核能四廠發電工程施工期間環境監測

（期間：101年4月至101年6月）

（定稿）

開發單位：台灣電力股份有限公司

執行監測單位：美商傑明工程顧問（股）台灣分公司

提送日期：中華民國 101 年 9 月

核能四廠發電工程施工期間環境監測報告（101年第1季）

環保署審查意見暨辦理情形

審查意見	辦理情形
(一)貴公司進行空氣品質監測作業時，應避開本署公告大陸沙塵事件之影響時段，以反映該工程施工期間空氣污染之實際狀況。	因大陸沙塵影響並非可長時間觀測，多於發生前1~2天方可進行預測，且每年11月至隔年5月為我國受大陸沙塵影響頻率較高之時期，其已占全年一半以上之月份，因本計畫空氣品質監測每月須連續監測3天（含假日及平日），且當地多為有雨情形，若需避開大陸沙塵影響，恐有執行上之困難，故有關大陸沙塵部分，目前以　貴署「中國大陸沙塵監測網」發布沙塵暴為主要依循，若於執行前該網站已發布沙塵暴之訊息，將調整監測時間。
(二)澳底漁港之水質監測生化需氧量（BOD）測值於2月及3月超出甲類海域海洋環境品質標準情形，請持續了解追蹤。	澳底漁港之生化需氧量測值超出甲類海域海洋環境標準情形，主要受船隻活動作業影響，且核能四廠之海事工程已於94年底完工，故屬環境背景之影響，將持續監測水質狀況。
(三)第2-74頁「地下水污染監測基準」應為「地下水污染監測標準」，請修正。	謝謝指教，將於下季報告內修正。
(四)第2-79頁101年3月份監測井GM6-1監測結果，pH值為5.477，與前2個月相較，呈現顯著變化，請說明可能原因。	謝謝指教，第2-79頁101年3月份地下水監測井GM6-1監測結果，pH值為5.477係為誤植，測值應為7.578，與1、2月（測值分別為7.743及7.812）變化不大。
(五)本報告書雖為季報，仍請分析各監測井測值之趨勢，是否有明顯變化趨勢，並說明可能原因。	謝謝指教，各監測井測值之趨勢變化，請參閱第3章及表3.1-28至表3.1-40，歷年來各監測井測值變化不大，若測值有明顯變化之情形，將確實探討分析原因。
(六)噪音、振動監測現場紀錄表（附錄IV3-61），未紀錄噪音計、聲音校正器等監測儀器之型號、序號等資料，建議執行單位確認。	有關噪音計、聲音校正器等監測儀器之型號、序號等資料，請　貴署參閱附錄III.2-5。

監測成果摘要

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告


監測成果摘要

1.氣象觀測

在盛行風向方面，本季 4~6 月以北北東風、南南東風、南風、西北風及西南風為主，與去年同期及歷年同期相近。4~6 月平均氣溫介於 22.1~27.0℃，露點溫度介於 19.2~24.2℃，相對濕度介於 83.9~85.2%，累計雨量分別為 204.5mm、499.0mm 及 297.5mm。大氣穩定度機率分佈，氣象高、低塔皆以 D 級（中性）及 E 級（微穩定）之分佈機率較高。

2.空氣品質監測

本季 4~6 月各測站空氣品質均符合空氣品質標準，整體而言，本季監測結果空氣品質尚屬良好。

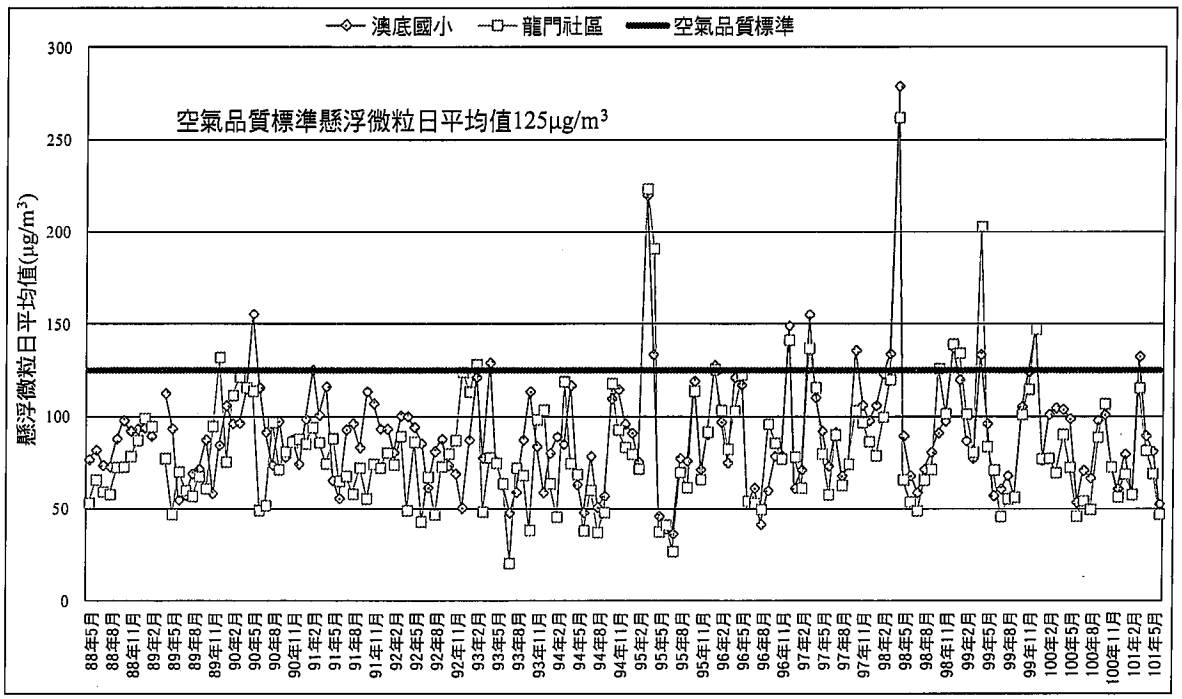


空氣品質歷年懸浮微粒日平均值（最大值）趨勢圖

3.噪音與振動監測

本季距核四主體工程最近之鹽寮海濱公園及過港部落等 2 測站而言，4~6 月非假日（施工）$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量在 1.6 dB(A)以內，依環保署環境影響評估技術規範之營建工程噪音評估模式技術規範之標準評估，

鹽寮海濱公園及過港部落測站之噪音影響程度均屬「無影響或可忽略」程度，故核四施工對鄰近地區噪音品質影響尚屬輕微。

本季 4~6 月之振動值均符合參考之日本振動規制法實施規則。

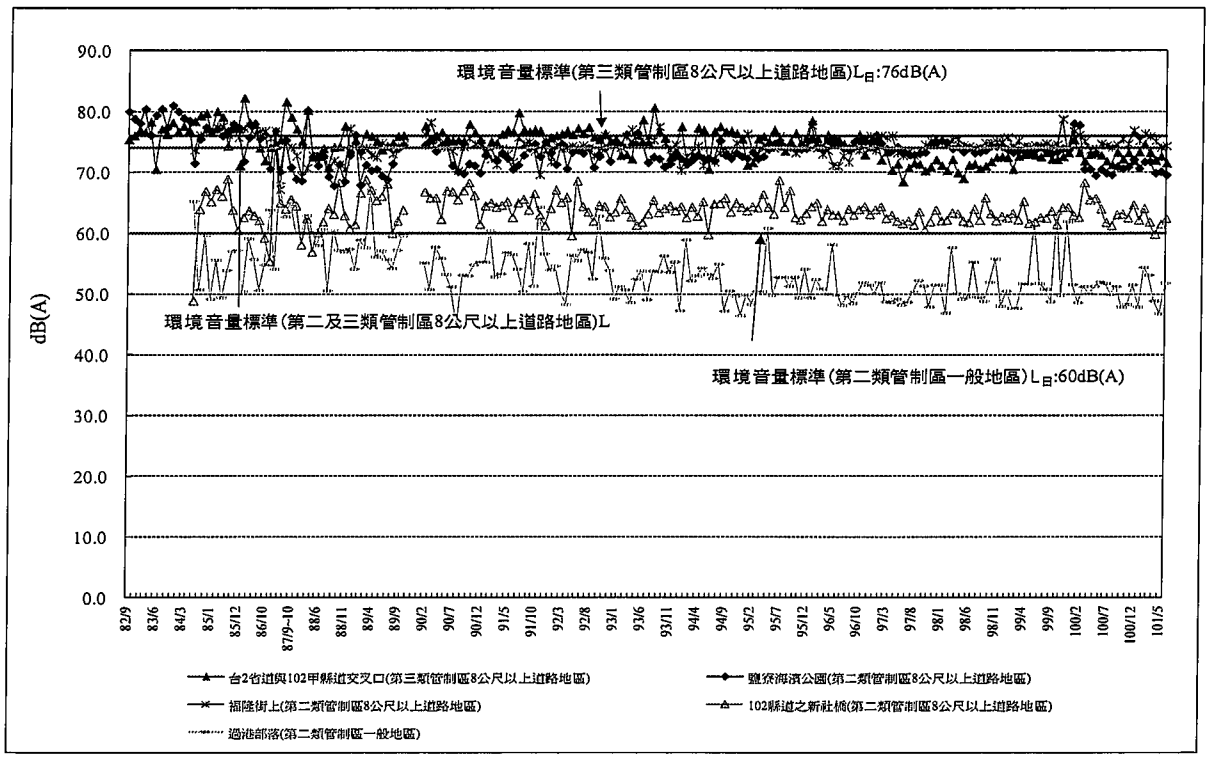

註：89/12~90/2 月因核四停工，故無資料。

核四施工環境監測歷年噪音 L 日非假日監測結果變化圖

4.交通流量監測

省道旁 3 處測站（台 2 省道與 102 甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等 3 測站）各月份尖峰時段之道路服務水準多維持在 B~C 級；另非省道旁測站（102 縣道之新社橋及過港部落）於非假日及假日尖峰時段之道路服務水準皆維持在 A 級。整體而言，扣除觀光活動影響，核四運輸車輛對台 2 省道交通運輸品質影響尚屬穩定可接受範圍。

5.河川水文監測


本季 4~6 月石碇溪及雙溪河川流量分別介於 0.237cms~17.116cms 及 3.057cms~ 270.736cms 間；歷年同季石碇溪及雙溪河川流量分別介於

0.064cms~7.712 cms 及 0.236cms~130.774cms 間。本季 4~6 月含砂量介於 0~888ppm 之間，歷年同期之含砂量介於 0~135ppm 間，其中 6 月 12 日因受梅雨峰面之豪大雨影響，當日降雨達 193.0mm，測值為歷年同期最高值。

6.河川水質監測

本季 4~6 月石碇溪除支流暗渠上游（沼澤區）測站水質較差，其 4、6 月屬輕度污染程度，5 月屬中度污染程度外，其餘各測站各月均屬未(稍)受污染程度；惟支流暗渠上游（沼澤區）測站位於核四廠區排水匯入處之上游，故其水質狀況未受廠區排水影響。另在雙溪部分，貢寮國小及新社大橋 2 測站皆屬未(稍)受污染程度。

石碇溪、鹽寮溪及雙溪等 3 處河口水質以大腸桿菌群、生化需氧量及總磷測值偏高，惟均在歷年範圍之內。

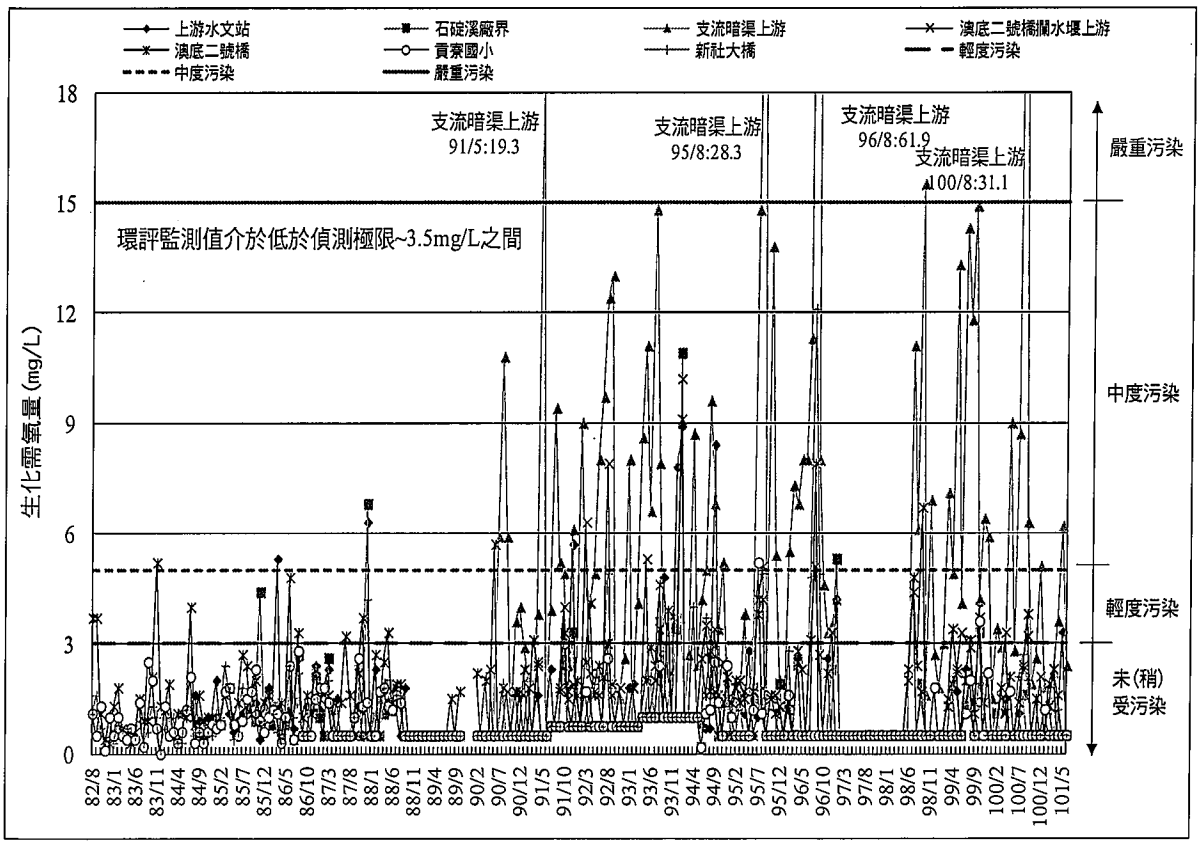


註：1.89/12~90/2 月因核四停工，故無資料。
2.支流暗渠上遊及澳底二號橋上游攔水堰 2 測站為 90 年 5 月新增。

核四施工環境監測歷年河川水質之生化需氧量監測結果變化圖

7.廠區水質監測

本季 4~6 月各測站各測值均符合放流水標準。

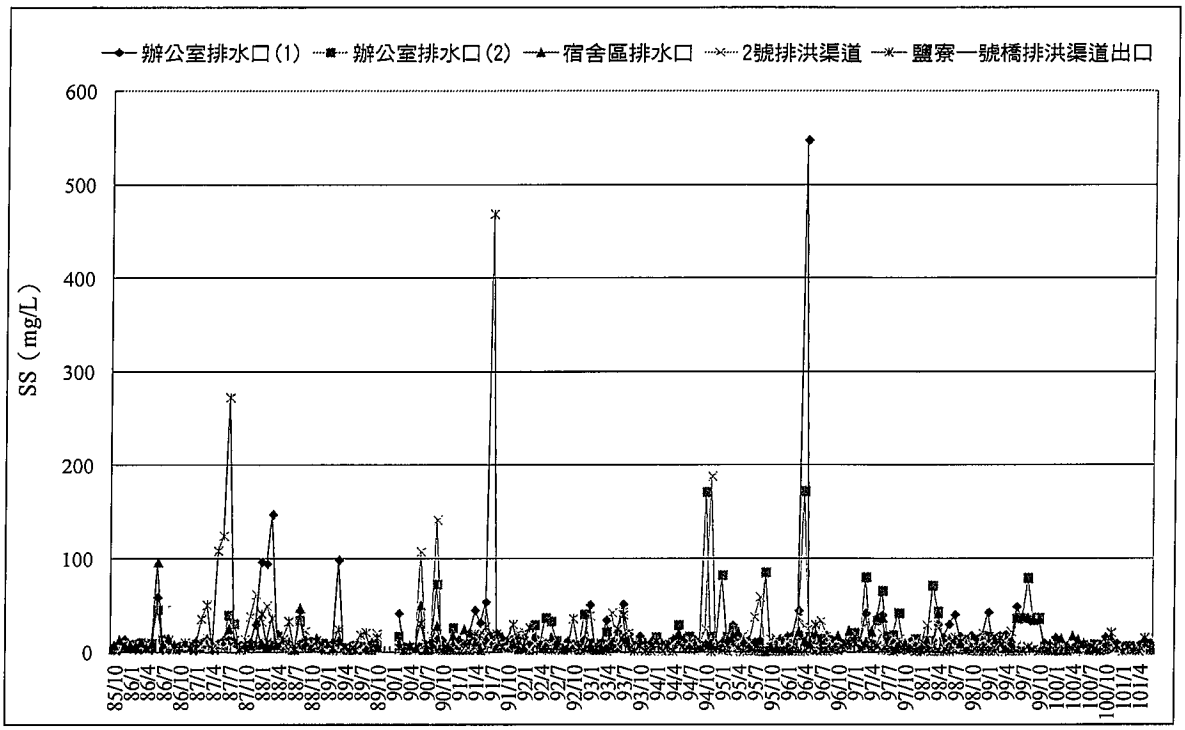

註：89/12~90/2 月因核四停工，故無資料。

核四施工環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果變化圖

8.地下水監測

本季 4~6 月僅 GM3-1 監測井之氨氮（4~6 月測值介於 0.67~0.84mg/L 之間）、重金屬鐵（4、6 月測值分別為 2.310mg/L、2.740mg/L）、重金屬錳（4~6 月測值介於 3.170~4.060 mg/L）等 3 項目有未符合第二類「地下水污染監測標準」之情形。GM3-1 監測井自設井之初，其氨氮、重金屬鐵、重金屬錳測值即有超出標準之情形，歷年測值分別介於 0.13~1.41mg/L、<0.016~5.65mg/L、<0.002~6.12mg/L，本季各測值均介於歷年範圍內，應受環境背景影響。


9.河域生態監測

本季在石碇溪與雙溪葉綠素 *a* 各次調查平均含量介於 0.07~1.00μg/L，附著性

藻類各次調查出現 22~43 種，浮游植物細胞數介於 5,808~138,072cells/L，浮游動物個體量介於 19~12,600ind./m^3，水生昆蟲於石碇溪及雙溪均以吉田扁蜉蝣、雙棘四節蜉蝣為主；魚種於石碇溪以粗首馬口鱲、大鱗鯰、尼羅口孵魚為主，雙溪則以粗首馬口鱲(粗首鱲)、黃鰭鯛、大鱗鯰為主；甲殼類方面，石碇溪以雙齒近相手蟹、北方呼喚招潮蟹及多齒新米蝦在數量最為優勢，雙溪以台灣沼蝦與雙齒近相手蟹在數量上較為優勢；軟體動物方面，石碇溪以網蜷、小皇冠蜑螺及福壽螺較為優勢，雙溪以網蜷及福壽螺在數量上較優勢。

10.海域水質監測

澳底漁港部份，僅生化需氧量 4、6 月（分別為 2.1 mg/L 及 3.1mg/L）測值有超出甲類海域環境分類及海洋環境品質標準之情形，主要受船隻活動作業影響，因核能四廠海事工程已於 94 年底完工，故本季測值屬環境背影值，且本季測值均介於歷年非海事工程施工時段生化需氧量（<1.0~29 mg/L）範圍內；鄰近海域部份，本季各測值除 5 月 4 號測站表、底層大腸桿菌測值有超出甲類海域海洋環境品質標準外，其餘各測站各測值均符合甲類海域海洋環境品質標準。

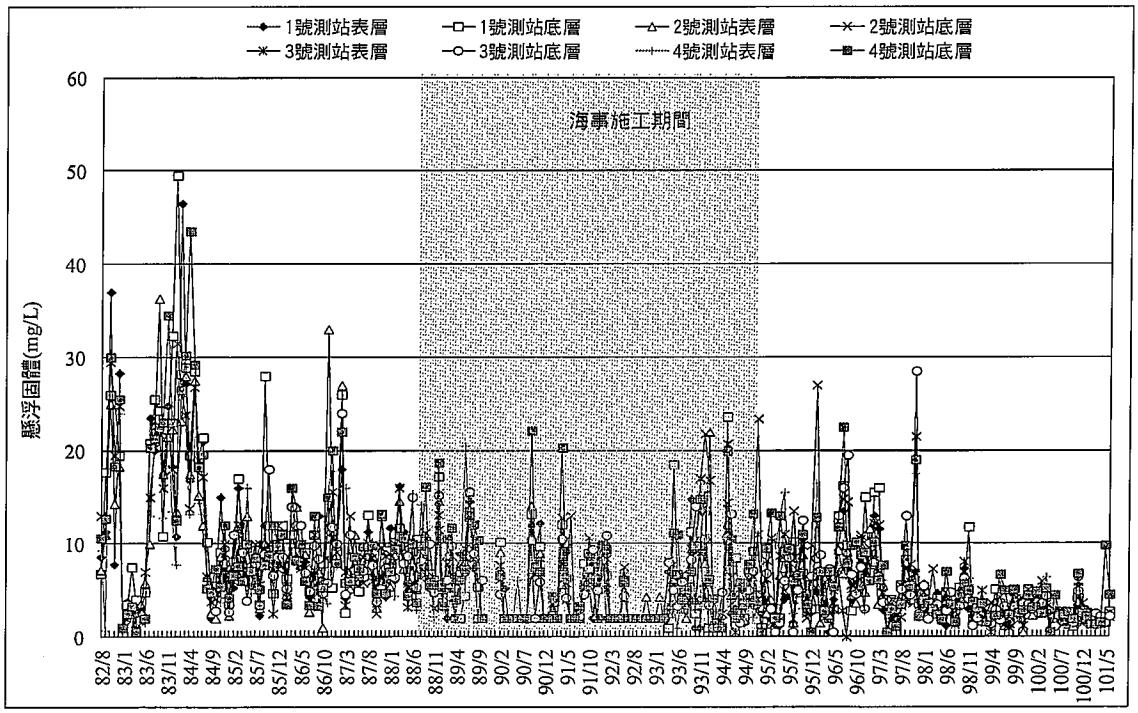

註：89/12~90/2 月因核四停工，故無資料。


核四施工環境監測歷年海域水質懸浮固體監測結果變化圖

11.海域生態監測

本季 4~6 月硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 *a* 各項平均測值分別為 26.59μg/L、1.19μg/L、<0.93μg/L、158.66μg/L、0.26μg Chl *a*/L，總氮與總磷分別為 0.05mg/L、0.03mg/L。整體而言，海域生態環境變動不大。

基礎生產力平均值為 0.84μg C/L/hr。本季浮游植物表層 0m 藍綠藻的鐵氏束毛藻為較優勢種、3m 及底層以矽藻的旋鏈角刺藻為優勢種，平均含量為 8.55×10^3cells/L。浮游動物垂直及水平分佈平均豐度為 27.2×10^3ind/1,000m^3 和 8.4×10^3ind/1,000m^3，以介形類、哲水蚤、夜光蟲及棘皮幼生優勢種。本季潮間帶沙底質記錄到多毛類，與鹽寮沙質底質環境變動大及物種特性有關。潮間帶岩礁底棲無脊椎動物的調查，以黑齒牡蠣及黑瘤海蜷為優勢物種。本季亞潮帶調查結果顯示，鹽寮海域亞潮帶沙質環境底棲無脊椎動物的種類以普通文蛤為主。亞潮帶岩礁區則與歷年調查結果相似，主要以瘤菟葵及白尖紫叢海膽為優勢物種。魚卵平均密度為 708 個/1000m^3。仔稚魚平均密度近於 52 尾/1000m^3。成魚在鹽寮及澳底兩礁石區以隆頭魚科、雀鯛科及蝴蝶魚科較多，並以霓虹雀鯛及斑鰭光鰓雀鯛較具優勢。魚類群聚的歧異指數為 3.13。大型海藻潮間帶海藻種類數較少，而亞潮帶水深 3 公尺處則以紅藻為主。亞潮帶大型藻類群聚亦以紅藻為主，除以貝狀耳殼藻及太平洋寬珊藻等表覆型海藻為優勢藻種外，水深 5 米的紅羽凹頂藻及水深 10 米的匍扇藻也較上季增加，覆蓋率大礁南側水深 5m 平均 26.40%，水深 10m 平均 27.60%。淺礁南側水深 5m 平均 19.58%，水深 10m 平均 23.70%。大礁及淺礁海域的珊瑚群聚仍以團塊形及平鋪狀的石珊瑚類為主，珊瑚種類組成與歷年調查結果相似，其中以菊珊瑚科的種類最多，微孔珊瑚及軸孔珊瑚次多。整體而言各測站的各項指數皆在歷年 95%信賴區間內，並未呈現異常變動


浮游植物細胞含量高於去年同季，浮游動物含量個體量與去年同季的相較增加，成魚種類數、大型海藻種類數皆較高於去年同季；魚卵密度含量、仔稚魚密度、珊瑚覆蓋率則較低於去年同季，其餘生物因子則變動不大，仍為一般沿近海域該季較常出現之現象。

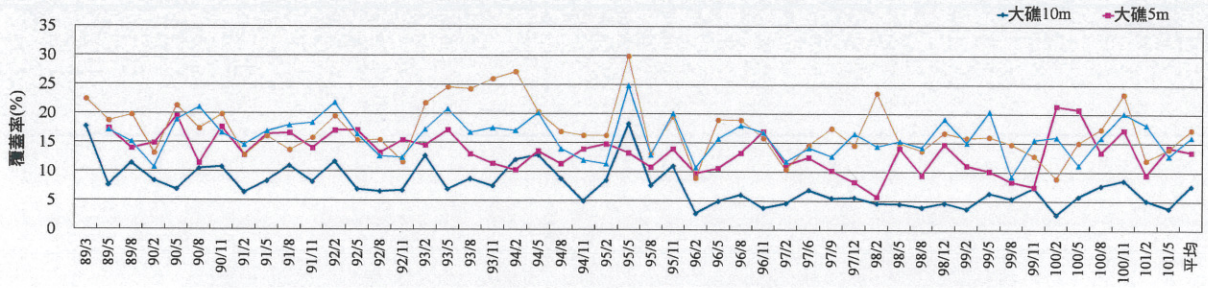

核四施工環境監測歷年珊瑚平均覆蓋率長期趨勢圖

12.漁業調查

各類作業漁法因季節性而異，於 101 年 4~6 月（農曆 3 月 11 日~5 月 12 日）之漁業法以沿岸採捕、燈火漁業（含火誘網及扒網漁業）及釣具漁業為主。在沿岸採捕業方面，本季涉水採捕方式之 CPUE 介 6.14~8.47 公斤/日/戶，IPUE 介於 927.91~978.14 元/日/戶，本季潛水採捕方式之 CPUE 介 16.48~22.35 公斤/日/戶，IPUE 介於 5,506.45~6,501.44 元/日/戶；在釣具漁業方面，本季 CPUE 介 12.2~18.9 公斤/日/戶，IPUE 介於 3,098~4,197 元/日/戶；在火誘網漁業方面，本季 CPUE 介於 104~603 公斤/日/戶，IPUE 介於 12,187~14,564 元/日/戶；在扒網漁業方面，CPUE 介於 8,241~16,835 公斤/日/戶，IPUE 介於 231,185~509,627 元/日/戶；在刺網漁業方面，本季 CPUE 介於 9.5~15.5 公斤/日/戶，IPUE 介於 4,506~5,774 元/日/戶。本季各漁法之 CPUE 及 IPUE 均介於歷年範圍內。

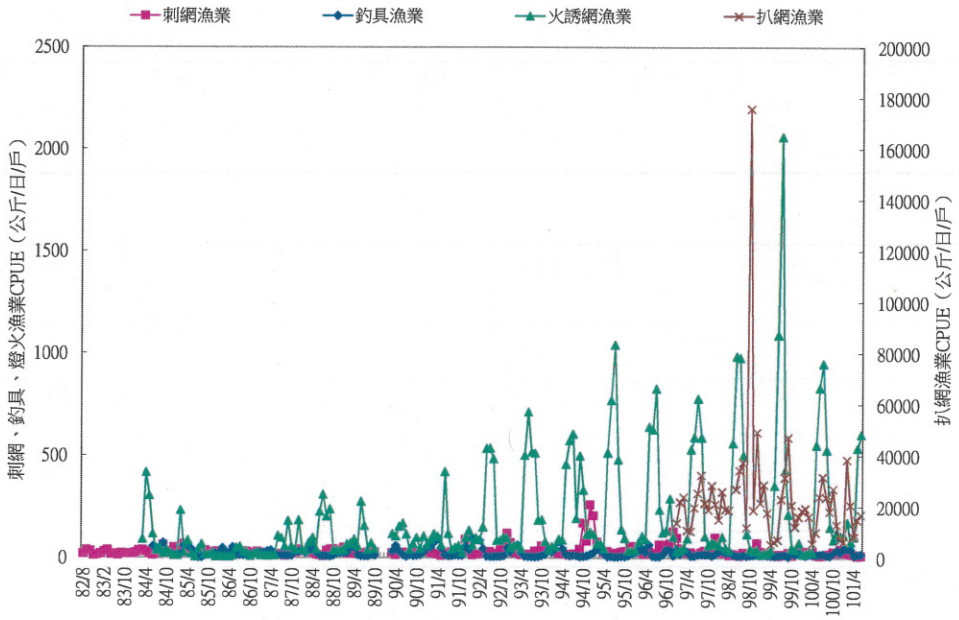

貢寮地區漁業標本戶 CPUE 調查結果變化圖

13.海象調查

海域溫度屬季節性變化，本季各測站之表層水溫約在 20.2℃~24.9℃之間，本季水層垂直水溫分佈情況方面，除 5、6 月份 A10、B8、B10、D8、D10、F8、F10 等測站之上、下水層溫差約在 4.0℃~7.5℃左右，其餘各測站並無明顯斜溫層；各測站之鹽度介於 33.5PSU~34.0PSU 之間，海水鹽度垂直變化小，此區域之水體混合狀況大致良好。

本季浮標流況大致上呈現漲潮西北流、退潮東南流之流況，少數浮標則呈現流向較不穩定；至於浮標之平均流速則呈鹽寮灣內流速較鹽寮灣外流速為低的情形。

14.景觀與遊憩活動調查

本季鹽寮海濱公園、龍門公園、福隆海水浴場各月遊客總人次分別介於 259~527 人次/月、3,502~4,497 人次/月、11,760~137,621 人次/月之間，各測站本季與去年同期比較，以鹽寮海濱公園及福隆海水浴場因受連日降雨及颱風影響，遊客數較去年同期減少。

本季第 4、5 號西向觀景點之景觀品質因廠區廠房共同通風塔及核島區廠房工程施工完成，略微影響，屬中度自然完整性程度，第 7 號觀景點因山坡上生水池工程施工開挖，視覺景觀品質受影響，屬中度自然完整性程度，惟目前皆已進行植生復育；各觀景點景觀品質與上季相近。整體而言，核四施工對台 2 省道—澳底至龍門社區(舊社)段及鹽寮海濱公園之景觀品質衝擊較大，屬中度自然完整性程度。目前綠帶二期(澳底二號橋以南段)之規劃設計已配合「公路局台 2 線鹽寮段新闢工程細部設計」之路線、高程設計中，並於台 2 線鹽寮段新闢工程完工後發包施工，屆時將沿台 2 省道施築一道 15~50 公尺寬之高坡緩衝綠帶，以有效改善台 2 省道沿線觀景點之視覺景觀。

15.海域漂砂

就輸砂量而言，本季各測站之進砂速率以 S4 最大， S2 測站之進砂量最小。S1 進砂速率在 4.26~11.01g/cm^2/day 間，S2 進砂速率在 2.49~8.06g/cm^2/day 間，


S3 進砂速率在 2.69~11.33g/cm^2/day 間，S4 進砂速率在 4.98~10.29g/cm^2/day 間，S5 進砂速率在 4.52~7.93g/cm^2/day 間。

以漂砂八方位中優勢（最大捕砂體積量方向）方向而言，各捕砂器漂砂運動方向以垂直岸線為主，以向、離岸方向描述則漂砂趨勢以向外海推移為主。以和量計算方式考量各方位漂砂傳輸分量相消、疊加之影響，S1 與 S4 測站以約略平行岸線方向向南傳輸，S4 測站則向北傳輸，而 S2 與 S3 測站則為約略垂直岸線方向傳輸，S2 測站向岸側傳輸，S3 測站則向外海傳輸。

16.海岸地形

101 年 6 月之陸域地形與上季相較，陸域砂量總體積變化約增加 44,569 立方公尺，陸域整體平均高程增加約 21cm；與去年同季相較，陸域砂量增加約 94,188 立方公尺，高程平均增加約 45cm。101 年 6 月之海域地形與去年同季相較，砂量增加約 29,840 立方公尺，高程平均增加約 4cm。一年以來經過颱風季節、東北季風與西南季風影響，陸域沙灘總量為淤積情形，而近岸海域亦為淤積之情形。

雙溪河口灘線本季與上季相較，本季河口沙嘴向東南推移約 50m，沙灘往東南延伸，河口退潮後之河道寬度較上季縮減，本季河道出海口於最低潮時之寬度約為 20m，沙灘面積較上季增加，平均高程降低。自 97 年 9 月以來，福隆沙灘雖已趨於動態平衡狀態，雙溪河沙嘴持續在西南西與東北東方向小幅擺盪，近 2 年來未有明顯造成本區域影響之颱風，受季風之交替作用後，沙灘與近岸海域侵淤變化表現相對較為明顯，而侵襲本區域之颱風對整體漂砂侵淤量則產生較大之變化趨勢。

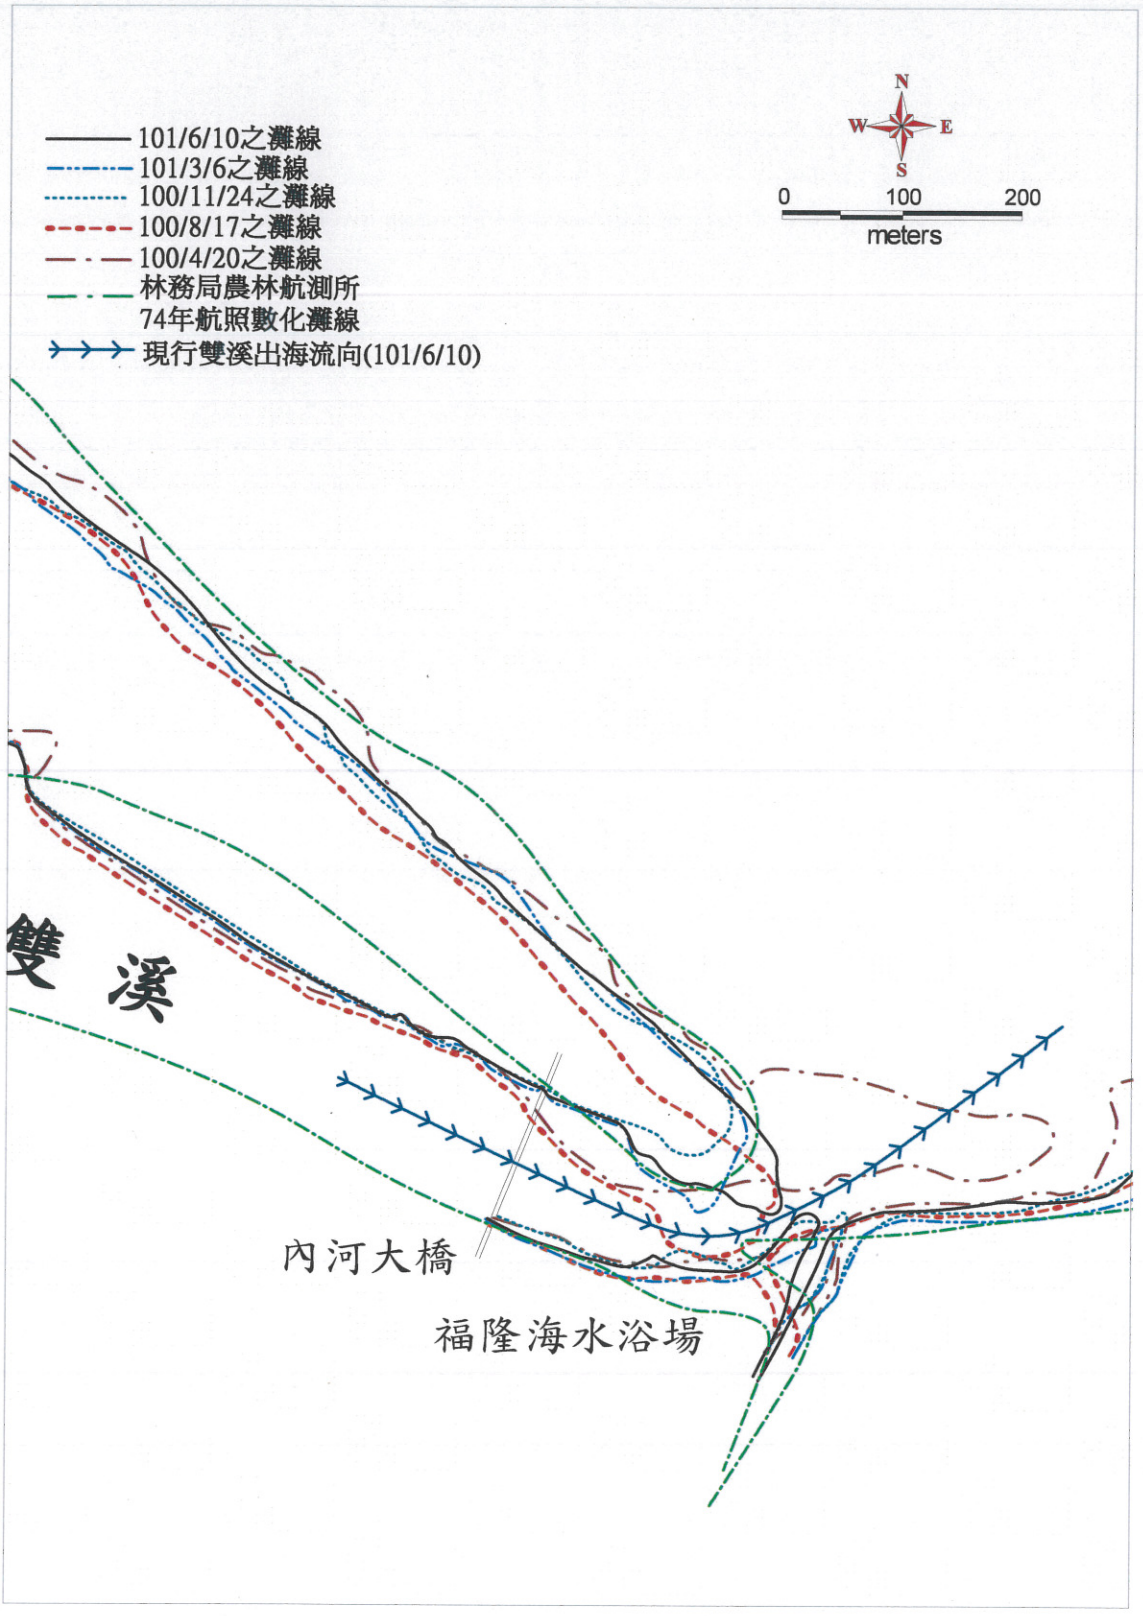

福隆海水浴場附近灘線變化及出海流向比較圖

目　錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

核能四廠發電工程施工期間環境監測
（期間：101年4月至101年6月）

目　　錄

監測成果摘要

表目錄

圖目錄

照片目錄

前言

第一章　監測內容概述 1-1

1.1　工程進度 1-1

1.2　監測情形概述 1-2

1.3　監測計畫概述 1-3

1.4　監測位址 1-3

1.5　品保品管作業措施概要 1-4

第二章　監測結果數據分析 2-1

2.1　氣象觀測 2-1

2.2　空氣品質監測 2-18

2.3　噪音與振動監測 2-33

2.4　交通流量監測 2-44

2.5　河川水文監測 2-51

2.6　河川水質監測 2-56

2.7　廠區水質監測 2-69

2.8　地下水監測 2-74

2.9　河域生態監測 2-83

2.10　海域水質監測 2-110

2.11　海域生態監測 2-114

2.12 漁業調查 2-156
2.13 海象調查 2-193
2.14 景觀與遊憩活動調查 2-199
2.15 海域漂砂 2-210
2.16 海岸地形 2-224

第三章 檢討與建議 3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策 3-1
3.1.1 監測結果綜合檢討分析 3-1
3.1.2 監測結果異常現象因應對策 3-46

參考文獻

附錄
附錄 I 檢測執行單位之認證資料
附錄 II 採樣與分析方法
附錄 III 品保/品管查核記錄
附錄 IV 原始數據

表 目 錄

表 1　核四廠施工環境監測各工作項目辦理單位一覽表 前-2

表 1.1-1　核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表 1-29

表 1.2-1　核四施工環境監測 101 年第 2 季監測結果摘要表 1-36

表 1.3-1　核四施工環境監測 101 年第 2 季執行情形一覽表 1-42

表 2.1-1　核四施工環境監測風速與風向 101 年第 2 季觀測結果 2-4

表 2.1-2　核四施工環境監測氣溫 101 年第 2 季觀測結果 2-5

表 2.1-3　核四施工環境監測露點溫度 101 年第 2 季觀測結果 2-6

表 2.1-4　核四施工環境監測相對濕度 101 年第 2 季觀測結果 2-7

表 2.1-5　核四施工環境監測雨量 101 年第 2 季觀測結果 2-8

表 2.1-6　巴斯魁爾(Pasquill)穩定度分類法 2-9

表 2.1-7　施工環境監測大氣穩定度 101 年第 2 季頻率分佈統計表 2-10

表 2.1-8　核四施工環境監測日射量 101 年第 2 季觀測結果 2-11

表 2.1-9　核四施工環境監測紫外線輻射量 101 年第 2 季觀測結果 2-12

表 2.2-1　核四施工環境監測空氣品質 101 年 4~6 月監測日期一覽表 2-21

表 2.2-2　核四施工環境監測空氣品質 101 年 4~6 月移動式測站監測綜合結果表 2-22

表 2.2-3　核四空氣品質 101 年 4~6 月連續監測站監測結果表 2-24

表 2.2-4　核四施工環境監測空氣品質 101 年 4 月移動式測站監測綜合結果表 2-26

表 2.2-5　核四施工環境監測空氣品質 101 年 5 月移動式測站監測綜合結果表 2-27

表 2.2-6　核四施工環境監測空氣品質 101 年 6 月移動式測站監測綜合結果表 2-28

表 2.3-1　核四施工環境監測 101 年 4 月噪音監測成果統計表 2-36

表 2.3-2　核四施工環境監測 101 年 5 月噪音監測成果統計表 2-37

表 2.3-3　核四施工環境監測 101 年 6 月噪音監測成果統計表 2-38

表 2.3-4 核四施工環境監測 101 年 4 月振動監測成果統計表 2-39
表 2.3-5 核四施工環境監測 101 年 5 月振動監測成果統計表 2-40
表 2.3-6 核四施工環境監測 101 年 6 月振動監測成果統計表 2-41
表 2.4-1 核四施工環境監測交通量 101 年 4 月監測結果統計表 2-46
表 2.4-2 核四施工環境監測交通量 101 年 5 月監測結果統計表 2-47
表 2.4-3 核四施工環境監測交通量 101 年 6 月監測結果統計表 2-48
表 2.4-4 多車道郊區公路服務水準評估準則建議表 2-49
表 2.4-5 核四施工環境監測 101 年 4 月道路服務水準等級分析 2-49
表 2.4-6 核四施工環境監測 101 年 5 月道路服務水準等級分析 2-50
表 2.4-7 核四施工環境監測 101 年 6 月道路服務水準等級分析 2-50
表 2.5-1 核四施工環境監測石碇溪河川水位 101 年第 2 季監測結果 2-52
表 2.5-2 核四施工環境監測雙溪河川水位 101 年第 2 季監測結果 2-53
表 2.5-3 核四施工環境監測河川斷面積、含砂量、流速與流量 101 年第 2 季監測結果 2-54
表 2.6-1 核四施工環境監測石碇溪河川水質 101 年第 2 季監測結果 2-60
表 2.6-2 核四施工環境監測雙溪河川水質 101 年第 2 季監測結果 ...2-62
表 2.6-3 核四施工環境監測河口水質 101 年第 2 季監測結果 2-63
表 2.6-4 地面水體適用性質分類 2-64
表 2.6-5 保護生活環境相關環境基準 2-64
表 2.6-6 保護人體健康相關環境基準 2-65
表 2.6-7 河川污染程度分類表 2-65
表 2.6-8 核四施工環境監測河川水質污染程度 101 年第 2 季推估結果 2-66
表 2.6-9 WQI5 之水質點數計算式 2-67
表 2.6-10 歐陽氏 WQI5 水質分類等級表 2-67
表 2.6-11 核四施工環境監測 101 年第 2 季河川 WQI5 指標評估結果 2-67
表 2.7-1 與本計畫相關之放流水標準 2-70
表 2.7-2 核四施工環境監測廠區排水水質 101 年第 2 季監測結果 ...2-71

表 2.7-3 101 年第 2 季每日平均人員數量表.....2-73
表 2.7-4 101 年第 2 季每日平均污水量及污染量推估表.....2-73
表 2.8-1 核四施工環境監測地下水 101 年第 2 季水位標高調查結果統計表.....2-78
表 2.8-2 核四施工環境監測地下水水質 101 年第 2 季監測結果.....2-79
表 2.9-1 核四廠附近河域 101 年第 2 季葉綠素 *a* 調查報告.....2-92
表 2.9-2 核四電廠附近雙溪及石碇溪附著藻類調查結果.....2-93
表 2.9-3 核四廠附近河域 101 年第 2 季浮游植物細胞數含量.....2-96
表 2.9-4 核四廠附近河域 101 年第 2 季浮游動物種類與個體量.....2-102
表 2.9-5 核四廠附近河域 101 年第 2 季水生昆蟲調查報告.....2-104
表 2.9-6 核四廠附近河域 101 年第 2 季魚類調查.....2-106
表 2.9-7 核四廠附近河域 101 年第 2 季無脊椎動物調查.....2-108
表 2.10-1 海域環境分類及海洋環境品質標準.....2-111
表 2.10-2 核四施工環境監測澳底漁港 101 年第 2 季監測結果.....2-111
表 2.10-3 核四施工環境監測海水水質 101 年第 2 季監測結果.....2-112
表 2.11-1 核四廠附近海域生態環境因子 101 年第 2 季現況分析結果.....2-126
表 2.11-2 核四廠附近海域 0 公尺表水層浮游植物 101 年第 2 季細胞數含量.....2-127
表 2.11-3 核四廠附近海域 3 公尺水層浮游植物 101 年第 2 季細胞數含量.....2-130
表 2.11-4 核四廠附近海域底層浮游植物 101 年第 2 季細胞數含量...2-132
表 2.11-5 核四廠附近海域浮游動物 101 年第 2 季種類與個體量.....2-134
表 2.11-6 核四廠附近海域浮游動物 101 年第 2 季之最高,最低與平均含量.....2-136
表 2.11-7 核四廠附近鹽寮海域潮間帶沙質環境 101 年第 2 季底棲無脊椎動物調查紀錄.....2-138
表 2.11-8 核四廠附近鹽寮海域潮間帶岩礁環境 101 年第 2 季底棲無脊椎動物調查紀錄.....2-138

表 2.11-9 核四廠附近鹽寮海域亞潮帶沙質環境 101 年第 2 季底棲無脊椎動物調查紀錄 2-140
表 2.11-10 核四廠附近鹽寮海域亞潮帶岩礁環境 101 年第 2 季底棲無脊椎動物調查紀錄 2-141
表 2.11-11 核四廠附近鹽寮海域底棲動物 101 年第 2 季群聚結構調查結果 2-142
表 2.11-12 核四廠附近海域 101 年第 2 季魚卵、仔稚魚密度含量及仔稚魚種類 2-143
表 2.11-13 核四廠附近海域 101 年第 2 季礁石區成魚調查 2-144
表 2.11-14 核四廠附近海域 101 年第 2 季潮間帶及潮下帶水深 3 公尺內大型海藻調查結果 2-145
表 2.11-15 核四廠附近海域潮間帶海藻種類密度、頻度、豐度與乾重 2-148
表 2.11-16 核能四廠附近海域潮下帶海藻種類及其覆蓋率 2-149
表 2.11-17 核能四廠附近海域 101 年第 2 季瑚瑚群聚調查記錄 2-150
表 2.11-18 核能四廠附近海域 101 年第 2 季珊瑚群聚結構調查結果 ..2-154
表 2.12-1 九孔養殖戶平均生產狀況 2-171
表 2.12-2 鮑魚養殖戶平均生產狀況 2-172
表 2.12-3 九孔養殖戶平均成本 2-173
表 2.12-4 鮑魚養殖戶平均成本 2-174
表 2.12-5 漁撈戶每月出海次數 2-175
表 2.12-6 漁撈戶各月作業漁法作業次數百分比 2-176
表 2.12-7 漁撈戶每月之平均漁獲產量 2-178
表 2.12-8 漁撈戶銷售狀況 2-183
表 2.12-9 漁撈戶平均成本 2-184
表 2.12-10 貢寮地區漁獲魚種之中、英文學名、俗名、使用漁具及漁期一覽表 2-185
表 2.12-11 貢寮地區 101 年 4~6 月火誘網漁業標本戶作業情形 2-187
表 2.12-12 貢寮地區 101 年 4~6 月扒網漁業標本戶作業情形 2-187

表 2.12-13 貢寮地區 101 年 4~6 月刺網漁業標本戶作業情形 2-188
表 2.12-14 貢寮地區 101 年 4~6 月釣具漁業標本戶作業情形 2-188
表 2.12-15 貢寮地區 101 年 4~5 月魩仔魚漁獲統計一覽表 2-188
表 2.12-16 貢寮地區 101 年 4~6 月沿岸採捕業標本戶漁獲統計 2-189
表 2.12-17 貢寮地區 101 年 4~6 月娛樂(海釣)漁業標本戶漁獲統計....2-189
表 2.12-18 貢寮地區 101 年 4~6 月養殖標本戶產量.....2-190
表 2.12-19 貢寮地區 101 年 4~6 月養殖標本戶產值.....2-191
表 2.12-20 貢寮地區 101 年 4~6 月養殖標本戶九孔、鮑魚仔苗海膽苗放養情形 2-192
表 2.13-1 核四施工環境監測海象調查 101 年第 2 季沿岸潮汐調查結果.....2-196
表 2.14-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季遊客人次統計表 2-204
表 2.14-2 各景觀點 101 年第 2 季自然完整性之評分明細表 2-205
表 2.15-1 本季（101 年第 2 季）漂砂底質粒徑分佈表 2-215
表 2.15-2 本季（101 年第 2 季）捕砂器砂樣成分綜合歸類表（以中值粒徑區分） 2-216
表 2.15-3 本季（101 年第 2 季）漂砂底質進砂及進砂速率分佈表.....2-216
表 2.15-4 本季（101 年第 2 季）運動底質輸砂主要來向、最大淨輸砂方向和速率一覽表.....2-217
表 2.15-5 本季（101 年第 2 季）運動底質調查和量計算之漂砂傳輸趨勢結果 2-217
表 2.15-6 本季（101 年第 2 季）海流儀實測統計資料表 2-218
表 2.15-7 本季（101 年第 2 季）近岸流場調查累積向量資料分析表....2-218
表 2.16-1 本季（101 年第 2 季）各定位樁沙灘高度紀錄.....2-232
表 3.1-1 核四施工環境監測歷年空氣品質總懸浮微粒監測結果 3-47
表 3.1-2 核四施工環境監測歷年空氣品質懸浮微粒監測結果.....3-51
表 3.1-3 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物日平均值(最大值)監測結果 3-54
表 3.1-4 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物小時平均值(最

大值)監測結果 3-58
表 3.1-5 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮日平均值(最大值)監測結果 3-62
表 3.1-6 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮小時平均值(最大值)監測結果 3-66
表 3.1-7 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳小時平均值(最大值)監測結果 3-70
表 3.1-8 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳 8 小時平均值(最大值)監測結果 3-71
表 3.1-9 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物日平均值(最大值)監測結果 3-78
表 3.1-10 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物小時平均值(最大值)監測結果 3-82
表 3.1-11 核四台 2 省道與 102 甲縣道交叉口施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表 3-86
表 3.1-12 核四鹽寮海濱公園施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表 3-90
表 3.1-13 核四福隆街上施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表...3-94
表 3.1-14 核四 102 縣道之新社橋施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表 3-98
表 3.1-15 核四過港部落施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表 3-102
表 3.1-16 核四施工環境監測歷年振動 $L_{v10(24\text{ 小時})}$監測結果統計表 3-106
表 3.1-17 核四施工環境監測歷年交通流量監測結果比較表 3-111
表 3.1-18 核四施工環境監測河川水文監測結果比較表 3-115
表 3.1-19 核四施工環境監測歷年河川水質溶氧監測結果.....3-116
表 3.1-20 核四施工環境監測歷年河川水質生化需氧量監測結果 3-120
表 3.1-21 核四施工環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果.....3-124
表 3.1-22 核四施工環境監測歷年河川水質氨氮監測結果.....3-128

表 3.1-23 核四施工環境監測歷年河川水質導電度監測結果 3-132
表 3.1-24 核四施工環境監測歷年河川水質硝酸鹽氮監測結果.....3-136
表 3.1-25 核四施工環境監測歷年廠區水質 pH 監測結果.....3-140
表 3.1-26 核四施工環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果.....3-143
表 3.1-27 核四施工環境監測歷年廠區水質生化需氧量監測結果 3-146
表 3.1-28 核四施工環境監測歷年與本季平均地下水水位標高調查結果比較表 3-149
表 3.1-29 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季 pH 監測結果表 3-150
表 3.1-30 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季導電度監測結果表.....3-151
表 3.1-31 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季氯鹽監測結果表 ..3-152
表 3.1-32 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季生化需氧量監測結果表.....3-153
表 3.1-33 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季化學需氧量監測結果表.....3-154
表 3.1-34 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季氨氮監測結果表 3-155
表 3.1-35 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季總有機碳監測結果表 3-156
表 3.1-36 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季總硬度監測結果表.....3-157
表 3.1-37 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季濁度測值監測結果表 3-158
表 3.1-38 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季懸浮固體監測結果表 3-159
表 3.1-39 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季鐵監測結果表...3-160
表 3.1-40 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季錳測值監測結果表.....3-161
表 3.1-41 核四施工期間環境 101 年第 2 季河域生態比較 3-162

表 3.1-42 核四施工環境監測歷年海域水質懸浮固體監測結果.....3-163
表 3.1-43 核四施工環境監測歷年海域水質生化需氧量監測結果.....3-167
表 3.1-44 核四施工環境監測歷年海域水質大腸桿菌群監測結果.....3-171
表 3.1-45 核四施工環境監測歷年海域水質濁度監測結果.....3-175
表 3.1-46 核四施工環境監測 101 年第 2 季與去年同季海域生態環境因子比較.....3-179
表 3.1-47 核四施工環境監測 101 年第 2 季與去年同季海域生態生物因子比較.....3-180
表 3.1-48 核四施工環境監測 101 年第 2 季海域生態指標性物種監測比對.....3-181
表 3.1-49 環境因子施工前與施工後比較.....3-182
表 3.1-50 生物因子施工前與施工後比較.....3-182
表 3.1-51 核四施工環境監測遊憩區歷年遊客人次統計結果.....3-183
表 3.1-52 核四施工環境監測景觀品質調查結果評分表.....3-185
表 3.1-53 核四施工環境監測海域漂砂捕砂器砂樣成分變化.....3-188
表 3.1-54 運動底質平均粒徑比較.....3-189
表 3.1-55 核四施工環境監測海域漂砂運動底質輸砂主要來向及最大淨輸砂方向.....3-191
表 3.1-56 各測站主要輸砂來向歷次調查次數統計表.....3-196
表 3.1-57 各測站最大淨輸砂方向歷次調查次數統計表.....3-196
表 3.1-58 歷年主要輸砂來向分季累計次數統計表.....3-196
表 3.1-59 歷年最大淨輸砂方向分季累計次數統計表.....3-197
表 3.1-60 歷年海岸地形砂量體積變化推估結果.....3-198
表 3.1-61 各定位樁相對侵淤示意表.....3-199
表 3.1-62 101 年第 1 季監測之異常狀況及處理情形.....3-201
表 3.1-63 101 年第 2 季監測之異常狀況及處理情形.....3-202

圖 目 錄

圖 1.4-1 核四施工環境監測氣象觀測站位置圖 1-46
圖 1.4-2 核四施工環境監測空氣品質監測站位置圖 1-47
圖 1.4-3 核四施工環境監測噪音與振動及交通流量監測站位置圖...1-48
圖 1.4-4 核四施工環境監測河川水文監測站位置圖 1-49
圖 1.4-5 核四施工環境監測河川水質及廠區水質監測站位置圖 1-50
圖 1.4-6 核四施工環境監測地下水監測站位置圖.....1-51
圖 1.4-7 核四施工環境監測河域生態監測站位置圖 1-52
圖 1.4-8 核四施工環境監測海域水質監測站位置圖 1-53
圖 1.4-9 核四施工環境監測海域生態監測站位置圖 1-54
圖 1.4-10 核四施工環境監測海象調查測站位置圖 1-55
圖 1.4-11 核四施工環境監測景觀環境品質及遊憩使用調查位置圖...1-56
圖 1.4-12 核四施工環境監測海域漂砂及海流監測位置圖.....1-57
圖 1.4-13 核四施工環境監測海岸地形調查範圍圖 1-58
圖 2.1-1 核四施工環境監測氣象塔 101 年 4 月風花圖.....2-13
圖 2.1-2 核四施工環境監測氣象塔 101 年 5 月風花圖.....2-14
圖 2.1-3 核四施工環境監測氣象塔 101 年 6 月風花圖.....2-15
圖 2.2-1 核四施工環境監測空氣品質總懸浮微粒 101 年 4~6 月日平均值（最大值）比較分析圖.....2-29
圖 2.2-2 核四施工環境監測空氣品質懸浮微粒 101 年 4~6 月日平均值（最大值）比較分析圖 2-29
圖 2.2-3 核四施工環境監測空氣品質氮氧化物 101 年 4~6 月各月監測平均值比較分析圖 2-29
圖 2.2-4 核四施工環境監測空氣品質二氧化氮 101 年 4~6 月各月監測平均值比較分析圖 2-30
圖 2.2-5 核四施工環境監測空氣品質二氧化氮 101 年 4~6 月小時平均值（最大值）比較分析圖 2-30
圖 2.2-6 核四施工環境監測空氣品質一氧化碳 101 年 4~6 月小時平均值（最大值）比較分析圖 2-30

圖 2.2-7 核四施工環境監測空氣品質一氧化碳 101 年 4~6 月 8 小時平均值（最大值）比較分析圖 2-31
圖 2.2-8 核四施工環境監測空氣品質一氧化碳 101 年 4~6 月各月監測平均值比較分析圖 2-31
圖 2.2-9 核四施工環境監測空氣品質非甲烷化合物 101 年 4~6 月各月監測平均值比較分析圖 2-31
圖 2.3-1 環保署環境影響評估技術規範-營建工程噪音評估模式技術規範 2-42
圖 2.5-1 核四施工環境監測河川水文 101 年 4~6 月逐時水位變化圖 2-55
圖 2.6-1 石碇溪污染分佈圖 2-68
圖 2.8-1 核四施工環境監測地下水 101 年第 2 季水位標高變化圖 ...2-82
圖 2.11-1 核四廠附近海域浮游植物 101 年第 2 季各監測站之垂直分佈 2-155
圖 2.11-2 核四廠附近海域浮游動物 101 年第 2 季各監測站個體量與生物體垂直分佈 2-155
圖 2.11-3 核四廠附近海域浮游動物 101 年第 2 季各監測站個體量與生物體水平分佈 2-155
圖 2.13-1 核四施工環境監測海象調查 101 年 4 月 2 日漂流浮標追蹤軌跡圖 2-197
圖 2.13-2 核四施工環境監測海象調查 101 年 5 月 7 日漂流浮標追蹤軌跡圖 2-197
圖 2.13-3 核四施工環境監測海象調查 101 年 6 月 6 日漂流浮標追蹤軌跡圖 2-198
圖 2.13-4 核四施工環境監測海象調查沿岸水溫月平均變化圖 2-198
圖 2.14-1 觀景點位置示意圖 2-206
圖 2.15-1 本季（101 年第 2 季）各測站各方向進砂速率及淨進砂速率雷達圖 2-219
圖 2.15-2 本季（101 年第 2 季）各測站輸砂和量淨傳輸率向量圖....2-221
圖 2.15-3 本季（101 年第 2 季）海流儀實測流速流向玫瑰圖.....2-222

圖 2.15-4 本季（101 年第 2 季）流速流向棍棒圖潮汐水位變化圖....2-222
圖 2.15-5 本季（101 年第 2 季）近岸流場調查累積向量路徑圖 2-223
圖 2.16-1 核四附近海岸地形測量規劃測線圖 2-233
圖 2.16-2 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月海岸地形監測結果 2-234
圖 2.16-3 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 101 年 3 月監測結果比較 2-235
圖 2.16-4 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 100 年 11 月監測結果比較 2-236
圖 2.16-5 福隆海水浴場附近灘線變化及出海流向比較示意圖.....2-237
圖 2.16-6 福隆海水浴場與雙溪河道侵淤比較圖 2-238
圖 3.1-1 核四施工環境監測歷年空氣品質總懸浮微粒 24 小時值(最大值）比較分析圖 3-203
圖 3.1-2 核四施工環境監測歷年空氣品質懸浮微粒日平均值（最大值）比較分析圖 3-204
圖 3.1-3 核四施工環境監測歷年噪音 $L_{日}$非假日監測結果變化圖....3-205
圖 3.1-4 核四施工環境監測歷年噪音 $L_{日}$假日監測結果變化圖 3-206
圖 3.1-5 核四施工環境監測歷年噪音 $L_{晚}$非假日監測結果變化圖....3-207
圖 3.1-6 核四施工環境監測歷年噪音 $L_{晚}$假日監測結果變化圖 3-208
圖 3.1-7 核四施工環境監測歷年噪音 $L_{夜}$非假日監測結果變化圖....3-209
圖 3.1-8 核四施工環境監測歷年噪音 $L_{夜}$假日監測結果變化圖 3-210
圖 3.1-9 核四施工環境監測歷年振動 $L_{v10(24小時)}$假日監測結果變化圖 3-211
圖 3.1-10 核四施工環境監測歷年振動 $L_{v10(24小時)}$非假日監測結果變化圖 3-212
圖 3.1-11 核四施工環境監測各測站歷年非假日交通量監測結果 3-213
圖 3.1-12 核四施工環境監測各測站歷年假日交通量監測結果.....3-214
圖 3.1-13 核四施工環境監測河川水質歷年調查溶氧量變化圖.....3-215
圖 3.1-14 核四施工環境監測河川水質歷年調查生化需氧量變化圖...3-216
圖 3.1-15 核四施工環境監測河川水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖

.....3-217
圖 3.1-16 核四施工環境監測河川水質歷年調查氨氮濃度變化圖 3-218
圖 3.1-17 核四施工環境監測河川水質歷年調查導電度變化圖.....3-219
圖 3.1-18 核四施工環境監測河川水質歷年調查硝酸鹽氮濃度變化圖
.....3-220
圖 3.1-19 核四施工環境監測廠區水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖
.....3-221
圖 3.1-20 核四施工環境監測廠區水質歷年調查生化需氧量變化圖...3-221
圖 3.1-21 核四施工環境監測地下水流向示意圖 3-222
圖 3.1-22 核四施工環境監測平地監測井歷年地下水位變化圖.....3-223
圖 3.1-23 核四施工環境監測山區監測井歷年地下水位變化圖.....3-224
圖 3.1-24 核四施工環境監測 GM10 監測井歷年地下水導電度監測結
果.....3-225
圖 3.1-25 核四施工環境監測 GM10 監測井歷年地下水氯鹽監測結果
.....3-225
圖 3.1-26 核四施工期間環境監測河域生態長期趨勢分析.....3-226
圖 3.1-27 核四施工環境監測海域水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖
.....3-228
圖 3.1-28 核四施工環境監測海域水質歷年調查生化需氧量變化圖...3-229
圖 3.1-29 核四施工環境監測海域水質歷年調查大腸桿菌群變化圖...3-230
圖 3.1-30 核四施工環境監測海域水質歷年調查濁度變化圖 3-231
圖 3.1-31 核四施工期間環境監測調查海域水體內浮游生物含量長期
變動趨勢 3-232
圖 3.1-32 核四施工期間環境監測調查海域水體內魚類,魚卵密度及
仔稚魚密度長期變動趨勢.....3-233
圖 3.1-33 核四施工期間環境監測調查海域大型藻類指標物種長期變
動趨勢 3-234
圖 3.1-34 核四施工期間環境監測調查海域大礁及淺礁水深 10m 及
5m 歷年珊瑚平均覆蓋率 3-235
圖 3.1-35 貢寮地區各類漁業標本戶之 CPUE（公斤/日/戶）一覽表.3-236
圖 3.1-36 貢寮地區各類漁業標本戶之 IPUE（元/日/戶）一覽表 3-236

圖 3.1-37 各測站主要輸砂來向歷年累計次數比較圖 3-237
圖 3.1-38 各測站主要輸砂來向歷年累計次數雷達圖 3-237
圖 3.1-39 各測站最大淨輸砂方向歷年累計次數比較圖 3-238
圖 3.1-40 各測站最大淨輸砂方向歷年累計次數雷達圖 3-238
圖 3.1-41 歷年主要輸砂來向分季累計次數比較圖 3-239
圖 3.1-42 歷年主要輸砂來向分季累計次數雷達圖 3-239
圖 3.1-43 歷年最大淨輸砂方向分季累計次數比較圖 3-240
圖 3.1-44 歷年最大淨輸砂方向分季累計次數雷達圖 3-240
圖 3.1-45 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 100 年 4 月監測結果比較 3-241
圖 3.1-46 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 87 年 6 月監測結果比較 3-242
圖 3.1-47 核四附近海岸地形監測各剖面水深變化比較 3-243
圖 3.1-48 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 101 年 3 月侵淤比較圖 3-247
圖 3.1-49 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 100 年 4 月侵淤比較圖 3-247
圖 3.1-50 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 87 年 6 月侵淤比較圖 3-248
圖 3.1-51 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 100 年 11 月侵淤比較圖 3-248
圖 3.1-52 歷年海岸地形砂量體積變化圖 3-249
圖 3.1-53 各定位樁相對侵淤量示意圖 3-251

照片目錄

照片1.1-1 2號機反應器廠房施工現況 1-59
照片1.1-2 核廢料廠房施工現況 1-59
照片1.1-3 1號機汽機廠房施工現況 1-59
照片1.1-4 開關場施工現況 1-59
照片2-1 核能四廠發電工程施工期間環境監測計畫各項監測調查情形 2-16
照片2.2-1 空氣品質監測照片.....2-32
照片2.3-1 噪音振動監測照片.....2-43
照片2.14-1 核四施工環境監測第1~3號觀景點記錄照片 2-207
照片2.14-2 核四施工環境監測第4~5(西向)號觀景點記錄照片 2-208
照片2.14-3 核四施工環境監測第5(南向)~7號觀景點記錄照片 2-209
照片2.16-1 定位樁觀測情形 2-239

前　言

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

前　言

1.依據

隨著國家經濟蓬勃發展與國民生活水準日益提升，考量台灣地區用電量需求及能源多元化之考慮，於核定之電源開發方案中，選定新北市貢寮區的鹽寮地區設置第四核能發電廠。

台電公司依據民國 74 年 1 月行政院核備的「加強推動環境影響評估方案」，及民國 78 年 8 月行政院原子能委員會（以下簡稱原能會）「核能電廠環境影響評估作業要點」的規定，據以辦理核能四廠環境影響評估工作；評估作業歷經數次修正及補充後，該評估報告已在民國 80 年 12 月 30 日經原能會審查通過。台電公司為了達成核能四廠施工階段的各項環境監測工作及建立計畫區附近完整的背景環境資料庫，自 82 年 8 月起，依據評估報告相關內容與審查結論辦理「核能四廠發電工程施工期間環境監測工作」，目前由美商傑明工程顧問公司（以下簡稱傑明公司）負責辦理該項監測工作，藉以隨時掌握施工階段各項工程對環境品質產生之影響程度，以適時修正施工作業方式並採行相關減輕對策與保護措施，確保周圍環境品質。此外，經由環境背景資料之蒐集與分析，尚可建立長期性、連續環境監測系統，以符合環保追蹤管制之規定。

2.監測執行期間

核能四廠施工期間之環境監測工作自 82 年 8 月執行迄今，本季報係 101 年第 2 季之監測報告，其執行期間係自民國 101 年 4 月 1 日至 101 年 6 月 30 日，共計 3 個月。

3.執行監測單位

本計畫監測工作監測項目包括氣象觀測、空氣品質監測、噪音與振動監測、交通流量監測、河川水文監測、河川水質監測、廠區水質、地下水監測、河域生態監測、海域水質監測、海域生態監測、漁業調查、

海象調查、景觀遊憩調查、海域漂砂調查及海岸地形調查等，共計 16 個項目；其中氣象、海象與河川水文監測工作係由台電公司電源開發處自行觀測調查，而漁業調查係由台電公司委託國立台灣海洋大學執行，其餘項目則由傑明公司負責規劃與辦理，並敦請國內著名之學者專家與顧問公司共同參與執行。有關本監測工作各項目之辦理單位，詳表 1 所示。

表1　核四廠施工環境監測各工作項目辦理單位一覽表

工作項目	負責辦理單位	工作項目	負責辦理單位
1.氣象	台電公司電源開發處	9.河域生態	中華民國魚類學會
2.空氣品質	新紀工程顧問有限公司	10.海水水質	台灣檢測（股）公司
3.噪音與振動		11.海域生態	中華民國珊瑚礁學會
4.交通流量		12.漁業	台電公司委託「海洋大學環境生物與漁業科學系」辦理
5.河川水文	台電公司電源開發處	13.海象	台電公司電源開發處
6.河川水質	台灣檢測（股）公司	14.景觀遊憩	美商傑明工程顧問（股）公司
7.廠區水質		15.海域漂砂	中山大學海洋環境及工程學系 李忠潘教授
8.地下水		16.海岸地形	中山大學海洋環境及工程學系 薛憲文副教授
監測季報與年報撰寫	美商傑明工程顧問（股） 台灣分公司		

註：新紀工程顧問有限公司（環保署認可之代檢業／許可證號 053），台灣檢測（股）公司（環保署認可之代檢業／許可證號 035），台電公司電源開發處獲經濟部標準檢驗局國際標準品質保證制度 ISO9001/CNS12681 品質系統認可（證明書編號 3S7Y012-02）。

1 監測內容概述

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

第一章　監測內容概述

1.1 工程進度

核能四廠廠區設施主要包括：冷修配廠、開關廠、輔助鍋爐燃油槽、核廢料廠房、廢水處理廠、氣渦輪機廠房、放射性試驗室、倉庫區、生水池、永久倉庫、輔助用過燃料廠房、圍阻體廠房、重車廠、輔機廠房、汽機廠房、廢料廠房及控制廠房，其它設施尚有工地辦公區、行政大樓、模擬中心、員工宿舍、氣象鐵塔、停車場、主要警衛室及大門等。

本季（101年4~6月）核能四廠之主要施工內容包括：1、2號機核島區廠房結構工程（照片1.1-1）、核廢料廠房工程（照片1.1-2）、抽水機廠房工程（照片1.1-3）、1、2號汽機廠房工程（照片1.1-4）、變壓器場工程、水處理系統工程及雜項土木建築方面等，各工程均已發包並進行施工中。

1.2 監測情形概述

本季環境調查監測工作係「核四施工環境監測」101 年第 2 季之監測作業，其執行期間係自民國 101 年 4 月 1 日至 101 年 6 月 30 日，共計 3 個月。本季進行之監測項目包括：氣象觀測、空氣品質監測、噪音與振動監測、交通流量監測、河川水文監測、河川水質監測、廠區水質監測、地下水監測、河域生態監測、海域水質監測、海域生態監測、漁業調查、海象調查、景觀遊憩調查、海域漂砂調查及海岸地形調查等 16 項，以下茲就各項監測項目之監測結果摘要詳表 1.2-1。

由於核四廠址三面環山，東側約 300 公尺即為太平洋，因受地形屏障作用之利，根據核四廠過去歷年施工期間環境監測年報與季報顯示，位於廠址西南側之貢寮及東南側的舊社、福隆等地受核四廠施工之影響不大；而廠址東北側之澳底與東側濱海地區則較有可能受到施工的影響；至於海域方面，循環水進水口防波堤及重件碼頭工程雖已於 88 年 7 月份開始進行海上施工作業，海事工程海域施工項目已於 94 年 7 月 22 日竣工，並於 94 年 11 月 28 日驗收，目前並無任何於海域上施工之工程進行，故本年度環境影響以陸上工程為主。有關本年度核四廠施工作業是否對其周遭環境造成影響，將於第二章各節中分別予以說明。

1.3 監測計畫概述

本季進行之監測項目計包括氣象觀測、空氣品質監測、噪音與振動、交通流量、河川水文、河川水質、廠區水質、地下水、河域生態、海域水質、海域生態、漁業、海象、景觀遊憩、海域漂砂、海岸地形等 16 項，監測項目、工作內容及監測方法如表 1.3-1 所示。

1.4 監測位址

計畫區位於新北市貢寮區的鹽寮地區，廠址北、西及南方三面環山，東側約 300 公尺即為太平洋。本監測計畫中各監測項目之監測地點及說明詳見圖 1.4-1~圖 1.4-13 及前表 1.3-1。

1.5 品保品管作業措施概要

1.現場採樣之品保/品管

⑴空氣品質方面：

①樣品採集及樣品輸送

根據標準操作程序之要求，本次監測所規範之採樣工作及制定之採樣流程乃依樣品之保存性質不同而採取不同品保執行要求，敘述如下：

高量採樣法中，濾紙於採樣及樣品輸送期間所受之保護為品保工作重點之一。於採樣時，須確實記錄高量採樣工作中之各項數據（如流量、採集時間等），並於樣品之輸送過程中，確保濾紙樣品之完整性。濾紙樣品破裂，若為採樣期間，則重新採樣；若為採樣結束，仍能完整收集碎片，則乾燥稱重，否則重新採樣。

②樣品之交接與轉登程序

採樣結束時，樣品由採樣人員攜回實驗室後，交與樣品管理員進行轉登錄工作，此時樣品管理員應確實檢視樣品是否完整，並隨時將突發狀況之發生向主管報備。

⑵噪音/振動監測

①確認監測站位置符合環保署設置規定。

②確認監測點擺設位置無其他干擾音源。

③確認監測點擺設位置不影響交通及人員安全。

④確認監測點所屬管制區類別並記錄。

⑤監測站位置附近環境簡述、描繪測站位置，填寫相關之現場紀錄。

⑶河川水質/廠區水質/地下水/海水水質監測

河川水質/廠區水質/地下水/海水水質之採樣方法均依行政院環保署公告之「水質檢驗方法」中規定採樣作業及「監測井地下水採樣方法」進行採樣。

①pH 計進行現場測試前之校正，並量測標準液記錄其結果。

②導電度計進行現場測試前之校正，並量測標準液記錄其結果。

③填寫現場測試結果表，以確實記錄樣品現場測量狀況。

④填寫樣品監控表，以確實掌控樣品數量。

⑤進行現場採樣重覆樣品採集，以明瞭樣品之代表性。

⑥準備旅運空白樣品與實際樣品同時進行分析，以掌握樣品運送是否有污染狀況發生。

⑷海域生態監測

海上作業時以全球定位系統(GPS, MAGELLAN Model NAV 5000D 型）進行海上導航及定位工作，於各測站以 Niskin 採水瓶採取不同深度（0,3 及底層）海水，依環保署公告「品質保證及品質管制作業方式」進行樣品保存、輸送及分析等工作。

水樣採集後，現場立即測定溫度、pH 及溶氧，其他項目則使用預先清洗過之塑膠瓶盛裝，在樣品收集前並使用該測站之海水再潤洗兩次後，依規定進行樣品保存。所有盛裝之容器均於採樣前由本實驗室採樣小組進行樣品編號及分析項目之標識工作。樣品編號係根據環保署（1990）「污染源自行或委託檢驗申報書撰寫指引」之編號方式加以編碼。本實驗室編號方式為 C-10-0，英文字碼為計劃代號，英文字碼後之兩位數字碼代表測站號碼，最後數字碼則為該樣品之深度。採樣時應於現場記錄包括採樣時間、地點、分析項目、現場測定項目之測值、採樣瓶數、樣品編號等項目。

至於生物因子方面，採樣作業管制方式如下：

①採樣作業記錄表：

海上作業均需填寫海上作業記錄表，該記錄表中，至少必須登載包含採樣分類、作業站名、作業日期、測站位置，作業或採樣時間（當地時間）、採樣水深，流量或流量計讀數，表面海水溫度及鹽度、記錄人員、標本瓶編號等資料在內，以供日後查核之用。

②海上採樣作業管制注意事項：

A.標本分裝作業管制：

a.標本瓶依採樣類別及方式之不同（如浮游動物水平、垂直採樣，仔稚魚採樣等），而使用不同的標本瓶種類（如大小、型式或顏色不同），防止標本誤裝。

b.在不同採樣類別，使用不同標本瓶編號方式及順序或顏色，防止編碼錯誤發生，而且標本瓶的編碼均在出海前事先編妥。

c.標本加藥保存處理，均於事後再行檢視或查驗 1 次，防止因忘記加藥保存而致毀損。

d.標本裝瓶作業均依標本瓶號順序裝填，如此對照作業時間順序，即可得知標本瓶是屬於那一測站所有，方便事後需要追查或驗証之用。

e.採集網的標本採樣，均經過 2 次網身沖洗作業，確保沒有標本黏附於網身上。

f.上述標本採樣結束後，網身並再做 1 次完全沖洗，以避免有殘留標本黏附網身上，經此道手續後，再留作下次採樣使用。

B.流量計功能檢查管制：

a.每次採樣作業前，需再次核對流量計讀數，是否與前次收回時讀數相同，若有不同，則另行記載其讀數。

b.每次採樣作業，當網具收上後，首先檢查流量計讀數是否正常，並記錄其讀數，以防因各種因素導致流量計讀數有所變動，造成誤差。

c.每次採樣結束後，均需核對流量計讀數值是否正常（對照採樣水深與流量計讀數是否有所同步增減），若不正常，則檢查流量計是否卡住或已損害，或裝置不正常（因繩索被鉤住或其他各種因素等），流量計若有不正常則須立即更換預備品，或是調整網具中流量計之裝置方式等。

C.採樣水深管制：

a.鋼纜或纜繩下放至網口接近海水面時，停止下放並將碼錶歸零，以確保下放鋼纜長度正確性。

b.採樣水深使用附於鋼纜上之碼錶讀數加以控制，另於控制絞車上亦有絞車的轉數可互相校對。

c.使用船上之科學漁探機，探測網具下放之深度，並檢視是否與碼錶讀數相同，做為碼錶功能正常與否驗証，確保深度之正確性。

d.採用固定之採樣深度時，則於鋼纜或纜繩上於固定採樣距離作 1 個標記予以識別。

③其他作業管制注意事項：

A.每次出海作業，所有網具、記錄表、流量計及標本瓶等均準備有備用品，以防因意外損害時，作為更換之用。

B.所有記錄表於航次結束後，均影印 2 份，分由不同人，各收執 1 份，以防止原始作業資料因不慎遺失，尤其研究船較長航程之航次，更須遵循本項要點。

C.採 3 班輪值制之航次，各項採樣作業均列有操作注意事項，包括作業使用網具、採樣深度操作，標本加藥種類及數量、記錄資料方式等，置於作業台以利作業人員隨時查閱，並力求作業程序的一致性。

2.監測與分析工作之品保/品管措施

(1)空氣品質監測

空氣品質監測品管要求：

檢驗項目	品管要求						
	流量查校	測漏	零點校正	全幅校正	零點漂移	全幅漂移	臭氧流量
氮氧化物	○	○	○	○	○	○	○
非甲烷碳氫化合物	○	○	○	○	○	○	-
一氧化碳	○	○	○	○	○	○	-
總懸浮微粒	○	○	-	-	-	-	-

品管要求內容與管制範圍說明：

①表上所列「○」表示需做此項目品管要求，「-」則為無需操作。

②流量查校需求管制：

A.氮氧化物：700 cc/min ±10%。

B.非甲烷碳氫化合物：800 cc/min ±10%。

C.一氧化碳：700 cc/min ±10%。

D.總懸浮微粒：1,100~1,700L/min±7%

③測漏檢查管制要求：

A.測定時必須 90 秒內停至零點(或顯示××××)。

B.高量採樣器流量壓力應為固定值。

④溫濕度感應器品管需求：溫度誤差值為±1℃，濕度誤差值為±10%。

⑤風速風向計品管需求：風速誤差值為±5%，風向誤差值為±3%。

空氣品質監測品保目標：

①粒狀污染物之目標擬定因子

指標值 / 檢驗項目	精密度 (相對差異百分比) (%)	準確性分析		完整性(≧%)	儀器偵測極限
		品管樣品 (%)	野外空白		
TSP	>0.995	—	< 2 mg	87%≦完整性百分比≦113%	0.25 μ g/m^3

②氣狀污染物之目標擬定因子

指標值 / 監測項目	精密度(平均值相關係數)(r值)	準確性分析			完整性(%)	儀器偵測極限值
		雜訊 Noise	零點飄移 Zero	全幅飄移 Span(80 %)		
氮氧化物	>0.995	<±0.0005ppm	<±0.01ppm	<± 2.5%	每小時數值 ≧75 % 每日數值 ≧ 87 %	0.001ppm
一氧化碳	>0.995	<± 0.05ppm	<±0.5ppm	<± 2.5%	每小時數值 ≧75 % 每日數值 ≧ 87 %	0.1 ppm
碳氫化合物	>0.995	<± 0.05ppm	<±0.5ppm	<± 2.5%	每小時數值 ≧75 % 每日數值 ≧ 87 %	0.1 ppm

⑵噪音/振動監測

噪音/振動監測品保目標：

檢驗項目 / 指標值		精密度(相對差異百分比)	準確性分析		儀器偵測極限
			品管樣品	野外空白	
噪音	L_{eq}、L_{max} $L_{晚}$、$L_{日}$、$L_{夜}$、 $L_{x(5,10,50,90,95)}$	± 0.7 dB	± 0.7 dB	>90 % (每小時完整性百分比) ≧100 % (每日完整性百分比)	20 dB
振動	L_{veq}、L_{vmax} $L_{v日}$、$L_{v夜}$、 $L_{vx(5,10,50,90,95)}$	± 1.0 dB	± 1.0 dB	>90 % (每小時完整性百分比) ≧100 % (每日完整性百分比)	15 dB

⑶河川水質/廠區水質/地下水/海水水質監測

①水質分析品管要求：

序號	檢驗項目	檢量線製作	空白分析	重覆分析	查核樣品分析	添加標準品分析
1	水溫	-	-	-	-	-
2	pH	-	-	○	-	-
3	導電度、鹽度	-	-	○	-	-
4	溶氧量	-	-	○	-	-
5	大腸桿菌群	-	○	○	-	-
6	懸浮固體	-	○	○	-	-
7	氯鹽、硫酸鹽	○	○	○	○	○
8	生化需氧量	-	○	○	○	-
9	化學需氧量	-	○	○	○	-
10	硝酸鹽、亞硝酸鹽	○	○	○	○	○
11	總有機碳	○	○	○	○	○
12	氨氮	○	○	○	○	○
13	油脂	-	○	-	-	-
14	鋅、鎘、鉻、鉛、銅、鎳、鐵、鎂、錳	○	○	○	○	○
15	砷	○	○	○	○	○
16	汞	○	○	○	○	○
17	餘氯	○	○	○	○	-
18	真色色度	○	○	○	○	-
19	濁度	-	○	○	○	-
20	總磷、正磷酸鹽	○	○	○	○	○
21	硫化物	○	○	○	○	○
22	總硬度	-	○	○	○	○

註：查核樣品須使用外購之ＱＣ樣品或自行配製。

品管頻率及管制範圍說明如下：

①檢量線製作：每批次樣品應重新製作檢量線，並求其相關係數 r 值。

②空白分析：每 10 個樣品做 1 空白分析。

③重覆分析：每 10 個樣品做 1 個重覆分析，並求其差異百分比。

④查核樣品分析：每 10 個樣品做 1 個查核樣品分析，並求其回收率。

⑤添加標準品分析：每 10 個樣品做 1 個添加標準品於樣品之分析，並求其回收率。

②水質分析品保目標：

海水水質部份：

序號	檢驗項目	檢 驗 方 法	單 位	偵測極限	重覆樣品差異百分比(±%)	查核樣品分析回收率(%)	添加樣品分析回收率(%)
1	pH	NIEA W424.52A	—	—	—	—	—
2	水溫	NIEA W217.51A	℃	—	—	—	—
3	導電度	NIEA W203.51B	μmho/cm	—	—	—	—
4	餘氯	NIEA W408.51A	mg/L	—	—	—	—
5	溶氧量	NIEA W455.52C	mg/L	—	—	—	—
6	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	CFU/100mL	<10	—	—	—
7	濁度	NIEA W219.52C	NTU	<0.05	0~25	85~115	—
8	生化需氧量	NIEA W510.55B	mg/L	<1.0	0~15	±30.5mg/L	—
9	懸浮固體	NIEA W210.57A	mg/L	<1.0	0~20	—	—
10	總磷	NIEA W427.53B	mg/L	0.002	0~15	85~115	80~120
11	油脂	NIEA W506.21B	mg/L	<1.0	—	—	—
12	鉛	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	mg/L	0.0004	0~20	80~120	80~120
13	鎘	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	mg/L	0.0002	0~20	80~120	80~120
14	鉻	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	mg/L	<0.0050	0~20	80~120	75~125
15	銅	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	mg/L	0.0004	0~20	80~120	80~120
16	鋅	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	mg/L	0.0014	0~20	80~120	80~120
17	鎳	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	mg/L	0.0004	0~20	80~120	80~120
18	鎂	NIEA W311.52C	mg/L	0.313	0~20	80~120	80~120
19	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0004	0~20	80~120	75~125

註：因 NIEA W306.52A 不適用於高鹽度水樣之直接測定，故需先以 NIEA W308.22B 做前處理降低鹽度後，再以 NIEA W311.52C 測定，檢測項目有鉛、鎘、銅、鋅及鎳。

河川水質部份：

序號	檢驗項目	檢驗方法	單位	偵測極限	樣重覆分析差異百分比(±%)	查核樣品分析回收率(%)	樣品添加分析回收率(%)
1	pH	NIEA W424.52A	—	—	—	—	—
2	導電度	NIEA W203.51B	μmho/cm	—	—	—	—
3	鹽度	NIEA W447.20C	psu	—	—	—	—
4	溶氧量	NIEA W455.52C	mg/L	—	—	—	—
5	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	CFU/100mL	<10	—	—	—
6	濁度	NIEA W219.52C	NTU	<0.05	0~25	85~115	—
7	生化需氧量	NIEA W510.55B	mg/L	<1.0	0~15	±30.5mg/L	—
8	懸浮固體	NIEA W210.57A	mg/L	<1.0	0~20	—	—
9	硝酸鹽氮	NIEA W436.50C	mg/L	0.01	0~10	85~115	85~115
10	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	mg/L	0.006	0~15	85~115	80~120
11	總磷	NIEA W427.53B	mg/L	0.002	0~15	85~115	80~120
12	化學需氧量	NIEA W517.52B	mg/L	2.9	0~20	85~115	—
13	油脂	NIEA W506.21B	mg/L	<1.0	—	—	—
14	氨氮	NIEA W437.51C	mg/L	0.01	0~15	85~115	85~115
15	鎘	NIEA W311.52C	mg/L	0.001	0~20	80~120	80~120
16	鉻	NIEA W311.52C	mg/L	0.004	0~20	80~120	80~120
17	銅	NIEA W311.52C	mg/L	0.003	0~20	80~120	80~120
18	鋅	NIEA W311.52C	mg/L	0.015	0~20	80~120	80~120
19	鐵	NIEA W311.52C	mg/L	0.017	0~20	80~120	80~120
20	鎳	NIEA W311.52C	mg/L	0.005	0~20	80~120	80~120
21	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0002	0~20	80~120	75~125

地下水部份：

序號	檢驗項目	檢 驗 方 法	單 位	偵測極限	樣重覆分析差異百分比(±%)	查核樣品分析回收率(%)	樣品添加分析回收率(%)
1	pH	NIEA W424.52A	—	—	—	—	—
2	水溫	NIEA W217.51A	℃	—	—	—	—
3	導電度	NIEA W203.51B	μmho/cm	—	—	—	—
4	濁度	NIEA W219.52C	NTU	<0.05	0~25	85~115	—
5	生化需氧量	NIEA W510.55B	mg/L	<1.0	0~15	±30.5mg/L	—
6	懸浮固體	NIEA W210.57A	mg/L	<1.0	0~20	—	—
7	氯鹽	NIEA W415.52B	mg/L	0.04	0~20	85~115	80~120
8	硫酸鹽	NIEA W415.52B	mg/L	0.04	0~20	85~115	80~120
9	化學需氧量	NIEA W515.54A	mg/L	1.9	0~20	85~115	—
10	氨氮	NIEA W437.51C	mg/L	0.01	0~15	85~115	85~115
11	總硬度	NIEA W208.51A	mg/L	1.6	0~15	85~115	80~120
12	硫化物	NIEA W433.51A	mg/L	0.01	0~20	80~120	75~125
13	總有機碳	NIEA W532.52C	mg/L	0.1	0~15	85~115	75~125
14	鐵	NIEA W311.52C	mg/L	0.017	0~20	80~120	80~120
15	錳	NIEA W311.52C	mg/L	0.002	0~20	80~120	80~120
16	鉛	NIEA W311.52C	mg/L	0.004	0~20	80~120	80~120
17	鎘	NIEA W311.52C	mg/L	0.001	0~20	80~120	80~120
18	鉻	NIEA W311.52C	mg/L	0.003	0~20	80~120	80~120
19	銅	NIEA W311.52C	mg/L	0.004	0~20	80~120	80~120
20	鋅	NIEA W311.52C	mg/L	0.010	0~20	80~120	80~120
21	鎳	NIEA W311.52C	mg/L	0.004	0~20	80~120	80~120
22	砷	NIEA W434.53B	mg/L	0.0004	0~15	85~115	80~120
23	汞	NIEA W330.52A	mg/L	0.0002	0~20	80~120	75~125

廠區水質部份：

序號	檢驗項目	檢 驗 方 法	單 位	偵測極限	樣重覆分析差異百分比(±%)	查核樣品分析回收率(%)	樣品添加分析回收率(%)
1	pH	NIEA W424.52A	—	—	—	—	—
2	導電度	NIEA W203.51B	μmho/cm	—	—	—	—
3	真色色度	NIEA W223.52B	—	<25	0~20	80~120	—
4	生化需氧量	NIEA W510.55B	mg/L	<1.0	0~15	±30.5mg/L	—
5	懸浮固體	NIEA W210.57A	mg/L	<1.0	0~20	—	—
6	化學需氧量	NIEA W517.52B	mg/L	2.9	0~20	85~115	—
7	油脂	NIEA W506.21B	mg/L	<1.0	—	—	—
8	氨氮	NIEA W437.51C	mg/L	0.01	0~15	85~115	85~115
9	水量	NIEA W022.51C/ NIEA W020.51C	m^3/sec	—	—	—	—

(4)海域生態監測

①水樣之接收

採樣人員除立即分析部份必需現場分析之項目後，樣品應立即冷藏，並送回實驗室交由樣品管理員點收。樣品管理員應檢視樣品標識是否清楚，是否依規定保存及密封，所使用之容器是否正確等加以詳實記錄。如樣品之收集方式均符合規定，樣品管理員即予以簽收，同時記載簽收日期及時間，並請送樣員簽名以示負責。如部份樣品之採集方式未依規定進行，應請採樣小組重行採樣，如重行採樣有所困難則應於備註欄加以說明，並立即呈報實驗室主管進行補救措施。完成上述工作後，樣品管理員立即通知各項目之檢驗人員進行檢驗。檢驗人員進行檢驗時均應記錄分析之時間，所使用之體積、樣品編號及分析項目等資料，以便作為日後品保追蹤上之依據。

②水樣之保存與銷毀

當樣品接受與登錄工作完成後，樣品管理員則按樣品性質及檢驗項目的不同，分別保存。樣品經分析後保存 2 個月後銷毀，並將資料登錄於銷毀記錄表中。

③浮游植物

項　　目	說　　明
取樣方式	依 0,3,底層分層採樣(採樣深度係依照水質調查深度)
標本處理方式	以 1%中性福馬林溶液或 Lugol's 溶液保存
鑑定標準	依分類圖鑑所訂分類標準表
資料管制方式說明： 1.所有資料依分類表排列，可儘量避免人為錯誤發生。 2.所有資料單項分別計算後，並就總計資料加以核對，以防單項資料過多，而有漏列或漏計發生。 3.就主要單項種類所佔比例及出現量的值，加以核對是否符合常態數值，若有非常態數值現象出現，則追查原始資料是否有記錄錯誤，或數值筆誤，或單項數值植入錯誤等人為錯誤發生，若有則加以更正。 4.所有上述驗証皆經 2 人的查驗結果。	

④浮游動物

項　　目	說　　明
取樣方式	水平及垂直採集
標本處理方式	以 5%中性福馬林溶液保存
鑑定標準	依 CSK(Current Study on Kuroshio)分類標準表
資料管制方式說明： 1.所有資料依 CSK 分類表排列，可儘量避免人為錯誤發生。 2.所有資料單項分別計算後，並就總計資料加以核對，以防單項資料過多，而有漏列或漏計發生。 3.就主要單項種類所佔比例及出現量的值，加以核對是否符合常態數值，若有非常態數值現象出現，則追查原始資料是否有記錄錯誤，或數值筆誤，或單項數值植入錯誤等人為錯誤發生，若有則加以更正。 4.所有上述驗証皆經 2 人的查驗結果。	

⑤魚卵及仔稚魚

項　　目	說　　明
取樣方式	以 Norpac 網或仔稚魚網具表層水平採集
標本處理方式	5%中性福馬林溶液保存
鑑定標準	依仔稚魚分類圖鑑所訂分類標準表
資料管制方式說明： A.各次分類種類均依同一鑑定標準，及相同之鑑定圖鑑，重要種類必要時並加以照相，所有標本並予留存。 B.依單一種類數值的出現情形，是否為常態數值，若非常態則再行檢驗原始登錄資料是否有誤或誤列情形，以減少人為錯誤。 C.所有資料報表，均經過 2 次核對驗証。	

⑥底棲生物

項　　目	說　　明
取樣方式	潮間帶測站利用 0.5m×0.5m 之方框採樣；海域測站則利用矩形拖曳式底棲生物採樣器(規格為 45cm 長×18cm 高)採樣
標本處理方式	5%中性福馬林溶液保存
鑑定標準	依分類圖鑑所訂分類標準表
資料管制方式說明： 1.各次分類種類均依同一鑑定標準，及相同之鑑定圖鑑，重要種類並加以照相，所有標本並予留存。 2.所有資料依分類表排列，避免人為誤植錯誤發生。 3.依單一種類數值的出現情形，是否為常態數值，若非常態則再行檢驗原始登錄資料是否有誤或誤列情形，以減少人為錯誤。 4.所有資料報表，均經過 2 次核對驗証。	

3.儀器維修校正項目及頻率

各類監測所使用主要儀器設備之維修校正項目及頻率說明如下：

(1)空氣品質監測

儀器名稱	校正項目	校正頻率	校正方式	校正執行單位
氣體校正儀	流量追溯校正查驗 臭氧濃度校正查驗	每年1次	外部定期校正或內部定期校正	儀器商或新紀工程顧問股份有限公司
氮氧化物分析儀 二氧化硫分析儀 一氧化碳分析儀 臭氧分析儀 碳氫化合物分析儀	零點及全幅單點查驗(Zero-Span)	每工作批次採樣前	內部例行校正	新紀工程顧問股份有限公司
	檢量線中點濃度查核	每工作批次之最初站及最末站採樣結束後	內部例行校正	新紀工程顧問股份有限公司
	檢量線製作(多點校正)	每6個月1次	內部定期校正	新紀工程顧問股份有限公司
	流量校正查驗	每6個月1次	內部定期校正	新紀工程顧問股份有限公司
氮氧化物分析儀	GPT轉換效率校驗	每6個月1次	內部定期校正	新紀工程顧問股份有限公司
高量採樣器	流量單點校正查驗	每次採樣前、後	內部例行校正	新紀工程顧問股份有限公司
	流量多點校正	每3個月1次	內部定期校正	新紀工程顧問股份有限公司
小孔流量校正器	流量追溯校正	每年1次	委託外部定期校正	環保署南區品保中心或流量校正實驗室
風速風向計	風速風向計比對校正	每6個月1次	內部定期校正	新紀工程顧問股份有限公司
	風洞測試追溯校正	每2年1次	委託外部定期校正	中央氣象局氣象儀器檢校中心
溫溼度感應器	溫溼度感應器比對校正	每6個月1次	內部定期校正	新紀工程顧問股份有限公司
	比較校正法追溯校正	每2年1次	委託外部定期校正	中央氣象局氣象儀器檢校中心
計時器	查對	每年	24 小時誤差不得超過 2min	新紀工程顧問股份有限公司

(2)噪音/振動監測

儀器名稱	校正項目	校正頻率	校正方式	校正執行單位
噪音計	1000Hz音壓校正(儀器內部電子校正)	每工作批次前、後	內部例行校正	新紀工程顧問股份有限公司
	1000Hz音壓校正(儀器外部校正)	每工作批次前、後	內部例行校正	新紀工程顧問股份有限公司
	噪音計檢定(度量衡儀器型式認證)	每2年1次(委託外部檢定)	委託外部定期檢定	經濟部標準檢驗局
聲音校正器(含活塞式聲音校正器及電子式聲音校正器)	1000Hz，聲音校正器比對校正	每6個月1次	內部定期校正	新紀工程顧問股份有限公司
	1000Hz，94dB(A權衡)追溯校正	每年1次	委託外部定期校正	臺灣電子檢驗中心
振動計	振動計內部31.5Hz正弦波發振器電訊查校	每工作批次前、後	內部例行校正	新紀工程顧問股份有限公司
	振動計外部振源校正	每工作批次前、後	內部例行校正	新紀工程顧問股份有限公司
	振動計追溯校正	每2年1次	委託外部定期校正	工研院量測中心
振動校正器	6.3Hz，97dB追溯校正	每年1次	委託外部定期校正	工研院量測中心

(3)河川水質/廠區水質/地下水/海水水質監測

儀器/設備	校正項目	頻　率	校　正　動　作
pH計	校正：準確度	每三個月	溫度探棒進行校正(同工作溫度計之校正方式)
		使用前後	先以第一種標準緩衝溶液 pH7 校正，再以第二種標準緩衝溶液 pH4 或 10 校正其斜率。使用後以涵蓋兩種標準緩衝液範圍內測定偏移，零點電位與斜率需落在允收標準。
	維護：清潔	使用前後	清洗玻璃電極
溶氧計	校正：準確度	使用前	單點檢查
	校正：準確度		電極檢查
	確認：大氣壓力值		與標準大氣壓力計比對
	校正：飽和溶氧值		使用飽和水蒸氣空氣進行滿點校正
	確認：零溶氧值	每月	以零溶氧溶液進行零點校正/確認
	確認：準確度		以碘定量法測定溶氧之飽和曝氣水確認
	確認：溫度	每三個月	與標準溫度計比對
導電度計	校正：準確度	使用前	單點檢查(以 0.01N KCl 校正)
		每年	溫度探棒進行校正(同工作溫度計之校正方式)
		每年	全刻度檢查(0.1、0.01、0.001N)
	維護：清潔	使用前後	清洗電極
餘氯計	校正：準確度	使用前	2 種不同濃度市售標準溶液
		每年	與實驗室分光光度計進行比對

⑶河川水質/廠區水質/地下水/海水水質監測(續)

儀器設備	校正項目	頻　率	校　正　動　作
精密型天平	校正：準確度	每次稱量前	零點檢查(Zero check)
		每月	刻度校正(One point check)
		每半年	重複性校正(Repeatability check)
		每年	委由校正暨量測實驗室執行重複性與線性量測校正
	維護：乾燥、清潔、水平	每日	水平度，稱盤清理
		每月	稱盤內部清理
原子吸收光譜儀	校正：穩定度	使用前	以 As 或 Hg 元素之檢量線中點確認其訊號值
		每季	儀器以 5ppm Cu 標準溶液確認其吸光值
感應耦合電漿原子發射光譜儀	校正：穩定度	使用前	波長校正
			依各該廠牌建議之 Tuning solution 調校
			以濃度 10ppm Cu 及 Pb 標準溶液確認其訊號強度比值
分光光度計	校正：準確度、穩定度、再現性	使用前	檢量線製備(參考標準品)
		每三個月	波長準確度、吸光度、線性(Linearity)、迷光(Stray light)、樣品吸光槽配對(Matching of cells)之校正
		每年	請儀器廠商執行外部校正
	維護：清潔	使用前	清理槽內積垢
濁度計	校正：準確度	使用前	以標準品進行單點檢查
		每年	Formazin 標準品全刻度校正
無菌台	落菌量測試	每季	在 35±1℃下培養 48 小時，正常狀態下無任何菌落生長
	維護：清潔	每 400hrs	更換預濾網
		每 4000hrs	更換 HEPA 濾網

⑷海域生態監測

①環境因子

儀　　器	項　目	頻　　率
溶氧儀	零點校正	使用前，每季 1 次
酸鹼儀	零點校正	使用前
分析天平	零點校正	使用前，每月 1 次
其他儀器：包括水溫計、CTD 溫鹽儀、分光光譜儀等	零點校正	使用前

②生物因子

A.採樣網具的檢修：

a.使用前：均需先行檢視網身及採收器等有否破損，若有，則需予以適當修補或更換。檢視正常後，將網具裝入適當之袋中，以

備運送。

b.使用後：使用之網具，於每次出海採樣使用後，清洗乾淨並陰乾後裝袋收藏，以防網具被蟲鼠損壞或不慎鉤破。

B.流量計檢修：

a.使用前：先以目視檢視流量計外部是否受擠壓、破損等，若正常，則再予以手動方式，測試流量計轉輪等內部功能是否能正常運轉及記錄轉數，若有疑問，則須立即更換。

b.使用後：返回實驗室後，須再予以泡入淡水清洗之，再如同上述之檢視方法，予以進行外部及功能檢查。

4.監測項目之檢測方法

(1)空氣品質監測

依據行政院環保署環境檢驗所公告之周界測定法則中,公告空氣中粒狀污染物測定法-高量採樣法 95 年 11 月 1 日環署檢字第 0950086772 號、空氣中氮氧化物 96 年 4 月 3 日環署檢字第 0960023890A 號、空氣中一氧化碳 95 年 5 月 11 日環署檢字第 0950037771 號及非甲烷碳氫化合物-火焰游離偵測法。各空氣品質監測項目之監測方法與使用儀器說明如下：

監測項目		監測之方法與使用之監測儀器	儀器偵測極限
1.總懸浮微粒(TSP)		高量採樣法(NIEA A102.12A)； 高量採樣器	0.25 μg/m^3
2.氮氧化物(NOx)		氮氧化物分析儀自動檢驗法(NOx ANALYZER/NIEA A417.11C「化學發光法」)；氮氧化物分析儀	0.001ppm
3.非甲烷碳氫化合物(NMHC)		「火焰游離偵測法」，碳氫化合物分析儀	0.1ppm
4.一氧化碳(CO)		一氧化碳分析儀自動檢驗法（CO ANALYZER/NIEA A421.11C「紅外光吸收光譜法」）；一氧化碳分析儀	0.1ppm
5.氣象	風速、風向	風速風向計；YOUNG Model 05103	-
	溫度、濕度	溫溼度計；ROTRONIC MP 101A	-

⑵噪音/振動監測

噪音與振動之監測使用儀器及方法說明如下：

監測項目	監 測 方 法	使 用 設 備
噪音	環境噪音測量方法(NIEA P201.94C)	噪音計 (RION NL-18、NL-31、NL-32)
振動	環境振動測量方法(NIEA P204.90C)	振動計 (RION VM-52A、VM-53A)

⑶交通流量監測

主要參考「交通量工程師手冊」、「2011 年台灣地區公路容量手冊」之方法及準則進行交通運輸之相關各項監測工作。

①交通量：針於選定各道路之監測點以「電子攝影記錄方式」或「以人工現場計數方式」對監測道路，進行連續 24 小時（00：00~24：00）之交通量監測。有關以電子攝影記錄之交通量監測方式，將配合人工觀看記錄之錄影帶方式統計各監測路段來向、去向之各小時的車種（機車、小型車、大型車、特種車）及其數量。

②道路服務水準：參考交通部運輸研究所之「2011 年台灣地區公路容量手冊」，計算不同類型之道路水準劃分。

⑷河川水質/廠區水質/地下水/海水水質監測

河川水質/廠區水質/地下水/海水水質檢測使用主要儀器設備及各監測項目分析方法說明如下：

①檢測使用之主要儀器設備

序號	分析項目	檢測主要儀器設備
1	水溫	攜帶式電子溫度計
2	pH	攜帶式電子 pH 計
3	導電度、鹽度	攜帶式電子導電度計/攜帶式電子鹽度計
4	溶氧量	攜帶式電子溶氧計
5	大腸桿菌群	高壓滅菌釜、恆溫培養箱
6	懸浮固體	過濾裝置、乾燥箱
7	氯鹽、硫酸鹽	離子層析儀
8	生化需氧量	恆溫培養箱、溶氧測定裝置
9	化學需氧量	迴流、加熱裝置
10	硝酸鹽、亞硝酸鹽	水浴鍋、分光光度計（UV：GBC 911）
11	總有機碳	總有機碳測定儀
12	氨氮	消化加溫器、蒸餾加熱裝置、分光光度計 （UV：GBC 911）
13	油脂	索氏萃取裝置、水浴鍋
14	鋅、鎘、鉻、鉛、銅、鎳、鐵、鎂、錳	萃取裝置設備、原子吸收光譜儀（AA：PE 2380） / 感應耦合電漿原子發射光譜儀（ICP：JY 50P）
15	砷	原子吸收光譜儀附砷測定裝置 （AA：PE 2380 / MHS-10）
16	汞	原子吸收光譜儀附汞測定裝置 （AA：PE 2380 / MHS-10）
17	餘氯	攜帶式分光光度計
18	真色色度	分光光度計（UV：GBC 911）
19	濁度	濁度計
20	總磷、正磷酸鹽	分光光度計
21	硫化物	分光光度計
22	總硬度	自動滴定管校

②水質分析方法

分析方法主要依據行政院環保署所公告之方法，各監測項目之方法說明詳前第 2 點水質分析品保目標表中之分析方法。

⑸海域生態監測

①環境因子

分析項目	檢 測 方 法	方法偵測極限	儀器偵測極限	重複分析(%)	添加回收率(%)
亞硝酸鹽	NIEA W436.50C	0.42 μg/L	-	1.49	
硝酸鹽	NIEA W436.50C	0.7 μg/L	-	1.68	
總氮	NIEA W423.52C	0.01mg/L	-	4.71	106.5
總磷	NIEA W444.51C	0.007mg/L	-	2.06	100.1

A.硝酸鹽與亞硝酸鹽（NIEA W436.50C）

水樣中之硝酸鹽氮（NO_3^-N）流經已銅化之顆粒狀鎘金屬管柱（Copperized cadmium granules column），被定量地還原成亞硝酸鹽氮（NO_2^-N），此亞硝酸鹽氮加上原水樣中之亞硝酸鹽氮，其總量被磺胺（Sulfanilamide）偶氮化後，接著和 N-1-萘基乙烯二氨二鹽酸鹽（N-(1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride, NED）偶合形成水溶性紫紅色之染料(dye)化合物，此紫紅色物質於 540nm 波長量測其波峰吸收值並定量水樣中硝酸鹽氮加亞硝酸鹽氮濃度之總量。硝酸鹽氮加亞硝酸鹽氮濃度之總和亦稱之為總氧化氮（Total oxidized nitrogen, TON）。

若移除流動注入分析（Flow injection analysis, FIA）設備組裝架構中之顆粒狀鎘金屬管柱則可單獨分析亞硝酸鹽氮之濃度，所以總氧化氮（TON）與亞硝酸鹽氮之濃度可於同一組水樣中檢測得知。在此種 FIA 設備組裝架構下，總氧化氮濃度扣除亞硝酸鹽氮濃度可得水樣中之硝酸鹽氮濃度。

B.磷酸鹽（NIEA W443.51C）

水樣中正磷酸鹽與鉬酸銨（Ammonium molybdate）和酒石酸銻鉀（Antimony potassium tartrate）在酸性條件下反應成錯合物，接著此錯合物被維生素丙溶液（Ascorbic acid solution）還原為另

1 個藍色高吸光度之產物，藉由量測 880 nm 波峰之吸光值，以定量水樣中正磷酸鹽之含量。

C.矽酸鹽（NIEA W450.50B）

水樣經過濾後，矽酸鹽於酸性溶液下與鉬酸鹽反應生成黃色之矽鉬黃雜多酸（Heteropoly acid），以分光光度計於 410 nm 波長處測其吸光度而定量水中矽酸鹽濃度。若水樣中矽酸鹽含量較低，可加入還原試劑 1-胺基-2 萘酚-4 磺酸將黃色之矽鉬黃雜多酸還原成感度較佳之藍色矽鉬藍雜多酸（Heteropoly blue），以分光光度計於 815nm 或 650nm 波長處測其吸光度而定量水中矽酸鹽濃度。本方法所檢測之矽酸鹽的濃度皆以二氧化矽（SiO_2）表示之。

D.總磷（NIEA W444.51C）

水樣中之多磷酸鹽（Polyphosphate）及有機磷分別經硫酸及過氧焦硫酸鉀消化後皆被轉化成正磷酸鹽。將手動消化之消化液導入流動注入分析（Flow injection analysis, FIA）系統中，正磷酸鹽與鉬酸銨（Ammonium molybdate）和酒石酸銻鉀（Antimony potassium tartrate）在酸性條件下反應成錯合物。接著此錯合物被維生素丙溶液（Ascorbic acid solution）還原為另一個藍色高吸光度物質，於 880 nm 波長量測其波峰吸光值並定量水樣中之磷化物含量。

E.總氮（NIEA W423.52C）

水中總氮為硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、凱氏氮（凱氏氮為氨氮與總有機氮之和）之總和，因此下列 3 種檢測分析結果之總和即為水中總氮含量：硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮以水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮之鎘還原流動注入分析法（NIEA W436.50C）分析，凱氏氮以凱氏氮之消化與流動注入分析法－類靛酚法（NIEA W438.50C）分析。

F.葉綠素 *a*（NIEA E509.01C）

水樣經玻璃纖維濾紙過濾後，於 90%丙酮中以組織研磨器研磨萃取其中之葉綠素 *a*，再以藍光光源的螢光儀測得螢光值，最後依螢光值計算水樣中葉綠素 *a* 含量。

②生物因子

A.基礎生產力

利用 Niskin 採水瓶採集不同深度的海水（0m,3m,底層），裝入 1000mL 的塑膠瓶內，置放於裝有冷媒或冰塊之冰箱內冰藏，再攜回實驗室進行測定，以 C_{14} 為標定測定法或溶氧量測定法分析之。

B.植物性浮游生物（NIEA E505.50C）

潮間帶各測站係利用採水桶採集表層海水，海域測站則利用 Niskin 採水瓶採集不同深度（0m,3m,底層）的海水，裝入 1000mL 的塑膠瓶內，以 Lugol's solution 或 1%福馬林溶液下固定後攜回實驗室處理。在實驗室中，將水樣以 0.45μm 的薄膜過濾後，置於高倍光學顯微鏡下觀察，鑑定種類組成及計量細胞數，再換算成每 1 公升海水內的浮游植物細胞密度。

C.動物性浮游生物（NIEA E701.20C）

利用聯合國教科文組織（UNESCO）所定之北太平洋標準浮游生物網（NORPAC net,網目為 0.33mm×0.33mm,網身長 180cm,網口徑為 45cm），並於網口附流量計（Hydro-Bios,Model 438 110）測定並記錄轉數，並據以計算所過濾之水量，於網底掛上重錘後，將網下放至海底上面約 3 公尺處，再往上慢速拉升至水面之採樣方式採集動物性浮游生物標本。

D.大型藻類

a.潮間帶海藻相調查

選擇大潮期間的最低潮位為起始點，向高潮位方向設置 4 條垂直之採樣穿越線，每間隔 10m。如遇測量地點凹凸不平，則平行向兩側延伸至適當位置，視現場地形而定。記錄每條穿越線沿線內之所有海藻種類，覆蓋率之估算以覆蓋百分比（%）表示。

b.亞潮帶海藻相調查

以水肺潛水進行調查，並以 10 公尺長的皮尺為取樣工具，在岩礁區平行等深線設置取樣橫截線，記錄橫截線上各種海藻及其覆蓋的比例，每一個地點重複取樣 4 次，以得到不同海藻的平均覆蓋率。覆蓋率之估算以覆蓋百分比（%）表示。

E.底棲無脊椎動物

a.岩礁環境之潮間帶：

選擇大潮期間的最低潮位為起始點，向高潮位方向設置 1 條橫截線（transect），每間隔 10m 以 50 公分×50 公分之鐵框採樣隨機選取 2 個樣品，計數樣區內之物種及其個體數。

b.亞潮帶：

依據底質而區分為沙底及岩礁兩種環境，分別採用不同採樣調查方式。在沙底質環境採用矩形底棲生物採樣器(Naturalist's anchor dredge，採樣器規格為 45 cm 長×18 cm 高，收集網網目 5 mm，以船尾拖網方式採樣。採樣器收集網外層並另行加裝一層帆布套，以防止收集網鉤住海底雜物或礁石而破損)。採樣深度分別為 5m 及 10m，各採樣 2 次。拖曳時船速保持約 1 浬/小時，每次拖曳時間為 10 分鐘（NIEA E103.20C）。岩礁環境採用水肺潛水方式調查，調查地點為大礁南方及淺礁南方，深度為 5 m 及 10m，每站分別取樣 4 條橫截線，以直接

計數或拍照紀錄橫截線內所出現之物種、數量及其覆蓋度。必要時，採集部份標本，進行種類鑑定（NIEA E104.20C）。

F.珊瑚（NIEA E104.20C）

調查區域位於大礁和淺礁南側，其中大礁南側位於核四廠進水口預定地前方；淺礁南側則位於排水口預定地附近。調查方法係使用 10m 長的橫截線為取樣工具，於 2 地點各隨機取樣 4 次。直接記錄橫截線上的珊瑚種類、數量及其覆蓋度。必要時，採集部份標本，進行種類鑑定。

G.魚類

a.仔稚魚及魚卵

利用附有流量計之浮游生物採集網或稚魚網於船尾，以水平方式拖網，或於船側以垂直方式採集表層之魚卵及仔稚魚標本。每一測站至少各拖曳 5~10 分鐘，所採集之標本均置於 5% 中性福馬林溶液中保存。於實驗室中，以肉眼或在立體解剖顯微鏡下。取出標本進行定性種類組成分析，並經過濾水量之換算後，進行定量密度分析。

b.成魚（NIEA E102.20C）

依規定之調查方式，以具有魚類專業之人員，以水肺潛水目視調查方式，進行澳底及鹽寮礁石區的魚類調查（NIEA E102.20C）。調查時均採同一組人員，依循同一路徑進行目視觀察，觀察及記錄依據標準是於自身左右各 5 公尺範圍內出現的魚類方被記錄。目視調查的同時，並輔以水下攝影方式，進行影像拍攝，作為必要之比對。

5.數據處理原則

(1)空氣品質監測之有效數據處理原則：

①粒狀污染物

採樣時間之誤差小於 13%，即將該日視為有效數據，計算方式如下：

$$113\% \geqq \text{完整性百分比} = \frac{|\text{採樣時間}|}{24\text{小時}} \geqq 87\%$$

②氣狀污染物

本檢驗室之空氣品質檢測進行過程中，由於現場監測時因供電系統不良或其他因素造成檢測數據異常（此一異常數據由稽核方式處理後予以捨棄），其可信數據於一小時內足 45 分鐘時，即為可使用之數據，每日數據完整性之百分比超過 87%時，則該日數據即為可使用數據，計算方式如下：

A.小時數據

$$\text{完整性百分比} = \frac{60\text{分鐘} - (\text{校正時間} + \text{停機時間} + \text{稽核捨棄時間})}{60\text{分鐘}} \geqq 75\%$$

B.每 1 日之數據

$$\text{完整性百分比} = \frac{24\text{小時} - \text{不完整之小時數}}{24\text{小時}} \geqq 87\%$$

上述為依據環保署空氣品質監測網之品質保證作業之品保作業規範為最低品保要求限值訂正之，且此品保規範經環檢所認可後實施，惟本季各監測項目之測值均可達有效數據達 100%，符合品保作業規範要求限值。

⑵噪音及振動之分析測值處理原則：

本監測計畫之量測方法，係依據環保署公告之相關檢驗方法與驗算式來進行量測及數據後處理分析計算。

監測結果須經由「噪音振動資料處理工具程式軟體」進行數據資料處理後，轉存入記憶卡或磁片中，連同現場監測記錄送達檢驗室樣品管理員。

噪音及振動之監測取樣時距均為 1 秒，每小時監測數據為 3,600 組，每小時完整性百分比需大於 90%，才能視為有效數據，每日數據完整性百分比須為 100%。

⑶水質之分析測值處理原則：

①樣品分析值為偵測極限 3 倍以下時，分析結果均僅以 1 位有效數字報告，其餘數據按有效數字之認定原則規定處理。

②有效數字處理原則：

A.有效數字乃由正確數字後加 1 位未確定數所組成。

B.有效數字相乘除之結果其有效數字以位數少的為準（倍數除外）。

C.有效數字相加減後其有效位數以正確數字加 1 位估計值為準。

D.經由吸光度換算的濃度，其有效位數以吸光度之有效位數為準。

E.分析結果若經由檢量線換算得知者，小於檢量線最低點時（不含零點），以小於最低點之濃度表示，若無吸光度則以 ND 表示，並註明其實驗室之方法偵測極限值。

表 1.1-1 核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表

工程名稱		預定進度(%)			實際執行進度(%)			施工概況
		4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
核反應器廠房	1 號機	100	100	100	99.96	99.96	99.96	結構面積長約 60m，寬約 57m，廠房結構主要可分為 7 個樓板。(地下 3 層，地上 4 層)。 核島區廠房結構工程施工。 1 號機 (1) 結構工程竣工。 2 號機 (1) 門窗及其餘建築收尾施作。 (2) 不銹鋼門施作。 (3) 油漆施作。 (4) 維修平台修改。 核島區機械安裝工程施工。 1 號機 (1) 配合現場臨時修改、O&M 修改及配合電廠相關測試作業。 2 號機 (1) RPV 本體保溫作業。 (2) Scram Piping Support 修改作業。 (3) EDG B Fuel Oil 系統管路沖洗。 (4) C12 SMP 補強作業。 (5) N22 PWRT 銲接作業。 (6) 回覆之 UFCR、FDDR 管路及 Support 銲接作業。 核島區管路安裝工程施工。 1 號機 (1) 配合核島區廠房結構施工進度進行 Dry Run，O&M 問題管架安裝修改，管路水壓試驗。 2 號機 (1) 配合核島區廠房結構施工進度進行現場施工。目前進行 EL.-8200、-1700、4800、8500、12300 、18150、23500 、31700 P24/P21/E11/E22/E51/R51/K11 /G41/T22/T31/T49/G31 管路及管支撐定位作業。 核島區消防系統安裝工程施工。 1 號機 (1) 消防系統整合測試。 2 號機 (1) 電氣導線管施作。 核島區空調設備及風管安裝工程施工。 1 號機 (1) 風管測試調整平衡(TAB)測試工作。 2 號機 (1) 出風口安裝。 (2) 等待設備接電才可進行測試。 核反應廠房儀電安裝工程。 1 號機 (1) CRD 檢修、測試。 2 號機 (1) 品質計畫書、程序書文件進版。 (2) Conduit 及 Cable Tray 施工及巡檢工作。 (3) 儀器放樣安裝、盤體安裝。
	2 號機	100	100	100	97.51	97.54	97.58	

資料來源：台電公司龍門施工處。

註：1.表中各項工程為本季主體工程，其餘零星工程不予詳列。2.施工概況係統計至 101 年 6 月止。

表 1.1-1 核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表（續 1）

工程名稱		預定進度(%)			實際執行進度(%)			施 工 概 況
		4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
控制廠房	1 號機	100	100	100	99.97	99.97	99.97	控制廠房簡介: 結構面積約長 56.4m，寬 24.4m 廠房結構大致可分為 6 個樓板。(地下 4 層、地上 2 層)。 控制廠房目前情況： 核島區廠房結構工程施工。 1 號機 (1) 結構工程竣工。 2 號機 (1) 廠區各樓層環境清理。 (2) 石膏隔間及耐震輕鋼架天花板施作。 (3) 高架地板。 核島區管路安裝工程施工。 1 號機 (1) 配合核島區廠房結構施工進度進行現場配合 Dry Run，O &M 問題管架安裝修改，管路水壓試驗。 2 號機 (1) 配合核島區廠房結構施工進度進行現場施工。目前進行 EL. -8200、-1850、2900、7600、12300B/C 區、17150B/C 區 P21/P31/K11/P25 管路及管架安裝作業。 核島區消防系統安裝工程施工。 1 號機 (1) 竣工程序辦理中。 2 號機 (1) 電氣導線管施工。 核島區空調設備及風管安裝工程施工。 1 號機 (1) 風管測試調整平衡(TAB)測試工作。 2 號機 (1) 出風口安裝。 (2) 待設備接電後進行 PCT。 控制廠房儀電安裝工程。 1 號機 (1) DCIS 系統迴路查修。 2 號機 (1) 品質計畫書、程序書文件進版。 (2) Conduit 及 Cable Tray 施工及巡檢工作。 (3) 儀控設備安裝、拉接線。
	2 號機	100	100	100	97.33	97.42	97.44	
變壓器場	1 號機	100	100	100	100	100	100	主變壓器工程施工。 (1)輔助變壓器工程：完成 1 號機輔助變壓器安裝。 (2)161KV 級變壓器及中性點電阻器工程：2 號機 RAT 1~2(備用變壓器)及 ABT(輔助鍋爐變壓器)進行安裝中。
	2 號機	100	100	100	100	100	100	

資料來源：台電公司龍門施工處。

註：1.表中各項工程為本季主體工程，其餘零星工程不予詳列。2.施工概況係統計至 101 年 6 月止。

表 1.1-1 核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表（續 2）

工程名稱	預定進度(%)			實際執行進度(%)			施 工 概 況
	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
生水系統	100	100	100	99.99	99.99	99.99	12 萬噸生水系統及道路工程施工。 土建部分： (1) 土木工作已完成。 機械設備裝設部份： (1) 試車及操作人員訓練工作執行完成。 儀控設備裝設部份： (1) 第 2 分項契約變更已完成，進行竣工後工程結算及相關文件整理。 (2) 第 3 分項操作人員教育訓練已全部完成。 電氣設備裝設部份： (1) 現場工作已完成。
水處理系統	100	100	100	99.71	99.71	99.71	水處理系統安裝工程。 (1) 第 1 分項及第 2 分項工程已竣工。 (2) 第 3 分項：雜項收尾工程。 儀控設備安裝工程。 (1) 雜項收尾工程。
循環水系統	100	100	100	99.99	99.99	99.99	循環水抽水機房、電解加氯機房(ECB)及反應器廠房冷卻水(RBSW)抽水機房工程施工。 (1) 已施工完成。 循環水系統儀電安裝工程。 (1) 1 號機部份已完成。 (2) 2 號機進行 Raceway 施作。 (3) 2 號機儀控設備及 tubing 安裝。
環境保護及景觀裝置	97.75	98.12	98.31	90.09	90.09	90.09	污水處理廠工程施工。 (1) 竣工。 核四廠綠帶第 2 期工程。 (1) 變更設計規劃及購地作業。 整體廠區景觀工程。 (1) 放射性實驗室區整體景觀工程，現場施工完成並驗收完成，進入養護期。 (2) 1 號機電力區整體景觀工程第 1 分項已申報竣工，1.19 驗收合格後進行第 2 分項工程養護工作。 (3) 圖面審查及規劃。 (4) 綠化區養護工作。

資料來源：台電公司龍門施工處。

註：1.表中各項工程為本季主體工程，其餘零星工程不予詳列。 2.施工概況係統計至 101 年 6 月止。

表 1.1-1 核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表（續 3）

工程名稱	預定進度(%)			實際執行進度(%)			施 工 概 況
	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
雜項土木建築方面	99.75	99.79	99.83	99.84	99.90	99.91	核廢料隧道新建工程施工。 (1) 竣工。 廠房區電纜管道工程施工。 (1) 竣工。 電力場區貯槽基礎及管溝工程施工。 (1) 已竣工。 廠區永久性道路及排水系統工程。 (1) 已竣工。 冷修配廠等工程施工。 (1) 已報竣工。 廠內低幅射廢料貯存倉庫新建工程施工。 (1) 已竣工。 廠內低放射性廢料桶貯存庫機電設備安裝工程。 (1) 檢驗 ARM/PRM 電纜接續。 (2) CCTV Camera 維護保養。 (3) Video Radio 維護保養。 (4) DHC、CHC、PHC、單軌起重機維護保養。 (5) 移動式空氣壓縮機維護保養。 (6) 移動式電動噴射清洗機維護保養。 (7) 鉛屏蔽堆高機設備維護保養。 (8) 儀控盤體設備維護保養。 非核島區消防系統安裝工程施工。 (1) URS 建議缺失改善項目。 (2) 2 號機 UAT 消防管路 PCT 測試。 廠外管路安裝工程施工。 (1) 竣工文件準備。 其他各類型鐵槽建造工程施工。 (1) 1、2 號機除礦水槽、冷凝水槽，核安處驗收澄清。 (2) 生水儲槽、消防儲槽 A、B 座，核安處驗收澄清。 (3) 2 號機乾淨、髒潤滑油儲槽、集水槽辦理工期補償契約變更。
安全冷卻水系統	100	100	100	99.87	99.87	99.87	反應器廠房用抽水機房機械設備安裝工程。 (1) RB 抽水機房 1、2 號機固定攔污柵、耙污機、迴轉攔污柵已安裝完成。 (2) CW 抽水機房 1、2 號機 W13、P27 及 P28 系統之自清過濾器已安裝完成。 (3) RB&CW 抽水機房 1 號機設備已 PCT 完成。 (4) RB&CW 抽水機房 2 號機械設備尚未進行 PCT 測試。 抽水機房機空調設備及內管安裝工程。 (1) 完成安裝。 廠區電氣安裝工程。 (1) 2 號機電氣導線管施作。 儀控設備安裝工程。 (1) 2 號機儀控設備及 tubing 安裝。

資料來源：台電公司龍門施工處。 註：1.表中各項工程為本季主體工程，其餘零星工程不予詳列。 2.施工概況係統計至 101 年 6 月止。

表 1.1-1 核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表（續 4）

工程名稱	預定進度(%)			實際執行進度(%)			施 工 概 況
	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
核廢料廠房	100	100	100	99.97	99.97	99.97	機核廢料廠房新建工程施工。 (1) 廠房結構施作完成。 放射性廢料處理系統機械設備與管路安裝工程施工。 (1) 設備維護保養。 (2) 管閥維護保養。 (3) 配合電廠執行 K12、P31、P62 系統試運轉。 空調通風系統 (1) 工作已完成。 儀電設備安裝。 (1) 變更設計部份施工。 廠用電梯製造及安裝工程。 (1) 辦理竣工驗收工作。
模擬（訓練）中心及其他廠房	99.39	99.45	99.55	99.35	99.35	99.35	機組行政大樓工程 (1) 已竣工。 空調通風系統。 (1) 第 1 分項(1 號機)及第 3 分項(消防水泵房)，待第 1 次契約變更單價調整完成辦理竣工驗收金額結算資料彙整。 (2) 第 2 分項(2 號機)，施工器材型錄進版審查及施工圖面審查。 廠區保安系統。 (1) 0 號機 MSB 旋轉門測試。 (2) 1 號機 RB 反遞回測試。 (3) 2 號機 RB、TB、CB、ACB 龍東路 CCTV 電纜敷設。 (4) 2 號機 GH I Workstation 軟體安裝及設定。 廠用電梯製造及安裝工程。 (1) 已辦理竣工。
7 號柴油發電機及用過燃料廠房(AFB)	99.95	99.96	99.97	99.95	99.95	99.95	核島區機械設備安裝。 (1) 安裝工作已完成。 核島區空調設備及風管安裝工程施工。 (1) 風管測試調整平衡(TAB)測試工作。 消防管路安裝工程。 (1) 消防系統整合測試。 核島區管路安裝工程施工。 (1) 持續進行 EL.400、6350、12300 管路安裝。 (2) 0G42 系統水壓測試。 核島區電氣安裝工程。 (1) 材料領料作業。 (2) 程序書審查。 儀控設備安裝工程。 (1) 儀用纜線檢整後設計變更處理。

資料來源：台電公司龍門施工處。

註：1.表中各項工程為本季主體工程，其餘零星工程不予詳列。　2.施工概況係統計至 101 年 6 月止。

表 1.1-1 核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表（續 5）

工程名稱		預定進度(%)			實際執行進度(%)			施 工 概 況
		4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
汽輪發電機廠房	1 號機	100	100	100	99.99	99.99	99.99	結構面積長約 118m，寬約 72m，廠房結構主要可分為 3 個樓板。(地下 1 層，地上 2 層)。 汽機島區廠房結構工程施工。 1 號機 (1) 已竣工。 2 號機 (1) 已竣工。 汽輪發電機暨輔助設備安裝工程施工。 1 號機 (1) 配合龍門電廠執行汽輪發電機(飼水泵汽機)試運轉作業。(抽真空管路查漏) (2) 蒸發器廠房搭架及人孔蓋除銹保養。 2 號機 (1) 現場工安巡查。 (2) 工程文書處理。 (3) 主汽輪機設備乾燥劑定期更換。 (4) 油洗管路除銹保養。 (5) 天俥保養。 汽機廠房管路製造及安裝工程施工。 1 號機 (1) 竣工文件整理。 2 號機 (1) 配合各分包雜項工作。 (2) NCR 缺失與現場缺失改善。 空調通風系統安裝工程。 1 號機 (1) 等待進行氣流流向測試。 2 號機 (1) 待電源執行設備 PCT。 汽機廠房儀電安裝工程。 1 號機 (1) I/O 及 MMI 測試。 2 號機 (1) 電纜托網、電氣導線管施作。 (2) 電氣拉接線。 (3) 儀器設備安裝、拉接線。
	2 號機	100	100	100	96.15	96.21	96.48	

資料來源：台電公司龍門施工處。

註：1.表中各項工程為本季主體工程，其餘零星工程不予詳列。 2.施工概況係統計至 101 年 6 月止。

表 1.1-1 核能四廠興建工程 101 年第 2 季施工進度與執行情形一覽表（續 6）

工程名稱		預定進度(%)			實際執行進度(%)			施 工 概 況
		4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	
輔助鍋爐	1 號機	100	100	100	100	100	100	輔助鍋爐廠房結構工程施工。 1 號機 (1) 竣工。 2 號機 (1) 竣工。 輔助鍋爐儀電安裝工程。 2 號機 (1) 鍋爐端接線完成。 (2) 永久照明施作。 輔助鍋爐廠房機械設備安裝工程。 2 號機 (1) 所有機械設備安裝已安裝完成。 (2) 所有管路已安裝，進行水壓試驗及沖洗完成。 (3) 受他標影響，飼水泵馬達 PCT、儀電 PCT 及竣工檢查等無法執行。
	2 號機	100	100	100	98.74	98.84	98.74	
開 關 場	1 號機	100	100	100	100	100	100	345/161KV 開關場氣體絕緣開關設備工程： (1)1 號機 161KV 及 345KV 級變壓器均已加入系統並移交核能電廠運轉中。 (2)2 號機 161KV 級變壓器已加入系統並移交核能電廠運轉中，345KV 級變壓器已施工完成尚待試運轉及加入系統。
	2 號機	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	
開關設備廠房及熱修配廠房	1 號機	100	100	100	100	100	100	核島區空調設備及風管安裝工程。 1 號機 (1) 工作已完成。 2 號機 (1) 待設備接電後進行施工後測試。 核島區消防系統安裝工程。 1 號機 (1) 竣工程序辦理中。 2 號機 (1) 電氣導線管施工。 核島區電氣安裝工程。 1 號機 (1) 現場工作已完成。 2 號機 (1) 電氣導線管及支架安裝。
	2 號機	100	100	100	96.92	96.98	97.05	

資料來源：台電公司龍門施工處。

註：1.表中各項工程為本季主體工程，其餘零星工程不予詳列。2.施工概況係統計至 101 年 6 月止。

表 1.2-1 核四施工環境監測 101 年第季 2 監測結果摘要表

監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	因應對策
氣象觀測	風速、風向、氣溫、垂直氣溫差（大氣穩定度）、露點溫度、相對濕度、日射量、紫外線輻射量	・在盛行風向方面，本季4~6月以北北東風、南南東風、南風、西北風及西南風為主，與去年同期及歷年同期相近。4~6月平均氣溫介於22.1~27.0℃，露點溫度介於19.2~24.2℃，相對濕度介於83.9~85.2%，累計雨量分別為204.5mm、499.0mm及297.5mm。 ・大氣穩定度機率分佈，氣象高、低塔皆以D級（中性）及E級（微穩定）之分佈機率較高。	-
空氣品質監測	總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM_{10})、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、非甲烷碳氫化合物(NMHC)	・本季4~6月各測站空氣品質均符合空氣品質標準。	-
噪音與振動監測	噪音：Leq（包括：$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$、小時L_{eq}）、L_x、L_{max}。 振動：L_{veq}（包括：$L_{V日}$、$L_{V夜}$）、L_{vx}、L_{vmax}	・本季距核四主體工程最近之鹽寮海濱公園及過港部落等2測站而言，4~6月非假日（施工）$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量在1.6 dB(A)以內，依環保署環境影響評估技術規範之營建工程噪音評估模式技術規範之標準評估，鹽寮海濱公園及過港部落測站之噪音影響程度均屬「無影響或可忽略」程度，故核四施工對鄰近地區噪音品質影響尚屬輕微。 ・本季4~6月之振動值均符合參考之日本振動規制法實施規則。	進水口防波堤及海上工程已於94年7月22日完工，其噪音量受到環境背景之交通噪音影響。
交通流量監測	交通流量、車輛類型、施工人員、物料來源、輸送方式、吞吐量及路況	・省道旁3處測站（台2省道與102甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等3測站）各月份尖峰時段之道路服務水準多維持在B~C級；另非省道旁測站（102縣道之新社橋及過港部落）於非假日及假日尖峰時段之道路服務水準皆維持在A級。整體而言，扣除觀光活動影響，核四運輸車輛對台2省道交通運輸品質影響尚屬穩定可接受範圍。	—
河川水文監測	水位、河川斷面積、流速、流量及含砂量	・本季4~6月石碇溪及雙溪河川流量分別介於0.237~17.116cms及3.057~ 270.736cms間；歷年同季石碇溪及雙溪河川流量分別介於0.064~7.712 cms及0.236~130.774cms。本季4~6月含砂量介於0~888ppm，歷年同期之含砂量介於0~135 ppm，其6月12日受梅雨峰面之豪大雨影響，當日降雨達193.0mm，測值為歷年同期最高值。	—

表 1.2-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季監測結果摘要表（續 1）

監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	因應對策
河川水質監測	石碇溪及雙溪之7處測站（河口除外）測定溶氧量、導電度、pH、生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌群、懸浮固體、油脂、氨氮、重金屬（銅、鐵、鋅、鎘、鉻、汞、鎳）、硝酸鹽氮、磷酸鹽等項。雙溪、石碇溪及鹽寮溪等3處測定生化需氧量、大腸桿菌群、鹽度、濁度、溶氧、總磷、油脂及懸浮固體等測項	・本季4~6月石碇溪除支流暗渠上游（沼澤區）測站水質較差，屬輕度~中度污染程度外，其餘均屬未(稍)受污染程度；惟支流暗渠上游（沼澤區）測站位於核四廠區排水匯入處之上游，故其水質狀況未受廠區排水影響。另在雙溪部分，貢寮國小及新社大橋2測站皆屬未（稍）受污染程度。 ・石碇溪、鹽寮溪及雙溪等3處河口水質以大腸桿菌群、生化需氧量及總磷測值偏高，惟均在歷年範圍之內。	支流暗渠上游（沼澤區）測站位於核四廠區排水匯入處之上游，水質狀況未受廠區排水影響，自施工前即有超出甲類陸域水體標準之情形。
廠區水質監測	水量、導電度、pH、生化需氧量、懸浮固體、油脂、氨氮、真色色度及化學需氧量	・本季4~6月各測站各測值均符合放流水標準。	—
地下水監測	地下水水位及地下水水質（pH、水溫、導電度、氯鹽、總硬度、鐵、錳、鉻、銅、鎘、鉛、汞、鋅、鎳、砷、硫酸鹽、硫化物、總有機碳、濁度、懸浮固體、BOD、COD、氨氮）及雙溪之河口附近海水入侵監測	・本季僅GM3-1監測井之氨氮（4~6月測值介於0.67~0.84mg/L）、重金屬鐵（4、6月測值分別為2.310mg/L、2.740mg/L）、重金屬錳（4~6月測值介於3.170~4.060 mg/L）等3項目有未符合第二類「地下水污染監測標準」之情形。GM3-1監測井自設井之初，氨氮、重金屬鐵、重金屬錳測值即有超出標準之情形，歷年測值分別介於0.13~1.41 mg/L、<0.016~5.65mg/L、<0.002~ 6.12 mg/L，本季各測值均介於歷年範圍內，應受環境背景影響。	GM3-1監測井於設井之初即有測值偏高之情形，本季測值介於歷年測值範圍內，主要為受環境背景影響。
河域生態監測	葉綠素*a*、浮游植物、附著藻類、浮游動物、水生昆蟲、魚類及無脊椎動物	・本季在石碇溪與雙溪葉綠素*a*平均含量介於0.07~1.00μg/L，附著性藻類出現22~43種，浮游植物細胞數介於5,808~138,072 cells/L，浮游動物個體量介於19~12,600 ind./m^3，水生昆蟲以吉田扁蜉蝣、雙棘四節蜉蝣為主；魚種於石碇溪以粗首馬口鱲、大鱗鮻、尼羅口孵魚為主，雙溪以粗首馬口鱲(粗首鱲)、黃鰭鯛、大鱗鮻為主；甲殼類方面，石碇溪以雙齒近相手蟹、北方呼喚招潮蟹及多齒新米蝦為優勢，雙溪以台灣沼蝦與雙齒近相手蟹為優勢；軟體動物方面，石碇溪以網蜷、小皇冠蜑螺及福壽螺為優勢，雙溪以網蜷及福壽螺為優勢。	—

表 1.2-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季監測結果摘要表（續 2）

監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	因應對策
海域水質監測	(1)海域4處測站：測定pH、溶氧量、生化需氧量、大腸桿菌群、懸浮固體、導電度、總磷、油脂、重金屬(鉛、鎘、銅、汞、鎂、鎳、鋅、鉻)、水溫、餘氯及濁度 (2)澳底漁港：測定鹽度、大腸桿菌群、生化需氧量、懸浮固體、濁度、溶氧量、總磷及油脂	・澳底漁港部份，僅生化需氧量4、6月（分別為2.1mg/L及3.1mg/L）測值有超出甲類海域環境分類及海洋環境品質標準之情形，主要受船隻活動作業影響，本季測值均介於歷年非海事工程施工時段生化需氧量（<1.0~29 mg/L）範圍內；鄰近海域部份，本季各測值除5月4號測站表、底層大腸桿菌測值有超出甲類海域海洋環境品質標準外，其餘各測站各測值均符合甲類海域海洋環境品質標準。	核四海事工程海域施工已於94年7月22日竣工；澳底漁港測值主要受船隻活動作業影響，造成有機污染物偏高。
海域生態監測	(1)環境因子：營養鹽(亞硝酸鹽、硝酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽)、總磷、總氮、葉綠素a。 (2)生物因子：基礎生產力、植物性及動物性浮游生物、大型藻類、底棲生物、珊瑚、魚類。	・本季4~6月硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素*a*平均測值分別為26.59μg/L、1.19μg/L、<0.93μg/L、158.66μg/L、0.26μg Chl a/L，總氮與總磷分別為0.05mg/L、0.03mg/L。整體而言，海域生態環境變動不大。 ・基礎生產力平均值為0.84μg C/L/hr。浮游植物表層0m藍綠藻的鐵氏束毛藻為較優勢種、3m及底層以矽藻的旋鏈角刺藻為優勢種，平均含量為8.55×10^3cells/L。浮游動物垂直及水平分佈平均豐度為27.2×10^3ind/1,000m^{3}和8.4×10^3 ind/1,000m^3，以介形類、哲水蚤、夜光蟲及棘皮幼生優勢種。潮間帶沙底質記錄到多毛類，與鹽寮沙質底質環境變動大及物種特性有關。潮間帶岩礁底棲無脊椎動物的調查，以黑齒牡蠣及黑瘤海蜷為優勢物種。鹽寮海域亞潮帶沙質環境底棲無脊椎動物以普通文蛤為主。亞潮帶岩礁區與歷年調查結果相似，主要以瘤菟葵及白尖紫叢海膽為優勢物種。魚卵平均密度為708個/1000m^3。仔稚魚平均密度近於52尾/1000m^3。成魚在鹽寮及澳底兩礁石區以隆頭魚科、雀鯛科及蝴蝶魚科較多，並以霓虹雀鯛及斑鰭光鰓雀鯛較具優勢。魚類群聚的歧異指數為3.13。	—

表 1.2-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季監測結果摘要表（續 3）

監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	因應對策
海域生態監測	(1)環境因子：營養鹽(亞硝酸鹽、硝酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽)、總磷、總氮、葉綠素 *a*。 (2)生物因子：基礎生產力、植物性及動物性浮游生物、大型藻類、底棲生物、珊瑚、魚類。	・大型海藻潮間帶海藻種類數較少，而亞潮帶水深3公尺處則以紅藻為主。亞潮帶大型藻類群聚亦以紅藻為主，除以貝狀耳殼藻及太平洋寬珊藻等表覆型海藻為優勢藻種外，水深5米的紅羽凹頂藻及水深10米的匍扇藻也較上季增加，覆蓋率大礁南側水深5m平均26.40%，水深10m平均27.60%。淺礁南側水深5m平均19.58%，水深10m平均23.70%。大礁及淺礁海域的珊瑚群聚仍以團塊形及平鋪狀的石珊瑚類為主，珊瑚種類組成與歷年調查結果相似，其中以菊珊瑚科的種類最多，微孔珊瑚及軸孔珊瑚次多。整體而言各測站的各項指數皆在歷年95%信賴區間內，無明顯變動。 ・浮游植物細胞含量高於去年同季，浮游動物含量個體量與去年同季的相較增加，成魚種類數、大型海藻種類數皆較高於去年同季；魚卵密度含量、仔稚魚密度、珊瑚覆蓋率則較低於去年同季，其餘生物因子則變動不大，仍為一般沿近海域該季較常出現之現象。	—
漁業調查	(1)問卷調查分析 (2)漁獲實地調查分析	・各類作業漁法因季節性而異，於101年4~6月（農曆3月11日~5月12日）之漁業法以沿岸採捕、燈火漁業（含火誘網及扒網漁業）及釣具漁業為主。在沿岸採捕業方面，本季涉水採捕方式之CPUE介6.14~8.47公斤/日/戶，IPUE介於927.91~978.14元/日/戶，本季潛水採捕方式之CPUE介16.48~22.35公斤/日/戶，IPUE介於5,506.45~ 6,501.44元/日/戶；在釣具漁業方面，本季CPUE介12.2~18.9公斤/日/戶，IPUE介於3,098~4,197元/日/戶；在火誘網漁業方面，本季CPUE介於104~603公斤/日/戶，IPUE介於12,187~14,564元/日/戶；在扒網漁業方面，CPUE介於8,241~16,835公斤/日/戶，IPUE介於231,185~509,627元/日/戶；在刺網漁業方面，本季CPUE介於9.5~15.5公斤/日/戶，IPUE介於4,506~ 5,774元/日/戶。本季各漁法之CPUE及IPUE均介於歷年範圍內。	—
海象調查	海域溫度與鹽度縱深剖面調查、漂流浮標追蹤調查、沿岸潮位及水溫調查。	・海域溫度屬季節性變化，本季4~6月各測站之表層水溫約在20.2℃~24.9℃之間，水層垂直水溫分佈情況方面，除5、6月份A10、B8、B10、D8、D10、F8、F10等測站之上、下水層溫差約在4.0℃~7.5℃左右，其餘各測站並無明顯斜溫層；各測站之鹽度介於33.5~ 34.0PSU之間，海水鹽度垂直變化小，此區域之水體混合狀況大致良好。 ・本季浮標流況大致呈現漲潮西北流、退潮東南流之流況，少數浮標則呈現流向較不穩定；至於浮標之平均流速則呈鹽寮灣內流速較鹽寮灣外流速為低的情形。	—

表 1.2-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季監測結果摘要表（續 4）

監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	因應對策
景觀與遊憩活動調查	(1)遊客人數實地調查 (2)觀光點門票分析 (3)設置景觀點，定期拍照並進行自然完整性之評估	・本季鹽寮海濱公園、龍門公園、福隆海水浴場各月遊客總人次分別介於259~527人次/月、3,502~4,497人次/月、11,760~137,621人次/月之間，各測站本季與去年同期比較，以鹽寮海濱公園及福隆海水浴場因受連日降雨及颱風影響，遊客數較去年同期減少。 ・本季第4、5號西向觀景點之景觀品質因廠區廠房共同通風塔及核島區廠房工程施工完成，略微影響，屬中度自然完整性程度，第7號觀景點因山坡上生水池工程施工開挖，視覺景觀品質受影響，屬中度自然完整性程度，惟目前皆已進行植生復育；各觀景點景觀品質與上季相近。整體而言，核四施工對台2省道—澳底至龍門社區(舊社)段及鹽寮海濱公園之景觀品質衝擊較大，屬中度自然完整性程度。目前綠帶二期(澳底二號橋以南段)之規劃設計已配合「公路局台2線鹽寮段新闢工程細部設計」之路線、高程設計中，並於台2線鹽寮段新闢工程完工後發包施工，屆時將沿台2省道施築一道15~50公尺寬之高坡緩衝綠帶，以有效改善台2省道沿線觀景點之視覺景觀。	於開挖坡面進行植生復育，且配合台2省道工程，沿台2省道施築高坡緩衝綠帶，以降低視覺衝擊。
海域漂砂	漂砂粒徑分析、漂砂方向	・就輸砂量而言，本季各測站之進砂速率以S4最大，S2測站之進砂量最小。S1進砂速率在4.26~11.01g/cm^2/day間，S2進砂速率在2.49~8.06 g/cm^2/day間，S3進砂速率在2.69~11.33g/cm^2/day間，S4進砂速率在4.98~10.29 g/cm^2/day間，S5進砂速率在4.52~7.93g/cm^2/day間。 ・以漂砂八方位中優勢（最大捕砂體積量方向）方向而言，各捕砂器漂砂運動方向以垂直岸線為主，以向、離岸方向描述則漂砂趨勢以向外海推移為主。以和量計算方式考量各方位漂砂傳輸分量相消、疊加之影響，S1與S4測站以約略平行岸線方向向南傳輸，S4測站則向北傳輸，而S2與S3測站則為約略垂直岸線方向傳輸，S2測站向岸側傳輸，S3測站則向外海傳輸。	—

表 1.2-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季監測結果摘要表（續 5）

監測類別	監測項目	監測結果摘要說明	因應對策
海岸地形	陸域地形、海域地形、雙溪出海口淤砂監測	·101年6月之陸域地形與上季相較，陸域砂量總體積變化約增加44,569立方公尺，陸域整體平均高程增加約21cm；與去年同季相較，陸域砂量增加約94,188立方公尺，高程平均增加約45cm。101年6月之海域地形與去年同季相較，砂量增加約29,840立方公尺，高程平均增加約4cm。一年以來經過颱風季節、東北季風與西南季風影響，陸域沙灘總量為淤積情形，而近岸海域亦為淤積之情形。 ·雙溪河口灘線本季與上季相較，本季河口沙嘴向東南推移約50m，沙灘往東南延伸，河口退潮後之河道寬度較上季縮減，本季河道出海口於最低潮時之寬度約為20m，沙灘面積較上季增加，平均高程降低。自97年9月以來，福隆沙灘雖已趨於動態平衡狀態，雙溪河沙嘴持續在西南西與東北東方向小幅擺盪，近2年來未有明顯造成本區域影響之颱風，受季風之交替作用後，沙灘與近岸海域侵淤變化表現相對較為明顯，而侵襲本區域之颱風對整體漂砂侵淤量則產生較大之變化趨勢。	—

表 1.3-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季執行情形一覽表

調查監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	調查日期
氣象觀測	風速、風向、氣溫、垂直氣溫差（大氣穩定度）、露點溫度、相對濕度、日射量、紫外線輻射量	1.氣象低塔 2.氣象高塔	採連續自動觀測。	以氣象觀測儀器及資料轉換器(MTC)換算與數據化。	台電公司電源開發處	101年4月1日~101年6月30日
空氣品質監測	總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM_{10})、一氧化碳(CO)、氮氧化物(NO×)、非甲烷碳氫化合物(NMHC)	1.移動式監測站 ● 貢寮國小 ● 福隆海水浴場 ● 川島養殖池 ● 石碇宮 ● 貢寮焚化廠入口旁民宅 2.固定式自動連續監測站 ● 澳底 ● 龍門	1.移動式監測站每月進行連續3天（含假日）監測。 2.固定式自動連續監測站採連續自動監測。	依據環保署公告之空氣檢測方法辦理，詳附錄Ⅱ。	1.新紀工程顧問有限公司 2.台電公司	1.移動式監測： 101年4月2~8、19~22、27~30日 101年5月2~12、24~27日 101年6月6~9、22~30日 2.固定式自動連續監測： 101年4月1日~101年6月30日
噪音與振動監測	噪音：Leq（包括：小時L_{eq}、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$）、L_x、L_{max} 振動：L_{veq}（包括：$L_{V日}$、$L_{V夜}$）、L_{vx}、L_{vmax}	1.台2省道與102甲縣道交叉口 2.鹽寮海濱公園 3.福隆街上 4.過港部落 5.102縣道之新社橋附近	每個月進行2天，每天連續24小時（含假日）監測。	噪音：依據環保署公告之噪音量測方法進行24小時連續測定。 振動：採用相對人體感覺之振動位準方式監測。	新紀工程顧問有限公司	101年4月3~4、20~21日 101年5月6~7、11~12日 101年6月8~9、24~25日
交通流量監測	交通流量、車輛類型、施工人員、物料來源、輸送方式、吞吐量及路況	1.台2省道與102甲縣道交叉口 2.鹽寮海濱公園 3.福隆街上 4.過港部落 5.102縣道之新社橋附近	每月進行2天，每天連續24小時調查(配合噪音與振動監測同時進行）。	以人工計數或錄影方式記錄每小時車輛。	新紀工程顧問有限公司	101年4月3~4、20~21日 101年5月6~7、11~12日 101年6月8~9、24~25日

表 1.3-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季執行情形一覽表（續 1）

調查監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	調查日期
河川水文監測	水位、河川斷面積、流速、流量及含砂量	1.石碇溪： ● 石碇溪1號測站（台電宿舍上游） ● 石碇溪2號測站（澳底二號橋附近） 2.雙　溪： ● 雙溪1號測站(貢寮國小附近) ● 雙溪2號測站(明燈橋下游約300公尺處)	1.河川水位採連續逐時自動觀測。 2.斷面積、流速與流量為每月1次，每年6月至11月間為每月2次。	1.水位以BDR320水壓式水位計監測。 2.河川斷面積以測深桿測得之水深推算。 3.含砂量以DH-48採樣器採集砂樣。 4.流速以PRICE式流速計觀測。	台電公司電源開發處	101年4月1日~101年6月30日
河川水質監測	石碇溪及雙溪之7處測站（河口除外）測定溶氧量、導電度、pH、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、油脂、氨氮、重金屬（銅、鐵、鋅、鎘、鉻、汞、鎳）、硝酸鹽氮、磷酸鹽及大腸桿菌群等項。雙溪、石碇溪及鹽寮溪等3處河口測定鹽度、大腸桿菌群、生化需氧量、懸浮固體、濁度、溶氧量、總磷及油脂。	1.石碇溪： ● 上游水文站 ● 石碇溪廠界 ● 澳底二號橋 ● 石碇溪河口 ● 澳底二號橋攔水堰上游 ● 支流暗渠上游(沼澤區) 2.雙　溪： ● 貢寮國小 ● 新社大橋 ● 雙溪河口 3.鹽寮溪河口（88/10新增)	各測站每月進行1次採樣分析。	依據環保署公告之水質檢驗方法辦理，詳附錄Ⅱ。	台灣檢測股份有限公司	101年4月3、12日 101年5月3、23日 101年6月4、5日
廠區水質監測	流量、導電度、pH、生化需氧量、懸浮固體、油脂、氨氮、真色色度、化學需氧量。	1.辦公區排水口（1） 2.辦公區排水口（2） 3.宿舍區排水口 4.2號排洪渠道 5.鹽寮一號橋排洪渠道出口	各測站每月進行1次採樣分析。	依據環保署公告之水質檢驗方法辦理，詳附錄Ⅱ。	台灣檢測股份有限公司	101年4月12日 101年5月23日 101年6月5日

表 1.3-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季執行情形一覽表（續 2）

調查監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	調查日期
地下水監測	地下水水位及地下水水質（水溫、pH、導電度、濁度、氯鹽、硫酸鹽、懸浮固體、BOD、總有機碳、COD、氨氮、硫化物、總硬度、鐵、錳、鉻、銅、鎘、鉛、汞、鋅、鎳、砷）及雙溪之河口附近海水入侵監測	於核四廠址附近設置12口監測井	水位：自93年12月起，於地下水監測井內安裝水位自動監測儀器，記錄每小時之水位標高。 水質：為每月採樣分析1次。	1.以水位量測尺測出地下水位深度。 2.依據環保署公告之水質檢驗方法辦理，詳附錄Ⅱ。	台灣檢測股份有限公司	1.水位：101年4月1日~101年6月30日(自93/9起於各監測井內安裝水位計連續監測) 2.水質： 101年4月2、13~17日 101年5月5~10日 101年6月2~3、6~9日
河域生態監測	葉綠素*a*、浮游植物、附著藻類、浮游動物、水生昆蟲、魚類及無脊椎動物	1.石碇溪： ● 上游水文站 ● 澳底二號橋 ● 石碇溪河口 2.雙　溪： ● 貢寮國小 ● 新社大橋 ● 雙溪河口	各測站每2個月進行1次採樣分析	詳1.5節及附錄Ⅱ。	中華民國魚類學會	101年4月17、18日; 101年6月18、19日
海域水質監測	1.海域4處測站：測定pH、溶氧量、生化需氧量、大腸桿菌群、懸浮固體、導電度、總磷、油脂、重金屬（鉛、鎘、銅、汞、鎂、鎳、鋅、鉻）、水溫、餘氯及濁度 2.澳底漁港：測定鹽度、大腸桿菌群、生化需氧量、懸浮固體、濁度、溶氧量、總磷及油脂	1號~4號監測站及澳底漁港（其中澳底漁港測站僅分析鹽度、大腸桿菌群、生化需氧量、懸浮固體、濁度、溶氧量、總磷及油脂等項）	各測站每月進行1次採樣分析。	依環保署公告之水質檢測方法辦理，詳附錄Ⅱ。	台灣檢測股份有限公司	101年4月3日 101年5月3日 101年6月4日

表 1.3-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季執行情形一覽表（續 3）

調查監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行單位	調查日期
海域生態監測	1.環境因子：營養鹽（亞硝酸鹽、硝酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽）、總磷、總氮、葉綠素*a* 2.生物因子：基礎生產力、植物性及動物性浮游生物、大型藻類、底棲生物、珊瑚、魚類	除配合海域水質所設之4處監測站外，另於亞潮帶及外海設6處測站，共計10處監測站。	各測站每季進行1次調查分析。	詳1.5節及附錄Ⅱ。	中華民國珊瑚礁學會	101年5月3、25日
漁業調查	1.問卷調查分析 2.漁獲實地調查分析	調查範圍包括貢寮鄉沿海地區。	每月1次。	問卷調查及漁獲資料蒐集，詳附錄Ⅱ。	海洋大學環境生物與漁業科學系	101年4月1日~101年6月30日（農曆3月11日~5月12日）
海象調查	海域溫度與鹽度縱深剖面調查、漂流浮標追蹤調查、沿岸潮位及水溫調查	固定潮位、水溫測站：進水口重件碼頭邊	1.漂流浮標追蹤及溫鹽剖面調查每月至少進行1次調查分析。 2.潮位、岸邊海溫採連續自動觀測。	1.海域溫度與鹽度縱深剖面調查以CTD進行調查。漂流浮標追蹤調查以雙葉浮標進行觀測，浮標流跡以GPS追蹤定位。 2.潮位、海溫調查以潮位及水溫計自動記錄。	台電公司電源開發處	1.海域溫度、鹽度及浮標漂流追蹤 101年4月2、3日 101年5月7、8日 101年6月6、7日 2.沿岸潮位及水溫：101年4月1日~101年6月30日
景觀與遊憩活動調查	1.觀光點門票分析 2.設置景觀點，定期拍照並進行自然完整性之評估	1.景觀美質： 核四廠址附近，選7個定點 2.遊憩： ● 鹽寮海濱公園 ● 福隆海水浴場 ● 龍門公園（即龍門渡假中心）	每月進行拍照比對。	1.景觀美質調查以照相記錄方式，藉由自然完整性評分方式進行評估。 2.遊憩以蒐集遊憩區門票資料進行分析。	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	景觀美質 101年4月23日 101年5月22日 101年6月16日
海域漂砂	漂砂粒徑分析、漂砂方向	自澳底漁港南側至福隆海水浴場附近之海域，設置5處捕砂器。	各測站每季調查1次。	將捕砂器放置於定點約1天，以各方向進砂量推估漂砂方向。	中山大學海洋環境學系	101年6月10~11日
海岸地形	陸域地形、海域地形、雙溪出海口淤砂監測分析	自澳底漁港南側至福隆海水浴場附近之海域，進行海域水深、陸域地形及雙溪出海口淤砂監測分析	海域地形、雙溪出海口淤砂監測每年調查2次，分別於颱風前、後各進行1次；陸域地形每年調查4次	控制點以GPS衛星定位系統得，水深測量採聲波測深。	中山大學海洋環境學系	101年6月10~12日

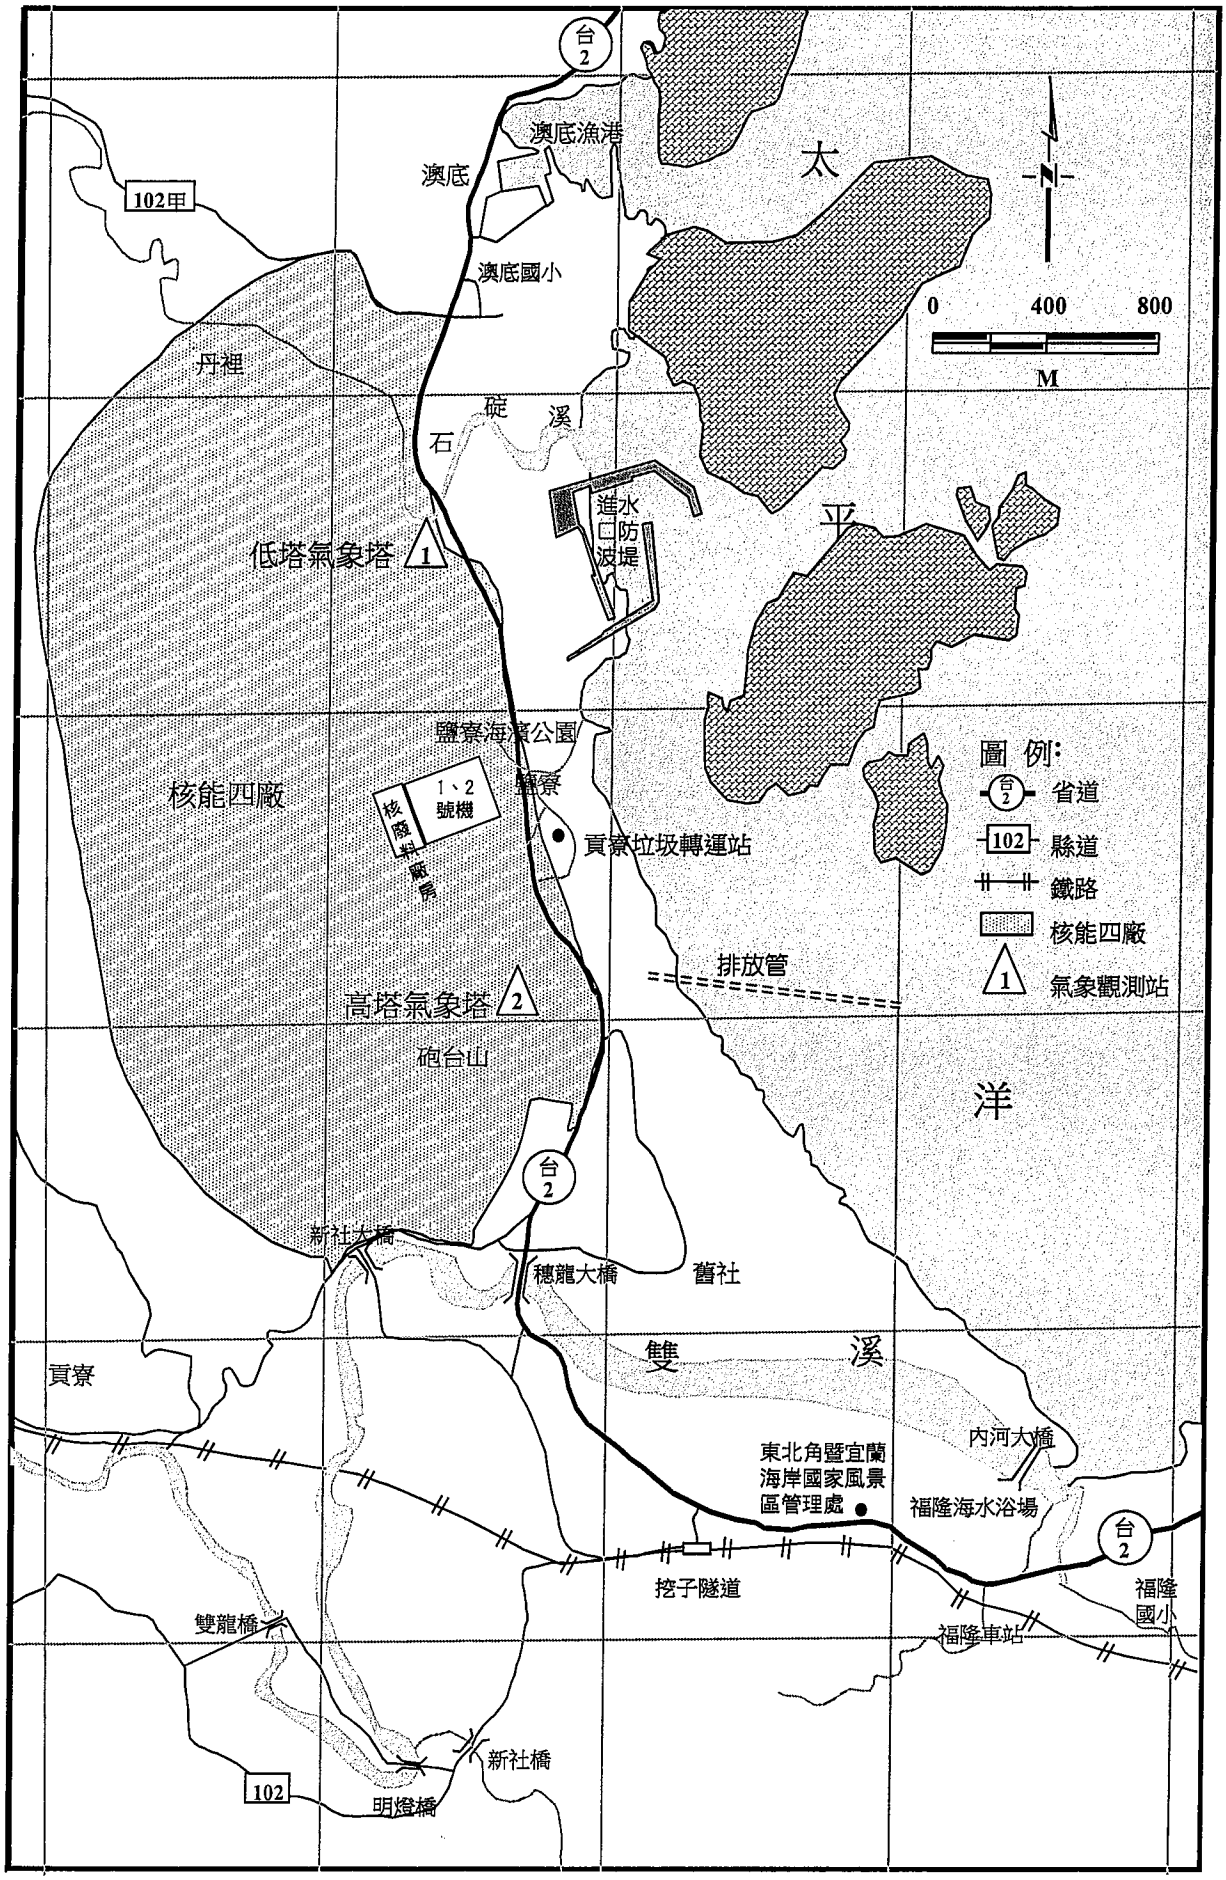


圖1.4-1 核四施工環境監測氣象觀測站位置圖

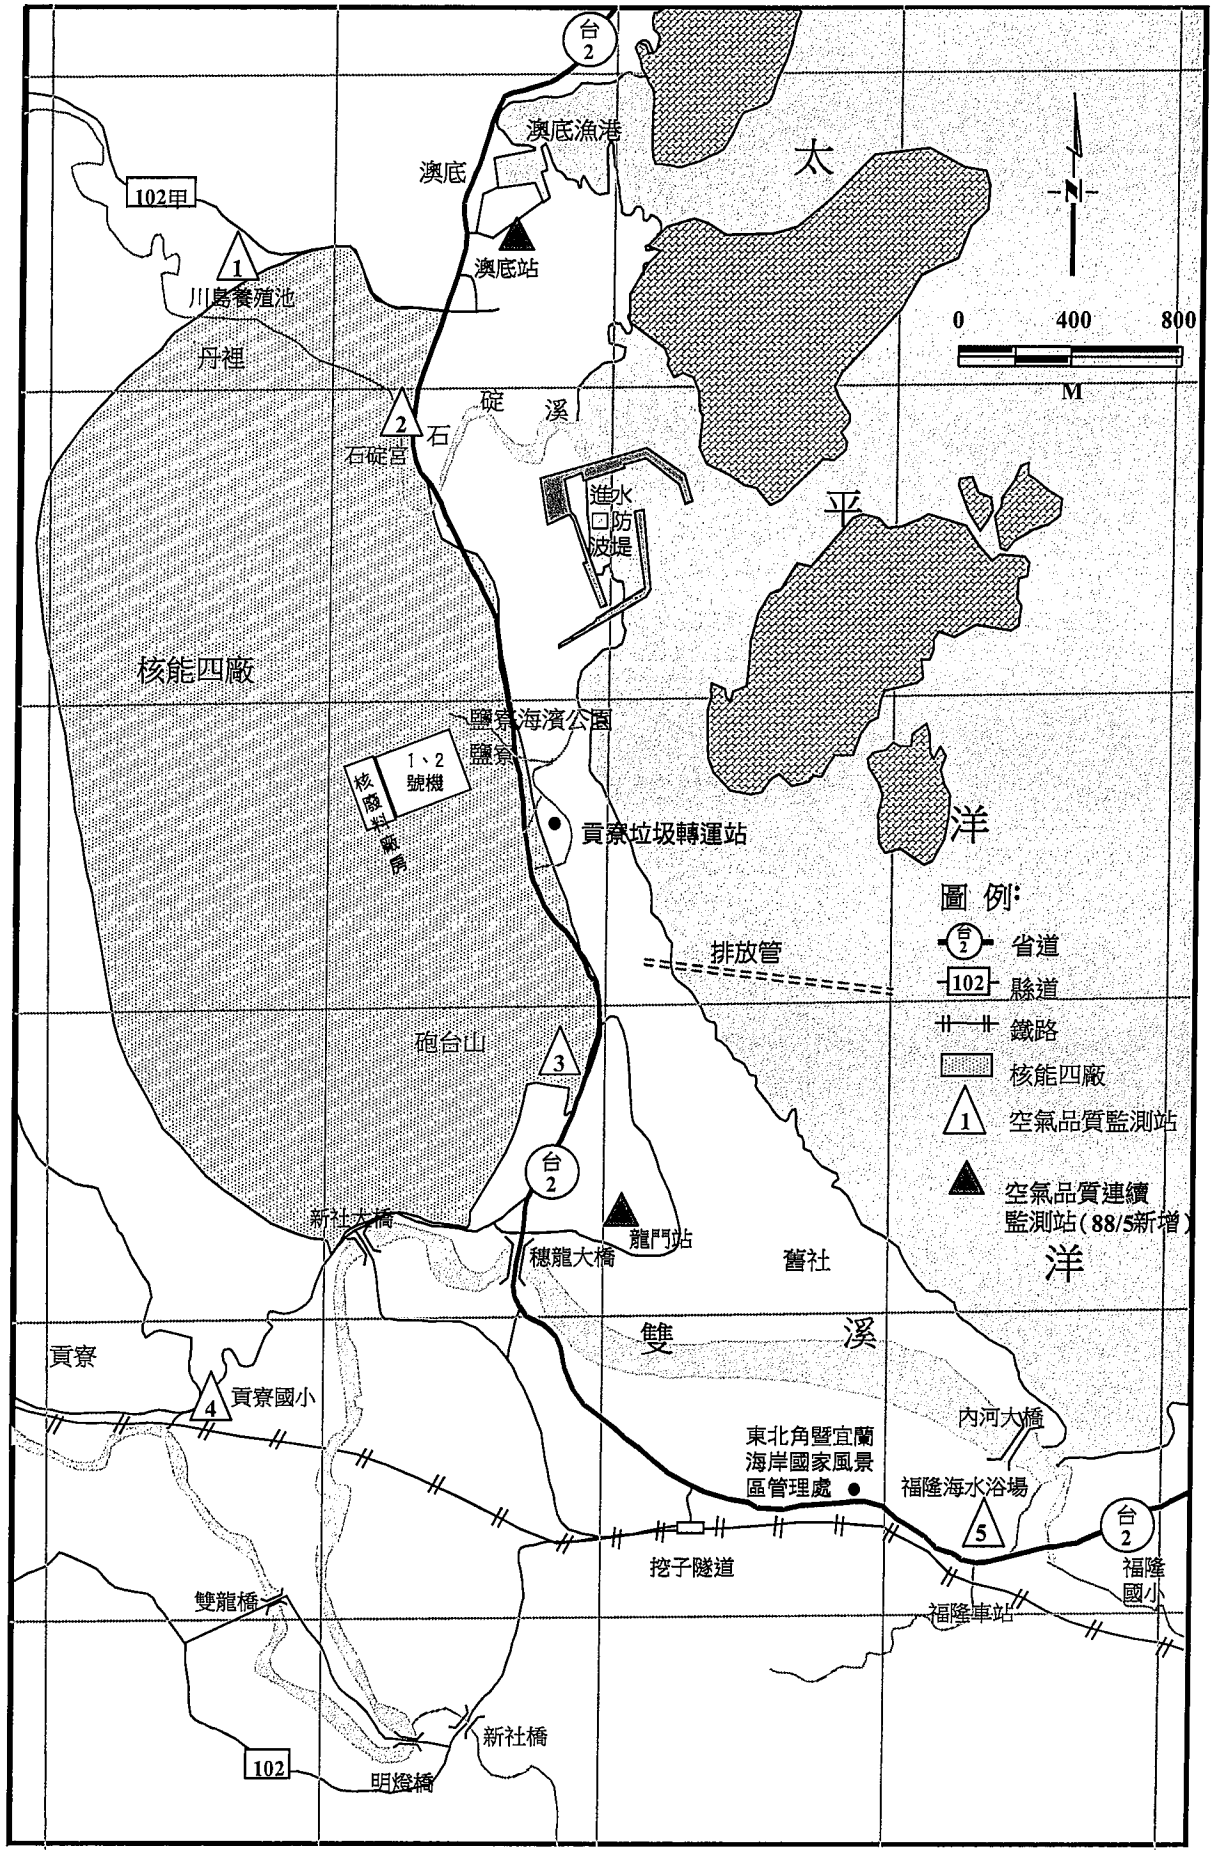


圖1.4-2 核四施工環境監測空氣品質監測站位置圖

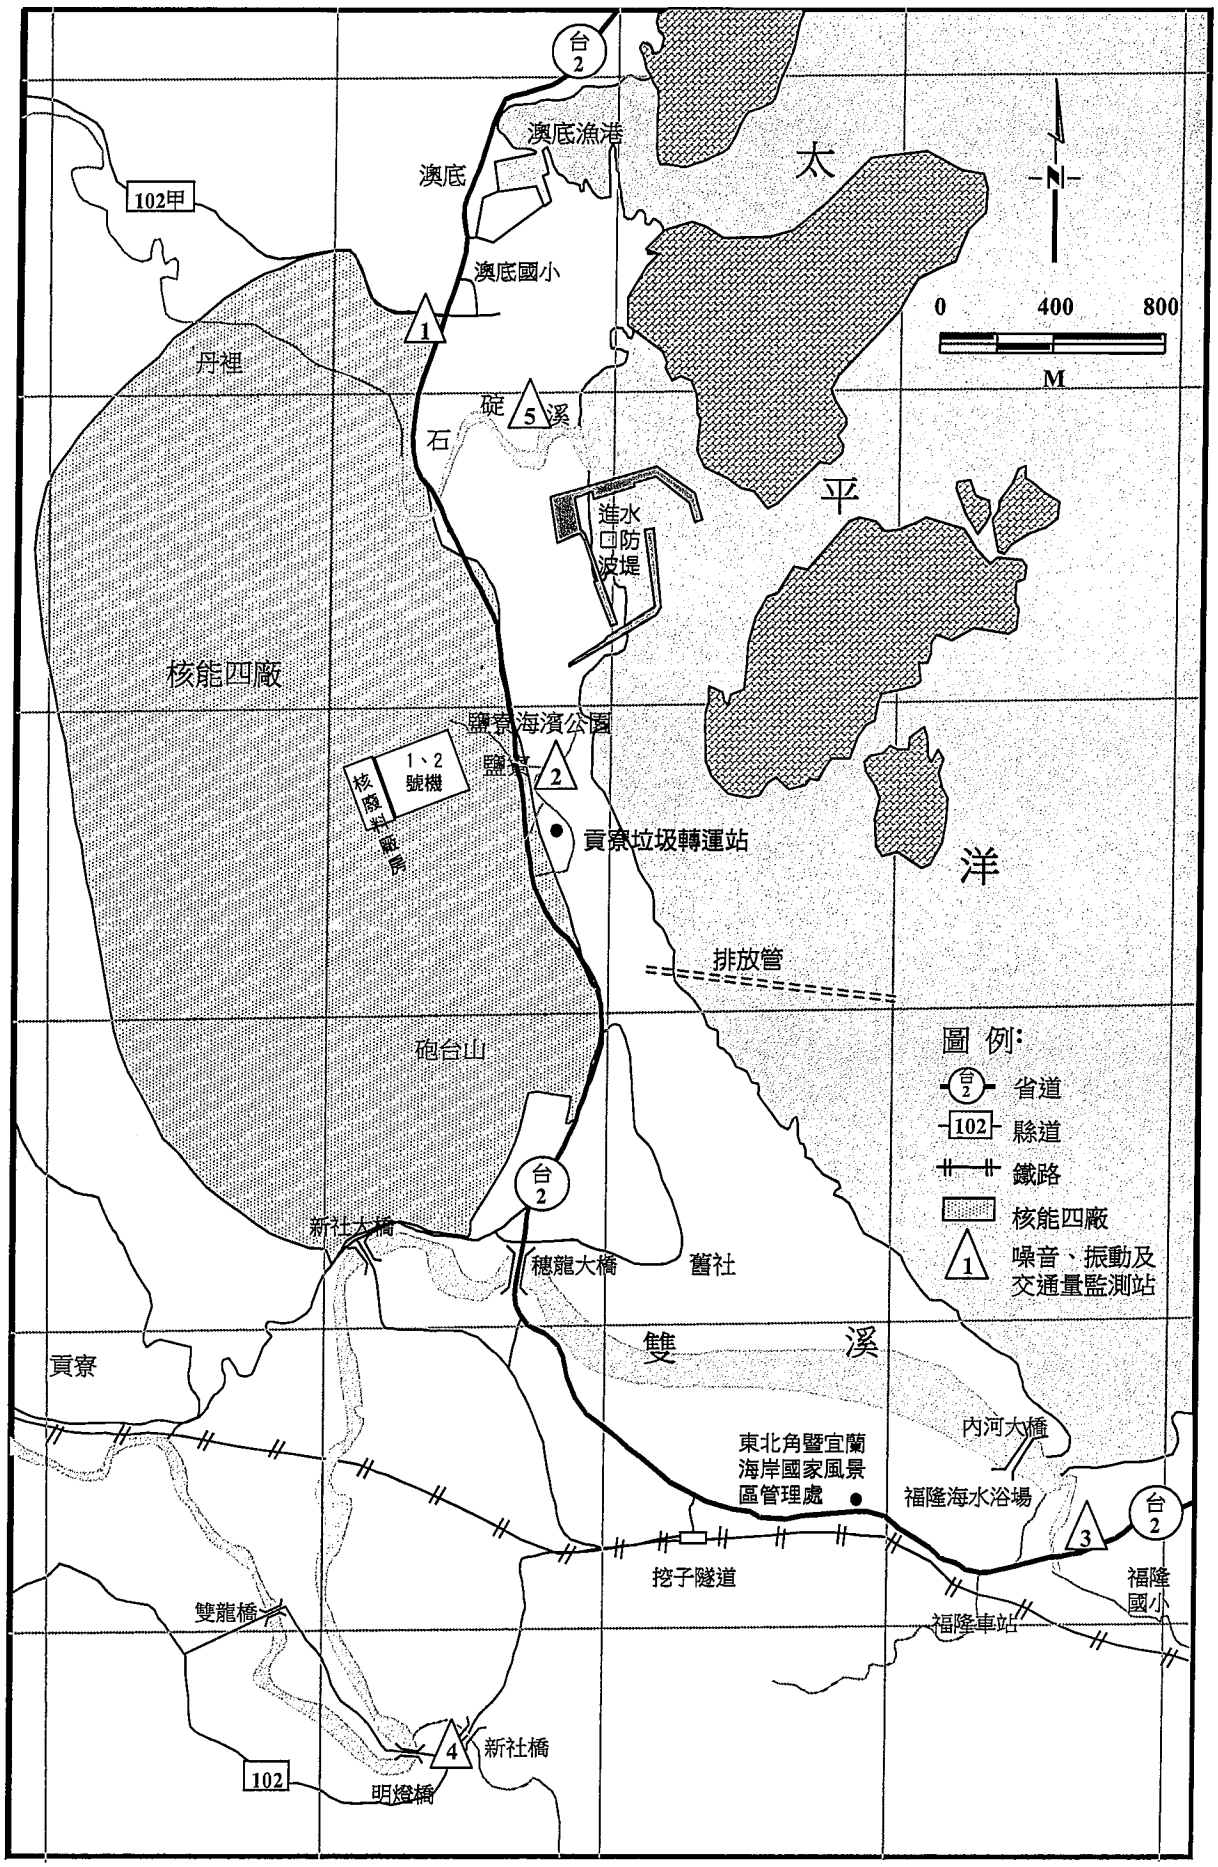


圖1.4-3 核四施工環境監測噪音與振動及交通流量監測站位置圖

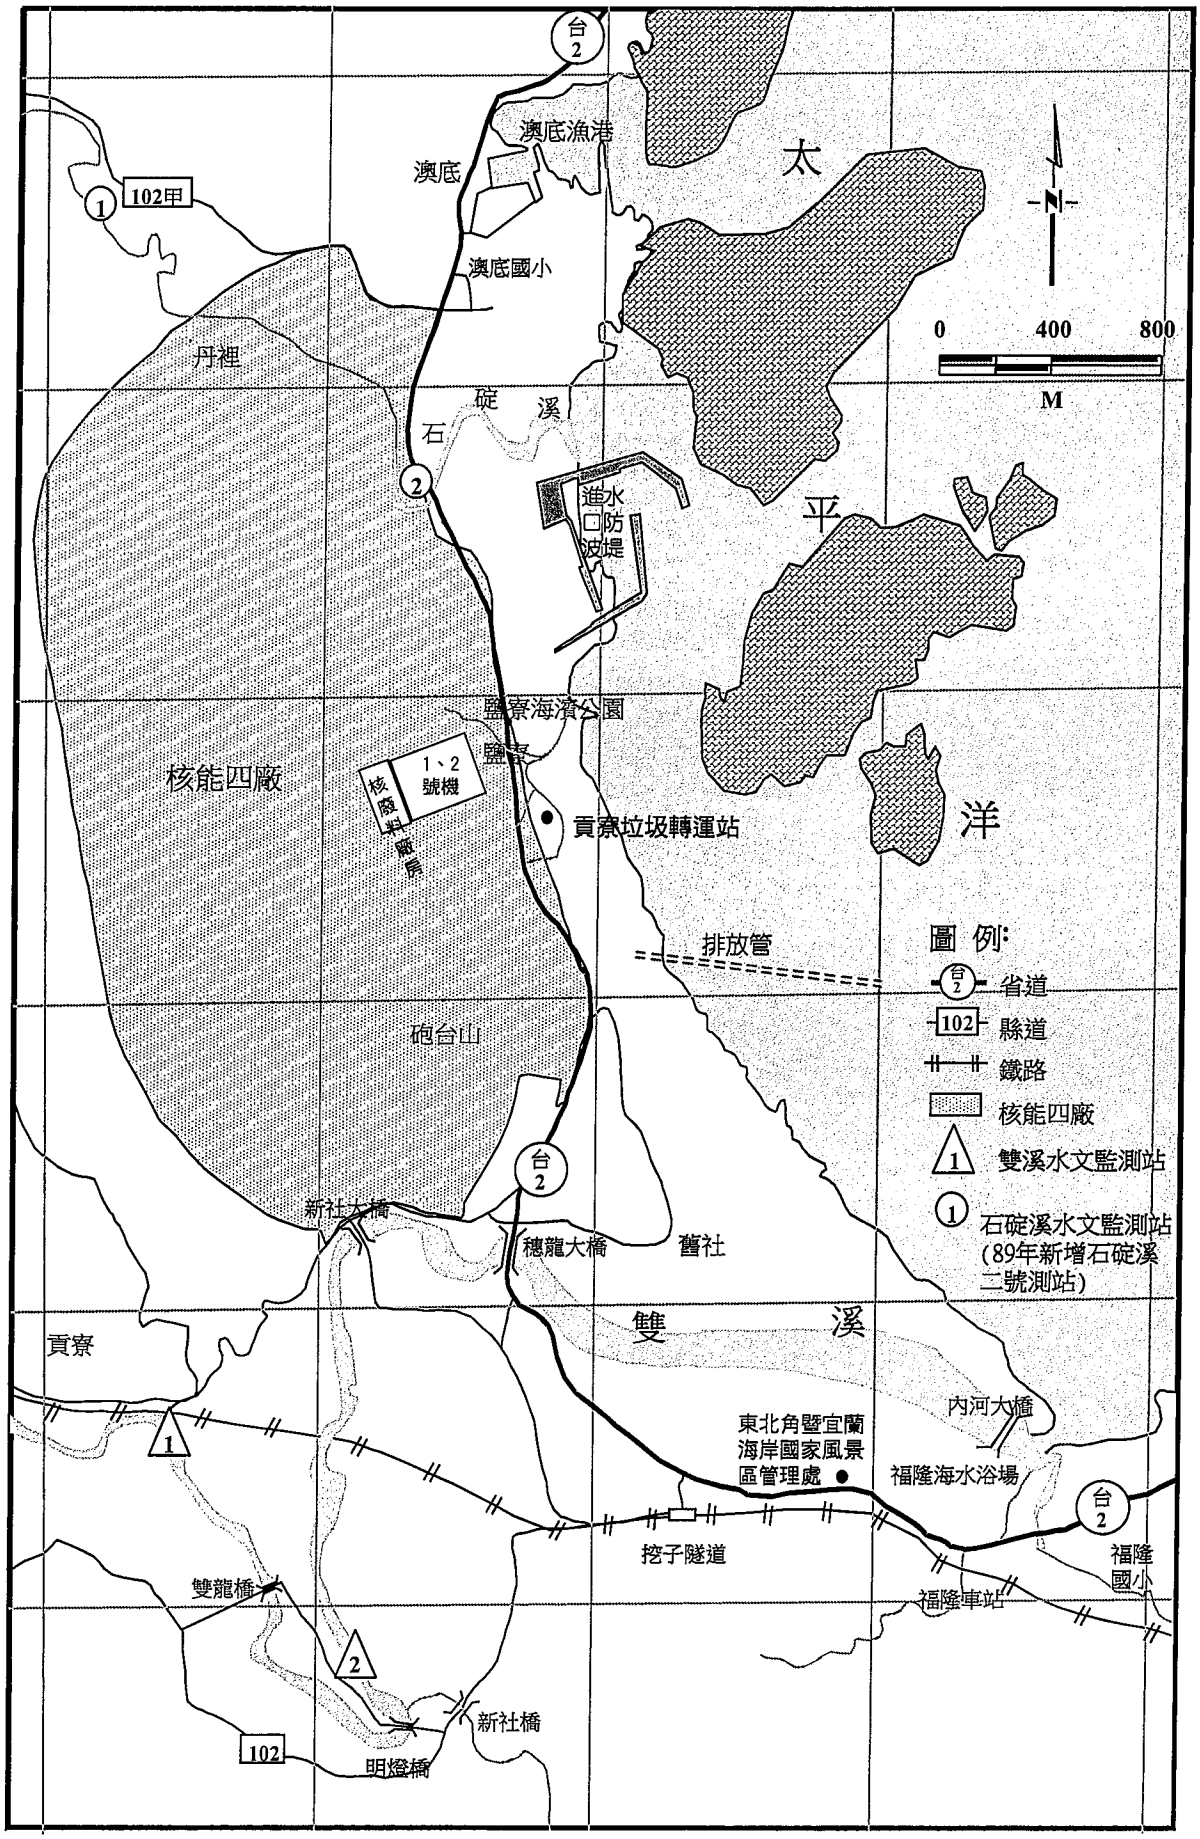


圖1.4-4 核四施工環境監測河川水文監測站位置圖

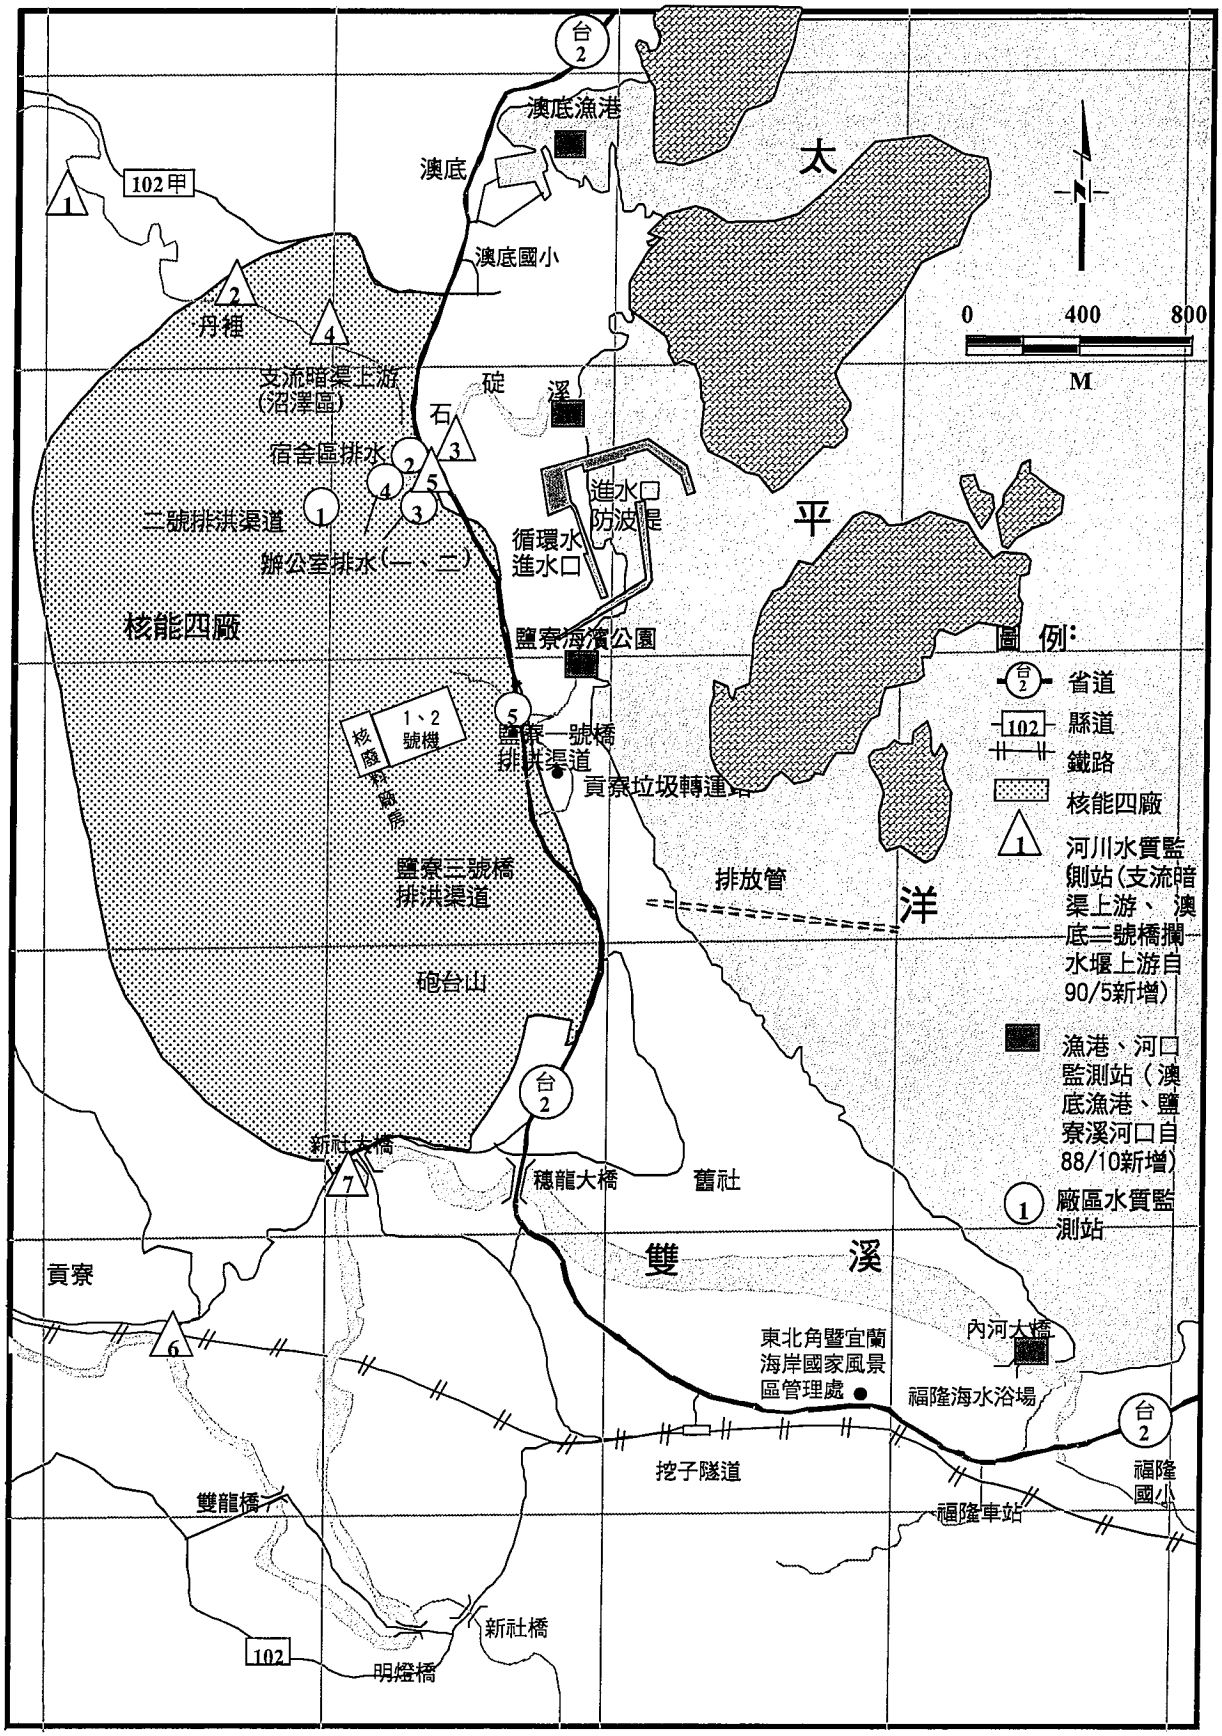


圖1.4-5 核四施工環境監測河川水質及廠區水質監測站位置圖

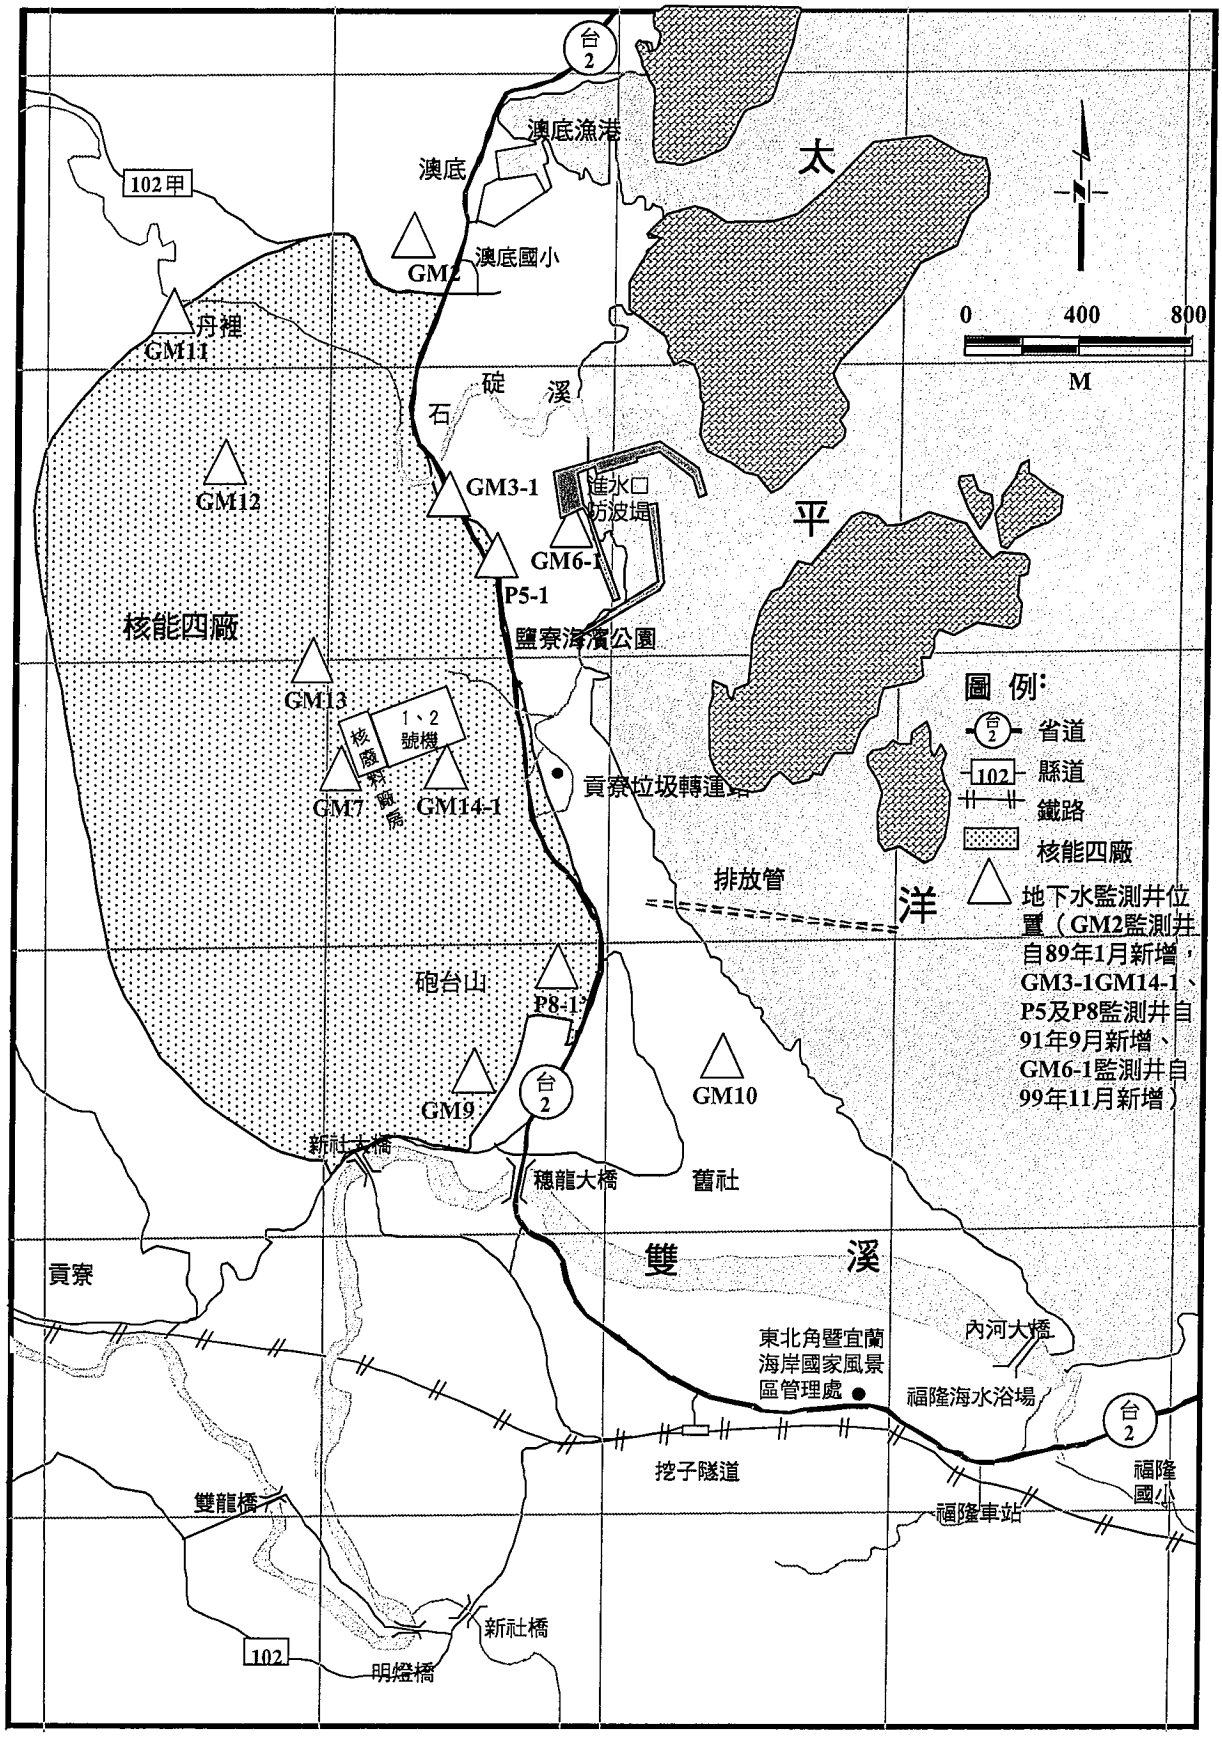


圖1.4-6 核四施工環境監測地下水監測站位置圖

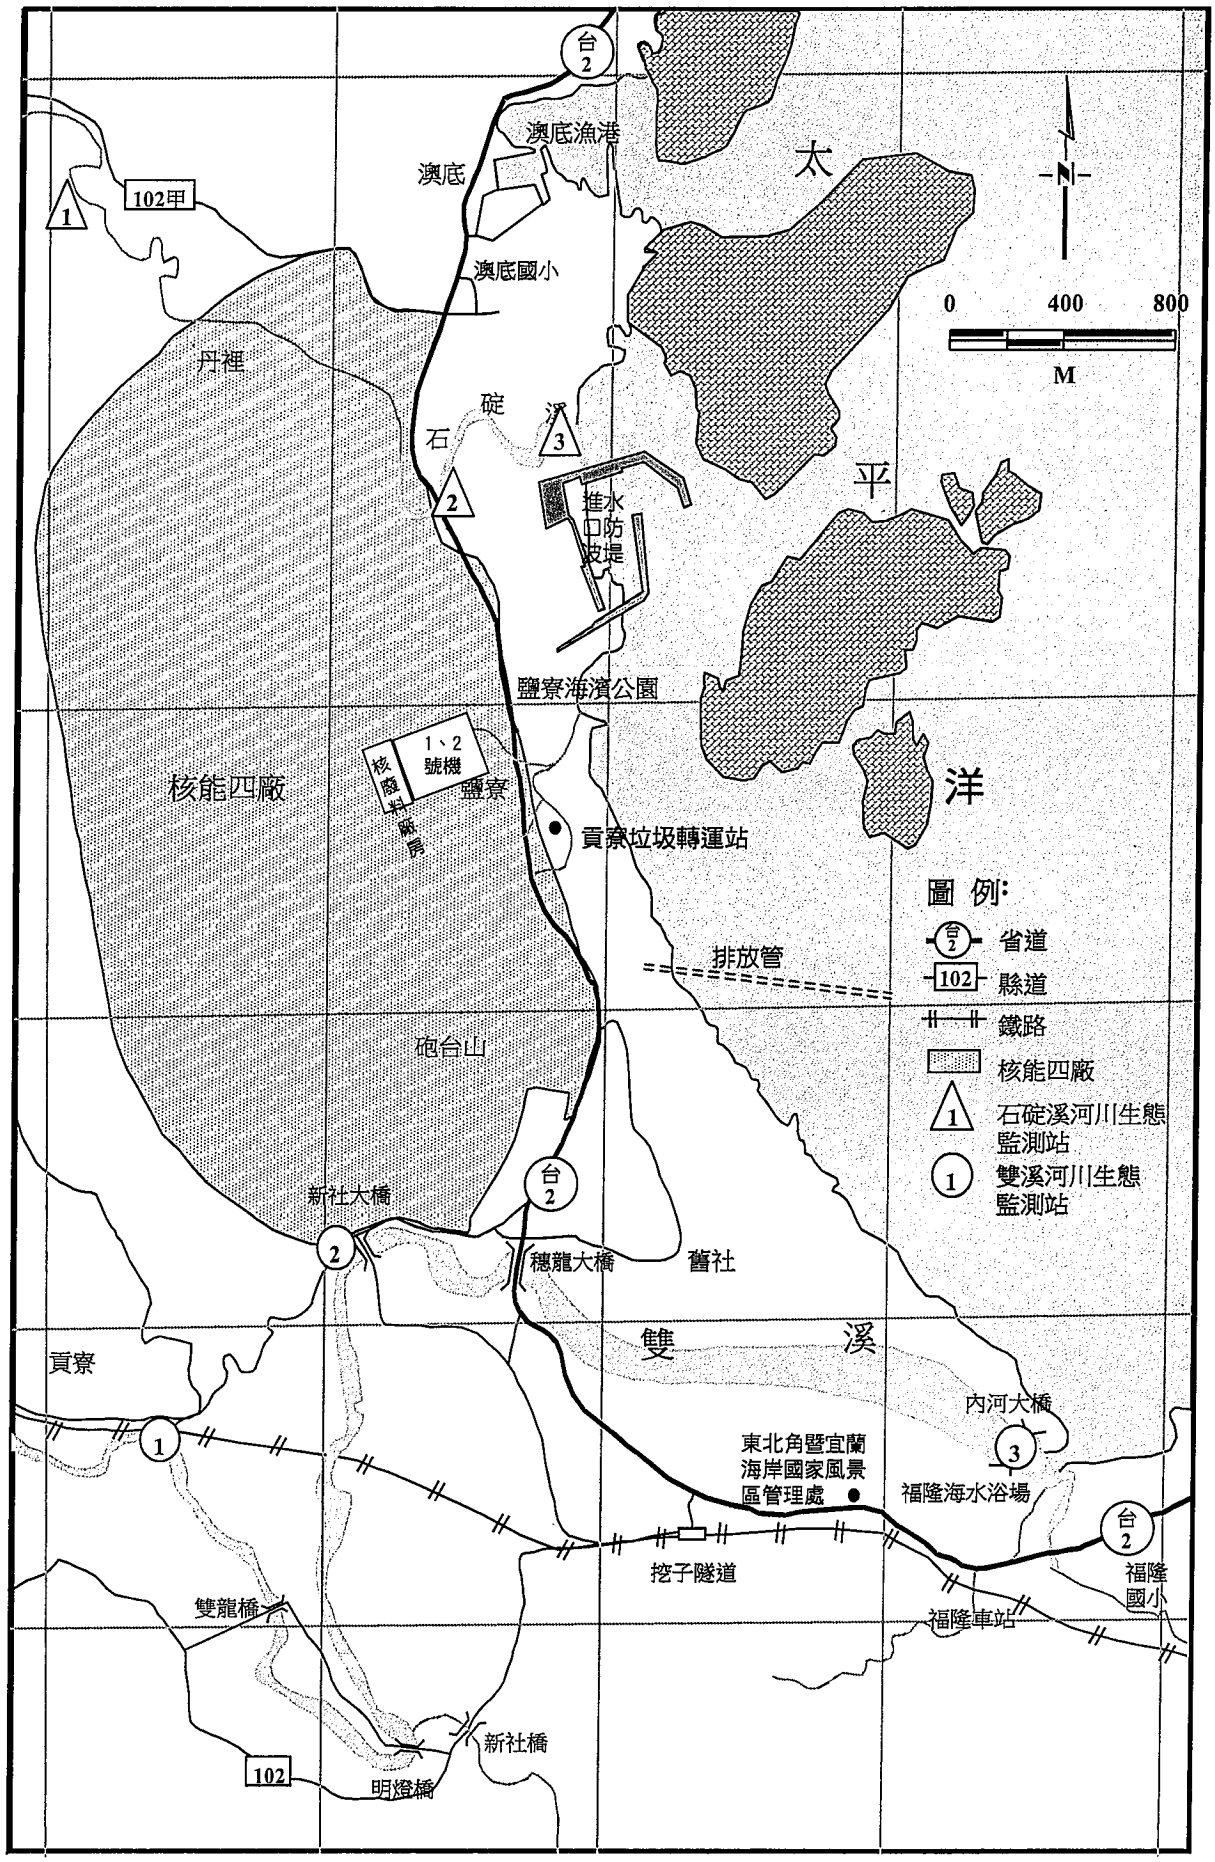


圖1.4-7 核四施工環境監測河域生態監測站位置圖

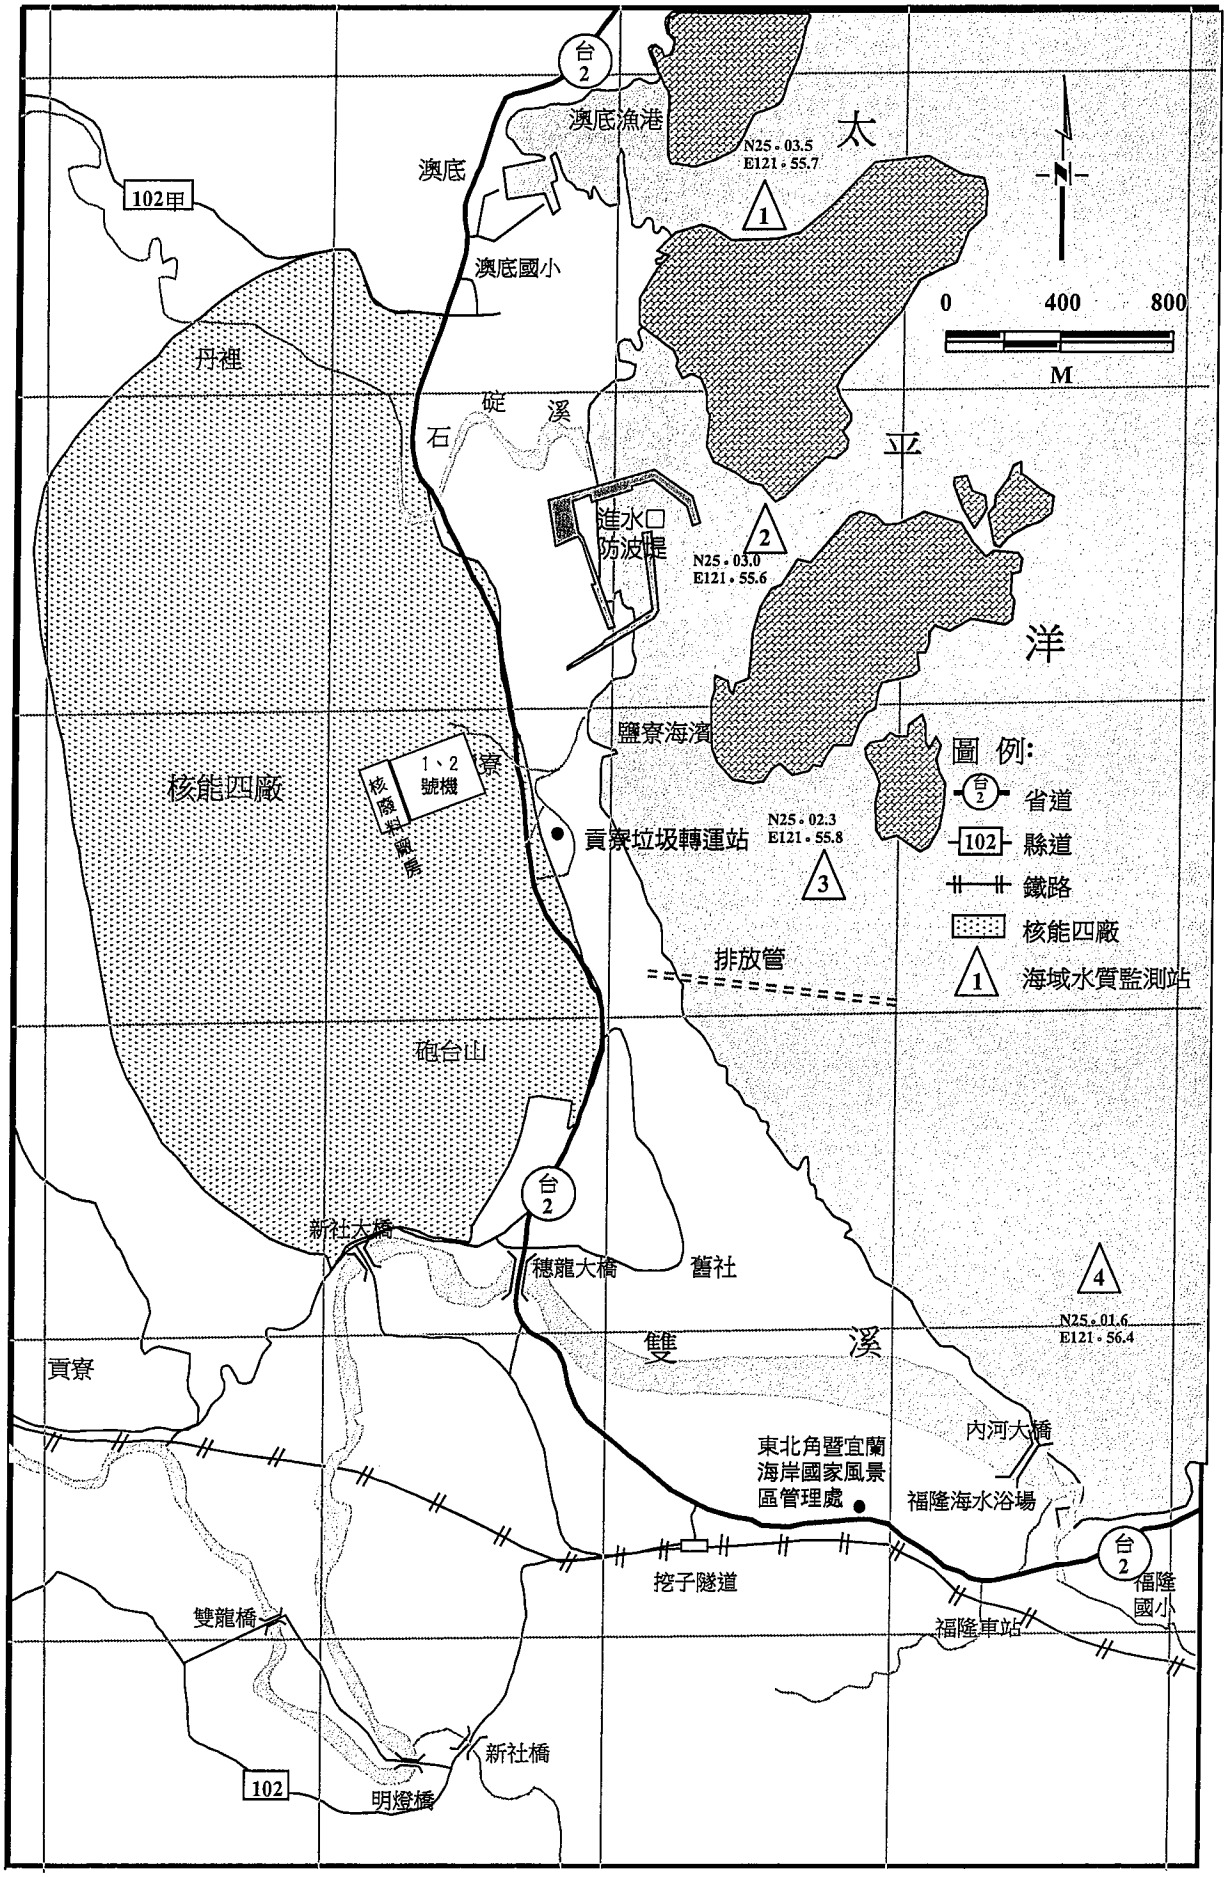


圖1.4-8 核四施工環境監測海域水質監測站位置圖

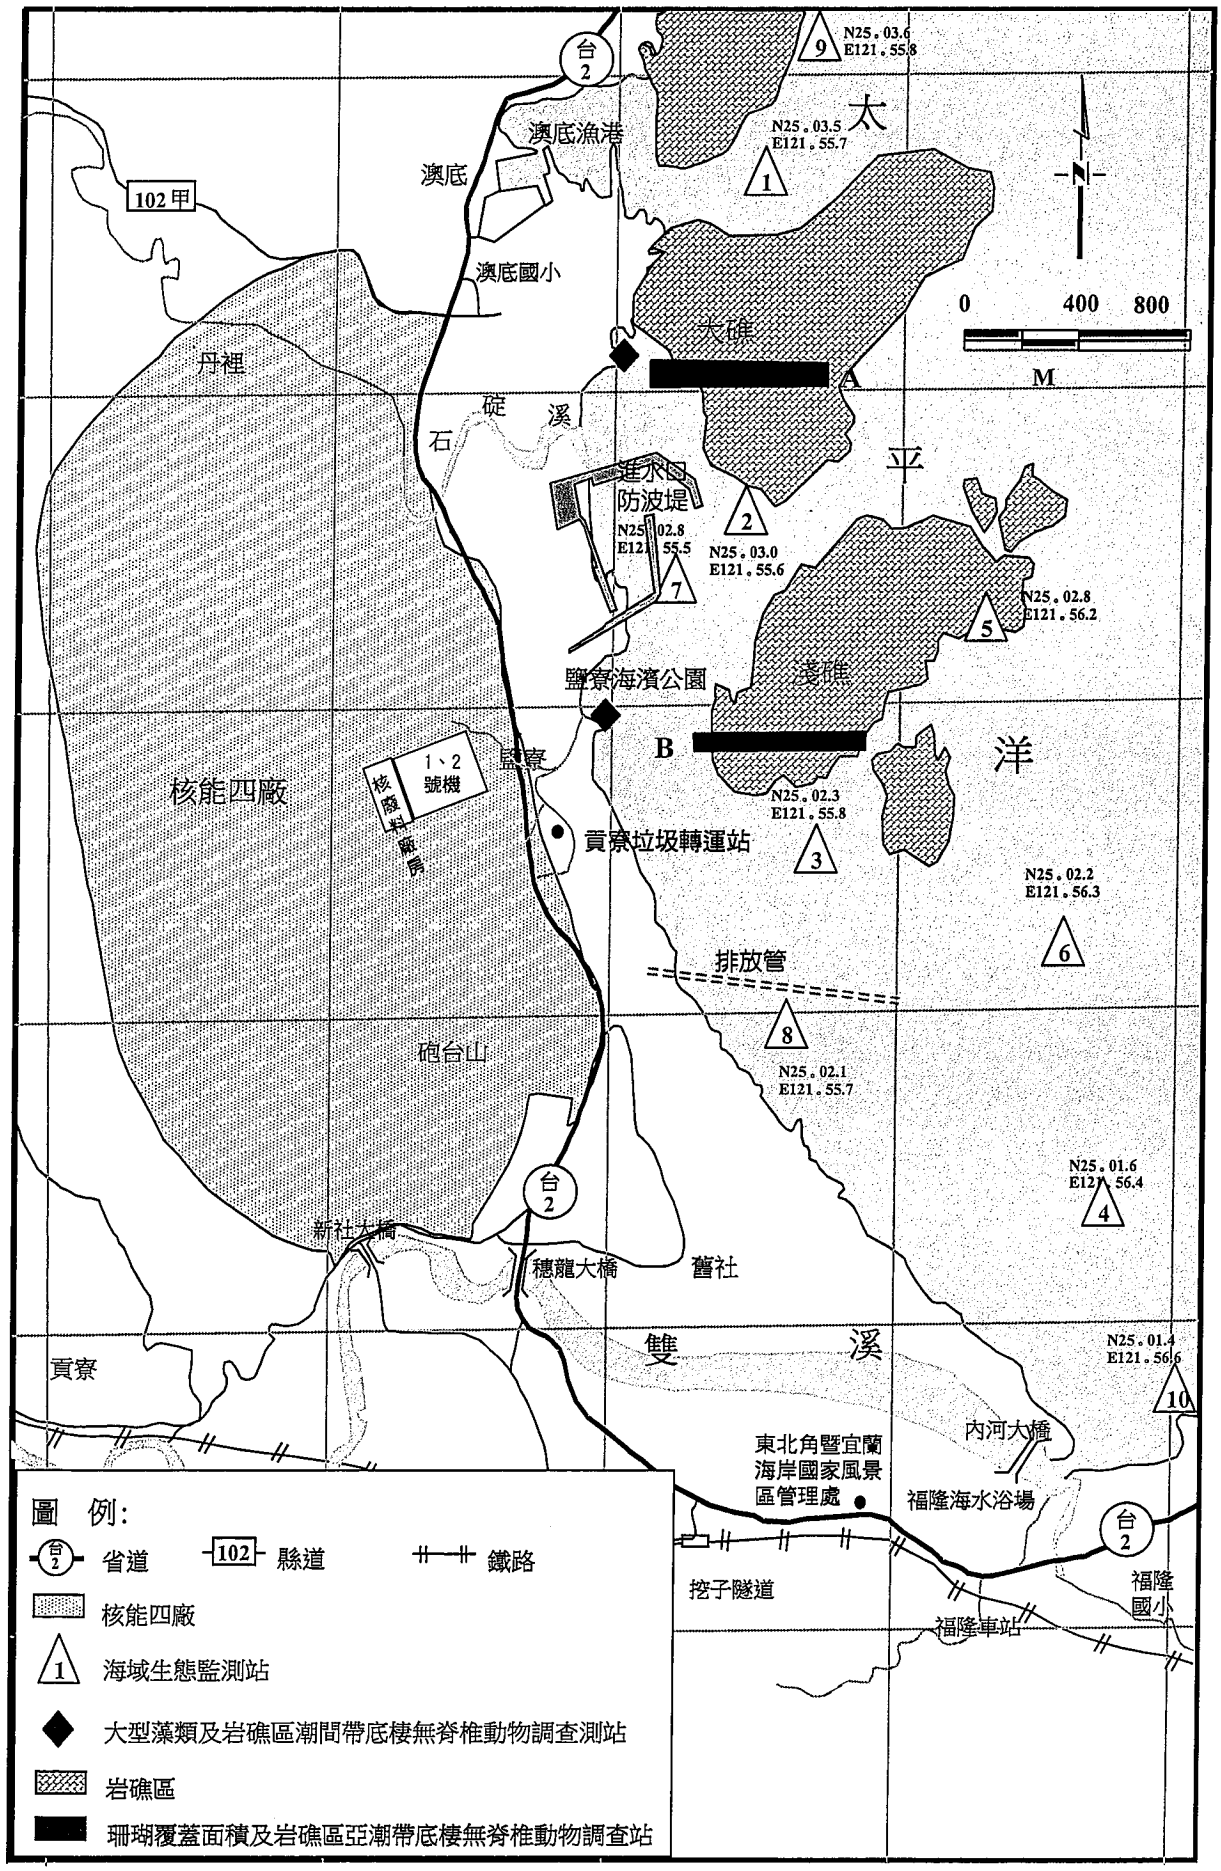


圖1.4-9 核四施工環境監測海域生態監測站位置圖

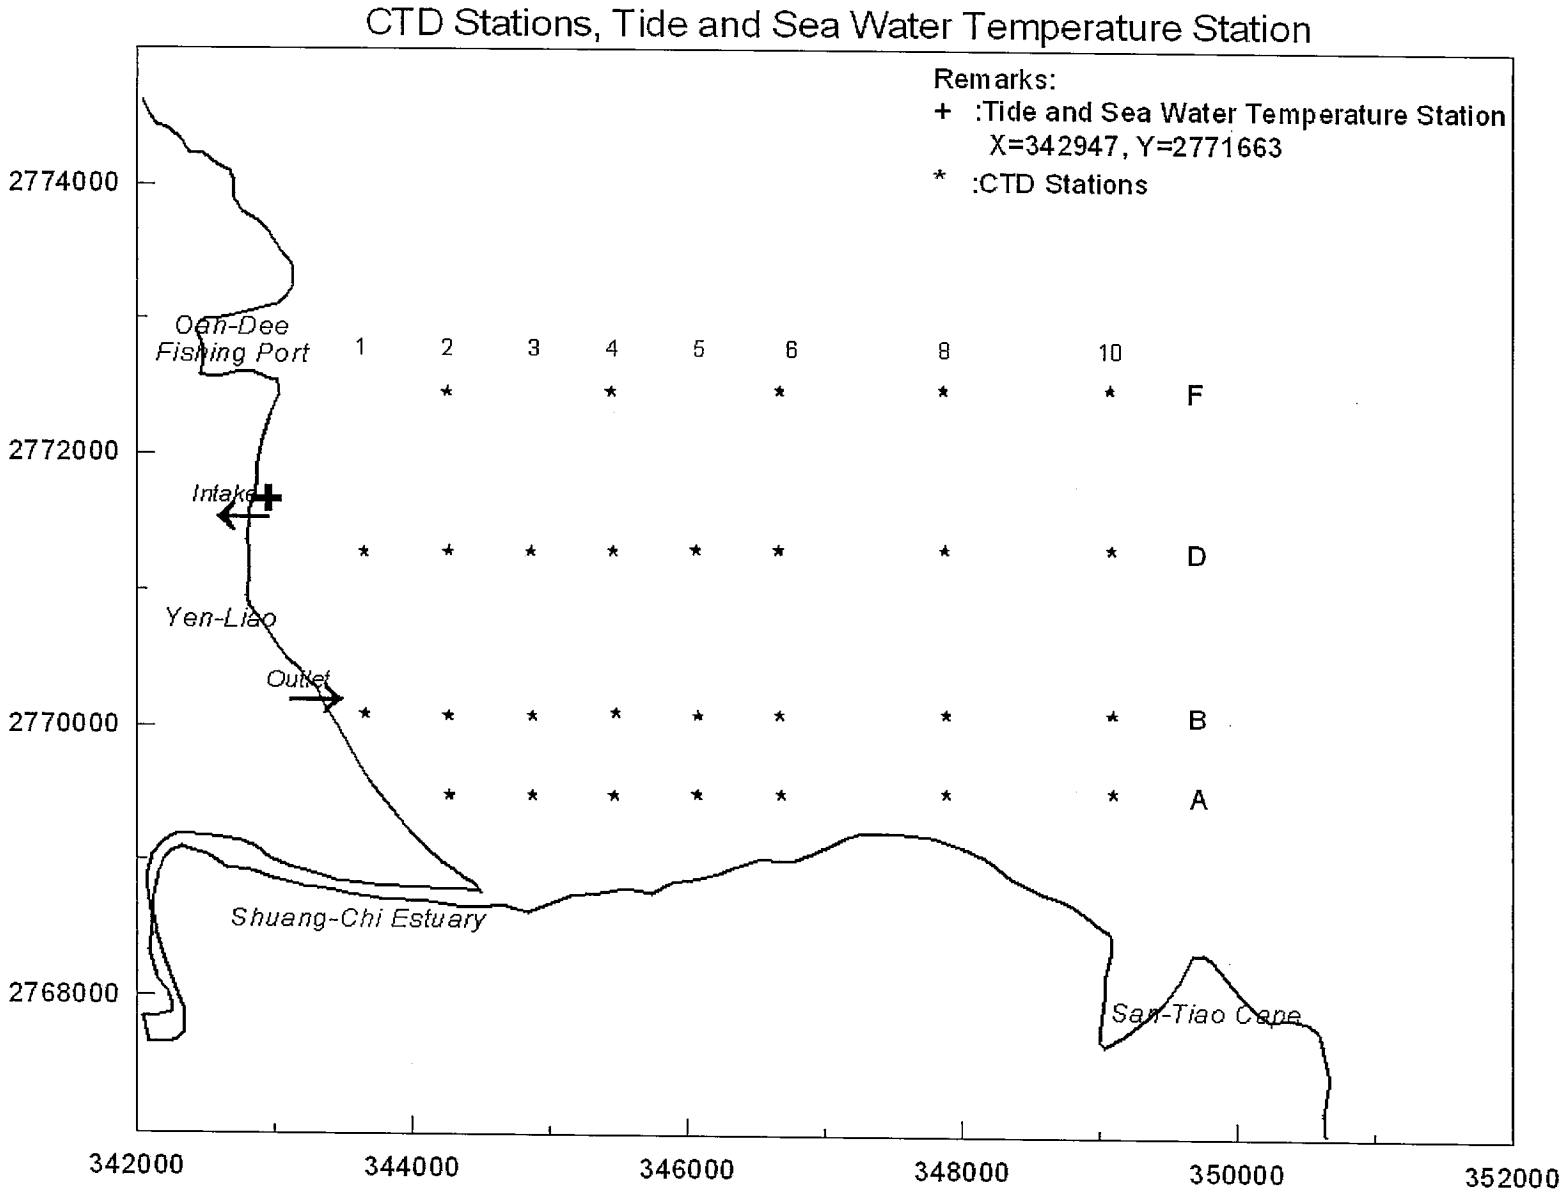


圖1.4-10 核四施工環境監測海象調查測站位置圖

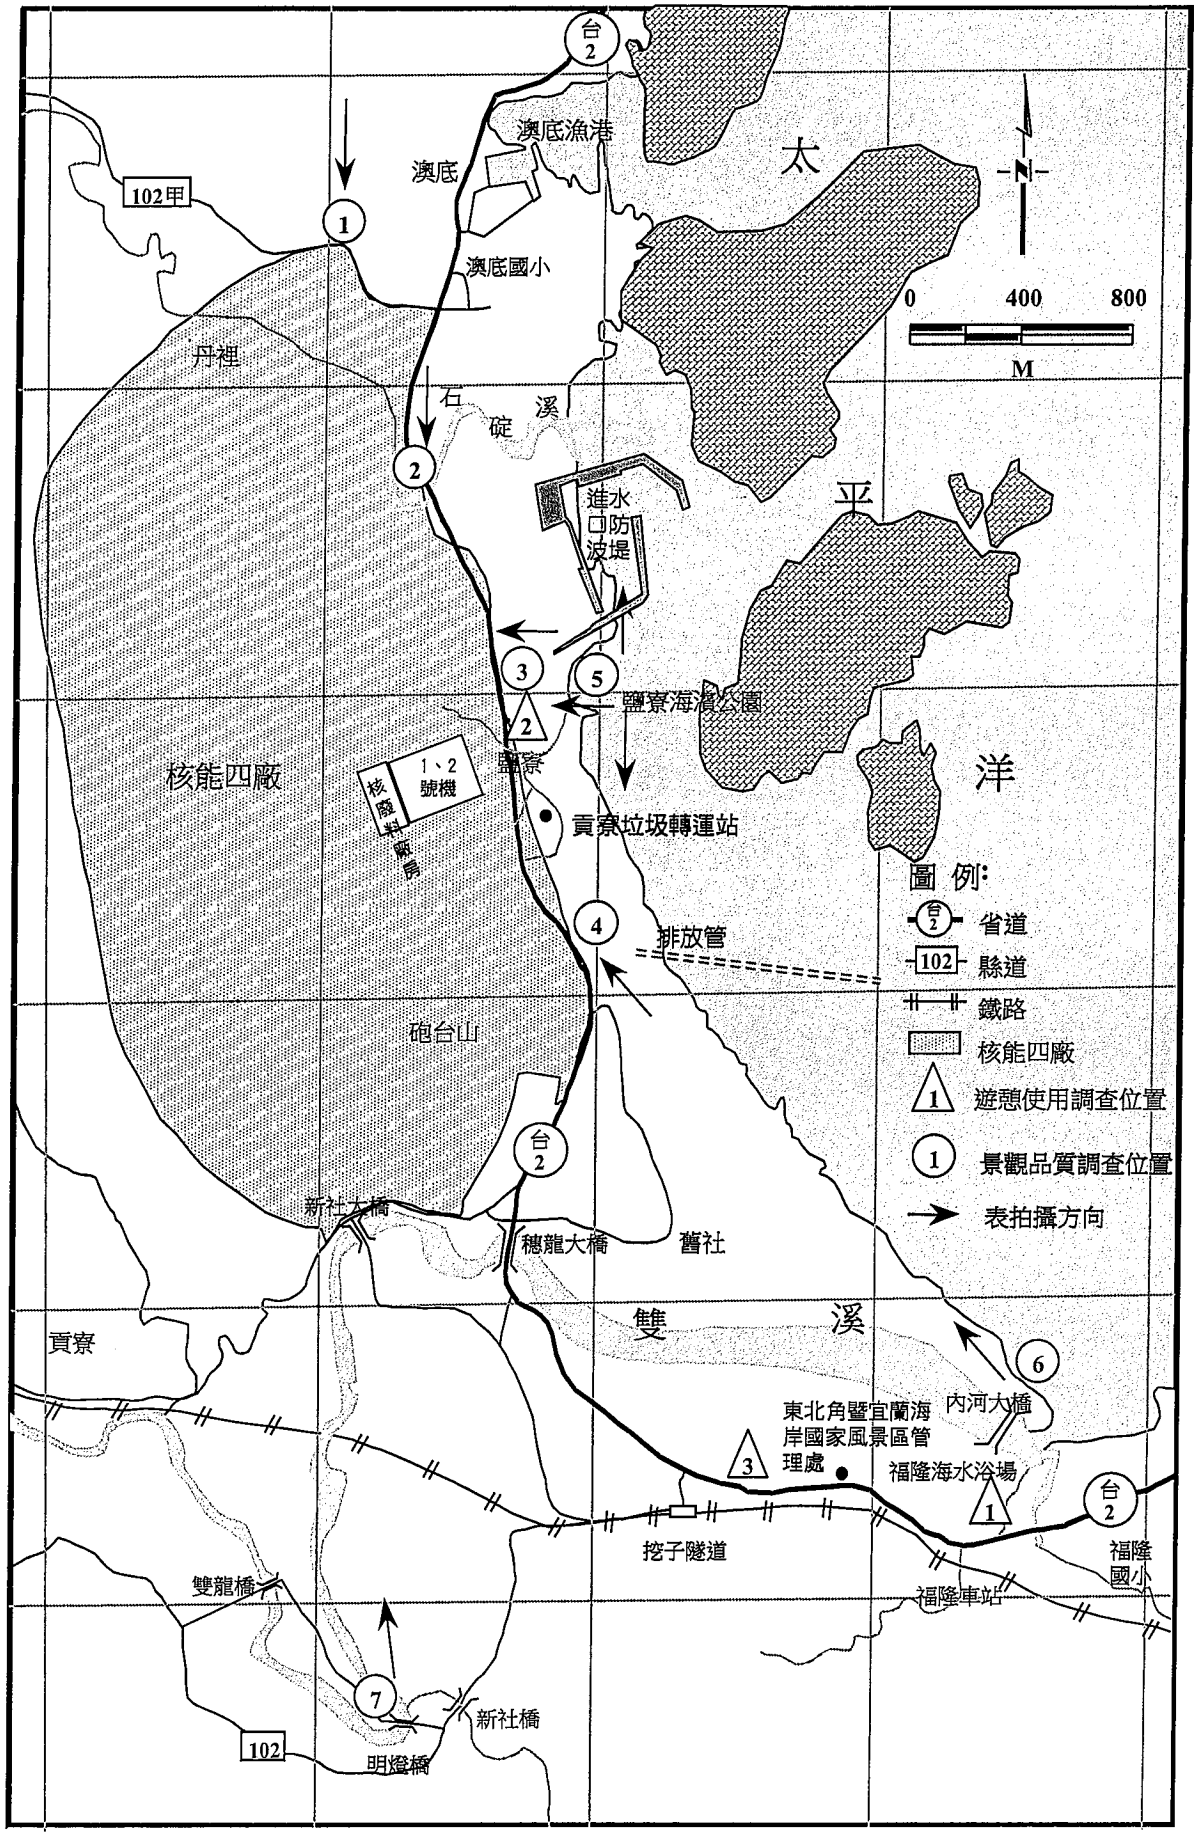


圖1.4-11 核四施工環境監測景觀環境品質及遊憩使用調查位置圖

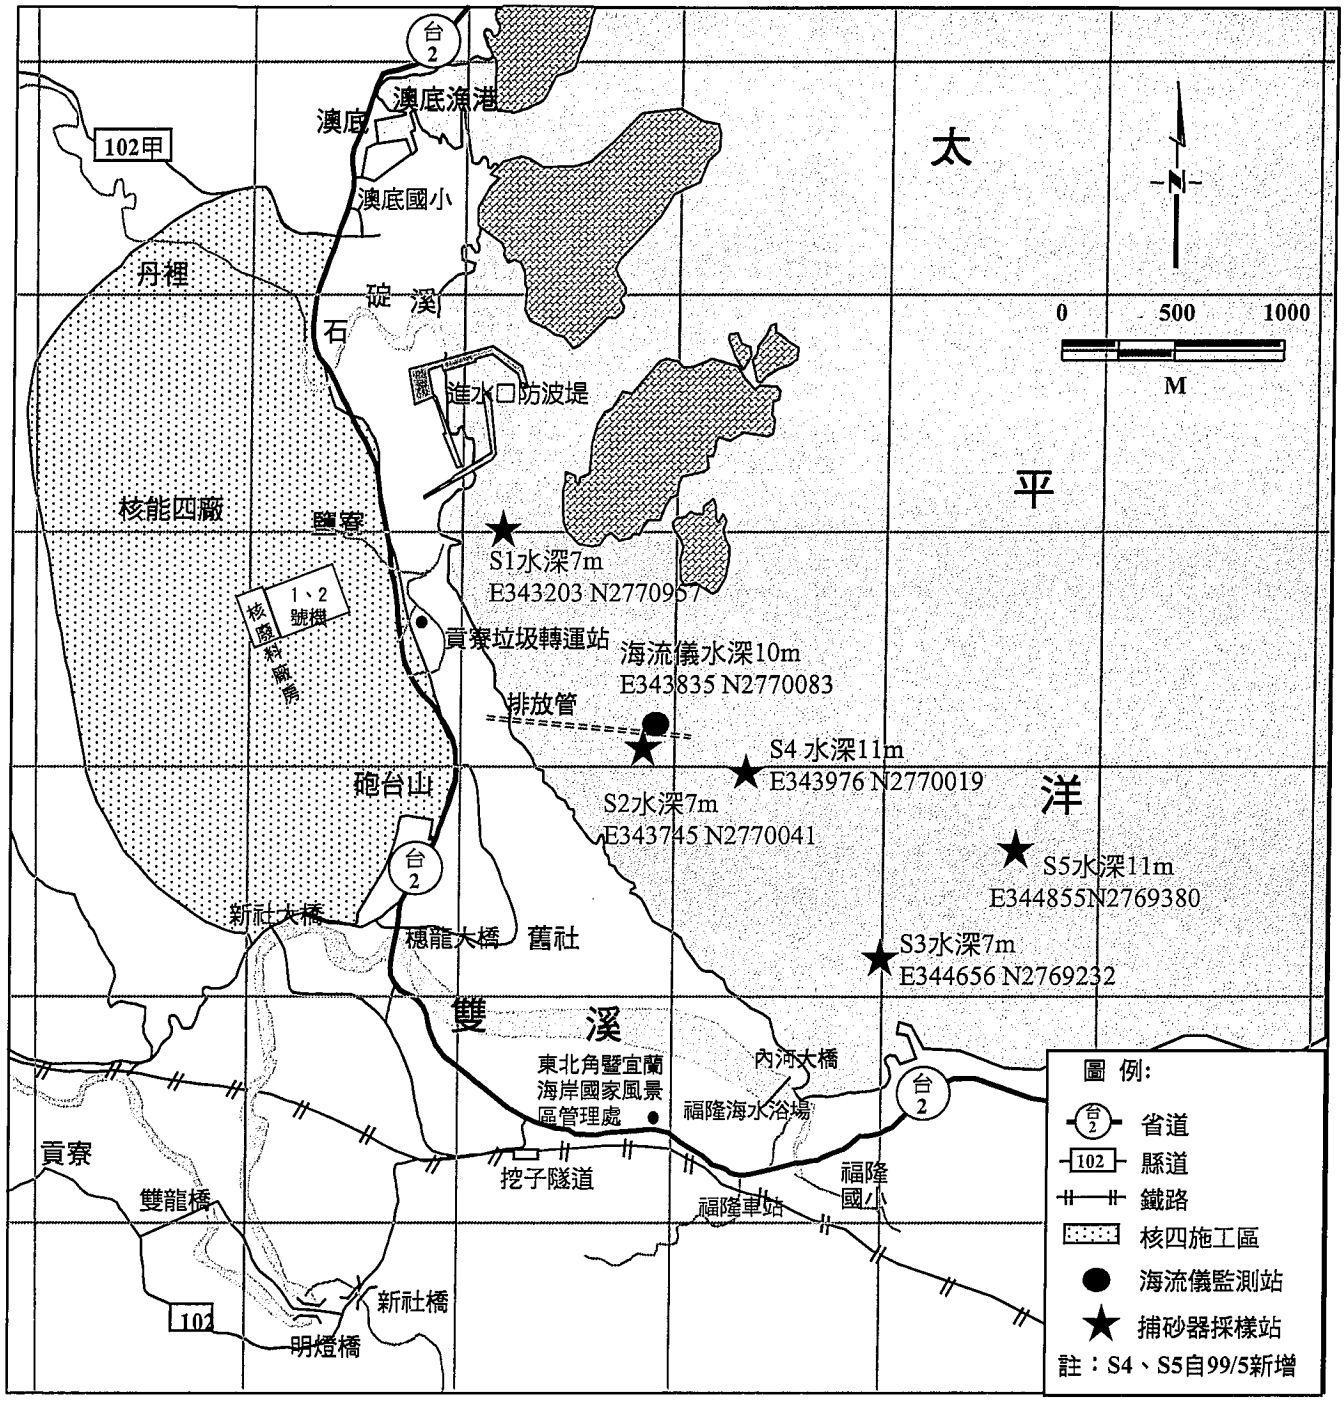


圖1.4-12 核四施工環境監測海域漂砂及海流監測位置圖


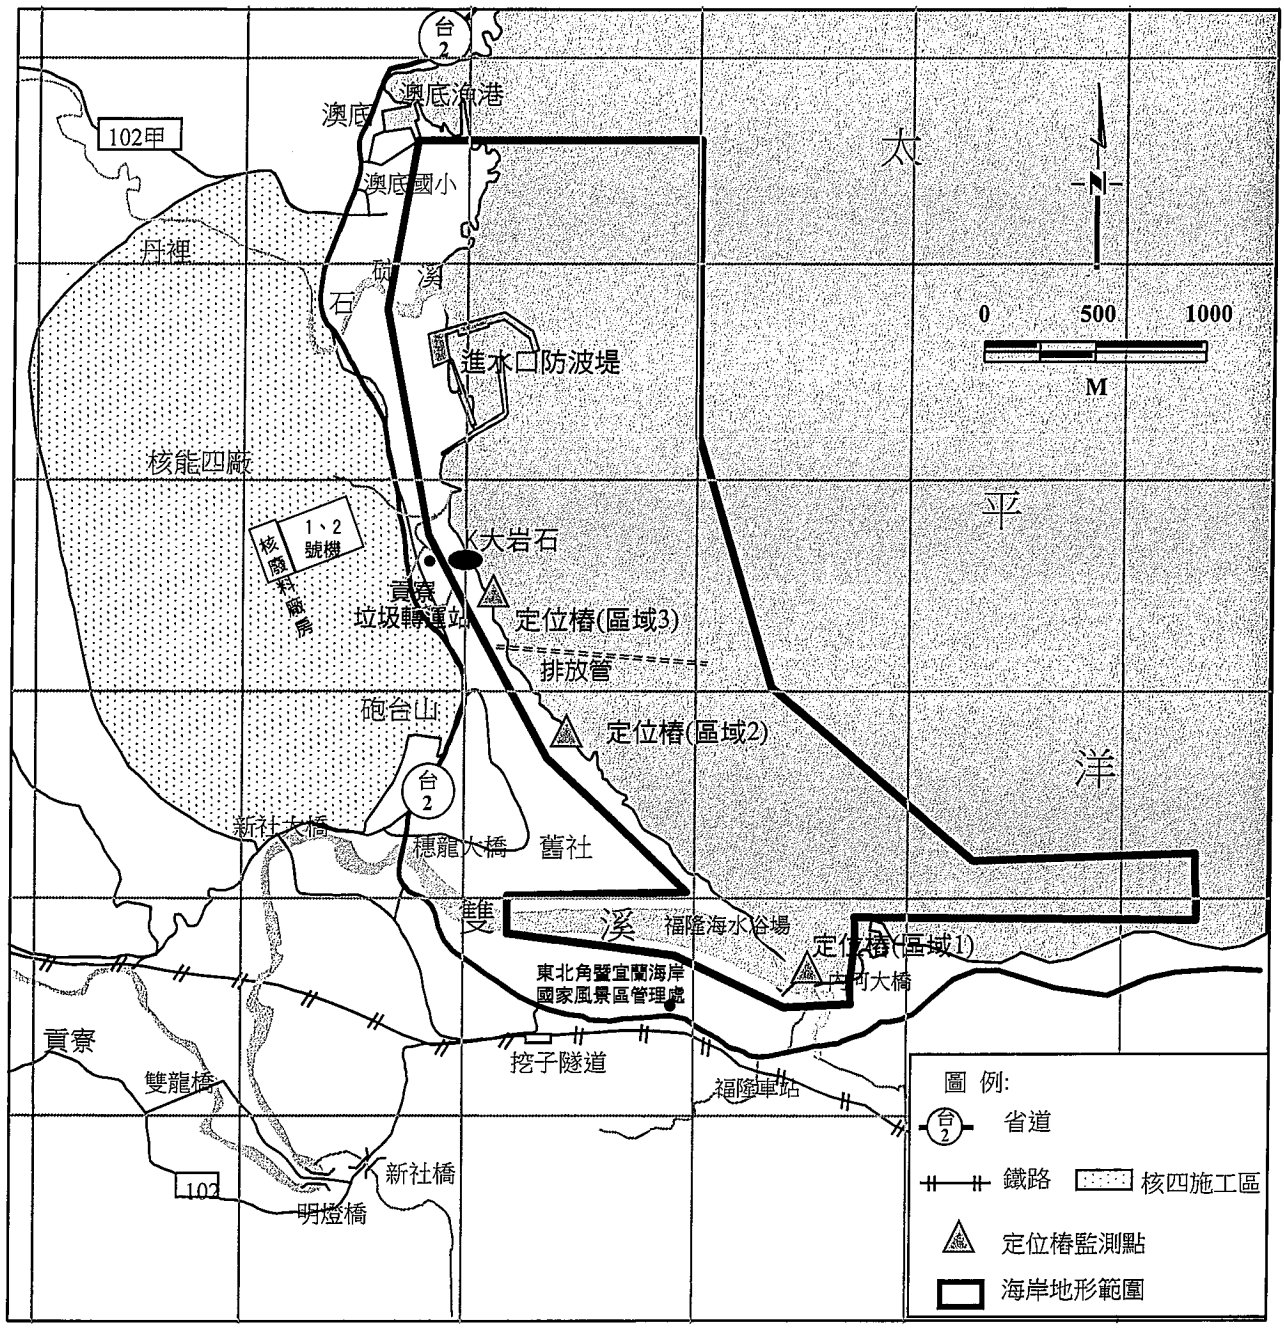


圖1.4-13 核四施工環境監測海岸地形調查範圍圖



照片 1.1-1 2號機反應器廠房施工現況（101/6/17)

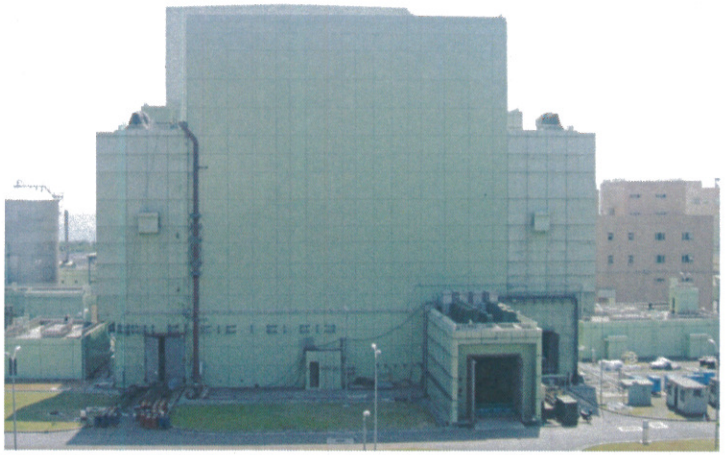

照片 1.1-2 核廢料廠房施工現況（101/6/17）



照片 1.1-3 抽水機房施工現況（101/6/17）



照片 1.1-4 汽機廠房 施工現況（101/6/17）

資料來源：台電公司

2 監測結果數據分析

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

氣象觀測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

第二章　監測結果數據分析

本季環境調查監測工作係「核能四廠發電工程施工期間環境監測」（以下簡稱核四施工環境監測）101 年第 2 季（4~6 月）之監測作業，本季進行之監測項目包括：氣象觀測、空氣品質監測、噪音與振動監測、交通流量監測、河川水文監測、河川水質監測、廠區水質、地下水監測、河域生態監測、海域水質監測、海域生態監測、漁業調查、海象調查、景觀遊憩調查、海域漂砂調查及海岸地形調查等 16 項；各監測項目詳細之監測時程請參照第一章表 1.3-1 所示，其執行情形整理如照片 2-1 所示，以下茲就本季各項監測結果分析說明如后。

2.1 氣象觀測

1.風向與風速

針對高、低氣象塔之風向與風速均進行 2 種不同高度之觀測，氣象低塔之觀測高度分別為標高 63 公尺及標高 21 公尺，氣象高塔則分別為標高 93 公尺及標高 63 公尺。

本季高、低氣象塔之盛行風向與平均風速監測結果，經整理詳如表 2.1-1 所示。而其逐時風向與風速月報表則列於附錄Ⅳ.1-1~附錄Ⅳ.1-12，依觀測結果繪製之風花圖詳如圖 2.1-1~圖 2.1-3 所示，風速風向聯合頻率分佈則列於附錄Ⅳ.1-13~附錄Ⅳ.1-24，茲分別說明如后。

(1)氣象低塔

本季低塔 63 公尺及 21 公尺所觀測之風向及風速監測結果，經整理統計詳如表 2.1-1 及圖 2.1-1~圖 2.1-3 所示，本季低塔 63 公尺氣象塔 4、6 月之其盛行風向均以南南東風為主，5 月之其盛行風向以北北東風為主，其各月最頻風向之頻率分別為 13.89%、13.98%及 12.22%。低

塔 21 公尺氣象塔 4 月其盛行風向以南南東風為主，5 月盛行風向為北北東風為主，6 月盛行風向以西北風為主，其 4~6 月盛行風向之頻率分別為 10.97%、15.99%及 11.94%。

本季（4~6 月）從氣象低塔觀測所得之平均風速，低塔 63 公尺分別為 3.1m/sec、3.1m/sec 及 3.0m/sec，而低塔 21 公尺則均為 1.6m/sec；由觀測結果可知，低塔 63 公尺因高程較高，所觀測之風速略較低塔 21 公尺為高。

⑵氣象高塔

本季高塔 93 公尺及 63 公尺所觀測之風向及風速監測結果，經整理統計詳如表 2.1-1 及圖 2.1-1~圖 2.1-3 所示。本季高塔 93 公尺觀測結果，4、6 月其盛行風向均以南風為主，5 月其盛行風向以北北東風為主，4~6 月之各月頻率分別為 15.69%、17.47%及 13.75%。高塔 63 公尺 4、6 月之盛行風向均以西南風為主，5 月之盛行風向以北北東風為主，4~6 月之各月份最頻風向所佔百分比分別為 16.25%、14.38%及 17.78%。

本季（4~6 月）從氣象高塔觀測所得之平均風速，在高塔 93 公尺分別為 3.7m/sec、4.0m/sec 及 4.0m/sec，而高塔 63 公尺則分別為 2.4 m/sec、2.6m/sec 及 2.6m/sec；由觀測結果可以看出，因高程之關係，高塔 93 公尺觀測所得之風速皆較高塔 63 公尺為高。

2.氣溫、露點溫度、相對濕度及雨量

氣溫與露點溫度與相對濕度係於氣象低塔附近之氣象觀測坪進行觀測，本季各月份逐日之平均氣溫、露點溫度、相對濕度及雨量，分別整理如表 2.1-2 至表 2.1-5 所示。本季 4~6 月之月平均氣溫分別為 22.1℃、24.5℃及 27.0℃，月平均露點溫度則分別為 19.2℃、21.2℃及 24.2℃；相對濕度則分別為 85.0%、83.9%及 85.2%；各月累計雨量分別為 204.5mm、499.0mm 及 297.5mm。

3.大氣穩定度（以垂直溫差推算）

大氣穩定度通常係以 Pasquill 穩定度分類法予以分類，其分類基準包括風向角標準差（動力因素）及垂直溫度梯度（熱力因素），詳見表 2.1-6 所示。依據本季氣象低塔（63 公尺與 21 公尺）及氣象高塔（93 公尺與 63 公尺）觀測之垂直溫差，再以 Pasquill 穩定度分類法計算其大氣穩定度機率分佈，結果詳如表 2.1-7 所示。

綜合本季低塔和高塔垂直溫差之觀測結果，氣象高、低塔之大氣穩定度多以 D 級（中性）及 E 級（微穩定）之分佈機率最高，D 級之分佈機率介於 12.92%~41.40%間，E 級之分佈機率介於 54.31%~87.08%間，至於其他等級之分佈機率則較少。

4.日射量及紫外線輻射量

日射量（全波段）及紫外線輻射量（波長介於 290nm~385nm）係於氣象低塔附近之氣象觀測坪進行觀測，本季各月份各時段之觀測結果整理如表 2.1-8 和表 2.1-9。於日射量之統計方面，本季 4~6 月之日累積量月平均值分別為 267.4cal/cm^2、342.6cal/cm^2 及 333.9cal/cm^2，日累積量最大值發生於 6 月 27 日之 665.1cal/cm^2；而在紫外線輻射量方面，本季 4~6 月日累積量之月平均值分別為 11.867cal/cm^2、15.421cal/cm^2 及 16.726 cal/cm^2，紫外線輻射量日累積最大值則發生於 6 月 27 日之 29.431 cal/cm^2；最大日射強度及紫外線輻射強度多發生於上午 11 時至下午 2 時之間，晚間 8 時至翌日早上 5 時因無太陽照射，其日射量及紫外線輻射量均為 0.0cal/cm^2。

表2.1-1 核四施工環境監測風速與風向101年第2季觀測結果

類別	時間	平均風速(m/sec)	盛行風向	所佔百分比 (%)
低塔63公尺	101年4月	3.1	南南東風	13.89
	100年4月	3.4	南風	12.08
	歷年同期	3.3	南風	11.60
	101年5月	3.1	北北東風	13.98
	100年5月	3.2	東北風	10.62
	歷年同期	3.0	南風	11.60
	101年6月	3.0	南南東風	12.22
	100年6月	3.2	南南東風	20.00
	歷年同期	2.8	南風	13.80
低塔21公尺	101年4月	1.6	南南東風	10.97
	100年4月	1.0	西北風	14.03
	歷年同期	2.3	西北風	12.10
	101年5月	1.6	北北東風	15.99
	100年5月	1.8	西北風	12.90
	歷年同期	2.1	西北風	13.20
	101年6月	1.6	西北風	11.94
	100年6月	2.0	南風	16.67
	歷年同期	2.1	西北風	13.30
高塔93公尺	101年4月	3.7	南風	15.69
	100年4月	4.4	南南東風	15.56
	歷年同期	3.9	北風	12.60
	101年5月	4.0	北北東風	17.47
	100年5月	4.2	南風	14.25
	歷年同期	3.6	南風	12.30
	101年6月	4.0	南風	13.75
	100年6月	4.2	南風	25.56
	歷年同期	3.4	南風	14.30
高塔63公尺	101年4月	2.4	西南風	16.25
	100年4月	3.1	西南風	12.50
	歷年同期	2.8	北北東風	11.90
	101年5月	2.6	北北東風	14.38
	100年5月	2.9	西南風	11.16
	歷年同期	2.6	西南風	12.00
	101年6月	2.6	西南風	17.78
	100年6月	2.7	南風	22.22
	歷年同期	2.4	西南風	14.30

註：(1)歷年測值資料來源為台電電源開發處。
(2)低塔21公尺之歷年資料統計時間自民國69年10月至100年12月，其他之歷年資料統計時間自民國71年12月至100年12月。

表2.1-2 核四施工環境監測氣溫101年第2季觀測結果

日期 \ 月份	101年4月	101年5月	101年6月
1	19.6	26.1	24.5
2	21.7	26.0	24.7
3	20.5	22.2	24.8
4	19.9	19.8	25.0
5	18.6	21.7	25.0
6	17.6	21.6	25.6
7	18.7	24.0	28.2
8	20.3	25.6	28.3
9	20.7	24.3	29.3
10	24.4	22.7	29.4
11	24.9	22.8	28.2
12	24.0	24.1	24.5
13	25.2	26.6	25.1
14	21.8	27.5	25.2
15	23.9	25.8	26.9
16	19.4	25.1	27.2
17	19.8	22.7	27.9
18	22.2	23.9	28.3
19	23.0	24.7	26.5
20	23.3	22.7	25.8
21	24.3	23.1	24.8
22	21.1	23.7	26.3
23	24.7	24.4	26.8
24	25.0	27.1	27.2
25	26.2	26.3	28.3
26	19.0	25.1	28.8
27	20.0	23.9	30.0
28	22.8	24.1	29.8
29	23.8	25.6	29.5
30	25.3	26.5	29.0
31	-	24.6	-
月 平 均	22.1	24.5	27.0
歷年同期平均	21.0	24.0	26.5
100 年 同 期	20.8	23.7	28.1

註：(1)單位為℃。

(2)歷年平均資料來源為台電電源開發處100年水文氣象年表，資料統計時間自民國69.7~100.12。

表2.1-3 核四施工環境監測露點溫度101年第2季觀測結果

日期 \ 月份	101年4月	101年5月	101年6月
1	13.2	22.3	21.8
2	18.2	22.4	22.5
3	15.5	20.3	22.7
4	14.8	19.5	23.6
5	18.0	17.7	22.4
6	15.3	18.0	22.9
7	15.8	19.0	24.1
8	17.4	21.3	24.4
9	19.0	22.6	24.8
10	20.8	21.2	24.7
11	21.8	21.4	24.4
12	21.9	22.8	24.0
13	21.7	23.4	23.3
14	19.2	23.0	24.4
15	21.2	23.4	25.0
16	18.3	24.0	25.7
17	17.1	21.5	25.7
18	19.4	20.4	25.3
19	21.2	21.9	24.6
20	21.9	21.4	24.6
21	22.1	18.5	22.8
22	18.3	17.8	24.2
23	20.8	20.8	24.3
24	23.0	21.0	24.8
25	23.5	21.4	24.8
26	17.3	20.8	25.1
27	18.6	21.3	25.0
28	20.2	21.7	25.4
29	20.9	23.2	24.7
30	21.7	24.2	24.8
31	-	21.9	-
月平均	19.2	21.2	24.2
歷年同期平均	18.3	21.1	23.6
100年同期	16.8	20.9	23.9

註：(1)單位為℃。

(2)歷年平均資料來源為台電電源開發處100年水文氣象年表，資料統計時間自民國83.7~100.12。

表2.1-4 核四施工環境監測相對濕度101年第2季觀測結果

日期 \ 月份	101年4月	101年5月	101年6月
1	66.9	80.7	85.1
2	81.3	81.9	87.7
3	73.7	89.1	88.0
4	73.2	98.0	91.9
5	96.4	79.4	85.6
6	87.9	81.5	85.0
7	84.2	75.1	78.7
8	83.8	78.0	79.7
9	90.7	90.4	77.1
10	81.0	91.1	76.2
11	83.8	92.0	80.0
12	87.9	92.3	97.1
13	82.0	83.2	89.8
14	84.9	77.3	95.8
15	85.4	86.8	89.6
16	93.5	93.7	91.5
17	85.6	92.6	88.0
18	85.3	81.0	84.1
19	90.0	85.2	89.6
20	91.7	92.6	92.7
21	87.5	76.0	88.3
22	84.8	70.2	88.9
23	79.2	80.3	86.3
24	89.7	69.9	86.8
25	85.9	74.6	81.9
26	90.0	77.1	80.4
27	92.0	85.8	75.1
28	86.0	86.5	77.5
29	84.6	86.8	75.6
30	81.5	87.6	78.8
31	-	85.0	-
月 平 均	85.0	83.9	85.2
歷年同期平均	84.3	85.2	84.4
100 年 同 期	78.4	85.1	78.5

註：(1)單位為%。

(2)歷年平均資料來源為台電電源開發處100年水文氣象年表，資料統計時間自民國69.7~100.12。

表2.1-5 核四施工環境監測雨量101年第2季觀測結果

日期 \ 月份	101年4月	101年5月	101年6月
1	0.0	0.0	0.0
2	0.0	47.5	0.0
3	0.0	13.0	0.5
4	0.0	48.5	6.0
5	9.5	0.0	0.0
6	1.0	0.0	0.0
7	1.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.5
9	20.0	28.5	6.0
10	0.0	11.0	5.0
11	5.5	7.0	15.0
12	0.0	26.0	193.0
13	0.0	0.0	0.5
14	0.0	0.0	29.5
15	3.5	52.0	4.5
16	23.5	31.5	1.0
17	7.0	24.0	4.0
18	3.0	0.0	0.0
19	0.0	7.0	9.5
20	3.0	0.0	8.5
21	10.5	0.0	5.0
22	13.0	0.0	0.5
23	0.0	0.0	0.0
24	4.5	0.0	0.0
25	1.0	0.0	0.0
26	75.0	0.0	0.0
27	7.5	45.0	0.0
28	1.0	39.5	7.5
29	6.0	33.5	0.5
30	9.0	84.0	0.5
31	-	1.0	-
累計雨量	204.5	499.0	297.5
歷年同期平均	171.3	222.2	249.9
100 年 同 期	60.0	280.0	163.5

註：(1)單位為mm。

(2)歷年平均資料來源為台電電源開發處100年水文氣象年表，資料統計時間自民國55.1~100.12。

表2.1-6 巴斯魁爾(Pasquill)穩定度分類法

大氣穩定度分類	巴斯魁爾	風向角標準差	垂直溫度梯度
極不穩定	A	≧22.5°	<-1.9
中程度不穩定	B	17.5°～22.4°	-1.9～-1.7
微不穩定	C	12.5°～17.4°	-1.7～-1.5
中性	D	7.5°～12.4°	-1.5～-0.5
微穩定	E	3.8°～7.4°	-0.5～1.5
中程度穩定	F	1.3°～3.7°	1.5～4.0
極穩定	G	<1.3°	>4.0

註：垂直溫度梯度之單位為℃/100公尺。

表2.1-7 施工環境監測大氣穩定度101年第2季頻率分佈統計表

月份 \ 等級			A	B	C	D	E	F	G
101年第2季	4月	氣象低塔	0.00	0.00	0.00	12.92	87.08	0.00	0.00
		氣象高塔	0.00	0.14	0.00	14.58	85.28	0.00	0.00
	5月	氣象低塔	0.00	0.00	0.00	41.40	58.60	0.00	0.00
		氣象高塔	0.00	0.00	0.27	18.68	81.05	0.00	0.00
	6月	氣象低塔	0.14	0.14	0.28	28.61	69.17	1.67	0.00
		氣象高塔	3.61	0.42	2.78	31.11	54.31	7.78	0.00
100年同期	4月	氣象低塔	2.22	1.39	1.67	25.69	65.28	3.75	0.00
		氣象高塔	6.11	1.81	1.67	17.64	62.78	10.00	0.00
	5月	氣象低塔	7.80	2.96	4.17	36.69	33.47	13.84	1.08
		氣象高塔	18.68	3.23	2.28	18.01	24.87	27.28	5.65
	6月	氣象低塔	5.83	1.67	1.11	23.06	41.53	20.97	5.83
		氣象高塔	12.78	2.22	2.50	13.89	40.14	22.22	6.25
歷年	4月	氣象低塔	4.43	3.54	4.92	30.25	43.19	9.30	4.37
		氣象高塔	9.08	2.38	3.82	24.71	45.57	11.17	3.27
	5月	氣象低塔	5.18	4.21	4.92	29.59	39.68	11.13	5.30
		氣象高塔	9.96	2.90	4.18	23.38	42.06	13.72	3.81
	6月	氣象低塔	6.50	5.34	5.52	27.53	37.62	13.44	4.05
		氣象高塔	9.44	3.30	5.33	25.40	36.80	14.45	5.28

註：1.各穩定度等級發生頻率以%表示。

2.本表之大氣穩定度係依垂直溫度梯度推算而得。

3.歷年統計值係依據電源開發處氣象月報表統計，其資料統計時間自民國83年1月至100年12月

表2.1-8 核四施工環境監測日射量101年第2季觀測結果

單位：cal/cm^2

月份 / 日期	101年4月			101年5月			101年6月		
	日累積量	日最大值（發生時間）		日累積量	日最大值（發生時間）		日累積量	日最大值（發生時間）	
1	111.9	22.6	(11)	445.3	68.3	(11)	220.5	34.8	(16)
2	394.5	71.1	(14)	331.4	73.9	(12)	118.0	16.1	(16)
3	262.0	39.5	(10)	184.0	38.6	(12)	77.3	16.9	(13)
4	498.7	74.8	(12)	40.4	7.0	(12)	198.2	40.2	(13)
5	36.1	6.1	(12)	626.9	84.1	(12)	283.2	45.5	(11)
6	39.0	7.1	(10)	651.8	86.7	(12)	268.4	38.5	(10)
7	193.6	34.8	(11)	643.8	84.0	(12)	640.9	84.3	(13)
8	152.5	41.5	(10)	507.7	85.3	(12)	519.7	72.1	(12)
9	120.4	23.5	(11)	216.7	65.3	(13)	440.1	79.2	(12)
10	442.2	75.5	(11)	120.4	25.9	(11)	360.8	49.5	(15)
11	473.4	65.0	(11)	137.7	31.8	(13)	261.5	46.0	(10)
12	490.6	86.4	(12)	139.4	27.9	(14)	25.3	8.1	(13)
13	499.5	71.4	(12)	540.8	80.8	(11)	234.5	37.8	(12)
14	57.9	10.4	(14)	647.3	88.6	(12)	110.8	24.5	(14)
15	187.4	52.3	(10)	381.9	85.2	(12)	266.9	60.0	(13)
16	43.6	6.6	(14)	113.6	38.7	(12)	370.0	61.7	(11)
17	216.1	44.6	(11)	126.1	26.1	(14)	398.2	76.4	(13)
18	345.9	69.1	(12)	508.9	77.8	(11)	465.2	66.3	(11)
19	245.1	41.7	(11)	341.1	73.4	(11)	258.3	46.7	(13)
20	96.5	17.3	(15)	126.1	26.1	(14)	104.8	20.9	(9)
21	341.4	62.1	(10)	462.9	80.2	(12)	135.8	24.3	(12)
22	265.1	53.3	(14)	465.4	74.8	(12)	421.0	80.8	(12)
23	587.8	76.3	(13)	525.4	74.6	(14)	498.1	81.9	(14)
24	323.4	67.4	(14)	651.7	84.0	(12)	521.4	81.3	(11)
25	231.7	49.5	(10)	534.0	84.0	(12)	493.2	89.1	(12)
26	69.5	16.2	(10)	350.1	73.7	(11)	497.5	79.9	(11)
27	116.7	24.6	(9)	62.9	9.5	(11)	665.1	84.4	(12)
28	326.3	71.8	(12)	84.6	16.7	(11)	459.6	73.7	(11)
29	335.7	70.6	(10)	178.6	34.9	(10)	513.5	77.5	(11)
30	518.3	86.4	(12)	263.4	56.4	(14)	521.7	79.9	(14)
31	-	-	(-)	209.0	48.9	(15)	-	-	(-)
月平均值	267.4			342.6			333.9		
歷年同期月平均值	256.7			309.1			369.7		
100年同期月平均值	361.4			287.3			475.3		

註：1.日最大值發生時間為〝時〞。

2.歷年平均值資料來源為台電電源開發處民國100年水文氣象年表，其資料統計時間自民國69.7~100.12。

表2.1-9 核四施工環境監測紫外線輻射量101年第2季觀測結果


單位：cal/cm^2

月份 / 日期	101年4月			101年5月			101年6月		
	日累積量	日最大值	（發生時間）	日累積量	日最大值	（發生時間）	日累積量	日最大值	（發生時間）
1	5.731	1.118	(11)	18.186	2.709	(11)	12.026	1.694	(16)
2	16.611	2.754	(14)	14.090	2.917	(12)	7.199	0.852	(16)
3	10.490	1.607	(13)	8.848	1.772	(12)	5.083	1.062	(13)
4	18.215	2.824	(13)	2.609	0.426	(12)	11.034	2.144	(13)
5	2.033	0.317	(11)	22.809	3.212	(12)	14.926	2.266	(11)
6	2.463	0.373	(10)	23.385	3.296	(12)	13.972	1.965	(10)
7	9.232	1.595	(11)	26.170	3.676	(12)	28.165	3.978	(12)
8	6.790	1.657	(10)	22.650	3.795	(12)	22.672	3.228	(12)
9	6.513	1.206	(11)	10.834	2.992	(13)	21.118	3.781	(12)
10	18.310	3.049	(11)	7.371	1.524	(11)	17.922	2.393	(11)
11	20.494	2.847	(11)	8.357	1.739	(13)	14.429	2.323	(10)
12	22.480	3.864	(12)	8.376	1.581	(14)	2.309	0.587	(14)
13	22.074	3.214	(12)	24.271	3.620	(12)	12.110	1.932	(12)
14	3.919	0.613	(12)	26.956	3.789	(12)	6.822	1.398	(14)
15	8.962	2.216	(10)	16.907	3.591	(12)	14.789	3.060	(13)
16	2.964	0.412	(13)	6.742	2.013	(12)	18.728	3.016	(13)
17	10.875	2.080	(11)	7.324	1.472	(14)	19.918	3.731	(13)
18	15.852	3.030	(12)	21.014	3.205	(11)	22.311	3.054	(11)
19	12.242	2.098	(11)	16.517	3.203	(11)	14.042	2.438	(13)
20	5.464	0.879	(15)	7.324	1.472	(14)	6.557	1.142	(9)
21	15.622	2.575	(10)	22.747	3.660	(12)	8.376	1.489	(12)
22	12.641	2.290	(14)	20.570	3.394	(12)	21.706	3.893	(12)
23	23.232	3.206	(13)	22.724	3.187	(13)	24.332	3.774	(14)
24	14.644	2.855	(14)	27.134	3.697	(12)	25.656	3.801	(11)
25	10.500	2.153	(10)	22.821	3.642	(12)	24.289	4.214	(12)
26	3.848	0.789	(10)	16.533	3.359	(11)	24.399	3.747	(11)
27	5.746	0.990	(9)	4.183	0.636	(11)	29.431	3.943	(12)
28	13.998	2.812	(12)	5.493	0.995	(11)	22.823	3.542	(11)
29	13.831	2.620	(10)	9.881	1.850	(10)	25.936	3.863	(13)
30	20.316	3.356	(12)	13.907	2.699	(14)	25.440	3.857	(13)
31	-	-	(-)	11.3	2.4	(15)	-	-	(-)
月平均值	11.867			15.421			16.726		
歷年同期月平均值	10.630			13.530			16.470		
100年同期月平均值	14.900			13.500			22.700		

註：1.日最大值發生時間為〝時〞


2.歷年平均值資料來源為台電電源開發處民國100年水文氣象年表，其資料統計時間自民國84.1~100.12。

101/04/01-101/04/30

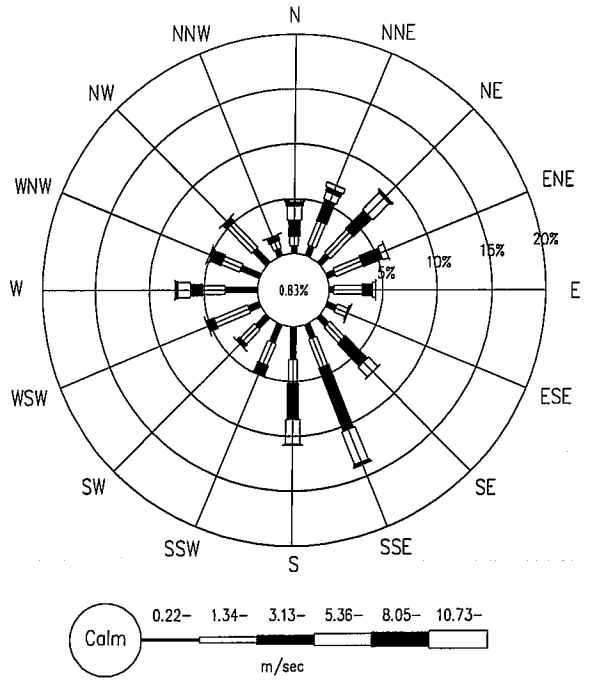


低塔63公尺

101/04/01-101/04/30

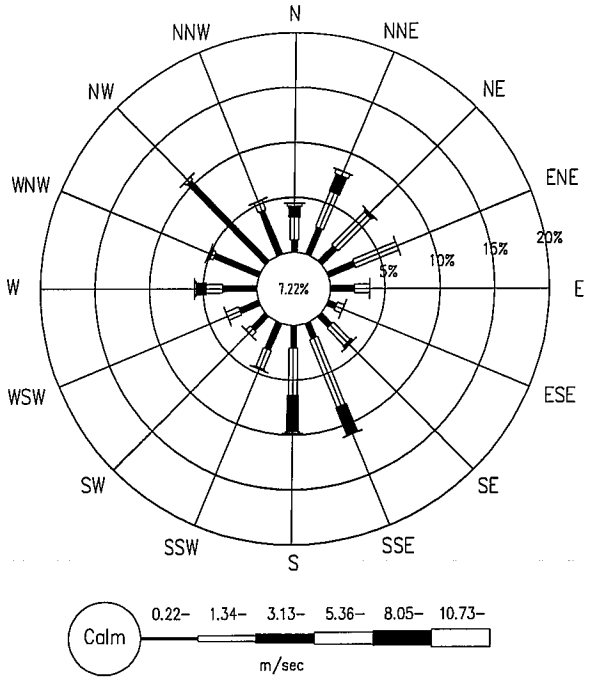


低塔21公尺

101/04/01-101/04/30

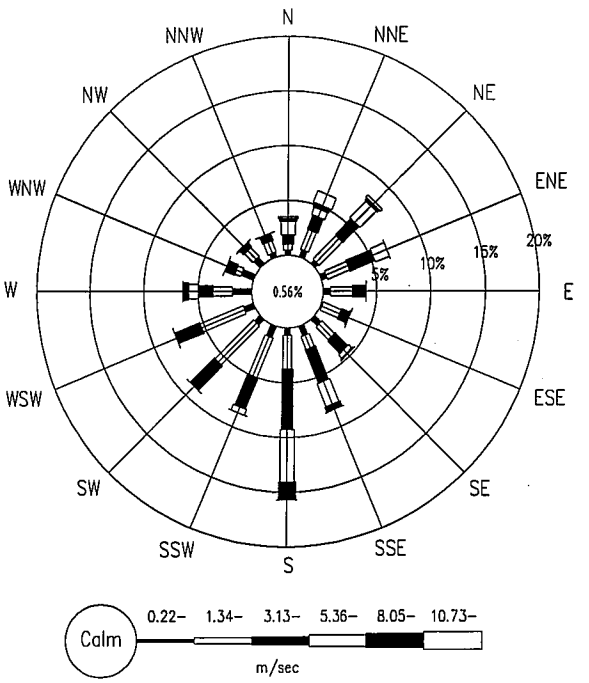

高塔93公尺

101/04/01-101/04/30

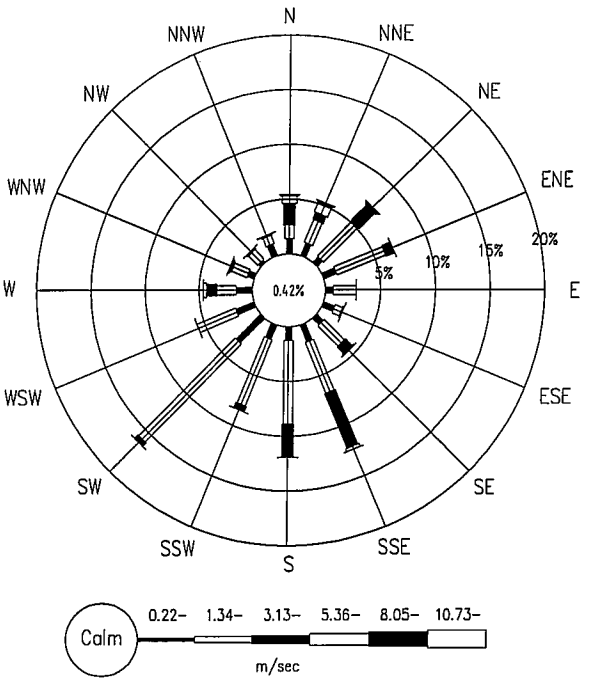


高塔63公尺

MWH

圖2.1-1 核四施工環境監測氣象塔
101年4月風花圖


N:\CadDwg\000\017-14\Rose101-456.dwg_2012_0712_14:13_Paul Chen

101/05/01-101/05/31

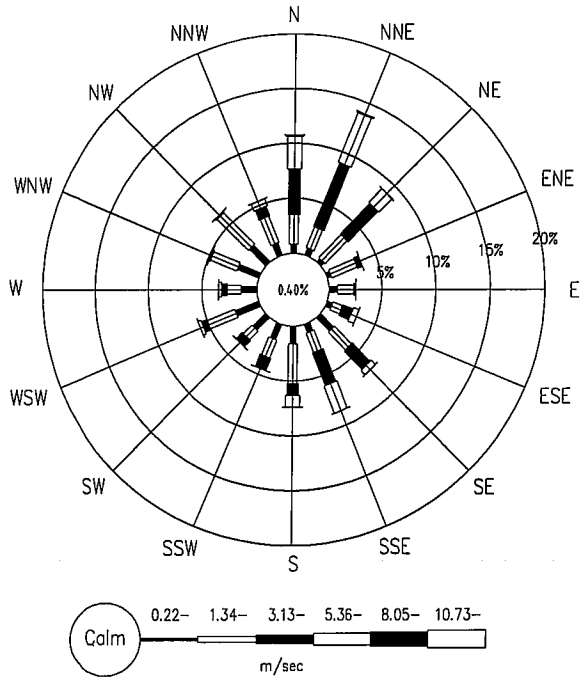


低塔63公尺

101/05/01-101/05/31

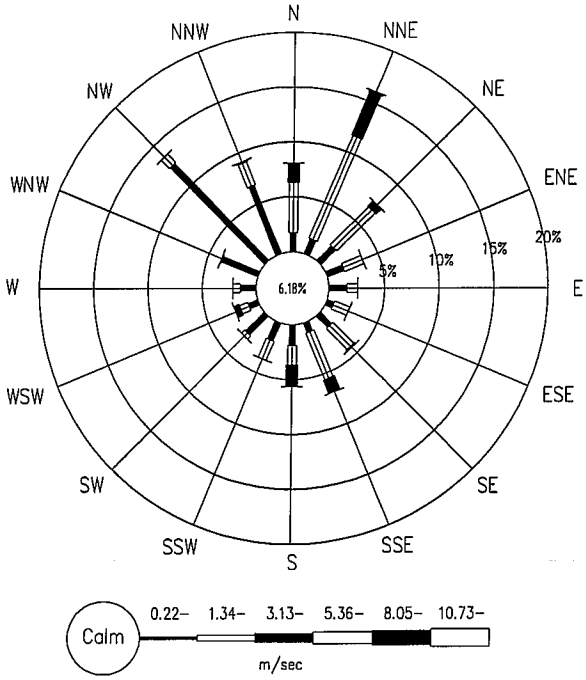


低塔21公尺

101/05/01-101/05/31

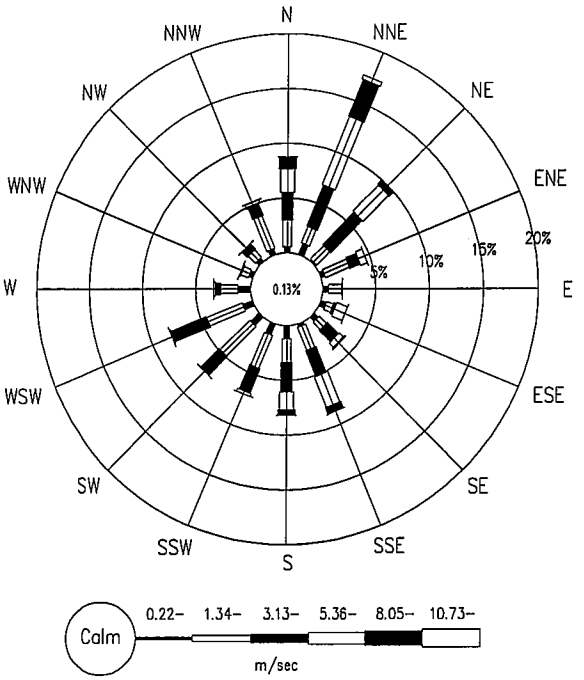

高塔93公尺

101/05/01-101/05/31

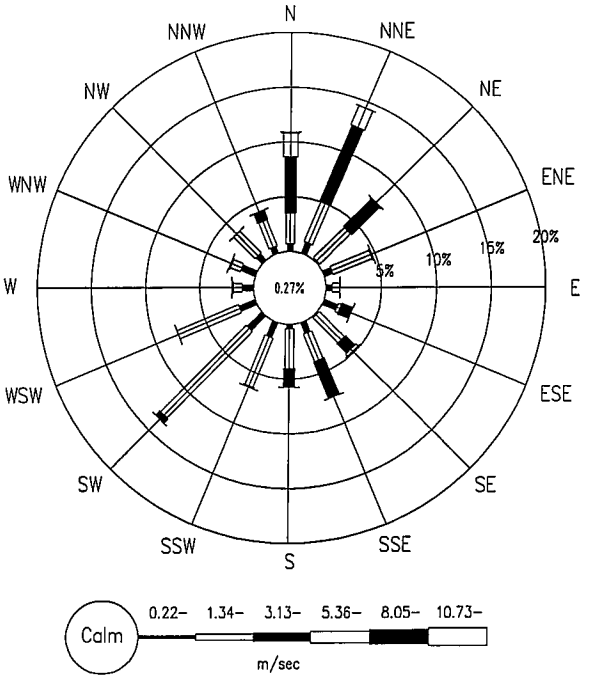


高塔63公尺

MWH

圖2.1-2 核四施工環境監測氣象塔 101年5月風花圖


N:\CadDwg\000\017-14\Rose101-456.dwg_2012_0712_14:14_Paul Chen

101/06/01-101/06/30

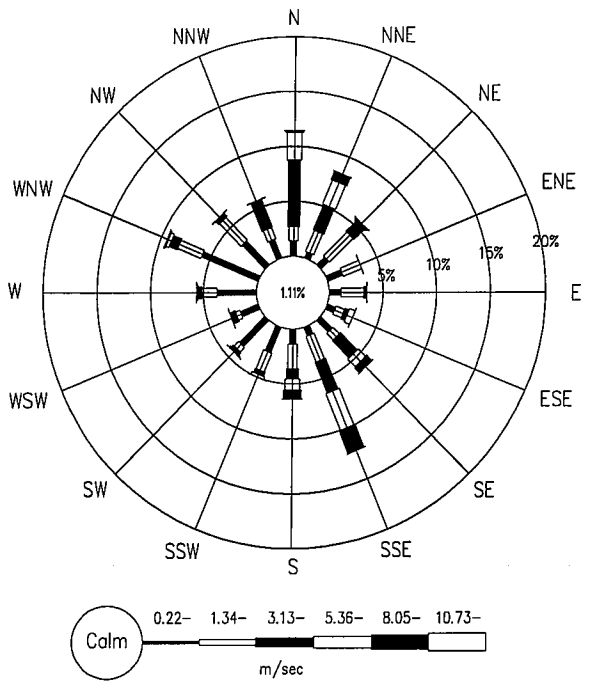


低塔63公尺

101/06/01-101/06/30

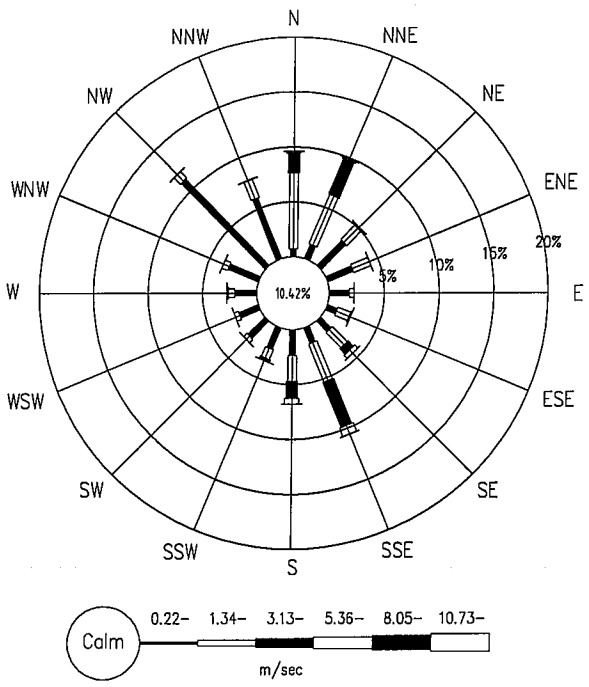


低塔21公尺

101/06/01-101/06/30

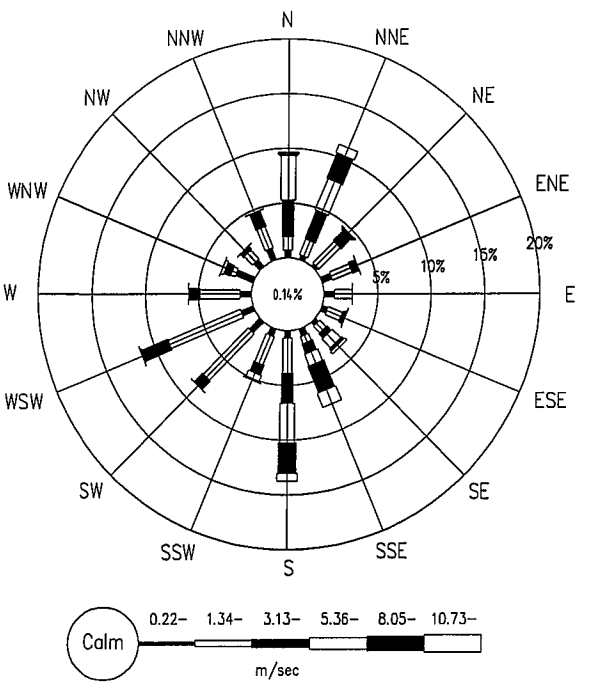

高塔93公尺

101/06/01-101/06/30

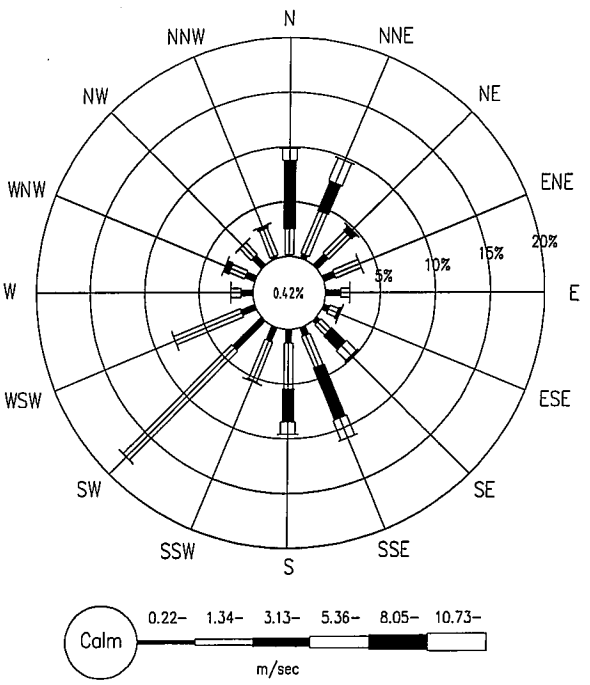

高塔63公尺

MWH

圖2.1-3 核四施工環境監測氣象塔 101年6月風花圖

N:\CadDwg\000\017-14\Rose101-456.dwg_2012_0712_14:14_Paul Chen



空氣品質監測情形（101/5/2）



噪音振動監測情形（101/6/24）



河川水質採樣情形（101/6/5）




廠區水質採樣情形（101/6/5）



地下水水質採樣情形（101/6/8）



海域水質採樣情形（101/6/4）



海域生態調查情形（101/5/9）




河域生態調查（101/6/18）

照片2-1 核能四廠發電工程施工期間環境監測計畫各項監測調查情形



水文流量調查情形

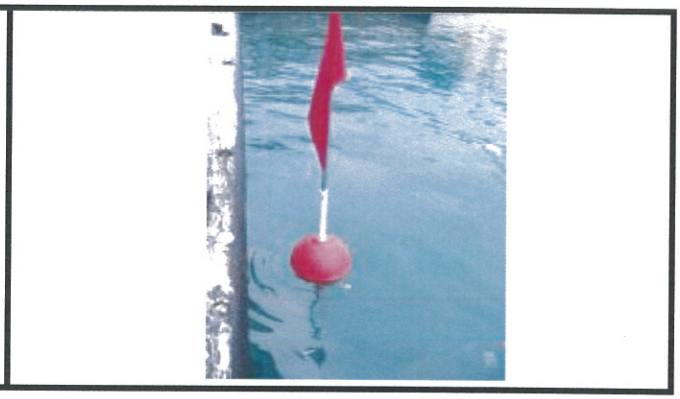


海象浮球調查情形



海岸地形沙灘定位樁調查情形（101/6/11）



海域漂砂調查-八向位捕砂器

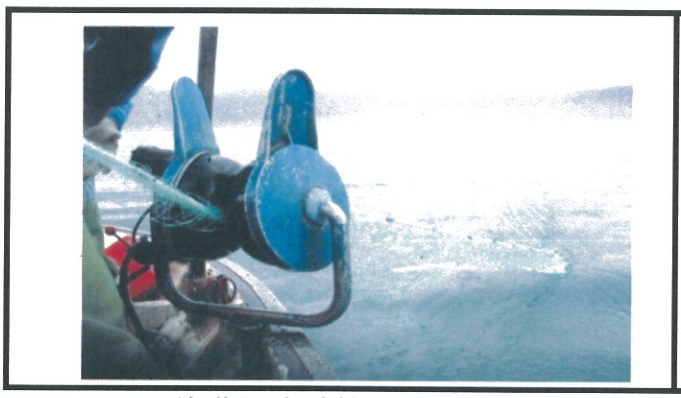

漁業調查-刺網作業情形



觀景點情形（101/6/16）

照片2-1　核能四廠發電工程施工期間環境監測計畫各項監測調查情形(續)

空氣品質監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.2 空氣品質監測

本計畫空氣品質監測包括：移動式監測（每月連續監測 3 天）及固定式自動連續監測。本季（4~6 月）移動式監測之監測日期詳見表 2.2-1，各測站監測周界採樣儀器校正紀錄表及空氣污染物逐時監測結果列於附錄 III 及附錄 IV，各空氣污染物之監測綜合結果則整理於表 2.2-2~2.2-6，並繪如圖 2.2-1~2.2-9 所示。空氣品質監測照片如照片 2.2-1 所示。

1.澳底及龍門固定式自動連續監測空氣品質測站監測結果

另自 88 年 5 月起台灣電力公司於龍門及澳底各設置空氣品質連續監測站，本季監測結果彙整如表 2.2-3 及圖 2.2-1~2.2-9 所示。

⑴總懸浮微粒（TSP）

本季（4~6 月）份空氣品質連續監測站之總懸浮微粒月平均測值介於 46~63μg/m^3 之間（詳表 2.2-3 所示）；本季（4~6 月）各月 24 小時值介於 31~127μg/m^3 之間，各測值均符合空氣品質標準 24 小時值（250μg/m^3）之標準。

⑵懸浮微粒（PM_{10}）

本季（4~6 月）龍門及澳底空氣品質連續監測站之懸浮微粒監測結果月平均值介於 31.4~46.1μg/m^3 之間（詳如表 2.2-3 所示）；各月日平均值介於 15.0~89.6μg/m^3 之間，各測值均符合空氣品質標準日平均值（125μg/m^3）之標準。

⑶氮氧化物（NO_x 及 NO_2）

本季（4~6 月）龍門及澳底空氣品質連續監測站之氮氧化物月平均值介於 0.005~0.011ppm 之間（詳如表 2.2-3 所示），各月份小時平均值之最大值介於 0.016~0.049ppm 之間；各月份二氧化氮之月平均值介於 0.003~0.007ppm 之間（詳如表 2.2-3 所示），各月小時平均值之最大值介於 0.010~0.029ppm 之間（詳如表 2.2-3 所示），其測值均遠低

於空氣品質標準小時平均值（0.25ppm）之標準。

⑷一氧化碳

本季（4~6 月）龍門及澳底空氣品質連續監測站一氧化碳月平均值介於 0.2~0.6ppm（詳如表 2.2-3 所示），各月小時平均值之最大值介於 0.8~1.1ppm 之間（詳如表 2.2-3 所示），各測值均符合空氣品質標準小時平均值（35ppm）之標準。

⑸非甲烷碳氫化合物

本季（4~6 月）龍門及澳底空氣品質連續監測站之非甲烷碳氫化合物月平均值介於 0.28~0.37ppm 之間（詳如表 2.2-3 所示）；各月小時平均值之最大值介於 0.50~2.79ppm 之間。

2.環境空氣品質測站監測結果

環境空氣品質測站計包括貢寮國小、福隆海水浴場、川島養殖池、石碇宮及貢寮焚化廠入口旁民宅等 5 處測站。茲就本季分析結果（詳表 2.2-2）說明如下：

⑴總懸浮微粒

本季（4~6 月）空氣品質測站總懸浮微粒之各月監測平均值介於 19~62μg/m^3 之間，詳如圖 2.2-1 所示；24 小時值介於 15~87μg/m^3 之間，各測值均符合空氣品質標準 24 小時值（250μg/m^3）之標準。

⑵氮氧化物

本季（4~6 月）空氣品質測站氮氧化物各月監測平均值介於 0.005~0.015ppm 之間；小時平均值介於 0.003~0.036ppm 之間，其月平均值及最大小時平均值之最高值均發生於 5 月份石碇宮測站，詳如圖 2.2-3 所示。

⑶二氧化氮

本季（4~6 月）空氣品質測站二氧化氮各月監測平均值介於 0.003~0.009ppm，詳如圖 2.2-4 所示；小時平均值介於 0.002~0.024ppm，詳如圖 2.2-5 所示，本季監測結果遠低於空氣品質標準小時平均值（0.25ppm）之標準。

⑷一氧化碳

本季（4~6 月）空氣品質測站一氧化碳各月監測平均值介於 0.1~0.4 ppm，詳如圖 2.2-8 所示；小時平均值介於 0.4~0.6ppm 之間（詳如圖 2.2-6 所示），各測值均遠低於空氣品質標準小時平均值（35ppm）之規定；最大 8 小時平均值介於 0.2~0.5ppm 之間（詳如圖 2.2-7 所示），各測值均遠低於空氣品質標準 8 小時平均值（9ppm）之規定。

⑸非甲烷碳氫化合物

本季（4~6 月）空氣品質測站非甲烷碳氫化合物各月監測平均值介於 0.11~0.25ppm，詳如圖 2.2-9 所示，小時平均值則介於 0.10~0.52ppm 之間，其月平均值及最大小時平均值之最高值均發生於 6 月份貢寮焚化廠入口旁之民宅測站。

綜上所述，本季各項空氣污染物測值均低於環境空氣品質標準，整體而言，本季監測結果空氣品質尚屬良好。

表2.2-1 核四施工環境監測空氣品質101年4~6月監測日期一覽表

測站 / 月份		貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
本季監測日期	4月	101/4/5 15:00 至 101/4/8 15:00	101/4/27 15:00 至 101/4/30 15:00	101/4/2 11:00 至 101/4/5 11:00	101/4/5 17:00 至 101/4/8 17:00	101/4/19 14:00 至 101/4/22 14:00
	5月	101/5/3 15:00 至 101/5/6 15:00	101/5/24 14:00 至 101/5/27 14:00	101/5/6 10:00 至 101/5/9 10:00	101/5/2 17:00 至 101/5/5 17:00	101/5/9 17:00 至 101/5/12 17:00
	6月	101/6/27 17:00 至 101/6/30 17:00	101/6/23 14:00 至 101/6/26 14:00	101/6/22 15:00 至 101/6/25 15:00	101/6/27 17:00 至 101/6/30 17:00	101/6/6 17:00 至 101/6/9 17:00

表2.2-2 核四施工環境監測空氣品質101年4~6月移動式測站監測綜合結果表

項目 \ 測站			貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅	空氣品質標準
TSP (μg/m³)	24小時值(最大值)	4月	34	21	87	57	47	250
		5月	46	60	38	61	26	
		6月	22	45	26	23	52	
	24小時值(最小值)	4月	28	18	47	40	22	-
		5月	15	32	25	29	16	
		6月	22	29	18	18	31	
	4月監測平均值		31	19	62	47	34	-
	5月監測平均值		34	48	34	42	22	
	6月監測平均值		22	37	22	21	41	
NO_x (ppm)	日平均值(最大值)	4月	0.006	0.009	0.006	0.016	0.008	-
		5月	0.006	0.009	0.009	0.019	0.010	
		6月	0.006	0.015	0.006	0.009	0.008	
	小時平均值(最小值)	4月	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	-
		5月	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	
		6月	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	
	小時平均值(最大值)	4月	0.024	0.022	0.010	0.031	0.014	-
		5月	0.010	0.021	0.016	0.036	0.019	
		6月	0.011	0.026	0.008	0.022	0.017	
	4月監測平均值		0.006	0.009	0.005	0.010	0.007	-
	5月監測平均值		0.005	0.007	0.008	0.015	0.009	
	6月監測平均值		0.006	0.011	0.005	0.007	0.008	
NO_2 (ppm)	日平均值(最大值)	4月	0.004	0.007	0.004	0.012	0.006	-
		5月	0.005	0.007	0.006	0.011	0.006	
		6月	0.005	0.014	0.004	0.005	0.007	
	小時平均值(最小值)	4月	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	-
		5月	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	
		6月	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	
	小時平均值(最大值)	4月	0.011	0.014	0.008	0.024	0.011	0.25
		5月	0.008	0.018	0.011	0.022	0.012	
		6月	0.006	0.023	0.005	0.010	0.015	
	4月監測平均值		0.004	0.006	0.003	0.007	0.005	-
	5月監測平均值		0.004	0.005	0.005	0.009	0.005	
	6月監測平均值		0.004	0.008	0.004	0.004	0.006	

註："-"表示無法規標準參考。

表2.2-2 核四施工環境監測空氣品質101年4~6月移動式測站監測綜合結果表(續)

項目 \ 測站			貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅	空氣品質標準
CO (ppm)	小時平均值(最小值)	4月	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	-
		5月	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	
		6月	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	
	小時平均值(最大值)	4月	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	35
		5月	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	
		6月	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	
	8小時平均值(最大值)	4月	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	9
		5月	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	
		6月	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	
	4月監測平均值		0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	-
	5月監測平均值		0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	
	6月監測平均值		0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	
NMHC (ppm)	日平均值(最大值)	4月	0.18	0.13	0.14	0.18	0.21	-
		5月	0.14	0.12	0.15	0.17	0.13	
		6月	0.21	0.17	0.18	0.18	0.28	
	小時平均值(最小值)	4月	0.14	0.11	0.10	0.12	0.15	-
		5月	0.11	0.08	0.11	0.11	0.11	
		6月	0.16	0.11	0.16	0.15	0.15	
	小時平均值(最大值)	4月	0.26	0.16	0.19	0.18	0.28	-
		5月	0.17	0.20	0.23	0.19	0.18	
		6月	0.26	0.22	0.21	0.31	0.52	
	4月監測平均值		0.17	0.13	0.12	0.14	0.19	-
	5月監測平均值		0.13	0.11	0.13	0.14	0.13	
	6月監測平均值		0.19	0.17	0.18	0.17	0.25	

註："-"表示無法規標準參考。

表2.2-3 核四空氣品質101年4~6月連續測站監測結果表

項目 \ 測站			澳底站	龍門站	空氣品質標準
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	4月月平均值		39.8	38.0	—
	5月月平均值		46.1	36.3	
	6月月平均值		40.3	31.4	
	日平均值(最大值)	4月	89.6	81.7	125
		5月	81.3	69.1	
		6月	52.7	47.1	
	日平均值(最小值)	4月	23.0	18.6	125
		5月	27.5	15.0	
		6月	24.5	19.5	
TSP ($\mu g/m^3$)	4月月平均值		63	55	—
	5月月平均值		57	50	
	6月月平均值		54	46	
	24小時值(最大值)	4月	127	102	250
		5月	94	81	
		6月	74	68	
	24小時值(最小值)	4月	40	31	250
		5月	42	29	
		6月	40	32	
NOx (ppm)	4月月平均值		0.011	0.006	—
	5月月平均值		0.009	0.005	
	6月月平均值		0.009	0.005	
	日平均值(最大值)	4月	0.019	0.008	—
		5月	0.017	0.008	
		6月	0.014	0.008	
	日平均值(最小值)	4月	0.004	0.003	—
		5月	0.004	0.003	
		6月	0.003	0.003	
	小時平均值(最大值)	4月	0.049	0.020	—
		5月	0.046	0.016	
		6月	0.031	0.035	
NO_2 (ppm)	4月月平均值		0.007	0.004	—
	5月月平均值		0.007	0.003	
	6月月平均值		0.006	0.003	
	日平均值(最大值)	4月	0.013	0.006	—
		5月	0.012	0.005	
		6月	0.010	0.005	
	日平均值(最小值)	4月	0.002	0.002	—
		5月	0.003	0.001	
		6月	0.002	0.001	
	小時平均值(最大值)	4月	0.024	0.016	0.25
		5月	0.029	0.010	
		6月	0.021	0.023	

註："-"表示無法規標準參考。

表2.2-3 核四空氣品質101年4~6月連續測站監測結果表（續）

項目 \ 測站			澳底站	龍門站	空氣品質標準
NO (ppm)	4月月平均值		0.004	0.002	—
	5月月平均值		0.002	0.002	
	6月月平均值		0.003	0.003	
	日平均值(最大值)	4月	0.006	0.003	—
		5月	0.006	0.003	
		6月	0.005	0.003	
	日平均值(最小值)	4月	0.001	0.001	—
		5月	0.001	0.002	
		6月	0.001	0.002	
	小時平均值(最大值)	4月	0.029	0.008	—
		5月	0.027	0.007	
		6月	0.017	0.012	
CO (ppm)	4月月平均值		0.6	0.2	—
	5月月平均值		0.6	0.4	
	6月月平均值		0.5	0.3	
	日平均值(最大值)	4月	0.7	0.5	—
		5月	0.8	0.7	
		6月	0.6	0.5	
	日平均值(最小值)	4月	0.4	0.1	—
		5月	0.4	0.2	
		6月	0.4	0.2	
	小時平均值(最大值)	4月	1.1	0.8	35
		5月	1.0	1.1	
		6月	0.9	0.9	
NMHC (ppm)	4月月平均值		0.28	0.37	—
	5月月平均值		0.33	0.33	
	6月月平均值		0.28	0.32	
	日平均值(最大值)	4月	0.61	0.50	—
		5月	0.58	0.47	
		6月	0.38	0.37	
	日平均值(最小值)	4月	0.07	0.29	—
		5月	0.08	0.20	
		6月	0.11	0.15	
	小時平均值(最大值)	4月	1.44	0.99	—
		5月	2.79	1.11	
		6月	0.55	0.50	

註："-"表示無法規標準參考。

表2.2-4 核四施工環境監測空氣品質101年4月移動式測站監測綜合結果表

項目	監測結果 \ 監測地點 / 日程	貢寮國小			福隆海水浴場			川島養殖池			石碇宮			貢寮焚化廠入口旁民宅			法規值
		第1日(非假日)	第2日(假日)	第3日(假日)	第1日(非假日)	第2日(假日)	第3日(假日)	第1日(假日)	第2日(假日)	第3日(非假日)	第1日(假日)	第2日(非假日)	第3日(非假日)	第1日(非假日)	第2日(假日)	第3日(假日)	
二氧化氮	日平均值	0.004	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.012	0.006	0.004	0.006	0.004	0.005	-
(NO_2)	小時平均值(最小值)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	-
(ppm)	小時平均值(最大值)	0.006	0.011	0.004	0.014	0.009	0.010	0.008	0.006	0.004	0.024	0.011	0.008	0.008	0.006	0.011	0.25
一氧化碳	日平均值	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	-
(CO)	小時平均值(最小值)	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	-
	小時平均值(最大值)	0.4	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	35
(ppm)	8小時平均值(最大值)	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	9
非甲烷化合物	日平均值	0.17	0.18	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.11	0.11	0.13	0.12	0.18	0.18	0.18	0.21	-
(NMHC)	小時平均值(最小值)	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.17	0.16	0.15	0.16	-
(ppm)	小時平均值(最大值)	0.21	0.26	0.15	0.14	0.14	0.16	0.19	0.15	0.13	0.15	0.14	0.18	0.19	0.28	0.24	-
TSP($\mu g/m^3$)	24小時值	28	31	34	19	21	18	47	87	52	57	40	43	32	22	47	250

註："-"表示無法規標準參考

表2.2-5 核四施工環境監測空氣品質101年5月移動式測站監測綜合結果表

項目	監測結果	貢寮國小			福隆海水浴場			川島養殖池			石碇宮			貢寮焚化廠入口旁民宅			法規值
	日程	第1日(假日)	第2日(非假日)	第3日(非假日)	第1日(非假日)	第2日(非假日)	第3日(假日)	第1日(假日)	第2日(非假日)	第3日(非假日)	第1日(假日)	第2日(非假日)	第3日(非假日)	第1日(非假日)	第2日(非假日)	第3日(假日)	
二氧化氮	日平均值	0.005	0.003	0.003	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.009	0.011	0.007	0.005	0.005	0.006	-
(NO_2)	小時平均值(最小值)	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	-
(ppm)	小時平均值(最大值)	0.008	0.006	0.005	0.012	0.018	0.009	0.006	0.009	0.011	0.018	0.022	0.015	0.011	0.010	0.012	0.25
一氧化碳	日平均值	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	-
(CO)	小時平均值(最小值)	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	-
	小時平均值(最大值)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	35
(ppm)	8小時平均值(最大值)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	9
非甲烷化合物	日平均值	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.15	0.13	0.12	0.17	0.12	0.12	0.13	-
(NMHC)	小時平均值(最小值)	0.11	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.15	0.11	0.11	0.12	-
(ppm)	小時平均值(最大值)	0.17	0.17	0.16	0.20	0.16	0.16	0.13	0.19	0.23	0.19	0.16	0.19	0.15	0.18	0.17	-
TSP($\mu g/m^3$)	24小時值	15	41	46	32	60	51	38	38	25	35	29	61	26	24	16	250

註："-"表示無法規標準參考

表2.2-6 核四施工環境監測空氣品質101年6月移動式測站監測綜合結果表

項目	監測結果	貢寮國小			福隆海水浴場			川島養殖池			石碇宮			貢寮焚化廠入口旁民宅			法規值
	日程	第1日(非假日)	第2日(非假日)	第3日(假日)	第1日(非假日)	第2日(非假日)	第3日(假日)	第1日(假日)	第2日(非假日)	第3日(非假日)	第1日(非假日)	第2日(非假日)	第3日(假日)	第1日(非假日)	第2日(非假日)	第3日(假日)	
二氧化氮	日平均值	0.005	0.004	0.005	0.014	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	-
(NO_2)	小時平均值(最小值)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	-
(ppm)	小時平均值(最大值)	0.006	0.005	0.006	0.023	0.013	0.010	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.010	0.012	0.015	0.009	0.25
一氧化碳	日平均值	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	-
(CO)	小時平均值(最小值)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	-
	小時平均值(最大值)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	35
(ppm)	8小時平均值(最大值)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	9
非甲烷化合物	日平均值	0.21	0.17	0.18	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.16	0.17	0.26	0.28	0.20	-
(NMHC)	小時平均值(最小值)	0.18	0.16	0.17	0.11	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16	0.22	0.19	0.15	-
(ppm)	小時平均值(最大值)	0.26	0.20	0.23	0.22	0.20	0.22	0.20	0.20	0.21	0.31	0.18	0.18	0.31	0.52	0.28	-
TSP($\mu g/m^3$)	24小時值	22	22	22	45	37	29	18	22	26	21	23	18	52	39	31	250

註："-"表示無法規標準參考

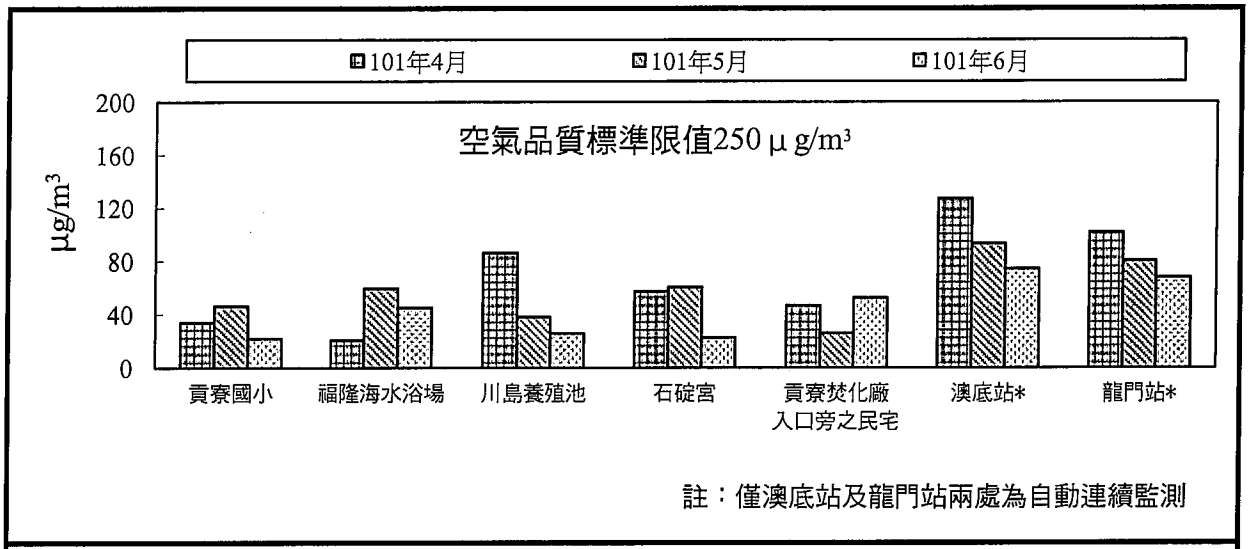


圖2.2-1 核四施工環境監測空氣品質總懸浮微粒101年4~6月日平均值（最大值）比較分析圖

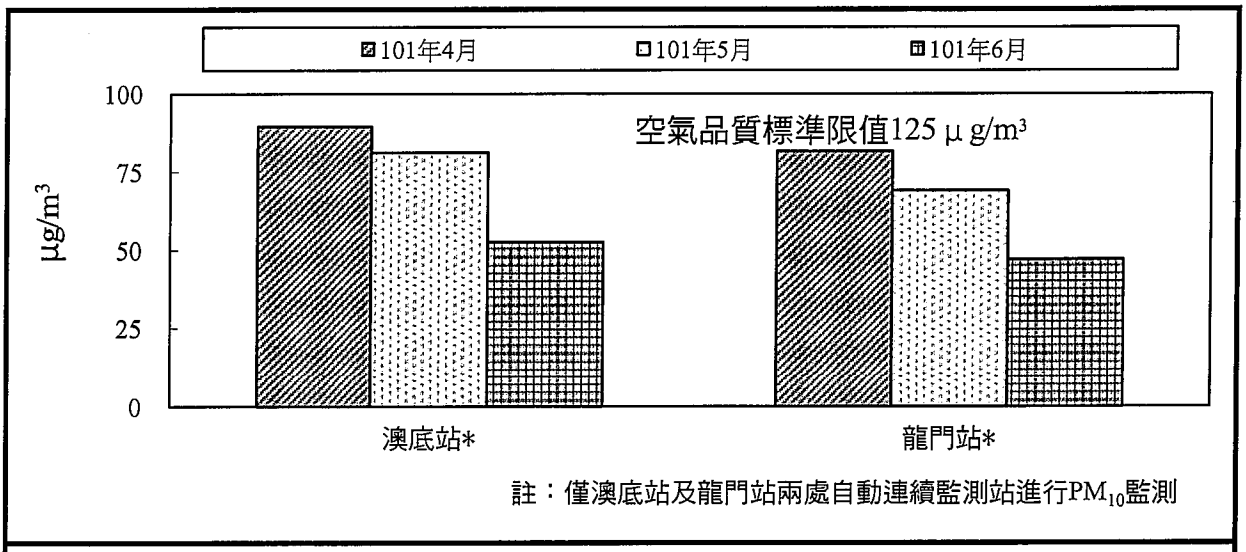


圖2.2-2 核四施工環境監測空氣品質懸浮微粒101年4~6月日平均值（最大值）比較分析圖

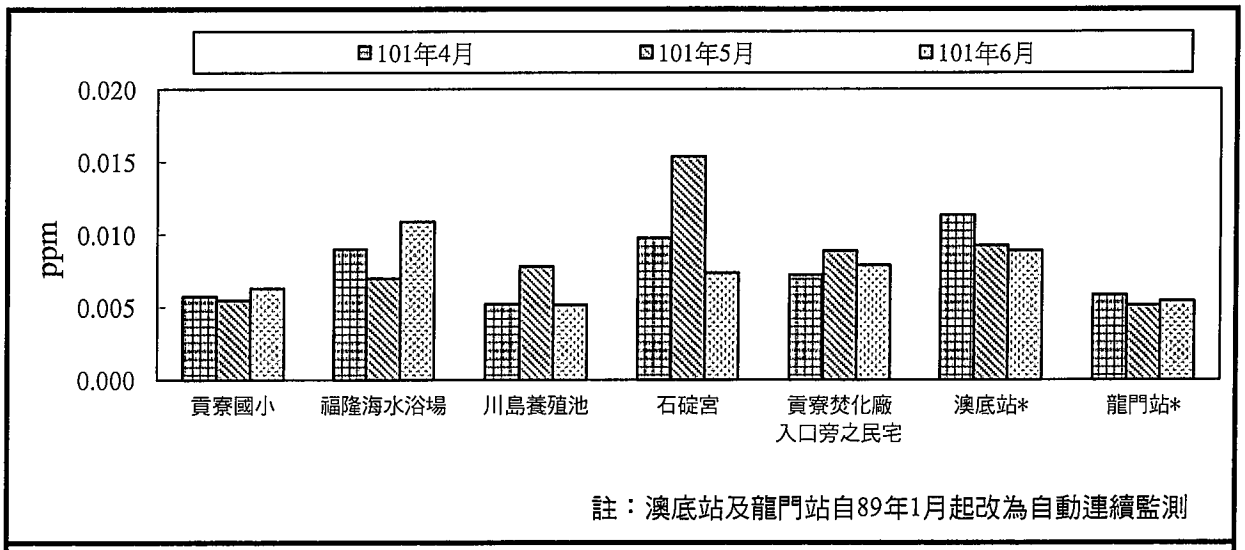


圖2.2-3 核四施工環境監測空氣品質氮氧化物101年4~6月各月監測平均值比較分析圖

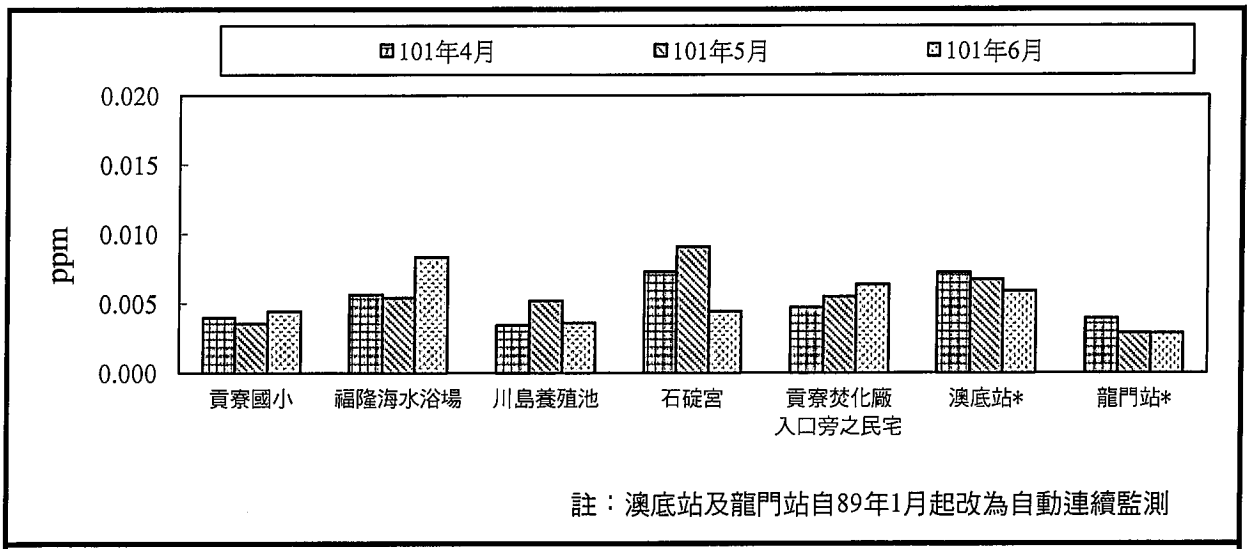


圖2.2-4 核四施工環境監測空氣品質二氧化氮101年4~6月各月監測平均值比較分析圖

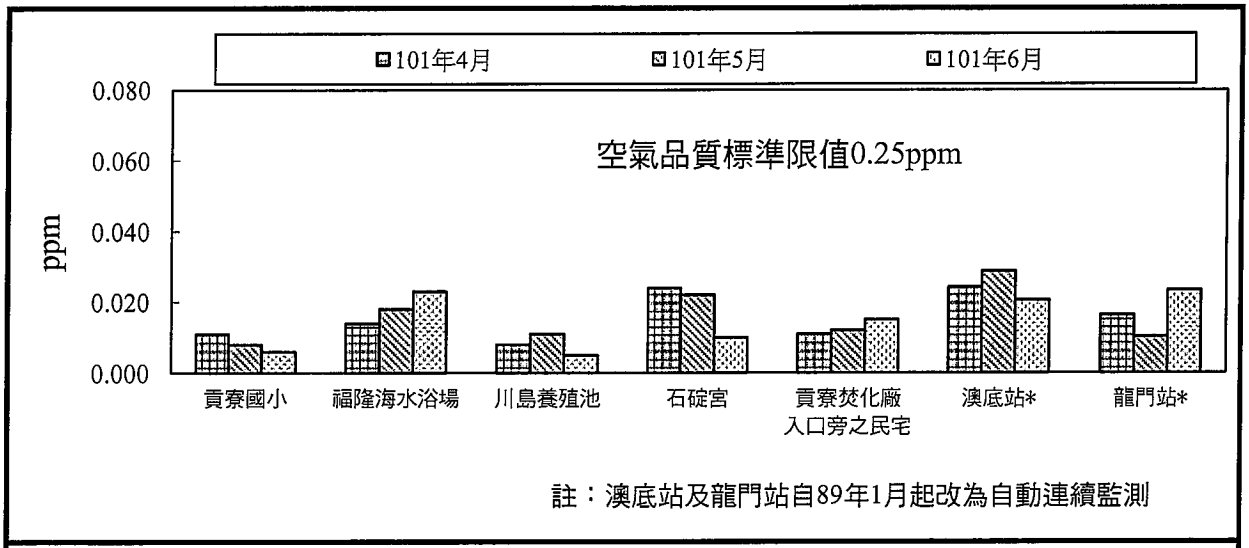


圖2.2-5 核四施工環境監測空氣品質二氧化氮101年4~6月小時平均值(最大值)比較分析圖

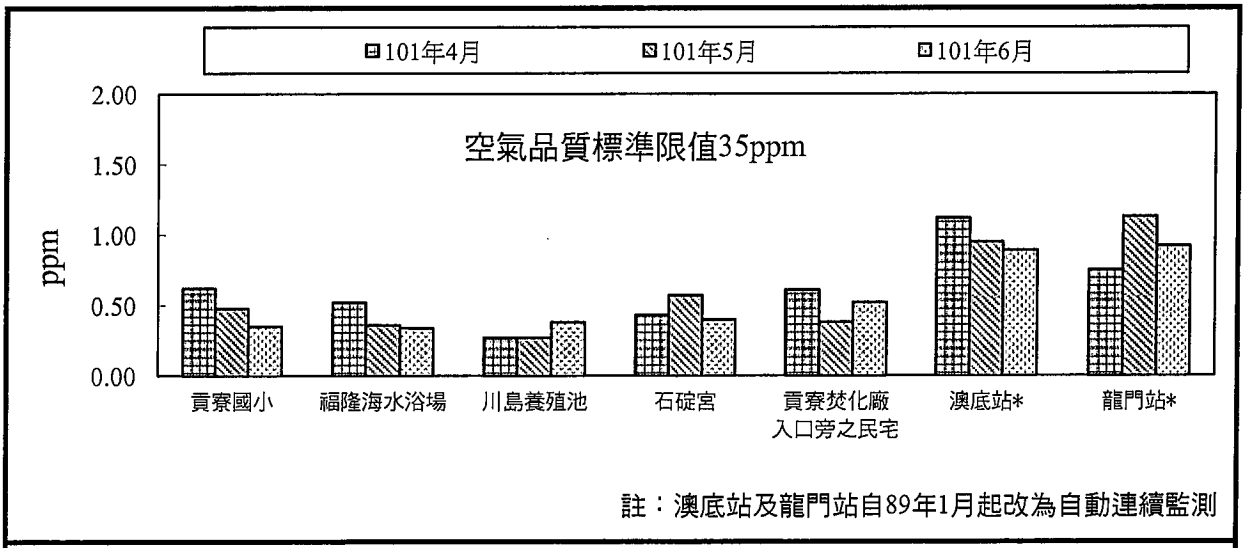


圖2.2-6 核四施工環境監測空氣品質一氧化碳101年4~6月小時平均值(最大值)比較分析圖



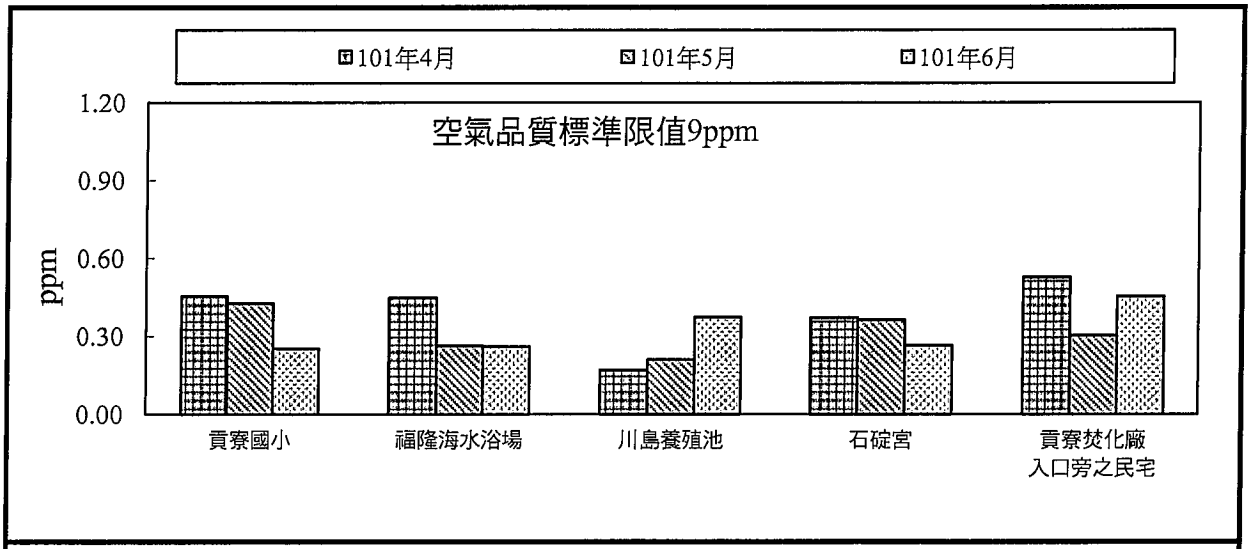


圖2.2-7 核四施工環境監測空氣品質一氧化碳101年4~6月8小時平均值(最大值)比較分析圖

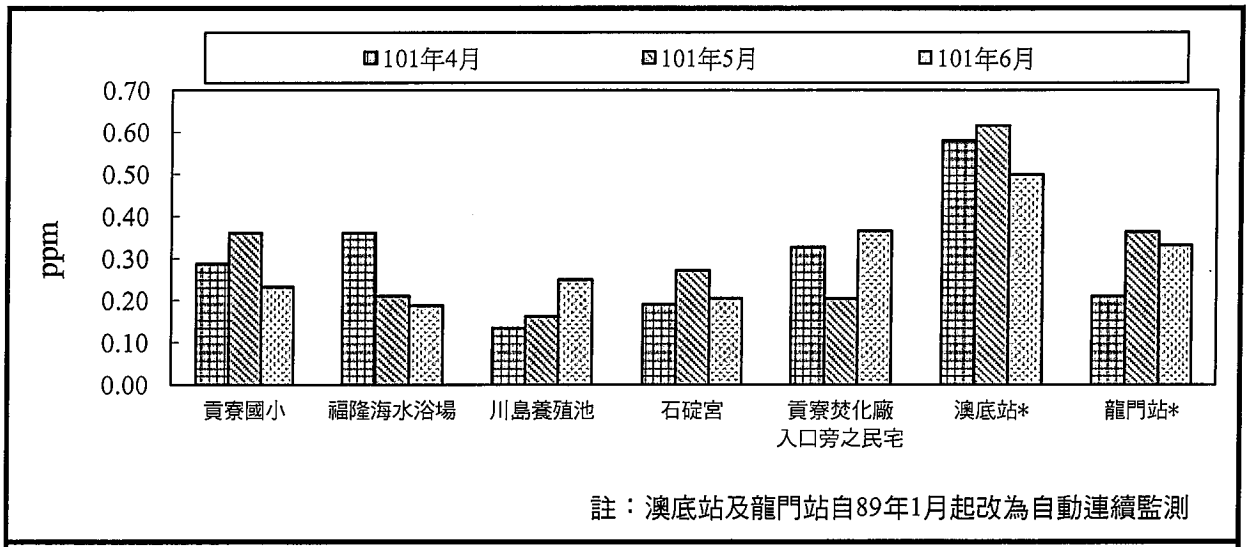

註：澳底站及龍門站自89年1月起改為自動連續監測


圖2.2-8 核四施工環境監測空氣品質一氧化碳101年4~6月各月監測平均值比較分析圖

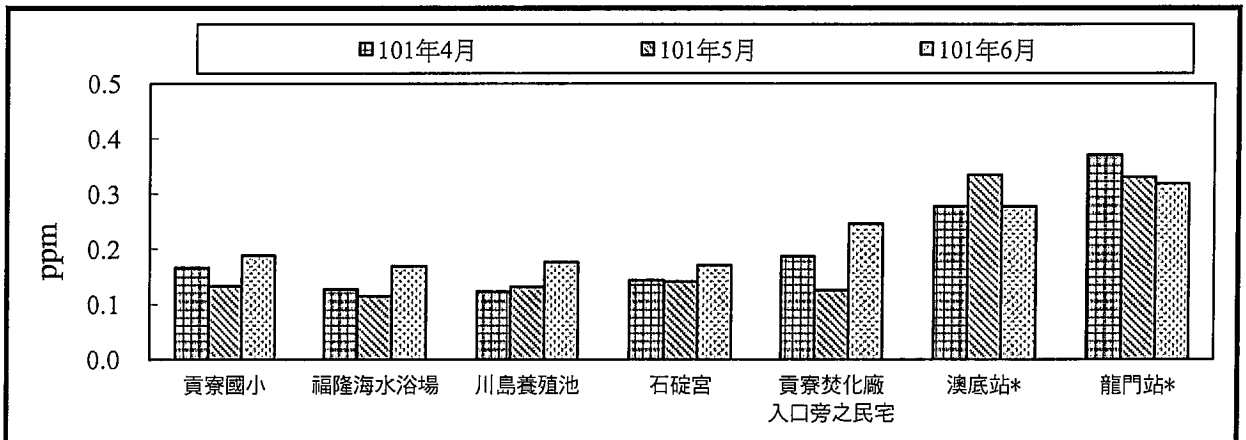

註：澳底站及龍門站自89年1月起改為自動連續監測


圖2.2-9 核四施工環境監測空氣品質非甲烷化合物101年4~6月各月監測平均值比較分析圖

測點：貢寮國小

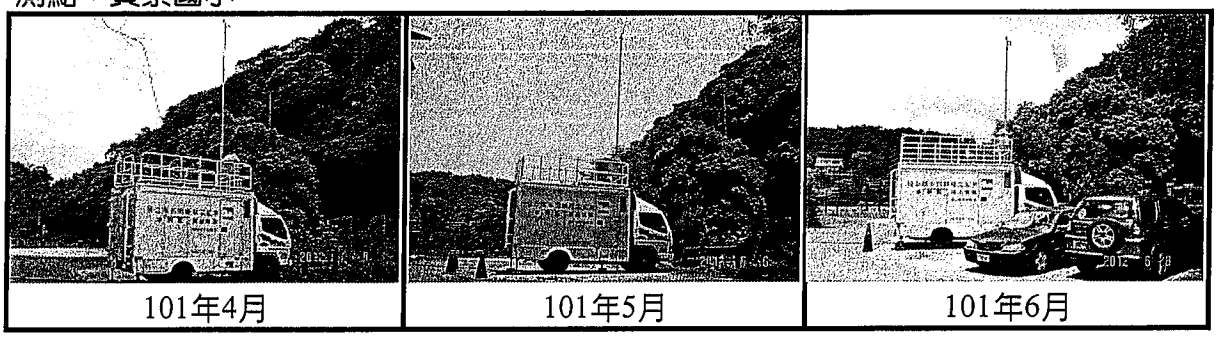

101年4月	101年5月	101年6月

測點：川島養殖池

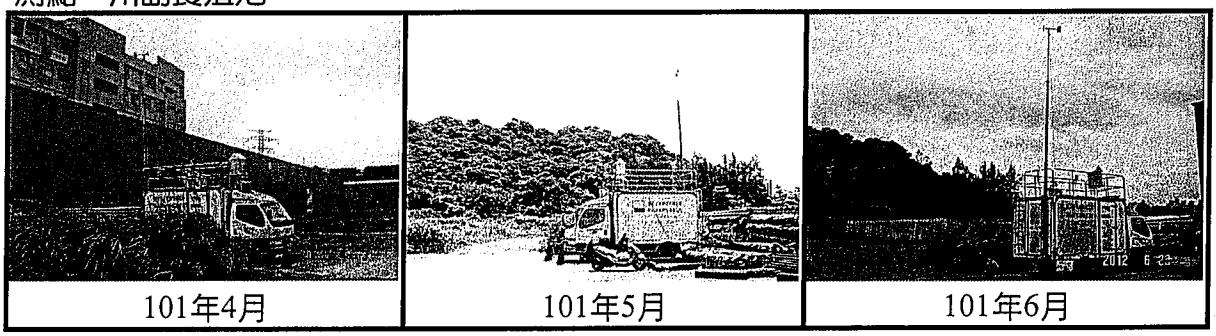


101年4月	101年5月	101年6月

測點：福隆海水浴場




101年4月	101年5月	101年6月

測點：石碇宮

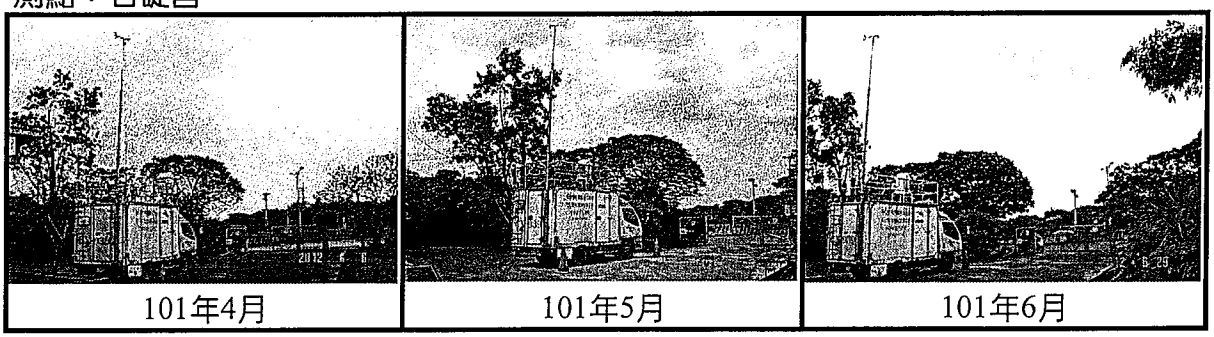

101年4月	101年5月	101年6月

測點：貢寮焚化場入口旁民宅

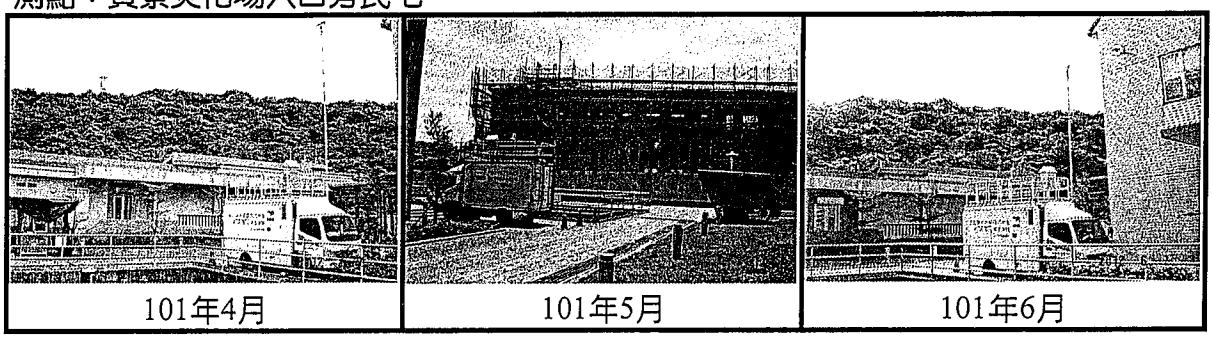

101年4月	101年5月	101年6月

照片2.2-1 空氣品質監測照片

噪音與振動監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.3 噪音與振動監測

本季各測站於每月各進行 1 次 2 天（含非假日與假日）之噪音與振動之調查監測，各測站之逐時監測結果列於附錄Ⅳ.3，綜合成果則分別整理如表 2.3-1~2.3-6 所示，其測點附近環境現況如照片 2.3-1，以下分別就噪音與振動之監測結果做說明，噪音部份依據「噪音管制區劃定作業準則」（一般地區環境音量標準，98 年 9 月 4 日行政院環境保護署環署空字第 0980078181 號令發布）及「環境音量標準」（道路交通噪音環境音量標準，99 年 1 月 21 日行政院環境保護署環署空字第 0990006225D 號令修正發布）比較，振動部份因目前國內尚無法規標準，則暫與「日本振動規制法實施規則」參考比較。

本季噪音量測時台 2 省道與 102 甲縣道交叉口測站之風速介於 0.2~1.5 m/s，風向以北風為主；鹽寮海濱公園測站之風速介於 0.3~3.0m/s，風向以西北西風為主；福隆街上測站之風速介於 0.3~3.3m/s，風向以西北風為主；102 縣道之新社橋測站其風速介於 0.2~3.3m/s，風向以南南東風為主；過港部落測站之風速介於 0.2~2.7m/s，風向以南風為主。噪音監測時段之氣象資料如下：溫度介於 11.2~32.0℃、溼度介於 50.8~98.9%、氣壓介於 997.6~1019.8hPa（參考中央氣象局基隆站的氣壓資料），各測站氣象狀況詳附錄Ⅳ.3-1~30。

1.噪音監測結果分析

本季台 2 省道旁測站（台 2 省道與 102 甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等 3 測站）監測值在非假日介於 67.4~75.2dB(A)之間；假日則介於 65.5~74.9dB(A)之間，其最高值發生於 4 月份非假日福隆街上日間時段，其台 2 省道與 102 甲縣道交叉口（4 月假日）及鹽寮海濱公園（4~6 月）$L_{夜}$有超出管制區內之標準限值，福隆街上則於各時段多有超出管制區內之標準限值，其鹽寮海濱公園及福隆街上屬環境音量標準道路交通噪音第二類噪音管制區，其管制標準較為嚴格，致使測值易超出標準限值。

非省道旁測站（102 縣道之新社橋測站、過港部落等 2 測站）於本季各月份監測值在非假日介於 42.5~62.5dB(A)之間，假日則介於 40.4~65.8 dB(A)之間，其中僅過港部落 5 月份假日 $L_{晚}$時段測值 56.8 dB(A)，超出其所屬之標準限值，經查為晚間時段測站周圍環境，持續有蟲鳴聲傳出影響所致，其餘各測項之測值均符合其所屬之環境音量標準道路交通噪音第二類噪音管制區及噪音管制區劃定作業準則一般地區第二類管制區限值。

2.振動監測結果分析

本季位於台 2 省旁之測站（台 2 省道與 102 甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等 3 測站）$L_{v10(日)}$測值介於 30.6~53.4dB，$L_{v10(夜)}$測值介於 30.2~53.0dB；非省道旁測站（102 縣道之新社橋測站、過港部落等 2 測站）$L_{v10(日)}$測值均介於 30.0~31.0dB 及 $L_{v10(夜)}$測值均為 30.0dB。依前述結果發現，位於台 2 省道旁之測站測值均較高，其中以福隆街上測站測值最高，惟本季整體測值屬穩定變化趨勢，且符合日本「振動規制法」之參考標準。

3.施工作業對噪音及振動影響分析

施工作業對噪音及振動之影響主要包括施工行為導致之營建噪音及施工車輛產生之交通噪音。在營建噪音部分，目前主要施工內容包括：核四（龍門）計畫第 1、2 號機核島區廠房電纜配線、汽機島區廠房空調及消防設備裝檢工程、第 1、2 號機循環水抽水機房及環境綠化養護工程...等，而工區內所使用之機具有吊車、卡車、水車、挖土機、泵浦車、拌合車等，距周界最近之敏感受體尚有數百公尺，且經距離衰減及圍籬阻隔作用，其產生之噪音對周界測站之測值影響甚微。

以核四主體工程最近之鹽寮海濱公園及過港部落等 2 測站而言，其鹽寮海濱公園及過港部落本季非假日（施工）$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量為 1.6 (A)，依環保署環境影響評估技術規範之營建工程噪音評估模式技術規範之標準評估（圖 2.3-1），鹽寮海濱公園及過港

部落測站之噪音影響程度均屬「無影響或可忽略」程度；若過港部落海事工程施工前比較，距離最近之過港部落測站本季之非假日 $L_{日}$測值，各月份分別為 48.9dB(A)、46.8dB(A)及 51.8 dB(A)，均符合該區之噪音管制標準，故核四施工對鄰近地區噪音品質影響尚屬輕微。

表2.3-1 核四施工環境監測101年4月噪音監測成果統計表

單位：dB(A)

環境音量標準第三類管制區內 緊鄰8公尺（含）以上道路		$L_{日}$ 76	$L_{晚}$ 75	$L_{夜}$ 72
1.台2省道與102甲縣道交叉口	非假日 101/4/20	72.0	68.9	71.8
	假　日 101/4/21	71.8	66.9	* 72.2
環境音量標準第二類管制區內 緊鄰8公尺（含）以上道路		$L_{日}$ 74	$L_{晚}$ 70	$L_{夜}$ 67
2.鹽寮海濱公園	非假日 101/4/20	69.9	67.4	* 70.4
	假　日 101/4/21	69.9	66.5	* 70.4
3.福隆街上	非假日 101/4/20	* 75.2	* 72.8	* 75.1
	假　日 101/4/21	* 74.2	* 70.1	* 74.9
4.102縣道之新社橋	非假日 101/4/3	59.8	56.8	55.2
	假　日 101/4/4	62.6	54.7	52.4
噪音管制區劃定作業準則 一般地區第二類管制區		$L_{日}$ 60	$L_{晚}$ 55	$L_{夜}$ 50
5.過港部落	非假日 101/4/3	48.9	46.3	43.9
	假　日 101/4/4	49.1	40.4	46.9

註：1.一般地區環境音量標準，係依據98年9月4日行政院環境保護署環署空字第0980078181號令發布之『噪音管制區劃定作業準則』。

2.道路交通噪音環境音量標準，係依據99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布之『環境音量標準』。

3.時段區分：(1)日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

(2)晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

(3)夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

4. * 表超出道路交通噪音或一般地區噪音之標準值。

5.噪音管制區劃分係依臺北縣政府99年8月3日北府環空字第09900671901號公告及新北市政府100年1月28日北府環空字第0990126573號最新公告內容為依據。

表2.3-2 核四施工環境監測101年5月噪音監測成果統計表

單位：dB(A)

環境音量標準第三類管制區內 緊鄰8公尺（含）以上道路		$L_{日}$ 76	$L_{晚}$ 75	$L_{夜}$ 72
1.台2省道與102甲縣道交叉口	非假日 101/5/7	72.7	70.1	71.9
	假　日 101/5/6	70.8	67.9	70.8
環境音量標準第二類管制區內 緊鄰8公尺（含）以上道路		$L_{日}$ 74	$L_{晚}$ 70	$L_{夜}$ 67
2.鹽寮海濱公園	非假日 101/5/7	70.1	68.7	* 70.2
	假　日 101/5/6	68.6	66.7	* 68.5
3.福隆街上	非假日 101/5/7	* 74.1	* 72.9	* 74.1
	假　日 101/5/6	70.7	69.7	* 72.9
4.102縣道之新社橋	非假日 101/5/11	61.5	58.0	56.3
	假　日 101/5/12	65.8	61.2	58.1
噪音管制區劃定作業準則 一般地區第二類管制區		$L_{日}$ 60	$L_{晚}$ 55	$L_{夜}$ 50
5.過港部落	非假日 101/5/11	46.8	42.5	47.2
	假　日 101/5/12	52.2	* 56.8	44.8

註：1.一般地區環境音量標準，係依據98年9月4日行政院環境保護署環署空字第0980078181號令發布之『噪音管制區劃定作業準則』。

2.道路交通噪音環境音量標準，係依據99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布之『環境音量標準』。

3.時段區分：(1)日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

(2)晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

(3)夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

4. * 表超出道路交通噪音或一般地區噪音之標準值。

5.噪音管制區劃分係依臺北縣政府99年8月3日北府環空字第09900671901號公告及新北市政府100年1月28日北府環空字第0990126573號最新公告內容為依據。

表2.3-3 核四施工環境監測101年6月噪音監測成果統計表

單位：dB(A)

環境音量標準第三類管制區內 緊鄰8公尺（含）以上道路		$L_{日}$ 76	$L_{晚}$ 75	$L_{夜}$ 72
1.台2省道與102甲縣道交叉口	非假日 101/6/25	71.6	67.9	70.4
	假　日 101/6/24	69.0	66.5	67.4
環境音量標準第二類管制區內 緊鄰8公尺（含）以上道路		$L_{日}$ 74	$L_{晚}$ 70	$L_{夜}$ 67
2.鹽寮海濱公園	非假日 101/6/25	69.6	67.5	* 70.1
	假　日 101/6/24	67.6	65.5	66.4
3.福隆街上	非假日 101/6/25	* 74.3	* 72.4	* 74.4
	假　日 101/6/24	70.0	69.8	* 71.0
4.102縣道之新社橋	非假日 101/6/8	62.5	57.4	56.6
	假　日 101/6/9	64.0	58.9	58.5
噪音管制區劃定作業準則 一般地區第二類管制區		$L_{日}$ 60	$L_{晚}$ 55	$L_{夜}$ 50
5.過港部落	非假日 101/6/8	51.8	48.2	46.5
	假　日 101/6/9	50.1	44.2	46.2

註：1.一般地區環境音量標準，係依據98年9月4日行政院環境保護署環署空字第0980078181號令發布之『噪音管制區劃定作業準則』。

2.道路交通噪音環境音量標準，係依據99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布之『環境音量標準』。

3.時段區分：(1)日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

(2)晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

(3)夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

4. * 表超出道路交通噪音或一般地區噪音之標準值。

5.噪音管制區劃分係依臺北縣政府99年8月3日北府環空字第09900671901號公告及新北市政府100年1月28日北府環空字第0990126573號最新公告內容為依據。

表2.3-4 核四施工環境監測101年4月振動監測成果統計表

單位：dB

振動規制法第二種地區		$L_{v10(日)}$ 70	$L_{v10(夜)}$ 65	$L_{v10(24小時)}$ —
1.台2省道與102甲縣道交叉口	非假日 101/4/20	36.3	36.2	36.3
	假　日 101/4/21	36.4	35.7	36.1
2.鹽寮海濱公園	非假日 101/4/20	44.4	42.3	43.7
	假　日 101/4/21	44.1	41.3	43.1
3.福隆街上	非假日 101/4/20	53.4	53.0	53.2
	假　日 101/4/21	52.6	52.7	52.6
振動規制法第一種地區		$L_{v10(日)}$ 65	$L_{v10(夜)}$ 60	$L_{v10(24小時)}$ —
4.102縣道之新社橋	非假日 101/4/3	30.0	30.0	30.0
	假　日 101/4/4	30.1	30.0	30.1
5.過港部落	非假日 101/4/3	30.0	30.0	30.0
	假　日 101/4/4	30.0	30.0	30.0

註:1.資料來源:日本環境廳「振動規制法」。

2.第一種區域類似於我國環境品質標準之第一、二類管制區。
第二種區域類似於我國環境品質標準之第三、四類管制區。

3.日間時段一上午5時、6時、7時或8時開始到下午7時、8時、9時或10時。
夜間時段一下午7時、8時、9時或10時開始到翌日上午5時、6時、7時或8時。
確實之規制時段由都道府縣長各別訂定。

4.振動位準的決定，取L_{v10}值。

表2.3-5 核四施工環境監測101年5月振動監測成果統計表

單位：dB

振動規制法第二種地區		$L_{v10(日)}$ 70	$L_{v10(夜)}$ 65	$L_{v10(24小時)}$ —
1.台2省道與102甲縣道交叉口	非假日 101/5/7	34.6	34.9	34.7
	假　日 101/5/6	33.0	31.8	32.6
2.鹽寮海濱公園	非假日 101/5/7	43.5	41.4	42.7
	假　日 101/5/6	40.5	37.2	39.4
3.福隆街上	非假日 101/5/7	51.8	52.0	51.9
	假　日 101/5/6	47.3	47.4	47.4
振動規制法第一種地區		$L_{v10(日)}$ 65	$L_{v10(夜)}$ 60	$L_{v10(24小時)}$ —
4.102縣道之新社橋	非假日 101/5/11	30.0	30.0	30.0
	假　日 101/5/12	30.6	30.0	30.3
5.過港部落	非假日 101/5/11	30.0	30.0	30.0
	假　日 101/5/12	31.0	30.0	30.6

註:1.資料來源:日本環境廳「振動規制法」。

2.第一種區域類似於我國環境品質標準之第一、二類管制區。
第二種區域類似於我國環境品質標準之第三、四類管制區。

3.日間時段一上午5時、6時、7時或8時開始到下午7時、8時、9時或10時。
夜間時段一下午7時、8時、9時或10時開始到翌日上午5時、6時、7時或8時。
確實之規制時段由都道府縣長各別訂定。

4.振動位準的決定，取L_{v10}值。

表2.3-6 核四施工環境監測101年6月振動監測成果統計表

單位：dB


振動規制法第二種地區		$L_{v10(日)}$ 70	$L_{v10(夜)}$ 65	$L_{v10(24小時)}$ —
1.台2省道與102甲縣道交叉口	非假日 101/6/25	33.8	33.8	33.8
	假　日 101/6/24	30.6	30.2	30.5
2.鹽寮海濱公園	非假日 101/6/25	43.6	41.3	42.8
	假　日 101/6/24	38.5	35.4	37.5
3.福隆街上	非假日 101/6/25	53.0	52.6	52.8
	假　日 101/6/24	46.2	45.8	46.1
振動規制法第一種地區		$L_{v10(日)}$ 65	$L_{v10(夜)}$ 60	$L_{v10(24小時)}$ —
4.102縣道之新社橋	非假日 101/6/8	30.0	30.0	30.0
	假　日 101/6/9	30.6	30.0	30.3
5.過港部落	非假日 101/6/8	30.0	30.0	30.0
	假　日 101/6/9	30.2	30.0	30.1

註:1.資料來源:日本環境廳「振動規制法」。

2.第一種區域類似於我國環境品質標準之第一、二類管制區。
第二種區域類似於我國環境品質標準之第三、四類管制區。

3.日間時段一上午5時、6時、7時或8時開始到下午7時、8時、9時或10時。
夜間時段一下午7時、8時、9時或10時開始到翌日上午5時、6時、7時或8時。
確實之規制時段由都道府縣長各別訂定。

4.振動位準的決定，取L_{v10}值。

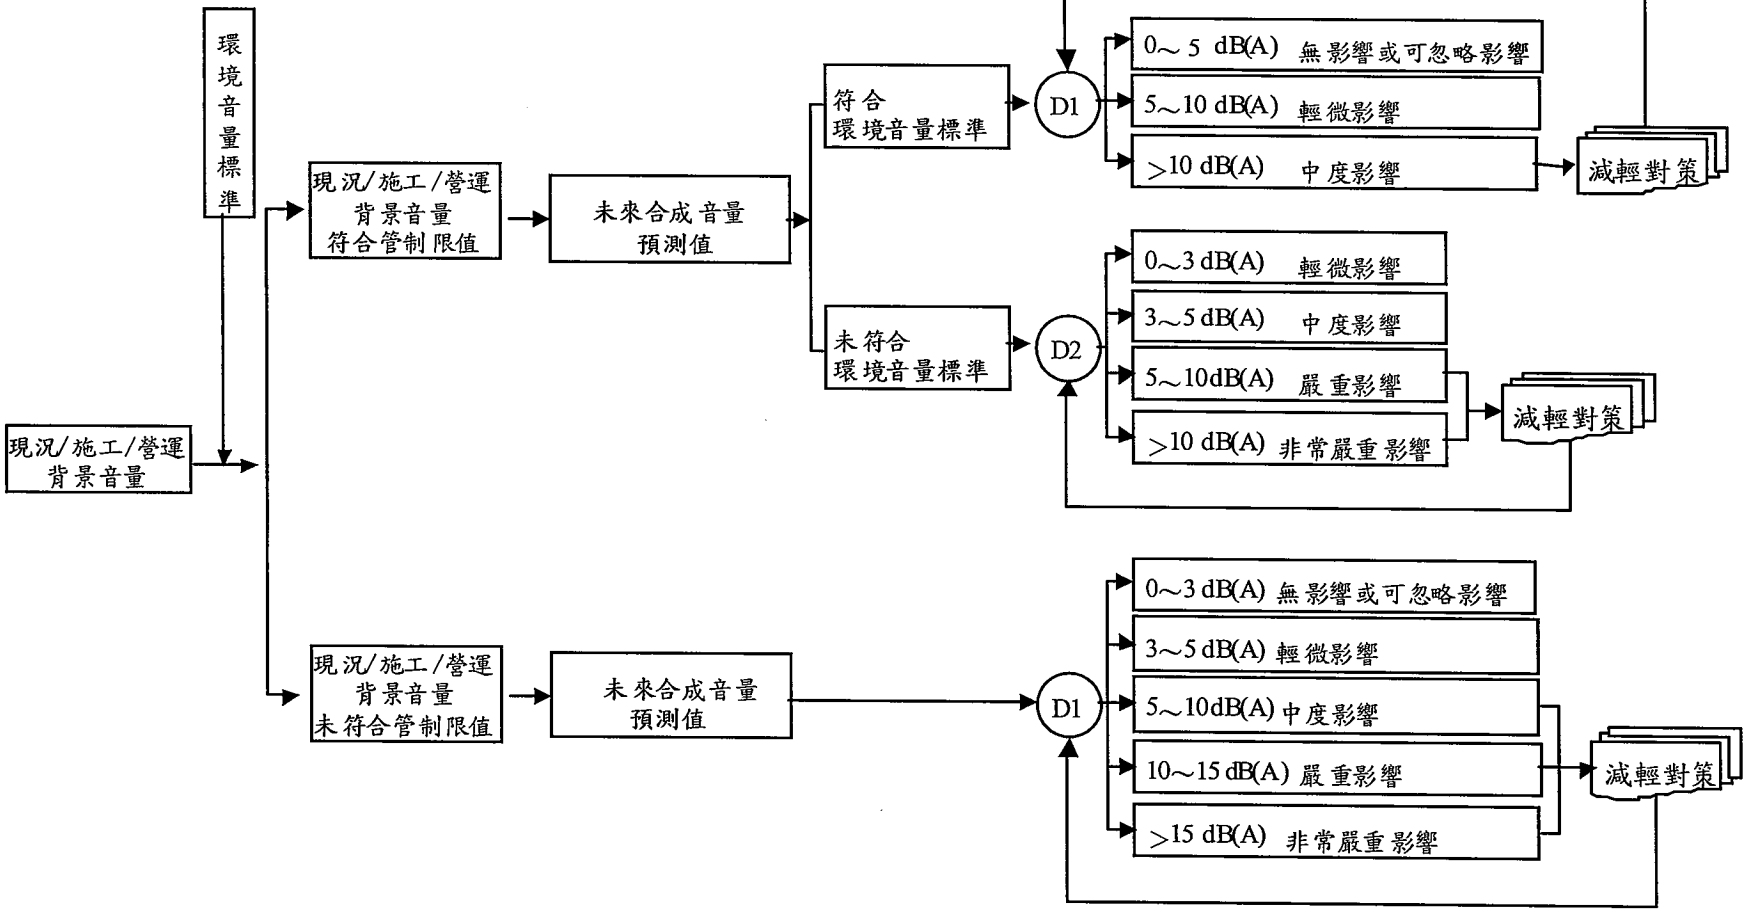


註：1. D1 未來合成音量預測值與現況/施工/營運背景音量之噪音增量
2. D2 未來合成音量預測值與環境音量標準之噪音增量
3. 等級劃分參考國內噪音法規、美國環保署環境影響評估準則歸類、噪音學原理及控制(蘇德勝著)。
4. 資料來源：黃乾全，「環境影響評估專業人員培訓講習會講義噪音與振動評估」，行政院環境保護署，民國87年1月。

MWH
美商傑明工程顧問（股）台灣分公司


圖2.3-1 環保署環境影響評估技術規範-營建工程噪音評估模式技術規範

測點：台2省道與102甲縣道交叉口

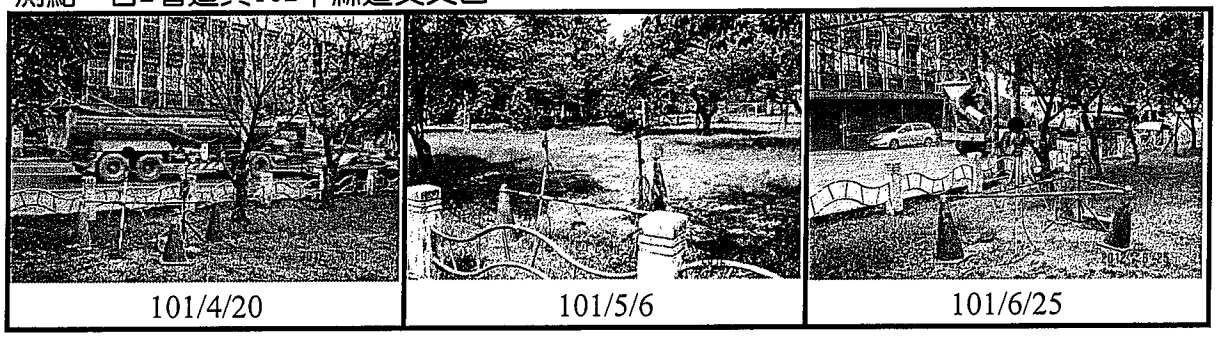


101/4/20	101/5/6	101/6/25

測點：鹽寮海濱公園

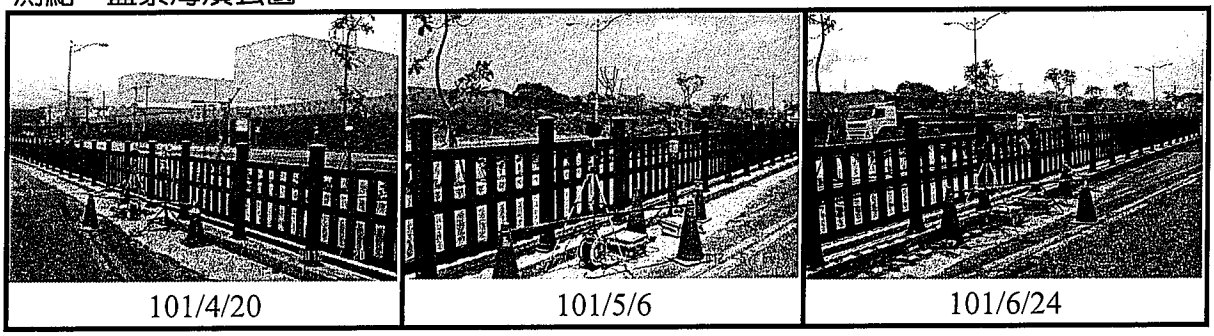


101/4/20	101/5/6	101/6/24

測點：福隆街上

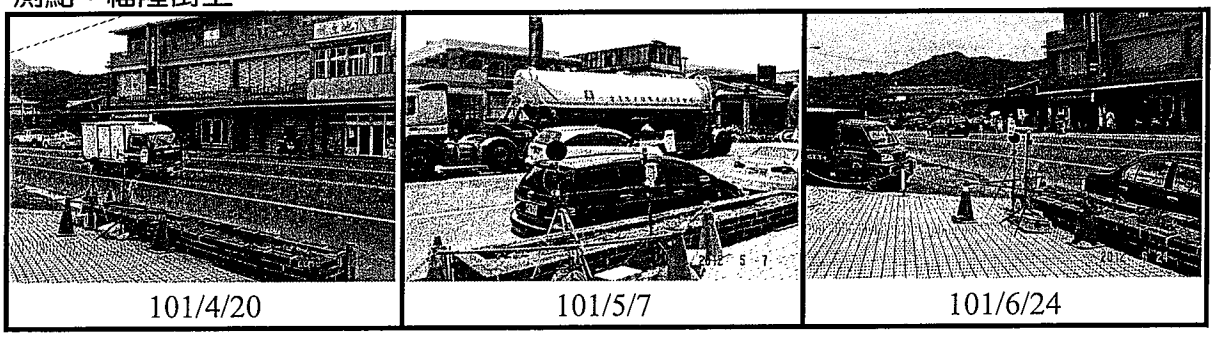


101/4/20	101/5/7	101/6/24

測點：102縣道之新社橋

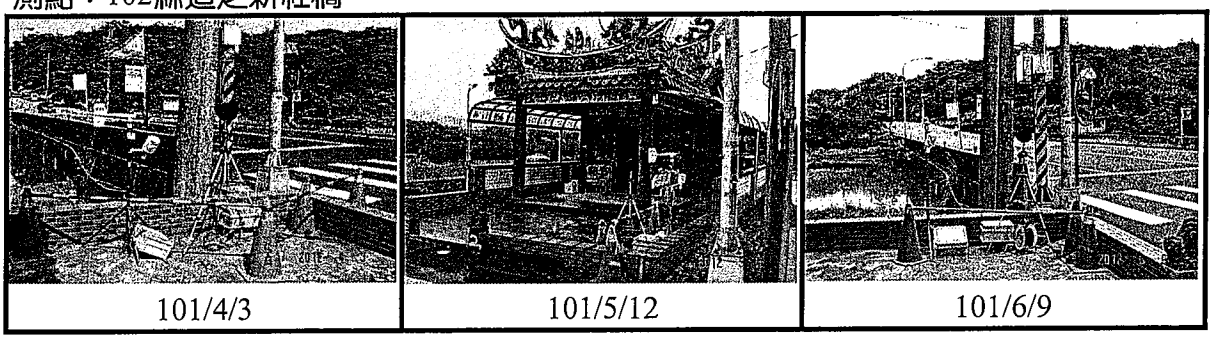

101/4/3	101/5/12	101/6/9

測點：過港部落

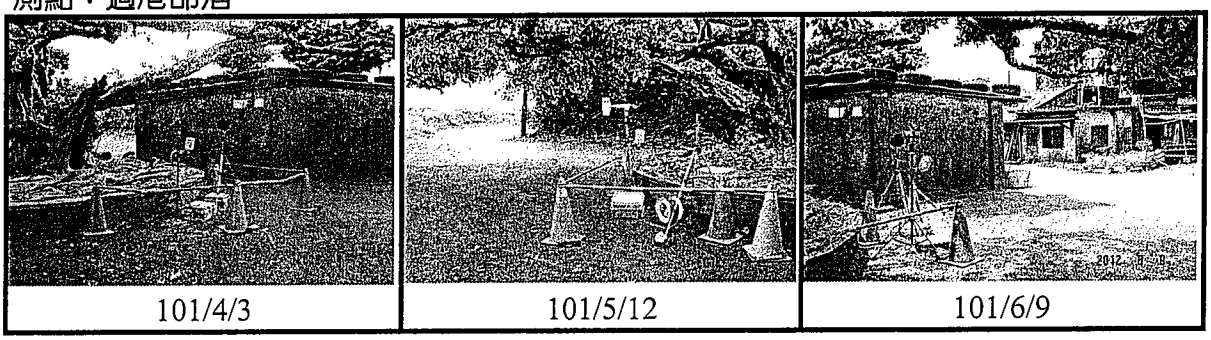

101/4/3	101/5/12	101/6/9

照片2.3-1 噪音振動監測照片

交通流量監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.4 交通流量監測

1.交通流量監測結果分析

本季於 4~6 月每月各進行 1 次 2 天（含非假日與假日）之交通流量調查。各測站之逐時監測結果列於附錄Ⅳ.4，綜合成果則整理於表 2.4-1~2.4-3 並說明如下：本季交通流量最大值（以 P.C.U./日為基準）發生在 5 月份假日台 2 省道與 102 甲縣道交叉口測站，交通量為 21,170.5 P.C.U./日，其車輛組成以小型車 13,836 輛（佔總車輛之 73.6%）為最多，其次為機車 2,883 輛（佔總車輛之 15.3%）。

本季省道旁之測站（台 2 省道與 102 甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等 3 測站）非假日車流量較高時段多發生於 7:00~18:00，假日車流量較高時段多發生於 11:00~16:00；非省道旁之測站（102 縣道之新社橋與過港部落等 2 測站）車輛數分佈情形，非假日車流量較高時段多發生於 7:00~8:00 及 16:00~18:00，假日車流量較高時段多發生於 13:00~16:00。

在車種組成方面，本季各月份各測站於車輛組成上多以小型車為主，其中省道旁之測站非假日小型車佔總車輛數比例介於 36.7~58.0%，假日介於 49.4~78.4%；非省道測站各月份小型車佔總車輛數比例，非假日與假日分別介於 38.7~64.8%及 48.1~75.7%之間。至於第二多數車種，在省道旁測站於非假日多以特種車為主，而假日多以機車為主，特種車於非假日及假日分別約佔 19.4~47.4%及 8.5~33.8%之總車輛數比例；機車於非假日及分別約佔 10.3~30.4%及 10.6~22.8%之總車輛數比例。非省道旁測站則多以機車為次多車種，非假日約佔 29.2~61.3%之總車輛數比例，假日則介於 21.1~51.9%之總車輛數比例。本季福隆海水浴場於 5 月 5 日至 6 月 30 日舉辦「2012 福隆國際沙雕藝術季」，活動聚辦期間吸引大量遊憩車輛前往福隆地區，惟本季 5 月份及 6 月份執行省道旁之測站監測作業時，其車流量應受舉辦活動影響，較 4 月份車流量偏高。

在吞吐量估算方面，依進入廠區車輛統計，本季（4~6 月）各月份總車輛總數介於 486~5,950 輛，小客車當量數介於 318.5~4,141.5P.C.U/日，其車輛組成以機車，約佔總車輛數之 62.2~73.7%，其次為小型車，約佔總車輛數之 25.3~32.4%，而大型車及特種車主要載運物品為零件蓋板、配電儀器及工具為主，因需海運方式運送之大型物件皆已運抵至廠區內，故本季所有物料原件皆以陸運方式運輸。

2.道路交通服務水準分析

評估道路系統服務品質之優劣，可藉由服務水準高低加以衡量，一般評估道路服務水準之指標常以道路交通流量（V）與道路服務流量（C）之比值（V/C）為指標，並分為 A、B、C、D、E 及 F 等 6 等級，如表 2.4-4 所示，其中道路交通流量乃指單位時間內該道路通過之車流量（以小客車當量 P.C.U.計）；至於道路服務流量乃指在現有道路及交通情況下，單位時間內該道路可容許之最大車流量，可由該道路之車道數、等級、所在區域及路基寬等特性評估得知。

表 2.4-5~表 2.4-7 即依上述為原則，計算本監測之 5 個交通流量測站於 4~6 月最高小時交通流量（P.C.U./H）。省道旁 3 處測站（台 2 省道與 102 甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等 3 測站）各月份尖峰時段之道路服務水準均維持在 B~C 級；另非省道旁測站（102 縣道之新社橋及過港部落）於非假日及假日尖峰時段之道路服務水準皆維持在 A 級。整體而言，扣除觀光活動影響，核四運輸車輛對台 2 省道交通運輸品質影響尚屬穩定可接受範圍。

表2.4-1 核四施工環境監測交通量101年4月監測結果統計表

單位：車輛數（所佔百分比%）

位置	監測日期	機車	小型車	大型車	特種車	P.C.U/日	總車輛數
台2省道與102甲縣道交叉口	非假日	3,421	4,657	478	3,485	17,778.5	12,041
	101/4/20	(28.4)	(38.7)	(4.0)	(28.9)		
	假　日	2,813	6,092	487	2,939	17,289.5	12,331
	101/4/21	(22.8)	(49.4)	(3.9)	(23.8)		
鹽寮海濱公園	非假日	1,518	3,430	480	3,253	14,908.0	8,681
	101/4/20	(17.5)	(39.5)	(5.5)	(37.5)		
	假　日	1,341	5,224	341	3,078	15,810.5	9,984
	101/4/21	(13.4)	(52.3)	(3.4)	(30.8)		
福隆街上	非假日	870	2,721	308	3,512	14,308.0	7,411
	101/4/20	(11.7)	(36.7)	(4.2)	(47.4)		
	假　日	972	4,727	316	3,068	15,049.0	9,083
	101/4/21	(10.7)	(52.0)	(3.5)	(33.8)		
102縣道之新社橋	非假日	471	970	35	80	1,515.5	1,556
	101/4/3	(30.3)	(62.3)	(2.2)	(5.1)		
	假　日	838	2,156	37	24	2,721.0	3,055
	101/4/4	(27.4)	(70.6)	(1.2)	(0.8)		
過港部落	非假日	45	45	0	0	67.5	90
	101/4/3	(50.0)	(50.0)	(0.0)	(0.0)		
	假　日	57	60	0	0	88.5	117
	101/4/4	(48.7)	(51.3)	(0.0)	(0.0)		

表2.4-2 核四施工環境監測交通量101年5月監測結果統計表

單位：車輛數（所佔百分比%）

位置	監測日期	機車	小型車	大型車	特種車	P.C.U/日	總車輛數
台2省道與102甲縣道交叉口	非假日	3,676	7,964	503	2,921	19,571.0	15,064
	101/5/7	(24.4)	(52.9)	(3.3)	(19.4)		
	假　日	2,883	13,836	350	1,731	21,170.5	18,800
	101/5/6	(15.3)	(73.6)	(1.9)	(9.2)		
鹽寮海濱公園	非假日	1,808	6,958	476	2,957	17,685.0	12,199
	101/5/7	(14.8)	(57.0)	(3.9)	(24.2)		
	假　日	2,176	13,109	374	1,675	19,970.0	17,334
	101/5/6	(12.6)	(75.6)	(2.2)	(9.7)		
福隆街上	非假日	1,158	6,512	360	3,197	17,402.0	11,227
	101/5/7	(10.3)	(58.0)	(3.2)	(28.5)		
	假　日	2,071	11,411	259	1,709	18,091.5	15,450
	101/5/6	(13.4)	(73.9)	(1.7)	(11.1)		
102縣道之新社橋	非假日	406	900	46	37	1,306.0	1,389
	101/5/11	(29.2)	(64.8)	(3.3)	(2.7)		
	假　日	588	2,111	37	53	2,638.0	2,789
	101/5/12	(21.1)	(75.7)	(1.3)	(1.9)		
過港部落	非假日	35	42	0	0	59.5	77
	101/5/11	(45.5)	(54.5)	(0.0)	(0.0)		
	假　日	29	46	0	0	60.5	75
	101/5/12	(38.7)	(61.3)	(0.0)	(0.0)		

表2.4-3 核四施工環境監測交通量101年6月監測結果統計表

單位：車輛數（所佔百分比%）

位置	監測日期	機車	小型車	大型車	特種車	P.C.U/日	總車輛數
台2省道與102甲縣道交叉口	非假日 101/6/24	3,969 (30.4)	5,401 (41.3)	469 (3.6)	3,229 (24.7)	18,010.5	13,068
	假　日 101/6/25	2,213 (13.9)	12,030 (75.8)	282 (1.8)	1,352 (8.5)	17,756.5	15,877
鹽寮海濱公園	非假日 101/6/24	1,928 (19.9)	4,241 (43.8)	558 (5.8)	2,961 (30.6)	15,204.0	9,688
	假　日 101/6/25	1,650 (10.6)	12,204 (78.4)	358 (2.3)	1,357 (8.7)	17,816.0	15,569
福隆街上	非假日 101/6/24	1,176 (15.3)	3,102 (40.4)	382 (5.0)	3,016 (39.3)	13,502.0	7,676
	假　日 101/6/25	1,869 (12.7)	11,215 (76.2)	280 (1.9)	1,346 (9.2)	16,747.5	14,710
102縣道之新社橋	非假日 101/6/8	626 (34.8)	1,050 (58.4)	46 (2.6)	76 (4.2)	1,683.0	1,798
	假　日 101/6/9	884 (27.4)	2,276 (70.5)	41 (1.3)	28 (0.9)	2,884.0	3,229
過港部落	非假日 101/6/8	92 (61.3)	58 (38.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	104.0	150
	假　日 101/6/9	84 (51.9)	78 (48.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	120.0	162

表 2.4-4 多車道郊區公路服務水準評估準則建議表

服務水準	密度（車/公里）	速率（KPH）	V/C	服務流率（P.C.U./hr/lane）	交通性質描述
A	0~13	~70	0.00~0.37	~750	自由車流
B	14~20	69~65	0.38~0.62	750~1150	穩定車流（少許延滯）
C	21~28	64~60	0.63~0.79	1150~1500	穩定車流（延滯可接受）
D	29~38	59~50	0.80~0.91	1500~1850	接近不穩定車流（延滯可容忍）
E	39~50	49~40	0.92~1.00	1850~2100	接近不穩定車流（延滯不可容忍）
F	50~	39~	>1.00	—	強迫性車流（已阻塞）

資料來源：交通部運輸研究所，「台灣地區公路容量手冊」，民國 100 年。

註：1.V/C ：為最高小時交通流量與道路每小時設計容量之比值。

2.服務流率：每車道每小時所承載之交通流量，P.C.U./hr/lane＝小客車當量數/小時/車道。

表 2.4-5 核四施工環境監測 101 年 4 月道路服務水準等級分析

測站別	路寬及車道路	設計實用最高小時容量(P.C.U/H)C	最高小時交通流量 V		V/C	服務水準等級
			發生時間	P.C.U./H.		
台 2 省道與 102 甲縣道交叉口	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 7-8	1,288.0	0.54	B
			(2) 11-12	1,230.0	0.51	B
鹽寮海濱公園	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 11-12	1,070.5	0.45	B
			(2) 10-11 12-13	1,148.5	0.48	B
福隆街上	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 11-12	1,047.0	0.44	B
			(2) 12-13	1,130.0	0.47	B
102 縣道之新社橋	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 9-10	149.0	0.06	A
			(2) 14-15	278.0	0.12	A
過港部落	5 公尺單車道	670	(1) 12-13	7.5	0.01	A
			(2) 13-14 15-16	15.0	0.02	A

註：發生時間(1)為 101 年 4 月非假日，(2)為 101 年 4 月假日。

表 2.4-6 核四施工環境監測 101 年 5 月道路服務水準等級分析

測站別	路寬及車道路	設計實用最高小時容量(P.C.U./H)C	最高小時交通流量 V		V/C	服務水準等級
			發生時間	P.C.U./H.		
台 2 省道與 102 甲縣道交叉口	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 17-18	1,641.0	0.68	C
			(2) 15-16	1,657.5	0.69	C
鹽寮海濱公園	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 17-18	1,491.0	0.62	B
			(2) 15-16	1,586.0	0.66	C
福隆街上	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 7-8	1,346.0	0.56	B
			(2) 15-16	1,532.5	0.64	C
102 縣道之新社橋	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 17-18	136.0	0.06	A
			(2) 15-16	272.5	0.11	A
過港部落	5 公尺單車道	670	(1) 14-15	12.5	0.02	A
			(2) 16-17	8.5	0.01	A

註：發生時間(1)為 101 年 5 月非假日，(2)為 101 年 5 月假日。

表 2.4-7 核四施工環境監測 101 年 6 月道路服務水準等級分析

測站別	路寬及車道路	設計實用最高小時容量(P.C.U./H)C	最高小時交通流量 V		V/C	服務水準等級
			發生時間	P.C.U./H.		
台 2 省道與 102 甲縣道交叉口	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 7-8	1,315.5	0.55	B
			(2) 15-16	1,599.0	0.67	C
鹽寮海濱公園	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 10-11	1,139.5	0.47	B
			(2) 15-16	1,610.5	0.67	C
福隆街上	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 10-11	989.0	0.41	B
			(2) 15-16	1,485.0	0.62	B
102 縣道之新社橋	12 公尺標準雙車道	2400	(1) 16-17	149.5	0.06	A
			(2) 15-16	317.0	0.13	A
過港部落	5 公尺單車道	670	(1) 17-18	15.5	0.02	A
			(2) 16-17	13.5	0.02	A

註：發生時間(1)為 101 年 6 月非假日，(2)為 101 年 6 月假日。

河川水文監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.5 河川水文監測

河川水文監測自 89 年 1 月起新增石碇溪下游，位於澳底二號橋附近之石碇溪 2 號河川水文監測站（詳圖 1.4-4 所示），有關本季石碇溪與雙溪河川水位監測結果，分別整理如表 2.5-1 及表 2.5-2 所示。至於河川橫斷面面積、流速與流量之監測結果詳如表 2.5-3，各測站之水位變化則詳見圖 2.5-1。本季監測結果分析說明如下：

1.河川水位

依據表 2.5-1、表 2.5-2 及圖 2.5-1 之監測結果顯示，本季（4~6 月）石碇溪 1 號測站之月平均河川水位分別為 1.69 公尺、1.82 公尺、1.80 公尺，石碇溪 2 號測站之月平均河川水位分別為 0.40 公尺、0.47 公尺、0.44 公尺，雙溪 1 號測站之月平均河川水位分別為 0.41 公尺、0.61 公尺、0.63 公尺，而雙溪 2 號測站之月平均河川水位分別 0.39 公尺、0.73 公尺、0.67 公尺。

2.河川流量

本季（4~6 月）河川流量監測結果詳表 2.5-3，由採樣施測結果顯示，石碇溪 1 號測站流量介於 0.237~12.923cms 之間，石碇溪 2 號測站流量介於 0.253~17.116cms 之間；雙溪 1 號測站流量介於 3.057~43.485cms 之間，雙溪 2 號測站流量介於 3.182~270.736cms 之間。與歷年同期之流量比較，本季因 6 月 12 日受梅雨峰面之豪大雨影響，當日降雨達 193.0mm，故各測值多高於歷年同期。

3.含砂量

依據表 2.5-3 之監測結果顯示，本季調查石碇溪及雙溪水中含砂量介於 0~888ppm 之間，其中 6 月 12 日因受梅雨峰面之豪大雨影響，當日降雨達 193.0mm，測值為歷年同期最高值。

表2.5-1 核四施工環境監測石碇溪河川水位101年第2季監測結果

測站別	石碇溪1號測站			石碇溪2號測站		
日期 \ 月份	101年4月	101年5月	101年6月	101年4月	101年5月	101年6月
1	1.65	1.72	1.85	0.39	0.41	0.48
2	1.64	1.76	1.78	0.39	0.44	0.44
3	1.64	1.82	1.75	0.39	0.47	0.42
4	1.62	2.04	1.76	0.39	0.60	0.43
5	1.63	1.91	1.74	0.40	0.51	0.42
6	1.64	1.80	1.72	0.39	0.45	0.40
7	1.64	1.75	1.71	0.39	0.42	0.40
8	1.63	1.72	1.70	0.38	0.41	0.40
9	1.65	1.74	1.69	0.40	0.43	0.40
10	1.68	1.75	1.70	0.41	0.42	0.40
11	1.65	1.77	1.68	0.39	0.43	0.39
12	1.65	1.77	2.50	0.38	0.44	0.88
13	1.63	1.77	2.10	0.37	0.44	0.62
14	1.62	1.74	1.99	0.37	0.42	0.55
15	1.62	1.86	1.92	0.37	0.50	0.51
16	1.71	1.97	1.86	0.41	0.55	0.46
17	1.70	1.96	1.83	0.40	0.55	0.44
18	1.70	1.88	1.81	0.39	0.49	0.42
19	1.68	1.81	1.79	0.38	0.45	0.42
20	1.67	1.78	1.78	0.38	0.44	0.42
21	1.70	1.75	1.79	0.40	0.42	0.42
22	1.75	1.72	1.79	0.43	0.41	0.42
23	1.71	1.71	1.77	0.39	0.40	0.41
24	1.70	1.70	1.75	0.40	0.39	0.40
25	1.68	1.69	1.74	0.39	0.39	0.40
26	1.91	1.68	1.72	0.52	0.39	0.39
27	1.95	1.73	1.70	0.53	0.43	0.39
28	1.83	1.90	1.69	0.46	0.52	0.39
29	1.78	2.04	1.70	0.43	0.58	0.39
30	1.74	2.19	1.67	0.42	0.69	0.38
31	-	2.00	-	-	0.56	-
月平均	1.69	1.82	1.80	0.40	0.47	0.44
核四環評同期平均	1.28	1.33	1.37	-	-	-
100年同期	1.64	1.75	1.68	0.39	0.45	0.40

註：1. 河川水位之量測單位為公尺，石碇溪1號測站（即歷年之石碇溪測站）之水尺零點標高為10.62公尺；石碇溪2號測站之水尺零點標高假定為0.00公尺。

2. 石碇溪1號測站（即歷年之石碇溪測站）之河川水位測值係每日24小時之平均值；石碇溪2號測站自89/1/24新增，表內數值係每日24小時之平均值。

3. 核四環評同期平均：係摘錄自「核能四廠第1、2號機發電計畫環境影響評估報告」（台電公司，民國80年），資料統計時間自民國69年至79年。

表2.5-2 核四施工環境監測雙溪河川水位101年第2季監測結果

測站別	雙溪1號測站			雙溪2號測站		
日期 \ 月份	101年5月	101年5月	101年6月	101年4月	101年5月	101年6月
1	0.33	0.45	0.72	0.25	0.50	0.79
2	0.33	0.51	0.61	0.25	0.60	0.67
3	0.32	0.69	0.66	0.29	0.76	0.72
4	0.31	0.96	0.83	0.28	1.09	0.91
5	0.32	0.81	0.74	0.23	0.90	0.81
6	0.32	0.61	0.65	0.31	0.66	0.69
7	0.31	0.52	0.54	0.26	0.56	0.59
8	0.31	0.46	0.49	0.25	0.52	0.53
9	0.31	0.48	0.45	0.25	0.56	0.50
10	0.37	0.49	0.43	0.33	0.57	0.48
11	0.33	0.54	0.40	0.27	0.58	0.45
12	0.35	0.58	2.12	0.32	0.63	2.30
13	0.33	0.64	1.23	0.27	0.72	1.23
14	0.31	0.53	1.02	0.30	0.58	1.12
15	0.31	0.76	0.88	0.25	0.86	0.97
16	0.40	1.02	0.70	0.36	1.16	0.77
17	0.42	0.97	0.60	0.38	1.07	0.66
18	0.43	0.79	0.53	0.39	0.85	0.59
19	0.40	0.64	0.50	0.39	0.69	0.55
20	0.38	0.58	0.47	0.37	0.66	0.52
21	0.39	0.54	0.49	0.41	0.62	0.54
22	0.46	0.49	0.53	0.46	0.55	0.50
23	0.42	0.45	0.50	0.40	0.51	0.47
24	0.41	0.41	0.46	0.39	0.47	0.43
25	0.40	0.39	0.43	0.40	0.44	0.39
26	0.70	-	0.41	0.81	0.40	0.37
27	0.84	-	0.41	0.94	0.42	0.35
28	0.63	-	0.38	0.67	0.85	0.36
29	0.55	-	0.38	0.58	1.16	0.36
30	0.51	-	0.35	0.54	1.50	0.36
31	-	-	-	-	1.16	-
月平均	0.41	0.61	0.63	0.39	0.73	0.67
核四環評同期平均	0.87	0.87	0.94	-	-	-
100年同期	0.35	0.51	0.38	0.33	0.59	0.44

註：1. 水位量測單位為公尺，雙溪1號之水尺零點標高為2.42公尺，雙溪2號為0.0公尺。

2. 雙溪1號及2號測站之測值係採用每日24小時之平均值。

3. 核四環評同期平均：係摘錄自「核能四廠第1、2號機發電計畫環境影響評估報告」（台電公司，民國80年），資料統計時間自民國69年至79年。

4.雙溪2號測站5/26~5/31因儀器故障，故無測值"-"。

表 2.5-3 核四施工環境監測河川斷面積、含砂量、流速與流量

101 年第 2 季監測結果

測站	觀測日期	河川斷面積 (m^2)	含砂量 (ppm)	平均流速 (m/sec)	流　量 (cms)	歷年同期實測流量(cms) (1)	100年同期實測流量(cms)
石碇溪 1 號測站	101/04/10(晴)	1.52	0	0.16	0.240	0.080~3.321	0.150
	101/04/24(晴)	1.57	0	0.16	0.257		
	101/05/18(雨)	3.01	0	0.55	1.660	0.085~4.255	1.645~2.876
	101/05/29(雨)	3.42	29	0.90	3.080		
	101/06/12(雨)	11.44	288	1.13	12.923	0.064~4.890	0.067~0.849
	101/06/28(晴)	1.91	0	0.12	0.237		
石碇溪 2 號測站(2)	101/04/10(晴)	0.91	-	0.28	0.253	0.080~6.420	0.166
	101/04/24(晴)	0.83	-	0.33	0.277		
	101/05/18(雨)	2.13	-	0.84	1.785	0.092~5.623	2.152~2.946
	101/05/29(雨)	2.41	-	1.33	3.213		
	101/06/12(雨)	8.64	-	1.98	17.116	0.064~7.172	0.072~1.163
	101/06/28(晴)	0.72	-	0.39	0.275		
雙溪 1 號測站	101/04/10(晴)	10.99	0	0.28	3.057	0.145~56.511	2.340
	101/04/24(晴)	12.46	0	0.31	3.887		
	101/05/18(雨)	49.68	0	0.55	27.097	0.978~69.360	29.782~32.360
	101/05/29(雨)	62.76	56	0.69	43.485		
	101/06/12(雨)	227.85	888	1.11	25.636	0.893~96.388	1.488~8.262
	101/06/28(晴)	7.84	-	0.57	4.435		
雙溪 2 號測站	101/04/10(晴)	4.30	0	0.74	3.182	0.776~74.280	2.473
	101/04/24(晴)	5.60	0	0.71	3.952		
	101/05/18(雨)	53.43	0	0.54	29.042	0.236~58.659	31.631~33.598
	101/05/29(雨)	69.30	52	0.70	48.310		
	101/06/12(雨)	227.85	846	1.19	270.736	0.610~130.774	1.550~10.434
	101/06/28(晴)	5.95	-	0.79	4.680		

註：1.歷年同期實測流量係摘錄「核能四廠發電工程施工期間環境監測」報告，其資料統計時間自民國82年至100年。

2.石碇溪2號測站自89年1月起新增。

3.石碇溪2號測站未測定含砂量，故無資料。

資料來源：台灣電力公司電源開發處提供。

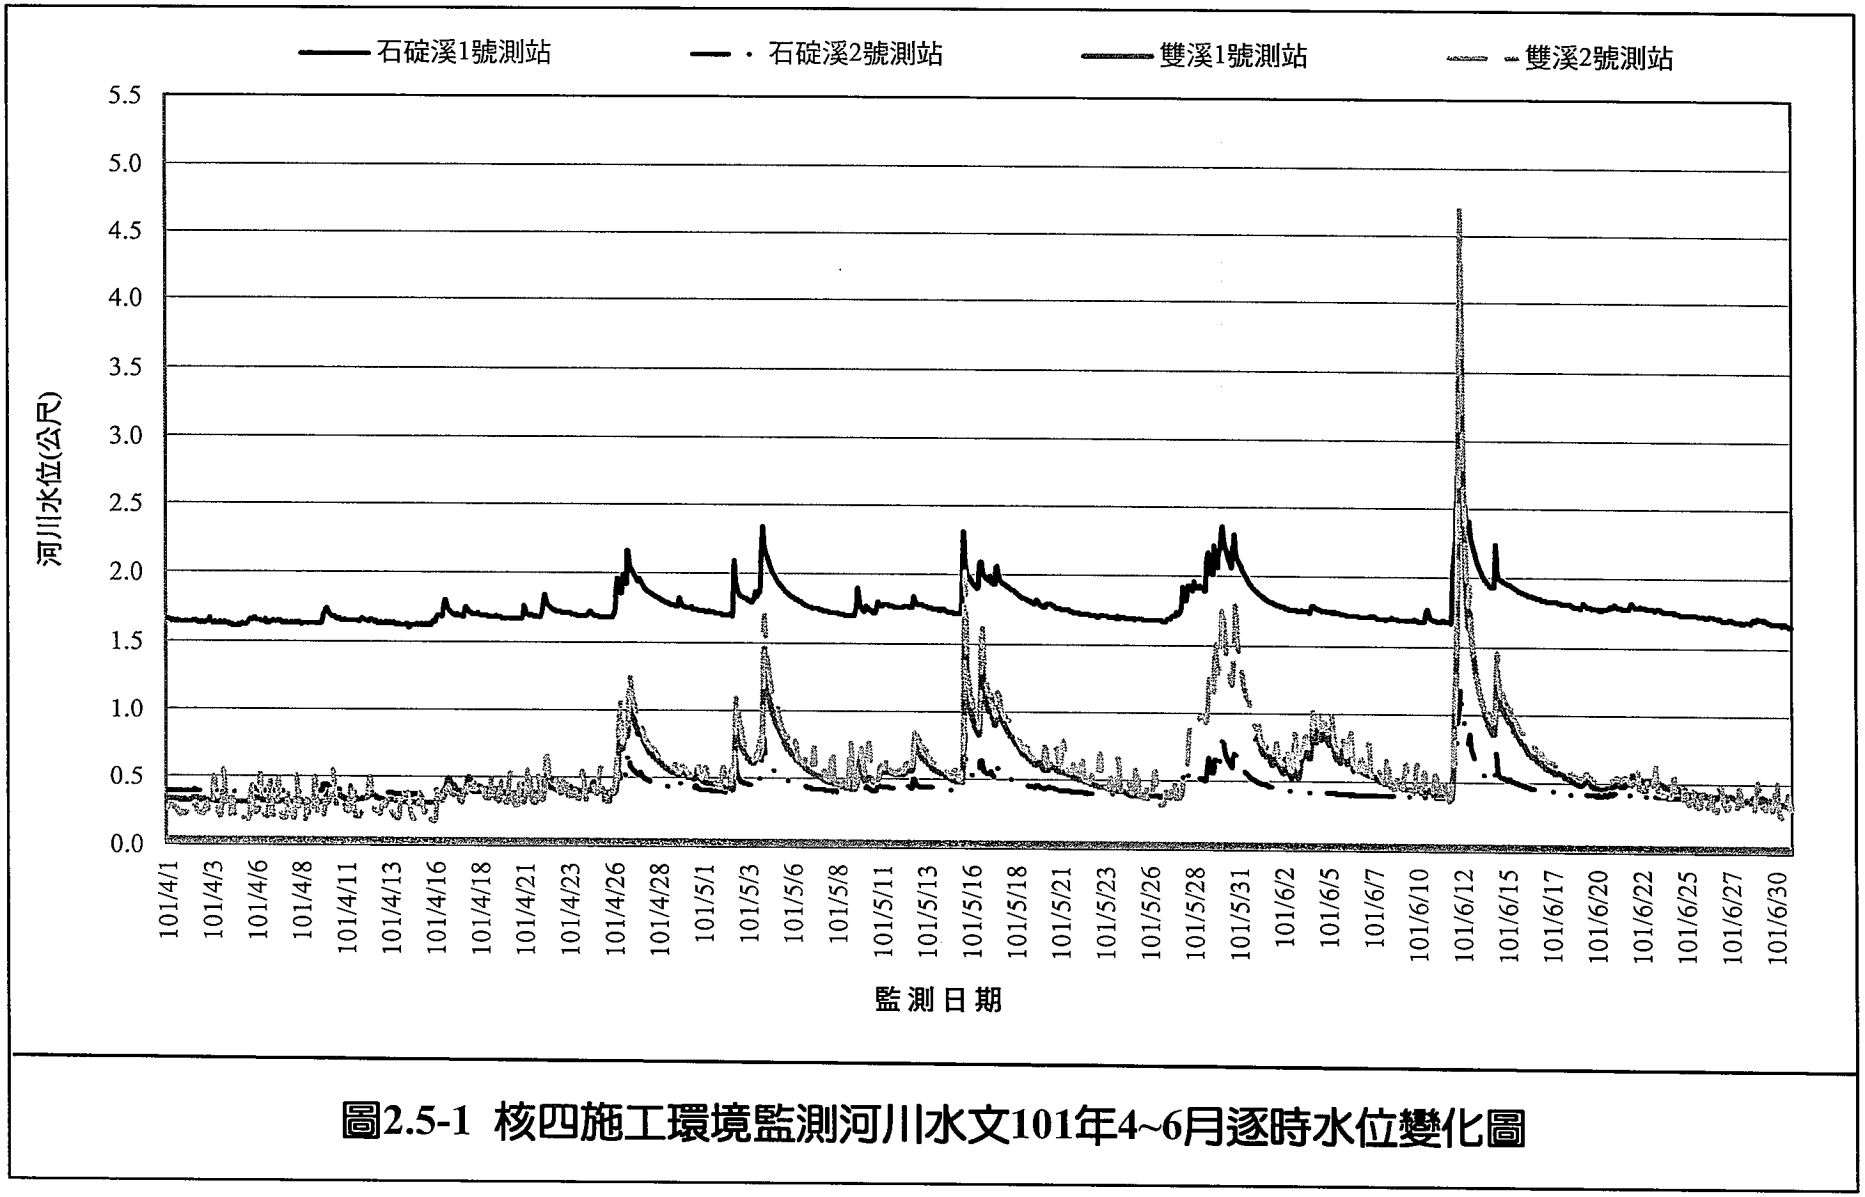


圖2.5-1 核四施工環境監測河川水文101年4~6月逐時水位變化圖

河川水質監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.6 河川水質監測

本季監測在雙溪流域、石碇溪流域及鹽寮溪河口共進行 3 次（每月 1 次）水質採樣及分析調查，調查結果分別整理如表 2.6-1 至表 2.6-3 所示。另自 90 年 5 月起新增支流暗渠上游(沼澤區)及澳底二號橋攔水堰上游 2 測站，其中支流暗渠上游（沼澤區）位於宿舍區工區放流水排放口上游，澳底二號橋攔水堰位於澳底生活污水、餐廳廢水等排入口前，其水質狀況可作為瞭解工區放流水對石碇溪之影響程度。

各類水體適用性質分類如表2.6-4所示，目前石碇溪尚未公告水體分類，而雙溪則公告為甲類陸域地面水體（前臺灣省政府環境保護處 80 年 3 月 21 日八十環三字第一二五五八號公告）。本報告乃依據行政院環境保護署 87 年 6 月 24 日最新修正之「地面水體分類及水質標準」(中華民國八十七年六月二十四日行政院環境保護署（八七）環署水字第〇〇三九一五九號令修正發布)，探討石碇溪及雙溪之河川水質是否符合各類水體之水質標準。環保署新修正標準中，分為保護生活環境及保護人體健康等二類環境基準，其中保護生活環境基準針對各水域類型訂定，而保護人體健康係全部公共水域一律適用（詳表 2.6-5~表 2.6-6）。

1.河川水質監測結果

本季於石碇溪及雙溪水質之監測結果（詳如表 2.6-1 及表 2.6-2），茲針對各測站水質狀況分別說明如下：

(1)石碇溪

①上游水文站：本季水質採樣分析結果，其中除大腸桿菌群（4~6 月）及氨氮（4 月）測值屬乙類陸域水體標準、生化需氧量（5 月）測值屬丙類陸域水體標準外，其餘測值均達甲類陸域水體水質標準，由於本測站位於核四廠址上游，該處無任何核四工區污水排入，因此大腸桿菌群測值偏高之情形，主要受上游社區住戶生活污水及養豬廢水排放所致。

②石碇溪廠界：本測站位於廠區周界，依本季（4~6 月）水質採樣分析結果，除大腸桿菌群測值均屬乙類陸域水體標準外，其餘測值均達甲類陸域水體標準。

③支流暗渠上游(沼澤區)：本測站係於 90 年 5 月新增，本季（4~6 月）水質採樣分析結果，其溶氧（測值介於乙類~丙類陸域水體標準）、大腸桿菌群（測值介於丙類~未符合陸域水體標準）、生化需氧量（測值介於丙類~未符合陸域水體標準）及氨氮（測值均為未符合陸域水體標準）測值未符合甲類陸域水體標準。該測站水質為石碇溪各測站中最差者，惟本測站上游處有生活及養豬廢水排入，且位於核四廠區排水匯入處之上游，研判本測站各項測值偏高可能是受鄰近生活污水、養豬廢水滯溜於沼澤區內所致。

④澳底二號橋攔水堰上游：本測站亦於 90 年 5 月新增。位於石碇溪下游之澳底二號橋測站上游，混合石碇溪上游及流經核四廠區內部之排放水，本季水質採樣分析結果，以生化需氧量（4 月測值屬乙類陸域水體標準）、大腸桿菌群及氨氮（4~6 月測值介於乙類~未符合陸域水體標準）項目水質較差，其餘項目則均符合甲類陸域水體標準。

⑤澳底二號橋：位於石碇溪下游之澳底二號橋測站，與澳底二號橋攔水堰上游測站水質狀況類似，本季（4~6 月）水質採樣分析結果，以大腸桿菌群及氨氮（測值均分別介於乙類~未符合陸域水體標準）項目水質較差，其餘項目則均符合甲類陸域水體標準。

⑵雙溪

依公告，雙溪屬甲類陸域地面水體。由於目前核四廠區僅逕流水會流入雙溪，惟於流入前會先經滯洪池後再排入雙溪，且逕流時間長，故對雙溪水質之影響輕微。有關本季分析結果如下：

①貢寮國小：本季貢寮國小測站水質採樣分析結果，僅 4~6 月大腸桿菌群測值屬乙類陸域水體標準未達甲類陸域水體標標外，其餘測值均屬甲類陸域水體水質標準。

②新社大橋：本季新社大橋水質採樣分析結果，除 5、6 月大腸桿菌群及 4 月生化需氧量測值屬乙類陸域水體水質外，其餘測值均屬甲類陸域水體水質標準。

惟雙溪 2 測站之大腸桿菌群及生化需氧量測值於施工前即有偏高之情形，且本季測值皆介於歷年範圍內。

2.河口水質監測結果

(1)石碇溪：為進一步就河口水質與海域水質比對，自 91 年 4 月起新增溶氧量及總磷等 2 項於海域水質所監測之項目；本季監測結果以大腸桿菌群（4~6 月測值均屬乙類陸域水體）、生化需氧量（4~6 月測值屬乙類~丙類陸域水體）、溶氧量（6 月測值均屬乙類陸域水體）及總磷（4~6 月測值均屬未符合陸域水體）等項目測值較高。

(2)鹽寮溪：本季監測結果以大腸桿菌群（4~6 月測值介於乙類~未符合陸域水體）、生化需氧量（5、6 月測值分屬乙類及丙類陸域水體）、溶氧量（5 月測值均屬乙類陸域水體）及總磷（5、6 月測值均屬乙類陸域水體）等項目測值較高。

(3)雙溪河口：本季以大腸桿菌群（4~6 月測值介於乙類~未符合陸域水體）、懸浮固體（6 月測值屬丙類陸域水體）及總磷（5、6 月測值均屬未符合陸域水體）等項目測值較高。

綜合而言，河川水質較差之項目為各月之大腸桿菌群、生化需氧量、溶氧量及總磷，其餘水質項目大致良好。由於核四工程生活污水皆經收集處理後予以排放，污染排出量比例甚低（詳 2.7 節分析），因此各河口之有機污染除上游河川帶出之陸源污染物外，沿岸遊憩、漁業活動等亦為主要影響因子。

3.河川水質分析

(1)河川污染指標(RPI)評估

依據表 2.6-7「河川污染程度分類表」之方式，推估本季各測站之

水質污染情況如表 2.6-8 所示。由推算結果得知，石碇溪各測站之污染程度，屬未(稍)受~輕度污染程度，其中以支流暗渠上游（沼澤區）測站水質較差，4~6 月份屬輕度~中度污染外，其餘各測站均屬未（稍）受污染程度，有關石碇溪之污染分佈詳圖 2.6-1 所示。另在雙溪部分，則均屬未（稍）受污染程度。

⑵中央大學歐陽氏指標(WQI5)評估

歐陽嶠暉等人於 1990 年提出了 1 個適用於台灣的河川水指標，其內容如下：

①水質參數：包括溶氧量、生化需氧量、氨氮、懸浮固體和導電度等 5 項。

②水質參數點數：WQI5 各項水質對應點數之設定，主要是以國內之河川水體分類水質標準為判定依據，並參考其他國家之水質標準將缺項補足，再推出點數曲線來表示參數之水質點數，這些點數並可以表 2.6-9 中所列公式計算。

③水質參數權數：依溶氧、生化需氧量、氨氮、懸浮固體、導電度的順序分別為 0.31、0.26、0.19、0.17、0.07。

④指標值之河川水質分類：根據歐陽氏指標值可以劃分河川水體分類等級如表 2.6-10 所示。

由本季 4~6 月份平均水質顯示，石碇溪 5 處測站以支流暗渠上游（沼澤區）測站水質最差，屬「中下」之「丁類水體」，其餘測站均屬「良」之「乙類水體」；而雙溪測站之貢寮國小及新社大橋測站均屬「良」之「乙類水體」，各測站評估結果詳表 2.6-11 所示。

表 2.6-1 核四施工環境監測石碇溪河川水質 101 年第 2 季監測結果

樣品名稱			上游水文站				石碇溪廠界				支流暗渠上游（沼澤區）			
檢測項目	單位	偵測極限	101.04.12 12:00（晴）	101.05.23 11:30（晴）	101.06.05 11:10（晴）	去年同期（100/4~100/6）	101.04.12 12:30（晴）	101.05.23 11:50（晴）	101.06.05 11:35（晴）	去年同期（100/4~100/6）	101.04.12 12:50（晴）	101.05.23 12:10（晴）	101.06.05 11:55（晴）	去年同期（100/4~100/6）
pH	-	-	7.514 甲	7.499 甲	7.497 甲	7.538 甲 ~8.203 甲	7.245 甲	7.291 甲	7.092 甲	7.133 甲 ~7.578 甲	7.014 甲	6.988 甲	6.942 甲	6.857 甲 ~7.651 甲
導電度	μmho/cm25℃	-	111	93	84	97~120	116	96	89	103~127	164	178	154	158~273
溶氧量	mg/L	-	7.7 甲	8.0 甲	7.4 甲	7.2 甲~8.6 甲	7.8 甲	8.6 甲	8.1 甲	7.2 甲~8.5 甲	6.3 乙	4.8 丙	6.2 乙	3.0 丁~5.9 乙
懸浮固體	mg/L	<1.0	3.8 甲	4.0 甲	2.8 甲	1.3 甲~4.0 甲	3.1 甲	3.6 甲	4.0 甲	1.9 甲~5.2 甲	6.0 甲	6.9 甲	19.1 甲	6.2 甲~23.2 甲
硝酸鹽氮	mg/L	0.01	1.14	0.42	0.46	0.53~0.92	1.16	0.55	0.51	0.53~0.78	0.22	0.04	0.14	0.02~0.24
磷酸鹽	mg/L	0.006	0.353	0.101	0.092	0.086~0.163	0.236	0.086	0.089	0.061~0.110	1.08	1.00	0.794	0.701~2.09
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	1.3×10^3 乙	2.8×10^2 乙	2.6×10^3 乙	1.1×10^3 乙 ~3.0×10^3 乙	9.0×10^2 乙	2.7×10^3 乙	2.9×10^3 乙	7.8×10^2 乙 ~4.6×10^3 乙	1.0×10^4 丙	8.8×10^4 X	2.2×10^4 X	2.5×10^4X ~8.1×10^4X
生化需氧量	mg/L	<1.0	<1.0 甲	3.3 丙	<1.0 甲	<1.0 甲~1.5 乙	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲	3.6 丙	6.2X	2.4 丙	2.3 丙~9.0X
化學需氧量	mg/L	2.9	8.5	4.4	ND	<ND~6.0	6.3	3.3	ND	ND~4.6	14.3	13.3	13.2	9.0~43.5
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0~1.2
氨氮	mg/L	0.01	0.16 乙	0.03 甲	0.02 甲	0.03 甲 ~0.05 甲	0.07 甲	0.03 甲	0.03 甲	0.02 甲 ~0.05 甲	0.96X	1.36X	0.75X	0.42X ~3.28X
鎳	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鐵	mg/L	0.017	0.366	0.294	0.298	0.210~0.461	0.398	0.433	0.445	0.249~0.547	2.28	3.45	3.12	1.30~4.71
鋅	mg/L	0.015	0.024	0.028	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	0.025	0.018	ND
鎘	mg/L	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅	mg/L	0.003	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND~0.04	ND	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	0.004	ND	ND	ND	0.006	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND
汞	mg/L	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

註：1.「甲」、「乙」、「丙」、「丁」、「戊」各代表符合甲、乙、丙、丁、戊類陸域地面水體水質標準，「x」表未能符合陸域地面水體水質標準。
2.支流暗渠上游（沼澤區）測站自90年5月起新增。

表 2.6-1 核四施工環境監測石碇溪河川水質 101 年第 2 季監測結果（續）

樣品名稱			澳底二號橋攔水堰上游				澳底二號橋			
檢測項目	單位	偵測極限	101.04.12 13:20 （晴）	101.05.23 12:30 （晴）	101.06.05 12:20 （晴）	去年同期 （100/4~100/6）	101.04.12 13:40 （晴）	101.05.23 12:50 （晴）	101.06.05 12:40 （晴）	去年同期 （100/4~100/6）
pH	-	-	7.382 甲	7.366 甲	7.395 甲	7.712 甲~7.676 甲	7.627 甲	7.451 甲	7.499 甲	7.416 甲~7.754 甲
導電度	μmho/cm25℃	-	656	204	200	150~445	326	208	190	226~457
溶氧量	mg/L	-	7.6 甲	8.3 甲	7.9 甲	6.9 甲~9.4 甲	7.7 甲	8.3 甲	7.2 甲	6.8 甲~9.8 甲
懸浮固體	mg/L	<1.0	4.4 甲	2.6 甲	4.9 甲	2.4 甲~3.9 甲	6.5 甲	2.4 甲	4.6 甲	2.8 甲~5.2 甲
硝酸鹽氮	mg/L	0.01	1.17	0.54	0.57	0.65~0.88	1.43	0.55	0.61	0.57~0.89
磷酸鹽	mg/L	0.006	0.571	0.209	0.202	0.221~0.543	0.653	0.190	0.196	0.252~0.469
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	1.3×10^4X	5.3×10^4X	2.8×10^3 乙	9.9×10^3 丙~4.2×10^4X	3.5×10^3 乙	3.3×10^4X	4.4×10^3 乙	6.8×10^3 丙~4.0×10^4 X
生化需氧量	mg/L	<1.0	1.6 乙	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲~3.3 丙	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲~2.1 丙
化學需氧量	mg/L	2.9	11.1	3.9	4.5	ND ~6.5	7.1	4.0	ND	ND~9.2
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
氨氮	mg/L	0.01	0.84 X	0.25 乙	0.12 乙	0.35 X~1.00 X	0.76 X	0.25 乙	0.14 乙	0.34 X ~0.66X
鎳	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
鐵	mg/L	0.017	0.693	0.54	0.643	0.450~0.771	0.657	0.546	0.608	0.401~0.736
鋅	mg/L	0.015	0.029	ND	ND	ND ~0.019	0.016	ND	ND	ND
鎘	mg/L	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅	mg/L	0.003	ND	ND	ND	ND	0.003	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	0.006	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND
汞	mg/L	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

註：1.「甲」、「乙」、「丙」、「丁」、「戊」各代表符合甲、乙、丙、丁、戊類陸域地面水體水質標準，「X」表未能符合陸域地面水體水質標準。
2.澳底二號橋攔水堰上游測站自90年5月起新增。

表 2.6-2 核四施工環境監測雙溪河川水質 101 年第 2 季監測結果

樣品名稱			貢寮國小				新社大橋			
檢測項目	單位	偵測極限	101.04.12 14:10 (晴)	101.05.23 13:10 (晴)	101.06.05 13:10 (晴)	去年同期 (100/4~100/6)	101.04.12 14:30 (晴)	101.05.23 13:30 (晴)	101.06.05 13:30 (晴)	去年同期 (100/4~100/6)
pH	-	-	7.622 甲	7.925 甲	7.659 甲	7.483 甲~8.003 甲	7.286 甲	7.451 甲	7.635 甲	7.272 甲~7.875 甲
導電度	μmho/cm25℃	-	122	96	79	105~120	2690	107	80	113~1460
溶氧量	mg/L	-	7.8 甲	8.3 甲	8.6 甲	7.8 甲~8.4 甲	7.5 甲	8.2 甲	8.1 甲	6.7 甲~8.7 甲
懸浮固體	mg/L	<1.0	4.0 甲	3.8 甲	8.2 甲	1.4 甲~6.4 甲	3.6 甲	18.4 甲	5.4 甲	3.6 甲~4.8 甲
硝酸鹽氮	mg/L	0.01	0.52	0.35	0.43	0.41~0.57	0.47	0.38	0.46	0.44~0.60
磷酸鹽	mg/L	0.006	0.034	0.034	0.052	0.021~0.052	0.037	0.071	0.034	0.028~0.040
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	1.3×10^2 乙	3.8×10^2 乙	2.7×10^3 乙	40 甲~5.3×10^3 丙	25 甲	2.4×10^3 乙	5.8×10^2 乙	95 乙~4.3×10^3 乙
生化需氧量	mg/L	<1.0	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲~1.7 乙	1.2 乙	<1.0 甲	<1.0 甲	<1.0 甲
化學需氧量	mg/L	2.9	6.5	3.1	ND	ND~9.4	10.9	ND	ND	ND
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
氨氮	mg/L	0.01	0.03 甲	ND 甲	0.02 甲	0.01 甲~0.05 甲	0.08 甲	ND 甲	ND 甲	0.02 甲~0.07 甲
鎳	mg/L	0.005	ND	ND	ND	ND	0.008	ND	ND	ND
鐵	mg/L	0.017	0.202	0.298	0.546	0.153~0.393	0.298	0.900	0.418	0.260~0.466
鋅	mg/L	0.015	0.023	ND	0.016	ND	0.02	ND	ND	ND
鎘	mg/L	0.001	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
銅	mg/L	0.003	0.003	ND	ND	ND~0.004	0.003	ND	ND	ND
鉻	mg/L	0.004	ND	ND	ND	ND	0.01	ND	ND	ND
汞	mg/L	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

註：「甲」、「乙」、「丙」、「丁」、「戊」各代表符合甲、乙、丙、丁、戊類陸域地面水體水質標準，「X」表未能符合陸域地面水體水質標準。

表 2.6-3 核四施工環境監測河口水質 101 年第 2 季監測結果

樣品名稱			石碇溪河口			
檢測項目	單位	偵測極限	101.04.03 11:10 (雨)	101.05.03 11:00 (陰)	101.06.04 12:45 (雨)	去年同期 (100/4~100/6)
鹽　度	psu	-	21.9	3.2	7.3	6.6~12.9
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	3.0×10^3 乙	4.1×10^3 乙	2.5×10^3 乙	3.1×10^2 乙~2.6×10^4 X
生化需氧量	mg/L	<1.0	2.6 丙	1.2 乙	1.1 乙	<1.0 甲~1.2 乙
懸浮固體	mg/L	<1.0	3.8 甲	8.2 甲	4.8 甲	3.2 甲~13.4 甲
濁　度	NTU	<0.05	2.8	7.4	4.7	1.6~15
溶 氧 量	mg/L	-	7.1 甲	7.3 甲	6.3 乙	7.4 甲~8.0 甲
總　磷	mg/L	0.002	0.069X	0.080X	0.085X	0.051 X~0.150 X
油　脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
樣品名稱			鹽寮溪河口			
檢測項目	單位	偵測極限	101.04.03 11:50 (雨)	101.05.03 11:40 (陰)	101.06.04 13:25 (雨)	去年同期 (100/4~100/6)
鹽　度	psu	-	0.3	0.3	0.2	0.6~0.9
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	2.3×10^2 乙	9.8×10^4X	2.2×10^3 乙	2.9×10^2 乙~7.7×10^5X
生化需氧量	mg/L	<1.0	<1.0 甲	1.7 乙	3.7 丙	<1.0 甲~2.3 丙
懸浮固體	mg/L	<1.0	4.4 甲	4.6 甲	9.2 甲	15.3 甲~29.2 丙
濁　度	NTU	<0.05	3.4	3.8	9.0	15~36
溶 氧 量	mg/L	-	9.0 甲	6.4 乙	6.7 甲	7.7 甲~8.5 甲
總　磷	mg/L	0.002	0.020 甲	0.030 乙	0.026 乙	0.051X ~0.230 X
油　脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
樣品名稱			雙溪河口			
檢測項目	單位	偵測極限	101.04.03 11:30 (雨)	101.05.03 11:20 (陰)	101.06.04 13:05 (雨)	去年同期 (100/4~100/6)
鹽　度	psu	-	6.9	0.2	0.3	0.1~3.0
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	8.1×10^2 乙	3.2×10^4X	1.3×10^4X	35 甲~6.8×10^3 丙
生化需氧量	mg/L	<1.0	<1.0 甲	<1.0 甲	1.0 甲	<1.0 甲
懸浮固體	mg/L	<1.0	5.6 甲	17.6 甲	29.2 丙	3.2 甲~8.1 甲
濁　度	NTU	<0.05	4.0	16	21	1.7~11
溶 氧 量	mg/L	-	8.6 甲	7.2 甲	8.0 甲	7.8 甲~8.6 甲
總　磷	mg/L	0.002	0.020 甲	0.060X	0.067X	0.018 甲~0.041 乙
油　脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

註：1.懸浮固體、濁度、溶氧量、總磷及油脂於 91 年 4 月開始執行。
2.大腸桿菌群及生化需氧量測項自 88 年 10 月起開始執行。
3.「甲」、「乙」、「丙」、「丁」、「戊」各代表符合甲、乙、丙、丁、戊類陸域地面水體水質標準，「x」表未能符合陸域地面水體水質標準。

表 2.6-4 地面水體適用性質分類

水體分類 / 水體適用性	甲　類	乙　類	丙　類	丁　類	戊　類
游泳	✓				
一級公共給水	✓				
二級公共給水	✓	✓			
三級公共給水	✓	✓	✓		
一級水產用水	✓	✓	✓		
二級水產用水	✓	✓	✓		
一級工業用水	✓	✓	✓		
二級工業用水	✓	✓	✓	✓	
灌溉用水	✓	✓	✓	✓	
環境保育	✓	✓	✓	✓	✓

說明：一級公共給水：指經消毒處理即可供公共給水之水源。

二級公共給水：指需混凝、沉澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源。

三級公共給水：指經活性碳吸附、離子交換、逆滲透等特殊或高度處理可供公共給水之水源。

一級水產用水：在陸域地面水體，指可供鱒魚、香魚及鱸魚培養用水之水源；在海域水體，指可供嘉臘魚及紫菜類培養用水之水源。

二級水產用水：在陸域地面水體，指可供鰱魚、草魚及貝類培養用水之水源；在海域水體，指虱目魚、烏魚及龍鬚菜培養用之水源。

一級工業用水：指可供製造用水水源。

二級工業用水：指可供冷卻用水之水源。

表2.6-5 保護生活環境相關環境基準

水體分類 / 限值 / 水質項目(註)	陸域地面水體 (河川、湖泊)				
	甲　類	乙　類	丙　類	丁　類	戊　類
pH	6.5-8.5	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0
溶氧量	≧6.5	≧5.5	≧4.5	≧3.0	≧2.0
大腸桿菌群	≦50	≦5,000	≦10,000		
生化需氧量	≦1.0	≦2.0	≦4.0		
懸浮固體	≦25	≦25	≦40	≦100	
氨氮	≦0.1	≦0.3	≦0.3		
總磷	≦0.02	≦0.05			

註：各項之單位：pH值無單位，大腸桿菌群CFU/100mL，其餘均為mg/L。

資料來源：行政院環保署87年6月24日修訂公告。

表 2.6-6 保護人體健康相關環境基準

水質項目		基準值（單位：毫克/公升）
重金屬	鎘	0.01
	鉛	0.1
	六價鉻	0.05
	砷	0.05
	汞	0.002
	硒	0.05
	銅	0.03
	鋅	0.5
	錳	0.05
	銀	0.05

備註：1.保護人體健康相關環境基準係以對人體具有累積性危害之物質，具體標示其基準值。
2.基準值以最大容許量表示。
3.全部公共水域一律適用。
4.其他有害水質之農藥，其容許量由中央主管機關增訂公告之。

資料來源：行政院環保署87年6月24日修訂公告。

表 2.6-7 河川污染程度分類表

污染程度 / 項目	未（稍）受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量（mg/L）	6.5 以上	4.6～6.5	2.0～4.5	2.0 以下
生化需氧量(mg/L)	3.0 以下	3.0～4.9	5.0～15	15 以上
懸浮固體 (mg/L)	20 以下	20～49	50～100	100 以上
氨氮 (mg/L)	0.50 以下	0.50～0.99	1.0～3.0	3.0 以上
點數	1	3	6	10
污染積分數	2.0 以下	2.0～3.0	3.1～6.0	6.0 以上

說明：1.表內之污染積分數為溶氧量、生化需氧量、懸浮固體及氨氮點數之平均值。
2.溶氧量、生化需氧量、懸浮固體及氨氮均採用平均值。

資料來源：台灣河川水質年報。

表 2.6-8 核四施工環境監測河川水質污染程度 101 年第 2 季推估結果

測站 / 項目	石碇溪											
	上游水文站			石碇溪廠界			支流暗渠上游（沼澤區）			澳底二號橋攔水堰上游		
監測日期	4/12（晴）	5/23（晴）	6/5（晴）	4/12（晴）	5/23（晴）	6/5（晴）	4/12（晴）	5/23（晴）	6/5（晴）	4/12（晴）	5/23（晴）	6/5（晴）
參考水位[1]	1.65	1.71	1.74	1.65	1.71	1.74	1.65	1.71	1.74	0.38	0.40	0.42
溶氧量	7.7	8.0	7.4	7.8	8.6	8.1	6.3	4.8	6.2	7.6	8.3	7.9
生化需氧量	<1.0	3.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.6	6.2	2.4	1.6	<1.0	<1.0
懸浮固體	3.8	4.0	2.8	3.1	3.6	4.0	6.0	6.9	19.1	4.4	2.6	4.9
氨氮	0.16	0.03	0.02	0.07	0.03	0.03	0.96	1.36	0.75	0.84	0.25	0.12
污染積分數	1.00	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	2.50	4.00	2.00	1.50	1.00	1.00
污染程度	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	輕度污染	中度污染	輕度污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染

測站 / 項目	石碇溪			雙溪					
	澳底二號橋			貢寮國小			新社大橋		
監測日期	4/12（晴）	5/23（晴）	6/5（晴）	4/12（晴）	5/23（晴）	6/5（晴）	4/12（晴）	5/23（晴）	6/5（晴）
參考水位[1]	0.38	0.40	0.42	0.35	0.45	0.74	0.32	0.51	0.81
溶氧量	7.7	8.3	7.2	7.8	8.3	8.6	7.5	8.2	8.1
生化需氧量	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	<1.0
懸浮固體	6.5	2.4	4.6	4.0	3.8	8.2	3.6	18.4	5.4
氨氮	0.76	0.25	0.14	0.03	ND	0.02	0.08	ND	ND
污染積分數	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
污染程度	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染	未(稍)受污染

註：參考水位係以鄰近之河川水文測站水位為比較基準，河川水位之量測單位為公尺，上游水文站、石碇溪廠界及支流暗渠上游等 3 站參考石碇溪 1 號測站之水位，其水尺零點為 10.62 公尺；澳底 2 號橋攔水堰上游及澳底二號橋等 2 站參考石碇溪 2 號測站之水位，其水尺零點假定為 0.00 公尺；貢寮國小參考雙溪 1 號測站之水位，其水尺零點為 2.42 公尺；新社大橋參考雙溪 2 號測站之水位，其水尺零點為 0.0 公尺（詳 2.5 節）。

表 2.6-9 WQI5 之水質點數計算式

水質參數	單　位	點　　數(qi)
溶氧	飽和度%	－ 0.08841347 ＋ 0.8996848×K—4.907377×10-2×K2 ＋ 1.5696×10-3×K3—1.5216×10-5×K4＋4.545×10-8×K5
生化需氧量	mg/L	1123.6/〔1＋9.99×EXP（0.2×BOD）〕
氨氮	mg/L (as N)	9.79＋56.76／（N＋0.6236888）
懸浮固體	mg/L	100.1－2.433×T＋2.282×10-2×T2－7.90×10-5×T3
導 電 度	μmho/cm	101.7／〔1＋0.0062×EXP（8.32×10-3×C）〕

資料來源：水質監測整合計畫，行政院環保署，民國 85 年 6 月。


表 2.6-10 歐陽氏 WQI5 水質分類等級表

水質指標	水質等級	河川水體分類
91-100	優	甲
71-90	良　好	乙
51-70	中　等	丙
31-50	中下等	丁
16-30	不　良	戊
<15	惡　劣	－

表 2.6-11 核四施工環境監測 101 年第 2 季 河川 WQI5 指標評估結果

溪別 / 項目		石碇溪					雙溪	
		上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游（沼澤區）	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋
點數	DO	100	100	70	100	100	100	100
	BOD	70	90	25	90	90	90	90
	SS	90	90	70	90	90	90	90
	NH_3-N	90	90	25	45	45	90	90
	導電度	90	90	90	90	90	90	25
WQI5		82	90	37	78	78	90	83
水質等級		良	良	中下	良	良	良	良
水體分類		乙	乙	丁	乙	乙	乙	乙

註：WQI5 取四捨五入至整數位。

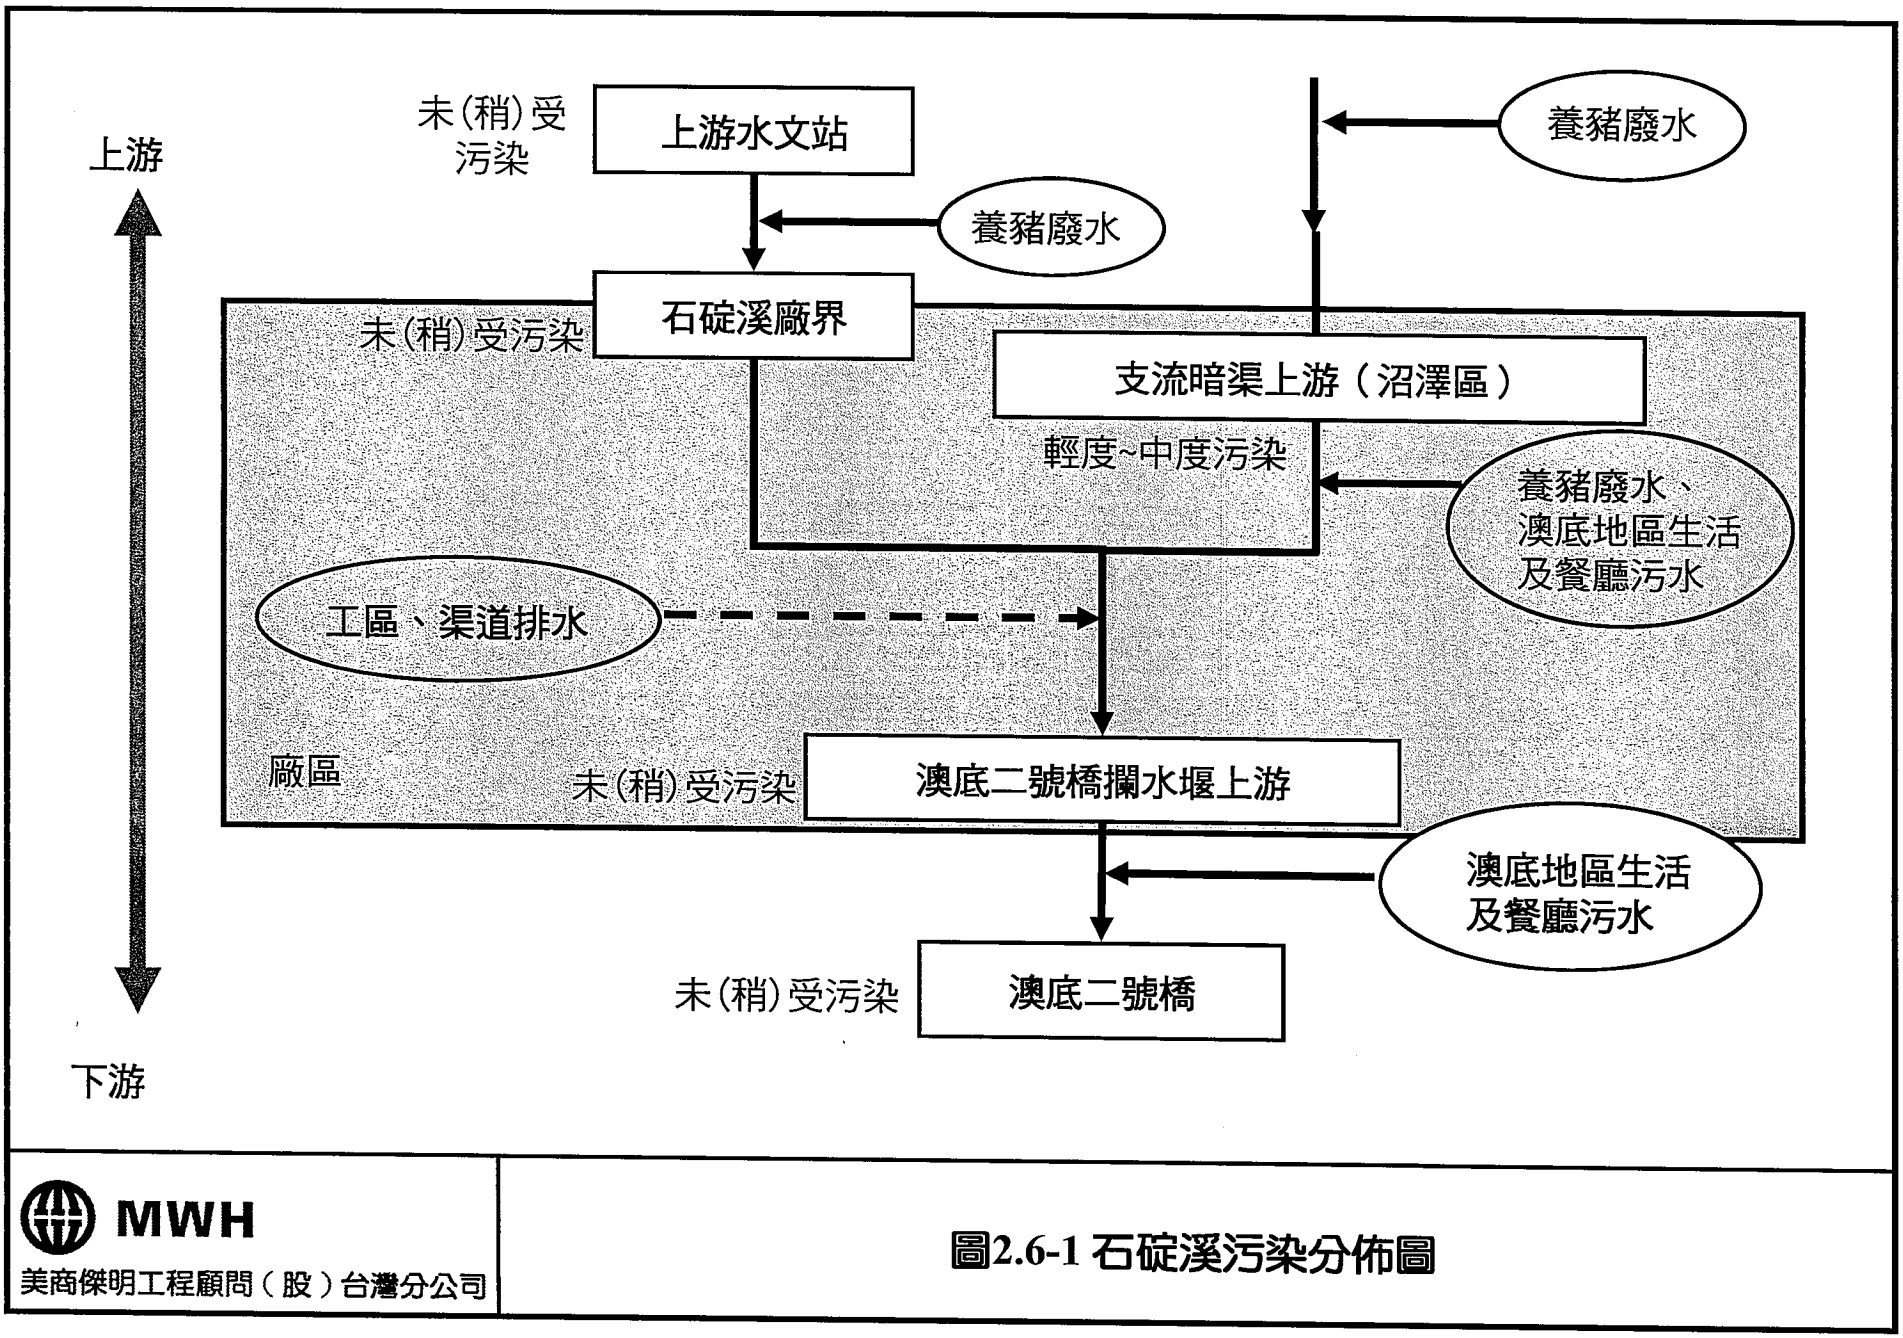

MWH
美商傑明工程顧問（股）台灣分公司

圖2.6-1 石碇溪污染分佈圖

廠區水質監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.7 廠區水質監測

本項監測主要係針對廠區各排入鄰近水體（石碇溪、鹽寮溪）之排水口進行水質監測。各測站中辦公區排水口(1)、(2)等 2 處測站完全為廠區產生之污染源，而 2 號排洪渠道及鹽寮一號橋等 2 測站之排水則混合有山泉水或野溪溪水，宿舍區排水口測站則匯集有廠區外生活污水及沼澤區水。

目前工區內辦公廳舍及宿舍區等臨時建物及排水設施均於 87 年放流水相關標準制定前建造完成，惟因應現行法規標準，故以放流水相關管制標準做為參考基準，即辦公區排水口(1)、(2)及宿舍區排水口等 3 處放流水質以放流水標準中既設建築物污水處理設施標準（如表 2.7-1 所示）為參考依據，而 2 號排洪渠道、鹽寮一號橋排洪渠道出口等 2 測站則以中央主管機關指定之事業廢水-貯煤場、營造工地、土石方堆(棄)置場之管制標準（如表 2.7-1 所示）為參考依據。本季監測結果（詳表 2.7-2），各測值均符合放流水標準。

另針對施工人員生活污水之有機污染對河川水質影響方面，目前廠區之生活污水僅排至石碇溪。而核四廠污水處理廠亦已完工，目前進行試運轉中。本季核四廠區內之員工污水（詳表 2.7-3）多已接管至污水處理廠內處理，僅少部份經由化糞池或合併式淨化槽處理後排放，依據廠內各生活污水排水口之監測結果顯示，生化需氧量及氨氮平均濃度分別為 6.2mg/L 及 9.4mg/L，依此推估本季廠區之生化需氧量及氨氮污染排放量分別為 1.09 公斤/日及 1.66 公斤/日推估（污染量推估詳表 2.7-4）；另推估工區污染排放佔石碇溪污染比例，石碇溪之背景流量約為 3.820m^3/sec（101 年 4~6 月石碇溪 2 號水文測站之平均河川流量，詳表 2.5-3 所示），而生化需氧量及氨氮濃度分別為 0.5mg/L 及 0.38mg/L（本季澳底二號橋測站 101 年 4~6 月平均測值），故推算本廠區排放之生化需氧量及氨氮污染量分別佔石碇溪背景污染量之 0.66%及 1.32%，其污染排放量對石碇溪水質影響尚屬有限。

表 2.7-1 與本計畫相關之放流水標準

適用範圍		項　　目	單位	最大限值
事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢污水共同適用		水溫	℃	1.攝氏 38 度以下(適用於 5~9 月)。 2.攝氏 35 度以下(適用於 10 月~翌年 4 月)。
		pH	-	6.0~9.0
		油脂	mg/L	10
貯煤場、營建工地、土石方堆(棄)置場		生化需氧量(BOD)	mg/L	30
		化學需氧量(COD)	mg/L	100
		懸浮固體(SS)	mg/L	30
		真色色度	-	550
既設建築物污水處理設施	流量大於 250 立方公尺/日	生化需氧量(BOD)	mg/L	30
		化學需氧量(COD)	mg/L	100
		懸浮固體(SS)	mg/L	30
		大腸桿菌群	CFU/100mL	2×10^5
	流量介於 50~250 立方公尺/日	生化需氧量(BOD)	mg/L	50
		化學需氧量(COD)	mg/L	150
		懸浮固體(SS)	mg/L	50
		大腸桿菌群	CFU/100mL	3×10^5
	流量小於 50 立方公尺/日	生化需氧量(BOD)	mg/L	80
		化學需氧量(COD)	mg/L	250
		懸浮固體(SS)	mg/L	80

資料來源：行政院環保署 100 年 12 月 1 日修正發布之放流水標準。

表 2.7-2 核四施工環境監測廠區排水水質 101 年第 2 季監測結果

樣品名稱			辦公區排水口（1）				辦公區排水口（2）				宿舍區排水口			
檢測項目	單位	方法偵測極限	101.04.12 9:30（晴）	101.05.23 9:20（晴）	101.06.05 9:00（晴）	去年同期 (100/4~100/6)	101.04.12 10:00（晴）	101.05.23 9:40（晴）	101.06.05 9:20（晴）	去年同期 (100/4~100/6)	101.04.12 10:310（晴）	101.05.23 10:10（晴）	101.06.05 9:45（晴）	去年同期 (100/4~100/6)
流　量	m^3/day	-	18.3	26.6	23.7	13.2~24.6	20.4	37.4	31.9	35.3~42.7	5.47×10^3	6.05×10^3	5.47×10^3	3.74×10^3 ~5.18×10^3
pH	-	-	7.594	7.395	7.295	6.812~7.302	7.092	7.156	7.166	7.294~7.515	7.154	7.118	7.147	6.876~7.555
導電度	μmho/cm25℃	-	213	640	551	236~274	336	430	325	222~267	845	802	659	787~2450
真色色度	color unit	<25	<25	67	45	<25	<25	<25	<25	<25	26	42	47	<25~30
懸浮固體	mg/L	<1.0	2.3	11.2	9.0	2.9~5.5	4.6	4.2	1.8	2.8~6.5	6.8	8.9	6.2	8.9~16.8
化學需氧量	mg/L	2.9	12.1	52.4	34.1	9.0~14.8	3.7	ND	ND	<2.9 ~16.1	21.1	26.0	14.2	22.5~38.3
生化需氧量	mg/L	<1.0	1.7	24.0	8.1	2.4~3.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0~1.6	4.0	13.7	2.9	4.9~11.5
油　脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0~2.1
氨　氮	mg/L	0.01	1.65	43.2	32.8	1.44~3.44	0.18	0.21	0.16	0.06~0.08	3.83	2.29	0.44	0.73~6.95

表 2.7-2 核四施工環境監測廠區排水水質 101 年第 2 季監測結果（續）

樣品名稱			2 號排洪渠道				鹽寮一號橋排洪渠道出口			
檢測項目	單位	方法偵測極限	101.04.12 11:00 （晴）	101.05.23 10:35 （晴）	101.06.05 10:10 （晴）	去年同期 (100/4~100/6)	101.04.12 11:30 （晴）	101.05.23 11:00 （晴）	101.06.05 10:40 （晴）	去年同期 (100/4~100/6)
流　量	m^3/day	-	8.35×10^3	6.91×10^3	6.91×10^3	4.03×10^3 ~5.76×10^3	1.15×10^3	1.44×10^3	1.73×10^3	5.76×10^2 ~1.15×10^3
pH	-	-	7.306	7.620	7.527	7.363~7.923	8.139	8.174	7.774	7.409~7.749
導 電 度	μmho/cm25℃	-	244	184	263	238~265	800	718	740	504~722
真色色度	color unit	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
懸浮固體	mg/L	<1.0	4.2	2.4	3.2	<1.0~2.0	<1.0	14.5	2.7	2.1~3.0
化學需氧量	mg/L	2.9	12.6	4.2	3.0	<2.9~41.2	4.8	ND	ND	<2.9 ~11.3
生化需氧量	mg/L	<1.0	1.4	1.1	<1.0	<1.0~4.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0~3.4
油　脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
氨　氮	mg/L	0.01	0.56	0.26	0.17	0.20~0.34	0.01	0.03	0.11	ND ~0.06

註：”ND”表低於方法偵測極限。

表 2.7-3　101 年第 2 季每日平均人員數量表

項　　目	人數	備　　註
1.施工作業人員 (1)施工機具操作人員 (2)技術工 (3)臨時工	1,182	1.依據龍門施工處施工日誌統計，以每月總出工日數（4月為23天、5月為26天、6月為25天）平均求得每日平均施工作業人員數量（4月：1,246人/日；5月：1,208人/日；6月：1,091人/日）。 2.施工作業人員依規定不能留宿於廠區。
2.管理職工	1,010	管理職工包括：台電人員（龍門施工處及核四廠人員）約693人、AE工程師約203人、勞務工作人員約115人；其中有169人留宿。
3.保　　警	106	保警均留宿於廠區
合　　計	2,298	—

表 2.7-4　101 年第 2 季每日平均污水量及污染量推估表

處理別 \ 項目		污水量（m^3/day）	排放濃度 (mg/L)	污染量 (kg/day)
生化需氧量	處理前	176.38	200	35.3
	處理後		6.2	1.09
氨氮	處理前	176.38	30	5.3
	處理後		9.4	1.66
備　　註		留宿於廠區人員約275人之污水量以每人每日200公升計，通勤人員約2,023人以每人每日60公升計。	1.處理前以一般都市污水污染含量估算，生化需氧量為200mg/L、氨氮為30mg/L。 2.放流水排放濃度以本季辦公區及宿舍區實測平均值計。測值為ND者，則採$\left(\frac{\text{偵測極限值}}{2}\right)$為其值以平均之。 3.污染量（kg/day）=污水量（m^3/day）×生化需氧量含量（mg/L）×(1/1000)	

地下水監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.8 地下水監測

本計畫之地下水監測，係採用台電公司既設之地下水監測井，選定 12 口進行地下水水位與地下水水質監測工作。歷年監測之地下水監測井為 GM2、GM3、GM6、P5、P8、GM9、GM10、GM11、GM12、GM13、GM7 及 GM14 等，P8 監測井因坍孔、GM14 監測井因工程填孔廢棄，分別設置 P8-1 及 GM14-1 監測井始恢復監測，另 GM3 監測井因設置於私人土地上，P5 監測井位於工程施工範圍內，故亦一併於 91 年 8 月新井完成後（分別為 GM3-1 及 P5-1 監測井）移站監測，而 P8-1 監測井 100 年 4 月因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 P8-1'續持進行監測。有關地下水水位與地下水水質監測結果分述如下。

1.地下水水位

本計畫自 93 年 9 月起，於地下水監測井內安裝水位自動監測儀器記錄，紀錄每小時之水位標高，各測站逐時調查月報表列於附錄Ⅳ，水位標高監測結果則整理於表 2.8-1，日平均水位變化繪如圖 2.8-1 所示。本季（4~6 月）整體而言，山區監測井中 GM11、GM12、GM13 之月平均水位標高約在 28.50~44.29 公尺之間；其餘平地監測井之月平均水位介於 1.09~19.92 公尺之間。

2.地下水水質

本季（4~6 月）地下水水質監測每月進行 1 次採樣，共進行 3 次，水質分析結果整理於表 2.8-2，水質檢驗分析報告則列於附錄Ⅳ.6；以下報告乃引用「地下水污染管制標準」（100 年 2 月 10 日發佈）及「地下水污染監測標準」（100 年 2 月 10 日發佈）中第二類作為非飲用水水源之地下水進行比對，分析探討各地下水監測井之水質狀況。

(1)pH

測值介於 5.130~7.855 間，多呈偏酸性反應，根據調查一般天然地下水之 pH 值約介於 6.0~8.5 之間(環保署，1996)，但有時地下水中會

因溶解較多之 CO2（如生物作用產生），使得地下水呈弱酸（pH 低於 7）。本季地下水除 GM6-1、GM7、GM10 等監測井之 pH 監測值屬中性略偏鹼外，其餘監測井均呈現弱酸性反應，各測值與環評背景值相近。

⑵導電度

一般而言，地下水鹽化現象之來源除人為污染外，主要為天然鹽水（Connate Brines）及海水入侵（Salt Water Instrusion）所致，而地下水之鹽化若以溶解固體量做為參考指標，則其溶解固體量超過 1,000mg/L 時，可視此地下水已有鹽化現象，此一數值如換算成導電度約為 1,400μmho/cm，亦即相當氯鹽濃度 330mg/L。

本季監測井之導電度測值以 GM10 監測井測值較高，其測值介於 900~1,260μmho/cm 之間，因 GM10 監測井所在位置距海邊較近，導致導電度等受海水影響而升高，其餘監測井之測值介於 112~796μmho/cm，均在鹽化限值之內。

⑶濁度

本季監測井之濁度監測值介於 0.25~9.7 NTU 之間。

⑷氯鹽

本季氯鹽測值介於 14.0~262mg/L 間，以近海濱之 GM10 監測井測值（介於 170~262mg/L）較高；各監測井測值與第二類「地下水污染監測基準」相較，各監測井均符合 625mg/L 之標準值。

⑸懸浮固體

懸浮固體項目自 88 年 6 月起新增，本季各監測井之懸浮固體測值介於低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~9.8mg/L 間。

⑹硫酸鹽

本季各監測井之硫酸鹽測值介於 7.8~123mg/L 之間，各測值均符

合第二類「地下水污染監測標準」625mg/L 之標準值。

⑺氨氮

本季以 GM3-1（4~6 月測值介於 0.67~0.84mg/L 之間）有略超出第二類「地下水污染監測標準」之情形，惟超出幅度不大，其餘未超出法規標準之監測井，本季監測值介於低於偵測極限（ND<0.01）~0.24mg/L 之間。GM3-1 監測井歷年測值介於 0.13~1.41mg/L，該監測井自設井之初，測值即有偏高之情形，故研判係屬地區環境特性。

⑻總有機碳

一般而言，總有機碳及化學需氧量具有指示地下水是否遭受有機污染的指標，由工研院的研究可知，地下水若受到有機污染其總有機碳濃度應大於 4mg/L，且化學需氧量會有偏高的情形。本季各監測井總有機碳之監測值介於 0.1~1.4mg/L 之間，本季各測值均符合第二類「地下水污染監測標準」10mg/L 之標準值。

⑼總硬度

本季各監測井硬度以 GM6-1、GM10 及 GM14-1 等監測井測值較高，分別為 192~214mg/L、243~302mg/L、324~354mg/L 之間，其餘監測井測值則介於 16.6~159mg/L 之間，與「地下水污染監測標準」750mg/L 相較，所有測值均符合第二類「地下水污染監測標準」。

⑽重金屬（鐵、錳、鉛、鎘、銅、汞、鋅、鉻及砷）

本季各監測井之重金屬測值，僅 GM3-1 監測井之重金屬鐵（4、6 月測值分別為 2.310mg/L、2.740mg/L）及錳（4~6 月測值介於 3.170~4.060 mg/L）測值未能符合「地下水污染監測標準」中第二類地下水監測標準，其餘各測值均符合「地下水污染監測標準」中第二類地下水標準。地下水重金屬鐵、錳測值雖有不符合標準情形，然鐵、錳離子均為含水層天然沉積物中所含之離子，地下水流經時會將這些離子濾出。由各監測井之測值顯示鐵、錳離子皆屬於地下水中之天然含量。

3.綜合評析

綜合上述監測結果，在水質項目方面以 GM3-1 監測井之氨氮及重金屬鐵、錳等項有超出第二類「地下水污染監測標準」之情形，惟該監測井於設井之初即有測值偏高之情形，主要為受環境背景影響，本季各測值均介於歷年範圍內，將持續監測其水質變化。

表2.8-1 核四施工環境監測地下水101年第2季水位標高調查結果統計表

單位：公尺

監測井編號		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
監測井名稱		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
地面標高		9.92	—	—	—	—	16.71	18.09	42.30	43.56	55.25	19.49	—
井頂標高		10.42	9.530	6.48	12.14	20.583	17.21	18.58	42.89	44.00	55.77	19.96	12.69
4月	月平均值	10.13	6.70	2.04	5.93	19.11	14.18	1.26	28.50	32.77	40.34	10.52	7.40
	逐時最高值	10.38	7.05	2.39	7.08	20.11	15.59	1.45	30.18	36.15	45.02	11.39	7.81
	逐時最低值	9.52	6.29	1.82	5.50	18.57	13.85	1.05	28.05	32.15	37.86	9.78	6.84
5月	月平均值	9.87	7.18	2.52	7.52	19.86	14.30	1.09	30.06	35.20	44.29	11.46	7.91
	逐時最高值	9.92	7.66	3.34	9.55	20.32	15.74	1.31	31.89	38.99	51.36	12.14	8.65
	逐時最低值	9.61	6.72	2.06	6.65	19.14	13.80	1.03	29.11	33.35	41.07	10.04	7.27
6月	月平均值	9.99	7.09	3.26	7.08	19.92	13.80	1.69	28.95	34.46	41.66	10.60	7.40
	逐時最高值	10.16	7.66	3.85	8.87	20.10	15.53	1.82	31.32	39.56	46.96	16.63	8.41
	逐時最低值	9.62	6.65	2.79	6.13	19.65	13.49	1.31	28.31	33.06	39.85	9.89	6.89
本季平均		10.00	6.99	2.61	6.84	19.63	14.10	1.35	29.17	34.15	42.10	10.86	7.57

註：1.自93/9起於地下水監測井內安裝水位自動監測儀器記錄水位標高，逐時水位詳附錄Ⅳ.6所示；各月平均水位為該監測井該月所有紀錄到之日平均水位平均值。

2.GM2為89年1月起新增之監測井；P8監測井90年4月20日坍孔、GM14監測井於91年1月10日填孔廢棄而暫停監測，於91年8月新井完成後（分別為P8-1及GM14-1監測井）始恢復監測；GM3監測井因設置於私人土地上，P5監測井位於工程施工範圍內，故亦一併於91年8月新井完成後（分別為GM3-1及P5-1監測井）移站監測；GM6監測井因廠區永久安全圍籬施工，於99年2月22日移除水位連續監測記錄箱，並於99年4月8日將地下水井主體挖除，新井（GM6-1）於99年11月完成；P8-1監測井100年4月因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井P8-1'，並於100年4月即移至新井進行監測。

表2.8-2 核四施工環境監測地下水水質101年第2季監測結果

監測井	檢驗項目	水溫	pH	導電度	濁度	氯鹽	硫酸鹽	懸浮固體	BOD
	偵測極限	-	-	-	<0.05	0.04	0.04	<1.0	<1.0
	單　位	℃	—	μmho/cm 25℃	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
GM2	101/04/15 11:55	23.4	6.734	235	8.0	25.6	11.9	8.2	<1.0
	101/05/06 11:25	25.1	6.721	222	2.5	25.7	11.8	2.6	<1.0
	101/06/03 11:30	24.6	6.526	221	7.6	25.3	11.7	8.4	<1.0
GM3-1	101/04/15 15:41	24.0	6.311	427	5.1	22.0	76.3	5.4	<1.0
	101/05/06 15:10	26.3	6.198	394	8.1	19.7	67.2	8.8	<1.0
	101/06/03 15:10	24.5	6.152	397	9.1	19.3	64.5	9.6	1.1
GM6-1	101/04/17 13:45	19.8	7.709	446	6.0	19.1	16.1	6.2	2.7
	101/05/10 14:30	19.7	7.615	423	1.3	18.2	15.9	2.2	<1.0
	101/06/09 14:30	23.5	7.504	461	3.1	14.0	15.0	6.2	<1.0
P5-1	101/04/02 15:45	25.7	6.489	382	0.25	33.8	21.8	<1.0	<1.0
	101/05/07 09:36	25.0	6.004	210	9.6	22.8	11.0	9.8	<1.0
	101/06/07 17:27	26.1	6.317	346	0.30	33.7	19.2	<1.0	<1.0
P8-1'	101/04/13 10:20	23.1	6.904	331	9.7	28.1	25.7	9.8	<1.0
	101/05/08 10:15	25.7	6.901	346	8.6	27.4	20.0	8.9	<1.0
	101/06/06 10:00	25.3	6.472	283	7.8	24.5	17.2	8.8	<1.0
GM9	101/04/14 12:20	23.0	5.483	115	7.9	22.0	8.1	8.1	<1.0
	101/05/05 11:50	22.1	5.593	113	8.0	20.2	8.3	8.3	<1.0
	101/06/02 11:15	23.9	5.667	112	9.2	18.5	8.3	9.7	<1.0
GM10	101/04/14 13:40	23.4	7.855	900	8.0	170	31.2	8.4	<1.0
	101/05/05 09:50	25.1	7.573	1250	0.40	262	45.9	<1.0	3.9
	101/06/02 12:40	25.0	7.564	1260	0.65	260	44.3	<1.0	1.1
GM11	101/04/02 11:15	22.0	6.273	224	5.0	21.6	10.3	5.2	<1.0
	101/05/07 14:00	23.7	6.166	189	1.0	20.6	7.8	1.1	<1.0
	101/06/07 12:50	23.6	6.187	206	2.7	21.0	9.0	2.8	<1.0
GM12	101/04/13 15:00	22.4	6.014	292	6.1	22.8	34.2	9.7	<1.0
	101/05/08 14:20	22.6	5.398	193	4.0	20.5	38.0	4.2	<1.0
	101/06/06 14:45	23.5	5.130	190	2.7	20.2	38.4	4.2	<1.0
GM13	101/04/17 12:30	22.1	5.941	164	8.2	20.6	9.8	9.0	1.2
	101/05/10 12:55	22.7	5.630	127	4.6	21.8	8.7	6.8	<1.0
	101/06/09 13:05	25.4	5.764	142	2.9	19.1	8.5	4.0	<1.0
GM7	101/04/16 12:20	22.1	7.705	748	4.8	22.8	53.5	5.6	<1.0
	101/05/08 12:20	26.3	7.550	745	0.70	21.9	52.7	<1.0	<1.0
	101/06/09 12:20	25.7	7.529	760	0.70	20.1	49.2	<1.0	<1.0
GM14-1	101/04/16 16:52	21.9	7.080	761	8.0	24.0	101	8.6	<1.0
	101/05/08 17:00	24.9	6.936	762	4.0	22.4	123	4.2	<1.0
	101/06/09 16:55	25.4	6.897	796	5.1	21.3	110	5.5	<1.0
地下水污染監測標準		—	—	—	—	625	625	—	—
地下水污染管制標準		—	—	—	—	—	—	—	—

註：GM2為89年1月起新增之監測井；P8監測井90年4月20日坍孔、GM14監測井於91年1月10日填孔廢棄而暫停監測，於91年8月新井完成後（分別為P8-1及GM14-1監測井）始恢復監測；GM3監測井因設置於私人土地上，P5監測井位於工程施工範圍內，故亦一併於91年8月新井完成後（分別為GM3-1及P5-1監測井）移站監測；GM6監測井因廠區永久安全圍籬施工，於99年2月22日移除水位連續監測記錄箱，並於99年4月8日將地下水井主體挖除，新井（GM6-1）於99年11月完成；P8-1監測井100年4月因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井P8-1'，並於100年4月即移至新井進行監測。

表2.8-2 核四施工環境監測地下水水質101年第2季監測結果（續1）

監測井	檢驗項目	總有機碳	COD	氨氮	硫化物	總硬度	鐵	錳	鎳
	偵測極限	0.1	1.9	0.01	0.01	1.6	0.017	0.002	0.004
	單　位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
GM2	101/04/15 11:55	0.6	7.0	0.01	ND	56.3	0.877	0.133	ND
	101/05/06 11:25	0.2	ND	0.02	ND	60.8	0.969	0.130	0.015
	101/06/03 11:30	0.3	ND	0.02	0.02	61.5	1.010	0.129	ND
GM3-1	101/04/15 15:41	0.8	2.8	0.67	ND	159	2.310	3.900	ND
	101/05/06 15:10	0.8	4.4	0.76	ND	155	1.410	3.170	0.006
	101/06/03 15:10	0.9	5.9	0.84	0.03	154	2.740	4.060	ND
GM6-1	101/04/17 13:45	1.4	4.1	ND	ND	204	0.024	0.004	ND
	101/05/10 14:30	1.3	ND	0.01	ND	192	0.030	ND	ND
	101/06/09 14:30	1.2	2.9	ND	ND	214	ND	ND	ND
P5-1	101/04/02 15:45	0.4	ND	0.01	ND	140	0.032	0.018	ND
	101/05/07 09:36	0.5	4.9	0.03	ND	68.8	0.031	0.009	ND
	101/06/07 17:27	0.2	ND	ND	ND	117	0.021	0.010	ND
P8-1'	101/04/13 10:20	0.6	2.7	ND	ND	118	0.040	0.018	0.007
	101/05/08 10:15	0.6	3.1	0.02	ND	128	0.037	0.039	0.006
	101/06/06 10:00	1.0	7.1	0.01	ND	102	ND	0.089	0.005
GM9	101/04/14 12:20	0.9	4.9	ND	ND	18.1	0.045	0.010	ND
	101/05/05 11:50	0.4	ND	ND	ND	16.6	0.195	0.003	ND
	101/06/02 11:15	0.7	3.4	0.03	0.07	20.2	0.055	0.002	ND
GM10	101/04/14 13:40	0.6	2.1	0.04	ND	243	0.034	0.032	0.020
	101/05/05 09:50	0.8	8.3	0.17	ND	302	0.017	0.011	0.006
	101/06/02 12:40	0.4	3.7	0.14	0.03	301	0.029	0.012	ND
GM11	101/04/02 11:15	0.9	ND	0.03	ND	75.2	0.026	0.242	ND
	101/05/07 14:00	0.4	ND	ND	ND	55.3	0.031	0.189	ND
	101/06/07 12:50	0.3	ND	ND	ND	66.9	0.026	0.195	ND
GM12	101/04/13 15:00	0.3	1.9	ND	ND	89.7	0.039	0.138	0.006
	101/05/08 14:20	0.4	3.3	ND	ND	48.0	0.038	0.073	0.005
	101/06/06 14:45	1.1	7.4	0.02	ND	33.5	0.108	0.061	0.006
GM13	101/04/17 12:30	0.5	10.9	ND	ND	48.8	0.041	0.011	ND
	101/05/10 12:55	0.7	ND	ND	ND	26.8	0.051	0.016	ND
	101/06/09 13:05	0.8	ND	0.03	ND	31.8	0.028	0.022	ND
GM7	101/04/16 12:20	0.3	3.2	0.17	ND	158	0.033	0.008	ND
	101/05/08 12:20	0.2	4.0	0.21	ND	146	0.023	0.006	ND
	101/06/09 12:20	0.1	ND	0.22	ND	154	0.029	0.007	ND
GM14-1	101/04/16 16:52	0.5	ND	0.21	ND	324	0.403	0.046	0.004
	101/05/08 17:00	0.6	3.5	0.18	ND	345	0.596	0.056	ND
	101/06/09 16:55	0.9	ND	0.24	ND	354	0.047	0.039	ND
地下水污染監測標準		10.0	—	0.25	—	750	1.5	0.250	0.25
地下水污染管制標準		—	—	—	—	—	—	—	0.50

註：1.ND表示未檢出或低於偵測極限，偵測極限自101年2月變更。

2.GM2為89年1月起新增之監測井；P8監測井90年4月20日坍孔、GM14監測井於91年1月10日填孔廢棄而暫停監測，於91年8月新井完成後（分別為P8-1及GM14-1監測井）始恢復監測；GM3監測井因設置於私人土地上，P5監測井位於工程施工範圍內，故亦一併於91年8月新井完成後（分別為GM3-1及P5-1監測井）移站監測；GM6監測井因廠區永久安全圍籬施工，於99年2月22日移除水位連續監測記錄箱，並於99年4月8日將地下水井主體挖除，新井（GM6-1）於99年11月完成；P8-1監測井100年4月因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井P8-1'，並於100年4月即移至新井進行監測。

表2.8-2 核四施工環境監測地下水水質101年第1季監測結果（續2）

監測井	檢驗項目	鎳	鎘	鉻	銅	鋅	砷	汞
	偵測極限	0.004	0.001	0.003	0.003/0.004	0.010	0.0004	0.0002
	單　位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
GM2	101/01/08 11:03	ND	ND	ND	ND	0.016	ND	ND
	101/02/12 10:55	ND	ND	ND	ND	0.013	ND	ND
	101/03/10 10:55	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GM3-1	101/01/08 14:50	ND	ND	ND	0.006	0.018	0.0011	ND
	101/02/12 14:35	ND	ND	ND	ND	0.011	0.0010	ND
	101/03/10 14:30	ND	ND	ND	ND	0.025	0.0014	ND
GM6-1	101/01/05 14:45	ND	ND	ND	ND	0.016	0.0018	ND
	101/02/10 11:15	ND	ND	ND	ND	0.014	0.0012	ND
	101/03/08 12:50	ND	ND	0.003	ND	0.056	ND	ND
P5-1	101/01/02 16:45	ND	ND	ND	0.003	0.013	ND	ND
	101/02/09 16:45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	101/03/03 16:52	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	ND
P8-1'	101/01/04 09:30	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND
	101/02/13 10:27	0.006	ND	0.003	ND	0.016	ND	ND
	101/03/07 10:00	0.005	ND	ND	ND	0.026	ND	ND
GM9	101/01/07 10:45	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	ND
	101/02/11 10:15	ND	ND	0.003	ND	0.025	ND	ND
	101/03/04 10:50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GM10	101/01/07 12:25	ND	ND	ND	0.038	0.014	0.0004	ND
	101/02/11 11:45	0.005	ND	0.004	ND	0.013	ND	ND
	101/03/04 11:25	ND	ND	ND	ND	0.014	ND	ND
GM11	101/01/02 12:00	ND	ND	ND	ND	0.02	ND	ND
	101/02/09 11:55	ND	ND	ND	ND	0.010	ND	ND
	101/03/03 12:10	ND	ND	ND	ND	0.015	ND	ND
GM12	101/01/04 13:21	0.006	ND	ND	ND	0.013	ND	ND
	101/02/13 14:15	0.006	ND	ND	ND	0.03	ND	ND
	101/03/07 13:30	ND	ND	ND	ND	0.021	ND	ND
GM13	101/01/05 13:20	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND
	101/02/10 15:25	0.005	ND	0.003	ND	0.052	ND	ND
	101/03/08 12:50	ND	ND	0.003	ND	0.056	ND	ND
GM7	101/01/09 12:00	ND	ND	ND	ND	0.013	ND	ND
	101/02/14 12:25	ND	ND	ND	ND	0.012	ND	ND
	101/03/08 16:40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GM14-1	101/01/09 16:43	ND	ND	ND	0.004	ND	ND	ND
	101/02/14 13:58	ND	ND	ND	ND	0.026	ND	ND
	101/03/08 12:26	ND	ND	ND	ND	0.017	ND	ND
地下水污染監測標準		—	0.025	0.25	5	25.000	0.2500	—
地下水污染管制標準		1.0	0.050	0.50	10	50.000	0.5000	0.020

註：1.ND表示未檢出或低於偵測極限，偵測極限自101年2月變更。

2.GM2為89年1月起新增之監測井；P8監測井90年4月20日坍孔、GM14監測井於91年1月10日填孔廢棄而暫停監測，於91年8月新井完成後（分別為P8-1及GM14-1監測井）始恢復監測；GM3監測井因設置於私人土地上，P5監測井位於工程施工範圍內，故亦一併於91年8月新井完成後（分別為GM3-1及P5-1監測井）移站監測；GM6監測井因廠區永久安全圍籬施工，於99年2月22日移除水位連續監測記錄箱，並於99年4月8日將地下水井主體挖除，新井（GM6-1）於99年11月完成；P8-1監測井100年4月因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井P8-1'，並於100年4月即移至新井進行監測。

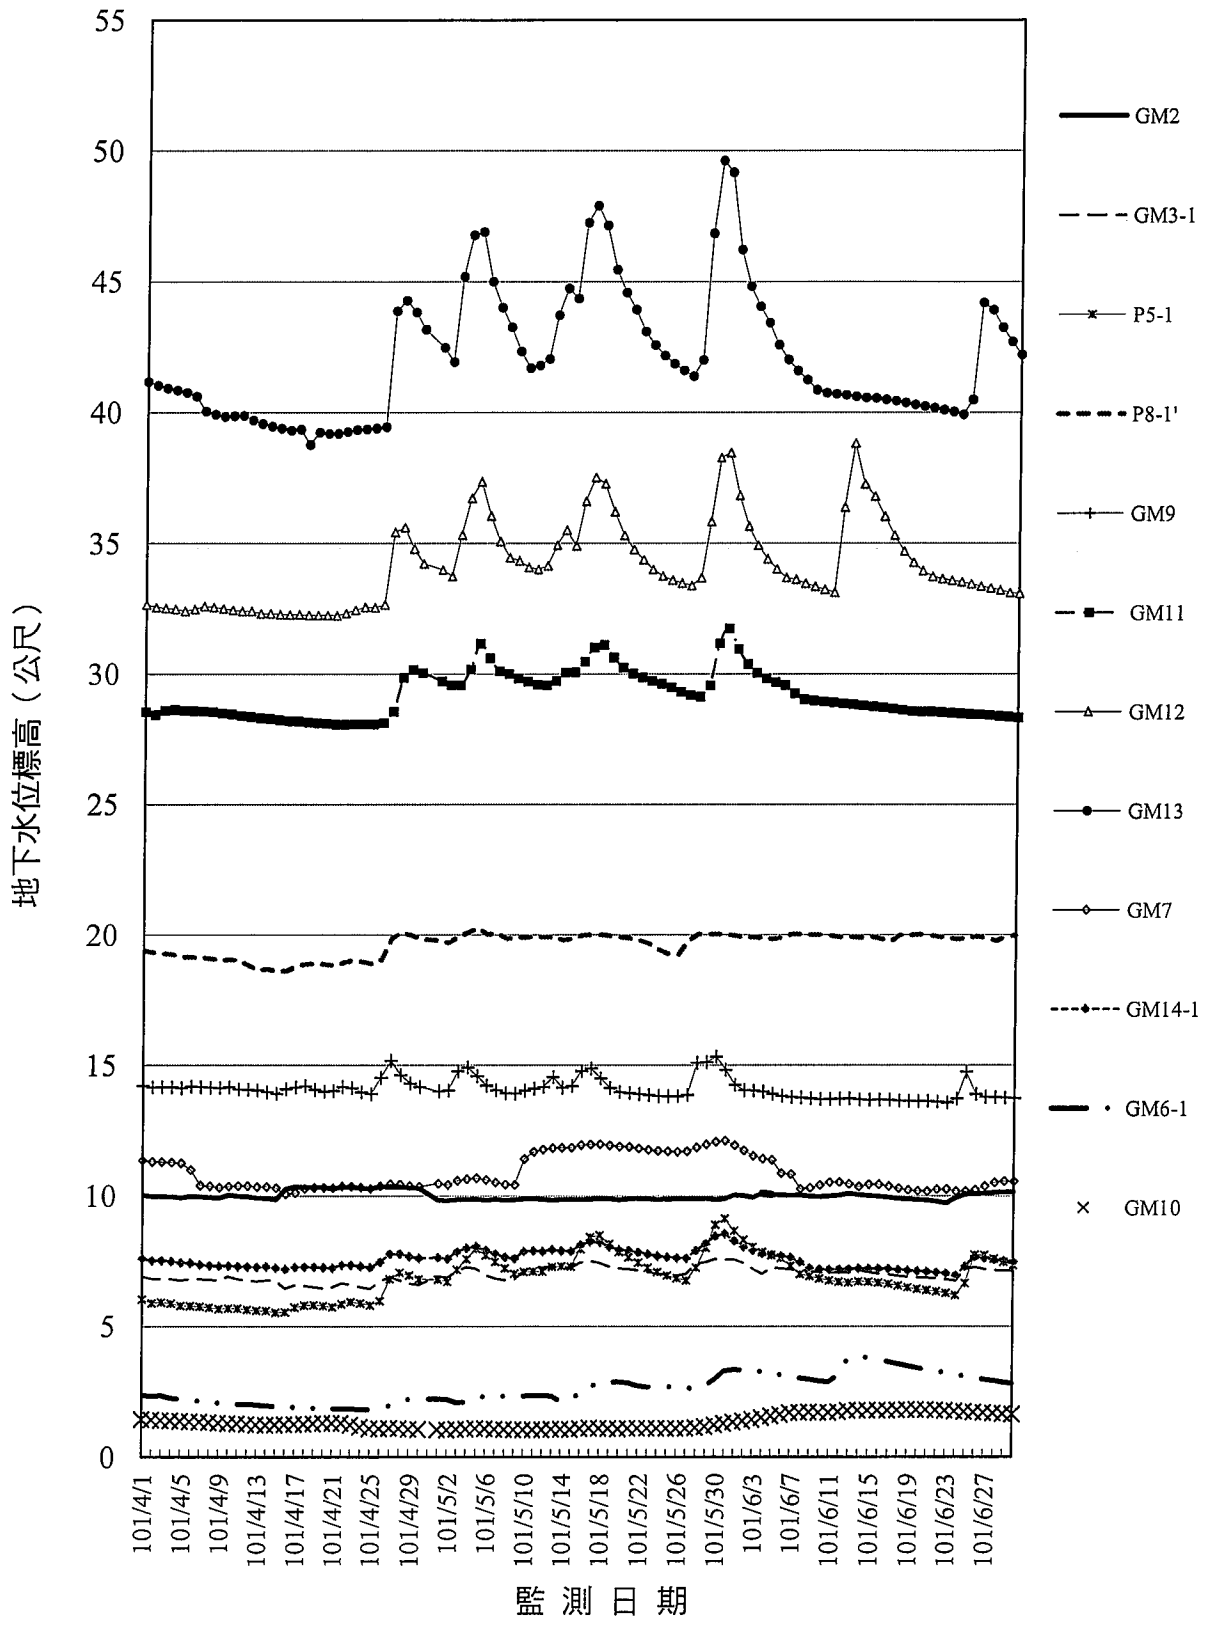


圖2.8-1 核四施工環境監測地下水101年第2季水位標高變化圖

河域生態監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.9 河域生態監測

本季於民國 101 年 4 月 17、18 日與 6 月 18、19 日於核四廠周邊的石碇溪及雙溪調查預定測站，進行各測站之河域生態調查研究工作。各項調查研究工作結果分述如下：

1.葉綠素 *a*

本季於 101 年 4 月 17 日與 6 月 18 日進行石碇溪及雙溪之上游(測站 1)、中游(測站 2)及下游(測站 3)共 6 個測站之水體葉綠素 *a* 含量測定，測定結果如表 2.9-1 所示。本季 4 月份的採樣調查中，石碇溪上游、中游及下游分別為 0.31μg/L、0.46μg/L 及 0.29μg/L，平均含量為 0.35μg/L。石碇溪葉綠素 *a* 含量以中游最高，上游次之，下游最低，此趨勢與上季相同。雙溪的上游、中游及下游則分別為 1.00μg/L、0.31μg/L 及 0.51μg/L，平均含量為 0.61μg/L。雙溪葉綠素 *a* 含量與石碇溪趨勢相同，以上游最高，下游次之，中游最低。本季 6 月份的採樣調查中，石碇溪上游、中游及下游分別為 0.07μg/L、0.07μg/L 及 0.55μg/L，平均含量為 0.23μg/L。石碇溪葉綠素 *a* 含量以下游最高，上游與中游次之。雙溪的上游、中游及下游則分別為 0.12μg/L、0.12μg/L 及 0.55μg/L，平均含量為 0.21μg/L。雙溪葉綠素 *a* 含量與石碇溪趨勢相同，下游最高，上游與中游次之，6 月份的採樣結果說明石碇溪與雙溪有相同的變化趨勢。

2.附著性藻類

本季於 101 年 4 月 17 日與 6 月 18 日進行石碇溪及雙溪的上游(測站 1)、中游(測站 2)及下游(測站 3)共 6 個測站的採樣。4 月份的調查結果如表 2.9-2 所示。於石碇溪所進行的調查，在石碇溪上游發現矽藻類 28 種，較明顯的優勢種類為線形曲殼藻、微小異極藻及隱頭舟形藻。在石碇溪中游發現矽藻類 27 種，較明顯的優勢種類為線形曲殼藻與隱頭舟形藻。在石碇溪下游共發現矽藻類 30 種，其中以短柄曲殼藻、擬銀幣直鏈藻、隱頭舟形藻與克勞氏菱形藻為最優勢種類。至於在雙溪所做的採樣調查，雙溪上游共發現矽藻類 24 種，較明顯的優勢種類為截端舟形藻及克勞式

菱形藻。雙溪中游發現矽藻類 22 種，較明顯的優勢種類為短柄曲殼藻與克勞氏菱形藻。雙溪下游共發現矽藻類 32 種，較明顯的優勢種類為短柄曲殼藻、橢圓雙壁藻、格氏舟形藻與克勞氏菱形藻。

6 月份的調查結果如表 2.9-2 所示。於石碇溪所進行的調查，在石碇溪上游發現矽藻類 43 種，較明顯的優勢種類為披針曲殼藻、線形曲殼藻、直條異極藻、微小異極藻及克勞氏菱形藻。在石碇溪中游發現矽藻類 24 種，較明顯的優勢種類為隱頭舟形藻及克勞氏菱形藻。在石碇溪下游共發現矽藻類 31 種，其中以隱頭舟形藻、直舟形藻與直舟形藻疏遷變種為最優勢種類。至於在雙溪所做的採樣調查，雙溪上游共發現矽藻類 23 種，較明顯的優勢種類為雙眉藻、扁圓卵形藻及隱頭舟形藻。雙溪中游發現矽藻類 29 種，較明顯的優勢種類為克勞式菱形藻。雙溪下游共發現矽藻類 28 種，較明顯的優勢種類為格氏舟形藻與克勞氏菱形藻。

3.浮游植物

本季的浮游植物於 4 月 17 日與 6 月 18 日進行採樣。本季 4 月份之採樣調查結果顯示，在石碇溪上游(測站 1)、中游(測站 2)及下游(測站 3)共 3 個測站的細胞數含量如表 2.9-3 所示，分別為 22,176cells/L、59,136 cells/L 及 46,200cells/L。雙溪的上游(測站 1)、中游(測站 2)及下游(測站 3)共 3 個測站的細胞數含量如表 2.9-3(續 1)所示，分別為 82,896cells/L、58,080cells/L 及 110,352cells/L。本季的浮游植物種類組成分析結果，石碇溪的所有測站中，下游測站發現矽藻類與綠藻類，其餘上游及中游測站則皆僅發現矽藻類。而雙溪的 3 個測站則皆發現矽藻類與綠藻類。在石碇溪上游，優勢種類為穀皮菱形藻及扁圓卵形藻，在數量上分別佔 21.83%及 11.11%；在石碇溪中游，以微小異極藻及扁圓卵形藻最為優勢，數量佔 17.86%及 16.96%；在石碇溪下游，最優勢的種類為線形曲殼藻與隱頭舟形藻，在數量上分別佔 24.00%及 22.86%。在雙溪上游，最為優勢的種類為隱頭舟形藻，在數量上佔 68.15%；在雙溪中游，優勢種類為空球藻及線形曲殼藻，在數量上分別佔 36.36%及 34.09%；在雙溪下游，優勢種類為線形曲殼藻與隱頭舟形藻，在數量上分別佔 26.32%及 20.10%。

本季 6 月份的採樣調查顯示，在石碇溪上游(測站 1)、中游(測站 2)及下游(測站 3)共 3 個測站的細胞數含量如表 2.9-3 所示，分別為 68,376 cells/L、72,072cells/L 及 101,376cells/L。雙溪的上游(測站 1)、中游(測站 2)及下游(測站 3)共 3 個測站的細胞數含量如表 2.9-3 所示，分別為 77,088cells/L、20,988cells/L 及 138,072cells/L。本季的浮游植物種類組成分析結果，石碇溪的所有測站中，中游及下游測站發現矽藻類與綠藻類，上游測站則皆僅發現矽藻類。而雙溪的上游及中游測站發現矽藻類與綠藻類，下游測站則皆僅發現矽藻類。在石碇溪上游，優勢種類為穀皮菱形藻及微小異極藻，在數量上分別佔 23.17%及 13.13%；在石碇溪中游，以空星藻及微小異極藻最為優勢，數量佔 23.44%及 15.02%；在石碇溪下游，最優勢的種類為隱頭舟形藻與穀皮菱形藻，在數量上分別佔 16.67%及 13.28%。在雙溪上游，優勢的種類為隱頭舟形藻與穀皮菱形藻，在數量上分別佔 19.18%及 11.30%；在雙溪中游，優勢種類為空球藻及線形曲殼藻，在數量上分別佔 20.13%及 16.35%；在雙溪下游，優勢種類為微小異極藻與梅尼小環藻，在數量上分別佔 15.87%及 11.47%。

4.動物性浮游生物

本季於 4 月 17 日與 6 月 18 日進行動物性浮游生物採樣調查。調查結果如表 2.9-4 所示。在 4 月份的調查採樣，石碇溪上游測站(測站 1)、中游測站(測站 2)及下游測站(測站 3)所測得的總個體含量分別為 10,850 ind./m^3、800ind./m^3 及 900ind./m^3，其中以上游的含量較高，下游次之，中游最低。上游測站動物性浮游生物組成以輪蟲及枝角類最多，佔 74.65%及 12.44%。中游測站動物性浮游生物組成以猛水蚤及端腳類最多，分別佔 37.50%及 25.00%。下游測站動物性浮游生物組成以猛水蚤及無節幼體最多，皆佔 38.89%。在雙溪的測站方面，採樣結果顯示，雙溪上游測站(測站 1)、中游測站(測站 2)及下游測站(測站 3)所測得的總個體含量分別為 12,600ind./m^3、7,250ind./m^3 及 3,400ind./m^3，以上游的含量最高，中游次之，下游最低。上游測站動物性浮游生物組成以輪蟲及猛水蚤最多，分別佔 40.08%及 25.00%。中游測站動物性浮游生物組成以猛水蚤及輪蟲最

多，分別佔 56.55%及 17.93%。下游測站動物性浮游生物組成以無節幼體及其他類最多，分別佔 36.8%及 22.1%。

在 6 月份的調查採樣，石碇溪上游測站(測站 1)、中游測站(測站 2)及下游測站(測站 3)所測得的總個體含量分別為 122ind./m^3、65ind./m^3及 19ind./m^3，其中以上游的含量較高，中游次之，下游最低。上游測站動物性浮游生物組成以軟體動物最多，佔 85.25%。中游測站動物性浮游生物組成以軟體動物最多，佔 58.46%。下游測站動物性浮游生物組成以軟體動物最多，佔 63.16%。在雙溪的測站方面，採樣結果顯示，雙溪上游測站(測站 1)、中游測站(測站 2)及下游測站(測站 3)所測得的總個體含量分別為 59ind./m^3、19ind./m^3及 51ind./m^3，以上游的含量最高，下游次之，中游最低。上游測站動物性浮游生物組成以軟體動物最多，佔 88.14%。中游測站動物性浮游生物組成以軟體動物最多，佔 52.63%。下游測站動物性浮游生物組成以軟體動物最多，佔 94.12%。

5.水生昆蟲

本季於 4 月 17 日與 6 月 18 日進行水生昆蟲調查。4 月份的調查結果如表 2.9-5 所示。石碇溪及雙溪僅於上游及中游測站(測站 1 及測站 2)有採獲水生昆蟲。總計各測站採獲的種類有蜉蝣目、蜻蛉目、毛翅目、襀翅目及雙翅目。其中石碇溪採獲蜉蝣目、蜻蛉目、毛翅目、雙翅目等 4 個目的水生昆蟲。與上季相同，石碇溪在上游測站採獲蜉蝣目、蜻蛉目及毛翅目 3 目的水生昆蟲；在中游測站則採獲雙翅目。而雙溪上游則採獲蜉蝣目、蜻蛉目、毛翅目等共 3 個目的水生昆蟲，與上季相同；雙溪中游則採獲襀翅目及雙翅目的水生昆蟲，此亦與上季相同。石碇溪在上游測站出現 6 種水生昆蟲，出現個體數合計為 32 隻。單一種類出現較多者為吉田扁蜉蝣及雙棘四節蜉蝣，分別採獲 15、9 隻個體。石碇溪在中游測站出現的種類數僅 1 種，為採獲 3 隻的 *Chironomus* sp.。雙溪在上游測站出現的種類數 6 種，出現個體數合計為 49 隻。單一種類出現較多者為吉田扁蜉蝣及雙棘四節蜉蝣，分別採獲 23 及 12 隻，顯示這個測站的優勢水生昆蟲與石碇溪上游測站相同。雙溪在中游測站只有出現

Chironomus sp.與 *Oyamia* sp.兩種，分別採獲 6 與 1 隻，與歷年的採樣調查結果相似，中游測站的水生昆蟲種類與數量皆明顯較上游測站為低。

6 月份的調查結果如表 2.9-5 所示。石碇溪僅於上游及中游測站(測站 1 及測站 2)有採獲水生昆蟲，雙溪則僅於上游及中游測站(測站 1 測站 2)有採獲水生昆蟲。總計各測站採獲的種類有蜉蝣目、蜻蛉目、毛翅目、襀翅目及雙翅目。其中石碇溪採獲蜉蝣目、蜻蛉目、毛翅目、雙翅目等 4 個目的水生昆蟲。與上季及本季 4 月份的採樣結果相同，石碇溪在上游測站採獲蜉蝣目、蜻蛉目及毛翅目 3 目的水生昆蟲；在中游測站則採獲雙翅目。而雙溪上游則採獲蜉蝣目、蜻蛉目、毛翅目等共 3 個目的水生昆蟲，雙溪中游則採獲襀翅目及雙翅目的水生昆蟲，此與上季及本季 4 月份的採樣結果相同。石碇溪在上游測站出現 7 種水生昆蟲，出現個體數合計為 30 隻。單一種類出現較多者為雙棘四節蜉蝣及吉田扁蜉蝣，分別採獲 11、7 隻個體。石碇溪在中游測站出現的種類數僅 1 種，為採獲 5 隻的 *Chironomus* sp.。雙溪在上游測站出現的種類數 6 種，出現個體數合計為 67 隻。單一種類出現較多者為吉田扁蜉蝣及吉本扁蜉蝣，分別採獲 19 及 17 隻，與本季 4 月份的採樣調查結果略有不同。雙溪在中游測站只有出現 *Oyamia* sp.與 *Simulium* sp.兩種，分別採獲 16 與 2 隻，與歷年的採樣調查結果相似，中游測站的水生昆蟲種類與數量皆明顯較上游測站為低。同時石碇溪及雙溪中游測站所發現的水生昆蟲如搖蚊科與蚋科皆屬於生存於水流較緩的中下游水域，這也明確反映了中游測站的水域環境，而上游測站所記錄到的蜉蝣目與毛翅目水生昆蟲也同樣反映了上游環境中水流較快的上游水域，因此可知水生昆蟲相確實反映了各測站中的水域環境現況。

6.魚類

本季於 4 月 17、18 日與 6 月 18、19 日進行魚類的採樣調查。在 4 月份的調查採樣，石碇溪及雙溪的測站在本次的調查中，總共採獲 8 科 16 種魚類，結果如表 2.9-6 所示。石碇溪上游(測站 1)，總共採獲 4 科 7 種 51 尾，以鯉科的粗首馬口鱲(粗首鱲)及外來種的尼羅口孵魚出現數量

較多，分別採獲 20 及 9 尾；石碇溪上游屬於不受潮汐影響的純淡水溪流水域，而鯉科魚類為該類水域中相當重要的組成魚種，而除了本次調查所採獲的優勢魚種粗首馬口鱲(粗首鱲)外，台灣縱紋鱲及台灣石魚賓也都是這類具有代表性的魚種，而外來魚種中，在台灣極為常見的尼羅口孵魚(吳郭魚)及食蚊魚(大肚魚)也在本測站出現，且有成為優勢魚種的趨勢；在其他原生魚類方面，本樣站也採獲北部溪流常見的明潭吻鰕虎 5 尾與日本禿頭鯊 2 尾。石碇溪中游(測站 2)，總共採獲 5 科 6 種 88 尾，其中以鰕虎科的大鱗鮻出現數量最多，共採獲 55 尾，其次為尼羅口孵魚，共採獲 16 尾；本測站屬於受潮汐影響的感潮帶溪流水域，因此如大鱗鮻這種周緣性淡水魚種或是尼羅口孵魚、食蚊魚等次級性淡水魚種為該測站常見且重要的組成魚種，另外本次的調查也發現記錄到黃鰭鯛及花身雞魚等周緣性淡水魚，顯示石碇溪中游測站魚類相仍是以兩側洄游型及周緣性淡水魚類為主，與上游測站截然不同。石碇溪下游(測站 3)，總共採獲 5 科 5 種 53 尾，其中以大鱗鮻及花身雞魚在數量上較為優勢，皆分別採獲 15 尾，而本樣站所採獲的大鱗鮻、花身雞魚及黃鰭鯛等優勢魚種皆屬於兩側迴游型或周緣性淡水魚種，顯示在河口測站棲地中同樣以兩側迴游型或周緣性淡水魚種為該測站常見且重要的組成魚種，此與中游測站的魚類組成頗為接近。在雙溪的 3 個樣站，共計採獲 8 科 12 種 140 尾。在雙溪上游(測站 1)，總共採獲 4 科 7 種 83 尾，其中以鯉科的台灣石魚賓及粗首馬口鱲(粗首鱲)出現數量最多，分別各採獲 23 及 21 尾；這個樣站同樣屬於不受潮汐影響的溪流樣站，該樣站之中，鯉科魚類如粗首馬口鱲及台灣石魚賓等初級淡水魚類為該類水域中相當重要的組成魚種，這一點與石碇溪上游測站頗為相似，顯示兩測站的棲地環境特性較為接近，同時在雙溪流域的 3 個測站中，上游測站也都是魚類調查數量最多的一個測站，可見其水域生態豐富。在雙溪中游(測站 2)，總共採獲 4 科 5 種 44 尾，其中以屬於周緣性淡水魚種的大鱗鮻為最優勢魚種，採獲 25 尾，其次為黃鰭鯛 12 尾，顯示該樣站在原生魚種中，兩側迴游或周緣性淡水魚種為該測站最常見且重要的組成魚種。在雙溪下游(測站 3)，總共採獲 3 科 3 種 13 尾，分別是大鱗鮻、花身雞魚及黃鰭鯛，分別採獲 6 尾、5

尾及 2 尾，顯示在雙溪下游測站(測站 3)，兩側迴游或周緣性淡水魚種為該測站常見且重要的組成魚種，顯示本測站的魚種生態類型與石碇溪河口測站的河域環境較為相似。

在 6 月份的調查採樣，石碇溪及雙溪的測站在本次的調查中，總共採獲 8 科 15 種魚類，結果如表 2.9-6 所示。在石碇溪上游(測站 1)，總共採獲 4 科 7 種 51 尾，以鯉科的粗首馬口鱲(粗首鱲)及外來種的尼羅口孵魚出現數量較多，分別採獲 16 及 11 尾；石碇溪上游屬於不受潮汐影響的純淡水溪流水域，而鯉科魚類為該類水域中相當重要的組成魚種，而除了本次調查所採獲的優勢魚種粗首馬口鱲(粗首鱲)外，台灣縱紋鱲及台灣石魚賓也都是這類具有代表性的魚種，而外來魚種中，在台灣低海拔水域中極為常見的尼羅口孵魚(吳郭魚)及食蚊魚(大肚魚)也在本測站出現。在其他原生魚類方面，本樣站也採獲北部溪流常見的明潭吻鰕虎 3 尾。在石碇溪中游(測站 2)，總共採獲 5 科 6 種 87 尾，其中以鯰科的大鱗鮻出現數量最多，共採獲 56 尾，其次為尼羅口孵魚，共採獲 12 尾；本測站屬於受潮汐影響的感潮帶溪流水域，因此如大鱗鮻這種周緣性淡水魚種或是尼羅口孵魚、食蚊魚等次級性淡水魚種為該測站常見且重要的組成魚種，另外本次的調查也發現記錄到花身雞魚這種周緣性淡水魚，顯示石碇溪中游測站魚類相仍是以兩側洄游型及周緣性淡水魚類為主，與上游測站截然不同。在石碇溪下游(測站 3)，總共採獲 4 科 4 種 67 尾，其中以大鱗鮻及黃鰭鯛在數量上較為優勢，分別採獲 44 及 11 尾，而本樣站所採獲的大鱗鮻、花身雞魚及黃鰭鯛等優勢魚種皆屬於兩側迴游型或周緣性淡水魚種，顯示在河口測站棲地中同樣以兩側迴游型或周緣性淡水魚種為該測站常見且重要的組成魚種，此與中游測站的魚類組成頗為接近，這個調查結果也與本季 4 月份相似。在雙溪的 3 個樣站，共計採獲 8 科 12 種 135 尾。在雙溪上游(測站 1)，總共採獲 4 科 7 種 63 尾，其中以鯉科的粗首馬口鱲(粗首鱲) 及 台灣石魚賓出現數量最多，分別各採獲 16 及 15 尾；這個樣站同樣屬於不受潮汐影響的溪流樣站，該樣站之中，鯉科魚類如粗首馬口鱲及台灣石魚賓等初級淡水魚類為該類水域中相當重要的組成魚種，這一點與石碇溪上游測站頗為相似，顯示兩測站

的棲地環境特性較為接近，同時在雙溪流域的 3 個測站中，上游測站也都是魚類調查數量最多的一個測站，可見其水域生態豐富。在雙溪中游(測站 2)，總共採獲 5 科 5 種 54 尾，其中以屬於周緣性淡水魚種的大鱗鮻為最優勢魚種，採獲 26 尾，其次為屬於兩側迴游型魚類的日本禿頭鯊幼魚 16 尾，顯示日本禿頭鯊幼魚正往上游水域溯游，這個測站的魚種調查顯示該樣站在原生魚種中，兩側迴游或周緣性淡水魚種為該測站最常見且重要的組成魚種。在雙溪下游(測站 3)，總共採獲 3 科 3 種 13 尾，分別是大鱗鮻、黃鰭鯛及花身雞魚，分別採獲 11 尾、5 尾及 2 尾，顯示在雙溪下游測站(測站 3)，兩側迴游或周緣性淡水魚種為該測站常見且重要的組成魚種，顯示本測站的魚種生態類型與石碇溪河口測站的河域環境較為相似。

7.甲殼類及軟體動物

本季於 4 月 17、18 日與 6 月 18、19 日進行甲殼類的採樣。採樣結果如表 2.9-7 所示。本季 4 月份的採樣調查結果顯示在石碇溪上游(測站 1)，總共採獲 3 科 3 種，分別為多齒新米蝦、字紋弓蟹及日本絨螯蟹，分別採獲 7 隻、2 隻及 1 隻。在石碇溪中游(測站 2)，共採獲字紋弓蟹 5 隻、台灣沼蝦 7 隻、南海沼蝦 5 隻及日本沼蝦 2 隻。在石碇溪下游(測站 3)，總共採獲 3 科 5 種 33 隻，其中以北方呼喚招潮蟹雙齒及近相手蟹在數量上最為優勢，分別採獲 19 及 10 隻。至於在雙溪的採樣調查方面，在雙溪上游(測站 1)，只採獲台灣沼蝦 2 隻個體。在雙溪中游(測站 2)，總共只採獲日本沼蝦 7 隻及等齒沼蝦 5 隻。在雙溪下游(測站 3)，只採獲雙齒近相手蟹 11 隻及台灣沼蝦 5 隻。

本季 6 月份的甲殼類採樣調查結果顯示在石碇溪上游(測站 1)，總共採獲 3 科 3 種，分別為多齒新米蝦、字紋弓蟹及日本絨螯蟹，分別採獲 5 隻、2 隻及 1 隻。在石碇溪中游(測站 2)，共採獲台灣沼蝦 8 隻、字紋弓蟹 3 隻及日本沼蝦 1 隻。在石碇溪下游(測站 3)，總共採獲 3 科 4 種 26 隻，其中以北方呼喚招潮蟹及雙齒近相手蟹在數量上最為優勢，分別採獲 12 及 9 隻。至於在雙溪的採樣調查方面，在雙溪上游(測站 1)，只採

獲台灣沼蝦 5 隻個體。在雙溪中游(測站 2)，總共只採獲日本沼蝦 3 隻、台灣沼蝦 1 隻及雙齒近相手蟹 1 隻。在雙溪下游(測站 3)，只採獲雙齒近相手蟹 9 隻及南海沼蝦 5 隻。

在軟體動物方面，本季 4 月 17、18 日與 6 月 18、19 日進行採樣。調查結果如表 2.9-7 所示。在本季 4 月份的採樣調查，於石碇溪上游(測站 1)，採獲福壽螺 2 隻個體。在石碇溪中游(測站 2)，總共採獲 4 科 5 種 21 隻，其中以小皇冠蜑螺、長形壁蜑螺、福壽螺，在數量上最為優勢，分別採獲 9 隻、5 隻、5 隻，小皇冠蜑螺為本測站數量最多的軟體動物，數量雖較上季為少，但已有明顯恢復之跡象。在石碇溪下游(測站 3)，則分別採獲網蜷 9 隻、長牡蠣 6 隻。至於在雙溪的調查樣站，在雙溪上游(測站 1)，採獲台灣蜆 5 隻及福壽螺 3 隻。在雙溪中游(測站 2)則僅採獲福壽螺 2 隻。在雙溪下游(測站 3)，共採獲網蜷 16 隻、長牡蠣 5 隻及山椒蝸牛 5 隻，各個測站的軟體動物與以往採獲的種類頗為相似，顯示各測站的軟體動物相變化皆不大。

在本季 6 月份的採樣調查，於石碇溪上游(測站 1)，採獲福壽螺 1 隻個體。在石碇溪中游(測站 2)，總共採獲 4 科 5 種 32 隻，其中以網蜷及小皇冠蜑螺在數量上最為優勢，分別採獲 15 及 10 隻，小皇冠蜑螺數量較本季 4 月份時的調查為多，顯示數量已有逐漸恢復的跡象。在石碇溪下游(測站 3)，則分別採獲網蜷 16 隻、長牡蠣 3 隻。至於在雙溪的調查樣站，在雙溪上游(測站 1)，採獲福壽螺 4 隻及台灣蜆 2 隻。在雙溪中游(測站 2)則僅採獲福壽螺 3 隻。在雙溪下游(測站 3)，共採獲網蜷 11 隻、長牡蠣 5 隻及山椒蝸牛 2 隻。各個測站的軟體動物調查顯示，僅有石碇溪中游測站的軟體動物多樣性較高，其餘測站多樣性皆普遍較低。

表2.9-1 核四廠附近河域101年第2季葉綠素*a* 調查報告

單位:μg/L

河川	石碇溪			雙溪		
季別 測站	測站1	測站2	測站3	測站1	測站2	測站3
100年2月	0.2	0.48	0.16	0.33	0.44	0.28
平均		0.28			0.35	
100年4月	0.07	1.36	0.24	0.83	0.19	0.20
平均		0.56			0.41	
100年6月	0.11	0.33	0.17	0.51	0.18	0.72
平均		0.23			0.47	
100年8月	0.2	0.54	0.51	0.7	2.36	2.29
平均		0.42			1.79	
100年10月	0.39	0.39	0.70	0.64	0.16	0.68
平均		0.49			0.49	
100年12月	0.53	0.19	0.45	0.31	0.41	0.24
平均		0.39			0.32	
101年2月	0.25	0.63	0.16	0.23	0.37	0.20
平均		0.35			0.27	
101年4月	0.31	0.46	0.29	1.00	0.31	0.51
平均		0.35			0.61	
101年6月	0.07	0.07	0.55	0.12	0.12	0.55
平均		0.23			0.21	

表2.9-2 核四電廠附近雙溪及石碇溪附著藻類調查結果

採樣日期：101年4月17日

		石碇溪			雙溪		
Taxa	Stations	測站 1	測站 2	測站 3	測站 1	測站 2	測站 3
Diatoms							
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	+	+	+++	++	+++	+++
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	+			+		
Achnanthes exigua	短小曲殼藻	++	+	+			
Achnanthes hustedtii	平滑曲殼藻			+			
Achnanthes lanceolata	披針曲殼藻	+					
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	+++	++	+	+	++	+
Amphiprora alata	異繭形藻						+
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻		+	+			+
Amphora normani	雙眉藻						+
Amphora sp.	雙眉藻		+	+	+		++
Aulacoseira granulata	顆粒直鏈藻					++	++
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	+	+		+		
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	+		+	+		+
Cocconeis scutellum	盾卵形藻		+				
Cyclotella meneghiniana	梅尼小環藻						+
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻		+		+		+
Cymbella lacustris	橋彎藻		+	+			
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	++		+	+	+	+
Cymbella minuta	橋彎藻	+					
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	+	+				
Diploneis elliptica	橢圓雙壁藻			+	++	+	+++
Diploneis ovalis	闊橢圓雙壁藻						+
Fragilaria intermedia	中型脆桿藻						+
Frustularia vulgaris	普通肋縫藻	+					
Gomphonema clevei	克氏異極藻	+	+		+		
Gomphonema gracile	纖細異極藻	+	+			+	
Gomphonema heliveticum	直條異極藻	+		+	+	+	+
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	++	+	+	+	+	
Gomphonema parvulum	微小異極藻	+++	+	+	+	+	+
Gyrosigma sp.	布紋藻						+
Hydrosera triquetra	水鏈藻				+	+	
Melosira nummuloides	擬銀幣直鏈藻		+	+++			+
Melosira varians	變異直鏈藻	+			+	+	+
Navicula anglica	英吉利舟形藻			+			
Navicula cancellata	方格舟形藻			+		+	+
Navicula cryptocephala	隱頭舟形藻	+++	++	+++	+	+	++

表2.9-2 核四電廠附近雙溪及石碇溪附著藻類調查結果（續1）

採樣日期：101年4月17日

		石碇溪			雙溪		
Taxa	Stations	測站 1	測站 2	測站 3	測站 1	測站 2	測站 3
Navicula directa	直舟形藻		+				
Navicula grimmii	格氏舟形藻		+	+	++	+	+++
Navicula lanceolata	披針舟形藻	+		+			
Navicula mutica	截端舟形藻			+	+++		
Navicula placentula	扁圓舟形藻	+					
Navicula pupula	瞳孔舟形藻			+			+
Navicula radiosa	放射舟形藻	++		+	+	+	+
Navicula radiosa var. *parva*	放射舟形藻變種	+		+	+		+
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	+	++	+		+	++
Navicula spicula	針舟形藻						++
Nitzschia brevissima	縮短菱形藻	+	+	+	++	++	
Nitzschia clausii	克勞氏菱形藻	+	+	+++	+++	+++	+++
Nitzschia filiformis	絲狀菱形藻						+
Nitzschia frustulum	碎片菱形藻	+					
Nitzschia hungarica	菱形藻		+				
Nitzschia obtusa var. *scalpelliformis*	盾頭菱形藻刀形變種		+	+			
Nitzschia palea	穀皮菱形藻	++	+	+	+	+	+
Nitzschia tryblionella	盤形菱形藻			+			+
Pinnularia microstauron	細條羽紋藻	+	+				
Stephanodiscus sp.	冠盤藻			+		+	
Surirella robusta	粗壯雙菱藻		+			+	
Synedra ulna	肘狀針桿藻		+		+	+	+

註： +++ 表示豐富者； ++ 表示常見；+ 表示稀少。

表2.9-2 核四電廠附近雙溪及石碇溪附著藻類調查結果（續2）

採樣日期：101年6月18日

		石碇溪			雙溪		
Taxa	Stations	測站 1	測站 2	測站 3	測站 1	測站 2	測站 3
Diatoms							
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	+		+		++	+
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	+					
Achnanthes exigua	短小曲殼藻	+	+	+			
Achnanthes hustedtii	平滑曲殼藻	+					
Achnanthes lanceolata	披針曲殼藻	+++	+	+	++	+	
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	+++	++	++	+	++	++
Amphora angusta	狹窄雙眉藻				+		
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻			+			
Amphora ovalis	卵形雙眉藻			+	+		
Amphora sp.	雙眉藻	+		++	+++	+	+
Aulacoseira granulata	顆粒直鏈藻	++			+	+	
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	+	+		+		+
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	+	+	+	+++	+	
Cyclotella meneghiniana	梅尼小環藻	+	+	+			+
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻	+					
Cymbella lacustris	橋彎藻	+	+				
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	+			+	+	+
Cymbella minuta	橋彎藻	+					
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	+				+	
Diploneis elliptica	橢圓雙壁藻	+					+
Fragilaria intermedia	中型脆桿藻	+	+			+	+
Frustularia vulgaris	普通肋縫藻				+		
Gomphonema clevei	克氏異極藻	+	+	+	+	+	+
Gomphonema heliveticum	直條異極藻	+++	+		+	++	++
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	++	+	+		+	+
Gomphonema parvulum	微小異極藻	+++	++	+	+	++	+
Gomphonema sphaerophorum	球異極藻	+					
Gyrosigma sp.	布紋藻		+				
Hantzschia amphioxys	雙尖菱板藻			+			
Melosira nummuloides	擬銀幣直鏈藻			++			
Melosira varians	變異直鏈藻	+		+		+	+
Navicula cancellata	方格舟形藻						+
Navicula cryptocephala	隱頭舟形藻	+	+++	+++	+++	+	++
Navicula directa	直舟形藻			+++			
Navicula directa var. *remota*	直舟形藻疏遷變種			+++			
Navicula grimmii	格氏舟形藻	+	++		+	+	+++
Navicula lanceolata	披針舟形藻	+	+	+		+	+
Navicula mutica	截端舟形藻	+				+	+
Navicula placentula	扁圓舟形藻	+	+	+		+	
Navicula radiosa	放射舟形藻	++	++	++	++		
Navicula radiosa var. *parva*	放射舟形藻變種	+	++	+	+	+	+
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	++	+	+	++	+	+
Nitzschia brevissima	縮短菱形藻	++		+		+	++
Nitzschia clausii	克勞氏菱形藻	+++	+++	+	+	+++	+++
Nitzschia filiformis	絲狀菱形藻	+					
Nitzschia fonticola	泉生菱形藻			+	+	++	+
Nitzschia frustulum	碎片菱形藻			+	+	+	
Nitzschia hungarica	菱形藻	+					
Nitzschia obtusa var. *scalpelliformis*	盾頭菱形藻刀形變種	+					
Nitzschia palea	穀皮菱形藻	+	++	++	++	+	++
Nitzschia sublinearis	近線形菱形藻	+				+	+
Nitzschia tryblionella	盤形菱形藻	+					
Pinnularia microstauron	細條羽紋藻	+			+	+	
Rhoicosphenia curvata	彎楔藻		+	+			+
Stephanodiscus sp.	冠盤藻						
Surirella robusta	粗壯雙菱藻	+					+
Synedra pulchella var. *lanceolata*	針桿藻			+			
Synedra ulna	肘狀針桿藻	+	+	+		+	+

註： +++表示豐富者；++表示常見；+表示稀少。

表 2.9-3 核四廠附近河域101年第2季浮游植物細胞數含量

採樣日期：101年4月17日

Taxa / Stations		石碇溪測站1	石碇溪測站2	石碇溪測站3	平均	百分比
Bacillariophytes	矽藻					
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	176	0	0	59	0.14%
Achnanthes exigua	短小曲殼藻	352	1056	264	557	1.31%
Achnanthes hustedtii	平滑曲殼藻	88	528	1848	821	1.93%
Achnanthes lancelata	披針曲殼藻	88	528	528	381	0.90%
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	1408	10560	11088	7685	18.08%
Amphora angusta	狹窄雙眉藻	0	0	264	88	0.21%
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻	0	0	1056	352	0.83%
Amphora crassa	粗雙眉藻	0	0	264	88	0.21%
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	2464	10032	264	4253	10.01%
Cocconeis scutellum	盾卵形藻	528	0	0	176	0.41%
Cyclotella meneghiniana	梅尼小環藻	88	528	792	469	1.10%
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻	88	528	528	381	0.90%
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	440	528	264	411	0.97%
Cymbella minuta	橋彎藻	0	528	0	176	0.41%
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	88	0	0	29	0.07%
Cymbella sp.	橋彎藻	0	528	528	352	0.83%
Diploneis ovalis	闊橢圓雙壁藻	88	0	0	29	0.07%
Fragilaria intermedia	中型脆桿藻	88	528	1056	557	1.31%
Frustularia vulgaris	普通肋縫藻	88	0	528	205	0.48%
Gomphonema clevei	克氏異極藻	0	0	264	88	0.21%
Gomphonema gracile	纖細異極藻	176	0	528	235	0.55%
Gomphonema heliveticum	直條異極藻	88	0	0	29	0.07%
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	792	4752	1320	2288	5.38%
Gomphonema parvulum	微小異極藻	2288	10560	2904	5251	12.35%
Hantzschia amphioxys	雙尖菱板藻	0	528	0	176	0.41%
Melosira nummuloides	擬銀幣直鏈藻	352	0	0	117	0.28%
Melosira varians	變異直鏈藻	704	1584	0	763	1.79%
Navicula cryptocephala	隱頭舟形藻	2288	4224	10560	5691	13.39%
Navicula mutica	截端舟形藻	88	528	0	205	0.48%
Navicula northumbica	諾森舟形藻	0	0	264	88	0.21%
Navicula placentula	扁圓舟形藻	176	0	0	59	0.14%
Navicula pupula	瞳孔舟形藻	88	0	528	205	0.48%
Navicula radiosa	放射舟形藻	616	3168	528	1437	3.38%
Navicula radiosa var. *parva*	放射舟形藻變種	176	0	1320	499	1.17%
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	1144	0	792	645	1.52%
Nitzschia brevissima	縮短菱形藻	88	0	0	29	0.07%
Nitzschia clausii	克勞氏菱形藻	88	0	0	29	0.07%
Nitzschia fonticola	泉生菱形藻	88	0	264	117	0.28%
Nitzschia frustulum	碎片菱形藻	440	0	264	235	0.55%
Nitzschia longissima	長菱形藻	0	0	264	88	0.21%
Nitzschia obtusa var. *scalpelliformis*	盾頭菱形藻刀形變種	88	0	264	117	0.28%
Nitzschia palea	穀皮菱形藻	4840	6864	4224	5309	12.49%
Pinnularia microstauron	細條羽紋藻	88	0	0	29	0.07%
Rhoicosphenia curvata	彎楔藻	0	1056	0	352	0.83%
Synedra ulna	肘狀針桿藻	1408	0	528	645	1.52%
Chlorlphytes	綠藻					
Crucigenia sp.	十字藻	0	0	1056	352	0.83%
Scenedesmus sp.	柵藻	0	0	1056	352	0.83%
Total (cells/l)		22176	59136	46200	42504	100%

表 2.9-3 核四廠附近河域101年第2季浮游植物細胞數含量（續1）

採樣日期：101年4月17日

Taxa / Stations		雙溪測站1	雙溪測站2	雙溪測站3	平均	百分比
Bacillariophytes	矽藻					
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	528	0	0	176	0.27%
Achnanthes exigua	短小曲殼藻	0	0	2112	704	1.06%
Achnanthes hustedtii	平滑曲殼藻	528	0	0	176	0.27%
Achnanthes lancelata	披針曲殼藻	528	132	1056	572	0.86%
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	3696	1980	29040	11572	17.44%
Achnanthes minutissima	極小曲殼藻	0	0	1584	528	0.80%
Amphora angusta	狹窄雙眉藻	0	0	528	176	0.27%
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻	0	0	528	176	0.27%
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	0	0	1056	352	0.53%
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	528	264	528	440	0.66%
Cyclotella meneghiniana	梅尼小環藻	0	396	3168	1188	1.79%
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻	0	0	528	176	0.27%
Cymbella lacustris	橋彎藻	0	0	528	176	0.27%
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	528	0	1584	704	1.06%
Cymbella minuta	橋彎藻	0	0	528	176	0.27%
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	0	0	0	0	0.00%
Cymbella ventricosa	偏腫橋彎藻	0	0	528	176	0.27%
Diploneis elliptica	橢圓雙壁藻	528	0	0	176	0.27%
Fragilaria intermedia	中型脆桿藻	0	132	0	44	0.07%
Gomphonema clevei	克氏異極藻	0	0	528	176	0.27%
Gomphonema heliveticum	直條異極藻	528	0	528	352	0.53%
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	0	132	1056	396	0.60%
Gomphonema parvulum	微小異極藻	0	264	4752	1672	2.52%
Gyrosigma sp.	布紋藻	0	0	528	176	0.27%
Melosira varians	變異直鏈藻	2112	132	0	748	1.13%
Navicula cryptocephala	隱頭舟形藻	56496	1056	22176	26576	40.05%
Navicula lanceolata	披針舟形藻	0	0	1056	352	0.53%
Navicula mutica	截端舟形藻	0	0	528	176	0.27%
Navicula placentula	扁圓舟形藻	0	0	1056	352	0.53%
Navicula radiosa	放射舟形藻	3696	132	4224	2684	4.05%
Navicula radiosa var. *parva*	放射舟形藻變種	528	0	0	176	0.27%
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	2640	132	1584	1452	2.19%
Navicula spicula	針舟形藻	0	0	2640	880	1.33%
Nitzschia brevissima	縮短菱形藻	528	0	0	176	0.27%
Nitzschia clausii	克勞氏菱形藻	528	0	1584	704	1.06%
Nitzschia filiformis	絲狀菱形藻	0	0	2640	880	1.33%
Nitzschia fonticola	泉生菱形藻	528	0	528	352	0.53%
Nitzschia frustulum	碎片菱形藻	0	0	1584	528	0.80%
Nitzschia palea	穀皮菱形藻	6864	924	15840	7876	11.87%
Pinnularia microstauron	細條羽紋藻	528	0	0	176	0.27%
Surirella robusta	粗壯雙菱藻	528	0	0	176	0.27%
Synedra pulchella var. *lanceolata*	針桿藻	0	132	528	220	0.33%
Synedra ulna	肘狀針桿藻	528	0	3696	1408	2.12%
Chlorlphytes	綠藻					
Dictyosphaerium sp.	膠網藻	0	0	10560	3520	5.31%
Eudorina sp.	空球藻	8448	2112	0	3520	5.31%
Total (cells/l)		82896	5808	110352	66352	100%

表 2.9-3 核四廠附近河域101年第2季浮游植物細胞數含量（續2）

採樣日期：101年6月18日

Taxa / Stations		石碇溪測站1	石碇溪測站2	石碇溪測站3	平均	百分比
Bacillariophytes	矽藻					
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	0	264	1320	528	0.66%
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	792	792	528	704	0.87%
Achnanthes exigua	短小曲殼藻	0	264	1584	616	0.76%
Achnanthes lancelata	披針曲殼藻	4752	1320	0	2024	2.51%
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	6072	3960	5280	5104	6.33%
Achnanthes minutissima	極小曲殼藻	1056	0	0	352	0.44%
Amphora angusta	狹窄雙眉藻	0	0	528	176	0.22%
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻	264	0	5544	1936	2.40%
Amphora ovalis	卵形雙眉藻	264	0	792	352	0.44%
Aulacoseira granulata	顆粒直鏈藻	792	2640	6336	3256	4.04%
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	528	0	1320	616	0.76%
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	4488	2376	4488	3784	4.69%
Cocconeis scutellum	盾卵形藻	0	0	2112	704	0.87%
Cyclotella meneghiniana	梅尼小環藻	528	0	792	440	0.55%
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	0	792	0	264	0.33%
Cymbella minuta	橋彎藻	264	0	0	88	0.11%
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	528	0	0	176	0.22%
Cymbella ventricosa	偏腫橋彎藻	0	264	0	88	0.11%
Diploneis elliptica	橢圓雙壁藻	0	0	528	176	0.22%
Diploneis ovalis	闊橢圓雙壁藻	0	528	528	352	0.44%
Eunotia arcus	弧形短縫藻	1320	264	0	528	0.66%
Fragilaria intermedia	中型脆桿藻	0	0	1848	616	0.76%
Gomphonema clevei	克氏異極藻	528	792	528	616	0.76%
Gomphonema constrictum	縊縮異極藻	0	528	0	176	0.22%
Gomphonema gracile	纖細異極藻	0	528	528	352	0.44%
Gomphonema heliveticum	直條異極藻	1320	264	1584	1056	1.31%
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	1584	3696	792	2024	2.51%
Gomphonema parvulum	微小異極藻	8976	10824	7920	9240	11.46%
Gomphonema sphaerophorum	球異極藻	0	0	264	88	0.11%
Gyrosigma sp.	布紋藻	0	0	528	176	0.22%
Hantzschia amphioxys	雙尖菱板藻	0	264	528	264	0.33%
Melosira nummuloides	擬銀幣直鏈藻	0	528	2904	1144	1.42%
Melosira varians	變異直鏈藻	0	0	1320	440	0.55%
Navicula anglica	英吉利舟形藻	264	0	1056	440	0.55%
Navicula cryptocephala	隱頭舟形藻	5544	7656	16896	10032	12.45%
Navicula directa	直舟形藻	0	0	1584	528	0.66%

表 2.9-3 核四廠附近河域101年第2季浮游植物細胞數含量（續3）

採樣日期：101年6月18日

Taxa / Stations		石碇溪測站1	石碇溪測站2	石碇溪測站3	平均	百分比
Navicula directa var. *remota*	直舟形藻疏遷變種	0	0	1320	440	0.55%
Navicula grimmii	格氏舟形藻	264	264	792	440	0.55%
Navicula lanceolata	披針舟形藻	264	0	528	264	0.33%
Navicula lyra	琴狀舟形藻	0	0	264	88	0.11%
Navicula mutica	截端舟形藻	1056	264	2112	1144	1.42%
Navicula placentula	扁圓舟形藻	0	792	528	440	0.55%
Navicula pupula	瞳孔舟形藻	0	1056	1320	792	0.98%
Navicula radiosa	放射舟形藻	528	792	2376	1232	1.53%
Navicula radiosa var. *parva*	放射舟形藻	1584	2112	0	1232	1.53%
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	2376	1848	1320	1848	2.29%
Neidium iridis	彩虹長篦藻	0	0	528	176	0.22%
Nitzschia brevissima	縮短菱形藻	0	264	0	88	0.11%
Nitzschia clausii	克勞氏菱形藻	528	264	792	528	0.66%
Nitzschia filiformis	絲狀菱形藻	528	0	0	176	0.22%
Nitzschia fonticola	泉生菱形藻	264	0	0	88	0.11%
Nitzschia frustulum	碎片菱形藻	792	0	528	440	0.55%
Nitzschia hungarica	菱形藻	0	0	528	176	0.22%
Nitzschia linearis	線形菱形藻	264	0	0	88	0.11%
Nitzschia palea	穀皮菱形藻	15840	6864	13464	12056	14.96%
Nitzschia sublinearis	近線形菱形藻	528	264	528	440	0.55%
Nitzschia tryblionella	盤形菱形藻	264	0	0	88	0.11%
Pinnularia microstauron	細條羽紋藻	1848	792	1320	1320	1.64%
Pinnularia viridula	微緣羽紋藻	0	528	264	264	0.33%
Rhoicosphenia curvata	彎楔藻	1056	0	0	352	0.44%
Stephanodiscus sp.	冠盤藻	0	0	264	88	0.11%
Surirella robusta	粗壯雙菱藻	0	0	1584	528	0.66%
Synedra ulna	肘狀針桿藻	528	528	792	616	0.76%
Chlorlphytes	綠藻					
Coelastrum sp.	空星藻	0	16896	0	5632	6.99%
Golenkinia sp.	多芒藻	0	0	264	88	0.11%
Total (cells/l)		68376	72072	101376	80608	100%

表 2.9-3 核四廠附近河域101年第2季浮游植物細胞數含量（續4）

採樣日期：101年6月18日

Taxa / Stations		雙溪測站1	雙溪測站2	雙溪測站3	平均	百分比
Bacillariophytes	矽藻					
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	0	0	528	176	0.22%
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	528	0	1320	616	0.78%
Achnanthes exigua	短小曲殼藻	0	132	0	44	0.06%
Achnanthes lancelata	細身曲殼藻	1320	132	0	484	0.61%
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	6336	3432	4752	4840	6.15%
Achnanthes minutissima	極小曲殼藻	2376	264	0	880	1.12%
Amphora angusta	狹窄雙眉藻	264	0	0	88	0.11%
Amphora ovalis	卵形雙眉藻	528	396	0	308	0.39%
Aulacoseira granulata	顆粒直鏈藻	6864	924	0	2596	3.30%
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	2640	0	0	880	1.12%
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	1056	396	2640	1364	1.73%
Cyclotella meneghiniana	梅尼小環藻	0	264	15840	5368	6.82%
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻	0	0	3168	1056	1.34%
Cymbella lacustris	橋彎藻	528	132	0	220	0.28%
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	1056	396	1320	924	1.17%
Cymbella minuta	橋彎藻	0	132	0	44	0.06%
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	0	0	1056	352	0.45%
Diploneis elliptica	橢圓雙壁藻	0	132	1320	484	0.61%
Diploneis ovalis	闊橢圓雙壁藻	528	0	0	176	0.22%
Eunotia arcus	弧形短縫藻	264	0	528	264	0.34%
Gomphonema clevei	克氏異極藻	528	264	0	264	0.34%
Gomphonema gracile	纖細異極藻	0	0	0	0	0.00%
Gomphonema heliveticum	直條異極藻	1320	660	8976	3652	4.64%
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	528	0	11088	3872	4.92%
Gomphonema parvulum	微小異極藻	7656	1452	21912	10340	13.14%
Gyrosigma sp.	布紋藻	0	0	1320	440	0.56%
Hantzschia amphioxys	雙尖菱板藻	264	0	0	88	0.11%
Melosira varians	變異直鏈藻	528	132	11352	4004	5.09%
Navicula bacillum	桿狀舟形藻	0	132	0	44	0.06%
Navicula cryptocephala	隱頭舟形藻	14784	1584	13992	10120	12.86%
Navicula mutica	截端舟形藻	528	132	0	220	0.28%
Navicula grimmii	格氏舟形藻	0	0	528	176	0.22%

表 2.9-3 核四廠附近河域101年第2季浮游植物細胞數含量（續5）

採樣日期：101年6月18日

Taxa / Stations		雙溪測站1	雙溪測站2	雙溪測站3	平均	百分比
Navicula placentula	扁圓舟形藻	528	264	1584	792	1.01%
Navicula pupula	瞳孔舟形藻	2904	396	1320	1540	1.96%
Navicula radiosa	放射舟形藻	1848	132	0	660	0.84%
Navicula radiosa var. *parva*	放射舟形藻	1056	396	1056	836	1.06%
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	5280	132	0	1804	2.29%
Nitzschia brevissima	縮短菱形藻	528	132	2640	1100	1.40%
Nitzschia clausii	克勞氏菱形藻	528	0	2904	1144	1.45%
Nitzschia filiformis	絲狀菱形藻	0	264	0	88	0.11%
Nitzschia fonticola	泉生菱形藻	264	0	0	88	0.11%
Nitzschia frustulum	碎片菱形藻	528	264	0	264	0.34%
Nitzschia hungarica	菱形藻	264	0	0	88	0.11%
Nitzschia obtusa var. *scalpelliformi*	盾頭菱形藻刀形變種	0	0	1320	440	0.56%
Nitzschia palea	穀皮菱形藻	8712	1056	6072	5280	6.71%
Nitzschia scalaris	菱形藻	0	0	264	88	0.11%
Pinnularia microstauron	細條羽紋藻	528	264	8712	3168	4.02%
Pinnularia viridula	微緣羽紋藻	264	0	0	88	0.11%
Surirella robusta	粗壯雙菱藻	792	0	1584	792	1.01%
Synedra ulna	肘狀針桿藻	528	264	8976	3256	4.14%
Chlorlphytes	綠藻					
Eudorina sp.	空球藻	0	4224	0	1408	1.79%
Gloeocystis sp.	膠囊藻	0	2112	0	704	0.89%
Scenedesmus sp.	柵藻	2112	0	0	704	0.89%
Total (cells/l)		77088	20988	138072	78716	1

表2.9-4 核四廠附近河域101年第2季浮游動物種類與個體量

採樣日期: 101年4月17日

		石碇溪					雙溪				
採樣測站		測站1	測站2	測站3	平均	%	測站1	測站2	測站3	平均	%
每網過濾水量(m^3)		0.02	0.02	0.02			0.02	0.02	0.02		
單位個體量(ind./m^3)		10850	800	900	4183.33	100.00%	12600	7250	3400	7750.00	100.00%
Noctiluca	夜光蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Forminifera	有孔蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Ciliophora	纖毛蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Radiolaria	放射蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Medusa	水母	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Ctenophora	櫛水母	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Siphonophore	管水母	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Chaetognatha	毛顎類	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Polychaeta	多毛類	0	0	100	33.33	0.80%	0	0	300	100.00	1.29%
Cladocera	枝角類	1350	0	0	450.00	10.76%	800	150	150	366.67	4.73%
Otstrocoda	介形類	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Copepoda	橈腳類	0	0	0			0	0	0		
Calanoida	哲水蚤	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	150	50.00	0.65%
Cyclopoida	劍水蚤	0	0	0	0.00	0.00%	0	200	0	66.67	0.86%
Harpacticoida	猛水蚤	250	300	350	300.00	7.17%	3150	4100	550	2600.00	33.55%
Nouplius	無節幼體	500	150	350	333.33	7.97%	1400	1000	1250	1216.67	15.70%
Amphipoda	端腳類	0	200	0	66.67	1.59%	50	50	50	50.00	0.65%
Barncle nauplins	藤壺幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Crablarvae	蟹幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Shrimp larvae	蝦幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Mysidacea	磷蝦	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Luciferinae	螢蝦	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Mollusca	軟體動物	0	0	50	16.67	0.40%	50	0	0	16.67	0.22%
Water Bear	水熊	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Nematoda	線蟲類	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Rotifer	輪蟲	8100	0	50	2716.67	64.94%	5050	1300	150	2166.67	27.96%
Fish egg	魚卵	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Fish larvae	魚類幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Insect larvae	昆蟲幼生	650	100	0	250.00	5.98%	1700	350	50	700.00	9.03%
Other	其他	0	50	0	16.67	0.40%	400	100	750	416.67	5.38%

註: 石碇溪及雙溪各測站的水量均為20L

表2.9-4 核四廠附近河域101年第2季浮游動物種類與個體量（續）

採樣日期: 101年6月18日

		石碇溪					雙溪				
採樣測站		測站1	測站2	測站3	平均	%	測站1	測站2	測站3	平均	%
每網過濾水量(m3)		0.02	0.02	0.02			0.02	0.02	0.02		
單位個體量(ind./m3)		122	65	19	68.66	100.00%	59	19	51	43.00	100.00%
Noctiluca	夜光蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Forminifera	有孔蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Ciliophora	纖毛蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Radiolaria	放射蟲	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Medusa	水母	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Ctenophora	櫛水母	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Siphonophore	管水母	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Chaetognatha	毛顎類	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Polychaeta	多毛類	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Cladocera	枝角類	0	0	0	0.00	0.00%	0	1	0	0.33	0.01%
Otstrocoda	介形類	0	3	3	2.00	0.03%	0	0	0	0.00	0.00%
Copepoda	橈腳類										
Calanoida	哲水蚤	0	0	0	0.00	0.00%	0	1	0	0.33	0.01%
Cyclopoida	劍水蚤	0	0	4	1.33	0.02%	0	1	0	0.33	0.01%
Harpacticoida	猛水蚤	0	1	0	0.33	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Nouplius	無節幼體	0	0	0	0.00	0.00%	1	0	0	0.33	0.01%
Amphipoda	端腳類	0	1	0	0.33	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Barncle nauplins	藤壺幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Crablarvae	蟹幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Shrimp larvae	蝦幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Mysidacea	磷蝦	0	0	0	0.00	0.00%	0	1	0	0.33	0.01%
Luciferinae	螢蝦	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Mollusca	軟體動物	104	38	12	51.33	0.72%	52	10	48	36.67	0.84%
Water Bear	水熊	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Nematoda	線蟲類	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Rotifer	輪蟲	13	13	0	8.67	0.12%	0	1	0	0.33	0.01%
Fish egg	魚卵	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Fish larvae	魚類幼生	0	0	0	0.00	0.00%	0	0	0	0.00	0.00%
Insect larvae	昆蟲幼生	5	8	0	4.33	0.06%	5	3	2	3.33	0.08%
Other	其他	0	1	0	0.33	0.00%	1	1	1	1.00	0.02%

註: 石碇溪及雙溪各測站的水量均為20L

表2.9-5　核四廠附近河域101年第2季水生昆蟲調查報告

單位：隻

採樣日期	101年4月17日			101年4月17日		
河川	石碇溪			雙溪		
種類　學名　測站	測站1	測站2	合計	測站1	測站2	合計
蜉蝣目 Ephemeroptera						
1扁蜉蝣科Ecdyonuridae						
Ecdyonurus sp.						
吉田扁蜉蝣 *Ecdyonurus yoshidae*	15		15	23		23
吉本扁蜉蝣 *Ecdyonurus kibunensis*	2		2	5		5
Ecdyonurus viridis						
2.四節蜉蝣科Baetidae						
雙棘四節蜉蝣*Baetiella bispinosus*	9		9	12		12
蜻蛉目 Odonta						
1.蜻科Libellulidae						
Libellula sp.	1		1			
2.春蜓科Gomphidae						
Onychogomphus sp.	2		2	1		1
毛翅目Trichoptera						
1.網石蠶科Hydropsychidae						
Cheumatopsyche sp.				2		2
Hydropsyche sp.						
2.指石蠶科Philopotamidae						
Chimarra sp.						
3.流石蠶科Rhyacophilidae						
Rhyacophila nigrocephala	3		3	6		6
4.石蠶科Arctopsychidae						
Macronema radiatum						
襀翅目Plecoptera						
1.石蠅科Perlidae						
Oyamia sp.					1	1
Neoperla sp.						
雙翅目Diptera						
1.Chironomidae 搖蚊科						
Chironomus sp.		3	3		6	6
2.蚋科Simuliidae						
Simulium sp.						
鱗翅目Lepidoptera						
1.螟蛾科Pyralidae						
Paracymoriza sp.						
合計	32	3	35	49	7	56
出現種類數	6	1	7	6	2	8

表2.9-5　核四廠附近河域101年第2季水生昆蟲調查報告（續）

單位：隻

採樣日期	101年6月18日			101年6月18日		
河川	石碇溪			雙溪		
種類　學名　測站	測站1	測站2	合計	測站1	測站2	合計
蜉蝣目 Ephemeroptera						
1扁蜉蝣科Ecdyonuridae						
Ecdyonurus sp.						
吉田扁蜉蝣 *Ecdyonurus yoshidae*	7		7	19		19
吉本扁蜉蝣 *Ecdyonurus kibunensis*				17		17
Ecdyonurus viridis						
2.四節蜉蝣科Baetidae						
雙棘四節蜉蝣*Baetiella bispinosus*	11		11	15		15
蜻蛉目 Odonta						
1.蜻科Libellulidae						
Libellula sp.	1		1	1		1
2.春蜓科Gomphidae						
Onychogomphus sp.	1		1			
毛翅目Trichoptera						
1.網石蠶科Hydropsychidae						
Cheumatopsyche sp.	2		2	5		5
Hydropsyche sp.	3		3			
2.指石蠶科Philopotamidae						
Chimarra sp.						
3.流石蠶科Rhyacophilidae						
Rhyacophila nigrocephala	5		5	10		10
4.石蠶科Arctopsychidae						
Macronema radiatum						
襀翅目Plecoptera						
1.石蠅科Perlidae						
Oyamia sp.					16	16
Neoperla sp.						
雙翅目Diptera						
1.Chironomidae 搖蚊科						
Chironomus sp.		5	5			
2.蚋科Simuliidae						
Simulium sp.					2	2
鱗翅目Lepidoptera						
1.螟蛾科Pyralidae						
Paracymoriza sp.						
合計	30	5	35	67	18	85
出現種類數	7	1	8	6	2	8

表2.9-6　核四廠附近河域101年第2季魚類調查

調查日期	101年4月17、18日								101年4月17、18日							
河川	石碇溪								雙溪							
測站	測站1		測站2		測站3		合計		測站1		測站2		測站3		合計	
種類　學名	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g
鯉科 Cyprinidae																
台灣石魚賓 *Acrossocheilus paradoxus*	5	17.92					5	17.92	23	30.25					23	30.25
台灣縱紋鱲 *Candidia barbata*	3	7.16					3	7.16								
粗首馬口鱲 *Opsariichthys pachycephalus*	20	32.26					20	32.26	21	37.62					21	37.62
胎鱂魚科 Poeciliidae																
食蚊魚 *Gambusia affinis*	7	1.52	10	3.10			17	4.62	10	4.01					10	4.01
條紋雞魚科 Teraponidae																
花身雞魚 *Terapon jarbua*			2	5.20	15	38.50	17	43.70					5	7.25	5	7.25
鯛科 Sparidae																
黃鰭鯛 *Acanthopagrus latus*					10	17.55	10	17.55			12	52.63	2	10.50	14	63.13
慈鯛科 Cichlidae																
巴西珠母麗鯛 *Geophagus brasiliensis*									9	39.01	4	50.50			13	89.51
尼羅口孵魚 *Orechromis niloticus*	9	50.10	16	100.55			25	150.65	2	51.02					2	51.02
鯔科 Mugilidae																
大鱗鯧 *Chelon macrolepis*			55	90.21	15	35.25	51	125.46			25	61.23	6	25.50	31	86.73
白鯧 *Chelon subviridis*											1	6.65			1	6.65
塘鱧科 Eleotridae																
蓋刺塘鱧 *Eleotris acanthopoma*			2	5.19	2	6.2	4	11.39								
棕塘鱧 *Eleotris fusca*			3	7.86			3	7.86			2	5.23			2	5.23
鰕虎科 Gobiidae																
雷氏斑點鰕虎 *Papillogobius rechei*					11	7.62	11	7.62								
明潭吻鰕虎 *Rhinogobius cadidianus*	5	6.17					5	6.17	16	23.02					16	23.02
台灣吻鰕虎 *Rhinogobius formosanus*									2	2.35					2	2.35
日本禿頭鯊 *Sicyopterus japonicus*	2	6.29					2	6.29								
魚類合計	51	121.42	88	212.11	53	105.12	173	438.65	83	187.28	44	176.24	13	43.25	140	406.77

表2.9-6　核四廠附近河域101年第2季魚類調查（續）

調查日期	101年6月18、19日								101年6月18、19日							
河川	石碇溪								雙溪							
測站	測站1		測站2		測站3		合計		測站1		測站2		測站3		合計	
種類　學名	數量	重量g	數量	重量g	數量	重量g	數量	重量g	數量	重量g	數量	重量g	數量	重量g	數量	重量g
鯉科 Cyprinidae																
台灣石魚賓 *Acrossocheilus paradoxus*	3	15.12					3	15.12	15	52.16					15	52.16
台灣縱紋鱲 *Candidia barbata*	2	6.51					2	6.51								
粗首馬口鱲 *Opsariichthys pachycephalus*	16	25.17					16	25.17	16	30.26					16	30.26
胎鱂魚科 Poeciliidae																
食蚊魚 *Gambusia affinis*	5	1.12	7	5.24			7	5.24	9	2.51					9	2.51
條紋雞魚科 Teraponidae																
花身雞魚 *Terapon jarbua*			5	6.81	10	30.00	15	36.81					2	6.15	2	6.15
鯛科 Sparidae																
黃鰭鯛 *Acanthopagrus latus*					11	32.51	11	32.51			10	27.62	5	71.11	15	98.73
慈鯛科 Cichlidae																
巴西珠母麗鯛 *Geophagus brasiliensis*									5	27.91	1	37.00			6	64.91
尼羅口孵魚 *Orechromis niloticus*	11	71.23	12	98.16			12	98.16	3	35.02					3	35.02
鯔科 Mugilidae																
大鱗鯧 *Chelon macrolepis*			56	85.23	44	110.00	100	195.23			26	51.42	11	36.00	37	87.42
塘鱧科 Eleotridae																
蓋刺塘鱧 *Eleotris acanthopoma*			6	7.62			6	7.62								
棕塘鱧 *Eleotris fusca*			1	2.81			1	2.81			1	3.52			1	3.52
鰕虎科 Gobiidae																
雷氏斑點鰕虎 *Papillogobius rechei*					2	1.73	2	1.73								
明潭吻鰕虎 *Rhinogobius cadidianus*	3	5.81					3	5.81	10	31.16					10	31.16
台灣吻鰕虎 *Rhinogobius formosanus*									5	9.63					5	9.63
日本禿頭鯊 *Sicyopterus japonicus*											16	1.50			16	1.50
魚類合計	40	124.96	87	205.87	67	174.24	178	432.72	63	188.65	54	121.06	18	113.26	135	422.97

表2.9-7　核四廠附近河域101年第2季無脊椎動物調查

調查日期	101年4月17、18日								101年4月17、18日							
河川	石碇溪								雙溪							
測站	測站1		測站2		測站3		合計		測站1		測站2		測站3		合計	
種類　學名	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g
方蟹科 Grapsidae																
日本絨螯蟹 *Eriocheir japonica*	2	17.65					2	17.65								
利其厚蟹 *Helice leachi*					1	3.15	1	3.15								
雙齒近相手蟹 *Perisesarma bidens*					10	51.61	10	51.61					11	18.61	11	18.61
方形大額蟹 *Metapograpsus thukuhar*					1	5.02	1	5.02								
字紋弓蟹 *Varuna litterna*	1	5.32	5	2.76			6	8.08								
沙蟹科 Ocypodidae																
北方呼喚招潮蟹 *Uca borealis*					19	50.12	19	50.12								
梭子蟹科 Portunidae																
鋸緣青蟹 *Scylla serrata*					2	23.65	2	23.65								
長臂蝦科 Palaemonidae																
南海沼蝦 *Macrobranchium australa*			5	6.17			5	6.17								
等齒沼蝦 *Macrobranchium equidens*											5	6.31			5	6.31
臺灣沼蝦 *Macrobranchium formosense*			7	8.15			7	8.15	2	3.82			5	3.96	7	7.78
日本沼蝦 *Macrobranchium nipponense*			2	6.12			2	6.12			7	8.19			7	8.19
匙指蝦科 Atyidae																
多齒新米蝦 *Neocaridina denticulata*	7	1.15					7	1.15								
甲殼類合計	10	24.12	19	23.20	33	133.55	62	180.87	2	3.82	12	14.50	16	22.57	30	40.89
軟體動物類																
蜑螺科 Neritidae																
小皇冠蜑螺 *Clithon corona*			9	15.73			9	15.73								
長形壁蜑螺 *Septaria lineata*			5	3.06			5	3.06								
蘋果螺科 Ampullariidae																
福壽螺 *Pomacea canaliculata*	2	23.16	5	17.37			7	40.43	3	15.62	2	6.71			5	22.33
蜆科 Corbiculidae																
台灣蜆 *Corbicula fluminea*			1	2.52			1	2.52	5	5.79					5	5.79
牡蠣科 Ostreidae																
長牡蠣 *Crassostrea gigas*					6	12.63	6	12.63					5	7.91	5	7.91
錐蜷科 Thiaridae																
網蜷 *Melanoides tuberculatus tuberculatus*					9	3.05	9	3.05					16	8.12	16	8.12
似殼菜蛤科 Dreissenidae																
似殼菜蛤 *Mytilopsis sallei*			1	2.37			1	2.37								
山椒螺科 Assimineidae																
山椒蝸牛 *Assiminea* sp.													5	0.97	5	0.97
軟體動物類合計	2	23.16	21	41.05	15	15.68	38	79.79	8	21.41	2	6.71	26	17.00	36	45.12

表2.9-7　核四廠附近河域101年第2季無脊椎動物調查（續）

調查日期	101年6月18、19日								101年6月18、19日							
河川	石碇溪								雙溪							
測站	測站1		測站2		測站3		合計		測站1		測站2		測站3		合計	
種類　學名	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g	數量	重量 g
方蟹科 Grapsidae																
日本絨螯蟹 *Eriocheir japonica*	1	35.73					1	35.73								
利其厚蟹 *Helice leachi*					2	5.25	2	5.25								
雙齒近相手蟹 *Perisesarma bidens*					9	51.37	9	51.37			1	5.62	9	30.35	10	35.97
字紋弓蟹 *Varuna litterna*	2	50.21	3	5.71			5	55.92								
沙蟹科 Ocypodidae																
北方呼喚招潮蟹 *Uca borealis*					12	35.79	12	35.79								
梭子蟹科 Portunidae																
鋸緣青蟹 *Scylla serrata*					3	39.15	3	39.15								
長臂蝦科 Palaemonidae																
南海沼蝦 *Macrobranchium australa*													5	5.79	5	5.79
臺灣沼蝦 *Macrobranchium formosense*			8	6.51			8	6.51	5	2.15	1	2.50			6	4.65
日本沼蝦 *Macrobranchium nipponense*			1	2.06			1	2.06			3	5.02			3	5.02
匙指蝦科 Atyidae																
多齒新米蝦 *Neocaridina denticulata*	5	1.79					5	1.79								
甲殼類合計	8	87.73	12	14.28	26	131.56	46	233.57	5	2.15	5	13.14	14	36.14	24	51.43
軟體動物類																
蜑螺科 Neritidae																
小皇冠蜑螺 *Clithon corona*			10	9.76			10	9.76								
長形壁蜑螺 *Septaria lineata*			2	2.53			2	2.53								
蘋果螺科 Ampullariidae																
福壽螺 *Pomacea canaliculata*	1	5.32	3	7.61			4	12.93	4	10.67	3	5.23			7	15.90
蜆科 Corbiculidae																
台灣蜆 *Corbicula fluminea*									2	3.12					2	3.12
牡蠣科 Ostreidae																
長牡蠣 *Crassostrea gigas*					3	6.81	3	6.81					5	12.16	5	12.16
錐蜷科 Thiaridae																
網蜷 *Melanoides tuberculatus tuberculatus*			15	12.51	16	6.99	31	19.50					11	5.33	11	5.33
似殼菜蛤科 Dreissenidae																
似殼菜蛤 *Mytilopsis sallei*			2	3.68			2	3.68								
山椒螺科 Assimineidae																
山椒蝸牛 *Assiminea* sp.													2	0.35	2	0.35
軟體動物類合計	1	5.32	32	36.09	19	13.80	52	55.21	6	13.79	3	5.23	18	17.84	27	36.86

海域水質監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.10 海域水質監測

本季監測共進行 3 次（4~6 月每月 1 次）採樣調查，依據行政院環保署最新公告之「海域環境分類及海洋環境品質標準」規定，本監測工作之 4 處海域水質測站均位於甲類海域水體範圍內，而海域水體水質標準則依行政院環保署 90 年 12 月 26 日環署水字第〇〇八一七五〇號令修正發佈之「海域環境分類及海洋環境品質標準」中第 4 條保護人體健康之環境品質標準與第 5 條甲類海域海洋環境品質標準（詳見表 2.10-1）之規定。

1.漁港水質監測結果

本季針對廠區東北方之澳底漁港進行水質監測，除生化需氧量 4、6 月（測值分別為 2.1mg/L 及 3.1mg/L）測值有超出甲類海域環境分類及海洋環境品質標準之情形（詳表 2.10-2）外，其餘測值均符合甲類海域環境分類及海洋環境品質標準，本測站位於漁港內，研判測值受漁業活動及船隻靠岸休憩及清洗工作影響，造成有機污染物偏高之原因，屬環境背景值。

2.海域水質監測結果

本季（4~6 月）監測結果，除 5 月 4 號測站之表、底層大腸桿菌測值有超出甲類海域海洋環境品質標準外，其餘各測站各測值均符合甲類海域海洋環境品質標準（詳表 2.10-3），由於核四海事工程海域施工項目已於 94 年 7 月 22 日竣工，本季監測各測值均屬環境背景值，亦將持續監測水質變化情形。

而與核四工程相關之濁度及懸浮固體濃度方面，本季各測站懸浮固體測值介於 1.2~9.8mg/L 之間，濁度測值介於 0.50~11 NTU 之間，均在施工前之監測範圍內（懸浮固體 0.5~49.5mg/L，濁度 0.14~15.5 NTU）。

表 2.10-1 海域環境分類及海洋環境品質標準

水體分類 / 基準值 / 水質項目	甲　類	乙　類	丙　類
pH	7.5~8.5	7.5~8.5	7.0~8.5
溶氧量	≧5.0	≧5.0	≧2.0
生化需氧量	≦2	≦3	≦6
大腸桿菌群	≦1000	-	-
氨氮	≦0.3	-	-
總磷	≦0.05	-	-
氰化物	≦0.01	≦0.01	≦0.02
酚類	≦0.01	≦0.01	≦0.01
礦物性油脂	≦2	≦2	-
重金屬 鎘	≦0.01		
重金屬 鉛	≦0.1		
重金屬 六價鉻	≦0.05		
重金屬 砷	≦0.05		
重金屬 汞	≦0.002		
重金屬 硒	≦0.05		
重金屬 銅	≦0.03		
重金屬 鋅	≦0.5		
重金屬 錳	≦0.05		
重金屬 銀	≦0.05		

註：各項之單位：pH 值無單位，大腸桿菌群 CFU/100ml，其餘均為 mg/L。
資料來源：行政院環境保護署 90 年 12 月 26 日修訂公告。

表 2.10-2 核四施工環境監測澳底漁港 101 年第 2 季監測結果

檢測項目	單位	偵測極限	101.04.03 14:20 (雨)	101.05.03 14:10 (陰)	101.06.04 11:20 (雨)	去年同期 (100/4~100/6)
鹽　度	psu	-	32.9	31.0	31.1	33.1~35.0
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	35	50	2.2×10^2	$60\sim4.7\times10^3$
生化需氧量	mg/L	<1.0	2.1	1.9	3.1	2.3~3.0
懸浮固體	mg/L	<1.0	2.6	3.9	4.6	2.2~8.4
濁　度	NTU	<0.05	1.6	2.1	2.6	1.2~1.9
溶氧量	mg/L	-	6.9	6.4	6.2	5.7~7.2
總　磷	mg/L	0.002	0.025	0.025	0.031	0.031~0.051
油　脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

註：1.懸浮固體、濁度、溶氧量、總磷及油脂於 91 年 4 月開始執行。
2.大腸桿菌群及生化需氧量測項自 88 年 10 月起開始執行。
3.陰影部分表示超出甲類海域海洋環境品質標準。

表2.10-3 核四施工環境監測海水水質101年第2季監測結果

序	經緯度			N 25°03.5'			E 121°55.7'			N 25°03.0'			E 121°55.6'		
	樣品名稱			1號測站(表層)			1號測站(底層)			2號測站(表層)			2號測站(底層)		
號	檢測項目	單位	偵測極限	101.4.3(雨) 13:50	101.5.3(陰) 13:40	101.6.4(雨) 10:50	101.4.3(雨) 14:00	101.5.3(陰) 13:50	101.6.4(雨) 11:00	101.4.3(雨) 13:20	101.5.3(陰) 13:10	101.6.4(雨) 10:20	101.4.3(雨) 13:30	101.5.3(陰) 13:20	101.6.4(雨) 10:30
1	水溫	℃	-	20.2	25.7	26.1	20.2	25.6	26.1	19.9	25.5	26.1	20.0	25.5	26.1
2	pH	—	-	8.125	8.082	8.089	8.122	8.08	8.092	8.125	8.114	8.083	8.127	8.113	8.086
3	導電度	μmho/cm 25℃	-	50200	49900	50300	50200	49900	50300	50300	47500	49300	50300	47500	49200
4	溶氧量	mg/L	-	7.0	6.3	6.4	7.1	6.4	6.2	7.1	6.4	6.2	7.1	6.4	6.2
5	餘氯	mg/L	-	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04
6	大腸桿菌群	CFU/100ml	<10	<10	<10	15	<10	<10	25	<10	45	45	<10	50	50
7	濁度	NTU	<0.05	1.1	0.70	2.1	0.80	0.50	1.4	1.0	1.0	1.3	1.3	1.4	2.1
8	懸浮固體	mg/L	<1.0	2.0	1.6	2.6	1.4	1.5	2.7	1.4	1.8	2.4	1.8	1.8	2.6
9	生化需氧量	mg/L	<1.0	1.5	1.8	1.8	1.7	1.9	1.6	1.7	1.8	1.6	1.7	1.5	1.4
10	總磷	mg/L	0.002	0.012	0.011	0.027	0.012	0.011	0.017	0.020	0.016	0.021	0.015	0.013	0.018
11	油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
12	銅	mg/L	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13	鉛	mg/L	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	鎘	mg/L	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15	鋅	mg/L	0.0014	ND	0.0040	0.0033	ND	0.0037	0.0025	ND	0.0037	0.0035	ND	0.0029	0.0036
16	鎳	mg/L	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17	總鉻	mg/L	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
18	汞	mg/L	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
19	鎂	mg/L	0.313	1370	1330	1330	1370	1330	1340	1350	1290	1290	1340	1290	1300

註：ND表低於偵測極限。

表2.10-3 核四施工環境監測海水水質101年第2季監測結果（續）

序號	經緯度			N 25°02.3'			E 121°55.8'			N 25°01.6'			E 121°56.4'		
	樣品名稱			3號測站(表層)			3號測站(底層)			4號測站(表層)			4號測站(底層)		
	檢測項目	單位	偵測極限	101.4.3(雨) 12:50	101.5.3(陰) 12:40	101.6.4(雨) 9:50	101.4.3(雨) 13:00	101.5.3(陰) 12:50	101.6.4(雨) 10:00	101.4.3(雨) 12:20	101.5.3(陰) 12:10	101.6.4(雨) 9:20	101.4.3(雨) 12:30	101.5.3(陰) 12:20	101.6.4(雨) 9:30
1	水溫	℃	-	19.8	25.2	26.0	19.8	25.2	26.1	20.1	24.8	25.9	20.2	24.7	25.9
2	pH	—	-	8.115	8.145	8.062	8.117	8.142	8.095	8.072	8.221	8.097	8.065	8.224	8.087
3	導電度	μmho/cm 25℃	-	50200	49400	49100	50200	49400	47500	50100	33700	38800	50100	33800	36600
4	溶氧量	mg/L	-	7.0	6.4	6.5	7.1	6.3	6.4	7.0	6.9	6.4	7.0	6.8	6.2
5	餘氯	mg/L	-	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
6	大腸桿菌群	CFU/100ml	<10	<10	<10	85	<10	30	1.4×10^2	<10	2.3×10^3	2.7×10^2	<10	2.6×10^3	5.2×10^2
7	濁度	NTU	<0.05	0.65	0.65	1.2	1.1	0.65	1.4	1.1	11	3.7	1.2	11	3.8
8	懸浮固體	mg/L	<1.0	1.3	1.4	2.1	2.2	1.5	2.2	1.2	9.4	5.0	1.6	9.8	4.5
9	生化需氧量	mg/L	<1.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.0	1.6	1.9	1.8	1.7	1.8	1.5
10	總磷	mg/L	0.002	0.019	0.009	0.094	0.013	0.011	0.018	0.016	0.054	0.019	0.019	0.024	0.019
11	油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
12	銅	mg/L	0.0004	ND	0.0004	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
13	鉛	mg/L	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
14	鎘	mg/L	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
15	鋅	mg/L	0.0014	ND	0.0030	0.0032	ND	0.0047	0.0037	0.0017	0.0029	0.0016	0.0020	0.0043	0.0031
16	鎳	mg/L	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17	總鉻	mg/L	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050
18	汞	mg/L	0.0004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
19	鎂	mg/L	0.313	1360	1320	1260	1350	1320	1300	1320	861	949	1350	840	927

註：1.ND表低於偵測極限。

2.陰影部分表示超出甲類海域海洋環境品質標準。

海域生態監測

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.11 海域生態監測

1.環境因子

本季於民國 101 年 5 月 3 日完成核能四廠沿岸海域各測站環境因子之採樣調查工作，其調查結果詳如表 2.11-1 所示。茲將各環境因子（營養鹽、葉綠素 *a*、總氮、總磷）之調查研究結果分析說明如下：

⑴營養鹽

①硝酸鹽於各測站的濃度介於 4.40~79.51μg/L 之間，以測站 3 之表層之濃度最高，最低值出現在測站 1 水深 3m 處。海域平均濃度為 26.59μg/L。

②亞硝酸鹽於各測站的濃度介於低於偵測極限（＜0.42μg/L）~1.83μg/L 之間，以測站 3 之表層濃度最高，海域平均濃度為 1.19μg/L。

③磷酸鹽於各測站的濃度均低於偵測極限（＜0.93μg/L），各測站（水平分布）及水層（垂直分布）間的濃度變化不大。

④矽酸鹽於各測站的濃度介於 57.51~520.26μg/L 之間，以測站 3 水深表層之濃度最高，最低值出現在測站 5 底層。海域平均濃度為 158.66μg/L。

⑵葉綠素 *a*

葉綠素 *a* 於各測站的濃度介於 0.08~0.50μgChla/L 之間，以測站 9 之底層水濃度最低，最高值出現在測站 3 之表層。海域平均濃度為 0.26μgChla/L。

⑶總氮

總氮於各測站的濃度介於 0.03~0.10mg/L 之間。海域平均濃度為 0.05mg/L。各測站（水平分布）及水層（垂直分布）間的濃度變化不大，測值呈現較為均勻分佈的現象。

⑷總磷

總磷於各測站的濃度介於 0.02~0.12mg/L 之間。海域平均濃度為 0.03mg/L。各測站（水平分布）及水層（垂直分布）間的濃度變化不大，測值呈現較為均勻分佈的現象。

2.生物因子

⑴基礎生產力

各測站基礎生產力介於 0.23~1.90μgC/L/hr 之間，海域平均基礎生產力為 0.84μgC/L/hr，各測站(水平分布)及水層(垂直分布)間的濃度變化不大，測值呈現較為均勻分佈的現象。

⑵植物性浮游生物

①細胞數含量

本季採樣於民國 101 年 5 月 3 日進行，海域 10 個測站表層 0m 的細胞數含量，如表 2.11-2 所示介於 0.948×10^3~3.27×10^4cells/L，最高含量出現在測站 3，最低含量在測站 1，平均含量為 1.21×10^3 cells/L。3m 水層如表 2.11-3 所示，介於 1.61×10^3~1.26×10^4cells/L，最高含量出現在測站 4，最低含量出現在測站 6，平均含量為 6.89×10^3cells/L。底層如表 2.11-4 所示，介於 1.85×10^3~1.73×10^4cells/L，最高含量出現在測站 8，最低含量出現在測站 6，平均含量為 6.69×10^3cells/L，海域 10 個測站的細胞數的總平均含量為 8.55×10^3cells/L。細胞數含量的水平及垂直分佈，如圖 2.11-1 所示，水平分佈於測站 3 有出現較高含量，測站 6 含量最低。垂直分佈以 0m 水層的平均含量皆較高於 3m 水層及水底層層，呈現表層較高於底層低的分佈型態。

②種類組成分析

海域 10 個測站以矽藻所出現的種類數較多，表層 0m 矽藻含量如表 2.11-2 所示，佔有藻類的 60.61%，優勢種類以藍綠藻的鐵氏束

毛藻佔 37.73%，其次為矽藻的旋鏈角刺藻佔 31.65%，3m 水層如表 2.11-3 所示，矽藻含量佔有藻類的 91.7%，優勢種類以矽藻的旋鏈角刺藻佔 33.47%最優勢，其次為近岸卵形藻、鐵氏束毛藻及伏恩海毛藻佔 10.32%、6.87%及 6.58%，底層如表 2.11-4 所示，矽藻含量佔有藻類的 96.28%，優勢種類為矽藻的旋鏈角刺藻佔 37.34%最優勢，其次近岸卵形藻與線形曲殼藻分別佔 8.82%及 5.03%，而其他的渦鞭藻、矽質鞭毛藻與藍綠藻也於各水層皆有微量出現。

⑶動物性浮游生物

本季採樣於民國 101 年 5 月 3 日進行，海域 10 個測站的動物性浮游生物垂直分佈總個體含量(10^3ind/1,000m^3)如表 2.11-5 及圖 2.11-2 所示，介於 7.34×10^3~60.4×10^3 ind/1,000m^3，以測站 10 含量最多，測站 1 的含量較少，平均含量為 27.2×10^3ind/1,000m^3。水平分佈總個體含量如表 2.11-5 及圖 2.11-3 所示，介於 1.89×10^3~19.4×10^3ind/1,000m^3，以測站 5 含量最多，測站 7 的含量較少，平均含量為 8.4×10^3 ind/1,000m^3。

種類組成以個體量平均含量的百分比作為比較標準時，垂直分佈如表 2.11-6 所示，海域 10 個測站種類組成以介形類佔 23.73%，為較明顯的優勢種類，其次為橈足類的哲水蚤佔 18.71%及夜光蟲佔 13.54%、棘皮幼生佔 10.15%。水平分佈如表 2.11-6 所示，海域 10 個測站種類組成以夜光蟲佔 25.59%為較明顯的優勢種類，其次是橈腳類的哲水蚤佔 13.75%及棘皮幼生佔 13.26%、介形類 13.11%，本季的橈腳類的哲水蚤、夜光蟲、介形類及棘皮幼生為較高比率的群聚結構特性，顯示與一般近海海域者較相似。

⑷底棲無脊椎動物

①潮間帶

A.沙質環境

本季於民國 101 年 5 月 25 日進行鹽寮海岸潮間帶沙質環境底棲無脊椎動物調查，在 3 個樣區共計取 9 次樣本（潮間帶的上、中和下段各 3 次），記錄到環節動物環唇沙蠶（*Cheiloneris* sp.），總個體數有 13 隻（表 2.11-7），為耐污能力強的沙岸常見物種。本季調查結果與歷年結果相比，鹽寮沙質海岸潮間帶的物種多樣性低，而環唇沙蠶亦常見於過去的調查紀錄中。

B.岩礁環境

本季於民國 101 年 5 月 25 日進行潮間帶岩礁環境底棲無脊椎動物調查，在澳底測站共紀錄到 4 大類 22 種底棲動物(表 2.11-8)，包括軟體動物 18 種、節肢動物 3 種、環節動物 1 種及扁蟲 1 種，總個體數為 339 隻。生物豐富度的部分與之前調查結果相似，以黑齒牡蠣（*Saccostrea mordax*）最多，共 113 隻；其次為黑瘤海蜷（*Batillaria sordida*）共 106 隻；就空間分佈而言，上述優勢物種黑齒牡蠣主要分布於低潮位，而黑瘤海蜷則多分布於中高潮位;各樣框的物種多樣性及數量以距離低潮線 50m 的樣框記錄到 12 種共 87 隻個體最多。而鹽寮測站，共記錄到 2 大類 13 種底棲動物，分別為軟體動物 9 種共 76 隻與節肢動物 4 種共 26 隻。生物豐富度的部分，以黑齒牡蠣為主（共 63 隻），而主要分布在低潮線及距離低潮線 5m 的樣框中。

群聚結構的分析結果(表 2.11-11)顯示，澳底潮間帶底棲無脊椎動物群聚的歧異度指數(H')介於 0~2.40，優勢性指數(D)介於 0.30~0.85，均勻度指數(E)則介於 0.25~1.00。澳底潮間帶樣區底質環境較為複雜，其中，中高潮位的潮池及石塊提供生物良好的棲息躲避的環境，本季的物種記錄與過去紀錄相似，但物種數稍多。鹽寮地區潮間帶底棲無脊椎動物群聚的歧異度指數(H')介於 0.72~1.84，優勢性指數(D)介於 0.31~0.68，均勻度指數(E)則介於 0.66~0.92(表 2.11-8)。鹽寮潮間帶窄，而底質由岩礁構成，環境較為單調，少有生物躲避的棲地。過去兩季（100 年 12 月及 101 年

2月）鹽寮潮間帶的物種組成以固著的牡蠣為主，而本季除了固著性的牡蠣外，在高潮位亦有記錄到玉黍螺等較小的軟體動物，可能與海岸拍擊程度有關，相較於前兩季受東北季風影響而沿岸浪大，本季（5月）鹽寮潮間帶受海浪影響較小，在高潮位的樣框記錄到4種常見的玉黍螺。

②亞潮帶

A.沙質環境

本季於民國101年5月25日進行鹽寮海域亞潮帶沙質環境底棲無脊椎動物調查，紀錄到2大類10種底棲無脊椎動物，包括軟體動物6種及節肢動物4種，總個體數為92隻（表2.11-9）。就生物豐富度而言，以普通文蛤（*Meretrix meretrix*）的相對豐度為59.78%較多。群聚結構分析結果（表2.11-11）顯示，歧異度指數(H')介於 0~2.01，優勢性指數(D)介於 0.36~1.00，均勻度指數(E)則介於0.62~0.71。歷年各季調查資料顯示，亞潮帶沙質環境的物種空間分布非常不均勻，底棲無脊椎動物的物種與數量變動明顯，可能與沙質環境的變動及干擾頻繁，或者與底棲生物的季節性變動有關。

B.岩礁環境

本季(101年5月25日)於淺礁海域(121◦55'89"E, 25◦02'54"N)及大礁海域（121。55'49"E, 25。03'07"N）進行亞潮帶岩礁底棲無脊椎動物調查。在大礁南側水深5 m測站，共紀錄5大類12種底棲無脊椎動物（表2.11-10），包括海綿動物1種，刺絲胞動物1種，苔蘚動物1種，軟體動物6種及棘皮動物3種。就豐富度而言，大礁水深 5 m 測站總覆蓋率 28.85%，以瘤菟葵（*Palythoa tuberculosa*）的覆蓋率21.10%為最多。大礁南側水深10 m測站的生態調查共紀錄6大類14種底棲無脊椎動物（表2.11-10），包括海綿動物1種，刺絲胞動物1種，苔蘚動物2種、軟體動物6

種、棘皮動物 3 種及環節動物 1 種。就豐富度而言，大礁水深 10 m 測站總覆蓋率為 8.60%，以蕩皮參（*Holothuria leucospilota*）覆蓋率 1.80%為最多。群聚結構分析結果（表 2.11-11）顯示，大礁南側水深 5 m 測站的底棲無脊椎動物覆蓋率為 4.30~14.25%（平均 7.21%），種數為 4~6 種（平均 5 種），歧異度指數(H')介於 0.41~2.13（平均 1.41），優勢性指數(D)介於 0.29~0.89（平均 0.53），均勻度指數(E)介於 0.20~0.82（平均 0.59）；大礁南側水深 10 m 測站的底棲無脊椎動物覆蓋率為 0.90~3.00%（平均 2.15%），種數為 3~6（平均 5 種），歧異度指數(H')介於 1.53~2.45（平均 1.93），優勢性指數(D)介於 0.20~0.42（平均 0.31），均勻度指數(E)介於 0.79~0.97（平均 0.91）。本季與 97~101 年調查結果比較，大礁水深 5 m 監測站底棲無脊椎動物的覆蓋率、種數、種歧異度指數及均勻度指數等各項指數值大致與歷年調查結果相似（歷年調查結果的 95%信賴區間分別為：覆蓋率＝0~22.89%，物種數＝2~11，物種歧異度指數＝0.57~2.75，優勢性指數＝0.06~0.86 及均勻度指數＝0.24~1.05）。大礁水深 10 m 監測站底棲無脊椎動物的各項指數值也與歷年調查結果相似（歷年調查結果的 95%信賴區間分別為：覆蓋率＝0~11.41%，種數＝2~10，種歧異度指數＝1.24~2.97，優勢性指數＝0.10~0.51，均勻度指數＝0.66~1.03）。

淺礁南側水深 5 m 測站，共紀錄 4 大類 7 種底棲無脊椎動物（表 2.11-10），包括海綿動物 3 種、刺絲胞動物 1 種、棘皮動物 2 種及環節動物 1 種。就豐富度而言，淺礁南側水深 5 m 測站的底棲無脊椎動物總覆蓋率為 28.10%，以白尖紫叢海膽（*Echinostrephus aciculatus*）覆蓋率為 24.70%最多。淺礁南側水深 10 m 測站，共紀錄 4 大類 10 種底棲無脊椎動物（表 2.11-10），包括海綿動物 2 種、苔蘚動物 1 種、軟體動物 4 種及棘皮動物 3 種。就豐富度而言，淺礁南側水深 10 m 測站底棲無脊椎動物總覆蓋率為 10.05%，以白尖紫叢海膽覆蓋率為 4.70%最高。群聚結構分析結果（表 2.11-11）顯示，淺礁南側水深 5 m 測站的底棲無脊

椎動物覆蓋率為 3.90~11.50%（平均 7.03%），物種數 3~4（平均 4 種），歧異度指數(H')介於 0.34~1.37（平均 0.76），優勢性指數(D)介於 0.51~0.90（平均 0.74），均勻度指數(E)介於 0.21~0.68（平均 0.42）；淺礁南側水深 10 m 測站的覆蓋率為 1.70~3.60%（平均 2.51%），種數＝3~7（平均 5 種），歧異度指數(H')介於 1.11~2.67（平均 1.77），優勢性指數(D)介於 0.17~0.54（平均 0.37），均勻度指數(E)介於 0.70~0.95（平均 0.83）。本季與 97~101 年調查結果比較，淺礁水深 5 m 監測站底棲無脊椎動物的覆蓋率、種類數、種歧異度指數、優勢性指數及均勻度指數大致在 95%信賴區間範圍內，僅優勢性指數為 0.74 略高於歷年 95%信賴區間，在此測站記錄到大量的白尖紫叢海膽（歷年調查結果的 95%信賴區間分別為：覆蓋率＝0~20.44%，種數＝2~13，種歧異度指數＝0.63~3.00，優勢性指數＝0.14~0.69，均勻度指數＝0.47~0.83）。而淺礁水深 10 m 監測站底棲無脊椎動物的各項指數值與歷年調查結果相似（97~101 年調查結果的 95%信賴區間分別為：覆蓋率＝0~15.98%，種數＝0~12，種歧異度指數＝0.29~3.00，優勢性指數＝0.16~0.80，均勻度指數＝0.37~0.97）。

⑸魚類

①魚卵與仔稚魚

本季採樣於民國 101 年 5 月 3 日進行，海域 10 個測站的魚卵與仔稚魚密度如表 2.11-12 所示，垂直採樣的魚卵密度介於 0~7,120 個/1,000m^3，以測站 4 的密度最高。測站平均密度為 1,008 個/1,000m^3。仔稚魚密度介於 0~397 尾/1,000m^3，以測站 10 密度較高，平均密度約為 65 尾/1,000m^3。表層水平採樣的魚卵密度介於 28~2,120 個/1,000m^3，以測站 10 的密度為最高。測站平均密度為 409 個/1,000m^3。仔稚魚密度介於 5~119 尾/1,000m^3，以測站 5 密度較高，平均密度約為 39 尾/1,000m^3。魚卵密度以垂直採樣者較高於水平採樣者，而仔稚魚密度同樣以垂直採樣者較高於水平採樣者。本季調查全海域魚

卵及仔稚魚平均密度分別為 708 個/1,000m^3 及 52 尾/1,000m^3。仔稚魚出現之種類列如表 2.11-12 所示。

②成魚

本季於民國 101 年 5 月 9 日於鹽寮礁石區及澳底礁石區進行潛水調查。調查時之海底水溫約 23.6~24.0℃。以下分述鹽寮、澳底測站內的魚類調查所得結果（詳細魚種列於表 2.11-13）。

鹽寮礁石區的測站位於水深 5.6~10.4 公尺處，底質為起伏平坦之岩礁，其間具有 3 條小型砂溝及 1 區包圍沙地，偶有高約 1 公尺左右之散落大塊岩石。無大型之珊瑚礁與大型石珊瑚，在大礁岩旁生長 1 棵高約 15 公分的海扇，石珊瑚無泥沙覆蓋的狀況。海藻以褐藻較多，紅藻次多，生長狀況良好。調查過程共計錄到白尖紫叢海膽約 50 個，鑲嵌於岩礁中，另有鋸巾海膽 3 個。可見黑蝶貝 5 顆及藍指海星 5 隻。水中懸浮物少，海底少見垃圾堆積在礁沙交界處。海流微弱，能見度約 6~8 公尺。平均水溫約為 24.0℃。

澳底礁石區測站位於水深 6.6~12.6 公尺處，底質為起伏較大之岩礁礁盤，其間有 1 區礁岩包圍礁石區，間有高約 1~2 公尺之散落大塊岩石。無大型之珊瑚礁與大型石珊瑚，在大礁旁生長 3 棵高約 15~30 公分的海扇，石珊瑚無泥沙覆蓋的狀況。海藻以褐藻及紅藻最多，生長狀況良好。調查過程共記錄到高 20~30 公分，直徑 20~40 公分的馬桶海綿 10 個。白尖紫叢海膽豐度高，其在礁石上造成許多的凹洞；鋸巾海膽 1 個。可見黑蝶貝約 50 顆、藍指海星 2 個。水中懸浮物少，礁沙交界處及礁溝底部的海底，少見垃圾堆積。不過見到有廢棄漁網成團纏繞在岩礁的珊瑚上。海流微弱，能見度約 5~6 公尺。平均水溫約為 23.6℃。

在鹽寮礁石區共記錄到 20 科 57 種 2,007 尾魚類，其中以隆頭魚科的 18 種為最多，其次為雀鯛科及粗皮鯛科，各記錄到 12 種及 4 種。在澳底礁石區共記錄到 23 科 59 種 1,450 尾魚類，其中以隆頭魚

科的 18 種為最多，其次為蝴蝶魚科及雀鯛科，各記錄到 7 種及 6 種。

綜合在鹽寮礁石區與澳底礁石區共記錄到 30 科 59 屬 83 種，合計 3,457 尾魚類，魚種數較多的科分別為隆頭魚科（23 種）、雀鯛科（12 種）及蝴蝶魚科（7 種）。就單一魚種所出現之數量而言，鹽寮礁石區以霓虹雀鯛約 1,050 尾（整群數量估計）為最多，亦即最具優勢，數量次多的種類為斑鰭光鰓雀鯛（300 尾）。澳底礁石區同樣以霓虹雀鯛約 650 尾為最多，其次為斑鰭光鰓雀鯛約 280 尾。

棲息在鹽寮礁石區及澳底礁石區的魚類間的相似性指數值（Cz 值）為 56.90%。在群聚歧異指數方面，鹽寮礁石區為 2.81，澳底礁石區為 3.22；將鹽寮及澳底 2 區合併計算，為 3.13。本季以霓虹雀鯛、斑鰭光鰓雀鯛為出現較大的魚群。

⑹大型海藻

①潮間帶

本季（101 年 5 月 25 日）於澳底測站的調查結果，潮間帶自低潮線至高潮線之海蝕平台大型海藻種類共記錄綠藻 5 屬 9 種，褐藻 1 屬 1 種及紅藻 5 屬 5 種等 15 種（表 2.11-14），以低潮線附近有較多的種類與較高的覆蓋率，尤其是以石蓴（*Ulva* spp.）為主要的優勢種；另外，部分冬季可見到的藻種，僅荷葉紫菜（*Porphyra crispata*）零星散布於潮間帶。水深 3 公尺以淺的海藻種類則記錄 62 種，包括綠藻 9 屬 15 種，褐藻 8 屬 8 種，紅藻 26 屬 39 種（未含無節珊瑚藻）（表 2.11-14）。本測站潮間帶海蝕平台的海藻種類與生物量因進入海藻生長季節，海藻種類明顯較上季增加，生物量也較上季（101 年 2 月）升高，與去年同季（100 年 5 月）相似，低潮線附近以裂片石蓴為較優勢的藻種，高潮線則以石蓴為主要的藻種組成，潮下帶藻種群聚組成則較潮間帶豐富（表 2.11-15）。

本季（101 年 5 月 25 日）於鹽寮測站的潮間帶，共記錄綠藻 3 屬 6 種，褐藻 1 屬 1 種及紅藻 3 屬 3 種等 10 種（表 2.11-14）。亞

潮帶水深 3 公尺水域則發現海藻種類 55 種（含無節珊瑚藻一種），其中綠藻 9 屬 14 種，褐藻 7 屬 7 種，紅藻 24 屬 34 種(表 2.11-14)。鹽寮測站海藻的種類與生物量雖均較上季(101 年 2 月)明顯增加，但呈現出不均勻的塊狀分布情況，主要是因為可供海藻附著的岩礁底質散布於沙地所致；低潮線附近仍可發現少數的荷葉紫菜生長。

②亞潮帶

本季於 101 年 5 月 25 日進行亞潮帶潛水調查。調查結果顯示，各調查地點的海藻種類與覆蓋率均較上季（101 年 2 月）明顯增加，藻種組成仍以表覆型的海藻較佔優勢，如太平洋寬珊藻（*Mastophora pacifica*）及耳殼藻（*Peyssonnelia* spp.）等，但大礁與淺礁兩處調查地點水深 10 米可發現有較多的匍扇藻(*Lobophora vareigata*)聚集；各測站的海藻總平均覆蓋率變化略有差異，介於 19.58~27.60%之間，以大礁水深 10 公尺最高（表 2.11-16）。其中，大礁南面（澳底外海）共記錄了綠藻 2 屬 2 種，褐藻 2 屬 2 種，紅藻 12 屬 13 種（未包括無節珊瑚藻）等 17 種海藻，種類數較上季明顯增加。水深 5 公尺的海藻種類最多，優勢藻種以貝狀耳殼藻(Peyssonnelia conchicola)及太平洋寬珊藻為主，平均覆蓋率為 6.68%和 5.59%。而水深 10 公尺處的優勢藻藻種則為貝狀耳殼藻、太平洋寬珊藻和匍扇藻，平均覆蓋率依序為 8.93%、8.63%及 5.78%。

淺礁（鹽寮外海）的海藻種類則記錄了褐藻 2 屬 2 種，紅藻 7 屬 8 種（未包括無節珊瑚藻）等 10 種海藻（表 2.11-16）。水深 5 公尺處以紅羽凹頂藻（*Laurencia brongniartii*）和貝狀耳殼藻為主要優勢藻種，平均覆蓋率為分別為 9.64%和 5.21%。而水深 10 公尺處，則以匍扇藻及貝狀耳殼藻較為常見，平均覆蓋率分別為 8.59%及 5.44%，其餘藻類則零星散佈於礁石上。

(7)珊瑚

本季（101 年 5 月 25 日）於淺礁海域（121。55'89"E, 25。02'54"N）

及大礁海域（121。55'49"E, 25。03'07"N）進行珊瑚群聚調查，結果如表2.11-17所示。大礁及淺礁二調查區域的珊瑚群聚都以團塊形、板葉形及表覆形的石珊瑚類為主。其中以菊珊瑚科（Faviidae）的種類最為優勢，其他珊瑚包括屬於軸孔珊瑚科（Acroporidae）、蓮珊瑚科（Agariciidae）、微孔珊瑚科（Poritidae）、蕈珊瑚科（Fungiidae）、樹珊瑚科（Dendrophylliidae）、鹿角珊瑚科（Pocilloporidae）及軟珊瑚科（Alcyoniidae）等的種類皆有發現。珊瑚種類組成與歷年調查結果相似。

珊瑚群聚的分析結果如表2.11-18所示。大礁南側水深5 m測站珊瑚群聚的覆蓋率介於5.10~28.70%（平均14.26%），每一調查線的珊瑚種數5~10種（平均8種），群體數6~14株（平均11株），種歧異度指數(H')介於2.25~3.25（平均2.85），優勢性指數(D)介於0.11~0.22（平均0.16），均勻度指數(E)介於0.94~0.97（平均0.95）；大礁水深10 m測站珊瑚群聚的覆蓋率介於1.85~5.50%（平均3.78%），每一調查線的珊瑚種數4~5種（平均5種），群體數4~6株（平均5株），種歧異度指數(H')介於1.92~2.25（平均2.02），優勢性指數(D)介於0.22~0.28（平均0.26），均勻度指數(E)介於0.96~1.00（平均0.98）。本季與91~101年調查結果比較，各項指數則皆在95%信賴區間範圍內（大礁水深10 m監測站珊瑚各項指數歷年調查結果的95%信賴區間分別為：覆蓋率＝0~15.62%，種數＝0~21，群體數＝0~23，種歧異度指數＝1.01~3.83，優勢性指數＝0.06~0.42，均勻度指數＝0.81~0.99；大礁水深5 m監測站珊瑚各項指數歷年調查結果的95%信賴區間分別為：覆蓋率＝5.52~20.39%，種數＝1~22，群體數＝6~27，種歧異度指數＝2.07~4.03，優勢性指數＝0.03~0.28，均勻度指數＝0.80~1.01）。

淺礁南側水深5 m測站的珊瑚覆蓋率介於8.70~18.50%（平均12.81%），每一調查線的珊瑚種數6~8種（平均7種），群體數9~16株（平均13株），種歧異度指數(H')介於2.41~2.91（平均2.63），優勢性指數(D)介於0.14~0.20（平均0.18），均勻度指數(E)介於0.93~0.97（平均0.96）；淺礁水深10 m測站的珊瑚覆蓋率介於7.00~21.80%（平均14.00%）

之間，每一調查線的珊瑚種數 5~10 種（平均 8 種），群體數 9~21 株（平均 15 株），種歧異度指數(H')介於 2.20~3.13（平均 2.68），優勢性指數(D)介於 0.13~0.23(平均 0.18)，均勻度指數(E)介於 0.92~0.96 (平均 0.94)。本季與歷年（91~101 年）調查結果比較顯示，淺礁水深 10 m 的 B1 及 B2 監測站的珊瑚覆蓋率、群體數及種歧異度皆低於 B3 及 B4 測站，顯示該區珊瑚分布的空間異質性高，但是四測站各項指數的平均值皆在歷年調查結果的 95%信賴區間內（歷年調查結果的 95%信賴區間分別為：覆蓋率＝9.12~25.77%，種數＝7~19，群體數＝12~26，種歧異度指數＝2.70~3.91，優勢性指數＝0.08~0.17，均勻度指數＝0.85~0.97）。而淺礁水深 5 m 監測站珊瑚的各項指數值與歷年調查結果相似（歷年調查結果的 95%信賴區間分別為：覆蓋率＝10.01~22.01%，種數＝6~19，群體數＝12~26，種歧異度指數＝2.60~3.89，優勢性指數＝0.08~0.18，均勻度指數＝0.85~0.98）。根據本季大礁與淺礁海域水深 5 m 及 10 m 監測站珊瑚群聚的調查結果，大部分測站各項指數皆在歷年 95%信賴區間內，並未呈現異常變動。整體而言本季鹽寮海域的珊瑚群聚都在合理變動範圍之內。

表2.11-1 核四廠附近海域生態環境因子101年第2季分析結果

採樣日期：101年5月3日

測站 Station No.	水深 Depth (m)	亞硝酸鹽 Nitrite-N (μg/L)	硝酸鹽 Nitrate-N (μg/L)	磷酸鹽 Phosphate-P (μg/L)	矽酸鹽 Silicate-Si (μg/L)	總氮 TN (mg/L)	總磷 TP (mg/L)	葉綠素*a* Chl. *a* (μg/L)	基礎生產力 Primary Production (μgC/L/hr)
1	0	0.91	17.34	ND	66.87	0.03	0.03	0.13	0.31
	3	0.91	4.40	ND	66.87	0.03	0.03	0.13	0.31
	B	0.91	14.43	ND	70.88	0.05	0.02	0.13	0.45
2	0	1.22	63.53	ND	480.14	0.08	0.02	0.17	1.26
	3	ND	15.82	ND	81.58	0.03	0.02	0.19	0.66
	B	1.22	19.83	ND	70.88	0.05	0.03	0.46	1.01
3	0	1.83	79.51	ND	520.26	0.10	0.02	0.50	1.57
	3	ND	14.85	ND	66.87	0.03	0.03	0.25	0.56
	B	ND	14.63	ND	66.87	0.03	0.02	0.31	0.69
4	0	1.52	49.51	ND	239.40	0.07	0.02	0.21	0.75
	3	ND	17.86	ND	74.90	0.04	0.05	0.19	0.75
	B	ND	13.01	ND	69.55	0.06	0.03	0.23	0.52
5	0	0.91	39.03	ND	251.44	0.07	0.03	0.31	0.90
	3	ND	16.89	ND	82.92	0.04	0.03	0.23	0.52
	B	ND	8.80	ND	57.51	0.03	0.03	0.15	0.35
6	0	1.52	69.25	ND	457.40	0.10	0.12	0.44	1.37
	3	ND	31.03	ND	216.66	0.05	0.04	0.25	0.75
	B	ND	9.67	ND	60.18	0.03	0.02	0.23	0.79
7	0	1.22	76.47	ND	510.90	0.10	0.02	0.40	0.85
	3	ND	16.47	ND	86.93	0.04	0.03	0.25	1.90
	B	ND	13.56	ND	72.22	0.03	0.04	0.21	0.86
8	0	0.91	42.26	ND	330.35	0.06	0.02	0.48	1.78
	3	ND	23.27	ND	176.54	0.05	0.02	0.50	1.66
	B	ND	24.66	ND	86.93	0.05	0.02	0.42	0.97
9	0	ND	20.35	ND	66.87	0.04	0.02	0.15	0.85
	3	ND	13.88	ND	64.20	0.04	0.02	0.13	0.39
	B	ND	15.82	ND	60.18	0.03	0.12	0.08	0.23
10	0	ND	18.41	ND	161.83	0.04	0.04	0.15	0.58
	3	ND	19.58	ND	72.22	0.05	0.03	0.27	0.68
	B	ND	13.66	ND	69.55	0.04	0.03	0.38	1.00
最小值		ND	4.40	ND	57.51	0.03	0.02	0.08	0.23
最大值		1.83	79.51	ND	520.26	0.10	0.12	0.50	1.90
平均值		1.19	26.59	ND	158.66	0.05	0.03	0.26	0.84
		ND<0.42	ND<0.7	ND<0.93					

註1: B為底層

註2:採樣時間10:37~13:00, 滿潮時間13:06及潮高1.08 m, 乾潮時間06:30及20:05潮高-0.5 m及-0.24 m

註3: 測值若為ND值, 則採用0計算平均值

表2.11-2 核四廠附近海域0公尺表水層浮游植物 101年第2季細胞數含量

採樣日期：101年5月3日

Taxa / Stations		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均	%
Diatoms	矽藻												
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	0	0	88	0	0	0	0	44	0	0	13.2	0.11
Achnanthes hustedtii	平滑曲殼藻	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Achnanthes lanceolata	披針曲殼藻	22	0	0	0	44	0	0	0	0	0	6.6	0.05
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	176	748	616	484	440	704	572	704	396	418	525.8	4.35
Actinoptychus undulatus	波狀輻襯藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Amphora bigibba	雙凸雙眉藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻	0	88	0	0	0	0	0	0	22	22	13.2	0.11
Amphora costata	中肋雙眉藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphora crassa	粗雙眉藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphora lineolata	線狀雙眉藻	0	44	0	0	0	0	0	0	0	22	6.6	0.05
Amphora ovalis	卵形雙眉藻	0	0	0	88	44	0	88	0	0	0	22	0.18
Arachnodiscus ehrenbergi	蛛網藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asterionella japonica	日本星桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asterionella kariana	加拉星桿藻	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	17.6	0.15
Asterolampra marylandica	南方星紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asteromphalus cleveanus	長卵面星腊藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asteromphalus sarcophagus	星腊藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	22	0	0	0	0	0	88	0	0	0	11	0.09
Bacteriastrum delicatulum	優美輻桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Bacteriastrum varians	變異輻桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Biddulphia aurita	長耳盒形藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.02
Biddulphia granulata	顆粒盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Biddulphia mobiliensis	活動盒形藻	0	132	0	0	0	0	0	0	44	0	17.6	0.15
Biddulphia obtusa	鈍頭盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2.2	0.02
Biddulphia pulchella	美麗盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Biddulphia reticulata	網狀盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.02
Biddulphia rhombus	菱形盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Caloneis sp.	美壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Campylodiscus sp.	馬鞍藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.02
Cerataulina compacta	緊密角管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros affine	窄隙角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	6.6	0.05
Chaetoceros costatum	中肋角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros curvisetus	旋鏈角刺藻	110	3212	28292	1232	616	330	1892	1628	946	0	3825.8	31.65
Chaetoceros danicum	丹麥角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	30.8	0.25
Chaetoceros didymum	雙突角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros didymum var. *anglica*	雙突角刺藻 英國變種	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros laeve	平滑角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros lauderi	羅氏角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros lorenzianum	洛氏角刺藻	0	0	352	0	0	0	0	220	0	0	57.2	0.47
Chaetoceros pelagicum	海洋角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros peruvianum	祕魯角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros radicans	根狀角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros seiracanthum	鏈刺角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Climacodium frauenfeldianum	佛朗梯形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Climacosphenia moniligera	串珠梯楔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Cocconeis heteroidea	異向卵形藻	0	0	0	0	0	22	88	0	66	0	17.6	0.15
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	0	44	132	0	44	22	132	0	22	66	46.2	0.38
Cocconeis pseudomarginata	假邊卵形藻	0	0	0	44	0	0	44	0	0	44	13.2	0.11
Cocconeis scutellum	盾卵形藻	22	0	0	660	44	0	132	44	44	22	96.8	0.80
Cocconeis sublittoralis	近岸卵形藻	0	44	88	88	44	198	308	2728	220	0	371.8	3.08
Corethron hystrix	小環毛藻	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Coscinodiscus eccentricus	離心列圓篩藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Coscinodiscus lineatus	線形圓篩藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Coscinodiscus marginatus	寬邊圓篩藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.02
Coscinodiscus radiatus	輻射列圓篩藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Coscinodiscus subtilis	細弱圓篩藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Cyclotella sp.	小環藻	0	44	88	0	0	44	44	132	0	22	37.4	0.31
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻	0	44	44	0	44	0	132	176	0	0	44	0.36
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	0	0	44	0	0	0	88	88	22	0	24.2	0.20
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	0	0	0	44	88	0	44	0	0	22	19.8	0.16
Cymbella sp.	橋彎藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Diploneis bombus	蜂腰雙壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.02
Diploneis schmidtii	施氏雙壁藻	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Diploneis smithii	史密斯雙壁藻	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	8.8	0.07
Diploneis suborbicularis	近圓雙壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ditylum sol	太陽雙尾藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Donkina sp.	亞形殼藻	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Eucampia cornuta	長角彎角藻	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	8.8	0.07
Eucampia zoodiacus	短角彎角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Eunotia sp.	短縫藻	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	8.8	0.07
Fragilaria oceanica	海洋脆桿藻	0	44	44	44	0	0	0	0	0	0	13.2	0.11
Fragilaria striatula	條紋脆桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Frustularia sp.	肋縫藻	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	4.4	0.04
Gomphonema intricatum	中間異極藻	0	88	88	88	264	264	880	88	88	110	195.8	1.62
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	0	0	220	0	44	88	132	0	44	0	52.8	0.44
Grammatophora oceanica	海洋斑條藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	22	0.18

表2.11-2 核四廠附近海域0公尺表水層浮游植物 101年第2季細胞數含量（續1）

採樣日期：101年5月3日

Taxa / Stations		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均	%
Gyrosigma rectum	布紋藻	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Hantzschia sp.	菱板藻	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Hemiaulus hauckii	霍克半管藻	0	0	0	0	0	0	0	132	132	88	35.2	0.29
Hemiaulus sinensis	中華半管藻	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	8.8	0.07
Lauderia borealis	北方勞德藻	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	17.6	0.15
Leptocylindrus danicus	丹麥細柱藻	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	110	0.91
Licmophora abbreviata	短紋楔形藻	0	0	44	0	0	0	0	0	22	66	13.2	0.11
Licmophora ehrenbergii	愛氏楔形藻	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	8.8	0.07
Mastogloia brauni	扁中節胸隔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Mastogloia minuta	細微胸隔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Mastogloia rostrata	突刺胸隔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Melosira varians	變異直鏈藻	0	0	0	0	0	132	264	0	0	0	39.6	0.33
Navicula cancellata	方格舟形藻	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	8.8	0.07
Navicula crucicula	十字舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula delicatula	舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula digito-radiata	掌狀放射舟形藻	0	44	132	0	0	88	176	132	0	0	57.2	0.47
Navicula directa	直舟形藻	22	132	176	132	0	22	220	132	44	0	88	0.73
Navicula directa var. *remota*	直舟形藻疏邊變種	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	4.4	0.04
Navicula genuflexa	屈膝舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula howeana	豪納舟形藻	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Navicula marina	海洋舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula membranacea	膜狀舟形藻	44	44	0	0	0	88	44	88	0	22	33	0.27
Navicula mutica	截端舟形藻	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	4.4	0.04
Navicula northumbrica	諾森舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula pupula	瞳孔舟形藻	0	0	44	0	0	0	44	0	0	0	8.8	0.07
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	0	0	0	0	0	0	44	0	22	0	6.6	0.05
Neidium sp.	長篦藻	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	4.4	0.04
Nitzschia acuminata	尖錐菱形藻	66	0	88	0	0	110	0	88	0	0	35.2	0.29
Nitzschia delicatissima	柔弱菱形藻	0	0	132	0	0	0	0	0	44	0	17.6	0.15
Nitzschia dissipata	分散菱形藻	0	0	0	0	0	66	0	0	22	0	8.8	0.07
Nitzschia distans	稀紋菱形藻	0	0	88	0	0	22	0	0	44	0	15.4	0.13
Nitzschia pacifica	太平洋菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Nitzschia panduriformis	琴式菱形藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.02
Nitzschia seriata	成列菱形藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.02
Nitzschia sigma	彎菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Nitzschia sigmoides	擬螺形菱形藻	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Nitzschia vitrea	透明菱形藻	0	0	44	0	0	22	0	0	0	0	6.6	0.05
Paralia sulcata	具槽直鏈藻	0	0	572	0	0	0	0	0	66	0	63.8	0.53
Pinnularia angulata	有角羽紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Plagiogramma vanheurckii	范氏斜斑藻	0	0	0	0	0	0	0	352	0	0	35.2	0.29
Pleurosigma affine	近緣斜紋藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.02
Pleurosigma elongatum	長斜紋藻	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Pleurosigma naviculaceum	舟形斜紋藻	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	4.4	0.04
Pleurosigma rostratum	端嘴斜紋藻	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Podocystis spathulata	佛焰足囊藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhabdonema arcuatum	彎桿線藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhabdonema adriaticum	亞得里亞海桿線藻	0	0	0	0	0	0	0	0	660	154	81.4	0.67
Rhaphoneis sp.	縫舟藻	0	0	44	44	44	22	88	0	22	0	26.4	0.22
Rhizosolenia alata	異根管藻	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	4.4	0.04
Rhizosolenia bergonii	柏戈根管藻	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Rhizosolenia delicatula	柔弱根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhizosolenia fragilissima	脆根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	8.8	0.07
Rhizosolenia hebetata f. *semispina*	鈍棘根管藻半刺變種	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	8.8	0.07
Rhizosolenia imbricata	覆瓦根管藻	132	0	0	0	0	0	0	0	44	0	17.6	0.15
Rhizosolenia setigera	剛毛根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhizosolenia stolterfothii	斯托根管藻	0	0	0	0	0	0	0	572	220	0	79.2	0.66
Rhizosolenia styliformis	筆尖形根管藻	0	44	0	0	0	0	44	88	0	0	17.6	0.15
Skeletonema costatum	骨條藻	0	0	0	0	0	264	440	0	0	0	70.4	0.58
Stauroneis sp.	輻節藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.02
Stephanopyxis palmeriana	掌狀冠蓋藻	0	0	308	0	0	0	0	0	0	0	30.8	0.25
Striatella sp.	條紋藻	0	0	0	44	0	0	44	0	0	0	8.8	0.07
Surirella elegans	長雙菱藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Surirella fluminensis	流水雙菱藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Synedra ulna	肘狀針桿藻	22	0	88	0	88	242	176	220	22	132	99	0.82
Synedra undulata	波邊針桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Tabellaris sp.	平板藻	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	6.6	0.05
Thalassionema nitzschioides	菱形海線藻	66	308	220	616	176	0	176	264	22	132	198	1.64
Thalassiosira eccentricus	離心海鏈藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.02
Thalassiosira hyalina	透明海鏈藻	44	44	0	88	0	0	44	44	0	22	28.6	0.24
Thalassiosira leptopus	圓篩海鏈藻	44	220	88	88	88	132	88	528	66	0	134.2	1.11
Thalassiosira nordenskioldi	諾登海鏈藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Thalassiosira rotula	圓海鏈藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Thalassiosira subtilis	細弱海鏈藻	0	0	0	0	0	0	88	0	0	44	13.2	0.11
Thalassiothrix frauenfeldii	伏恩海毛藻	44	44	220	132	44	0	924	572	44	176	220	1.82
Thalassiothrix longissima	長海毛藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.02
Trachyneis aspera	粗紋藻	0	0	0	0	0	22	0	0	22	44	8.8	0.07
Triceratium reticulum	網紋三角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Trybliptychus cocconeiformis	卵形褶盤藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

表2.11-2 核四廠附近海域0公尺表水層浮游植物 101年第2季細胞數含量（續2）

採樣日期：101年5月3日

Taxa / Stations		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均	%
Dinoflagellates	渦鞭毛藻												
Ceratium furca	長叉狀角藻	0	0	0	0	44	88	0	44	0	22	19.8	0.16
Ceratium kofoidii	小角藻	0	0	0	0	220	22	0	0	0	0	24.2	0.20
Ceratium inflexum	角藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Ceratium macroceros	長角角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium teres	圓柱角藻	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	8.8	0.07
Ceratium trichoceros	三叉角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium tripos	三角角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Dinophysis homunculus	鰭藻	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	8.8	0.07
Dinophysis mitra	鰭藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.02
Gonyaulax sp.	膝溝藻	0	0	0	44	0	22	44	0	0	0	11	0.09
Ornithocercus magnificus	鳥尾藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.04
Podolampas palmipes	掌狀足甲藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.02
Prorocentrum balticum	原甲藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Prorocentrum micans	海洋原甲藻	0	44	44	44	44	0	88	0	0	0	26.4	0.22
Prorocentrum minimum	原甲藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.02
Protogonyaulax sp.	膝溝藻	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	17.6	0.15
Protoperidinium rectum	多甲藻	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	8.8	0.07
Protoperidinium sp.	多甲藻	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	8.8	0.07
Silicoflagellates	矽質鞭毛藻藻												
Dictyocha fibula	小等刺矽鞭藻	0	44	88	0	0	0	88	132	88	0	44	0.36
Distephanus speculum	六異刺矽鞭藻	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	6.6	0.05
Blue-green algae	藍綠藻												
Trichodesmium thiebautii	鐵氏束毛藻	0	8624	0	23012	4664	4510	3300	1496	0	0	4560.6	37.73
Total (cells/l)	總計（註）	948	14,500	32,700	27,600	7,580	7,930	12,700	11,000	3,710	2,370	12,100	
Total (cells/l)	總計	948	14480	32654	27596	7578	7932	12686	11016	3714	2374	12087	100
Diatoms (cells/l)	總計（註）	925	5,770	32,500	4,270	2,340	3,110	9,160	9,340	3,600	2,340	7,330	
Diatoms (cells/l)	總計	925	5766	32475	4272	2337	3108	9159	9336	3595	2342	7326	60.61

註：含量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-3 核四廠附近海域3公尺表水層浮游植物 101年第2季細胞數含量

採樣日期：101年5月3日

Taxa / Stations		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均	%
Diatoms	矽藻												
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	88	0	0	0	0	0	0	44	0	22	15.4	0.22
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.06
Achnanthes hustedtii	平滑曲殼藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Achnanthes lanceolata	披針曲殼藻	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	4.4	0.06
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	308	484	704	440	704	242	308	572	88	198	404.8	5.88
Actinoptychus undulatus	波狀輻襞藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphora bigibba	雙凸雙眉藻	0	0	220	0	0	22	0	0	0	22	26.4	0.38
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻	22	0	44	0	0	0	22	0	0	0	8.8	0.13
Amphora costata	中肋雙眉藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Amphora crassa	粗雙眉藻	22	0	0	0	0	0	22	0	22	0	6.6	0.10
Amphora lineolata	線狀雙眉藻	22	0	0	44	0	0	0	0	0	0	6.6	0.10
Amphora ovalis	卵形雙眉藻	44	44	0	0	0	0	0	44	0	22	15.4	0.22
Arachnodiscus ehrenbergi	蛛網藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asterionella japonica	日本星桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asterionella kariana	加拉星桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asterolampra marylandica	南方星紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asteromphalus cleveanus	長卵面星盤藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asteromphalus sarcophagus	星盤藻	22	0	44	0	0	0	0	0	0	0	6.6	0.10
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Bacteriastrum delicatulum	優美輻桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	6.6	0.10
Bacteriastrum varians	變異輻桿藻	0	0	0	176	22	44	0	0	0	198	44	0.64
Biddulphia aurita	長耳盒形藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Biddulphia granulata	顆粒盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4.4	0.06
Biddulphia mobiliensis	活動盒形藻	44	0	0	0	0	0	0	0	22	66	13.2	0.19
Biddulphia obtusa	鈍頭盒形藻	0	0	0	0	22	0	0	0	44	0	6.6	0.10
Biddulphia pulchella	美麗盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Biddulphia reticulata	網狀盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	4.4	0.06
Biddulphia rhombus	菱形盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Caloneis sp.	美壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Campylodiscus sp.	馬鞍藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Cerataulina compacta	緊密角管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	8.8	0.13
Chaetoceros affine	窄隙角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros costatum	中肋角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros curvisetus	旋鏈角刺藻	2816	1584	3740	7568	946	110	132	968	220	4972	2305.6	33.47
Chaetoceros danicum	丹麥角刺藻	0	0	0	0	0	66	0	88	0	0	15.4	0.22
Chaetoceros didymum	雙突角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros didymum var. *anglica*	雙突角刺藻 英國變種	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros laeve	平滑角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros lauderi	羅氏角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	11	0.16
Chaetoceros lorenzianum	洛氏角刺藻	44	0	0	176	44	66	132	220	22	198	90.2	1.31
Chaetoceros pelagicum	海洋角刺藻	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	13.2	0.19
Chaetoceros peruvianum	祕魯角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros radicans	根狀角刺藻	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.2	0.35
Chaetoceros seiracanthum	鏈刺角刺藻	242	0	176	264	66	66	0	0	0	0	81.4	1.18
Climacodium frauenfeldianum	佛朗梯形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Climacosphenia moniligera	串珠梯楔藻	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	8.8	0.13
Cocconeis heteroidea	異向卵形藻	110	0	88	44	0	0	0	0	0	0	24.2	0.35
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	0	0	0	0	22	22	0	132	0	0	17.6	0.26
Cocconeis pseudomarginata	假邊卵形藻	0	44	132	0	22	0	0	44	22	0	26.4	0.38
Cocconeis scutellum	盾卵形藻	946	44	44	44	44	0	22	44	88	44	132	1.92
Cocconeis sublittoralis	近岸卵形藻	88	0	176	88	88	0	638	5324	88	616	710.6	10.32
Corethron hystrix	小環毛藻	0	0	44	0	0	0	22	0	0	0	6.6	0.10
Coscinodiscus eccentricus	離心列圓篩藻	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.06
Coscinodiscus lineatus	線形圓篩藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Coscinodiscus marginatus	窄邊圓篩藻	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.06
Coscinodiscus radiatus	輻射列圓篩藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2.2	0.03
Coscinodiscus subtilis	細弱圓篩藻	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.06
Cyclotella sp.	小環藻	0	0	44	44	0	0	0	88	0	0	17.6	0.26
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻	110	44	0	0	0	22	66	44	22	22	33	0.48
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	22	88	0	0	0	0	44	44	0	0	19.8	0.29
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2.2	0.03
Cymbella sp.	橋彎藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Diploneis bombus	蜂腰雙壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Diploneis schmidtii	施氏雙壁藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Diploneis smithii	史密斯雙壁藻	22	0	0	0	0	0	22	44	0	0	8.8	0.13
Diploneis suborbicularis	近圓雙壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ditylum sol	太陽雙尾藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Donkina sp.	亞形殼藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Eucampia cornuta	長角彎角藻	0	0	88	0	0	0	0	0	0	44	13.2	0.19
Eucampia zoodiacus	短角彎角藻	0	0	44	0	0	176	0	0	0	0	22	0.32
Eunotia sp.	短縫藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Fragilaria oceanica	海洋脆桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.03
Fragilaria striatula	條紋脆桿藻	0	0	0	0	0	0	264	0	0	88	35.2	0.51
Frustularia sp.	肋縫藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Gomphonema intricatum	中間異極藻	66	88	44	88	66	22	66	132	44	66	68.2	0.99
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	0	0	0	0	66	0	66	176	66	22	39.6	0.57
Grammatophora oceanica	海洋斑條藻	154	0	0	0	0	0	22	0	0	0	17.6	0.26
Gyrosigma rectum	布紋藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Hantzschia sp.	菱板藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Hemiaulus hauckii	霍克半管藻	0	0	44	0	0	44	0	0	22	0	11	0.16
Hemiaulus sinensis	中華半管藻	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	8.8	0.13
Lauderia borealis	北方勞德藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.06
Leptocylindrus danicus	丹麥細柱藻	132	0	0	0	0	0	0	0	0	154	28.6	0.42
Licmophora abbreviata	短紋楔形藻	22	0	44	0	22	0	22	0	0	22	13.2	0.19
Licmophora ehrenbergii	愛氏楔形藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Mastogloia braunii	扁中節胸隔藻	22	0	0	44	0	0	0	0	0	0	6.6	0.10
Mastogloia minuta	細微胸隔藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.03
Mastogloia rostrata	突刺胸隔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Melosira varians	變異直鏈藻	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	4.4	0.06
Navicula cancellata	方格舟形藻	0	44	0	44	0	0	0	88	0	44	22	0.32
Navicula crucicula	十字舟形藻	0	0	44	0	0	0	0	0	0	22	6.6	0.10
Navicula delicatula	舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula digito-radiata	掌狀放射舟形藻	0	44	0	0	44	0	88	0	22	44	24.2	0.35
Navicula directa	直舟形藻	66	0	176	88	44	22	110	220	44	0	77	1.12

表2.11-3 核四廠附近海域3公尺表水層浮游植物 101年第2季細胞數含量（續）

採樣日期：101年5月3日

Taxa / Stations		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均	%
Navicula directa var. *remota*	直舟形藻疏邊變種	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Navicula genuflexa	屈膝舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula howeana	豪納舟形藻	0	44	0	0	0	0	22	0	0	0	6.6	0.10
Navicula marina	海洋舟形藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Navicula membranacea	膜狀舟形藻	44	0	0	88	0	0	0	44	22	22	22	0.32
Navicula mutica	截端舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula northumbrica	諾森舟形藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	4.4	0.06
Navicula pupula	瞳孔舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula rhynchocephala	喙頭舟形藻	0	0	88	0	0	0	0	0	22	0	11	0.16
Neidium sp.	長篦藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Nitzschia acuminata	尖錐菱形藻	44	0	0	0	22	0	22	0	0	0	8.8	0.13
Nitzschia delicatissima	柔弱菱形藻	88	88	0	0	0	0	0	264	0	0	44	0.64
Nitzschia dissipata	分散菱形藻	66	0	0	0	0	0	44	0	44	0	15.4	0.22
Nitzschia distans	稀紋菱形藻	110	0	0	0	22	0	22	0	22	0	17.6	0.26
Nitzschia pacifica	太平洋菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Nitzschia panduriformis	琴式菱形藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Nitzschia seriata	成列菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.03
Nitzschia sigma	彎菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	4.4	0.06
Nitzschia sigmoides	擬螺形菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Nitzschia vitrea	透明菱形藻	176	0	44	0	44	0	0	132	0	22	41.8	0.61
Paralia sulcata	具槽直鏈藻	0	220	0	0	0	0	0	0	264	0	48.4	0.70
Pinnularia angulata	有角羽紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Plagiogramma vanheurckii	范氏斜斑藻	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0	26.4	0.38
Pleurosigma affine	近緣斜紋藻	22	44	0	0	22	0	22	44	0	0	15.4	0.22
Pleurosigma elongatum	長斜紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Pleurosigma naviculaceum	舟形斜紋藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Pleurosigma rostratum	尾喙斜紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Podocystis spathulata	佛焰足囊藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhabdonema arcuatum	彎桿線藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhabdonema adriaticum	亞得里亞海桿線藻	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.16
Rhaphoneis sp.	縫舟藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Rhizosolenia alata	異根管藻	0	0	0	44	0	0	0	0	22	22	8.8	0.13
Rhizosolenia bergonii	柏戈根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhizosolenia delicatula	柔弱根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhizosolenia fragilissima	脆根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	8.8	0.13
Rhizosolenia hebetata f. *semispina*	鈍棘根管藻半刺變種	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.06
Rhizosolenia imbricata	覆瓦根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhizosolenia setigera	剛毛根管藻	0	0	0	132	0	0	0	0	22	22	17.6	0.26
Rhizosolenia stolterfothii	斯托根管藻	66	396	88	572	220	66	88	528	198	396	261.8	3.80
Rhizosolenia styliformis	筆尖形根管藻	44	0	88	0	22	22	22	88	0	0	28.6	0.42
Skeletonema costatum	骨條藻	110	0	0	0	66	0	0	0	0	0	17.6	0.26
Stauroneis sp.	輻節藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Stephanopyxis palmeriana	掌狀冠蓋藻	0	0	220	0	0	0	0	0	0	242	46.2	0.67
Striatella sp.	條紋藻	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	4.4	0.06
Surirella elegans	長雙菱藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Surirella fluminensis	流水雙菱藻	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	4.4	0.06
Synedra ulna	肘狀針桿藻	88	0	88	0	66	0	0	220	0	110	57.2	0.83
Synedra undulata	波邊針桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Tabellaris sp.	平板藻	0	264	352	0	0	0	0	0	0	0	61.6	0.89
Thalassionema nitzschioides	菱形海線藻	110	220	352	220	44	44	132	44	66	308	154	2.24
Thalassiosira eccentricus	離心海鏈藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Thalassiosira hyalina	透明海鏈藻	44	0	0	0	110	88	88	220	66	220	83.6	1.21
Thalassiosira leptopus	圓篩海鏈藻	176	88	352	176	44	88	154	308	66	176	162.8	2.36
Thalassiosira nordenskioldi	諾登海鏈藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Thalassiosira rotula	圓海鏈藻	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Thalassiosira subtilis	細弱海鏈藻	110	0	0	176	0	0	88	88	0	110	57.2	0.83
Thalassiothrix frauenfeldii	伏恩海毛藻	374	44	616	1892	66	220	594	484	66	176	453.2	6.58
Thalassiothrix longissima	長海毛藻	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	8.8	0.13
Trachyneis aspera	粗紋藻	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	4.4	0.06
Triceratium reticulum	網紋三角藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Trybliptychus cocconeiformis	卵形褶盤藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Dinoflagellates	渦鞭毛藻												
Ceratium furca	長叉狀角藻	0	44	0	0	44	0	22	0	0	0	11	0.16
Ceratium kofoidii	小角藻	0	0	0	0	66	44	0	0	22	0	13.2	0.19
Ceratium inflexum	角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium macroceros	長角角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium teres	圓柱角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium trichoceros	三叉角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium tripos	三角角藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	22	4.4	0.06
Dinophysis hominculus	鎧藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Dinophysis mitra	鎧藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Gonyaulax sp.	膝溝藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	4.4	0.06
Ornithocercus magnificus	鳥尾藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Podolampas palmipes	掌狀足甲藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Prorocentrum balticum	原甲藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Prorocentrum micans	海洋原甲藻	22	0	44	0	44	0	0	0	0	0	11	0.16
Prorocentrum minimum	原甲藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Protogonyaulax sp.	膝溝藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Protoperidinium rectum	多甲藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Protoperidinium sp.	多甲藻	0	0	0	0	88	44	0	44	0	0	17.6	0.26
Silicoflagellates	矽質鞭毛藻藻												
Dictyocha fibula	小等刺矽鞭藻	44	0	0	0	66	0	22	0	22	110	26.4	0.38
Distephanus speculum	六異刺矽鞭藻	0	0	0	0	22	0	22	0	0	22	6.6	0.10
Blue-green algae	藍綠藻												
Trichodesmium thiebautii	錐氏束毛藻	0	2156	2068	0	0	0	506	0	0	0	473	6.87
Total (cells/l)	總計（註）	7,750	6,160	10,500	12,600	3,420	1,610	4,300	11,400	1,920	9,270	6,890	
Total (cells/l)	總計	7745	6162	10519	12588	3415	1612	4297	11404	1923	9272	6888	100
Diatoms (cells/l)	總計（註）	7,680	3,960	8,410	12,600	3,020	1,500	3,730	11,400	1,880	9,100	6,320	
Diatoms (cells/l)	總計	7679	3962	8407	12588	3019	1502	3725	11360	1879	9096	6316	91.70

註：含量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-4 核四廠附近海域底層浮游植物
101年第2季細胞數含量

採樣日期：101年5月3日

Taxa / Stations		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均	%
Diatoms	矽藻												
Achnanthes brevipes	短柄曲殼藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	66	8.8	0.13
Achnanthes crenulata	波緣曲殼藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Achnanthes hustedtii	平滑曲殼藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Achnanthes lanceolata	披針曲殼藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.03
Achnanthes linearis	線形曲殼藻	440	286	154	264	484	462	418	352	286	220	336.6	5.03
Actinoptychus undulatus	波狀輻網藻	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Amphora bigibba	雙凸雙眉藻	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Amphora coffeaeformis	咖啡形雙眉藻	44	22	0	0	0	0	44	44	22	22	19.8	0.30
Amphora costata	中肋雙眉藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Amphora crassa	粗雙眉藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Amphora lineolata	線狀雙眉藻	44	0	0	0	0	0	22	0	22	0	8.8	0.13
Amphora ovalis	卵形雙眉藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.03
Arachnodiscus ehrenbergi	蛛網藻	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	4.4	0.07
Asterionella japonica	日本星桿藻	0	528	0	0	0	0	0	0	0	154	68.2	1.02
Asterionella kariana	加拉星桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Asterolampra marylandica	南方星紋藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.03
Asteromphalus cleveanus	長卵面星腊藻	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Asteromphalus sarcophagus	星腊藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Bacillaria paradoxa	奇異棍形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Bacteriastrum delicatulum	優美輻桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	6.6	0.10
Bacteriastrum varians	變異輻桿藻	0	0	0	0	0	0	44	0	0	66	11	0.16
Biddulphia aurita	長耳盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Biddulphia granulata	顆粒盒形藻	0	0	22	22	0	0	0	132	0	44	22	0.33
Biddulphia mobiliensis	活動盒形藻	0	44	44	0	0	0	0	88	0	0	17.6	0.26
Biddulphia obtusa	鈍頭盒形藻	0	22	0	0	0	0	0	0	44	0	6.6	0.10
Biddulphia pulchella	美麗盒形藻	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	13.2	0.20
Biddulphia reticulata	網狀盒形藻	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	13.2	0.20
Biddulphia rhombus	菱形盒形藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Caloneis sp.	美壁藻	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Campylodiscus sp.	馬鞍藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Cerataulina compacta	緊密角管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros affine	窄隙角刺藻	132	0	0	0	0	0	0	0	110	0	24.2	0.36
Chaetoceros costatum	中肋角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	50.6	0.76
Chaetoceros curvisetus	旋鏈角刺藻	4928	330	1452	748	176	594	572	4972	5808	5390	2497	37.34
Chaetoceros danicum	丹麥角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros didymum	雙突角刺藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Chaetoceros didymum var. *anglica*	雙突角刺藻 英國變種	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	15.4	0.23
Chaetoceros laeve	平滑角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	8.8	0.13
Chaetoceros lauderi	羅氏角刺藻	88	0	0	0	0	0	0	0	0	110	19.8	0.30
Chaetoceros lorenzianum	洛氏角刺藻	132	0	0	66	66	0	0	132	44	154	59.4	0.89
Chaetoceros pelagicum	海洋角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros peruvianum	祕魯角刺藻	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Chaetoceros radicans	根狀角刺藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Chaetoceros seiracanthum	鏈刺角刺藻	0	0	66	0	0	0	0	0	0	286	35.2	0.53
Climacodium frauenfeldianum	佛朗梯形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	4.4	0.07
Climacosphenia moniligera	串珠梯楔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Cocconeis heteroidea	異向卵形藻	88	0	0	0	0	0	44	44	0	0	17.6	0.26
Cocconeis placentula	扁圓卵形藻	44	22	22	44	0	0	88	220	66	22	52.8	0.79
Cocconeis pseudomarginata	假邊卵形藻	176	22	22	0	0	22	22	44	110	44	46.2	0.69
Cocconeis scutellum	盾卵形藻	132	682	550	0	66	0	44	0	66	44	158.4	2.37
Cocconeis sublittoralis	近岸卵形藻	88	0	154	22	0	22	418	4708	0	484	589.6	8.82
Corethron hystrix	小環毛藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Coscinodiscus eccentricus	離心列圓篩藻	0	44	0	22	0	0	0	0	22	0	8.8	0.13
Coscinodiscus lineatus	線形圓篩藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Coscinodiscus marginatus	寬邊圓篩藻	44	0	0	22	0	0	0	0	0	0	6.6	0.10
Coscinodiscus radiatus	輻射列圓篩藻	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	4.4	0.07
Coscinodiscus subtilis	細弱圓篩藻	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	4.4	0.07
Cyclotella sp.	小環藻	0	0	0	0	0	0	22	44	110	0	17.6	0.26
Cymbella affinis	邊緣橋彎藻	0	0	22	0	0	0	22	0	22	22	8.8	0.13
Cymbella laevis	平滑橋彎藻	44	0	0	0	0	0	22	0	0	0	6.6	0.10
Cymbella tumida	膨脹橋彎藻	0	22	0	44	22	0	0	0	0	0	8.8	0.13
Cymbella sp.	橋彎藻	0	0	0	22	66	0	0	0	0	0	8.8	0.13
Diploneis bombus	蜂腰雙壁藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Diploneis schmidtii	施氏雙壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.03
Diploneis smithii	史密斯雙壁藻	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Diploneis suborbicularis	近圓雙壁藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Ditylum sol	太陽雙尾藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Donkina sp.	亞形殼藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Eucampia cornuta	長角管角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	13.2	0.20
Eucampia zoodiacus	短角管角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Eunotia sp.	短縫藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Fragilaria oceanica	海洋脆桿藻	0	0	0	44	0	0	22	264	44	0	37.4	0.56
Fragilaria striatula	條紋脆桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Frustularia sp.	肋縫藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Gomphonema intricatum	中間異極藻	0	110	22	22	0	0	88	44	0	44	33	0.49
Gomphonema olivaceum	橄欖形異極藻	0	0	22	22	0	0	0	0	0	66	11	0.16
Grammatophora oceanica	海洋斑條藻	88	22	198	22	0	0	88	176	22	0	61.6	0.92
Gyrosigma rectum	布紋藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Hantzschia sp.	菱板藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Hemiaulus hauckii	霍克半管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Hemiaulus sinensis	中華半管藻	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8	0.13
Lauderia borealis	北方勞德藻	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.2	0.20
Leptocylindrus danicus	丹麥細柱藻	0	0	0	0	0	0	0	176	0	330	50.6	0.76
Licmophora abbreviata	短紋楔形藻	88	22	0	0	0	22	88	0	22	22	26.4	0.39
Licmophora ehrenbergii	愛氏楔形藻	0	0	22	0	0	0	22	132	0	0	17.6	0.26
Mastogloia braunii	扁中節胸隔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Mastogloia minuta	細微胸隔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Mastogloia rostrata	突刺胸隔藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Melosira varians	變異直鏈藻	0	0	176	0	0	0	0	132	0	0	30.8	0.46
Navicula cancellata	方格舟形藻	0	0	0	22	0	0	66	88	22	0	19.8	0.30
Navicula crucicula	十字舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula delicatula	舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.03
Navicula digito-radiata	掌狀放射舟形藻	44	0	0	22	0	22	44	0	22	22	17.6	0.26
Navicula directa	直舟形藻	88	132	0	0	0	0	88	220	22	44	59.4	0.89

表2.11-4 核四廠附近海域底層浮游植物
101年第2季細胞數含量（續）

採樣日期：101年5月3日

Taxa / Stations		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均	%
Navicula directa var. *remota*	直舟形藻疏邊變種	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula genuflexa	屈膝舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2.2	0.03
Navicula howeana	豪納舟形藻	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	4.4	0.07
Navicula marina	海洋舟形藻	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	2.2	0.03
Navicula membranacea	膜狀舟形藻	132	0	88	22	0	0	66	132	88	66	59.4	0.89
Navicula mutica	截端舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Navicula northumbrica	諾森舟形藻	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Navicula pupula	瞳孔舟形藻	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Navicula rhynchocephala	嘴頭舟形藻	0	0	0	0	0	0	0	44	22	0	6.6	0.10
Neidium sp.	長篦藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Nitzschia acuminata	尖錐菱形藻	0	0	0	0	0	22	44	0	0	0	6.6	0.10
Nitzschia delicatissima	柔弱菱形藻	176	0	0	0	0	0	44	0	0	0	22	0.33
Nitzschia dissipata	分散菱形藻	0	0	22	0	0	0	22	0	0	22	6.6	0.10
Nitzschia distans	稀紋菱形藻	44	22	0	22	0	0	0	0	0	0	8.8	0.13
Nitzschia pacifica	太平洋菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	528	0	0	52.8	0.79
Nitzschia panduriformis	琴式菱形藻	0	22	0	0	0	0	0	44	0	0	6.6	0.10
Nitzschia seriata	成列菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	13.2	0.20
Nitzschia sigma	彎菱形藻	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	4.4	0.07
Nitzschia sigmoides	擬螺形菱形藻	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Nitzschia vitrea	透明菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.03
Paralia sulcata	具槽直鏈藻	0	0	0	0	0	66	0	0	132	0	19.8	0.30
Pinnularia angulata	有角羽紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2.2	0.03
Plagiogramma vanheurckii	范氏斜斑藻	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	19.8	0.30
Pleurosigma affine	近線斜紋藻	0	22	0	22	0	0	22	44	0	0	11	0.16
Pleurosigma elongatum	長斜紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Pleurosigma naviculaceum	舟形斜紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2.2	0.03
Pleurosigma rostratum	端嘴斜紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Podocystis spathulata	佛焰足囊藻	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Rhabdonema arcuatum	彎桿線藻	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.4	1.05
Rhabdonema adriaticum	亞得里亞海桿線藻	0	0	0	0	0	0	0	0	198	0	19.8	0.30
Rhaphoneis sp.	縫舟藻	0	0	0	0	0	0	44	220	0	44	30.8	0.46
Rhizosolenia alata	異根管藻	0	0	22	0	0	0	0	0	0	176	19.8	0.30
Rhizosolenia bergonii	柏戈根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhizosolenia delicatula	柔弱根管藻	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	15.4	0.23
Rhizosolenia fragilissima	脆根管藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rhizosolenia hebetata f. *semispina*	鈍棘根管藻半刺變種	0	0	0	0	0	22	0	0	22	0	4.4	0.07
Rhizosolenia imbricata	覆瓦根管藻	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Rhizosolenia setigera	剛毛根管藻	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	4.4	0.07
Rhizosolenia stolterfothii	斯托根管藻	0	44	484	440	176	66	0	1320	110	198	283.8	4.24
Rhizosolenia styliformis	筆尖形根管藻	0	0	0	22	22	110	0	0	22	0	17.6	0.26
Skeletonema costatum	骨條藻	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	6.6	0.10
Stauroneis sp.	輻節藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Stephanopyxis palmeriana	掌狀冠盤藻	0	0	154	0	0	0	0	0	22	88	26.4	0.39
Striatella sp.	條紋藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Surirella elegans	長雙菱藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2.2	0.03
Surirella fluminensis	流水雙菱藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Synedra ulna	肘狀針桿藻	0	44	0	0	0	0	66	88	0	44	24.2	0.36
Synedra undulata	波邊針桿藻	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	4.4	0.07
Tabellaria sp.	平板藻	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	13.2	0.20
Thalassionema nitzschioides	菱形海線藻	176	286	88	154	66	66	44	396	396	374	204.6	3.06
Thalassiosira eccentricus	離心海鏈藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Thalassiosira hyalina	透明海鏈藻	0	44	154	66	66	44	22	132	44	198	77	1.15
Thalassiosira leptopus	圓篩海鏈藻	88	132	264	66	154	66	132	1232	154	220	250.8	3.75
Thalassiosira nordenskioldi	諾登海鏈藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Thalassiosira rotula	圓海鏈藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Thalassiosira subtilis	細弱海鏈藻	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.8	0.13
Thalassiothrix frauenfeldii	伏恩海毛藻	132	44	22	110	220	132	528	836	594	726	334.4	5.00
Thalassiothrix longissima	長海毛藻	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	4.4	0.07
Trachyneis aspera	粗紋藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Triceratium reticulum	網紋三角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Trybliophychus cocconeiformis	卵形褶盤藻	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Dinoflagellates	渦鞭毛藻												
Ceratium furca	長叉狀角藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Ceratium kofoidii	小角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium inflexum	角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium macroceros	長角角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ceratium teres	圓柱角藻	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Ceratium trichoceros	三叉角藻	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	2.2	0.03
Ceratium tripos	三角角藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Dinophysis homunculus	鎧藻	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Dinophysis mitra	鎧藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Gonyaulax sp.	膝溝藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Ornithocercus magnificus	鳥尾藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Podolampas palmipes	掌狀足甲藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Prorocentrum balticum	原甲藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Prorocentrum micans	海洋原甲藻	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	2.2	0.03
Prorocentrum minimum	原甲藻	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	4.4	0.07
Protogonyaulax sp.	膝溝藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Protoperidinium rectum	多甲藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Protoperidinium sp.	多甲藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Silicoflagellates	矽質鞭毛藻藻												
Dictyocha fibula	小等刺矽鞭藻	44	0	0	44	0	22	66	44	66	88	37.4	0.56
Distephanus speculum	六異刺矽鞭藻	44	0	44	0	22	0	0	44	44	66	26.4	0.39
Blue-green algae	藍綠藻												
Trichodesmium thiebautii	鐵氏束毛藻	0	0	2486	0	0	0	0	0	0	0	248.6	3.72
Total (cells/l)	總計（註）	8,800	3,210	7,040	2,560	2,270	1,850	3,640	17,300	9,450	10,800	6,690	
Total (cells/l)	總計	8801	3214	7043	2556	2271	1854	3637	17300	9447	10812	6,688	100
Diatoms (cells/l)	總計（註）	8,800	3,210	4,560	2,560	2,270	1,850	3,640	17,300	9,450	10,800	6,440	
Diatoms (cells/l)	總計	8801	3214	4557	2556	2271	1854	3637	17300	9447	10812	6439	96.28

註：含量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-5 核四廠附近海域浮游動物101年第2季種類與個體量

採樣日期：101年5月3日

	測站	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
流量計讀數	起始	62802	76932	73829	70515	65769	67383	75388	72216	64223	69023
	結束	62828	76985	73851	70521	65882	67423	75404	72229	64272	69042
每網過濾水量（m^3）		10.35	21.10	8.76	2.39	45.00	15.93	6.37116	5.17657	19.5117	7.56576
分割比例（n-1）		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
每網總生物量（g/haul）		0.8	0.9	1.17	0.63	0.88	1.17	0.8	1.21	1.12	0.27
總單位生物量（g/1000m^3）		77.27	42.64	133.56	263.69	19.56	73.46	125.566	233.745	57.4015	35.6871
每網總個體量（ind./haul）		76	388	300	176	628	400	164	156	224	484
總單位個體量（ind./1000m^3）註一		7,340	16,700	33,600	52,300	13,400	24,700	24,300	27,800	11,300	60,400
總單位個體量（ind./1000m^3）		7341	16679	33560	52319	13357	24736	24328	27818	11327	60404
垂直分佈											
Appendicularia	尾蟲	386	2843	5936	3348	711	1005	2511	0	615	2643
Ciliophora	纖毛蟲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forminifera	有孔蟲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noctiluca	夜光蟲	386	3222	7306	5023	2134	1758	3139	4636	2870	6344
Radiolaria	放射蟲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thaliacea	海桶	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0
Amphipoda	端腳類	0	0	457	0	89	0	0	0	0	0
Chaetognatha	毛顎類	0	0	0	1674	444	251	628	773	0	2115
Cladocera	枝角類	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0
Other Decapoda	其他十足類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heteropoda	異足類	0	0	0	0	178	251	0	0	0	0
Otstrocoda	介形類	773	758	1826	6697	2489	6027	3767	3864	1845	36480
Polychaeta	多毛類	0	190	0	0	0	0	0	0	0	529
Pteropoda	翼足類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copepoda	橈足類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calanoida	哲水蚤	4636	5876	9132	0	1600	8036	6278	9273	2870	3172
Cyclopoida	劍水蚤	0	379	0	0	89	251	1256	0	0	0
Harpacticoida	猛水蚤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
copepodite	橈足幼生	0	948	457	3348	1245	1256	628	0	410	1057
nauplius	無節幼體	0	0	457	0	0	251	628	0	0	0
Poecilostomatoida	岐口水蚤	1159	569	913	1674	356	1256	1256	773	410	1057
Ctenophora	櫛水母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medusa	水母	0	0	1370	1674	178	251	628	0	205	0
Siphonophore	管水母	0	0	0	0	267	251	628	0	0	0
Euphausiacea	磷蝦類	0	0	0	0	178	0	0	0	0	529
Luciferinae	螢蝦	0	0	0	0	178	0	628	0	205	0
Mollusca	軟體動物	0	758	457	5023	889	753	0	4636	615	1586
Mysidacea	糠蝦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sergestidae	櫻蝦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barncle nauplins	藤壺幼生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crab larvae	蟹幼生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Echinodermata larva	棘皮幼生	0	379	4109	15068	711	753	1883	3091	0	1586
Shrimp larvae	蝦幼生	0	190	457	1674	1333	2260	0	0	1230	2115
Fish egg	魚卵	0	474	228	7115	200	126	314	773	51	793
Fish larvae	仔稚魚	0	95	0	0	0	0	157	0	0	397
Other	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註一總單位個體量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-5 核四廠附近海域浮游動物101年第2季種類與個體量（續）

採樣日期：101年5月3日

	測站	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
流量計讀數	起始	62828	76985	73851	70521	65882	67423	75404	72229	64272	69042
	結束	64223	78530	75388	72216	67383	69023	76932	73829	65769	70515
每網過濾水量（m3）		555.49	615.22	612.03	674.95	597.69	637.12	608.45	637.12	596.10	586.55
分割比例（n-1）		8	8	16	16	32	32	8	16	16	8
每網總生物量（g/haul）		1.7	1.15	1.81	5.07	3.42	4.81	2.31	2.37	1.44	4.28
總單位生物量（g/1000m3）		3.06	1.87	2.96	7.51	5.72	7.55	3.80	3.72	2.42	7.30
每網總個體量（ind./haul）		4064	3744	5312	15168	18112	14208	3072	2992	7184	8672
總單位個體量（ind./1000m^3）註一		5,740	2,990	8,090	8,210	19,700	19,200	1,890	4,040	8,860	5,320
總單位個體量（ind./1000m3）		5741	2991	8091	8205	19671	19235	1885	4037	8856	5321
水平分佈											
Appendicularia	尾蟲	461	130	340	142	857	201	276	50	644	27
Ciliophora	纖毛蟲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forminifera	有孔蟲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noctiluca	夜光蟲	3255	1027	1595	1612	2998	3767	158	1281	4187	1623
Radiolaria	放射蟲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thaliacea	海樽	0	0	0	593	0	402	0	0	0	409
Amphipoda	端腳類	0	13	0	47	0	0	0	50	0	0
Chaetognatha	毛顎類	58	13	52	47	268	0	0	50	161	27
Cladocera	枝角類	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
Other Decapoda	其他十足類	0	0	0	24	0	50	0	25	0	0
Heteropoda	異足類	0	0	26	47	642	804	0	0	0	0
Otstrocoda	介形類	43	39	366	379	5247	3767	131	352	81	614
Polychaeta	多毛類	0	0	0	24	0	0	13	0	54	0
Pteropoda	翼足類	0	0	26	24	0	100	13	0	0	0
Copepoda	橈足類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calanoida	哲水蚤	907	312	1150	450	2570	3164	302	1030	1262	409
Cyclopoida	劍水蚤	0	52	26	0	0	0	26	25	0	0
Harpacticoida	猛水蚤	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
copepodite	橈足幼生	101	0	157	119	1499	1005	0	50	456	82
nauplius	無節幼體	43	52	78	24	54	352	26	75	81	14
Poecilostomatoida	岐口水蚤	144	65	209	142	161	151	92	0	107	68
Ctenophora	櫛水母	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medusa	水母	14	26	340	379	54	301	13	151	107	95
Siphonophore	管水母	14	13	0	95	0	0	0	0	0	14
Euphausiacea	磷蝦類	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0
Luciferinae	螢蝦	0	13	0	24	268	0	13	50	134	0
Mollusca	軟體動物	14	325	183	332	1124	2210	302	176	322	218
Mysidacea	糠蝦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sergestidae	櫻蝦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barncle nauplins	藤壺幼生	0	13	52	71	54	151	13	100	0	0
Crab larvae	蟹幼生	0	0	0	24	0	0	0	25	0	0
Echinodermata larva	棘皮幼生	14	351	3346	2608	1446	2562	39	452	54	273
Shrimp larvae	蝦幼生	446	104	78	47	2088	50	13	25	859	95
Fish egg	魚卵	191	390	34	935	226	75	373	27	203	1314
Fish larvae	仔稚魚	34	52	5	16	117	24	79	17	10	38
Other	其他	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0

註一總單位個體量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-6 核四廠附近海域浮游動物101年第2季之最高,最低與平均含量

採樣日期：101年5月3日

		最高含量	最低含量	平均含量	平均百分比%
總單位生物量（g/1000m^3）		264	20	106	
總單位個體量（ind./1000m^3）註一		60,400	7,340	27,200	
總單位個體量（ind./1000m^3）		60404	7341	27187	100.00
垂直分佈					
Appendicularia	尾蟲	5936	0	2000	7.36
Ciliophora	纖毛蟲	0	0	0	0.00
Forminifera	有孔蟲	0	0	0	0.00
Noctiluca	夜光蟲	7306	386	3682	13.54
Radiolaria	放射蟲	0	0	0	0.00
Thaliacea	海樽	89	0	9	0.03
Amphipoda	端腳類	457	0	55	0.20
Chaetognatha	毛顎類	2115	0	589	2.16
Cladocera	枝角類	457	0	46	0.17
Other Decapoda	其他十足類	0	0	0	0.00
Heteropoda	異足類	251	0	43	0.16
Otstrocoda	介形類	36480	758	6453	23.73
Polychaeta	多毛類	529	0	72	0.26
Pteropoda	翼足類	0	0	0	0.00
Copepoda	橈足類	0	0	0	0.00
Calanoida	哲水蚤	9273	0	5087	18.71
Cyclopoida	劍水蚤	1256	0	197	0.73
Harpacticoida	猛水蚤	0	0	0	0.00
copepodite	橈足幼生	3348	0	935	3.44
nauplius	無節幼體	628	0	134	0.49
Poecilostomatoida	岐口水蚤	1674	356	942	3.47
Ctenophora	櫛水母	0	0	0	0.00
Medusa	水母	1674	0	431	1.58
Siphonophore	管水母	628	0	115	0.42
Euphausiacea	磷蝦類	529	0	71	0.26
Luciferinae	螢蝦	628	0	101	0.37
Mollusca	軟體動物	5023	0	1472	5.41
Mysidacea	糠蝦	0	0	0	0.00
Sergestidae	櫻蝦	0	0	0	0.00
Barncle nauplins	藤壺幼生	0	0	0	0.00
Crab larvae	蟹幼生	0	0	0	0.00
Echinodermata larva	棘皮幼生	15068	0	2758	10.15
Shrimp larvae	蝦幼生	2260	0	926	3.41
Fish egg	魚卵	7115	0	1007	3.71
Fish larvae	仔稚魚	397	0	65	0.24
Other	其他	0	0	0	0.00

註一總單位個體量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-6 核四廠附近海域浮游動物101年第2季之最高,最低與平均含量（續）

採樣日期：101年5月3日

		最高含量	最低含量	平均含量	平均百分比%
總單位生物量（g/1000m3）		7.55	1.87	4.59	
總單位個體量（ind./1000m^3）註一		19700	1890	8400	
總單位個體量（ind./1000m^3）		19671	1885	8403	100.00
水平分佈					
Appendicularia	尾蟲	857	27	313	3.72
Ciliophora	纖毛蟲	0	0	0	0.00
Forminifera	有孔蟲	0	0	0	0.00
Noctiluca	夜光蟲	4187	158	2150	25.59
Radiolaria	放射蟲	0	0	0	0.00
Thaliacea	海桶	593	0	140	1.67
Amphipoda	端腳類	50	0	11	0.13
Chaetognatha	毛顎類	268	0	68	0.81
Cladocera	枝角類	26	0	3	0.03
Other Decapoda	其他十足類	50	0	10	0.12
Heteropoda	異足類	804	0	152	1.81
Otstrocoda	介形類	5247	39	1102	13.11
Polychaeta	多毛類	54	0	9	0.11
Pteropoda	翼足類	100	0	16	0.19
Copepoda	橈足類	0	0	0	0.00
Calanoida	哲水蚤	3164	302	1156	13.75
Cyclopoida	劍水蚤	52	0	13	0.15
Harpacticoida	猛水蚤	25	0	3	0.03
copepodite	橈足幼生	1499	0	347	4.13
nauplius	無節幼體	352	14	80	0.95
Poecilostomatoida	岐口水蚤	209	0	114	1.36
Ctenophora	櫛水母	0	0	0	0.00
Medusa	水母	379	13	148	1.76
Siphonophore	管水母	95	0	14	0.16
Euphausiacea	磷蝦類	134	0	13	0.16
Luciferinae	螢蝦	268	0	50	0.60
Mollusca	軟體動物	2210	14	521	6.20
Mysidacea	糠蝦	0	0	0	0.00
Sergestidae	櫻蝦	0	0	0	0.00
Barncle nauplins	藤壺幼生	151	0	45	0.54
Crab larvae	蟹幼生	25	0	5	0.06
Echinodermata larva	棘皮幼生	3346	14	1114	13.26
Shrimp larvae	蝦幼生	2088	13	381	4.53
Fish egg	魚卵	1314	27	377	4.48
Fish larvae	仔稚魚	117	5	39	0.47
Other	其他	100	0	10	0.12

註一總單位個體量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-7 核四廠附近鹽寮海域潮間帶沙質環境101年第2季底棲無脊椎動物調查紀錄

調查時間：101年5月25日

學名	中名	A	B	C	總個體數	相對豐度(%)
Annelida	環節動物					
Cheiloneris sp.	環唇沙蠶	6	3	4	13	100.00
個體數合計		6	3	4	13	100
種類數合計		1	1	1	1	

註：樣本A為最低潮線，B及C分別代表與最低潮線之距離5 m , 10 m。每1採樣站分別採2次樣本，樣本大小為50 x 50 cm^2。

表2.11-8 核四廠附近鹽寮海域潮間帶岩礁環境101年第2季底棲無脊椎動物調查紀錄

鹽寮測站

調查時間：101年5月25日

學名	中名	I -1	I -2	II -1	II -2	III-1	III-2	總個體數	相對豐度(%)
Mollusca	軟體動物								
Notoacmea schrenckii	花青螺		1	2		1		4	3.92
Omphalius nigerrima	臍孔黑鐘螺				1	1		2	1.96
Nodilittorina pyramidalis	顆粒玉黍螺				1			1	0.98
Echinolittorina radiata	輻射玉黍螺		1					1	0.98
Littoraria undulata	波紋玉黍螺						1	1	0.98
Granulilittorina millegrana	台灣玉黍螺					1		1	0.98
Batillaria sordida	黑瘤海蜷						1	1	0.98
Nerita albicilla	漁舟蜑螺	2						2	1.96
Saccostrea mordax	黑齒牡蠣	8	25	13	12	3	2	63	61.76
Arthropoda	節肢動物								
Orchestia platensis	扁跳蝦		3		6		3	12	11.76
Chthamalus pilsbryi	皮氏小藤壺		4					4	3.92
Thalamita sp.	短槳蟹			3	1			4	3.92
Tetraclita squamosa	鱗笠藤壺		6					6	5.88
個體數合計		10	40	18	21	6	7	102	100
種類數合計		2	6	3	5	4	4	13	

註：採樣站：I為最低潮線，II為距離最低潮線5 m，III為距離最低潮線10 m。每1採樣站分別採2次樣本，樣本大小為50 x 50 cm^2。

表2.11-8 核四廠附近鹽寮海域潮間帶岩礁環境101年第2季底棲無脊椎動物調查紀錄（續）

澳底測站　　調查時間：101年5月25日

學名	中名	I-1	I-2	II-1	II-2	III-1	III-2	IV-1	IV-2	V-1	V-2	VI-1	VI-2	總個體數	相對豐度(%)
Mollusca	軟體動物														
Batillaria sordida	黑瘤海蜷									1		46	59	106	31.27
Cronia margariticola	稜結螺											4		4	1.18
Tenguella granulata	結螺	2	1	2		1								6	1.77
Notoacmea schrenckii	花青螺							1					1	2	0.59
Omphalius nigerrima	臍孔黑鐘螺											4		4	1.18
Cellana toreuma	花笠螺				3									3	0.88
Isognomon perna	網紋障泥蛤											1		1	0.29
Cypraea arabica	阿拉伯寶螺		1											1	0.29
Liolophura sp.	駝石鱉											5	3	8	2.36
Morula anaxares	白瘤結螺											1		1	0.29
Euplica scripta	花麥螺	2												2	0.59
Nerita albicilla	漁舟蜑螺					3			1			11		15	4.42
Mastonia aegle	秀珠左錐螺								1				1	2	0.59
Mancinella aculeata	鐵斑岩螺			2	3									5	1.47
Pusiostoma mendicaria	斑馬峨螺	2												2	0.59
Scutus antipodes	鴨嘴螺											1		1	0.29
Planaxis sulcatus	芝麻螺									1				1	0.29
Saccostrea mordax	黑齒牡蠣			40	52			7	14					113	33.33
Arthropoda	節肢動物														
Thalamita sp.	短槳蟹	1	8						1					10	2.95
Calcinus latens	隱伏硬殼寄居蟹											8		8	2.36
Orchestia platensis	扁跳蝦	7	10		12				4			4		37	10.91
Annelida	環節動物														
Cheiloneris sp.	沙蠶的一種		6									1		7	2.06
Platyhelminthes	扁蟲動物門														
Thysanozoon sp.	海扁蟲											1		1	0.29
個體數合計		14	26	44	70	4	0	8	21	2	0	87	64	339	100.00
種類數合計		5	5	3	4	2	0	2	5	2	0	12	4	22	

註：採樣站：I為最低潮線，II, III, IV, V, VI分別為距離最低潮線10 m, 20 m, 30 m, 40 m及50 m。每1採樣站分別採2次樣本，樣本大小為50 x 50 cm^2。

表2.11-9 核四廠附近鹽寮海域亞潮帶沙質環境101年第2季底棲無脊椎動物調查紀錄

		5 m		10 m		調查時間：101年5月25日	
學名	中名	A	B	C	D	總個體數	相對豐度(%)
Mollusca	軟體動物						
Meretrix meretrix	普通文蛤		17		38	55	59.78
Mactra chinensis	中華馬珂蛤		3		8	11	11.96
Oliva tricolor	三色橄螺		1			1	1.09
Cyclosunetta menstrualis	紫碟文蛤		1			1	1.09
Abrina lunella	月光唱片蛤				4	4	4.35
Hastula matheronian		1	1		1	3	3.26
Arthropoda	節肢動物						
Palaemon serrifer	鋸齒長臂蝦				2	2	2.17
Matuta victor	勝利黎明蟹		4		4	8	8.70
Thalamita sp.	短槳蟹			1	1	2	2.17
Portunus sanguinolentus	紅星梭子蟹		3		2	5	5.43
個體數合計		1	30	1	60	92	100
種類數合計		1	7	1	8	10	

註：樣本A, B位於水深5 m；C, D位於水深10 m。

表2.11-10 核四廠附近鹽寮海域亞潮帶岩礁環境101年第2季底棲無脊椎動物調查紀錄

大礁　　10 m　　5 m　　調查時間：100年5月25日

學名	中名	大礁測站 A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	覆蓋率(%) 10 m	5 m	相對豐度(%) 10 m	5 m
Porifera	海綿動物												
Adocia sp.	磯海綿							4.0			0.40		1.39
Auletta sp.	角叉海綿				5.0					0.50		5.81	
Cnidaria	刺絲胞動物												
Palythoa tuberculosa	瘤蒐葵				5.0	134.0	20.0	23.0	34.0	0.50	21.10	5.81	73.14
Bryozoa	苔蘚動物												
Reteporella graeffei	枝狀苔癬蟲			3.0						0.30		3.49	
Schizoporella sp.	裂管苔蘚蟲	3.0	3.0				2.0		4.0	0.60	0.60	6.98	2.08
Mollusca	軟體動物												
Serpulorbis imbricatus	大蛇螺					1.0					0.10		0.35
Tectus niloticus maximus	馬蹄鐘螺			2.0						0.20		2.33	
Conus miles	柳絲芋螺								2.0		0.20		0.69
Ovula ovum	海兔螺			3.0			4.0			0.30	0.40	3.49	1.39
Harpago chiragra	水字螺	6.0	4.0							1.00		11.63	
Phyllidiella cooraaburrama	古怪葉海蛞蝓		2.0							0.20		2.33	
Bursa granularis	果粒蛙螺							3.0			0.30		1.04
Vasum turbinellum	短拳螺								3.0		0.30		1.04
Drupella cornus	白結螺				1.0					0.10		1.16	
Astraea haematraga	白星螺	3.0		6.0	6.0			1.0		1.50	0.10	17.44	0.35
Echinodermata	棘皮動物												
Echinaster luzonicus	呂宋棘海星			6.0			2.0			0.60	0.20	6.98	0.69
Echinostrephus aciculatus	白尖紫叢海膽				3.0	3.0	7.0	20.0		0.30	3.00	3.49	10.40
Echinometra mathaei	梅氏長海膽					4.5	9.0	8.0			2.15		7.45
Holothuria leucospilota	蕩皮參	18.0								1.80		20.93	
Annelida	環節動物												
Sabella fusca	纓鰓蟲			7.0						0.70		8.14	
覆蓋率合計		3.00	0.90	2.70	2.00	14.25	4.40	5.90	4.30	8.60	28.85	100.00	100.00
種類數合計		4	3	6	5	4	6	6	4	14	12		

淺礁　　10 m　　5 m

學名	中名	淺礁測站 B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	覆蓋率(%) 10 m	5 m	相對豐度(%) 10 m	5 m
Porifera	海綿動物												
Adocia sp.	磯海綿					3.0	4.0				0.70		23.33
Clathria sp.	窗海綿			10.0			5.0		1.0	1.00	0.60	333.33	20.00
Haliclona sp.	蜂海綿	7.0	2.0	6.0		6.0	3.0	3.0		1.50	1.20	500.00	40.00
Cnidaria	刺絲胞動物												
Palythoa tuberculosa	瘤蒐葵								5.0		0.50		16.67
Bryozoa	苔蘚動物												
Schizoporella sp.	裂管苔蘚蟲	3.0								0.30		100.00	
Mollusca	軟體動物												
Trochus hanleyanus	細紋鐘螺	2.5								0.25		83.33	
Tectus niloticus maximus	馬蹄鐘螺		2.0							0.20		66.67	
Bolma modesta	塔星螺	2.0								0.20		66.67	
Astraea haematraga	白星螺	5.0	3.0		1.0					0.90		300.00	
Echinodermata	棘皮動物												
Echinaster luzonicus	呂宋棘海星	3.0		2.0					3.0	0.50	0.30	166.67	10.00
Diadema setosum	刺冠海膽				5.0					0.50		166.67	
Echinostrephus aciculatus	白尖紫叢海膽	6.0	10.0	18.0	13.0	42.0	27.0	72.0	106.0	4.70	24.70	1566.67	823.33
Annelida	環節動物												
Sabella fusca	纓鰓蟲							1.0			0.10		3.33
覆蓋率合計		2.85	1.70	3.60	1.90	5.10	3.90	7.60	11.50	10.05	28.10	3350.00	936.67
種類數合計		7	4	4	3	3	4	3	4	10	7		

註：樣本A1, A2, A3, A4位於水深10 m；A5, A6, A7, A8位於水深5 m；樣本B1, B2, B3, B4位於水深10 m；B5, B6, B7, B8位於水深5 m。

表2.11-11 核四廠附近鹽寮海域底棲動物101年第2季群聚結構調查結果

(S：種類數；H'：種歧異度指數；D：優勢性指數；λ：辛普森指數；E：均勻度指數。)

(—表示無意義)

潮間帶沙底	個體數	S	H'	D	λ	E
A	6	1	0.00	1.00	0.00	-
B	3	1	0.00	1.00	0.00	-
C	4	1	0.00	1.00	0.00	-
潮間帶岩礁						
鹽寮	個體數	S	H'	D	λ	E
I-1	10	2	0.72	0.68	0.32	0.72
I-2	40	6	1.71	0.43	0.57	0.66
II-1	18	3	1.12	0.56	0.44	0.71
II-2	21	5	1.61	0.42	0.59	0.69
III-1	6	4	1.79	0.33	0.67	0.90
III-2	7	4	1.84	0.31	0.69	0.92
澳底	個體數	S	H'	D	λ	E
I-1	14	5	1.98	0.31	0.68	0.85
I-2	26	5	1.90	0.30	0.70	0.82
II-1	44	3	0.53	0.83	0.17	0.33
II-2	70	4	1.14	0.58	0.42	0.57
III-1	4	2	0.81	0.63	0.38	0.81
III-2	0	0	0.00	-	-	-
IV-1	8	8	0.54	0.78	0.22	0.54
IV-2	21	5	1.47	0.49	0.51	0.63
V-1	2	2	1.00	0.50	0.50	1.00
V-2	0	0	0.00	-	-	-
VI-1	87	12	2.40	0.31	0.69	0.67
VI-2	64	4	0.5	0.85	0.15	0.25
亞潮帶沙底	個體數	S	H'	D	λ	E
A	1	1	0.00	1.00	0.00	-
B	30	7	2.01	0.36	0.64	0.71
C	1	1	0.00	1.00	0.00	-
D	60	8	1.85	0.43	0.57	0.62
亞潮帶岩礁	覆蓋率	S	H'	D	λ	E
大礁A1	3.00	4	1.57	0.42	0.58	0.79
A2	0.90	3	1.53	0.36	0.64	0.97
A3	2.70	6	2.45	0.20	0.80	0.95
A4	2.00	5	2.15	0.24	0.76	0.93
A5	14.25	4	0.41	0.89	0.11	0.20
A6	4.40	6	2.13	0.29	0.71	0.82
A7	5.90	6	2.03	0.29	0.71	0.79
A8	4.30	4	1.06	0.64	0.36	0.53
淺礁B1	2.85	7	2.67	0.17	0.83	0.95
B2	1.70	4	1.62	0.40	0.60	0.81
B3	3.60	4	1.68	0.36	0.64	0.84
B4	1.90	3	1.11	0.54	0.46	0.70
B5	5.10	3	0.83	0.70	0.30	0.53
B6	3.90	4	1.37	0.51	0.49	0.68
B7	7.60	3	0.34	0.90	0.10	0.21
B8	11.50	4	0.50	0.85	0.15	0.25

註1: 潮間帶沙質樣本A為最低潮線, B, C分別代表與最低潮線之距離為5 m, 10 m。

註2: 潮間帶岩礁樣本I為最低潮線, II, III, IV, V, VI分別代表與最低潮線之距離10 m, 20 m, 30 m, 40 m及50 m, 在鹽寮海域樣本II, III分別代表5 m, 10 m。

註3: 亞潮帶沙底質樣本A, B位於水深5 m；C, D位於水深10 m。

註4: 亞潮帶岩礁：大礁A1, A2, A3, A4位於水深10 m；A5, A6, A7, A8位於水深5 m。
淺礁B1, B2, B3, B4位於水深10 m；B5, B6, B7, B8位於水深5 m。

表2.11-12 核四廠附近海域101年第2季魚卵、仔稚魚密度含量及仔稚魚種類

浮游生物標準網垂直採樣

採樣日期：101年5月3日

採樣測站 ：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
流量計讀數： 起始	62802	76932	73829	70515	65769	67383	75388	72216	64223	69023	
結束	62828	76985	73851	70521	65882	67423	75404	72229	64272	69042	
每網過濾水量 (m^3)	10.35	21.10	8.76	2.39	45.00	15.93	6.37	5.18	19.51	7.57	平均
魚卵 (個/haul)	0	10	2	17	9	2	2	4	1	6	5.3
仔稚魚 (尾/haul)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0.6
魚卵 (個/1000m^3)註	0	474	228	7,120	200	126	314	773	51	793	1007.86
仔稚魚 (尾/1000m^3)註	0	95	0	0	0	0	157	0	0	397	64.8247

浮游生物標準網水平採樣

採樣日期：101年5月3日

採樣測站 ：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
流量計讀數： 起始	62828	76985	73851	70521	65882	67423	75404	72229	64272	69042	
結束	64223	78530	75388	72216	67383	69023	76932	73829	65769	70515	
每網過濾水量 (m^3)	555.49	615.22	612.03	674.95	597.69	637.12	608.45	637.12	596.10	586.55	平均
魚卵 (個/haul)	110	239	21	358	122	48	210	18	98	1243	246.7
仔稚魚 (尾/haul)	18	32	3	11	71	15	45	9	6	23	23.3
魚卵 (個/1000m^3)註	198	388	34	530	204	75	345	28	164	2,120	408.848
仔稚魚 (尾/1000m^3)註	32	52	5	16	119	24	74	14	10	39	38.5314

註:單位密度含量有效數字取三位,第四位數以後四捨五入

表2.11-13　核四廠附近海域101年第2季礁石區成魚調查

調查日期:101年5月9日

科名		種名	中名	鹽寮	澳底	合計
Acanthuridae	粗皮鯛科(刺尾鯛科)	*Acanthurus dussumieri*	杜氏刺尾鯛	62	55	117
		Acanthurus nigrofuscus	褐斑刺尾鯛	3	10	13
		Acanthurus olivaceus	一字刺尾鯛	2		2
		Prionurus scalprum	鋸尾鯛	21	·35	56
Apogonidae	天竺鯛科	*Apogon doederleini*	稻氏天竺鯛	11		11
Aulostomidae	管口魚科	*Aulostomus chinensis*	中國管口魚		1	1
Balistidae	鱗鮋科	*Sufflamen chrysopterum*	金鰭鼓氣鱗鮋	2	1	3
Blenniidae	鰕科	*Ecsenius namiyei*	紅尾無鬍鰕		2	2
		Istiblennius edentulus	暗紋蛙鰕	1		1
		Plagiotremus rhinorhynchos	橫口鰕	3	1	4
Caesionidae	鳥尾鉤科	*Pterocaesio digramma*	雙帶鳥尾鉤		50	50
Chaetodontidae	蝴蝶魚科	*Chaetodon auriga*	揚旛蝴蝶魚		2	2
		Chaetodon auripes	耳帶蝴蝶魚	31	35	66
		Chaetodon kleinii	克氏蝴蝶魚		4	4
		Chaetodon speculum	鏡斑蝴蝶魚		1	1
		Chaetodon vagabundus	飄浮蝴蝶魚		5	5
		Coradion altivelis	褐帶少女魚		3	3
		Heniochus monoceros	烏面立旗鯛		2	2
Cirrhitidae	科	*Cirrhitichthys aprinus*	斑金		1	1
Diodontidae	二齒鮋科	*Diodon holocanthus*	六斑二齒鮋	28	45	73
Gobiidae	鰕虎科	*Amblyeleotris wheeleri*	紅紋鈍鯊	3	1	4
		Trimma okinawae	沖繩靡塘鱧	1		1
Haemulidae	石鱸科	*Diagramma pictum*	少棘石鱸		1	1
Holocentridae	金鱗魚科	*Myripristis kuntee*	廣德松毬	1		1
		Sargocentron rubrum	黑帶棘鱗魚	1		1
Labridae	隆頭魚科	*Anampses caeruleopunctatus*	青斑阿南魚	1	17	18
		Anampses melanurus	烏尾阿南魚	1	1	2
		Anampses meleagrides	北斗阿南魚	1		1
		Bodianus mesothorax	中胸狐鯛	1		1
		Cheilinus chlorourus	綠尾唇魚		1	1
		Choerodon azurio	藍豬齒魚	1	7	8
		Coris dorsomacula	背斑盔魚	1	2	3
		Coris gaimard	蓋馬氏盔魚		3	3
		Halichoeres argus	大眼海豬魚		1	1
		Halichoeres biocellatus	雙斑海豬魚		1	1
		Halichoeres melanochir	黑腕海豬魚	21	10	31
		Halichoeres nebulosus	雲紋海豬魚	7	7	14
		Labroides dimidiatus	裂唇魚	2	5	7
		Macropharyngodon meleagris	朱斑大咽齒鯛	1	2	3
		Pseudolabrus japonicus	日本鸚鯛	17	16	33
		Pteragogus aurigarius	長鰭鸚鯛	2		2
		Stethojulis terina	斷紋紫胸魚	13	20	33
		Suezichthys gracilis	薄蘇彝士魚	1	1	2
		Thalassoma amblycephalum	鈍頭錦魚		5	5
		Thalassoma jansenii	詹氏錦魚	2		2
		Thalassoma lunare	新月錦魚	4	20	24
		Thalassoma lutescens	黃衣錦魚	10	5	15
		Xyrichtys dea	紅虹彩鯛	1		1
Lethrinidae	龍占魚科	*Lethrinus nebulosus*	青嘴龍占	5		5
Lutjanidae	笛鯛科	*Lutjanus rivulatus*	海雞母笛鯛		2	2
Monacanthidae	單棘鮋科	*Pervagor janthinosoma*	前角鮋	1		1
		Stephanolepis cirrhifer	冠鱗單棘鮋	1		1
Mullidae	鬚鯛科	*Parupeneus ciliatus*	短鬚海鯡鯉		3	3
		Parupeneus multifasciatus	多帶海鯡鯉	4	8	12
Nemipteridae	金線魚科	*Scolopsis vosmeri*	白頸赤尾冬	2		2
Ostraciidae	箱鮋科	*Lactoria cornuta*	角箱鮋		1	1
		Ostracion cubicus	粒突箱鮋		6	6
Pempheridae	擬金眼鯛科	*Pempheris oualensis*	烏伊蘭擬金眼鯛	40		40
Pinguipedidae	擬鱸科	*Parapercis xanthozona*	紅帶擬鱸		1	1
Pomacanthidae	蓋刺魚科	*Pomacanthus semicirculatus*	疊波蓋刺魚		1	1
Pomacentridae	雀鯛科	*Abudefduf bengalensis*	孟加拉豆娘魚	3	15	18
		Abudefduf sexfasciatus	六線豆娘魚	10		10
		Abudefduf vaigiensis	條紋豆娘魚	50	20	70
		Amphiprion clarkii	克氏海葵魚	2		2
		Chromis fumea	燕尾光鰓雀鯛	130		130
		Chromis notata	斑鰭光鰓雀鯛	300	280	580
		Chromis weberi	魏氏光鰓雀鯛	30		30
		Dascyllus trimaculatus	三斑圓雀鯛	1		1
		Neopomacentrus cyanomos	藍新雀鯛	90	10	100
		Pomacentrus bankanensis	班卡雀鯛	1		1
		Pomacentrus coelestis	霓虹雀鯛	1050	650	1700
		Stegastes fasciolatus	藍紋高身雀鯛	11	15	26
Scaridae	鸚哥魚科	*Scarus forsteni*	福氏鸚哥魚		2	2
		Scarus ghobban	藍點鸚哥魚	2	4	6
		Scarus ovifrons	卵頭鸚哥魚		1	1
		Scarus rubroviolaceus	紅紫鸚哥魚	3	4	7
Scorpaenidae	鮋科	*Dendrochirus zebra*	斑馬紋多臂簑鮋		1	1
Serranidae	鮨科	*Cephalopholis boenak*	橫紋九刺鮨	1		1
		Grammistes sexlineatus	六線黑鱸	1	1	2
Siganidae	籃子魚科	*Siganus fuscescens*	褐籃子魚	5	32	37
Synodontidae	合齒魚科	*Synodontidae gen. sp.*	蛇鯔(未鑑種)	2		2
Tetraodontidae	四齒鮋科	*Canthigaster rivulata*	水紋尖鼻鮋		4	4
Zanclidae	角蝶魚科	*Zanclus cornutus*	角鑲魚	5	10	15
共30科			屬數	2007	1450	3457
			魚種數	57	59	83
			歧異指數(註1)	2.81	3.22	3.13

註1:本季指數為$\log_2$　　註2:*為成群,數量係估計

表2.11-14 核四廠附近海域101年第2季潮間帶及潮下帶水深3公尺內大型海藻調查結果

調查時間：101年5月25日

海藻種類＼調查地點		澳底		鹽寮	
		潮間帶	潮下帶	潮間帶	潮下帶
Chlorophyta	綠藻植物門				
Monostromataceae	礁膜科				
Monostroma nitidum	礁膜	+			
Ulvaceae	石蓴科				
Ulva conglobata	牡丹菜	+		+	
Ulva fasciata	裂片石蓴	++	+++		+++
Ulva lactuca	石蓴	++	+++	++	+++
Ulva intestinalis	腸澁苔	+		+	
Ulva japonica	日本石蓴		++		++
Ulva prolifera	澁苔	+++	++	+++	++
Anadyomenaceae	肋葉藻科				
Valoniopsis pachynema	指枝藻	+++	++		++
Cladophoraceae	剛毛藻科				
Chaetomorpha linum	線形硬毛藻		+		+
Chaetomorpha spiralis	螺旋硬毛藻	+	++	+	++
Cladophoropsis herpestica	擬剛毛藻		+		+
Boodleaceae	布氏藻科				
Boodlea composita	布氏藻	++	++	+	+
Valoniaceae	法囊藻科				
Dictyosphaeria cavernosa	網球藻		+++		++
Bryopsidaceae	羽藻科				
Bryopsis plumosa	羽藻		++		+
Caulerpaceae	蕨藻科				
Caulerpa peltata	盾葉蕨藻		++		++
Caulerpa racemosa var.	棒型總狀蕨藻		++		++
Codiaceae	松藻科				
Codium arabicum	阿拉伯松藻		++		+
Codium mamillosum	球松藻		++		
Phaeophyta	褐藻植物門				
Ectocarpaceae	外子藻科				
Hincksia mitchellae	棲狀褐茸藻	+			
Dictyotaceae	網地藻科				
Dictyopteris repens	匍匐網翼藻		+		
Dictyota sp.	網地藻的一種		++		++
Lobophora variegata	匍扇藻		+++		+++
Padina minor	小團扇藻		++	+	+
Spatoglossum pacificum	褐舌藻		+		+
Zonaria diesingiana	圈扇藻		++		+
Scytosiphonaceae	萱菜科				
Colpomenia sinuosa	囊藻		+		+
Sargassaceae	馬尾藻科				
Sargassum cristaefolium	重緣葉馬尾藻		++		+

表2.11-14 核四廠附近海域101年第2季潮間帶及潮下帶水深3公尺內大型海藻調查結果（續1）

調查時間：101年5月25日

海藻種類＼調查地點		澳底		鹽寮	
		潮間帶	潮下帶	潮間帶	潮下帶
Rhodophyta	紅藻植物門				
Bangiaceae	頭髮菜科				
Pophyra crispata	荷葉紫菜	+		+	
Galaxauraceae	乳節藻科				
Tricleocarpa fragilis	白果胞藻		++		+
Scinaia moniliformis	念珠蘚奈藻		++		+
Gelidiaceae	石花菜科				
Gelidium japonica	日本石花菜		++		++
Gelidium amansii	石花菜		+++		+++
Pterocladiella capillacea	異枝菜	+	+++		+++
Bonnemaisoniaceae	柏桉藻科				
Delisea japonica	日本櫛齒藻		+		+
Dumontiaceae	膠黏藻科				
Dudressnaya japonica	日本杜蠕藻		++		+
Gigartinaceae	杉藻科				
Chondracanthus	小杉藻	+	+++		++
Chondrus ocellatus	角叉菜		+		+
Chondrus verrucosa	異色角叉菜		++		++
Halymeniaceae	海膜科				
Carpopeltis maillardii	硬盾果藻		+++		+
Grateloupia filicina	蜈蚣藻		+		+
Grateloupia spasa	稀毛蜈蚣藻		+		+
Halymenia dilatata	平展海膜		+		
Halymenia floresia	海膜		++		
Hypneaceae	沙菜科				
Hypnea charoides	長枝沙菜		++		++
Hypnea japonica	日本沙菜		+		+
Hypnea pannosa	巢沙菜		+++		++
Hypnea spinella	刺沙菜	+		+	
Peyssonneliaceae	耳殼藻科				
Peyssonnelia caulifear	耳殼藻		+++		++
Peyssonnelia conchicola	貝狀耳殼藻		+++		++
Peyssonnelia distenta	充滿耳殼藻		+		
Phyllophoraceae	育葉藻科				
Ahnfeltiopsis flabelliformis	扇形叉枝藻		++		++
Rhizophyllidaceae	根葉藻科				
Portieria hornemannii	浪花藻		+++		+++
Sarcodiaceae	海木耳科				
Sarcodia ceylanica	海木耳		++		+

表2.11-14 核四廠附近海域101年第2季潮間帶及潮下帶水深3公尺內大型海藻調查結果（續2）

調查時間：101年5月25日

海藻種類＼調查地點		澳底		鹽寮	
		潮間帶	潮下帶	潮間帶	潮下帶
Solieriaceae	紅翎菜科				
Eucheuma serra	鋸齒麒麟菜		+++		+
Meristotheca coacta	匍匐雞冠菜		+++		+
Meristotheca papulosa	雞冠菜		+++		+
Corallinaceae	珊瑚藻科				
Corallina pilulifera	小珊瑚藻		++		+
Marginisporum aberrans.	異邊孢藻	+	+++	+	++
Mastophora rosea	寬珊藻		++		++
Mastophora pacifica	太平洋寬珊藻		+++		+++
crustose coralline algae	無櫛珊瑚藻		+++		++
Rhodymeniaceae					
Ceratodictyon spongiosum	角網藻		+++		+
Rhodomelaceae	松節藻科				
Acrocystis nana	頂囊藻		+		++
Chondria armata	樹枝軟骨藻		++		+
Chondria ryukyuensis	琉球軟骨藻		++		
Laurencia brongniartii	紅羽凹頂藻		+++		++
Laurencia intermedia	異枝凹頂藻		+		+

+：偶而見到；++：少見；+++：常見

表2.11-15 核四廠附近海域潮間帶海藻種類密度、頻度、豐度與乾重

調查時間：101年05月25日

		澳底						鹽寮		
密度 (個體數/0.25 m^2)		A	B	C	D	E	F	A	A'	B
Ulva fasciata	裂片石蓴	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ulva lactuca	石蓴	11.0	195.0	0.0	327.5	0.0	7.5	80.0	207.5	38.0
Ulva prolifera	滸苔	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216.0
Booldea coacta	布氏藻	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Valoniopsis pachynema	指枝藻	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Marginisporum aberrans	邊孢藻	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Chondracanthus intermedius	小杉藻	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頻度		A	B	C	D	E	F	A	A'	B
Ulva fasciata	裂片石蓴	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ulva lactuca	石蓴	0.38	0.74	0.00	1.00	0.00	0.20	0.44	1.00	0.46
Ulva prolifera	滸苔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
Booldea coacta	布氏藻	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valoniopsis pachynema	指枝藻	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marginisporum aberrans	邊孢藻	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chondracanthus intermedius	小杉藻	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
豐度		A	B	C	D	E	F	A	A'	B
Ulva fasciata	裂片石蓴	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ulva lactuca	石蓴	1.16	10.54	0.00	13.10	0.00	1.50	7.27	8.30	3.30
Ulva prolifera	滸苔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
Booldea coacta	布氏藻	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valoniopsis pachynema	指枝藻	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marginisporum aberrans	邊孢藻	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chondracanthus intermedius	小杉藻	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乾重(g)		A	B	C	D	E	F	A	A'	B
Ulva fasciata	裂片石蓴	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ulva lactuca	石蓴	2.11	22.19	0.00	40.55	0.00	0.14	3.94	8.66	2.13
Ulva prolifera	滸苔	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
Booldea coacta	布氏藻	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valoniopsis pachynema	指枝藻	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marginisporum aberrans	邊孢藻	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chondracanthus intermedius	小杉藻	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A：低潮線；A'：距低潮線5m；B：距低潮線10m；C：距低潮線20m；D：距低潮線30m；E：距低潮線40m；F：距低潮線50m；

表2.11-16 核四廠附近海域潮下帶海藻種類及其覆蓋率

調查時間：101年5月25日

大礁（澳底外海）5m		A5	A6	A7	A8	平均覆蓋率
Bryopsis pulmosa	羽藻	0.45	0.00	0.00	0.60	0.26
Caulerpa racemosa	棒形總狀蕨藻	0.00	0.00	0.00	1.65	0.41
Dictyota sp.	網地藻的一種	0.00	1.20	0.30	1.20	0.68
Lobophora vareigata	葡扇藻	3.75	2.85	3.15	5.10	3.71
crustose coralline algae	無櫛珊瑚藻	0.30	2.55	3.60	1.50	1.99
coralline algae	有櫛珊瑚藻	0.15	0.45	0.00	0.00	0.15
Carpopeltis maillardii	硬盾果藻	0.00	0.00	0.30	1.65	0.49
Ceratodictyon spongiosum	角網藻	0.00	1.50	0.00	0.00	0.38
Chondria armata	樹枝軟骨藻	0.00	0.00	0.30	0.00	0.08
Eucheuma serra	鋸齒麒麟菜	0.00	0.00	0.00	1.05	0.26
Galaxaura marginata	扁乳節藻	0.45	0.00	0.00	0.00	0.11
Hypnea pannosa	巢沙菜	1.35	0.00	0.00	3.45	1.20
Laurencia brongniartii	紅羽凹頂藻	2.10	5.70	1.05	3.45	3.08
Mastophora pacifica	太平洋寬珊藻	0.90	7.20	12.60	6.00	6.68
Peyssonnelia caulifera	耳殼藻	0.00	0.45	1.35	0.15	0.49
Peyssonnelia conchicola	貝狀耳殼藻	1.65	6.45	9.60	4.65	5.59
Portieria hornemannii	浪花藻	0.00	0.00	1.65	1.80	0.86
合計		11.10	28.35	33.90	32.25	26.40

大礁（澳底外海）10m		A1	A2	A3	A4	平均覆蓋率
Lobophora vareigata	葡扇藻	4.05	3.60	7.20	8.25	5.78
crustose coralline algae	無櫛珊瑚藻	0.00	1.20	1.65	4.50	1.84
coralline algae	有櫛珊瑚藻	0.00	0.00	0.45	0.00	0.11
Ceratodictyon spongiosum	角網藻	0.00	0.00	0.00	1.50	0.38
Galaxaura marginata	扁乳節藻	0.00	0.00	0.00	0.45	0.11
Mastophora pacifica	太平洋寬珊藻	8.70	9.15	11.25	5.40	8.63
Peyssonnelia caulifera	耳殼藻	0.90	3.00	0.90	1.95	1.69
Peyssonnelia conchicola	貝狀耳殼藻	3.45	7.35	14.70	10.20	8.93
Portieria hornemannii	浪花藻	0.00	0.00	0.30	0.30	0.15
合計		17.10	24.30	36.45	32.55	27.60

淺礁（鹽寮外海）5m		B5	B6	B7	B8	平均覆蓋率
Dictyota sp.	網地藻的一種	3.30	0.90	1.20	0.75	1.54
crustose coralline algae	無櫛珊瑚藻	0.75	0.90	0.75	0.30	0.68
Ceratodictyon spongiosum	角網藻	3.00	1.20	1.95	3.75	2.48
Hypnea pannosa	巢沙菜	1.05	0.15	0.00	0.00	0.30
Laurencia brongniartii	紅羽凹頂藻	10.95	7.50	9.75	10.35	9.64
Mastophora pacifica	太平洋寬珊藻	0.60	1.35	0.60	0.75	0.83
Peyssonnelia caulifera	耳殼藻	0.45	0.00	0.75	0.00	0.30
Peyssonnelia conchicola	貝狀耳殼藻	8.70	4.20	3.00	4.95	5.21
Portieria hornemannii	浪花藻	0.30	0.00	0.30	0.00	0.15
合計		25.80	15.30	17.10	20.10	19.58

淺礁（鹽寮外海）10m		B1	B2	B3	B4	平均覆蓋率
Lobophora vareigata	葡扇藻	16.35	13.50	3.00	1.50	8.59
crustose coralline algae	無櫛珊瑚藻	0.30	0.45	0.00	0.75	0.38
coralline algae	有櫛珊瑚藻	0.45	1.35	0.00	0.00	0.45
Ceratodictyon spongiosum	角網藻	0.00	0.00	2.10	0.00	0.53
Laurencia brongniartii	紅羽凹頂藻	2.40	0.00	4.80	4.50	2.93
Mastophora pacifica	太平洋寬珊藻	3.30	6.15	2.85	1.50	3.45
Peyssonnelia caulifera	耳殼藻	0.30	0.60	0.30	1.05	0.56
Peyssonnelia conchicola	貝狀耳殼藻	7.80	6.75	1.50	5.70	5.44
Portieria hornemannii	浪花藻	0.00	3.15	1.05	1.35	1.39
合計		30.90	31.95	15.60	16.35	23.70

表 2.11-17 核四廠附近海域101年第2季珊瑚群聚調查記錄

大礁A1　　調查時間：100年5月25日

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Faviidae	**菊珊瑚科**		
Cyphastrea microphthalma	小葉細菊珊瑚	1	0.60
Goniastrea edwardsi	艾氏角星珊瑚	1	0.50
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	1	0.45
Fungiidae	**蕈珊瑚科**		
Psammocora superficialis	表面沙珊瑚	1	0.30
		4	1.85

大礁A2

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Pocilloporidae	**鹿角珊瑚科**		
Stylophora pistillata	莩柱珊瑚	1	0.38
Faviidae	**菊珊瑚科**		
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	1	0.60
Cyphastrea microphthalma	小葉細菊珊瑚	2	1.55
Cyphastrea chalcidicum	碓突細菊珊瑚	1	0.30
		5	2.83

大礁A3

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Poritidae	**微孔珊瑚科**		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	1	0.30
Faviidae	**菊珊瑚科**		
Cyphastrea microphthalma	小葉細菊珊瑚	1	1.80
Favia pallida	圈紋菊珊瑚	1	1.60
Favites pentagona	五邊角菊珊瑚	2	0.90
Dendrophylliidae	**樹珊瑚科**		
Turbinaria mesenterina	膜形盤珊瑚	1	0.90
		6	5.50

大礁A4

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	**軸孔珊瑚科**		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	1	0.60
Faviidae	**菊珊瑚科**		
Favia speciosa	環菊珊瑚	2	2.70
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	2	1.05
Alcyoniidae	**軟珊瑚科**		
Cladiella sp.	瘤軟珊瑚	1	0.60
		6	4.95

註: A1-A4位於淺礁水深10 m。

表 2.11-17 核四廠附近海域101年第2季 珊瑚群聚調查記錄（續1）

大礁A5　　調查時間：100年5月25日

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	1	0.30
Pocilloporidae	鹿角珊瑚科		
Stylophora pistillata	葶柱珊瑚	1	11.20
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	1	0.45
Porites lobata	團塊微孔珊瑚	2	1.35
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia favus	正菊珊瑚	2	1.65
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	1	0.90
Favites halicora	實心角菊珊瑚	1	0.90
Favites complanata	板葉角菊珊瑚	1	11.20
Goniastrea edwardsi	艾氏角星珊瑚	1	0.45
Alcyoniidae	軟珊瑚科		
Lobophytum mortoni	莫頓葉形軟珊瑚	1	0.3
		12	28.70

大礁A6

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	1	0.45
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	1	0.45
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia favus	正菊珊瑚	1	1.65
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	2	1.35
Favites pentagona	五邊角菊珊瑚	1	1.35
Montastrea valenciennesi	華倫圓菊珊瑚	4	4.80
Dendrophylliidae	樹珊瑚科		
Turbinaria mesenterina	膜形盤珊瑚	2	2.10
Nephtheidae	穗軟珊瑚科		
Stereonephthya sp.	實穗軟珊瑚	2	0.90
		14	13.05

大礁A7

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	1	0.45
Fungiidae	蕈珊瑚科		
Leptastrea pruinosa	白斑柔星珊瑚	1	1.05
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia favus	正菊珊瑚	1	0.75
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	2	2.55
Dendrophylliidae	樹珊瑚科		
Turbinaria mesenterina	膜形盤珊瑚	1	0.30
		6	5.10

大礁A8

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Acropora valida	變異軸孔珊瑚	1	0.30
Acropora solitaryensis	單獨軸孔珊瑚	1	1.95
Montipora aequituberculata	瘤葉表孔珊瑚	1	0.60
Agariciidae	蓮珊瑚科		
Pavona explanulata	薄葉雀屏珊瑚	2	0.90
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia speciosa	環菊珊瑚	2	1.80
Favia rotundata	菱形菊珊瑚	1	1.05
Favia pallida	圈紋菊珊瑚	2	2.55
Favites pentagona	五邊角菊珊瑚	1	0.60
Nephtheidae	穗軟珊瑚科		
Stereonephthya sp.	實穗軟珊瑚	1	0.45
		12.00	10.20

註: A5-A8位於淺礁水深5 m。

表 2.11-17 核四廠附近海域101年第2季 珊瑚群聚調查記錄（續2）

淺礁B1　　調查時間：100年5月25日

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	2	1.20
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	3	2.75
Faviidae	菊珊瑚科		
Cyphastrea microphthalma	小葉細菊珊瑚	1	0.50
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	2	1.35
Dendrophylliidae	樹珊瑚科		
Turbinaria mesenterina	膜形盤珊瑚	1	1.20
		9	7.00

淺礁B2

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Acropora valida	變異軸孔珊瑚	1	0.60
Montipora informis	變形表孔珊瑚	3	2.25
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	2	1.35
Fungiidae	蕈珊瑚科		
Psammocora superficialis	表面沙珊瑚	1	0.75
Faviidae	菊珊瑚科		
Cyphastrea microphthalma	小葉細菊珊瑚	1	1.20
Favites complanata	板葉角菊珊瑚	2	1.05
		10	7.20

淺礁B3

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Acropora solitaryensis	單獨軸孔珊瑚	1	2.20
Montipora informis	變形表孔珊瑚	1	0.70
Pocilloporidae	鹿角珊瑚科		
Stylophora pistillata	葶柱珊瑚	1	1.35
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	4	2.70
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia favus	正菊珊瑚	2	3.90
Favia speciosa	環菊珊瑚	2	1.35
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	3	3.75
Favites pentagona	五邊角菊珊瑚	1	1.05
Montastrea valenciennesi	華倫圓菊珊瑚	2	2.55
Hydnophora exesa	大碓珊瑚	1	0.45
		18	20.00

淺礁B4

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Pocilloporidae	鹿角珊瑚科		
Stylophora pistillata	葶柱珊瑚	2	2.10
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	1	0.60
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	3	1.65
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia favus	正菊珊瑚	6	7.50
Favia laxa	疏菊珊瑚	1	0.45
Favia rotundata	菱形菊珊瑚	1	1.05
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	2	2.55
Montastrea valenciennesi	華倫圓菊珊瑚	2	2.10
Hydnophora exesa	大碓珊瑚	3	3.80
		21	21.80

註: B1-B4位於淺礁水深10 m。

表 2.11-17 核四廠附近海域101年第2季 珊瑚群聚調查記錄（續3）

淺礁B5　　調查時間：100年5月25日

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Pocilloporidae	鹿角珊瑚科		
Stylophora pistillata	莖柱珊瑚	2	4.35
Pocillopora damicornis	細枝鹿角珊瑚	1	1.50
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	2	1.95
Montipora foveolata	窪孔表孔珊瑚	1	0.45
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	3	2.70
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia rotundata	菱形菊珊瑚	2	1.95
Lobophylliidae	瓣葉珊瑚科		
Echinophyllia aspera	粗糙刺葉珊瑚	1	0.60
		12	13.50

淺礁B6

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Pocilloporidae	鹿角珊瑚科		
Stylophora pistillata	莖柱珊瑚	3	4.65
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	2	1.80
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	3	1.55
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia favus	正菊珊瑚	2	1.80
Favia speciosa	環菊珊瑚	1	2.40
Favites abdita	隱藏角菊珊瑚	1	0.90
Favites pentagona	五邊角菊珊瑚	2	1.50
Montastrea valenciennesi	華倫圓菊珊瑚	2	3.90
		16	18.50

淺礁B7

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Montipora informis	變形表孔珊瑚	1	1.20
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	2	1.05
Faviidae	菊珊瑚科		
Favia favus	正菊珊瑚	1	0.75
Favites pentagona	五邊角菊珊瑚	2	2.25
Goniastrea edwardsi	艾氏角星珊瑚	1	2.10
Nephtheidae	穗軟珊瑚科		
Stereonephthya sp.	實穗軟珊瑚	2	1.35
		9	8.70

淺礁B8

種類	中名	群體數	覆蓋率%
Pocilloporidae	鹿角珊瑚科		
Stylophora pistillata	莖柱珊瑚	2	2.55
Acroporidae	軸孔珊瑚科		
Acropora solitaryensis	單獨軸孔珊瑚	1	1.20
Montipora informis	變形表孔珊瑚	3	1.75
Poritidae	微孔珊瑚科		
Porites lichen	地衣微孔珊瑚	3	2.05
Porites lobata	團塊微孔珊瑚	1	1.05
Faviidae	菊珊瑚科		
Favites pentagona	五邊角菊珊瑚	4	1.95
		14	10.55

註: B5-B8位於淺礁水深5 m。

表 2.11-18 核四廠附近海域101年第2季 珊瑚群聚結構調查結果

調查時間：100年5月25日

調查線	N	S	覆蓋率%	H'	D	λ	E
A1	4	4	1.85	2.00	0.25	0.75	1.00
A2	5	4	2.83	1.92	0.28	0.72	0.96
A3	6	5	5.50	2.25	0.22	0.78	0.97
A4	6	4	4.95	1.92	0.28	0.72	0.98
A5	12	10	28.70	3.25	0.11	0.89	0.94
A6	14	8	13.05	2.81	0.16	0.84	0.97
A7	6	5	5.10	2.25	0.22	0.78	0.95
A8	12	9	10.20	3.09	0.13	0.88	0.95
B1	9	5	7.00	2.20	0.23	0.77	0.94
B2	10	6	7.20	2.45	0.20	0.80	0.94
B3	18	10	20.00	3.13	0.13	0.87	0.92
B4	21	9	21.80	2.92	0.16	0.84	0.96
B5	12	7	13.50	2.69	0.17	0.83	0.97
B6	16	8	18.50	2.91	0.14	0.86	0.97
B7	9	6	8.70	2.50	0.19	0.81	0.97
B8	14	6	10.55	2.41	0.20	0.80	0.93

註: 調查線A1-A4位於大礁水深10 m；A5-A8位於大礁水深5 m；
B1-B4位於淺礁水深10 m；B5-B8位於淺礁水深5 m。
S：珊瑚種數；**N**：群體數；**H'**：種歧異度指數；**D**：優勢性指數；
λ：辛普森多樣性指數；**E**：均勻度指數。

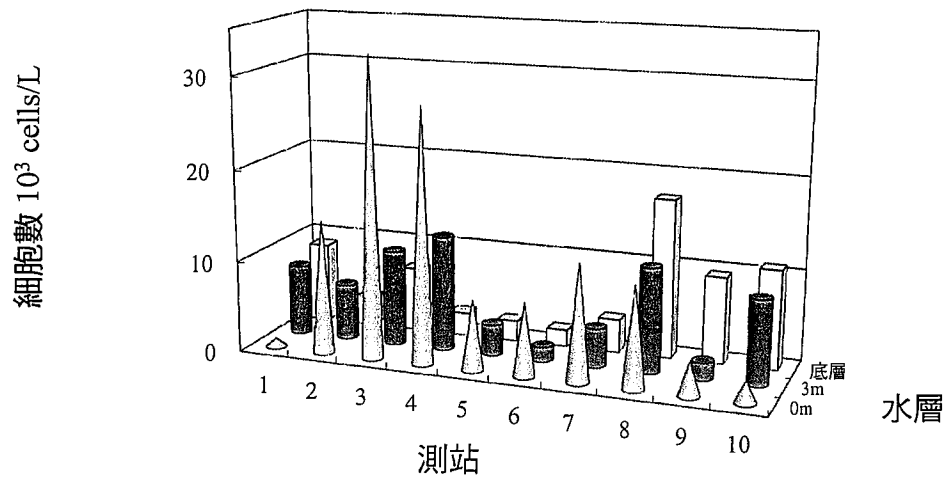


圖2.11-1核四廠附近海域浮游植物101年第2季各監測站之垂直分佈

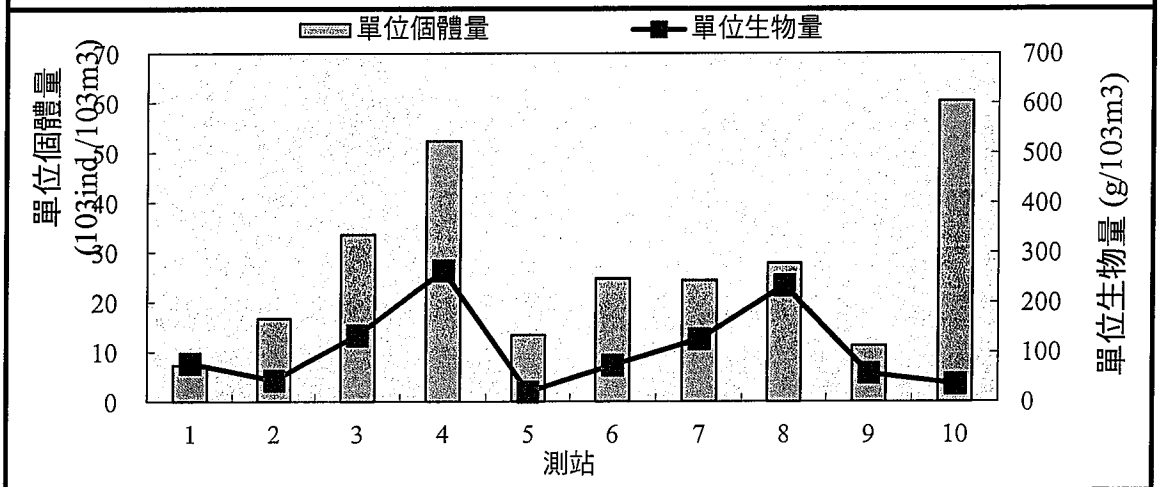


圖2.11-2 核四廠附近海域浮游動物101年第2季各監測站個體量與生物量垂直分佈

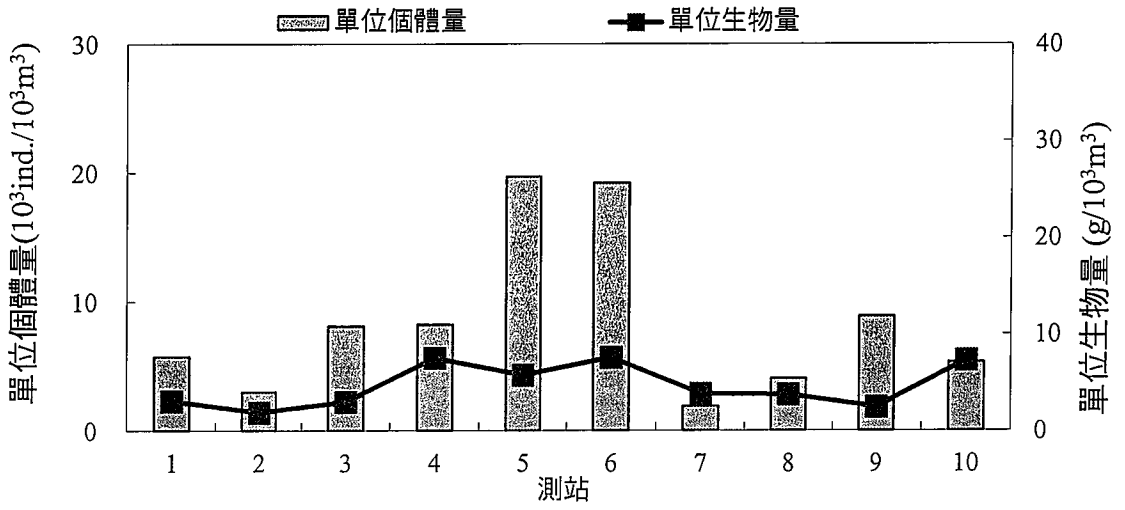


圖2.11-3 核四廠附近海域浮游動物101年第2季各監測站個體量與生物量水平分佈

漁業調查

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.12 漁業調查

本季101年4~6月貢寮地區漁業調查期間為農曆3月11日~5月12日。

1.漁業生產統計及經濟分析

(1)淺海養殖戶

就淺海養殖戶而言，貢寮地區淺海養殖戶以九孔（*Haliotis diverscolor supertexta*）為最主要養殖物，大部分是以築堤式為主要養殖方法，即利用海岸岩礁地形築池放養，以天然潮水進行水質交換來養殖九孔。本地業者大多有數10年以上養殖經驗的專業養殖戶，養殖戶之家庭收入多以本身的養殖收入為主。

在養殖面積方面，101年4~6月標本戶進行九孔養殖之平均養殖面積為 4,634.82 平方公尺/戶，標本戶進行鮑魚養殖之平均養殖面積為2,898.92平方公尺/戶。在產量方面，101年4、6月九孔生產量分別為425公斤/戶、2958公斤/戶(表2.12-1)，101年4月鮑魚生產量為1,667公斤/戶(表2.12-2)。在產值方面，101年4、6月九孔產值分別為354,167元/戶、821,759元/戶（表2.12-1），101年4月鮑魚產值為1,439,815元/戶（表 2.12-2）。在銷售狀況方面，九孔及鮑魚均以承銷商為主（100%）。

就養殖成本而言，在固定成本中以設備費用為主要支出，而變動成本則以飼料費及薪資支出為主。101年4~6月九孔每月平均養殖成本分別為22,655元/戶、20,200元/戶及21,875元/戶，101年4~6月間，九孔平均養殖成本為85,223元/月/戶（詳表2.12-3）；101年4~6月鮑魚每月平均養殖成本分別為63,875元/戶、58,562元/戶、58,812元/戶，101年4~6月間，鮑魚平均養殖成本為60,416元/月/戶(詳表2.12-4)。

(2)漁撈戶

就漁撈戶而言，貢寮地區漁撈戶多為沿近海漁業經營，其作業漁

區是以 6 浬海域內的作業為主，漁撈戶作業範圍除受天氣、水流影響外，亦與近年來沿近海漁業資源減少有關。在出海作業次數方面，漁撈戶每月的平均出海次數在 4 月出海次數以 11~15 次/戶所佔的比例最高，5 月出海次數以 6~10 次/戶所佔的比例最高，6 月出海次數以 11~15 次/戶所佔的比例最高。整體而言，101 年 4~6 月出海次數與往年同期之出海次數差異不大（表 2.12-5）。

本地區漁撈戶多為自有船隻，平均作業人數 1~2 人，其作業的漁法、漁具隨著漁季的不同而異，作業漁法以沿岸採捕、一支釣（包括手釣、釣具等）、刺網、燈火漁業等作業為主。101 年 4 月作業漁法以一支釣為主，佔 41.24%，其次為刺網，佔 32.12%；5 月作業漁法以刺網為主，佔 33.10%，其次為燈火漁業，佔 19.51%；6 月份作業漁法以燈火漁業為主佔 30.82%、其次依序為刺網，佔 27.74%(詳表 2.12-6)。

貢寮地區 101 年 4 月主要漁獲物為小卷，產量分別為 291.0 公斤/戶，產值為 40,533 元/戶。5 月、6 月主要漁獲物為圓花鰹(*Auxis rochei rochei*，俗稱煙管仔)，產量分別為 1,441.3 公斤/戶、2,087.1 公斤/戶，產值分別為 28,607 元/戶、38,961 元/戶（表 2.12-7、附錄Ⅳ.11-1）。101 年 4 月~6 月與去年同期比較，4 月漁獲量統計 15,976 公斤/戶比去年(2,312 公斤/戶)稍高，漁獲產值 574,181 元/戶卻比去年 32,923 元/戶)低很多，5 月漁獲產量 12,926 公斤/戶與漁獲產值 452,447 元/戶則比去年同期 11,612 公斤/戶、327,154 元/戶高出許多，6 月漁獲產量 13,801 公斤/戶與漁獲產值 476,888 元/戶亦比去年同期 34,549 公斤/戶、899,931 元/戶高出許多。101 年 4 月之漁撈漁獲物在銷售管道方面以自行銷售為主，所佔比例為 76.47%；5 月、6 月之漁撈漁獲物在銷售管道方面以承銷商為主，所佔比例分別為 47.92%及 56.80%（表 2.12-8）。

變動成本則包括燃料油費，餌料費、雜支費及維修費等。101 年 4 月份每戶平均燃料油費為 8,741 元/戶，餌料費為 663 元/戶，雜支費為 450 元/戶；101 年 5 月份每戶平均燃料油費為 4,520 元/戶，餌料費為 488 元/戶，雜支費為 615 元/戶；101 年 6 月份每戶平均燃料油費為 8,783

元/戶，餌料費為 460 元/戶，雜支費為 938 元/戶。整體而言，漁撈作業成本在 101 年 4 月份為 10,140 元/戶，5 月份為 5,624 元/戶，6 月份為 10,800 元/戶（表 2.12-9）。近年來，油價的波動對漁船作業成本的支出有較大的影響，日常生活用品的漲跌，也影響了雜支費的支出。

2.漁業活動

(1)生物資源概況

臺灣海域之海底地形及底質之特殊，且海況變動極具變化，使其具有獨特之底棲魚類相外，更因此一特殊之海洋構造，有來自東海生態區及黑潮流系之洄游性魚類，形成各具特色之生態區。由於漁業資源呈多種多樣之分布特性，向來為台灣週邊水域漁業活動最熱絡的漁場之一。

綜合整理本調查蒐集之漁獲資料顯示，經常性捕撈之商業魚種多達 70 種，主要作業方式有沿岸採捕、棒受網、焚寄網、扒網、延繩釣、小型拖網、刺網、一支釣、曳繩釣、追逐網、鏢旗魚等漁業。各漁獲魚種主要為季節性魚種，依時序洄游至本海域，成為漁獲對象。依漁獲比例分類，以季節性不明顯之魚種佔 36%為最多，其次為夏季型魚種（14%）、春季型魚種有（11%）及春冬型魚種（11%），秋季型、冬季型、春夏型、夏秋型則低於 7%。這些魚種因分佈於不同型態之海域，捕撈漁法多樣化且漁期互補，使貢寮地區之漁業活動終年不斷。

綜合整理本調查蒐集之魚獲資料表列本海域重要之漁獲魚種的漁法、漁期如表 2.12-10，這些魚種因分佈於不同型態之海域，捕撈漁法多樣化且漁期互補，使貢寮地區之漁業活動終年不斷。

3.燈火漁業

(1)火誘網漁業

火誘網漁業是利用魚類之趨光性，以光誘集魚群，進而達到漁獲目的之漁法，是本省沿襲已久之傳統漁法，在以往稱為「火燴」，其

網具在水中形狀如畚箕，故又稱畚箕網。在早期燈火以火炬、煤油燈、電石燈為主，近年來隨著電子科技之普及，各燈火漁業漁船均已使用電氣集魚燈，漁船則由竹筏、舢舨逐漸進步到動力漁船，且馬力及公噸位均增大，足以前往較遠之漁場作業，漁法更由雙艘式演變為單艘式作業，自從政府推廣了棒受網起網機之後，以往需由十多人作業之棒受網漁業，已減少至 1~3 人，漁撈作業已達到機械化及省力的目的。本地區燈火漁業目前以近海漁業之火誘網、焚寄網與沿岸漁業之火誘網(棒受網)漁業為主，本漁業之漁獲對象魚種屬季節性魚種，如小卷、白達仔、圓花鰹、鯖、目孔等，故本地區燈火漁業之作業漁船並非專營燈火漁業，而會隨著漁獲對象、漁期之變化而改變其漁具及漁法之作業方式，如兼營刺網、延繩釣、一支釣及曳繩釣等漁業。

貢寮地區火誘網漁業之漁期大約在每年的 4~10 月間，因此本季（4~6 月）所調查之標本戶大部分皆以從事曳繩釣及一支釣漁業及燈火漁業作業為主。貢寮地區火誘網漁業標本戶在 101 年 4 月之產量為 1,295 公斤/月/戶，較 100 年 4 月增加 1,055 公斤/月/戶；產值為 174,289 元/月/戶，較 100 年 4 月增加 96,734 元/月/戶；漁獲魚種以劍尖槍鎖管(*Loligo edulis*，俗稱小卷)846 公斤/月/戶為主；101 年 5 月之產量為 5,060 公斤/月/戶較 100 年 5 月減少 4,191 公斤/月/戶，產值為 114,901 元/月/戶，較 100 年 5 月減少 112,360 元/月/戶；漁獲魚種以圓花鰹(*Auxis rochei rochei*，俗稱煙管仔)4,899 公斤/月/戶為主；101 年 6 月之產量為 8,699 公斤/月/戶，較 100 年 6 月減少 10,659 公斤/月/戶；產值 210,143 元/月/戶，較 100 年 6 月減少 114,635 元/月/戶；主要漁獲魚種仍以圓花鰹 7,366 公斤/月/戶為主，各魚種 101 年 4~6 月之產量變化詳附錄Ⅳ.11-2。

101 年 4~6 月之 CPUE 以 101 年 6 月份之 603 公斤/日/戶為最高（如表 2.12-11 所示），IPUE 亦以 101 年 6 月之 14,564 元/日/戶為最高。

⑵扒網漁業

扒網漁業之作業漁法系於夜間利用燈光誘集魚群於燈下後，再用

兩袖一囊構成的漁網加以包圍，然後網船徐徐前進將魚群驅逐入網內加以捕撈之漁法，作業方式酷似單船驅迴式拖網漁法。因其撈捕對象為表層性迴游魚類，按漁具分類，其漁具漁法屬於浮曳網類，為沿近海撈捕趨光性魚種如鯖、鰺、鎖管、丁香及皮刀魚等魚種之重要漁法。

貢寮地區扒網漁業以鯖、鰺漁業為主，鯖鰺漁場分為 2 種，在 5~9 月期間為湧昇漁期，且以 0 歲魚為主要標的魚種，在潮境漁期（1~4 月與 10~12 月）的花腹鯖多為 1~3 歲為主的產卵群。貢寮地區扒網漁業標本戶在 101 年 4 月之產量為 129,107 公斤/戶，產值為 3,621,906 元/戶，5 月之產量為 84,666 公斤/戶，產值為 2,887,886 元/戶，6 月之產量為 33,670 公斤/戶，產值為 905,420 元/戶，4 月主要漁獲魚種以真鰺 (*Trachurus japonicus*，俗稱黑尾) 為主，其漁獲量為 118,274 公斤/戶為主，5 月為花腹鯖(*Scomber australacius*，俗稱花飛) 為主，其漁獲量為 32,725 公斤/戶，6 月則以白腹鯖(*Scomber japonicus*；俗稱青飛) 為主，其漁獲量為 19,192 公斤/戶為主（附錄Ⅳ.11-3 及附錄Ⅳ.11-4）。

貢寮地區 101 年 4~6 月間平均每戶之作業日數分別為 16 日、6 日及 2 日，101 年 4 月之 CPUE 為 8,241 公斤/日/戶，5 月之 CPUE 為 14,941 公斤/日/戶，6 月之 CPUE 為 16,835 公斤/日/戶。101 年 4 月之 IPUE 為 231,185 元/日/戶，5 月之 IPUE 為 509,627 元/日/戶，6 月之 IPUE 為 452,710 元/日/戶（表 2.12-12）。

4.刺網漁業、飛魚卵漁業、鏢旗魚漁業及釣具漁業

(1)刺網漁業

101 年 4~6 月調查期間之漁獲資料之標本船最多有 6 艘。其中龍洞 2 艘、澳底 3 艘、福隆 1 艘，2 艘為漁船，4 艘為漁筏及舢舨。目前貢寮地區刺網漁業大多屬於兼業性質，部分的標本戶並非以刺網為單一的漁法，而會隨著對象魚種、漁期的不同，而改變其漁具、漁法，如從事燈火漁業、竿釣、底繩釣等其他漁業。作業漁場主要係在三貂角至鼻頭角各港口附近 3 浬以內，水深 60 公尺之沿岸海域。

貢寮地區 101 年 4~6 月間，平均 1 個標本戶所漁獲各魚種之漁獲重量，合計約有 63 種魚類、3 種頭足類及 6 種甲殼類。

4 月以漁獲量真烏賊(*Sepia esculenta*，俗稱花枝)41.4 公斤/月/戶為最高，其次為鋸尾鯛(*Prionurus scalprum*，俗稱黑豬哥)的 28.6 公斤/月/戶，再其次為褐籃子魚(*Siganus fuscescens*，俗稱象魚)的 20.9 公斤/月/戶。5 月漁獲量最高為龍蝦(*Panulirus sp.*)的 29.4 公斤/月/戶，其次為鋸尾鯛的 22.5 公斤/月/戶，再其次為巴鰹(*Euthynnus affinis*，俗稱煙仔)的 10.9 公斤/月/戶。6 月最高為龍蝦類的 24.5 公斤/月/戶，其次為杜氏鰤(*Seriola dumerili*，俗稱紅甘)的 17.8 公斤/月/戶，再其次為虱目魚(*Chanos chanos*，俗稱虱目魚)的 17.5 公斤/月/戶。合計 3 個月漁獲最佳之漁獲物為龍蝦之 74.3 公斤/季/戶，其次為鋸尾鯛之 60.7 公斤/季/戶、真烏賊之 46.6 公斤/季/戶、褐籃子魚之 32.9 公斤/季/戶、杜氏刺尾鯛(*Acanthurus dussumieri*，俗稱正吊)之 32.5 公斤/季/戶。3 個月之漁獲總產量為 493.8 公斤/季/戶，與去年同期之漁獲量 742.6 公斤/季/戶減少。各月份各魚種之產量變化詳附錄Ⅳ.11-5。

各月份各魚種別之產值，4~6 月最高皆為龍蝦，分別為 26,846 元/月/戶、39,726 元/月/戶、34,766 元/月/戶。4 月居次為真烏賊之 8,756 元/月/戶，再其次為低鰭舵魚(*Kyphosus vaigiensis*，俗稱白毛)之 5,876 元/月/戶。5 月居次為鱗突擬蟬蝦(*Scyllarides squammosus*，俗稱戰車、蝦姑頭)之 8,755 元/月/戶，再其次為毛緣扇蝦(*Ibacus cilliatus*，俗稱蝦姑撇仔)之 2,480 元/月/戶。6 月居次為杜氏鰤之 3,791 元/月/戶，再其次為的 2,529 元/月/戶。合計 3 個月的漁獲總值，以龍蝦為最高 101,338 元/季/戶，其它依序為鱗突擬蟬蝦 12,643 元/季/戶、真烏賊 9,876 元/季/戶、低鰭舵魚 9,517 元/季/戶、毛緣扇蝦 8,533 元/季/戶。合計 3 個月漁獲總產值為 205,165 元/季/戶，較去年同期之 262,283 元/季/戶減少。各月份各魚種之產值變化詳附錄Ⅳ.11-6。

本次刺網業調查之平均作業天數、平均漁獲量、平均漁獲產值、CPUE、IPUE 等詳表 2.12-13。CPUE 分別為 15.5 公斤/日/戶、9.5 公斤

/日/戶、11.1 公斤/日/戶。IPUE 則分別 5,774 元/日/戶、4,549 元/日/戶、4,506 元/日/戶。

⑵飛魚卵漁業

本省北部海域飛魚卵的產期約在農曆 4~5 月，大約是國曆 5~7 月，此亦為本漁業作業漁期，由於在此期間飛魚魚群聚集於本省東北海域，在海藻間產卵。漁民乃依其習性利用由稻草編成之漁具或利用浮木，使飛魚穿梭於垂下之稻草束中或浮木上產卵，然後收取附著其上之飛魚卵。

本季（101 年 4~6 月）調查期間貢寮地區無標本戶漁船從事飛魚卵作業，故無漁獲資料。

⑶鏢旗魚漁業

由於鏢旗魚之作業期間僅有約 4 個月左右，因此漁船皆為兼營性質，在非漁期時則主要從事燈火、刺網、釣具等漁業。鏢旗魚作業從東北季風開始吹起時，漁期才展開，以有風小浪為適宜的作業天氣。作業區域為基隆嶼至龜山島間的海域。

本季（101 年 4~6 月）調查期間非貢寮地區之鏢旗魚漁期，故無漁獲資料。

⑷釣具漁業

釣具漁業標本戶 101 年 4~6 月調查期間最多有效標本戶為 13 戶從事作業。其中龍洞 2 戶，澳底 10 戶，卯澳 1 戶；本季釣具漁法為竿釣、底延繩釣及曳繩釣 3 種；本季之漁獲計有魚類 23 種、頭足類 3 種。

就魚種別之漁獲產量而言，4 月以赤鯨(*Dentex tumifrons*，俗稱赤宗)37.9 公斤/月/戶最高，其次為齒鰆(*Sarda orientalis*，俗稱煙仔虎)之 30.1 公斤/月/戶，再其次為萊氏擬烏賊(*Sepioteuthis lessoniana*，俗稱軟絲)之 13.0 公斤/月/戶。5、6 月皆以齒鰆最高，分別為 117.4 公斤/月/戶、153.6 公斤/月/戶。5 月以赤鯨之 21.5 公斤/月/戶居次，再其次

為鬼頭刀(*Coryphaena hippurus*，俗稱鬼頭刀)之 6.3 公斤/月/戶。6 月居次者仍為赤鯨之 28.6 公斤/月/戶，再其次為日本馬頭魚(*Branchiostegus japonicus*，俗稱馬頭)之 8.6 公斤/月/戶。3 個月合計漁獲量最高者為齒鰆之 301.1 公斤/季/戶，其次為赤鯨之 88.0 公斤/季/戶，再其次為日本馬頭魚 23.4 公斤/季/戶、萊氏擬烏賊 19.6 公斤/季/戶、白條紋石狗公(*Sebastiscus albofasciatus*，俗稱石狗公)14.9 公斤/季/戶。3 個月平均一戶之總漁獲量為 504.5 公斤/季/戶，較去年同期之 402.9 公斤/季/戶增加。本季有較多的小魚近岸，吸引齒鰆靠岸覓食，提高漁民出海從事曳繩釣捕捉的意願。各月份各魚種之產量變化詳附錄Ⅳ.11-7。

就各月份魚種別之漁獲產值而言，101 年 4 月以赤鯨 21,843 元/月/戶最高，其次為萊氏擬烏賊之 6,138 元/月/戶，再其次為日本馬頭魚之 4,947 元/月/戶。5 月最高為齒鰆之 14,460 元/月/戶，其次為赤鯨之 11,11 元/月/戶，再其次為日本馬頭魚 2,909 元/月/戶。6 月以赤鯨 14,266 元/月/戶最高，其次為齒鰆之 13,353 元/月/戶，在其次為日本馬頭魚 4,657 元/月/戶。3 個月合計總漁獲產值以赤鯨之 47,226 元/季/戶為最高，齒鰆之 30,354 元/季/戶居次，再其次為日本馬頭魚之 12,553 元/季/戶、萊氏擬烏賊之 9,163 元/季/戶、白條紋石狗公之 4,893 元/季/戶。3 個月總漁獲產值為 112,763 元/季/戶，較去年同期之 100,978 元/季/戶增加。各月份各魚種之產值變化詳附錄Ⅳ.11-8。

標本戶之平均作業天數、平均漁獲重量、平均漁獲產值、CPUE 及 IPUE 如表 2.12-14 所示，本季（4~6 月）每月平均 1 戶之作業天數分別為 10 日/戶、11 日/戶、11 日/戶。就漁獲產量而言分別為 121.9 公斤/戶、174.7 公斤/戶、207.9 公斤/戶。本季調查 3 個月的 CPUE 分別為 12.2 公斤/日/戶、15.9 公斤/日/戶、18.9 公斤/日/戶。IPUE 則分別為 4,197 元/日/戶、3,098 元/日/戶、3,338 元/日/戶（詳表 2.12-14）。

5.魩仔魚漁業、休閒漁業及沿岸採捕業

⑴魩仔魚漁業

漁期主要分為春（農曆3~6月）及秋（農曆8~10月）2期，其漁期雖長，但每季的實際總作業天數大都在30天以內，漁獲魚種隨季節推移而改變，主要有魩仔魚(刺公鯷,*Encuasichdina punctifer*；異葉公鯷,*Stolephorus heterolobus*；日本鯷,*Engraulis japonicus*)、青鱗(*sardinella melanure*)及臭肉鰮(*Etrmeus teres*)等。其作業漁法為火誘網，漁船在福隆至鹽寮沿海間3~10公尺沙質地區作業，於黃昏時間抵達漁場，尋找適合作業潮流方向並使漁船處於順風頂流狀態，架起撐竿且將網具堆放漁船尾就緒，打開集魚燈開始誘集魚群，在魚群聚集達一定密度及適合捕撈深度後，放下網具且逐漸熄滅集魚燈改使用誘導燈吸引魚群聚集在船尾，開始揚網捕撈。因每次作業的時間不一，故作業漁場範圍(約2000公頃)不大，要求標本戶以網次記錄其單位努力漁獲量(CPUE)並不容易。故資料收集係以每日之船組數為其漁獲努力量之基準。

本季（101年4~6月）調查期間貢寮地區魩仔魚捕獲情形，4月2日至5月5日（農曆3月12日至4月15日）止總共漁獲魩仔魚790公斤。平均CPUE、IPUE分別為71.82公斤/日/戶、14,910元/日/戶（表2.12-15、附錄Ⅳ.11-18）。。

⑵沿岸採捕業

沿岸採捕業之標本戶共計8戶，分別為龍洞2戶、澳底1戶、福隆4戶及馬崗各1戶。其作業方法通常視作業地點之水深不同，以潛水或涉水2種直接採捕方式進行之，而利用舢舨出海進行沿岸採捕作業者甚少。採捕種類計有從細雞毛菜(*Pterocladia capillacea*，俗稱石花菜)、長葉紫菜(*Porphyra dentata*，俗稱紫菜)、紅毛菜(*Bangia fuscopurpurea*，俗稱髮菜)、皮絲藻(*Dermonema virens*，俗稱鹿角菜)、礁膜(*Monostroma nitidum*，俗稱青苔菜)、克軟刺藻(*Chondracanthus acicularis*，俗稱茶米菜)、海膜屬(*Halymenia*，俗稱茭白菜)、細龍鬚菜

(*Gracilaria verrucosa*，俗稱龍鬚菜) 大駝石鰲(*liolophura japonica*，俗稱貝菊)、青螺(*collisella benoldi*，俗稱石菊)、細刺黑膽(*Anthocidaris crassispina*，俗稱海膽)、蜈蚣藻(*Grateloupia filicina*，俗稱蜈蚣藻)、文蛤(*Meretrix lusoria*，俗稱文蛤)、珊瑚草(*Corallina pilulifera*，俗稱珊瑚草)、九孔鮑(*Haliotis diversicolor supertexta*，俗稱九孔)、白棘三列海膽(*Tripneustes gratilla*，俗稱馬糞海膽)、蝦蛄(*Oratosquilla oratoria*，俗稱蝦蛄)、黑蝶真珠蛤(*Pinctade margaritifera*，俗稱黑碟貝)、文蛤(*Meretrix lusoria*，俗稱文蛤)等，且隨著天候季節之不同，採捕種類亦大不相同，如夏季以石花菜為主，冬季之種類較多，主要有紫菜、髮菜、鹿角菜及青苔菜等。採捕時，以 3~5 人 1 組，並以繩子編成之網袋放置採捕之海菜。

101 年 4~6 月間貢寮沿海沿岸採捕業標本戶之作業地點大致以和美或澳底為中心，採集地點亦大致固定，並非全面性採集。

① 涉水為主之沿岸採捕

101 年 4 月份共有 4 個標本戶作業，標本戶作業天數在 5~15 天，平均採集作業日數約 12 天（表 2.12-16、附錄Ⅳ.11-9），約每 3 天即採捕 1 次，主要採捕種類為加工前石花菜，共採捕 76.58 公斤/戶、其次為茶米菜(14.10 公斤/戶)、青苔菜(2.70 公斤/戶)、龍蝦(2.25 公斤/戶)、海膽(0.75 公斤/戶)、九孔(0.75 公斤/戶)、石菊(0.15 公斤/戶)、貝菊(0.15 公斤/戶)等，其月別採捕平均產值約為 10,671.0 元/戶/月，較去年同期採捕平均產值 16,883.3 元/戶/月約減少 36.80%。

101 年 5 月份標本戶之作業天數在 5~17 天，平均採集作業日數約 9 天（表 2.12-16、附錄Ⅳ.11-10），約每 3 天即採捕 1 次，主要採捕種類為加工前石花菜，共採捕 60.90 公斤/戶、其次為茶米菜(3.75 公斤/戶)、龍蝦(2.55 公斤/戶)、青苔菜(1.50 公斤/戶)、海膽(1.50 公斤/戶)、九孔(0.45 公斤/戶)、貝菊（0.15 公斤/戶）等，其月別採捕平均產值約為 8,202.0 元/戶/月，較去年同期採捕平均產值 13,225.0

元/戶/月約減少 37.98%。

101 年 6 月份標本戶之作業天數在 4~14 天，平均作業天數為 9 天（表 2.12-16、附錄Ⅳ.11-11），約每 3 天即採捕 1 次，主要採捕種類為加工前石花菜，共採捕 34.80 公斤/戶，其次為龍蝦(3.30 公斤/戶)、海膽(2.70 公斤/戶)、貝菊 (0.62 公斤/戶)等，其月別採捕平均產值約 6,602.4 元/戶/月，較去年同期採捕平均產值 19,085 元/戶/月約減少 65.41%。

② 潛水為主之沿岸採捕

101 年 4 月份共有 4 個標本戶作業，作業天數分別為 6~12 天之間，平均每 1 個標本戶潛水採集作業日數約 10 天(表 2.12-16、附錄Ⅳ.11-12)，約每 3 天即採捕一次，主要採捕種類為加工前石花菜，共採捕約 118.50 公斤/戶、其次為黑碟貝(40.65 公斤/戶)、龍蝦(18.03 公斤/戶)、文蛤(17.25 公斤/戶)、加工後石花菜(16.25 公斤/戶)、蝦蛄(11.10 公斤/戶)、海膽(6.03 公斤/戶)、貝菊(80.75 公斤/戶)、九孔(0.5 公斤/戶)等，其採捕平均產值約為 58,872.75 元/戶/月，較去年同期採捕平均產值 87,055.0 元/戶/月約減少 32.37%。

101 年 5 月份共有 4 個標本戶作業，作業天數分別為 7~14 天(表 2.12-16、附錄Ⅳ.11-13)，平均每 1 個標本戶潛水採集作業日數約 10 天，約每 3 天即採捕 1 次，主要採捕種類為加工前石花菜，共採捕約 72.45 公斤/戶、其次為黑碟貝(24.90 公斤/戶)、龍蝦(18.95 公斤/戶)、海膽(13.90 公斤/戶)、蝦蛄 (11.25 公斤/戶)、加工後石花菜(10.00 公斤/戶)、文蛤(5.40 公斤/戶)、茶米菜(4.00 公斤/戶)、石菊(1.50 公斤/戶)、貝菊(1.00 公斤/戶)、九孔(0.90 公斤/戶)、鹿角菜(0.50 公斤/戶)等，其採捕平均產值約為 55,064.50 元/戶/月，較去年同期總採捕產值 84,270.0 元/戶/月約減少 34.66%。

101 年 6 月份共有 4 個標本戶作業，作業天數分別為 7~16 天(表 2.12-16、附錄Ⅳ.11-14)，平均每 1 個標本戶潛水採集作業日數約 11

天，約每 3 天即採捕 1 次，主要採捕種類為黑碟貝，共採捕 74.25 公斤/戶，其次為龍蝦(31.25 公斤/戶)、文蛤(28.65 公斤/戶)、蝦蛄(17.55 公斤/戶)、加工前石花菜(15.45 公斤/戶)、加工後石花菜(8.00 公斤/戶)、海膽(6.88 公斤/戶)、貝菊(3.00 公斤/戶)、石菊(1.38 公斤/戶)、九孔(0.75 公斤/戶)等，其採捕平均產值約為 73,141.25 元/戶/月，較去年同期總採捕產值 81,99.00 元/戶/月約減少 10.80%

綜合沿岸採捕之調查可知，本季在涉水採捕中，4~6 月份均以加工前石花菜為主，平均產量為 76.58 公斤/戶、60.90 公斤/戶及 34.80 公斤/戶。在潛水採捕中，4~5 月份以加工前石花菜及 6 月份以黑碟貝為主，平均產量分別為 118.50 公斤/戶、72.45 公斤/戶及 74.25 公斤/戶。從涉水採捕與潛水採捕的產值來看，潛水採捕的產值較高，其原因可能是潛水作業時，可大量採捕定棲型黑碟貝之緣故，並且可捕獲高經濟價值之漁獲，如龍蝦、九孔、海膽...等。再將本季沿岸採捕（涉水、潛水採捕）之 CPUE、IPUE 與去年同期比較得知，101 年 4~6 月的平均 CPUE 分別為 15.41 公斤/日/戶、12.28 公斤/日/戶、11.39 公斤/日/戶，較去年同期 CPUE(23.43 公斤/日/戶、19.11 公斤/日/戶、27.71 公斤/日/戶) 減少 34.23%、35.74%及 58.90%；平均 IPUE 分別為 4,540.6 元/日/戶、5,495.1 元/日/戶、5,028.3 元/日/戶，較去年同期 IPUE(3,335.8 元/日/戶、3,221.9 元/日/戶、3,739.8 元/日/戶)增加 36.12%、70.55%、34.45%。

⑶娛樂漁業

101 年 4~6 月新北市貢寮地區娛樂漁業(標本船)平均每戶出海日數分別為 9.5 日/戶、10 日/戶及 8 日/戶，平均漁獲努力量分別為 8.63 支/日/戶、9.55 支/日/戶及 8.88 支/日/戶。其各月份之 CPUE 及 IPUE 詳表 2.12-17。

101 年 4 月間主要漁獲魚種以日本大眼鯛(*Cookeolus japonicus*，俗稱大目鰱)936.9 公斤/戶、赤鯨(*Dentex tumifrons*，俗稱赤鯨)141.9 公斤

/戶、三線雞魚(*Parapristipoma trilneatus*，俗稱黃雞母)100.0 公斤/戶、日本馬頭魚(*Branchiostegus japonoicus*，俗稱馬頭)96.1 公斤/戶、白條紋石狗公(Sebastiscus albofasciatus，俗稱石狗公)7.3 公斤/戶等為主，各魚種之漁獲量詳附錄Ⅳ.11-15。

101 年 5 月間主要漁獲魚種以大目鰱 858.3 公斤/戶、赤鯨 76.4 公斤/戶、刺鯧(*Psenopsis anomala*，俗稱土目)29.4 公斤/戶、馬頭 23.2 公斤/戶、齒鰆(*Sarda orentalis*，俗稱煙仔虎)11.4 公斤/戶、石斑魚(*Epinephelus* sp.，俗稱大石斑)8.1 公斤/戶、杜氏鰤(*Seriola dumerili*，俗稱紅甘)7.5 公斤/戶、石狗公 7.0 公斤/戶、無鰾鮹(*Helicolenus hilgendorfii*，俗稱紅黑喉)5.4 公斤/戶等為主，各魚種之漁獲量詳附錄Ⅳ.11-16。

101 年 6 月間主要漁獲魚種以大目鰱 877.5 公斤/戶、黃雞母 250.0 公斤/戶、赤鯨 125.0 公斤/戶、石狗公 24.5 公斤/戶、馬頭 24.0 公斤/戶等為主，各魚種之漁獲量詳附錄Ⅳ.11-17。

綜上可知，101 年 4~6 月娛樂漁業標本戶 CPUE 分別為 135.0 公斤/日/戶、102.7 公斤/日/戶和 162.6 公斤/日/戶，較去年同期月別 CPUE(280.5 公斤/日/戶、141.3 公斤/日/戶、163.3 公斤/日/戶)分別約減少 51.87%、27.32、0.43%。IPUE 則需考量燃料費等成本，亦即本季每艘海釣漁船淨收入為 366,000 元，又本季海釣漁船平均出海作業約 19 日，平均淨收入為 17,023.26 元/戶/日，約較去年同期(14,415.1 元/戶/日)增加 18.09%。

⑷魚苗漁業

貢寮沿海常見之魚苗種類有鰻魚苗、烏魚苗、花身仔、石斑魚苗、黑鯛魚苗等，由於各類魚苗漁業之漁期很短，其中又以鰻魚苗與烏魚苗為本區魚苗漁業之大宗，有固定魚販或業者進行魚苗之收購工作。因此魚苗漁業之資料來源主要來自於當地魚苗業者之買賣記錄，並以調查訪問實際漁撈魚苗之漁民的漁獲資料來核對買賣資料之正確性。

至於其作業法在貢寮區域屬於雜漁具類，因應魚苗種類之不同，所使用之採捕器具與方法亦不相同，主要有叉手網、待袋網、扒網及集魚燈等。

本季（101 年 4~6 月）貢寮地區無漁獲資料。

6.九孔及其他養殖漁業

(1)貢寮地區養殖戶（海上養殖池）基本資料

貢寮地區九孔養殖池均沿著海濱依地形不同分佈，本研究按九孔養殖戶集中的程度分成 4 段，分別是龍洞段有 19 戶、澳底段有 24 戶、香蘭段有 16 戶及馬崗段有 13 戶。經調查訪問結果顯示，貢寮區九孔養殖戶領有執照者總共有 72 戶，養殖總面積為 22 公頃 9,139 平方公尺，經由問卷調查和訪問的方式，得到了標本戶的基本資料，16 戶標本戶的總養殖面積為 58,765 平方公尺，其中龍洞段有 3 戶、澳底段有 8 戶、香蘭段有 3 戶及馬崗段有 2 戶，佔貢寮地區總養殖面積的 25.64%。本年度貢寮地區有 27 戶養殖九孔(本研究標本戶數 7 戶)，養殖面積為 108,224 平方公尺，8 戶為養殖鮑魚(本研究標本戶數 4 戶)，養殖面積為 45,303 平方公尺，10 戶為九孔及鮑魚混養(本研究標本戶數 5 戶)，養殖面積為 39,498 平方公尺，合計面積為 153,527 平方公尺，而本研究標本戶佔有養殖面積為 38.28%。

(2)貢寮地區養殖（海上養殖池）產量及產值

101 年 4~6 月（農曆 3 月 11 日至 5 月 12 日）間貢寮地區九孔養殖標本戶的總產量與總產值，分別為 3,507 公斤及 292.2 萬元，而鮑魚養殖標本戶的總產量與總產值，分別是 3,600 公斤及 311.0 萬元。養殖九孔最高產量為標本戶 4 的 1,800 公斤及 150.0 萬元，養殖鮑魚最高產量為標本戶 4 的 1,800 公斤及 153.0 萬元。（表 2.12-18、表 2.12-19）。由標本戶單位面積的產量來推估，101 年 4~6 月間貢寮地區多數九孔養殖標本戶皆處於放養階段，僅有 2 戶較為例外，有採收九孔，故不進行總產量與總產值推估。另由鮑魚標本戶單位面積的產

量來推估，101 年 4~6 月貢寮地區的鮑魚總產量為 11,122 公斤，總產值約為 960.8 萬元。

由調查資料發現養殖情況有逐漸復甦的情形，經實地訪問的結果顯示，本季部份樣本戶回復開始養殖九孔，其仔苗來源為日本的公貝及臺灣的母貝雜交的仔苗放養。本季共有 2 戶樣本戶（分別為樣本戶 3 及標本戶 4）採收九孔 3,507 公斤，產值為 292.2 萬元；今年鮑魚的養殖情況呈穩定狀態，受到鋒面及寒流的影響，養殖池需持續打氣與打水來維持水溫在 20℃左右，此溫度較適合鮑魚的成長，而樣本戶的採收規格大小約為 1 斤 13~20 粒的大小，本季共有 3 戶樣本戶（分別為樣本戶 9、11 及樣本戶 15）採收鮑魚 3,600 公斤，產值為 311.0 萬元。本季有 11 戶分別有放養鮑魚苗、九孔苗及海膽苗（表 2.12-20）。本季共放養九孔苗 627 萬粒，總成本為 1,241.7 萬元，平均每粒九孔苗 1.98 元。本季共放養鮑魚苗 20 萬粒，總成本為 40 萬元，平均每粒鮑魚苗 2 元。本季共放養海膽苗 3 萬粒，總成本為 30 萬元，平均每粒海膽苗 10 元。

今年已有部分的養殖戶開始養殖九孔，放養九孔的標本戶其仔苗來源為日本的公貝與台灣的母貝雜交的仔苗放養。而養殖鮑魚的養殖戶本季有採收，採收規格大小大約是 1 斤 13~20 粒左右，其成長情況穩定，往後將持續調查標本戶飼養九孔、鮑魚之狀況，以瞭解貢寮地區飼養九孔及鮑魚未來之發展。

表 2.12-1 九孔養殖戶平均生產狀況

年 \ 項目	月	養殖面積 (平方公尺/戶)	產量 (公斤/戶)	產值 (元/戶)	單價 (元/公斤)	單位面積產量 (公斤/平方公尺)
84	4	2,228.02	2,537.53	1,657,007	653	1.14
	5	2,228.02	2,305.05	1,546,689	671	1.03
	6	2,224.00	900.00	780,000	867	0.41
85	4	2,295.38	4,633.44	2,910,537	658	2.02
	5	2,295.38	2,372.55	1,654,463	677	1.03
	6	3,937.30	-	-	-	-
86	4	3,890.90	1,008.00	571,200	573	0.26
	5	3,890.90	-	-	-	-
	6	2,819.24	-	-	-	-
87	4	3,890.94	4,554.47	2,353,274	517	1.17
	5	3,890.94	820.00	460,464	562	0.21
	6	2,814.25	4,152.00	2,010,550	489	1.48
88	4	2,359.80	3,568.29	1,369,961	384	1.51
	5	2,359.80	1,924.32	804,800	418	0.82
	6	3,561.92	3,705.00	1,620,000	258	1.04
89	4	3,016.86	2,337.98	1,075,869	460	0.77
	5	1,413.25	615.85	321,672	522	0.44
	6	3,993.33	1,083.00	492,638	455	0.08
90	4	2,525.67	589.38	217,829	379	0.23
	5	2,289.00	1,098.37	356,871	366	0.48
	6	2,722.00	1,723.00	712,857	430	0.63
91	4	3,658.40	1,749.09	540,688	347	0.48
	5	3,615.33	2,681.49	914,731	353	0.79
	6	1,982.67	1,563.00	686,211	518	0.78
92	4	1,957.00	-	-	-	-
	5	1,957.00	-	-	-	-
	6	2,429.00	-	-	-	-
93	4	3,389.00	5,600.00	2,702,000	793	0.99
	5	3,389.00	3,000.00	1,350,000	750	0.53
	6	2,097.00	-	-	-	-
94	4	2,088.00	210.00	150,500	717	0.10
	5	3,481.00	7,500.00	5,377,500	717	2.15
	6	2,322.00	-	-	-	-
95	4	4,896.44	-	-	-	-
	5	4,896.44	3,120.00	1,769,040	340	0.14
	6	4,896.44	-	-	-	-

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-1 九孔養殖戶平均生產狀況（續）

年＼項目	月	養殖面積 (平方公尺/戶)	產量 (公斤/戶)	產值 (元/戶)	單價 (元/公斤)	單位面積產量 (公斤/平方公尺)
96	4	5,823.29	1,560.00	1,170,000	750	0.27
	5	5,823.29	600.00	450,000	750	0.10
	6	5,823.29	-	-	-	-
97	4	5,823.29	-	-	-	-
	5	5,823.29	-	-	-	-
	6	5,823.29	-	-	-	-
98	4	6,637.60	-	-	-	-
	5	6,637.60	-	-	-	-
	6	6,637.60	-	-	-	-
99	4	4,648.22	1,200	920,000	767	0.26
	5	4,648.22	1,860	1,395,000	750	0.40
	6	4,648.22	900	675,000	750	0.19
100	4	4,415.67	210	140,000	667	0.05
	5	4,415.67	-	-	-	-
	6	4,415.67	-	-	-	-
101	4	5,073.11	425	354,167	833	0.08
	5	4,415.67	-	-	-	-
	6	4,415.67	2,958	821,759	833	0.67

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-2 鮑魚養殖戶平均生產狀況

年＼項目	月	養殖面積 (平方公尺/戶)	產量 (公斤/戶)	產值 (元/戶)	單價 (元/公斤)	單位面積產量 (公斤/平方公尺)
98	4	3,000.00	-	-	-	-
	5	3,000.00	-	-	-	-
	6	3,000.00	-	-	-	-
99	4	3,041.33	640	514,000	803	0.21
	5	3,041.33	1,500	1,250,000	833	0.49
	6	3,041.33	900	750,000	833	0.30
100	4	2,269.00	428	313,500	733	0.19
	5	2,269.00	-	-	-	-
	6	2,269.00	450	435,000	967	0.20
101	4	3,049.00	1667	1,439,815	856	0.55
	5	2,823.88	-	-	-	-
	6	2,823.88	-	-	-	-

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-3 九孔養殖戶平均成本

單位：元/戶

年 \ 項目 / 月		電費	飼料費	損耗維修費	薪資支出	總計
84	4	12,979	109,732	39,520	134,192	296,424
	5	45,609	87,181	131,200	98,042	362,032
	6	47,958	97,839	334,000	41,800	521,597
85	4	12,637	119,412	33,800	126,900	292,749
	5	41,697	100,000	131,200	295,500	568,397
	6	28,678	188,357	20,000	81,667	318,702
86	4	32,465	201,588	14,889	114,455	363,396
	5	29,611	183,333	9,834	114,167	336,945
	6	24,317	200,200	11,903	76,000	312,420
87	4	31,658	138,688	97,500	115,375	383,221
	5	30,735	217,294	121,875	147,000	516,904
	6	111,897	139,865	229,347	174,903	656,011
88	4	7,238	89,881	13,000	104,729	214,848
	5	8,481	73,679	50,000	95,967	228,127
	6	51,294	149,212	124,000	85,125	409,631
89	4	25,287	83,228	-	141,246	249,761
	5	27,259	130,717	-	92,450	250,426
	6	52,997	186,678	186,667	87,000	513,342
90	4	57,077	141,554	10,838	191,789	401,258
	5	57,712	176,676	6,154	119,079	359,621
	6	57,954	412,858	3,286	62,393	536,490
91	4	46,250	111,971	31,110	116,321	305,652
	5	48,468	133,968	31,375	129,765	343,576
	6	50,764	101,457	11,121	68,400	231,742
92	4	500.0	10,000	15,904	26,000	52,404
	5	450	35,000	315,000	35,000	385,450
	6	8,598	120,567	19,428	76,667	225,259
93	4	10,477	35,543	25,575	57,387	128,982
	5	9,300	44,675	23,500	43,333	120,808
	6	15,800	71,164	10,667	38,333	135,964
94	4	8,932	38,511	32,667	25,800	105,910
	5	16,250	39,200	31,000	90,000	176,450
	6	6,250	61,583	4,333	14,560	86,726
95	4	49,667	81,250	10,667	74,000	215,583
	5	49,286	64,238	35,000	80,000	228,523
	6	39,000	83,725	22,500	74,000	219,225
96	4	28,120	20,250	38,000	76,667	163,037
	5	34,120	20,250	72,000	76,667	203,037
	6	36,320	5,500	36,500	76,667	154,987

表 2.12-3 九孔養殖戶平均成本（續）

單位：元/戶

年 \ 項目	月	電費	飼料費	損耗維修費	薪資支出	總計
97	4	6,500	54,400	75,000	45,000	180,900
	5	6,500	46,700	92,500	45,000	190,700
	6	34,143	82,671	25,500	45,000	187,314
98	4	5,124	11,500	10,000	20,000	46,624
	5	5,416	10,125	10,000	22,500	48,041
	6	24,562	12,100	23,500	32,500	92,662
99	4	23,633	44,429	15,889	19,444	103,395
	5	32,944	41,007	9,778	18,889	102,618
	6	27,411	42,712	10,222	18,889	99,234
100	4	20,472	55,767	2,417	17,083	95,739
	5	24,505	54,858	512	17,083	96,958
	6	23,222	48,046	1,768	22,500	95,536
101	4	22,655	40,561	-	19,667	82,883
	5	20,200	45,046	-	19,333	84,579
	6	21,875	48,666	-	17,667	88,208
101年 4-6月平均		21,577	44,758	-	18,889	85,223

註：- 表該項該月無資料。1~3 月僅一家標本戶養殖九孔。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-4 鮑魚養殖戶平均成本

單位：元/戶

年 \ 項目	月	電費	飼料費	損耗維修費	薪資支出	總計
98	4	1,500	7,500	-	-	9,000
	5	1,500	7,500	-	-	9,000
	6	1,500	7,500	-	-	9,000
99	4	8,433	35,333	8,333	5,500	57,599
	5	8,433	28,667	8,333	38,333	83,766
	6	9,433	29,500	8,333	11,483	58,749
100	4	13,875	52,000	-	7,500	73,375
	5	13,875	52,000	-	7,500	73,375
	6	13,750	63,250	-	7,500	84,500
101	4	7,625	37,500	-	18,750	63,875
	5	8,500	37,312	-	12,750	58,562
	6	8,512	36,925	-	13,375	58,812
100年 4-6月平均		8,212	37,246	-	14,958	60,416

註："-"表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-5 漁撈戶每月出海次數

單位：%

年 \ 項目 / 月		平均次數	5 次以下	6~10 次	11~15 次	16~20 次	21~25 次	26 次以上
84	4	13	10.00	35.00	25.00	30.00	-	-
	5	13	22.73	13.64	31.82	31.82	-	-
	6	12	21.74	26.09	21.74	30.43	-	-
85	4	12	9.52	33.33	28.57	28.57	-	-
	5	13	17.39	21.74	26.09	34.78	-	-
	6	12	23.81	28.57	14.29	33.33	-	-
86	4	8	33.33	44.44	16.67	5.56	-	-
	5	9	23.53	47.06	17.65	11.76	-	-
	6	8	15.00	70.00	10.00	5.00	-	-
87	4	10	11.76	41.18	41.18	5.88	-	-
	5	11	13.33	40.00	40.00	6.67	-	-
	6	10	11.11	50.00	27.78	11.11	-	-
88	4	9	15.79	47.37	31.58	5.26	-	-
	5	12	14.29	57.14	19.05	9.52	-	-
	6	9	21.05	36.84	31.58	10.53	-	-
89	4	9	15.00	65.00	10.00	10.00	-	-
	5	9	14.29	71.42	14.29	-	-	-
	6	10	14.29	42.86	23.81	19.05	-	-
90	4	9	29.41	47.06	17.65	5.88	-	-
	5	10	11.11	55.56	27.78	-	5.56	-
	6	13	20.04	45.96	10.57	-	14.43	9.00
91	4	9	35.14	49.15	11.15	4.56	-	-
	5	7	19.88	47.15	24.15	7.31	1.51	-
	6	12	13.46	35.17	32.45	15.46	3.46	-
92	4	9	58.82	17.64	5.88	5.88	-	11.76
	5	10	17.64	35.29	11.76	5.88	-	11.76
	6	15	18.37	20.63	23.75	25.86	7.95	3.44
93	4	11	9.62	42.86	40.00	7.52	-	-
	5	12	4.27	46.14	41.71	7.88	-	-
	6	13	12.84	26.47	35.68	10.10	12.62	2.29
94	4	4	83.33	16.67	-	-	-	-
	5	12	-	55.55	22.22	11.11	11.11	-
	6	23	9.09	9.09	13.64	13.64	22.73	31.82
95	4	9	28.00	36.00	28.00	8.00	-	-
	5	13	4.00	36.00	32.00	24.00	4.00	-
	6	13	8.00	24.00	40.00	16.00	12.00	-
96	4	9	6.06	41.56	42.42	-	9.96	-
	5	10	3.77	47.92	33.96	6.04	8.30	-
	6	11	3.36	31.54	25.50	24.50	15.10	-
97	4	9	12.50	41.67	41.67	4.17	-	-
	5	10	-	54.17	37.50	8.33	-	-
	6	13	11.54	26.92	26.92	19.23	7.69	7.69
98	4	7	36.00	56.00	8.00	-	-	-
	5	9	18.18	50.00	31.82	-	-	-
	6	13	8.70	39.13	26.09	13.04	13.04	-
99	4	8	29.17	45.83	25.00	-	-	-
	5	10	11.54	42.31	34.62	11.54	-	-
	6	13	8.00	28.00	36.00	16.00	8.00	4.00
100	4	11	16.67	33.33	33.33	12.50	4.17	-
	5	12	12.00	40.00	28.00	8.00	12.00	-
	6	12	4.00	40.00	28.00	24.00	4.00	-
101	4	11	21.74	30.43	43.48	13.04	0.00	4.35
	5	12	4.35	39.13	30.43	21.74	8.70	0.00
	6	13	4.35	30.43	43.48	13.04	0.09	0.00

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-6 漁撈戶各月作業漁法作業次數百分比

單位：%

年 \ 項目 / 月		拖網	沿岸採捕	圍網	燈火漁業	牽觔仔	刺網	曳繩釣	一支釣	延繩釣	定置網	飛魚卵
84	4	-	-	3.85	30.77	-	42.31	3.85	11.54	-	3.85	-
	5	3.45	-	3.45	27.59	-	41.38	6.90	3.54	3.45	3.45	-
	6	7.69	-	3.85	23.08	3.85	50.00	7.69	-	3.85	-	-
85	4	-	-	4.35	8.70	-	47.83	8.70	17.04	4.35	4.35	-
	5	4.00	-	4.00	16.00	-	44.00	8.00	8.00	8.00	4.00	-
	6	-	-	4.76	9.52	4.76	-	-	14.29	52.38	9.52	-
86	4	5.00	25.00	-	-	-	15.00	10.00	20.00	25.00	-	-
	5	-	30.00	-	40.00	-	15.00	-	10.00	-	-	-
	6	-	43.75	-	37.5	-	-	-	5.25	-	-	12.50
87	4	-	29.42	-	11.76	-	11.76	-	35.30	11.76	-	-
	5	-	33.33	-	13.33	-	6.68	-	33.33	13.33	-	-
	6	-	33.33	-	11.11	-	11.11	-	38.89	5.56	-	-
88	4	5.26	36.84	-	26.32	-	10.53	-	21.05	-	-	-
	5	-	33.33	-	33.33	-	14.29	-	14.29	4.76	-	-
	6	-	36.84	-	20.06	-	10.53	5.26	15.79	5.26	-	5.26
89	4	-	35.00	5.00	10.00	-	10.00	-	40.00	-	-	-
	5	-	31.58	5.26	10.53	-	10.53	5.26	36.84	-	-	-
	6	-	33.33	4.76	28.57	-	9.52	-	23.57	-	-	-
90	4	-	31.82	-	13.64	-	-	9.09	45.45	-	-	-
	5	-	33.33	-	33.33	-	-	-	33.33	-	-	-
	6	-	10.39	-	30.34	-	11.81	-	47.45	-	-	-
91	4	-	30.08	-	13.58	-	-	9.09	47.25	-	-	-
	5	-	35.27	-	30.16	-	-	-	34.57	-	-	-
	6	-	33.33	-	28.74	-	13.17	-	16.30	-	-	-
92	4	-	31.31	-	22.37	-	8.95	-	37.36	-	-	-
	5	-	28.33	-	28.33	-	12.15	-	27.15	4.05	-	-
	6	-	19.04	-	15.27	-	33.45	-	32.25	-	-	-

表 2.12-6 漁撈戶各月作業漁法作業次數百分比（續）

單位：%

年 \ 項目 / 月		拖網	沿岸採捕	圍網	燈火漁業	牽魚仔	刺網	曳繩釣	一支釣	延繩釣	定置網	飛魚卵
93	4	-	30.37	-	21.43	-	10.55	5.00	32.65	-	-	-
	5	-	29.85	-	23.45	-	14.29	-	27.86	4.55	-	-
	6	-	12.61	-	28.62	-	32.45	-	23.86	-	-	2.46
94	4	-	32.00	-	24.00	-	12.00	8.00	16.00	12.00	-	-
	5	-	38.44	-	48.05	-	-	-	6.31	7.21	-	-
	6	-	9.78	-	15.43	-	38.02	-	29.20	-	-	-
95	4	-	27.46	-	7.80	2.37	18.98	4.75	38.64	-	-	-
	5	-	18.37	-	32.81	2.36	17.06	5.51	23.10	-	-	0.79
	6	-	21.49	-	32.89	-	16.71	4.24	22.81	-	-	1.86
96	4	-	15.20	-	3.38	0.34	30.41	1.69	46.62	2.36	-	-
	5	-	14.12	-	19.12	1.47	26.18	1.18	37.94	-	-	-
	6	-	13.02	-	40.44	--	19.67	-	26.87	-	-	-
97	4	-	23.44	-	8.13	1.88	25.00	4.69	33.13	2.81	-	-
	5	-	22.92	-	27.08	-	21.43	0.30	25.60	2.08	-	-
	6	-	18.66	-	41.39	-	14.11	-	22.73	1.91	-	-
98	4	-	31.62	-	8.09	0.74	15.07	6.99	33.82	3.68	-	-
	5	-	30.12	-	21.99	1.81	13.55	0.60	30.42	1.51	-	-
	6	-	23.38	-	41.29	-	11.94	-	21.39	1.99	-	-
99	4	2.36	33.33	-	5.05	2.36	16.16	2.36	33.67	3.37	1.35	-
	5	0.27	26.20	-	19.52	1.87	17.91	0.53	24.06	1.60	8.02	-
	6	-	24.13	-	37.12	-	12.06	-	19.03	2.32	5.34	-
100	4	2.15	26.61	-	-	1.88	20.97	11.56	29.30	2.69	4.84	-
	5	0.59	16.13	-	25.81	0.88	25.22	-	19.94	3.52	7.92	-
	6	-	22.56	-	29.23	-	18.97	-	18.72	2.56	7.95	-
101	4	4.74	-	-	19.34	-	32.12	-	41.24	4.38	0.00	-
	5	1.39	0.00		19.51	0.00	33.10		13.59	3.14	0.00	1.39
	6	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	27.74	21.58	15.75	4.11	0.00	0.00

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-7 漁撈戶每月之平均漁獲產量

單位：公斤/戶、元/戶

項目 / 年	月	軟絲 (*Sepioteuthis lessoniana*)		黑毛 (*Sepia esculenta*)		白毛 (*Kyphosus lembus*)		紅甘 (*Seriola dumerili*)		花枝 (*Sepia esculenta*)		赤宗(赤鯨) (*Dentex tumifrons*)		小卷 (*Neritic Squid*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
84	4	35.1	18,975	56.0	7,633	26.4	11,000	-	-	120.0	20,000	-	-	-	-
	5	27.6	14,750	12.0	5,467	30.0	10,000	11.4	21,600	-	-	-	-	-	-
	6	57.0	32,983	13.0	5,930	26.0	10,640	21.0	21,550	-	-	-	-	-	-
85	4	35.1	18,975	182.0	26,725	26.7	11,333	-	-	120.0	22,000	-	-	-	-
	5	47.5	16,438	172.5	26,150	50.0	10,000	18.0	16,200	-	-	-	-	-	-
	6	57.0	32,983	13.0	5,930	26.0	10,640	29.0	31,650	-	-	-	-	-	-
86	4	3.6	1,380	2	1,018	40.8	18,360	6.3	2,279	22.1	4,761	68.3	23,324	-	-
	5	2.2	860	-	-	7.5	2,500	6.7	819	9.6	2,083	33.0	8,283	-	-
	6	-	-	1.0	120	6.0	1,852	-	-	-	-	176.0	89,090	63.0	11,346
87	4	10.7	4,838	-	-	36.0	15,000	-	-	32.0	7,032	330.0	132,150	-	-
	5	3.0	1,220	1.8	900	3.9	1,420	-	-	9.3	2,010	152.0	47,950	-	-
	6	6.0	3,000	-	-	1.0	300	-	-	-	-	155.0	86,467	272.0	64,690
88	4	5.1	1,500	-	-	-	-	11.7	2,955	19.2	4,075	296.8	74,200	-	-
	5	4.8	1,308	2.9	1,121	4.0	1,363	2.7	900	29.6	5,493	477.0	119,250	-	-
	6	2.0	768	-	-	11.0	3,850	-	-	-	-	35.0	15,339	21.0	4,273
89	4	9.6	4,519	1.4	786	5.8	2,101	10.6	3,307	11.1	2,127	59.9	20,200	-	-
	5	4.6	2,233	1.6	842	6.3	2,290	1.2	323	1.7	392	67.4	23,240	-	-
	6	1.0	673	-	-	6.0	1,879	-	-	-	-	30.0	15,214	70.0	12,197
90	4	10.1	4,809	0.7	316	4.3	1,532	16.2	4,299	4.3	787	96.5	32,627	-	-
	5	6.1	2,430	9.9	5,124	6.3	2,509	1.6	447	4.7	931	42.0	14,879	-	-
	6	4.9	2,174	7.3	1,328	53.1	19,465	10.2	3,400	-	-	60.6	28,978	78.89	13,058
91	4	22.50	6,300	21.44	6,003	3.32	664	7.32	1,098	22.47	6,292	132.51	13,251	-	-
	5	17.13	4,796	13.15	3,682	4.21	842	4.21	632	47.35	13,258	147.58	14,758	-	-
	6	3.0	1,269	1.0	182	3.0	1,095	-	-	-	-	81.0	38,779	9.0	1,520
92	4	4	2.5	1,122	5.9	2,547.9	0.9	340	2.3	501.2	5.0	9.4	5,363	5,363	-
	5	5	5.2	1,700	0.4	212.9	1.3	471	0.7	138.5	2.0	17.8	8,784	8,784	-
	6	6	3.0	1,244	1.0	444	1.0	406	2.0	420	-	14.0	7,846	7,846	9.0
93	4	4.8	2,278	0.5	259	1.4	524	3.9	928	4.0	664	44.1	23,824	-	-
	5	3.0	1,326	0.6	388	1.8	686	1.2	235	2.6	496	67.8	26,551	-	-
	6	0.8	443	0.2	85	1.6	598	17.0	3,198	-	-	9.0	4,563	1.7	298

表 2.12-7 漁撈戶每月之平均漁獲產量（續 1）

單位：公斤/戶、元/戶

項目 / 年	月	軟絲 (*Sepioteuthis lessoniana*)		黑毛 (*Sepia esculenta*)		白毛 (*Kyphosus lembus*)		紅甘 (*Seriola dumerili*)		花枝 (*Sepia esculenta*)		赤宗(赤鯨) (*Dentex tumifrons*)		小卷 (*Neritic Squid*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
94	4	4.0	2,316	0.6	285	1.5	507	2.7	555	1.4	259	80.5	17,463	-	-
	5	0.3	140	0.3	166	1.1	350	1.2	238	2.5	419	62.6	16,535	-	-
	6	1.9	459	2.0	652	3.3	637	4.1	718	-	-	194.7	58,353	7.0	1,667
95	4	4.9	2,195	0.3	125	0.3	107	10.1	2,330	1.8	320	102.0	31,514	41.3	6,264
	5	3.6	1,614	0.1	57	0.7	244	2.5	655	1.5	254	38.5	10,835	52.5	6,682
	6	2.3	1,117	0.3	67	1.5	563	1.8	432	0.4	85	17.1	6,023	6.0	1,531
96	4	4.0	1,802	0.4	217	0.7	248	1.5	324	2.7	435	30.6	9,290	60.9	8,095
	5	1.7	779	0.8	487	0.7	289	1.5	359	1.7	297	19.1	6,483	3.7	613
	6	0.5	206	0.6	355	1.1	457	0.7	132	0.6	119	8.6	3,426	5.2	1,116
97	4	3.3	1,499	0.5	254	4.4	1,355	3.3	554	12.7	2,102	34.4	11,897	53.4	9309
	5	2.4	1,126	0.2	93	2.8	1,110	0.7	148	5.4	1,025	11.6	3,448	20.1	3,249
	6	0.9	404	0.7	297	0.3	123	2.4	429	2.0	419	7.7	3,586	11.4	538
98	4	4.3	1,994	0.9	522	1.2	462	3.4	910	4.2	811	4.9	2,703	18.2	3,525
	5	1.3	577	0.1	49	0.3	137	1.7	508	1.4	203	8.2	4,228	14.7	3,428
	6	0.7	332	-	13	0.5	208	11.3	1,527	2.2	449	8.1	4,219	-	-
99	4	4.5	2,032	0.9	423	1.8	737	2.5	630	2.0	419	6.3	3,160	12.8	101
	5	1.3	584	0.4	219	2.8	1,036	3.4	876	0.8	172	7.9	4,140	10.8	2,523
	6	0.2	80	0.4	158	1.1	396	1.2	350	0.5	108	3.8	2,355	0.9	156
100	4	4.6	2,096	0.3	131	0.7	271	12.9	3,776	5.0	1,043	11.2	5,199	0.9	489
	5	1.6	747	0.1	45	1.0	363	1.5	349	2.4	472	6.9	3,358	-	-
	6	0.3	143	0.1	26	4.6	1,548	0.5	169	0.9	181	4.1	2,017	-	13
101	4	8.2	3,967.2	0.5	258.2	3.8	1,533.0	0.4	94.8	11.9	2,497.1	20.7	12,346.	291.0	40,533.
	5	2.6	1,192	0.5	320	1.0	379	1.4	341	0.8	162	11.2	5800	-	-
	6	1.2	561	0.2	129	1.4	570	4.7	989	0.8	177	13.7	6,365	0.0	0.0
101 年 4~6 月總和		12.0	5,720	1.2	707	6.2	2,482	6.5	1,425	13.5	2,836	45.6	24,511	291.0	40,533
101 年 4~6 月平均		4.0	1,907	0.4	236	2.1	827	2.2	475	4.5	945	15.2	8,170	145.5	20,267

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-7 漁撈戶每月之平均漁獲產量（續 2）

單位：公斤/戶、元//戶

年	月	魩仔魚		紅目鰱(紅目大眼鯛) (*Cookeolus boops*)		龍蝦(龍蝦) (Penulirus Japanicus)		石狗公(石狗公) (*Sebastiscus albofasciatus*)		煙仔虎(齒鰆) (*Sarda orientalis*)		煙管仔(圓花鰹) (*Auxis rochei*)		其他 (*Others*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
84	4	480.0	160,000	-	-	48.0	48,875	6.0	2,500	-	-	-	-	140.0	34,656
	5	368.0	106,007	-	-	66.8	67,375	-	-	-	-	-	-	137.0	14,923
	6	-	-	-	-			-	-			-	-	185.0	46,352
85	4	-	-	-	-	48.0	48,875	193.0	29,333	-	-	-	-	155.7	34,262
	5	170.0	250,000	-	-	82.5	55,820	98.5	23,825	-	-	-	-	220.9	30,413
	6	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	185.0	46,352
86	4	67.8	28,330	120.0	67,800	9.1	9,926	23.1	12,875	724.0	57,600	-	-	63.78	10,984
	5	80.4	21,870	60.0	33,900	-	-	9.6	2400	963.6	35,126	-	-	704.4	45,869
	6	-	-	-	-			-	-	-	-	5,845	66,235	59.0	11,150
87	4	-	-	122.0	17,800	54.4	61,689	53.0	10,600	2,242.2	114,180	-	-	256.6	34,793
	5	-	-	2.4	120	22.8	26,600	19.0	4,000	246.0	13,120	-	-	149.5	20,675
	6	-	-	-	-			-	-	316.0	17,955	-	-	1,976.0	183,700
88	4	-	-	161.0	80,500	23.4	21,510	39.8	14,614	1,378.7	46,313	-	-	110.5	14,962
	5	2566.0	641,500	311.0	103,667	24.5	21,421	76.0	37,633	434.0	16,260	-	-	42.0	16,600
	6	-	-	-	-			-	-	-	-	4,634	64,364	32.0	15,693
89	4	213.9	21,392	68.0	13,600	7.3	7,432	23.9	5,088	529.6	25,989	-	-	5.99	621
	5	423.8	43,201	1.9	200	5.3	5,184	30.7	8,171	56.2	1,629	-	-	7.86	728
	6	-	-	-	-			-	-	5.0	278	2,995	48,651	6.0	1,509
90	4	-	-	1.1	109	7.8	7,452	17.0	3,661	503.7	17,039	-	-	2.8	491
	5	-	-	0.6	165	4.7	4,084	17.0	4,614	147.5	4,893	-	-	0.4	106
	6	-	-	-	-			-	-	130.2	6,422	4,085	50,657	26.8	5,039
91	4	-	-	0.7	245	15.1	9,072	22.8	13,680	566.1	11,323	-	-	97.8	8,316
	5	-	-	2.5	875	6.4	3,882	78.1	46,890	678.56	13,571	-	-	131.5	11,178
	6	-	-	-	-			-	-	8.0	418	4,061	50,355	841.0	158,092

表 2.12-7 漁撈戶每月之平均漁獲產量（續 3）

單位：公斤/戶、元//戶

年	月	魩仔魚		紅目鰱(紅目大眼鯛) (*Cookeolus boops*)		龍蝦(龍蝦) (Penulirus Japanicus)		石狗公(石狗公) (*Sebastiscus albofasciatus*)		煙仔虎(齒鰆) (*Sarda orientalis*)		煙管仔(圓花鰹) (*Auxis rochei*)		其他 (*Others*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
92	4	13.7	2,080.0	0.2	43.1	1.2	1,206.2	1.9	697.2	598.1	25,701	-	-	342.8	26,015
	5	5.7	842.1	-	-	2.6	2,468.7	2.4	886.8	185.7	8,741	-	-	1,592.3	51,912
	6	14.0	724	-	-			-	-	-	-	5,634	32,253	1,921.0	24,798
93	4	182.4	182	-	-	6.8	6,804	8.1	2,267	150.0	8,563	-	-	452.8	37,596
	5	22.7	23	0.2	74	3.2	3,212	20.5	5,446	0.4	35	-	-	4,256.2	64,856
	6	-	-	-	-			-	-	24	269	12,367	163,692	2,544.1	27,882
94	4	165.0	16,500	-	-	7.3	6,887	6.7	983	279.0	10,636	-	-	105.4	20,601
	5	1,864.0	186,400	-	-	9.2	8,702	5.3	1,000	1.1	55	-	-	2,714.3	45,069
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	240	8,705	99,577	392.9	51,597
95	4	236.5	39,735	0.5	82	21.1	16,988	20.4	1,611	82.5	5,980	5.2	89	174.2	39,056
	5	781.5	93,787	0.2	79	4.6	4,282	37.2	7,197	3.2	214	8,435.3	116,218	223.6	21,003
	6	2.0	-	0.5	234	5.7	5,203	18.7	3,929	-	-	13,385.6	179,909	171.9	17,670
96	4	6.0	688	-	14	12.5	13,439	19.0	4,409	188.9	11,486	18.8	676	155.2	29,062
	5	29.4	2,438	0.1	34	6.1	5,749	22.3	5,056	204.4	13,356	2,221.5	26,543	148.6	19,582
	6	-	-	0.2	80	10.0	9,205	11.2	2,999	-	-	2,959.2	32,991	136.1	13,726
97	4	5.3	1,067	2.4	442	7.0	6,017	9.7	2,828	226.5	19,115	132.9	2,254	3,002.8	111,981
	5	-	-	-	-	5.1	4,602	7.9	1,467	4.5	413	4,136.3	77,347	2,682.7	79,954
	6	-	-	-	10	5.4	4,569	4.7	1,644	-	-	8,511.5	164,578	9,071.7	159,684
98	4	14.0	1,914	2.6	888	0.1	101	2.5	952	109.7	9,070	-	-	3,960.3	98,197
	5	1.0	172	0.5	178	1.1	1,181	4.1	1,503	55.0	4,728	3,893.3	78,201	112.8	12,578
	6	-	-	-	-	2.2	2,469	5.2	1,957	-	-	13,718.0	282,359	695.8	18,560

表 2.12-7 漁撈戶每月之平均漁獲產量（續 4）

單位：公斤/戶、元//戶

項目 / 年	月	魩仔魚		紅目鰱(紅目大眼鯛) (*Cookeolus boops*)		龍蝦(龍蝦) (Penulirus Japanicus)		石狗公(石狗公) (*Sebastiscus albofasciatus*)		煙仔虎(齒鰆) (*Sarda orientalis*)		煙管仔(圓花鰹) (*Auxis rochei*)		其他 (*Others*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
99	4	3.0	150	0.1	38	3.1	3,688	3.0	1,134	2.2	400	4.3	86	2,189.2	70,390
	5	2.2	555	-	12	3.6	4,276	3.6	1,269	2.0	325	2,682.8	43,032	2,752.7	69,597
	6	-	-	-	13	3.6	4,319	4.2	1,433	-	-	11,689.1	187,026	3,101.0	80,499
100	4	16.7	5,136	0.1	22	8.4	11,278	3.6	1,233	-	-	-	-	2,248.4	2,248
	5	16.6	3,300	0.1	35	6.7	8,674	4.5	1,580	-	-	4,107.5	92,858	7,463.4	215,372
	6	0.0	0	0.7	326	5.4	7,044	4.5	1,557	17.2	1,841	8,906.2	155,213	25,604.8	729,853
101	4	38.8	8,506.5	-	-	6.4	8,394.6	4.1	1,362.0	38.8	3,390.4	0.0	0.0	15,552	491,299
	5	7.8	548	-	-	7.9	10696	1.5	473	68.8	3961	1,441.3	28607	11,382.1	399968
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4,656	2.7	934	229.7	7,527	2,087.1	38,961	11,456.7	416,019
101 年 4~6 月總和		46.6	9,055	0	0	17.4	23,747	8.3	2,769	337.3	14,878	3528.4	67,568	38390.8	1,307,286
101 年 4~6 月平均		15.5	3,018	0	0	5.8	7,916	2.8	923	112.4	4,959	1176.1	22,523	12796.9	435,762

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)第 2 次中間報告，民國 101 年 8 月。

表 2.12-8 漁撈戶銷售狀況

單位：%

年 \ 銷路 / 月		承銷商	魚販	餐廳	自食或送人	自行銷售	其他
84	4	20.00	-	11.00	5.00	64.00	-
	5	21.74	-	8.26	4.35	65.65	-
	6	4.55	13.64	17.73	-	64.09	-
85	4	19.04	-	4.76	60.96	15.24	-
	5	20.00	-	4.00	60.40	15.60	-
	6	1.34	27.26	18.17	-	53.24	-
86	4	57.44	2.82	9.83	11.84	18.07	-
	5	48.63	5.24	1.28	0.93	17.82	26.10
	6	45.46	8.03	0.41	1.95	7.99	36.16
87	4	16.89	4.42	2.95	28.18	44.47	3.09
	5	15.28	6.40	12.57	16.16	47.18	2.41
	6	2.24	11.49	0.43	2.2	9.27	74.37
88	4	44.09	14.95	0.84	10.91	29.21	-
	5	27.12	22.60	1.12	18.96	30.20	-
	6	47.32	22.22	2.38	1.56	26.53	-
89	4	-	1.57	6.19	25.34	66.90	-
	5	-	2.57	8.30	38.46	50.32	0.35
	6	-	0.72	0.39	2.16	96.73	5.44
90	4	-	0.33	0.35	26.40	72.91	-
	5	0.89	0.26	33.60	9.45	55.80	-
	6	16.72	4.52	8.90	5.48	64.38	-
91	4	4.32	8.33	5.87	7.35	74.13	-
	5	17.44	6.54	9.75	8.37	57.90	-
	6	6.35	3.15	1.38	0.65	88.47	-
92	4	27.55	52.07	32.26	34.48	25.03	-
	5	58.20	16.53	36.74	45.98	47.50	-
	6	1.81	4.69	1.44	5.05	87.00	-
93	4	18.47	0.02	6.36	8.97	66.18	-
	5	5.84	43.18	9.86	8.65	32.47	-
	6	1.23	1.67	2.12	26.45	68.53	-
94	4	26.75	7.25	32.25	14.25	19.50	-
	5	65.04	-	8.11	-	24.98	1.87
	6	53.50	1.30	5.10	-	40.14	-
95	4	4.26	10.64	24.47	-	60.64	-
	5	53.42	0.68	4.10	-	41.78	-
	6	58.49	-	1.89	-	39.62	-
96	4	-	-	37.21	-	62.79	-
	5	45.18	-	13.86	-	40.96	-
	6	61.42	-	3.94	-	34.65	-
97	4	30.95	11.91	-	-	57.14	-
	5	80.00	0.56	-	-	8.89	10.56
	6	95.38	-	-	1.16	3.47	-
98	4	17.02	8.51	-	19.15	55.32	-
	5	54.67	9.33	10.67	13.33	12.00	-
	6	77.60	0.97	-	-	21.43	-
99	4	16.13	6.45	3.23	-	74.19	-
	5	82.79	2.69	-	0.19	14.33	-
	6	78.09	0.84	-	-	20.51	0.56
100	4	-	1.09	14.13	-	78.26	6.52
	5	81.58	-	-	-	18.42	-
	6	100.00	-	-	-	-	-
101	4	-	23.53	-	-	76.47	-
	5	47.92	6.25	-	-	45.83	-
	6	56.80	3.70	-	-	39.51	-

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-9 漁撈戶平均成本

單位：元/戶

年 \ 成本	月	燃料油費	餌料費	雜支費	維修費	總計
84	4	9,738	3,425	3,873	12,131	29,167
	5	6,695	7,400	7,923	12,917	34,935
	6	4,829	5,538	2,595	16,600	29,562
85	4	9,588	2,840	4,373	14,460	31,261
	5	7,182	7,400	5,376	12,083	32,041
	6	3,852	5,538	2,595	9,500	21,485
86	4	7,678	1,470	3,204	4,725	17,077
	5	4,888	2,637	2,816	14,010	24,351
	6	6,627	3,750	2,754	3,367	16,498
87	4	4,841	2,980	3,517	500	11,838
	5	4,702	2,300	4,525	500	12,027
	6	7,413	2,335	3,928	3,447	17,123
88	4	4,099	5,800	3,782	24,883	38,564
	5	5,577	2,950	3,250	8,500	20,277
	6	6,652	1,917	4,136	5,500	18,205
89	4	6,556	1,150	3,426	1,380	12,512
	5	5,623	1,515	1,823	110	9,071
	6	8,936	848	3,205	450	13,439
90	4	4,456	1,386	3,527	171	9,540
	5	7,650	263	2,798	2,500	13,210
	6	7,110	659	4,315	200	12,290
91	4	6,845	2,341	1,983	374	11,543
	5	5,486	2,654	2,015	1,754	11,909
	6	11,833	987	6,382	1,832	21,034
92	4	6,255	1,125	1,365	131	8,876
	5	7,515	1,083	1,092	866	10,556
	6	13,116	785	3,302	267	17,469
93	4	9,682	1,237	2,315	575	13,809
	5	6,880	915	2,951	695	11,441
	6	11,245	891	5,893	368	18,397
94	4	7,116	429	1,850	-	9,394
	5	18,224	556	6,374	-	25,154
	6	24,324	1,111	5,866	-	31,301
95	4	6,859	778	4,889	-	12,526
	5	16,990	598	8,751	-	26,339
	6	22,481	639	12,304	-	35,424
96	4	12,247	349	3,599	1,188	17,383
	5	18,859	178	5,219	1,632	25,727
	6	26,835	191	9,756	-	36,872
97	4	42,811	296	2,971	-	46,078
	5	12,959	298	6,571	-	19,828
	6	34,643	273	7,638	-	42,554
98	4	5,798	579	2,648	-	9,025
	5	11,350	461	4,319	-	16,130
	6	22,198	365	14,482	504	37,549
99	4	3,137	198	1,636	173	5,144
	5	14,362	241	4,212	365	19,180
	6	28,080	213	9,056	1,593	38,942
100	4	5,768	2,004	960	-	8,732
	5	13,389	633	1,170	207	15,399
	6	26,039	452	3,167	1,345	31,003
101	4	8,741	663	450	286	10,140
	5	4,520	488	615	-	5,624
	6	8,783	460	938	619	10,800

註：”-“表該項該月無資料。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-10 貢寮地區漁獲魚種之中、英文學名、俗名、使用漁具及漁期一覽表

漁獲種類 / 漁具別			沿岸採捕	棒受網	焚寄網	扒網	延繩釣	小型拖網	刺網	一支釣	曳繩釣	追逐網	鏢旗魚	魚種季節性							
中文學名	英文學名	俗名												春	夏	秋	冬	春夏	夏秋	秋冬	春冬
赤鯨	*Dentex tumifrons*	赤鯨					◎			◎				※							
嘉臘魚	*Pagrus major*	加臘、正鯛					◎		◎					※							
日本馬頭魚	*Branchiostegus japonicus*	馬頭					◎		◎	◎				※							
褐籃子魚	*Siganus fuscescens*	象魚、臭肚								◎				※							
星貂鮫	*Mustelus manazo*	沙條仔					◎							※							
大斑裸胸鰾	*Gymnothorax favagineus*	署鰻					◎			◎				※							
毛緣扇蝦	*Ibacus ciliatus*	蝦姑、蝦姑頭						◎						※							
花腹鯖	*Scomber australusis*	鯖		◎		◎	◎			◎				※							
鋸緣青蟳	*Scylla serrata*	紅蟳、菜蟳	◎						◎	◎		◎			※						
脂眼鯡	*Etrmeus teres*	臭肉、員眼													※						
紅瓜鰺	*Decapterus russelli*	赤尾		◎	◎	◎				◎			◎		※						
圓花鰹	*Auxis rochei rochei*	煙管仔				◎		◎	◎	◎					※						
鬼頭刀	*coryphaena hippurus*	飛烏虎					◎		◎		◎				※						
藍圓鰺	*Decapterus maruadsi*	硬尾、巴郎		◎		◎							◎		※						
青嘴龍占	*Lethrinus nebulosus*	青嘴					◎		◎						※						
孟加拉豆娘魚	*Abudefduf bengalensis*	厚殼仔								◎					※						
藍豬齒魚	*Choerodon azurio*	石老、石漏					◎		◎	◎					※						
黑口	*Atrobucca nibe*	烏喉					◎								※						
紅甘鰺	*Seriola dumerili*	紅鮸				◎			◎	◎						※					
白帶魚	*Trichiurus lepturus*	白魚、白帶				◎	◎		◎							※					
單角革單棘魨	*Aluterus monoceros*	白達		◎		◎										※					
低鰭舵魚	*Kyphosus cinerascens*	白毛				◎										※					
花軟唇	*Plectorhinchus cinctus*	加志、黃斑石鯛					◎		◎							※					
鯔	*Mugil cephalus*	烏魚							◎	◎							※				
臺灣馬加鰆	*Scomberomorus guttata*	白北、白腹							◎		◎						※				
赤土魟	*Dasyatis akajei*	魟仔魚					◎		◎								※				
烏鯧	*Parastromateus niger*	黑鯧、三角鯧						◎									※				
五絲馬鮫	*Polydactylus plebeius*	午仔							◎	◎							※				
長蛸(真蛸)	*Octopus variabills*	章魚、石居							◎	◎								※			
旭蟹	*Ranina ranina*	獅姑麻		◎	◎													※			
淺海小軸	*Scorpaenodes littoralis*	石狗公					◎			◎								※			
雨傘旗魚	*Istiophorus platypterus*	破雨傘、雨笠仔									◎		◎					※			
劍尖槍鎖管	*Loligo edulis*	小卷、透抽		◎	◎	◎													※		
真鰺	*Trachurus japonicus*	黑尾、巴郎		◎		◎													※		
白星笛鯛	*Latjaanus stellatus*	紅魚					◎		◎	◎									※		
日本鯷	*Engraulis japonicus*	苦蚵仔			◎														※		

表 2.12-10 貢寮地區漁獲魚種之中、英文學名、俗名、使用漁具及漁期一覽表（續）

漁獲種類 / 漁具別			沿岸採捕	棒受網	焚寄網	扒網	延繩釣	小型拖網	刺網	一支釣	曳繩釣	追逐網	鏢旗魚	魚種季節性							
中文學名	英文學名	俗名												春	夏	秋	冬	春夏	夏秋	秋冬	春冬
日本銀帶鯡	*Spratelloides gracilis*	鱙仔、丁香		◎	◎			◎											※		
真烏賊	*Sepia esculenta holye*	花枝							◎	◎											※
日本馬加鰆	*Scomberomorus niphonius*	馬加									◎										※
紅星梭子蟹	*Portunus sangunolentus*	三點市	◎						◎												※
銀鯧	*pampus argenteus*	白鯧						◎													※
單斑笛鯛	*Lutjanus monostigma*	黑點仔					◎		◎	◎											※
正鰹	*Katsuwonus pelamis*	卓鰮		◎	◎	◎	◎		◎		◎										※
齒鰆	*Sarda orientalis*	煙仔虎				◎					◎										※
短鬚海鯡鯉	*Parapristipoma ciliatus*	鬚姑、秋姑					◎			◎											※
黑瓜子鰹	*Girella punctata*	黑毛					◎		◎	◎											※
丫髻鮫	*Sphyrna zygaena*	鯊					◎														
大鱗鯔	*Liza macrolepis*	豆仔魚							◎	◎											
鋸尾鯛	*Prionurus scalprus*	倒吊、黑豬哥							◎	◎											
鮸魚	*Miichthy miiuy*	鮸仔、米魚								◎											
雙帶鯵	*Elagatis bipinnulata*	拉仙		◎		◎		◎	◎	◎											
海鱷	*Rachycentron canadum*	海鱷仔					◎		◎	◎											
銀紋笛鯛	*Lutjanus argentimaculatus*	紅槽					◎		◎	◎											
日本龍蝦	*Penulirus japonicus*	龍蝦							◎												
巴鰹	*Euthynnus affinis*	煙仔魚		◎	◎	◎	◎		◎		◎										
三線雞魚	*Parapristipoma trilneatum*	雞仔魚					◎		◎	◎											
吻斑石斑魚	*Epinephelus spilotoceps*	石斑					◎		◎	◎											
赤點石斑	*Epinephelus akaara*	過仔魚					◎		◎	◎											
細紋九孔螺	*Haliotis diversicolor*	九孔	◎																		
大眼鯛	*Priacanthus macracanthus*	紅目鰱			◎		◎			◎											
花身雞魚	*Therapun jarbun*	花身仔							◎	◎											
白斑鸚哥魚	*Chlorurus sordidus*	青衣							◎	◎											
日本金梭魚	*Sphyraena japonica*	尖梭、金梭							◎												
日本絨螯蟹	*Eriocheir japonica*	毛蟹、石居	◎						◎												
橫紋九刺鮨	*Cephalopholis boenak*	黑鄂					◎			◎											
黃鮫鰄	*Lophius litulon*	鮫鰄魚									◎										
黃鰭鯛	*Acanthopagrus latus*	赤翅仔							◎	◎											
異葉公鼊	*Encrasicholina heteroloba*	鯷仔			◎			◎													
		海藻類	◎																		
		鹽飛魚卵										◎									

註：經 ANOVA 檢定後之魚種季節性分類：單一季節性(P_1<0.05，P_2<0.05)、雙重季節性(P_1<0.05，P_2>0.05)及季節不明顯(P_1>0.05，P_2>0.05)

表 2.12-11 貢寮地區 101 年 4~6 月火誘網漁業標本戶作業情形

月　　別	101 年 4 月	101 年 5 月	101 年 6 月	合計	平均
標本戶數	7	7	7	21	7
總作業天數	87	66	101	254	85
平均作業天數(天/戶)	12	9	14	35	12
總漁獲量(公斤)	9,065	35,422	60,895	105,382	35,127
總漁獲金額(元)	1,220,025	804,309	1,471,004	3,495,338	1,165,113
平均漁獲量(公斤/戶)	1,295	5,060	8,699	15,054	5,018
平均漁獲金額(元/戶)	174,289	114,901	210,143	499,333	166,444
CPUE(公斤/天/戶)	104	537	603	1,244	415
IPUE(元/天/戶)	14,023	12,187	14,564	40,774	13,591

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-12 貢寮地區 101 年 4~6 月扒網漁業標本戶作業情形

月　　別	101 年 4 月	101 年 5 月	101 年 6 月	合計	平均
標本戶數	3	3	2	8	3
總作業天數	47	17	4	68	23
平均作業天數(天/戶)	16	6	2	24	8
總漁獲量(公斤)	387,321	253,998	67,340	708,659	236,220
總漁獲金額(元)	10,865,718	8,663,658	1,810,840	21,340,216	7,113,405
平均漁獲量(公斤/戶)	129,107	84,666	33,670	247,443	82,481
平均漁獲金額(元/戶)	3,621,906	2,887,886	905,420	7,415,212	2,471,737
CPUE(公斤/天/戶)	8,241	14,941	16,835	40,017	13,339
IPUE(元/天/戶)	231,185	509,627	452,710	1,193,522	397,841

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-13 貢寮地區 101 年 4~6 月刺網漁業標本戶作業情形

項目 \ 月別	101 年 4 月	101 年 5 月	101 年 6 月	合計	平均
樣本戶數	6	6	6	18	6
平均作業天數(日/戶)	12	16	14	42	14
平均漁獲重量(公斤/戶)	186.4	151.5	155.9	493.8	164.6
平均漁獲產值(元/戶)	69,289	72,786	63,090	205,165	68,388
CPUE(公斤/日/戶)	15.5	9.5	11.1	36.1	12.0
IPUE(元/日/戶)	5,774	4,549	4,506	14,829	4,943

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-14 貢寮地區 101 年 4~6 月釣具漁業標本戶作業情形

項目 \ 月別	101 年 4 月	101 年 5 月	101 年 6 月	合計	平均
樣本戶數	13	12	11	36	12
平均作業天數(日/戶)	10	11	11	32	11
平均漁獲重量(公斤/戶)	121.9	174.7	207.9	504.5	168.2
平均漁獲產值(元/戶)	41,971	34,074	36,718	112,763	37,588
CPUE(公斤/日/戶)	12.2	15.9	18.9	47.0	15.7
IPUE(元/日/戶)	4,197	3,098	3,338	10,633	3,544

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-15 貢寮地區 101 年 4~5 月魩仔魚漁獲統計一覽表

單位：漁獲量（公斤）

日期	標本戶 1	總計	CPUE（公斤/日/戶）	日期	標本戶 1	總計	CPUE（公斤/日/戶）
101/04/02	80	80	80	101/04/10	40	40	40
101/04/03	40	40	40	101/04/11	30	30	30
101/04/05	60	60	60	101/05/01	50	50	50
101/04/06	200	200	200	101/05/05	40	40	40
101/04/07	160	160	160	合　　計	790	790	790
101/04/08	60	60	60	平　　均	71.82	71.82	71.82
101/04/09	30	30	30				

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-16 貢寮地區 101 年 4~6 月沿岸採捕業標本戶漁獲統計

沿岸採捕方式	涉水				
項目 \ 目別	101 年 4 月	101 年 5 月	101 年 6 月	合計	平均
樣本戶數	4	4	4	12	4
總作業天數	46	35	27	108	36
總漁獲量(公斤)	389.70	283.20	165.68	838.58	279.53
平均漁獲重量(公斤/戶)	97.43	70.80	41.42	209.65	69.88
平均漁獲產值(元/戶)	10,671.00	8,202.00	6602.44	25,475.44	8,491.81
CPUE(公斤/日/戶)	8.47	8.09	6.14	22.70	7.57
IPUE(元/日/戶)	927.91	937.37	978.14	2,843.42	947.81
沿岸採捕方式	潛水				
項目 \ 目別	101 年 4 月	101 年 5 月	101 年 6 月	合計	平均
樣本戶數	4	4	4	12	4
總作業天數	41	40	45	126	42
總漁獲量(公斤)	916.20	659.00	748.60	2,323.80	774.60
平均漁獲重量(公斤/戶)	229.05	164.75	187.15	580.95	193.65
平均漁獲產值(元/戶)	58,872.75	55,064.50	73,141.25	187,078.50	62,359.50
CPUE(公斤/日/戶)	22.35	16.48	16.64	55.47	18.49
IPUE(元/日/戶)	5,743.68	5,506.45	6,501.44	17,751.57	5,917.19

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-17 貢寮地區 101 年 4~6 月娛樂（海釣）漁業標本戶漁獲統計

月別 \ 項目	101 年 4 月	101 年 5 月	101 年 6 月	合計	平均
樣本戶數	2	2	2	6	2
作業日數	19	20	16	55.0	18.3
漁獲努力量(支/日/戶)	164	191	142	497.0	165.7
總漁獲量(公斤)	25643	2053.4	2602.0	30298.4	10099.5
平均漁獲量(公斤/戶)	1282.2	1026.7	1301.0	3609.9	1203.3
CPUE(公斤/日/戶)	135.0	102.7	162.6	400.3	133.4

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-18 貢寮地區 101 年 4~6 月養殖標本戶產量

單位：公斤

	101 年 4 月		101 年 5 月		101 年 6 月		總合	
養殖種類	九孔	鮑魚	九孔	鮑魚	九孔	鮑魚	九孔	鮑魚
標本戶 1	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 2	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 3	1,377	0	0	0	330	0	1,707	0
標本戶 4	0	0	0	0	1,800	0	1,800	0
標本戶 5	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 6	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 7	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 8	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 9	0	600	0	0	0	0	0	600
標本戶 10	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 11	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800
標本戶 12	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 13	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 14	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 15	0	1,200	0	0	0	0	0	1,200
標本戶 16	0	0	0	0	0	0	0	0
總和	1,377	3,600	0	0	2,130	0	3,507	3,600

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-19 貢寮地區 101 年 4~6 月養殖標本戶產值

單位：元

	101 年 4 月		101 年 5 月		101 年 6 月		總合	
養殖種類	九孔	鮑魚	九孔	鮑魚	九孔	鮑魚	九孔	鮑魚
標本戶 1	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 2	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 3	1,147,500	0	0	0	275,000	0	1,422,500	0
標本戶 4	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0
標本戶 5	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 6	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 7	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 8	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 9	0	480,000	0	0	0	0	0	480,000
標本戶 10	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 11	0	1,530,000	0	0	0	0	0	1,530,000
標本戶 12	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 13	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 14	0	0	0	0	0	0	0	0
標本戶 15	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
標本戶 16	0	0	0	0	0	0	0	0
總和	1,147,500	3,110,000	0	0	1,775,000	0	2,922,500	3,110,000

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

表 2.12-20 貢寮地區 101 年 4~6 月養殖標本戶九孔、鮑魚仔苗海膽苗放養情形

	放養月份	放養數量（萬粒）	總成本（萬元）	養殖面積（平方公尺）
標本戶 1				1,980
標本戶 2	4	30	75.0	5,536
標本戶 3	6	300	510.0	22,720
標本戶 4				1,982
標本戶 5	5	120	360.0	3,300
標本戶 6	5	2	6.0	661
標本戶 7				661
標本戶 8	4**	3	30.0	3,636
標本戶 9	5	36	46.8	1,970
標本戶 10	5	36	46.8	2,542
標本戶 11	6*	20	40.0	2,475
標本戶 12	4	18	39.6	692
標本戶 13	5	30	75.0	2,640
標本戶 14				810
標本戶 15				5,672
標本戶 16	4	55	82.5	1,488
總和		650	1,311.7	58,765

註：*放養鮑魚，**放養海膽苗。

資料來源：臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測(期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月)，民國 101 年 8 月。

海象調查

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.13 海象調查

1.海域溫度與鹽度縱深剖面調查

海域溫度與鹽度之調查，係於三貂灣海域水深 5~60 公尺間，佈置間隔 600 公尺×600 公尺或 1200 公尺×1200 公尺之網點測站，進行水體縱深剖面之溫度及鹽度變化量測，以瞭解核能四廠附近海域不同深度之溫鹽分佈。本季調查時間為民國 101 年 4 月 3 日、5 月 8 日及 6 月 7 日，各次調查測站位置及各測站 CTD 調查剖面圖，詳見附錄Ⅳ8-1~Ⅳ8-3，調查結果整理說明如下：

根據 CTD 調查結果顯示，在表層水溫方面，4 月 3 日各測站表面水溫約在 20.3℃~21.0℃之間，各測站並無明顯斜溫層；表層海水鹽度約在 33.8PSU~34.0PSU，海水鹽度垂直變化不大。5 月 8 日各測站表面水溫約在 23.4℃~24.9℃之間，其水深較深之 A10、B8、B10、D8、D10、F8、F10 測站有斜溫層出現，其上、下水溫差約 4.0~7.5℃；表層海水鹽度約在 33.6PSU~34.0PSU，海水鹽度垂直變化不大。6 月 7 日各測站水表面溫度約在 22.8℃~24.8℃之間，其水深較深之 A10、B8、B10、D8、D10、F8、F10 測站有斜溫層出現，其上、下水溫差約 4.4~6.2℃；表層海水鹽度約在 33.5PSU~33.9 PSU，海水鹽度垂直變化不大。

本季因氣溫回暖，表層水溫受氣溫影響上升，以致上、下水層溫差較上季明顯變大，以 5、6 月份水深較深處有斜溫層出現；而於海水鹽度方面，各站表層與底層之鹽度差異並不大，顯示此區域水體混合狀況良好。

2.漂流浮標追蹤

本季漂流浮標追蹤調查係於 101 年 4 月 2 日、5 月 7 日及 6 月 6 日進行觀測，追蹤水面表層以下 1 公尺及 5 公尺處之漂流行為，以瞭解海面表層之綜合效應。各次浮標漂流調查之施放位置、施測時間、當日之風速、風向及浮標漂流軌跡，如圖 2.13-1~2.13-3 所示，各次浮標施放位置

之考量，主要係以核能四廠進、出水口附近海域之流況進行調查，並比較鹽寮灣內外流向與流速之差別。

根據 4 月 2 日之調查結果（圖 2.13-1），浮標 1~3 號於 9:34~9:39 由進水口東側外海施放，當時之潮汐狀況為退潮階段，風向約為南南東風，浮標 1 號施放後向東北方向漂移；浮標 2、3 號施放後往東南方向漂移，分別於 11:37 及 11:39 轉往西北方漂移；浮標 4 號於 13:05 於進出水口間東方海域施放，當時之潮汐狀況為漲潮階段，風向約為北北東風，施放後往西北方漂移；浮標 5~7 號於 14:30~14:34 於出水口至雙溪間之東方海域施放，當時之潮汐狀況為高平潮階段，風向約為北北東風，施放後往西北方漂移。各浮標水面下之流速分別為：水面下 1 公尺之 1、2、4、5、6 號浮標，其平均流速介於 13.7~46.7cm/sec，水面下 5 公尺之 3、7 號浮標，其平均流速分別為 22.0cm/sec、25.4cm/sec。

根據 5 月 7 日之調查結果(圖 2.13-2)，浮標 1~3 號於 9:15~9:21 由澳底漁港外海施放，當時之潮汐狀況為退潮階段，風向約為南南東風，浮標 1~3 號先分別往北北東、北及東北方向漂移，分別於 9:45、9:47 及 9:51 轉往東南方向；浮標 4、5 號分別於 11:56 及 11:58 在進水口東方海域施放，當時潮汐狀況為退潮，風向為南風，浮標 4 號施放後往東北方向漂移，於 12:48 轉往東南方向漂移，又於 13:50 轉往東北方向漂移；浮標 5 號施放後先往東南方向漂移，之後於 13:30 轉往西南方向漂移，又於 13:55 轉向西北向方漂移；浮標 6 號於 13:46 於進出水口間東方海域施放，當時潮汐狀況為漲潮階段，風向約為南風，浮標 6 號施放後往北北西向方漂移。各浮標水面下之流速分別為：水面下 1 公尺之浮標 1、2、4、6 號平均流速介於 21.6~52.9cm/sec，水面下 5 公尺之 3、5 號浮標平均流速分別為 53.7cm/sec、33.5cm/sec。

根據 6 月 6 日之調查結果（圖 2.13-3），浮標 1~3 號於 9:14~9:21 由進水口東側外海施放，當時之潮汐狀況為退潮階段，風向約為東北風，浮標 1~3 號施放後均往東南方漂移；浮標 4~6 號於 11:42~11:46 由進水口東側外海施放，當時之潮汐狀況為退潮階段，風向約為東北風，浮標

4 號施放後先往東方漂移，於 12:42 轉往東北方向漂移，浮標 5 號施放後先往東南方向漂移，之後於 12:44 轉往北北東方向漂移，又於 13:44 轉往東南方向漂移，浮標 6 號施放後先往東南方向漂移，於 12:15 轉往東方漂移，又於 12:46 轉往北向漂移，最後於 14:27 再度轉往東方漂移；浮標 7、8 號分別於 15:09 及 15:12 由出水口東側海域施放，當時之潮汐狀況為漲潮階段，風向約為北北東風，浮標 7 號施放後往西北西方向漂移，浮標 8 號施放後往西南西方向漂移。各浮標水面下之流速分別為：水面下 1 公尺之 1、2、4、5、7 號浮標平均流速介於 16.6~50.4cm/sec；水面下 5 公尺之浮標 3、6、8 號浮標平均流速介於 19.4~51.9cm/sec。

本季浮標流況大致上呈現漲潮西北流、退潮東南流之流況，少數浮標則呈現流向較不穩定；至於浮標之平均流速則呈鹽寮灣內流速較鹽寮灣外流速為低的情形。

3.沿岸潮位及水溫調查

本季沿岸潮汐及水溫調查逐時記錄詳附錄Ⅳ 8-4~Ⅳ 8-9，沿岸水溫月平均變化整理如圖 2.13-4，沿岸潮汐相關調查結果整理如表 2.13-1 所示。本區之潮汐係以半日潮為主，本季 4~6 月份之平均潮位介於 18~35 公分（相對於基隆港平均海平面），平均潮差介於 52~56 公分，就台灣地區而言，屬潮差較小之區域。另外，本季最高潮位 87 公分，發生於 6 月 5 日 6:20。

在沿岸水溫之調查方面，自 92 年 8 月份起，配合潮位塔遷移至進水口防波堤邊觀測，該處水深 6 公尺，儀器深 4 公尺。本季 4~6 月份測得月平均水溫分別 19.8℃、20.5℃及 25.1℃，其平均水溫較上季（101 年 1~3 月）每月之平均水溫 15.7℃~177℃為高，但與去年同期（101 年 4~6 月分別為 18.6℃、21.9℃及 24.8℃）差異不大。

表 2.13-1 核四施工環境監測海象調查 101 年第 2 季沿岸潮汐調查結果

月份 / 項目	101 年 4 月		101 年 5 月		101 年 6 月	
	高度（公尺）	發生時間（時分／日）	高度（公尺）	發生時間（時分／日）	高度（公尺）	發生時間（時分／日）
最高潮位	0.67	0620/22	0.84	0740/09	0.87	0620/05
大潮平均高潮位	0.50		0.64		0.70	
平均高潮位	0.46		0.56		0.61	
小潮平均高潮位	0.38		0.51		0.53	
平均潮位	0.18		0.30		0.35	
小潮平均低潮位	0.00		0.15		0.16	
平均低潮位	-0.10		0.04		0.09	
大潮平均低潮位	-0.20		-0.09		0.02	
最低潮位	-0.62	1500/09	-0.64	1340/07	-0.49	1340/05
最大潮差	1.22	0730/09 To 1500/09	1.38	0630/07 To 1340/07	1.36	0620/05 To 1340/05
平均潮差	0.56		0.52		0.53	
最小潮差	0.03	2320/26 To 0200/27	0.07	0200/12 To 0620/12	0.07	1710/13 To 2120/13

註：調查時間為101/4/1~101/6/30。

資料來源：台電公司電源開發處提供。

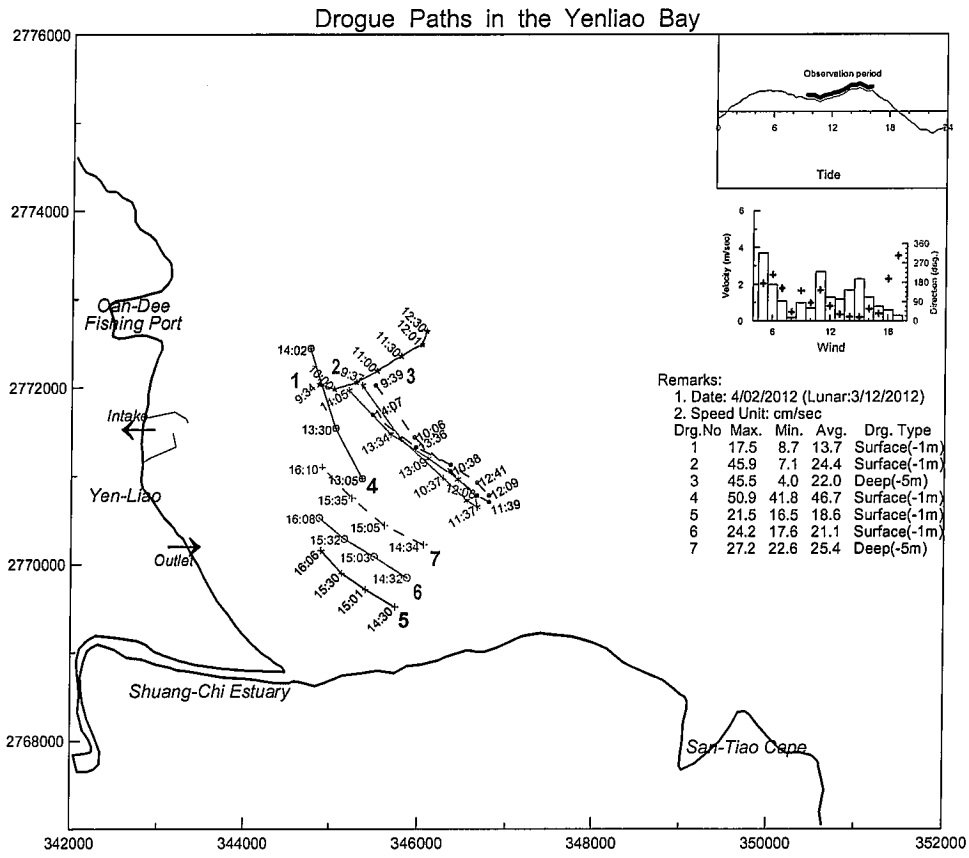


圖 2.13-1 核四施工環境監測海象調查 101 年 4 月 2 日漂流浮標追蹤軌跡圖

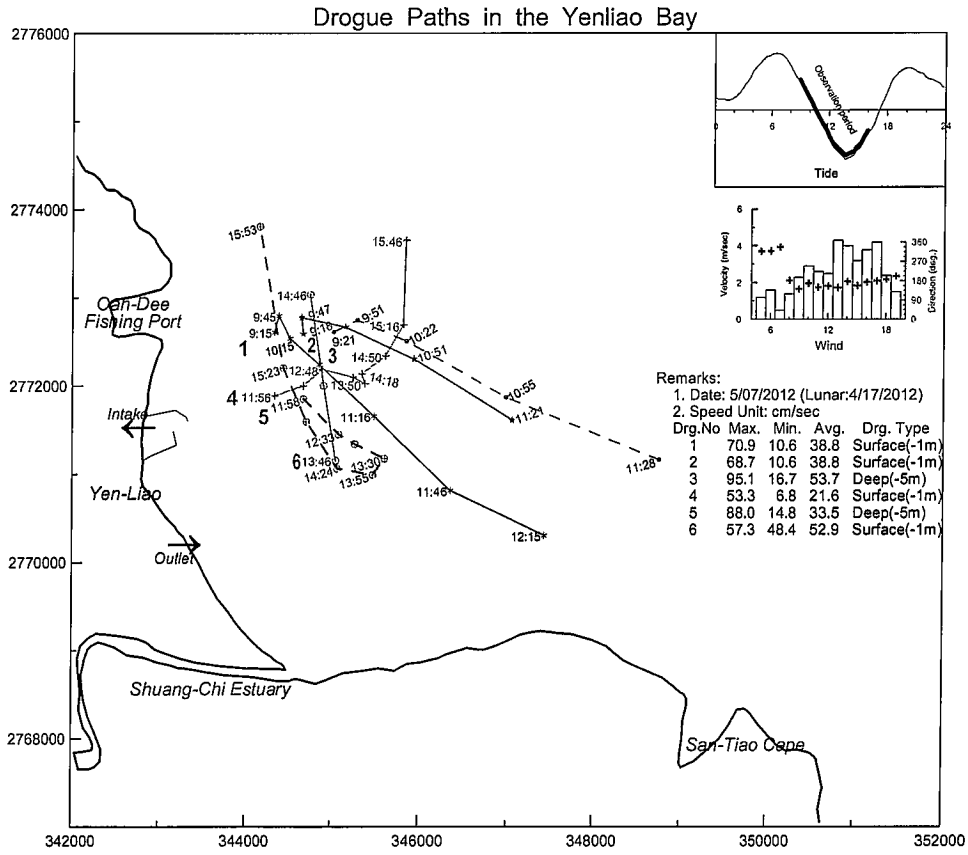


圖 2.13-2 核四施工環境監測海象調查 101 年 5 月 7 日漂流浮標追蹤軌跡圖

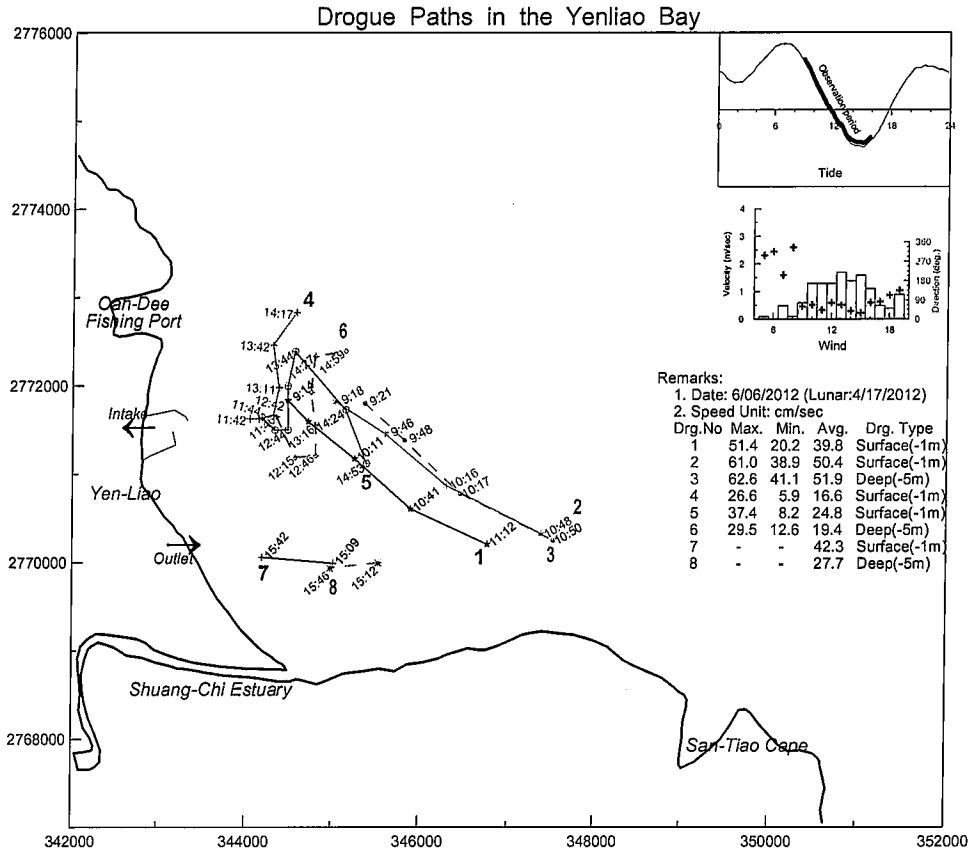


圖 2.13-3 核四施工環境監測海象調查 101 年 6 月 6 日漂流浮標追蹤軌跡圖

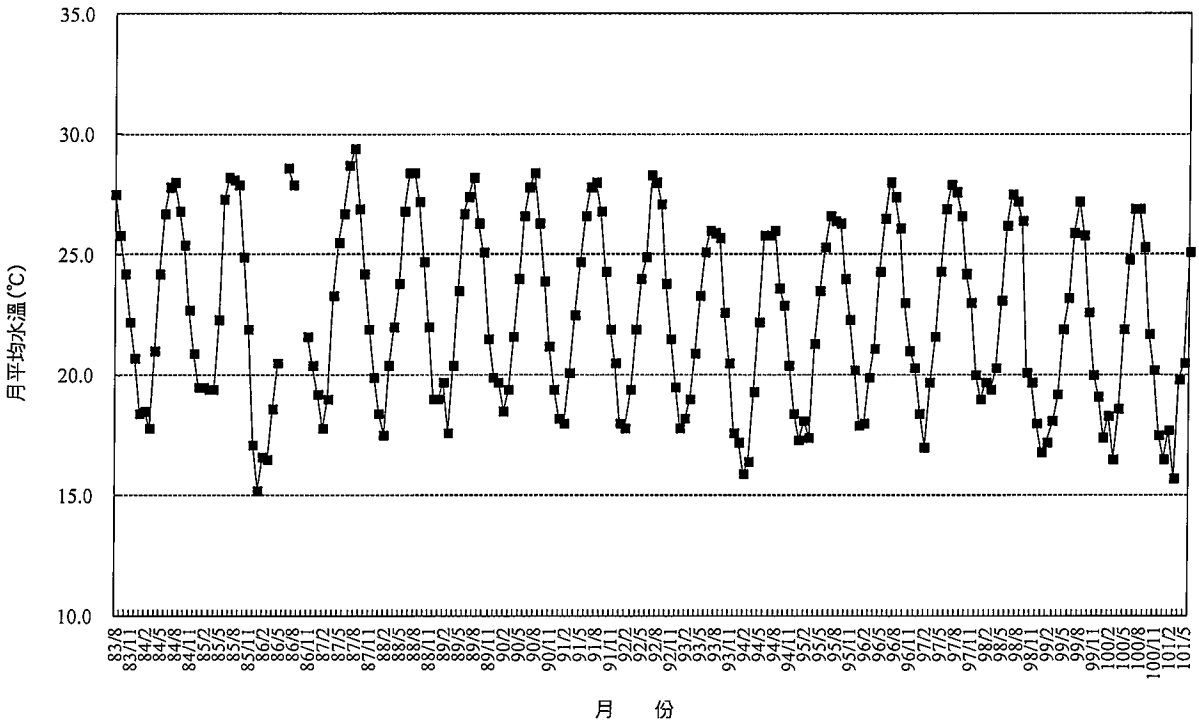


圖 2.13-4 核四施工環境監測海象調查沿岸水溫月平均變化圖

調查日期：83 年 8 月至 101 年 6 月

景觀與遊憩活動調查

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.14 景觀與遊憩活動調查

景觀遊憩活動調查之目的係為記錄施工期間對於核四廠址附近遊憩之使用及景觀品質之變化，本項調查自 83 年 9 月開始，陸續因應計畫需求增加龍門渡假中心（即龍門公園）遊客人次調查及觀景點 5~7 號之景觀品質紀錄攝影。

1.遊客人次調查

遊客人次調查地點包括鹽寮海濱公園、龍門公園及福隆海水浴場，本季各月份之遊客人次統計結果如表 2.14-1 所示。鹽寮海濱公園入園之遊客大部分多為路過東北角地區，在此稍作休息的遊客，本季各月遊客總人次在 259~527 人次/月之間。龍門公園為自 86 年第 3 季新增之調查遊憩點，為一露營、烤肉區，主要遊客來源為機關團體舉辦之休閒活動，本季各月遊客總人次在 3,502~4,497 人次/月之間。本季福隆海水浴場各月遊客總人次在 11,760~137,621 人次/月之間。

綜觀上述，本季與去年同期比較，龍門公園遊客數有增加之情形，而鹽寮海濱公園及福隆海水浴場因受天候影響較大，遊客數較去年同期減少。

2.景觀品質調查

有關本計畫景觀品質之評分方式，主要係考量本計畫性質為工程開發，對原環境造成之景觀影響首先為景觀破壞部份，之後則為環境復育對已破壞環境之改善程度，因此本計畫景觀品質之評分方式，將以自然完整性（分為景觀破壞及景觀美化 2 部分）進行評比（評分方式詳附錄 II.13 所述，每單項評估因子滿分為 5 分，共 8 項），依各評估因子（如坡度改變、工程施工面積...等）之累計分數分為「高、中、低」等 3 級，旨在瞭解施工過程中各觀景點之景觀品質變化程度，並依完整性評分改變幅度提出改善建議。各觀景點之調查位置詳前圖 1.4-11 所示，詳細位置圖詳圖 2.14-1，分別於核四廠區之北、東、西等 3 個方向 7 個觀景點

（包括主要可見到廠區工程之道路及遊憩場所），本季與記錄照片比較整理如照片 2.14-1~2.14-3，其詳細評分如表 2.14-2 所示，以下就各觀景點之景觀品質現況說明如后。

⑴1 號觀景點：

1 號觀景點為由核四廠北側 102 甲縣道往廠區核四宿舍區方向看（詳照片 2.14-1）。本觀景點於調查之初（83 年 9）可見核四廠區內部之宿舍以及與 102 甲縣道間之鐵絲圍籬，自 85 年 6 月起配合廠址周圍道路擴寬並沿石碇溪沿岸進行整地植栽綠化工程，將道路兩側之雜草清除並栽種新的觀賞性植物取而代之，植栽綠化顯具成效。惟於 90 年 12 月起進行龍門發電廠之職工宿舍，並於 95 年 8 月完工，本觀景點因建物所佔視野面積大、觀景距離近等因子，依附錄 II .13 評分基準，整體評分為 20 分，屬中自然完整性。

⑵2 號觀景點：

2 號觀景點為由核四廠東北側台 2 省道往廠區方向看，該觀景點附近於 86 年 2 月進行台 2 省道旁之景觀綠化工程，拆除原有零亂之廣告看板，景觀逐漸改善（詳照片 2.14-1 第 2 觀景點記錄照片）。本季由台 2 省道往廠區望去，可見廠區內搭建之房舍，由於僅可見房舍之上半部，且其改變面積部份所佔景觀視野面積之比例不大，故整體景觀上並未有太大影響，藉由廠區周界之綠樹遮掩作用將可提升該觀景點之景觀品質。本季以景觀破壞大項中之觀景距離及景觀美化大項中之美化材類與自然配合度 2 小項之分數較低，分別為 1 分及 3 分，整體評分為 34 分，尚屬高自然完整性。

⑶3 號觀景點：

3 號觀景點為由核四廠東側之鹽寮海濱公園停車場往廠區方向看，原均屬原始之茂密林木，隨工程進行改變地貌，90 年 10 月因大面積之開挖整地作業，景觀品質惡化，99 年 9 月~100 年 5 月因台二省道改道工程施工開挖及路面鋪整，景觀上略受影響，隨著工程之完成，目前

本觀景點大致以圍籬、植被進行綠美化，惟仍可見廠區內房舍之上半部，景觀略受影響（詳照片 2.14-1 第 3 觀景點記錄照片）。本觀景點在景觀破壞類別之土壤與環境對比程度、觀景距離 2 項評分較低，其餘項目則為評分為中等，總評分為 16 分，景觀品質屬中自然完整性。

⑷4 號觀景點

4 號觀景點為由核四廠東南側之核四廠南門附近往廠區方向看，從該觀景點向核四廠區望去，可見廠區內操作之大型機具，在整體評分上因受改變面積，立地再被覆性之評分較低而影響分數，自復工（90 年 2 月）後 1、2 號機廠址附近出現許多大型吊車，施工作業頻繁，目前 1、2 號機建物結構築起並完成，再加上廠房共同通風塔工程，在美化材料與自然配合度、立地再披覆性及景觀破壞改變面積方面之評分最低，僅為 1~2 分，總評分為 19 分，整體景觀品質屬中自然完整性（詳照片 2.14-2 第 4 觀景點之記錄照片）。

⑸5 號觀景點

5 號觀景點為 85 年第 4 季新增之點，攝影位置位於鹽寮海濱公園沙灘往廠區方向看，其照相方式詳圖 1.4-11，分別 3 方向，在南向主要係估出水道工程施工影響，因出水道工程採用隧道工法，故無視覺景觀上之衝擊（詳照片 2.14-3 第 5 觀景點南向之記錄照片）；在西向可見核四廠區內 1、2 號機廠房結構體及廠房共同通風塔，結構物佔視覺影響衝擊較大，惟觀景距離及土壤與環境對比程度不同，故其評分略較第 3 號觀景點為高，整體景觀品質屬中自然完整性（詳照片 2.14-2 第 5 觀景點西向之記錄照片）。

北向主要係為評估重件碼頭施工影響，88 年 7 月起開始展開海域部分施工，目前於現場可見抽水機房及防波堤結構物，在美化材料與自然配合度、立地再披覆性方面之評分較低；另由於防波堤施築改變原有之海岸地形，以及隨著工程進行日益加長的防波堤結構物（改變面積約佔全景面積 20%左右，詳照片 2.14-2 第 5 觀景點北向之記錄照

片），所以在改變類別及改變面積上評分為 3 分，整體評分為 26 分，屬中自然完整性。

⑹6 號觀景點

6 號觀景點為由福隆海水浴場往廠區方向看，本觀景點為 85 年第 4 季新增之觀景點，主要係觀測出水口工程對視覺景觀之衝擊，由於出水道工程採用隧道工法，且目前已完工，故本觀景點景觀品質未受核四施工影響（詳照片 2.14-3 第 6 觀景點之記錄照片）。

⑺7 號觀景點

本觀景點亦為 85 年第 4 季新增之點，自 89 年第 3 季起開始進行工程施工，惟 89 年 6 月僅進行測量整地工作，工程內容包括場地清理及雜草木砍伐移除，臨時性截水溝、滯洪池施作以及施工便道等，至 96 年 6 月方進行場地開挖工程；由雙溪方向可見山坡上生水池工程開挖所致之裸露地表，在景觀美化方面之品質受影響，經廠區強力植生復育結果，於美化材料與自然配合度方面之評分已明顯提昇，整體評分為 26 分，屬中自然完整性（詳照片 2.14-3 第 7 觀景點之記錄照片）。

表 2.14-3 之評分表係針對景觀之破壞及美化程度予以評定，其中因 5 號之南向及 6 號觀景點並未受任何工程之破壞而造成景觀之改變，因此暫不予以評分。7 個觀景點中之 1 號觀景點，可見廠區內高起之建物，且因觀景距離在 500 公尺以內，觀景品質不佳；2 號觀景點因台 2 省道旁建構圍籬、植栽綠化及廠內房舍搭建，但拆除原有零亂之廣告看板，景觀應有正面改善；3 號觀景點於 90 年 10 月因大面積之開挖整地作業，景觀品質惡化程度最大，惟其植生綠化成效逐年呈現，已由 90 年之最差之低自然完整性提升至中自然完整性，雖受 99 年 9 月起之台二省道改道工程施工開挖及路面鋪整影響，景觀略受影響，惟整體景觀品質並未明顯惡化，仍維持在中自然完整性；4 號觀景點因可見到 1、2 號機廠房結構體及廠房共同通風塔，景觀品質屬中自然完整性；5 號西向之觀景點評分略高於 3 號，但同屬中自然完整性，北向因重件碼頭施工及防波堤結構物，

屬中自然完整性；7 號觀景點因生水池工程進行場地開挖工程，可見到山坡上裸露之地表，景觀受施工影響，惟經工區加強植生復育結果，景觀品質已有改善。

綜觀上述完整性評定結果，核四工程鄰近區域於台 2 省道澳底至龍門社區（舊社）段及鹽寮海濱公園之景觀品質，因可見廠區內超高型施工機具及共同通風塔等，造成台 2 省道用路人及濱海住戶之視覺衝擊，屬中度自然完整性程度。目前隔離綠帶一期工程已完工，綠帶二期（澳底二號橋以南段）之規劃設計已配合「公路局台 2 線鹽寮段新闢工程細部設計」之路線、高程設計中，屆時將沿台 2 省道施築一道 15~50 公尺寬之高坡緩衝綠帶，以有效改善台 2 省道沿線觀景點之視覺景觀。

表 2.14-1 核四施工環境監測 101 年第 2 季遊客人次統計表

單位：人次

地點	月份	遊客人次		成長率 (%)	說明（遊客人數差異原因）
		總數	去年同月總數		
鹽寮海濱公園	4 月	259	335	-22.7	●本季 101/4~101/6 與去年同期比較，以鹽寮海濱公園及福隆海水浴場因受連日降雨及颱風影響，遊客數較去年同期減少。
	5 月	462	655	-29.5	
	6 月	527	1,028	-48.7	
龍門公園	4 月	3,789	2,311	64.0	
	5 月	3,502	3,208	9.2	
	6 月	4,497	4,076	10.3	
福隆海水浴場	4 月	11,760	12,726	-7.6	
	5 月	137,621	138,147	-0.4	
	6 月	106,926	167,363	-36.1	

註：計算遊客人數之方法分別為：

1. 鹽寮海濱公園採用收費停車數概估（89 年 1 月重新營運）。
2. 龍門公園採用門票收入。
3. 福隆海水浴場委外經營。

資料來源：1.交通部觀光局行政資源系統http://admin.taiwan.net.tw/indexc.asp。

2. 東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 。

表 2.14-2　各觀景點 101 年第 2 季自然完整性之評分明細表

項目	觀景點 / 月份 / 評分	第 1 觀景點			第 2 觀景點			第 3 觀景點			第 4 觀景點			第 5 觀景點(西向)			第 5 觀景點(北向)			第 7 觀景點		
		4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月
景觀破壞	坡度	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3
	土壤與環境對比程度	1	1	1	5	5	5	1	1	1	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3	3
	改變類別	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	改變面積	1	1	1	5	5	5	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	5	5	5
	觀景距離	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
景觀美化	美化材類與自然配合度	1	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
	立地再被覆性	1	1	1	5	5	5	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1
	土壤穩定性	5	5	5	5	5	5	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
總　分		20	20	20	34	34	34	16	16	16	19	19	19	26	26	26	26	26	26	26	26	26
自然完整性程度		中	中	中	高	高	高	低	低	低	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中

註：1.總得分 8~18 屬低自然完整性。
2.總得分 19~29 屬中自然完整性。
3.總得分 30~40 屬高自然完整性。
4.第 5 觀景點(南向)及第 7 觀景點目前尚無任何開發破壞，暫不評分。
5.第 5 觀景點(北向)自 88 年 10 月起因重件碼頭進行海域工程施工，第 7 觀景點自 89 年 10 月起因生水池工程進行開挖作業，故予以評分。

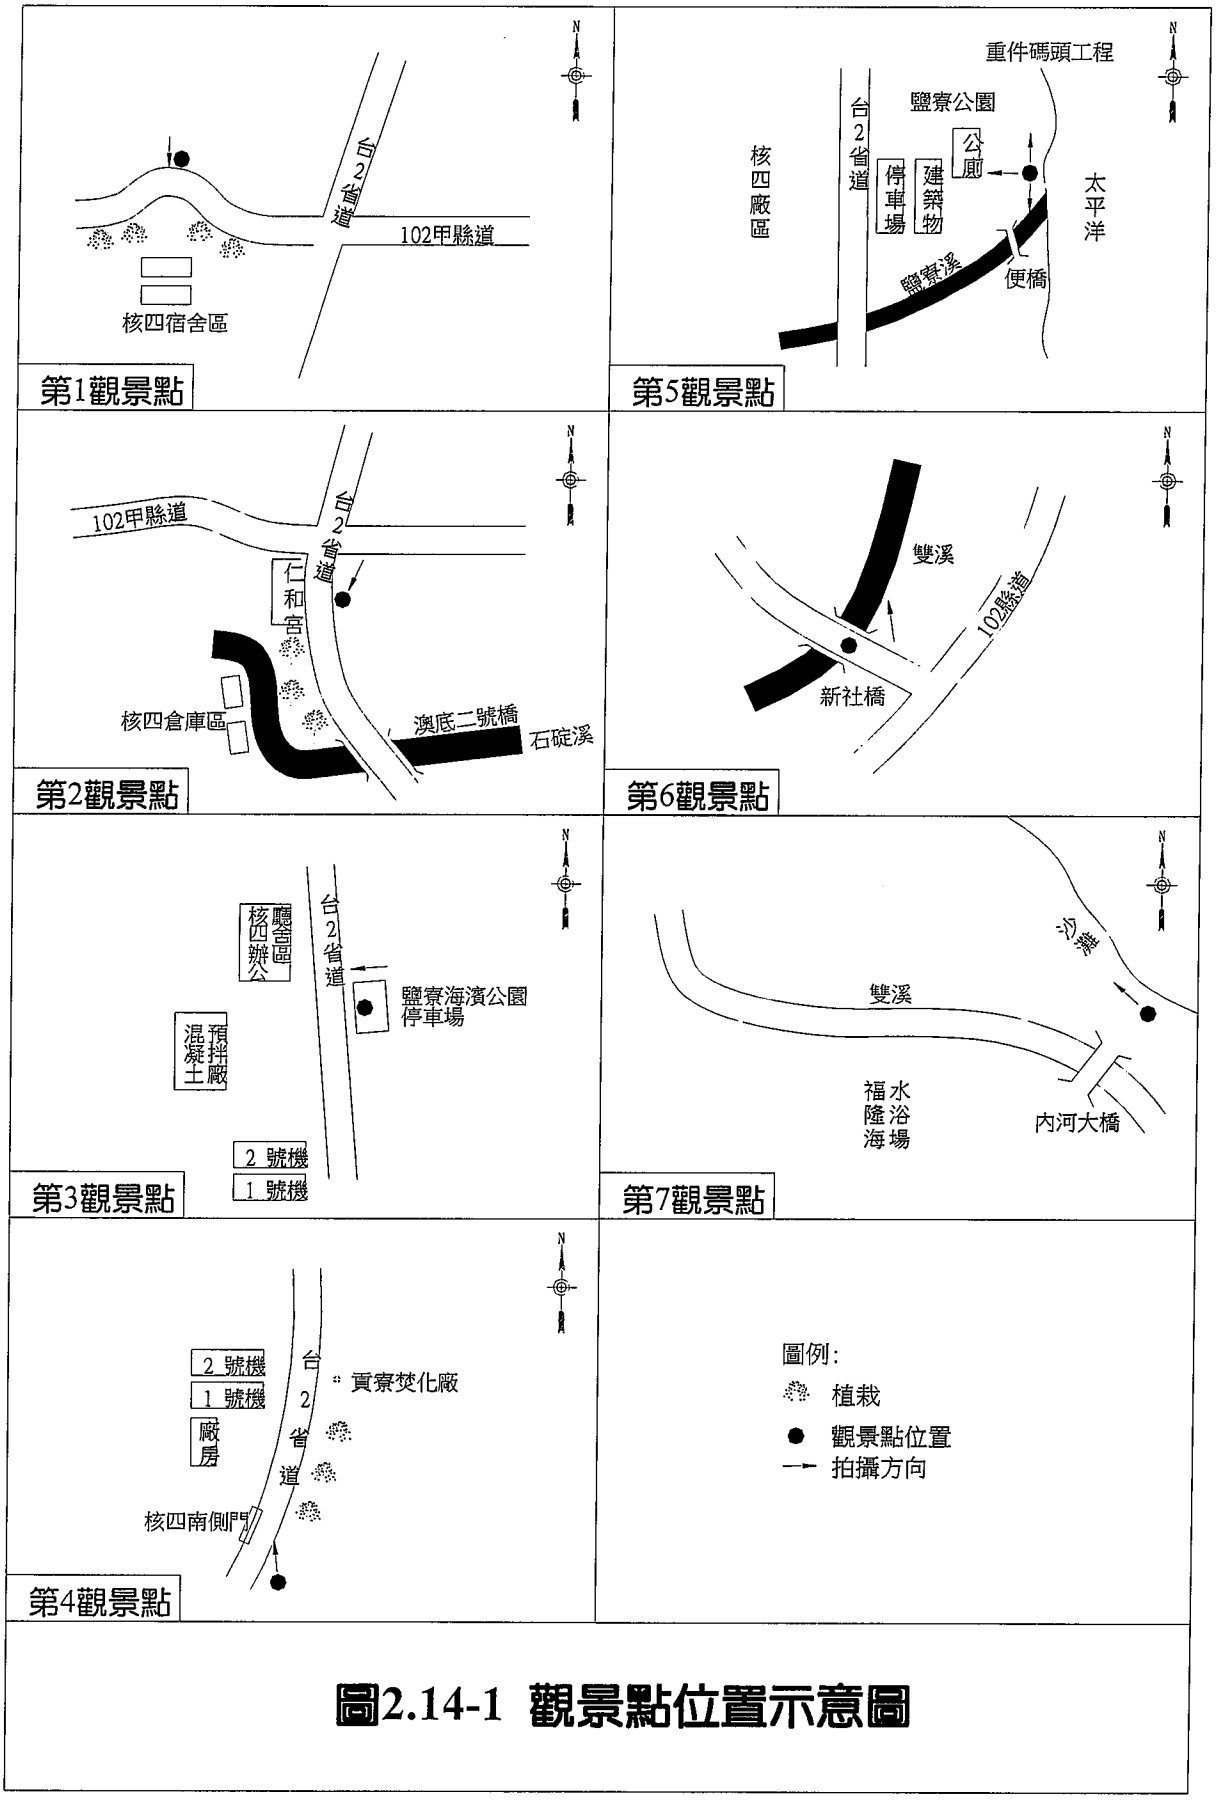


圖2.14-1 觀景點位置示意圖



拍攝日期： 88年3月　　拍攝日期：100年6月　　拍攝日期：101年6月

▲第一觀景點：龍門發電廠職工宿舍於95/8完工，本季與去年同季比較，視覺景觀大抵相同



拍攝日期：86年3月　　拍攝日期：100年6月　　拍攝日期：101年6月

▲第二觀景點： 86年2月進行台2省道景觀綠化工程，拆除原有零亂之廣告看板，並於道路旁設置圍籬及植栽，目前僅隱約可見廠內房舍



◀拍攝日期：86年3月



▶拍攝日期：99年5月



◀拍攝日期：100年6月



▶拍攝日期：101年3月

▲第三觀景點： 90/10進行進出水暗渠工程，將原植栽物移除，後已植栽綠化完成。99/9起因台2省道改道工程施工，景觀略受影響，於100/5台2省道改道工程已完工

照片2.14-1 核四施工環境監測第1～3號觀景點記錄照片



拍攝日期：86年7月



拍攝日期：95年8月



拍攝日期：96年3月



拍攝日期：100年6月



拍攝日期：101年6月

▲第四觀景點：90/2核四復工，1、2號機廠址附近出現許多大型吊車，施工作業頻繁；95/8因廠房共同通風塔施工完成，廠區內結構物佔視覺影響面積加大，96/3起因一號機汽機廠房工程施工，景觀略受影響，已於97/10完工



拍攝日期：86年9月



拍攝日期：100年6月



拍攝日期：101年6月

▲第5觀景點北向：88年7月起開始進行海域部分施工，隨著工程進行，防波堤結構物逐漸延伸入海，抽水機房外部結構體施工站視覺影響面積大



拍攝日期：86年12月



拍攝日期：100年6月



拍攝日期：101年6月

▲第5觀景點西向：可見1、2號廠房結構體及廠房共同通風塔，結構物佔視覺影響面積大

照片2.14-2 核四施工環境監測第4～5（西向）號觀景點記錄照片



拍攝日期：86年9月　　拍攝日期：100年6月　　拍攝日期：101年6月

▲第5觀景點南向：未因工程施工而有影響



拍攝日期：90年6月　　拍攝日期：100年6月　　拍攝日期：101年6月

▲第6觀景點：未因工程施工而有影響



拍攝日期：87年7月　　拍攝日期：89年9月



拍攝日期：100年6月　　拍攝日期：101年5月

▲第7觀景點：89年第3季進行生水系統施工，後停工並復育，直至96/5復工，開挖規模加大影響視覺景觀，惟廠區加強植栽復育之成效已日益顯著

照片2.14-3 核四施工環境監測第5（南向）～7號觀景點記錄照片

海域漂砂調查

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.15 海域漂砂

1.樣品分析結果

本計畫海域漂砂調查旨在分析此海域運動底質之粒徑特性及輸砂方向，以瞭解核四工程可能對此海域漂砂之影響。過去長期（84/8~94/3）針對漂砂粒徑之調查已可充分掌握此海域漂砂含量及粒徑分佈情形，並可依漂砂粒徑大小研判漂砂移動趨勢，因此自 94 年第 2 季起，乃調整海域漂砂調查方式，以多方向捕砂器搭配海流監測，以掌握海底底質受波浪、水流作用，沿底床附近運動時之各方向輸砂量，並藉施測當時所得之主要輸砂方向，幫助推估調查區域內之漂砂優勢方向。海域受波浪作用時，海底之水平流速因水深變化而異，水深較大處流速較小，而水淺處流速較大，同時在淺水域中之波形變為不對稱，波峰出現時流速大，而波谷出現時流速小，因此水粒子前進之加速度較後退加速度大，故前進時將粒徑較大之砂粒推向岸邊，後退時由於部份粒徑較大之砂粒仍停留在原地，因此原來包含各種大小粒徑之底質將重新調整，各種粒徑之砂粒移動至適當之水深後停止移動，此種現象稱為篩分作用。因此形成同一地點之粒徑大致相同，淺水處粗粒料所佔之成份較多，靠近破碎點之中值粒徑愈大，愈向外海則中值粒徑愈細；粒度由大而小的遞減方向，可視為漂砂前進方向。

海域漂砂調查自 99 年第 2 季開始共規劃 5 個捕砂施測地點，編號由北而南分別為 S1、S2 與 S3，分佈於水深約為 5~6m 等深線處，而編號 S4 與 S5 位於較外海水深約為 10~11m 等深線處，亦由北而南分佈。有關採樣位置與座標詳前圖 1.4-12 所示。漂砂調查係於測點底床裝置 1 具 8 方向之捕砂器，其中 1 孔標示正北，由潛水人員在海底進行正北的校正，而儀器固定在與海床平行距離 10cm 處。完成調查取樣時，需進行各方向捕砂孔內之含砂量重量分析及砂樣篩分析等。

捕砂時間依現地情況而異，以集砂器不滿溢為原則，本季捕砂器施放的時間為 101 年 6 月 10 日 9：00 至 6 月 11 日 11：40，捕砂時間共約

計 25 小時。每個捕砂器各有 N、NE、E、SE、S、SW、W、NW 等 8 個方向之砂樣，本次合計共採集 40 個砂樣進行分析。完成調查取樣時，將各方向所採集之砂樣取出秤重並以 Coulter LS 100 雷射顆粒度分析儀進行粒徑分析，以得到運動底質之粒徑及調查期間的主要漂砂方向及輸砂量等資料。

在粒徑分析方面，其步驟為：選取適當數量顆粒度小於 0.85mm 之土粒樣品，加入適量乾淨水充分混合後置於雷射儀器上，經分析後可得初始結果（Raw Data），至於粒度大於 0.85mm 之土粒則進行一般篩分析（Sieve Analysis）來了解其粒度分佈情形，上述資料分析後可得如附錄Ⅳ.9 之粒徑分佈圖。資料整理後可得中值粒徑 d_{50}，平均粒徑 dm，有效粒徑 d_{10}，及 d_{25}、d_{75}、d_{90} 各粒徑值。各測點 8 方向捕獲的砂樣粒徑分析結果如表 2.15-1 所示，若依平均粒徑來區分，則各測點的砂樣歸類如表 2.15-2 所示。由表 2.15-2 顯示，本次調查區域範圍內底質的平均粒徑均為細砂，各測站平均粒徑大小在 132.1~249.9μm 之間。

2.漂砂移動趨勢

輸砂速率之推算係以每個測點之 8 個方向捕砂孔所攔截的漂沙底質經秤重後得到進砂量，重量除以捕砂孔截面積，再除以捕砂時間即得進砂速率，其結果列於表 2.15-3。而漂砂移動方向則以兩相對方向進砂速率相減所得的淨輸砂速率來進行分析，而所謂的漂砂方向是以漂砂的來向為主，當兩相對方向進砂速率相減時，進砂速率較小的一端自然為漂砂堆積的一方。有關本季海域底質輸砂情況如表 2.15-4 所示，各測站各方向進砂速率雷達圖與淨進砂速率雷達圖如圖 2.15-1 所示。

另在不區分漂砂來向的條件下，進一步將八方向捕砂器各方位所擷取的總漂砂量，以單位時間（每分鐘）、單位通過面積（每平方公尺）為基礎，換算成總漂砂傳輸率（單時間之漂砂體積量，cm^3/min），該法計算所得之總漂砂傳輸率即觀測區域內單位時間總體漂砂發生體積，較大的總傳輸率表示受到驅動的漂砂數量較多，因此相對的地形水深發生

大範圍變化的機會亦隨之提高。而總傳輸率與淨傳輸率並不相同，若淨傳輸率為零之海域，仍可具有高總傳輸率，一旦保持漂砂平衡的條件遭到改變，該海域產生的侵、淤現象將會十分明顯。以和量方式計算之淨漂砂傳輸率與淨傳輸來向，以代表各測站附近的漂砂傳輸趨勢，結果如表 2.15-5，和量傳輸速率向量圖則如圖 2.15-2 所示。

測站 S1 八方向捕砂器各方向平均粒徑分佈在 202.5~216.7μm 間，底質歸類為細砂；101 年 6 月 10 日 9:00 至 101 年 6 月 11 日 10:00 間之收集總重量為 841 公克，進砂速率在 4.26~11.01cm^3/min 間，主要輸砂來向以 W 為主，最大淨輸砂方向為 E，最大之淨輸砂速率為 6.09cm^3/min；以向、離岸方向描述則漂砂趨勢主要垂直岸線向外海推移；以和量計算方式以沿岸方向描述，漂砂趨勢則向 SE 傳輸，傳輸率為 6.48cm^3/min。

測站 S2 八方向捕砂器各方向平均粒徑分佈在 172.0~209.3μm 間，底質歸類為細砂;101 年 6 月 10 日 9:20 至 101 年 6 月 11 日 10:20 間之收集總重量為 503 公克，進砂速率在 2.49~8.06cm^3/min 間，主要輸砂來向以 NE 為主，最大淨輸砂方向為 SW，最大之淨輸砂速率為 3.14cm^3/min；以向、離岸方向描述則漂砂趨勢主要垂直岸線向岸側推移；以和量計算方式以沿岸方向描述，漂砂趨勢則向 SW 傳輸，傳輸率為 4.55cm^3/min。

測站 S3 八方向捕砂器各方向平均粒徑分佈在 169.4~249.9μm 間，底質歸類為細砂；101 年 6 月 10 日 10:00 至 101 年 6 月 11 日 11:00 間之收集總重量為 816 公克，進砂速率在 2.69~11.33cm^3/min 間，主要輸砂來向以 NE 為主，最大淨輸砂方向為 E，最大之淨輸砂速率為 3.14cm^3/min；以向、離岸方向描述則漂砂趨勢主要垂直岸線向外海推移；以和量計算方式以沿岸方向描述，漂砂趨勢則向 NNE 傳輸，傳輸率為 2.84cm^3/min。

測站 S4 八方向捕砂器各方向平均粒徑分佈在 158.3~166.9μm 間，底質歸類為細砂；101 年 6 月 10 日 10:20 至 101 年 6 月 11 日 11:20 間之收集總重量為 885 公克，進砂速率在 4.98~10.29cm^3/min 間，主要輸砂來向以 W 為主，最大淨輸砂方向為 E，最大之淨輸砂速率為 5.24cm^3/min；以

向、離岸方向描述則漂砂趨勢主要垂直岸線向外海推移；以和量計算方式以沿岸方向描述，漂砂趨勢則向 SSE 傳輸，傳輸率為 7.58cm^3/min。

測站 S5 八方向捕砂器各方向平均粒徑分佈在 132.1~142.6μm 間，底質歸類為細砂；101 年 6 月 10 日 10:40 至 101 年 6 月 11 日 11:40 間之收集總重量為 793 公克，進砂速率在 4.52~7.93cm^3/min 間，主要輸砂來向在 NE、SW、SE、W、S 等均差異不大，最大淨輸砂方向為 NW，最大之淨輸砂速率為 2.82cm^3/min；以向、離岸方向描述則漂砂趨勢主要垂直岸線向岸側推移；以和量計算方式以沿岸方向描述，漂砂趨勢則向 NNW 傳輸，傳輸率為 3.71cm^3/min。

僅以漂砂八方位中優勢（最大捕砂體積量方向）方向而言，各捕砂器漂砂運動方向以垂直岸線為主，以向、離岸方向描述則漂砂趨勢以向外海推移為主。以和量計算方式考量各方位漂砂傳輸分量相消、疊加之影響，S1 與 S4 測站以約略平行岸線方向向南傳輸，S4 測站則向北傳輸，而 S2 與 S3 測站則為約略垂直岸線方向傳輸，S2 測站向岸側傳輸，S3 測站則向外海傳輸。

3.近岸流場調查

配合輸砂方向分析，本計畫漂砂調查亦增加 1 處海流監測站，海流儀設置位置如前圖 1.4-12，監測位置之水深為 10 公尺，海流儀則定點於水面下 5 公尺之水層進行監測，並記錄該點該水層之流速、流向資料。佈設時以漁船作業，使用 DGPS 定位方式配合潛水人員進行。自計式海流儀以不銹鋼纜加錨鍊、重錘固定於海床之上，以防止底拖漁船之破壞，配合 DGPS 定位以確定其位置，方便潛水人員取得海流儀。本次自計式海流儀有效時間從 101 年 6 月 10 日 09:00 至 101 年 6 月 11 日 10:00 止，每 5 分鐘接收 1 筆資料。

海流點位實測資料之統計結果如表 2.15-6，而統計資料之流速流向玫瑰圖如圖 2.15-3 所示。由圖可知實測資料顯示此地區流向大多以西北與東南方向為主，主要受沿岸及海底地形影響，屬於邊界流場，故其特

性為海流方向以平行海岸線為主；由圖 2.15-4 流速流向棍棒圖及潮汐水位圖之相對應下可看出，測定當時之海潮流流向與潮汐水位變化關係明顯，漲潮時其流向主要為 NW 及 WNW 方向【以 WNW 向為主】，而在退潮時其流向主要為 SE 及 ESE 方向【以 SE 為主】。

各漲退潮段之流速與流向資料，依其 X 軸與 Y 軸分量計算所得之累積向量資料分析如表 2.15-7 所示，累積向量路徑如圖 2.15-5。由海流實測數據資料可知，於 101 年 6 月 11 日 2:35 所測到退潮時往 SE 方向瞬間最大流速 26.4cm/sec，於 101 年 6 月 10 日 22:20 所測到漲潮時往 NW 方向瞬間最大流速 29.7cm/sec；各潮段之累積向量路徑方向大致平行等深線，平均速率在 11.7~20.7cm/sec 之間，以 C2 漲潮段之平均流速最大，C1 退潮段之平均流速最小，本測次在 C2 與 C4 漲潮段之累積向量約略平行等深線方向往 NW 方，但在 C1 與 C3 退潮段時，可能受地形效應影響，轉流時間點與退潮時間點有所差異，該二潮段之累積向量方向呈現約略先往 NW 方再轉回 SE 方，路徑呈現八字流形，可持續觀察是否為本海域之流場特性。

表2.15-1 本季（101年第2季）漂砂底質粒徑分佈表

單位：μm

採樣日期	測點	方向	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	d_{90}	d_m
101/6/10 09:00 至 101/6/11 10:00	S1	N	125.4	171.3	203.6	220.9	322.5	213.7
		NE	126.9	168.7	198.7	214.9	299.1	205.8
		E	122.1	169.7	200.7	217.4	305.4	208.2
		SE	125.9	170.9	201.8	218.3	306.0	208.6
		S	128.2	173.4	206.0	223.2	327.7	216.7
		SW	125.0	168.0	198.1	214.4	296.6	203.1
		W	119.9	166.6	196.8	213.0	295.8	202.5
		NW	119.5	165.8	196.4	212.9	300.9	204.2
101/6/10 09:20 至 101/6/11 10:20	S2	N	71.06	133.4	169.7	187.9	309.8	183.3
		NE	83.14	146.6	184.9	205.4	389.5	209.3
		E	74.52	130.9	166.2	183.9	290.1	179.9
		SE	71.07	122.9	158.0	175.5	272.3	172.0
		S	80.15	136.4	173.3	192.4	334.4	191.1
		SW	76.54	133.3	170.7	190.0	351.5	192.7
		W	72.11	127.0	162.5	180.1	295.8	178.1
		NW	85.81	139.5	174.2	192.2	326.6	192.3
101/6/10 10:00 至 101/6/11 11:00	S3	N	80.83	122.1	151.5	167.2	264.3	169.4
		NE	94.18	150.9	196.3	224.3	414.0	224.8
		E	96.85	152.3	199.5	230.0	418.2	229.5
		SE	98.11	153.4	204.4	239.9	470.5	249.9
		S	85.61	136.7	174.1	195.6	368.9	198.3
		SW	89.07	141.2	179.9	202.9	400.7	210.8
		W	97.77	154.1	201.6	231.5	408.1	227.8
		NW	92.26	144.2	190.0	220.2	448.8	234.2
101/6/10 10:20 至 101/6/11 11:20	S4	N	78.41	132.4	160.5	174.4	234.8	158.3
		NE	85.35	133.8	161.3	175.0	135.0	159.8
		E	78.52	134.1	162.4	176.4	239.2	160.9
		SE	85.59	136.6	165.1	179.1	242.5	164.1
		S	89.40	138.9	167.4	181.5	245.8	166.9
		SW	74.94	133.8	162.0	175.7	234.7	158.6
		W	86.41	137.0	164.9	178.5	239.3	163.1
		NW	83.78	133.3	160.9	174.7	234.0	159.1
101/6/10 10:40 至 101/6/11 11:40	S5	N	75.58	118.1	141.6	153.5	202.2	139.0
		NE	65.69	113.1	136.0	147.1	192.4	132.1
		E	77.87	121.0	145.5	157.6	207.9	142.6
		SE	72.05	117.1	140.7	152.5	199.4	137.4
		S	77.18	119.4	143.4	155.4	204.4	140.6
		SW	64.80	113.6	139.6	152.3	203.7	136.9
		W	62.33	110.8	137.5	150.4	201.5	134.7
		NW	63.68	112.5	138.4	151.1	202.6	135.8

表2.15-2 本季（101年第2季）捕砂器砂樣成分綜合歸類表

（以中值粒徑區分）

時間 / 點位	成份
	101/06/10 09:00 ~ 101/06/11 11:40
S1	細砂
S2	細砂
S3	細砂
S4	細砂
S5	細砂

註：粉砂(4μm~62.5μm)，極細砂(62.5μm~125μm)，細砂(125μm~250μm)，中砂(250μm~500μm)。

表 2.15-3 本季（101 年第 2 季）漂砂底質進砂速率分佈表

點位	方向	進砂量 (g)	進砂百分比 (%)	進砂速率 cm^3/min
S1	N	126	14.98	8.25
	NE	133	15.81	8.71
	E	75	8.92	4.91
	SE	85	10.11	5.57
	S	65	7.73	4.26
	SW	114	13.56	7.47
	W	168	19.98	11.01
	NW	75	8.92	4.91
S2	N	47	9.34	3.08
	NE	123	24.45	8.06
	E	81	16.10	5.31
	SE	38	7.55	2.49
	S	38	7.55	2.49
	SW	75	14.91	4.91
	W	60	11.93	3.93
	NW	41	8.15	2.69
S3	N	41	5.02	2.69
	NE	173	21.20	11.33
	E	87	10.66	5.70
	SE	83	10.17	5.44
	S	82	10.05	5.37
	SW	151	18.50	9.89
	W	135	16.54	8.84
	NW	64	7.84	4.19
S4	N	128	14.46	8.39
	NE	128	14.46	8.39
	E	77	8.70	5.04
	SE	105	11.86	6.88
	S	84	9.49	5.50
	SW	76	8.59	4.98
	W	157	17.74	10.29
	NW	130	14.69	8.52
S5	N	77	9.71	5.04
	NE	121	15.26	7.93
	E	87	10.97	5.70
	SE	112	14.12	7.34
	S	106	13.37	6.94
	SW	114	14.38	7.47
	W	107	13.49	7.01
	NW	69	8.70	4.52

1.調查時間約計 25 小時，各測站時間分別為
S1：101/6/10 09:00 至 101/6/11 10:00。
S2：101/6/10 09:20 至 101/6/11 10:20。
S3：101/6/10 10:00 至 101/6/11 11:00。
S4：101/6/10 10:20 至 101/6/11 11:20。
S5：101/6/10 10:40 至 101/6/11 11:40。
2.註：捕砂器之開孔尺寸為 10cm×4cm。

表 2.15-4 本季（101 年第 2 季）運動底質輸砂主要來向及最大淨輸砂方向和速率一覽表

點位	進砂速率範圍 (cm^3/min)	主要輸砂來向	最大淨輸砂方向	最大淨輸砂速率 (cm^3/min)	說明
S1	4.26~11.01	W	E	6.09	往東之離岸運動趨勢
S2	2.49~8.06	NE	SW	3.14	往西南之向岸運動趨勢
S3	2.69~11.33	NE	E	3.14	往東之離岸運動趨勢
S4	4.98~10.29	W	E	5.24	往東之離岸運動趨勢
S5	4.52~7.93	NE、SW、SE、W、S	NW	2.82	往西北之離岸運動趨勢

1.調查時間約計 25 小時，各測站時間分別為 S1：101/6/10 09:00 至 101/6/11 10:00。S2：101/6/10 09:20 至 101/6/11 10:20。S3：101/6/10 10:00 至 101/6/11 11:00。S4：101/6/10 10:20 至 101/6/11 11:20。S5：101/6/10 10:40 至 101/6/11 11:40。

2.註：捕砂器之開孔尺寸為 10cm×4cm。

表 2.15-5 本季（101 年第 2 季）運動底質調查和量計算之漂砂傳輸趨勢結果

測站	和量角度	淨傳輸方向	傳輸率 (cm^3/min)
S1	132.90	SE	6.48
S2	229.53	SW	4.55
S3	26.06	NNE	2.84
S4	148.26	SSE	7.58
S5	344.25	NNW	3.71


表 2.15-6 本季（101 年第 2 季）海流儀實測統計資料表

流 向	流速（CM/S）百分比（%）					累計百分比
	0-10cm/s	10-20 cm/s	20-30 cm/s	30-400 cm/s	>40 cm/s	
N	2.35%	1.68%	0.00%	0.00%	0.00%	4.03%
NNE	0.67%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
NE	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.34%
ENE	2.68%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	3.02%
E	2.68%	1.68%	0.00%	0.00%	0.00%	4.36%
ESE	4.36%	6.04%	3.02%	0.00%	0.00%	13.42%
SE	2.68%	9.40%	4.03%	0.00%	0.00%	16.11%
SSE	0.00%	1.68%	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%
S	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WSW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
W	0.34%	3.02%	1.68%	0.00%	0.00%	5.03%
WNW	0.34%	19.46%	9.40%	0.00%	0.00%	29.19%
NW	2.01%	7.38%	6.38%	0.00%	0.00%	15.77%
NNW	1.34%	3.69%	0.00%	0.00%	0.00%	5.03%
累計百分比	20.81%	54.70%	24.50%	0.00%	0.00%	100.00%


調查時間：101 年 06 月 10 日 09:00 至 06 月 11 日 11:40，約計 25 小時。

表 2.15-7 本季 （101 年第 2 季）近岸流場調查累積向量資料分析表


測站	水深	潮段	觀測時間	平均流速 (cm/sec)	約略流向
海流儀（A4）	11m	C1 退潮段	101/6/10 10:05 ~ 17:00	11.7	WNW 轉 SE 再轉 NW
		C2 漲潮段	101/6/10 17:00 ~ 22:25	20.7	NW
		C3 退潮段	101/6/10 22:25 ~ 6/11 07:00	14.8	NW 轉 SE
		C4 漲潮段	101/6/11 07:00 ~ 10:10	15.5	NW

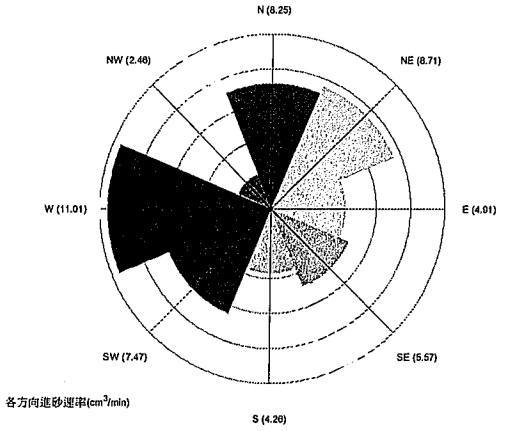


S1測站各方向進砂速率雷達圖

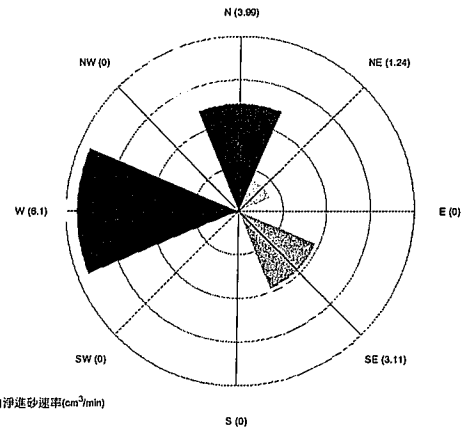


S1測站各方向淨進砂速率雷達圖

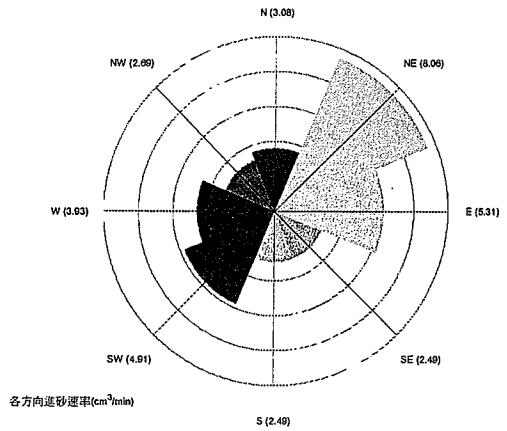


S2測站各方向進砂速率雷達圖

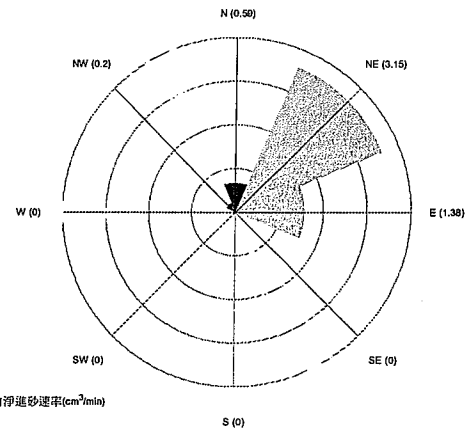

S2 測站各方向淨進砂速率雷達圖

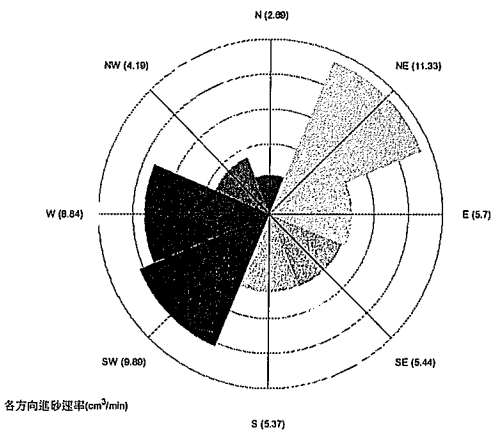


S3測站各方向進砂速率雷達圖

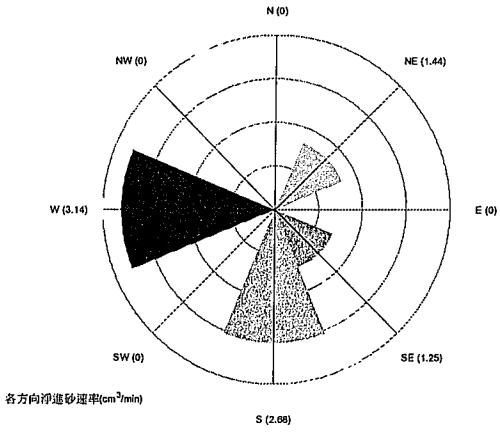


S3測站各方向淨進砂速率雷達圖


圖2.15-1　本季（101年第2季）各測站各方向進砂速率及淨進砂速率雷達圖

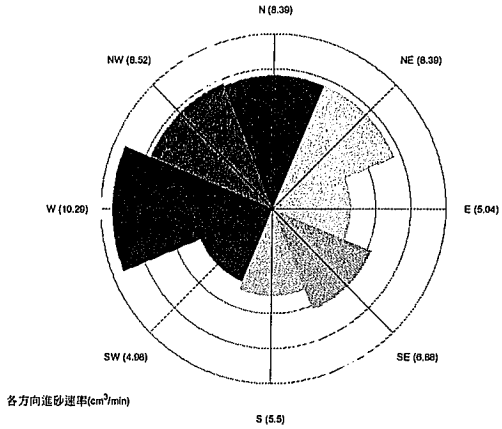


S4測站各方向進砂速率雷達圖

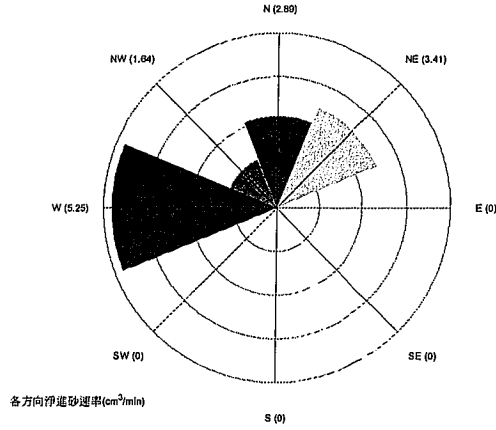

S4測站各方向淨進砂速率雷達圖

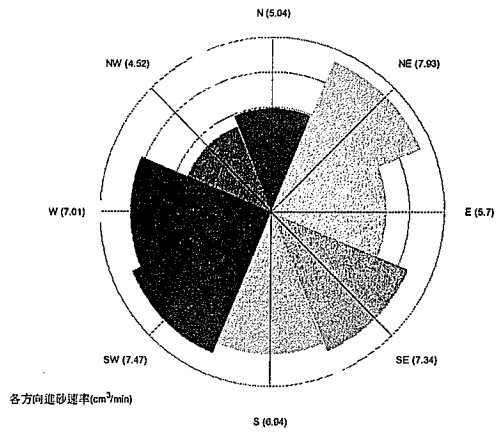

S5測站各方向進砂速率雷達圖

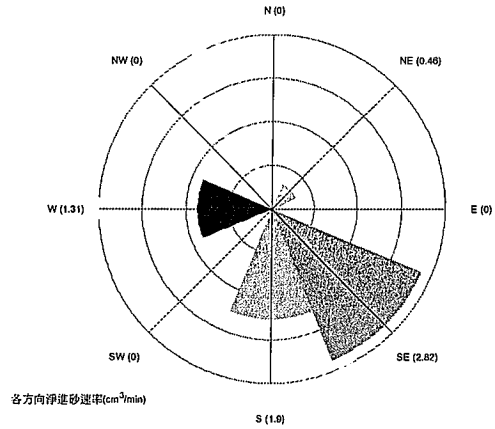

S5 測站各方向淨進砂速率雷達圖

圖2.15-1　本季（101年第2季）各測站各方向進砂速率及淨進砂速率雷達圖（續）

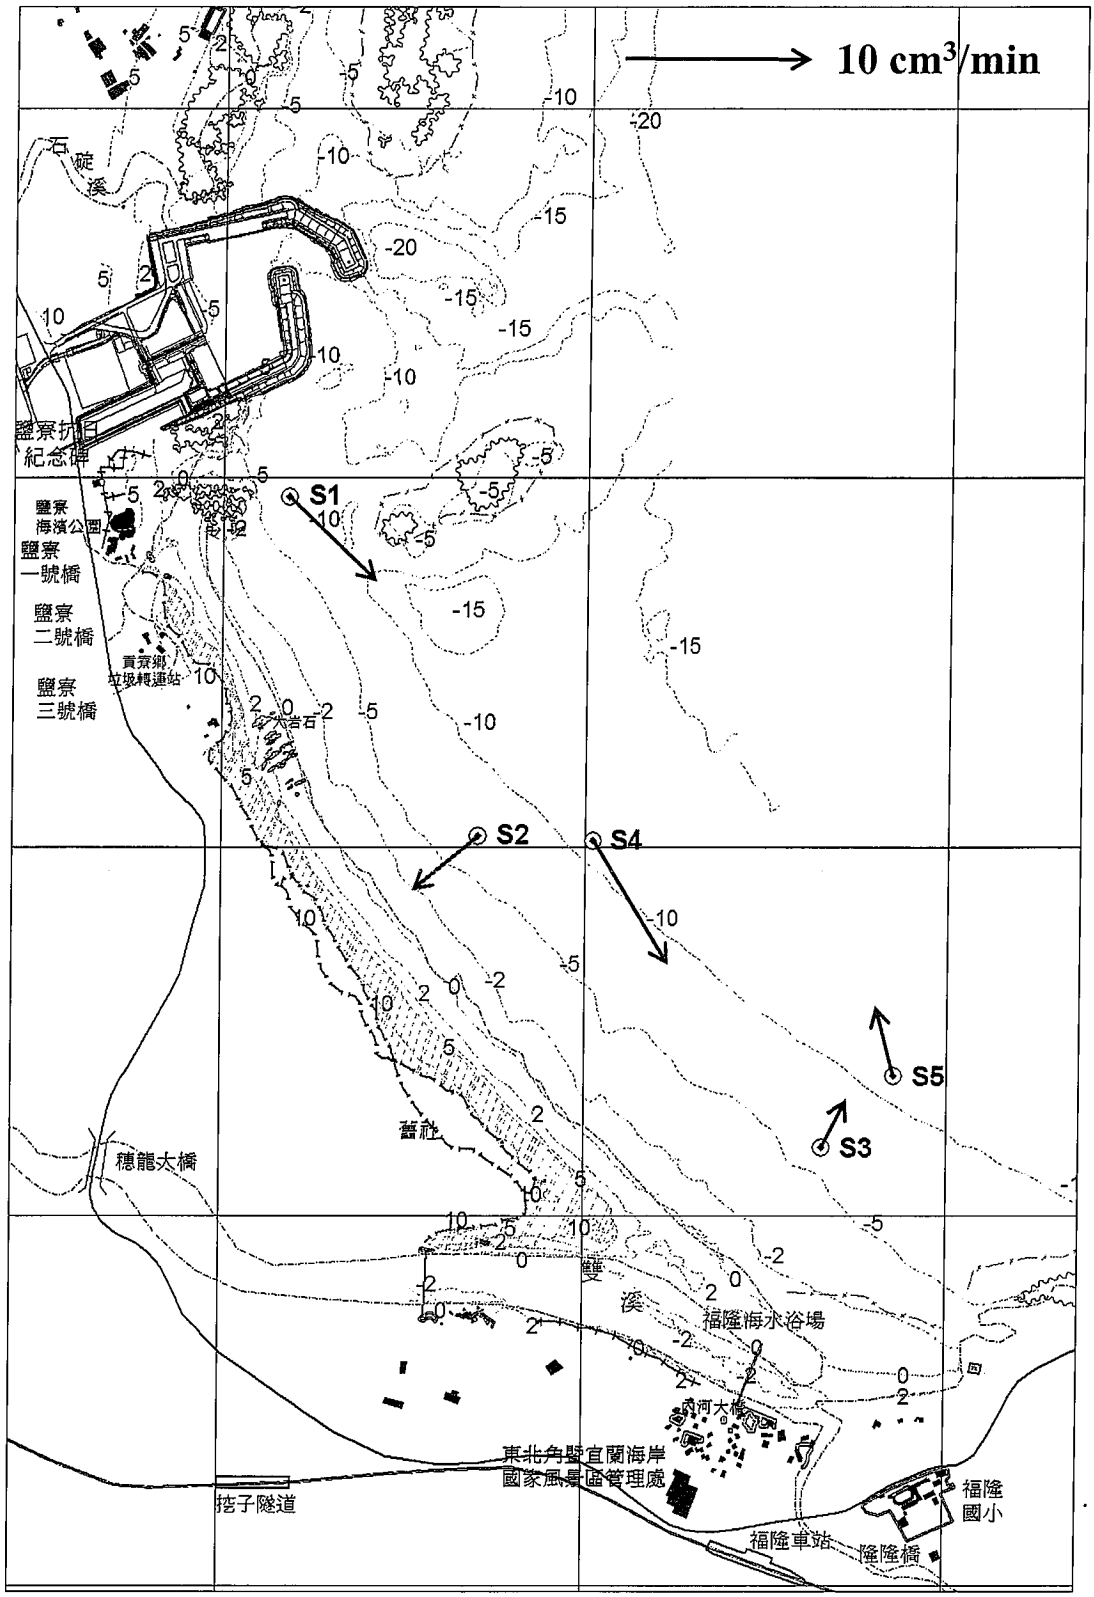


圖2.15-2　本季（101年第2季）各測站輸砂和量淨傳輸率向量圖

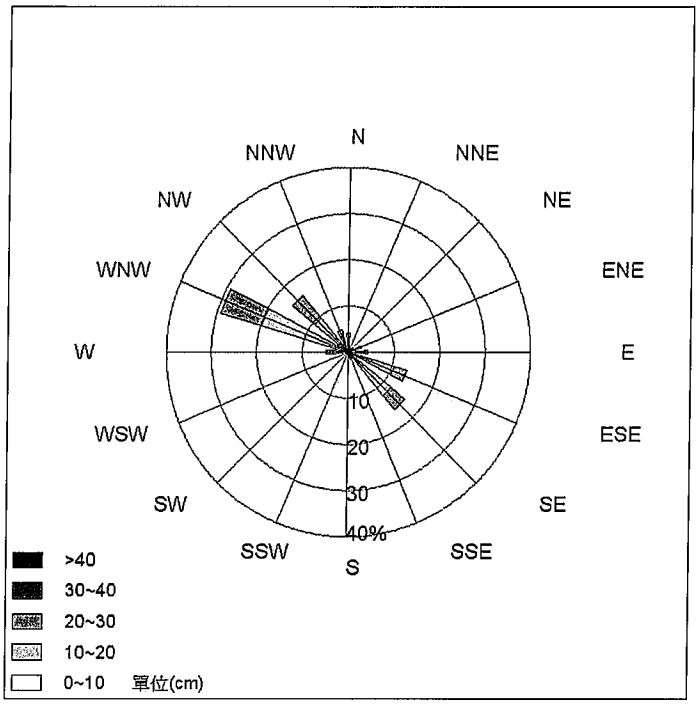


圖2.15-3　本季（101年第2季）海流儀實測流速流向玫瑰圖

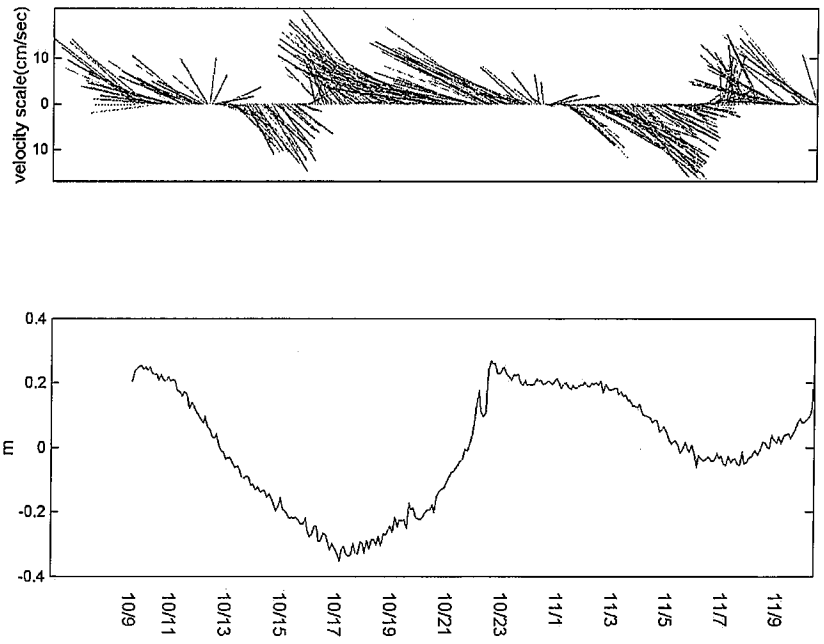


圖2.15-4　本季（101年第2季）流速流向棍棒圖及潮汐水位變化圖

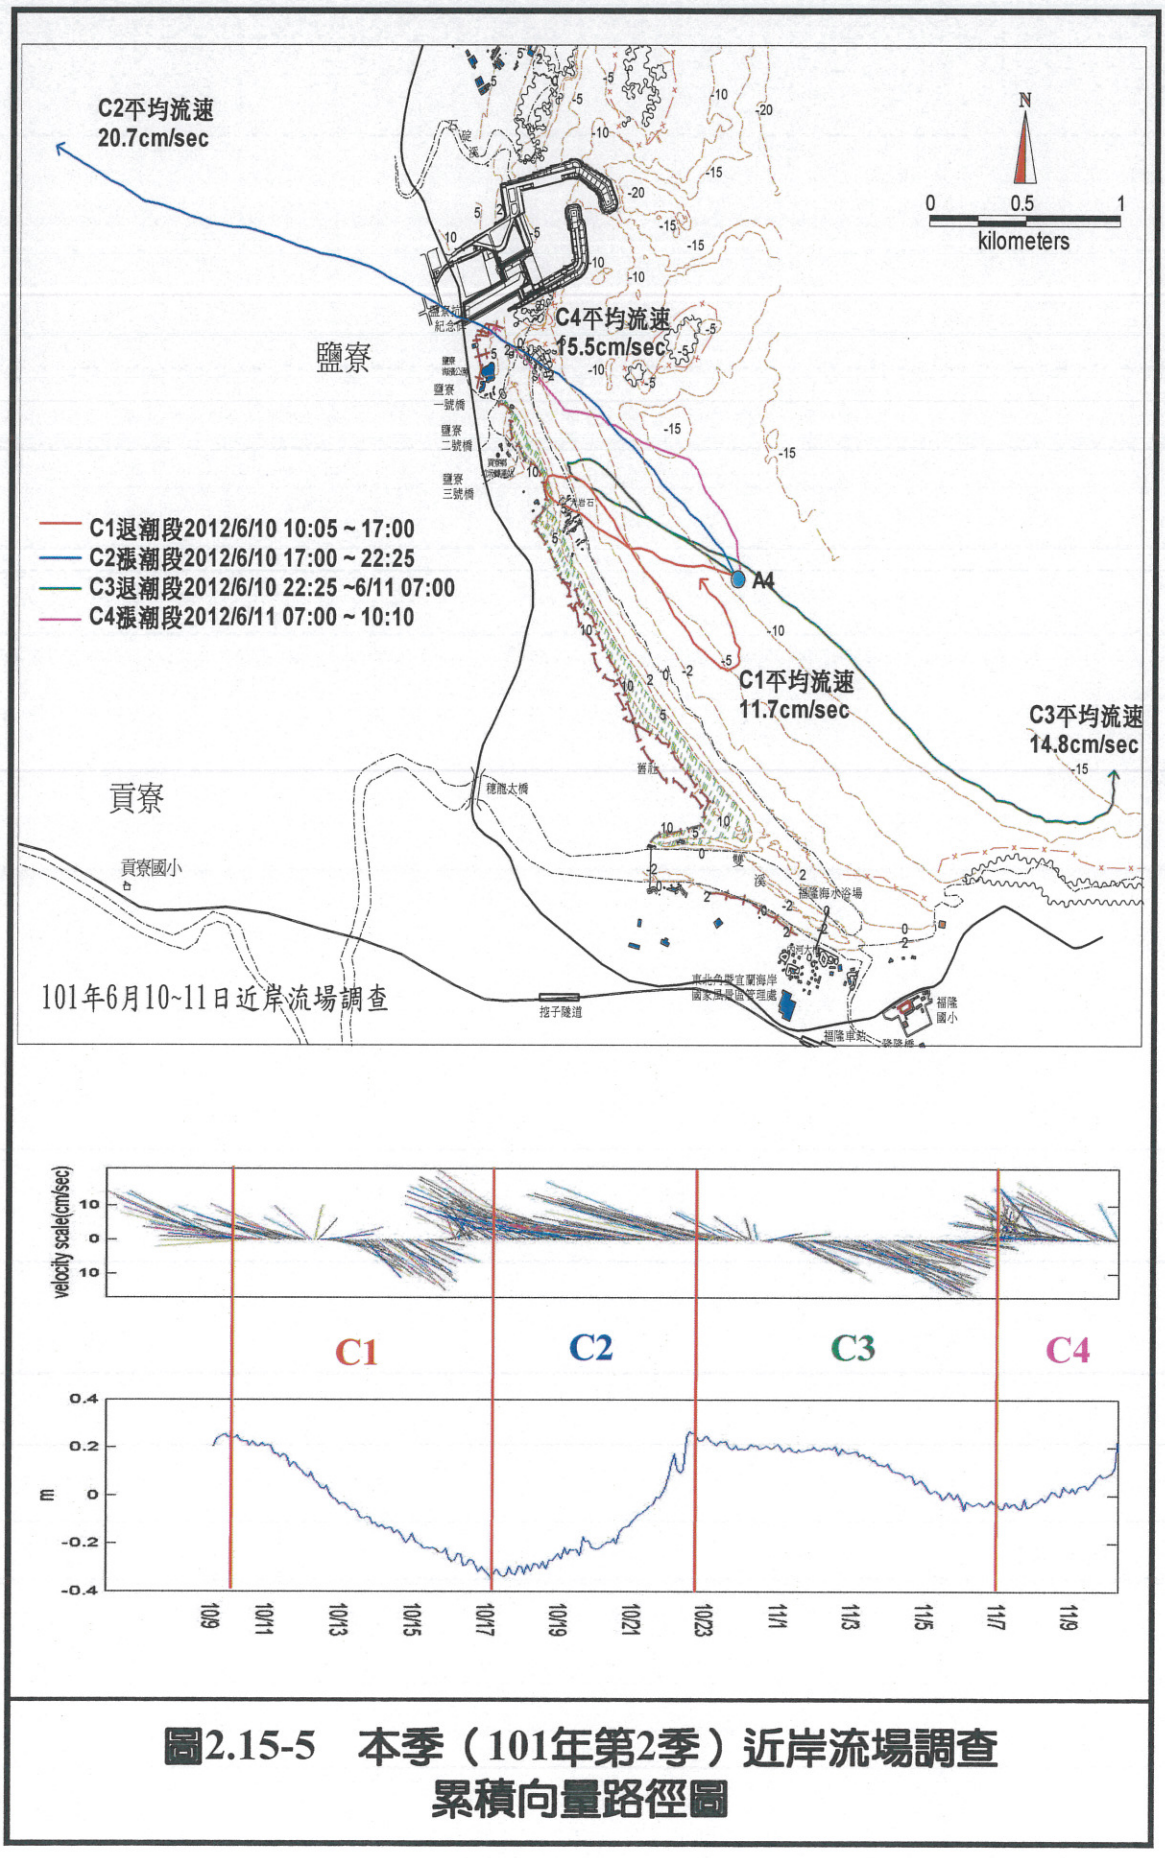


圖2.15-5　本季（101年第2季）近岸流場調查累積向量路徑圖

海岸地形調查

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

2.16 海岸地形

為進一步掌握核四附近鹽寮灣海域之沙灘變化，自 92 年第 1 季起除原計畫每年 2 次的陸域地形及海域地形調查外，另增加陸上地形調查頻率（增為每季 1 次）及沙灘定樁觀測。陸上地形調查範圍以低潮線往內陸 200 公尺為範圍，未達 200 公尺處則以台 2 線為最遠之邊界；測量方法以全球衛星定位系統之 RTK 模式進行，垂直海岸線方向之測線間距為 100 公尺，於進水口防波堤至鹽寮海濱公園附近地形，垂直海岸線之測線間距則加密至 25 公尺 1 條，測線規劃如圖 2.16-1 所示。

此外極近岸碎波帶部分之水深量測，主要顧慮測量人員與船隻之安全及測量效率等因素，多採用等差方式繪製等深線，惟此區域多為岸線變遷之主要區域，因此為確實掌握本區域之水深變化及更精確表現等深線之趨勢變化，自 93 年第 2 季（93/4）起每半年以小型船隻進行 1 次極近岸水深測量，以測深儀結合 DGPS 定位模式進行測量。量測系統所包含的設備計有：聲納設備、傾角改正系統（目前只針對 Rolling 部份進行修正）、無線傳輸系統、360 度稜鏡（配合陸地上之全站式經緯儀，以達到更高品質的平面控制）與 DGPS 接收器。

至於沙灘定樁觀測，於 96 年 6 月增設鹽寮海濱公園 1~3 號救生樁 3 點，99 年 3 月於鄰近處再增設 4~5 號救生樁 2 點，以及舊社 N21 南、北各 1 處救生樁，與 N16 大岩石北側救生樁，福隆海水浴場除原先靠外海之第 1 橋墩外，再增設第 2 橋墩與河道南側 N49 附近之救生樁 1 點，於垃圾掩埋場附近 N16 大岩石原先之 3 點定位樁，鄰近大岩石北側之救生樁亦作為新增之觀測樁，鹽寮、大岩石、舊社、福隆 4 區共計設置 14 處定位樁，均進行噴漆丈量比對，並以接近之角度於每次測量時進行攝影，藉以比對每次地貌之變化。本季調查時間為 101 年 6 月 9~12 日進行，其調查結果說明如下：

1.海域與陸域地形調查結果

本季進行之海、陸域調查，調查範圍由北而南共依 80 條規劃測線進行測量，其位置如圖 2.16-1 所示；將測區內所測之海、陸域地形三度空

間資料利用 DGM3 地形繪圖軟體繪製測區之等高線及等深線圖，並將所得圖形與澳底至福隆間之數化地形圖相結合。本季 101 年 6 月地形測量結果之等高線如圖 2.16-2~2.16-4 所示（各區位等深線及各剖面比較圖詳附錄Ⅳ.10），由該圖顯示，於海、陸域地形方面其等高線大致平行於海岸線，靠近鹽寮區域除貢寮鄉焚化爐及舊社東北方附近之高程較高，達 10~15m 左右，其餘地區高程多在 10m 以下。

(1)101 年 3 月至 101 年 6 月陸域地形變化

從 101 年 3 月至 101 年 6 月之陸域地形變化（如圖 2.16-4 所示，各區位等深線及各面比較圖詳附錄Ⅳ.10），大致可分為以下幾區之變化趨勢：

①澳底漁港至石碇溪以北：地形幾乎無太大之變化。

②石碇溪以南至核四進水口北防波堤：陸域地形高程+5m~0m 線大多向岸側退縮，最大量約 20m。沙灘面積略減，高程降低。

③核四進水口南防波堤至鹽寮海濱公園間：陸域地形高程+5m~+2m 線大多向外海推移，最大量約 8m；0m 線向岸退縮，最大量約 10m。沙灘面積差異不大高程略增。

④鹽寮海濱公園以南至大岩石間：陸域地形高程+5m~+2m 線大多向外海推移，最大量約 10m； 0m 線表現鹽寮海濱公園以南微向岸側退縮，最大量約 12m，大岩石附近為向外海推移，最大量約 25m。沙灘坡降較上季略為陡峭，大岩石附近沙灘面積略有增加。

⑤大岩石以南至福隆海水浴場以北（X-46 附近，詳錄Ⅳ.10-1）：大岩石以南至舊社附近陸域地形高程，+5m 線大多向岸側退縮，最大變化量約 10m；+2m 線以向外海推移為主，最大量約 13m；0m 線表現大多以向外海推移為主，在舊社附近推移量最大約 32m。沙灘坡降較上季平緩，沙灘高程略增面積增加。

⑥福隆海水浴場與雙溪河口附近（詳圖 2.16-6）：海水浴場北側+5m 線略向岸側推移，最大量約 5m；+2m 線則以向外海推移為主，但差

異量不大；0m 線在海水浴場北岸北側向外海推移，最大量約 30m，在海水浴場南岸差異變化量不大。沙灘坡降較上季平緩，面積增加但高程略有下降，雙溪沙嘴向東南推移。

由各剖面之變化來看，石碇溪以北之剖面圖 X-08 至 X-15 為礁盤地形，其變化並不大；往南於石碇溪以南至雙溪河口間之地形變化，於石碇溪至核四進水口北防波堤附近（剖面 X-16），高程在+2m~0m 間有侵蝕情形；鹽寮海濱公園至大岩石附近（剖面 X-21 至 X-32 間）附近，在核四進水口南防波堤至鹽寮海濱公園間(剖面 X-21 至 X-24)，高程在+5m~2m 間 X-24 有淤積情形外，其餘剖面則呈現侵蝕現象，另各剖面+2m~0m 間均呈現淤積情形。而鹽寮海濱公園以南至大岩石間（剖面 X-25 至 X-31），高程在+5m~2m 間 X-28~X-30 有淤積情形外，其餘剖面則呈現侵蝕現象，另各剖面+2m~0m 間均呈現淤積情形。鹽寮海濱公園至大岩石間植被稜線向外海推移，植被以下灘面高程相對增加，沙灘坡降相對較上季略為陡峭。

大岩石以南至舊社附近（剖面 X-32 至 X-41），在+5m~2m 間 X-34~X-37 與 X-39 有侵蝕情形外，其餘剖面為淤積情形；+2m~0m 間 X-34 與 X-39~ X-41 有侵蝕情形外，其餘剖面則呈現淤積情形，顯示此段海岸侵淤特性表現與鹽寮海濱公園至大岩石間大致相同，植被稜線向外海推移，植被以下灘面坡降較上季略為陡峭。舊社以南至 N26 附近（剖面 X-42 至 X-47）在+5m~2m 間 X-44 為淤積情形外，其餘剖面為侵蝕情形；+2m~0m 間則大多呈現淤積情形。

本季舊社以北陸域總體積變化較上季約增加 44,569 立方公尺，陸域整體平均高程增加約 21cm；依分區而言，大岩石以北陸域體積變化較上季約增加 5,124 立方公尺，高程較上季增加約 8cm，大岩石以南至福隆海水浴場附近陸域體積變化較上季約增加 39,445 立方公尺，高程較上季增加約 27cm。整體而言，本季砂量與上季相較相對增加，二次測量期間無大型颱風經過測區，砂量變化未受颱風作用影響屬受季節氣候影響所致之自然變遷。

整體而言，從 101 年 3 月至 101 年 6 月所調查的陸域地形整體趨勢，於澳底漁港至石碇溪以北之海岸地形幾乎無太大之變化，而於鹽寮海濱公園至福隆海水浴場以北，陸域砂量總體積有淤積情形，陸域高程均較上季有所增加。

⑵100 年 11 月至 101 年 6 月海域地形變化

本季與 100 年 11 月調查結果比較顯示（如圖 3.1-39.1 所示，各區位等深線及各剖面比較圖詳附錄Ⅳ.10），大致可分為以下幾區之變化趨勢：

①核四進水口南防波堤至鹽寮海海濱公園間：0m 線向外海推移，最大量約 20m；-2m 線則向岸側退縮，最大量約 25m；-5m 線亦向岸側退縮，最大量約 20m；-10m 線則以向外海推移為主。

②鹽寮海濱公園以南至 N16 大岩石間：0m 線均向外海推移，最大量約 28m；-2m 線則向岸側退縮，最大量約 60m；-5m 線亦向岸側退縮，最大量約 25m；-10m 線則退縮約 10m。

③N16 大岩石以南至 N21 舊社近岸海域地形：0m 線向外海推移，最大量約 40m；-2m 線亦以向外海推移為主，最大量約 40m；-5m 線則向岸側退縮，最大量約 60m；-10m 線表現一致，大多向岸側退縮，最大量約 30m。

④N21 舊社以南至 N26 福隆海水浴場以北近岸海域地形：0m 線向外海推移，最大量約 40m；-2m 線表現相同，大多向外海推移，最大量約 70m；-5m 線則向近岸退縮，最大量約 45m；-10m 線亦向近岸退縮，最大量約 30m。

⑤N26 以南至福隆海水浴場雙溪河口附近：0m 線以向外海推移為主，最大量約 40m；-2m 線表現相同，大多向外海推移，最大量約 60m；-5m 線向近岸退縮，最大量約 60m；-10m 線亦向近岸退縮，最大量約 40m。雙溪沙嘴 0m 線往東南推移延伸，內河大橋以北 0m 線往南向河道推移，最大量約 15m；沙灘面積增加高程降低。

各剖面之變化：於石碇溪以北之剖面圖 X-08 至 X-16 為礁盤地形，變化並不大；往南於核四進水口防波堤以南至雙溪河口間之地形變化，於鹽寮海濱公園至大岩石附近（剖面 X-21 至 X-32 間）附近，在核四進水口南防波堤至鹽寮海海濱公園間（剖面 X-21 至 X-24），高程在 0m~-2m 間均以侵蝕情形為主，-2m~-10m 間表現亦以侵蝕為主。而鹽寮海濱公園以南至大岩石間（剖面 X-25 至 X-31），0m~-10m 間大多呈現侵蝕現象。鹽寮海濱公園至大岩石間近岸海域高程較 100 年 11 月有侵蝕情形。

大岩石以南至舊社附近（剖面 X-32 至 X-41），高程在 0m~-2m 間剖面 X-32~X-33 與 X-40~X-41 有侵蝕情形，其餘剖面均為淤積之情形；-2m~-5m 間剖面 X-37~X-40 表現為淤積外，其餘均以侵蝕為主；高程在-5m~-10m 間除剖面 X-41 有部分淤積情形外，其餘剖面均以侵蝕為主。顯示此段近岸海域侵淤特性表現與大岩石以北趨勢相同，近岸海域高程-10m 以淺較上季大多有侵蝕現象。舊社以南至 N26 附近（剖面 X-42 至 X-47）之剖面高程表現，與 N21 以南至舊社附近差異不大，高程在 0m~-2m 間剖面 X-45 與 X-47 有侵蝕情形，其餘剖面均為淤積之情形；-2m~-5m 間剖面 X-44 與 X-47 有侵蝕情形，其餘剖面均為淤積之情形；高程在-5m~-10m 間均以侵蝕為主。

本季 0m~-5m 近岸海域總體積變化較 100 年 11 月約減少 121,152 立方公尺，近岸海域整體高程平均約降低 16cm，依分區而言，0m~-3m 間高程約增加 8cm，-3m~-5m 間高程約降低 47cm。整體而言，本季近岸海域砂量較 100 年 11 月呈現侵蝕現象，應屬受季節氣候影響所致之自然變遷。

整體而言，從 100 年 11 月至 101 年 6 月（本季）所調查的近岸海域地形整體趨勢，於澳底漁港至石碇溪以北之海岸地形無明顯變化，而於鹽寮海濱公園至福隆海水浴場以北，近岸海域砂量總體積變化為侵蝕狀態，地形高程均較 100 年 11 月降低。

2.沙灘定位樁觀測調查結果

本季幾處定位樁觀測結果如表 2.16-1 及照片 2.16-1，自 97 年第 1 季起福隆海水浴場之內河大橋第 1 橋墩已有淤沙，橋頭外灘已趨於穩定，但本季（101 年 6 月）內河大橋之第 1、2 橋墩維修中無法測量；福隆南岸河道救生樁定位線離底床 100cm，與上季相較並無差異。

在舊社 N21 附近連接沙灘便道之南、北 2 側，各設置 1 處救生樁之定位樁，北側為 1 號樁，南側為 2 號樁，舊社 1 號樁線離底床 174cm，與上季（101 年 3 月）相較高程約增加 9cm；舊社 2 號樁線離底床 51cm，較上季（101 年 3 月）約增加 4cm。舊社附近之灘面坡降表現較上季（101 年 3 月）略為陡峭。

在鹽寮公園南側大岩石靠近岸邊之 1 號定位樁線離底床 80cm，較上季(101 年 3 月)約增加 7cm；大岩石靠外海之 3 號定位樁線離底床 51cm，較上季約增加 42cm；中間之 2 號定位樁線離底床 42cm，較上季約增加 46cm；另大岩石北側救生樁定位線離底床 80cm，與上季（101 年 3 月）相較高程約增加 2cm。大岩石附近之沙灘灘面高程已持續 3 季增加甚多，沙灘面積增加。

另於鹽寮公園附近沙灘選擇 3 枝救生樁，由北而南依序編號為鹽寮 1 至 3 號定位樁，本季鹽寮 1 號樁已見基底，定位線離灘面 176cm，與上季相較高程約降低 12cm；鹽寮 2 號樁已見基底，定位線離灘面 142cm，與上季相較高程約降低 24cm；鹽寮溪南側 3 號樁線離灘面 89cm，高程約增加 16cm；另在鹽寮溪以南 4 號樁線離底床 108cm，與上季無異；在鹽寮與大岩石間之 5 號定位樁線離底床 92cm，與上季亦差異不大。鹽寮定位樁若已見水泥基底，於測量時會將基準延伸至基底外之沙灘面。本季鹽寮溪以南沙灘高程略有增加。

3.雙溪河口淤砂調查與結果

為進一步掌握雙溪河道之水深變化，除進行原河口剖面水深測量外，於 97 年 6 月夏季開始增加雙溪河龍門吊橋至出海口段之河道水深測量，本季配合海域監測，同步進行雙溪河道水深測量。

本季（101 年 6 月）與上季（101 年 3 月）相較河口沙嘴向東南推移約 50m，沙灘往東南延伸，河口退潮後之河道寬度較上季縮減，本季河道出海口於最低潮時之寬度約為 20m，沙灘面積較上季增加，平均高程降低。河口附近灘線變化詳圖 2.16-5 所示。

由侵淤量色階圖 2.16-6 比較，與 101 年 3 月相較，福隆海水浴場沙灘南、北側均呈現侵蝕之情形，可能受到測量當時因沙雕季所推移堆置之砂與取砂位置有關。與 100 年 11 月相較，在沙灘南、北側與河道內淤積情形明顯，而沙灘中間則略有侵蝕情形；與 100 年 4 月（同季）相較，沙灘大多呈現淤積之情形，而河道則呈現侵蝕之情形。由歷次測量結果顯示，受季風浪之作用，漂砂有淤積在近岸處與河道內之趨勢，而雙溪之逕流量會逐漸將於河道內之淤砂逐漸帶至出海口外海。福隆海水浴場東側沙洲自 97 年 9 月颱風後變化已趨於穩定，福隆沙洲範圍目前呈現動態平衡狀態，在季節性季風作用下，河口沙嘴變化呈現東北-西南向之擺動，位置則成西北-東南向之推移，變化不大。內河大橋之橋頭漲潮時均在水線以上，目前沙洲已呈現較穩定之情形。雙溪河道對於福隆附近海域漂砂之調節能量，與沙嘴推移方向及高程變化，將持續進行觀察比較。

本季雙溪河道水深測量結果與 100 年 11 月相較，由下游至上游方向以剖面變化進行分析：

(1)雙溪出海口附近剖面 X-50：本季因沙嘴有往東南推移趨勢，河道出海口向東延伸，原出海口附近北岸河道有淤積情形，河道淤積最大高差達約 150cm，南岸河道略有刷深，最大高差約 50cm，河道寬度略減。

(2)內河大橋以東剖面 X-49：河道中間與北岸有淤積情形，高差約為 30cm，河道深度略淺，寬度差異不大。

(3)內河大橋以西剖面 X-48：南、北岸河道均呈現淤積情形，高差約 30~60cm，河道深度與寬度差異不大。

(4)內河大橋上游剖面 X-51：河道南、北岸均有淤積情形，河岸邊最大淤積量約 40cm，河道深度略淺，寬度則無差異。

⑸內河大橋上游剖面 X-52：與 X-51 之表現相同，河道南、北岸均有淤積情形，河岸邊最大淤積量約 30cm，河道深度略淺，寬度則無差異。

雙溪河道水深剖面變化顯現內河大橋以西下游河道段，變化趨勢較上游段明顯，下游及出海口附近河道段隨沙嘴與沙洲遷移位置之變化而有明顯改變，本季沙洲往東南方延伸推移，但內河大橋以東河道寬度差異不大，河道北側大多呈現淤積情形，更因出海口位置東移，在較東側剖面 X-50 及 X-49 河道深度淤積程度大於剖面 X-48。

表 2.16-1 本季（101 年第 2 季）各定位樁沙灘高度紀錄

單位：公分

定位樁位置	記錄高度(1)			定位樁位置	記錄高度(1)		
	上季 (101/03)	本季 (101/06)	高度變化 (2)		上季 (101/03)	本季 (101/06)	高度變化 (2)
1. 福隆內河大橋第 1 橋墩	25	維修	--	8. 大岩石 2 號樁	88	42	46
2. 福隆內河大橋第 2 橋墩	145	維修	--	9. 大岩石 3 號樁	93	51	42
3. 福隆南側河道救生樁	100	100	0	10. 鹽寮 1 號樁	164	176	-12
4. 舊社 1 號樁（北側）	183	174	9	11. 鹽寮 2 號樁	118	142	-24
5. 舊社 2 號樁（南側）	55	51	4	12. 鹽寮 3 號樁	105	89	16
6. 大岩石救生樁	82	80	2	13. 鹽寮 4 號樁	108	108	0
7. 大岩石 1 號樁	87	80	7	14. 鹽寮 5 號樁	93	92	1

註：1.記錄高度表示灘線至定位樁最低標示刻度之距離。

2.高度變化表示該季與上季間之灘線高度變化，"＋"表示淤積，"－"表示刷深。

3.99 年 3 月新增福隆內河大橋第 2 橋墩、福隆南測河道救生樁、舊社 1 號樁(北側)、舊社 1 號樁(南側)、大岩石救生樁、鹽寮 4 號樁、鹽寮 5 號樁等 7 處定位樁。

4.大岩石 1 號樁見底 2m。

5.舊社 1 號樁(北側)於 101 年 3 月有人為將砂往植被推移堆積之情形。

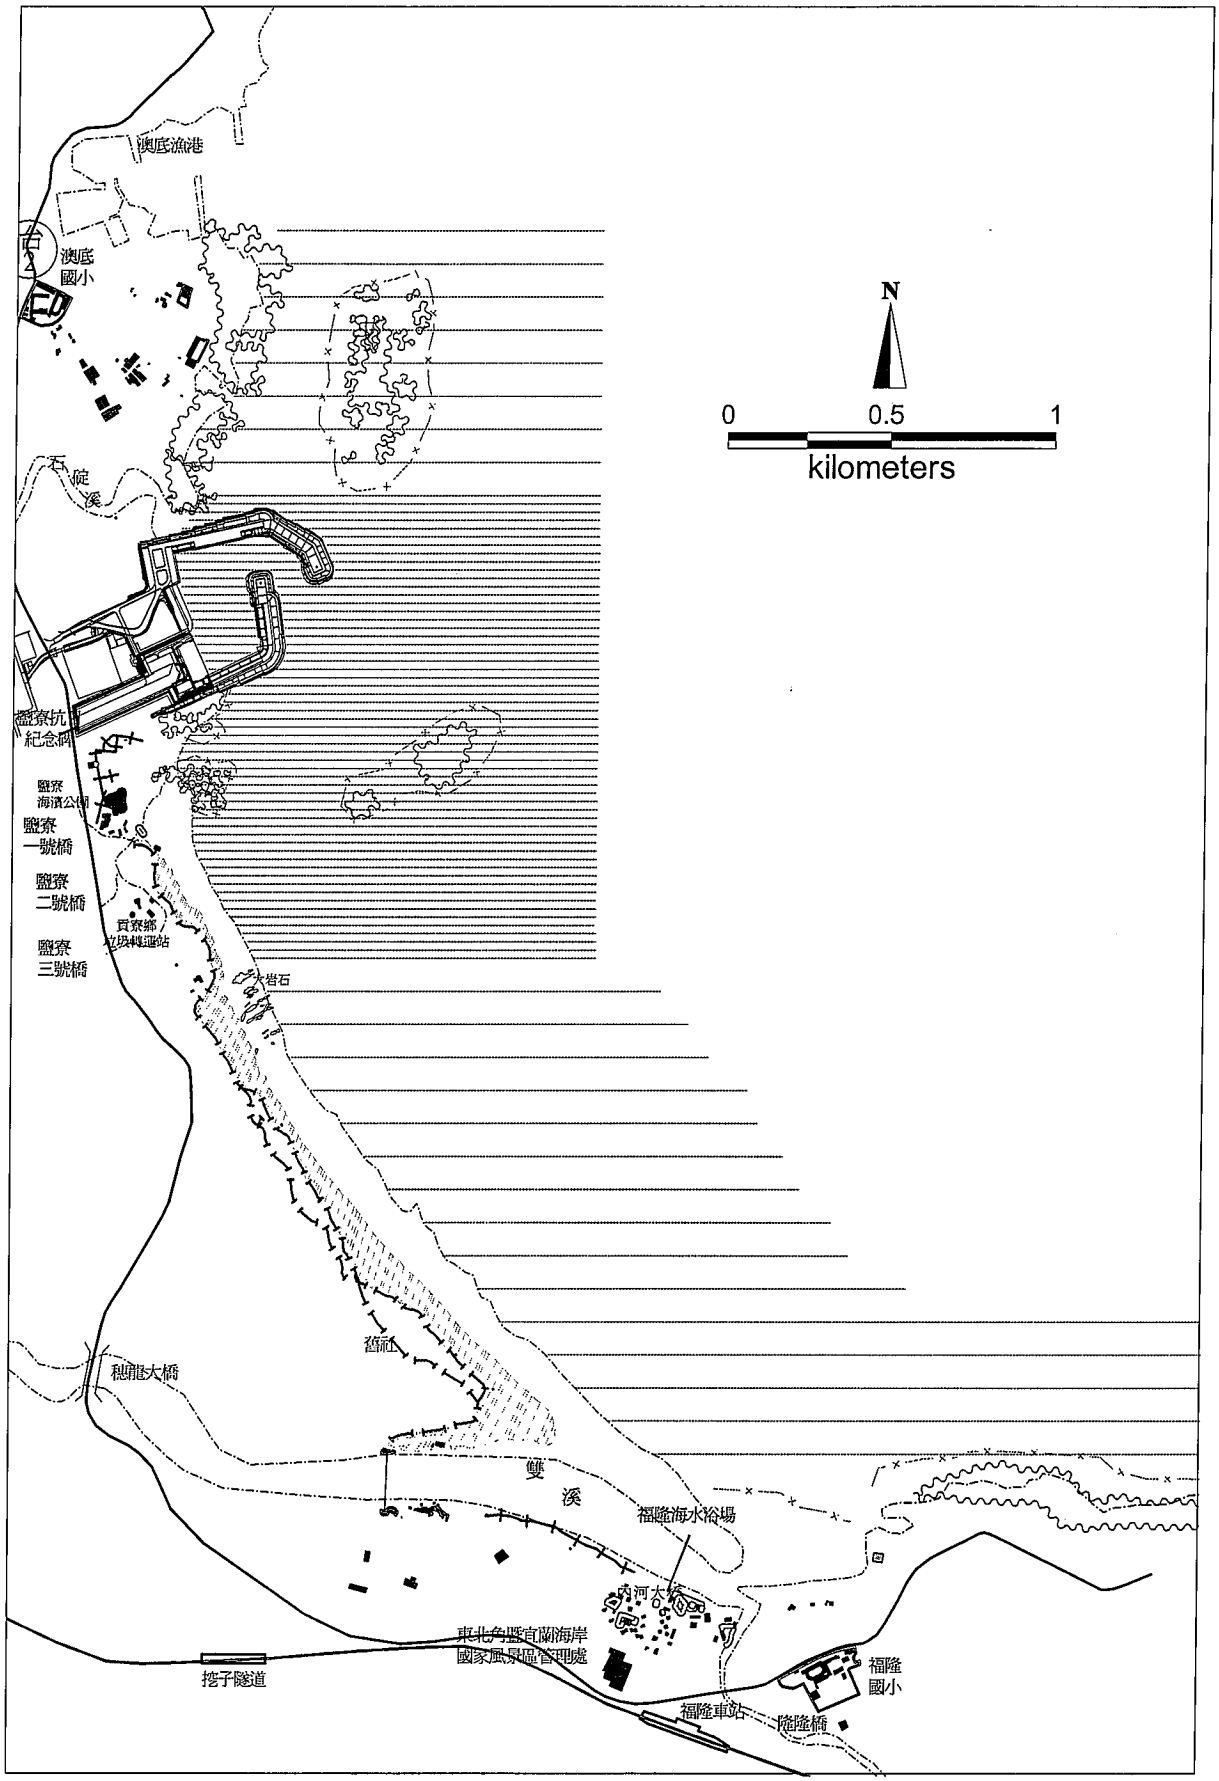


圖 2.16-1 核四附近海岸地形測量規劃測線圖

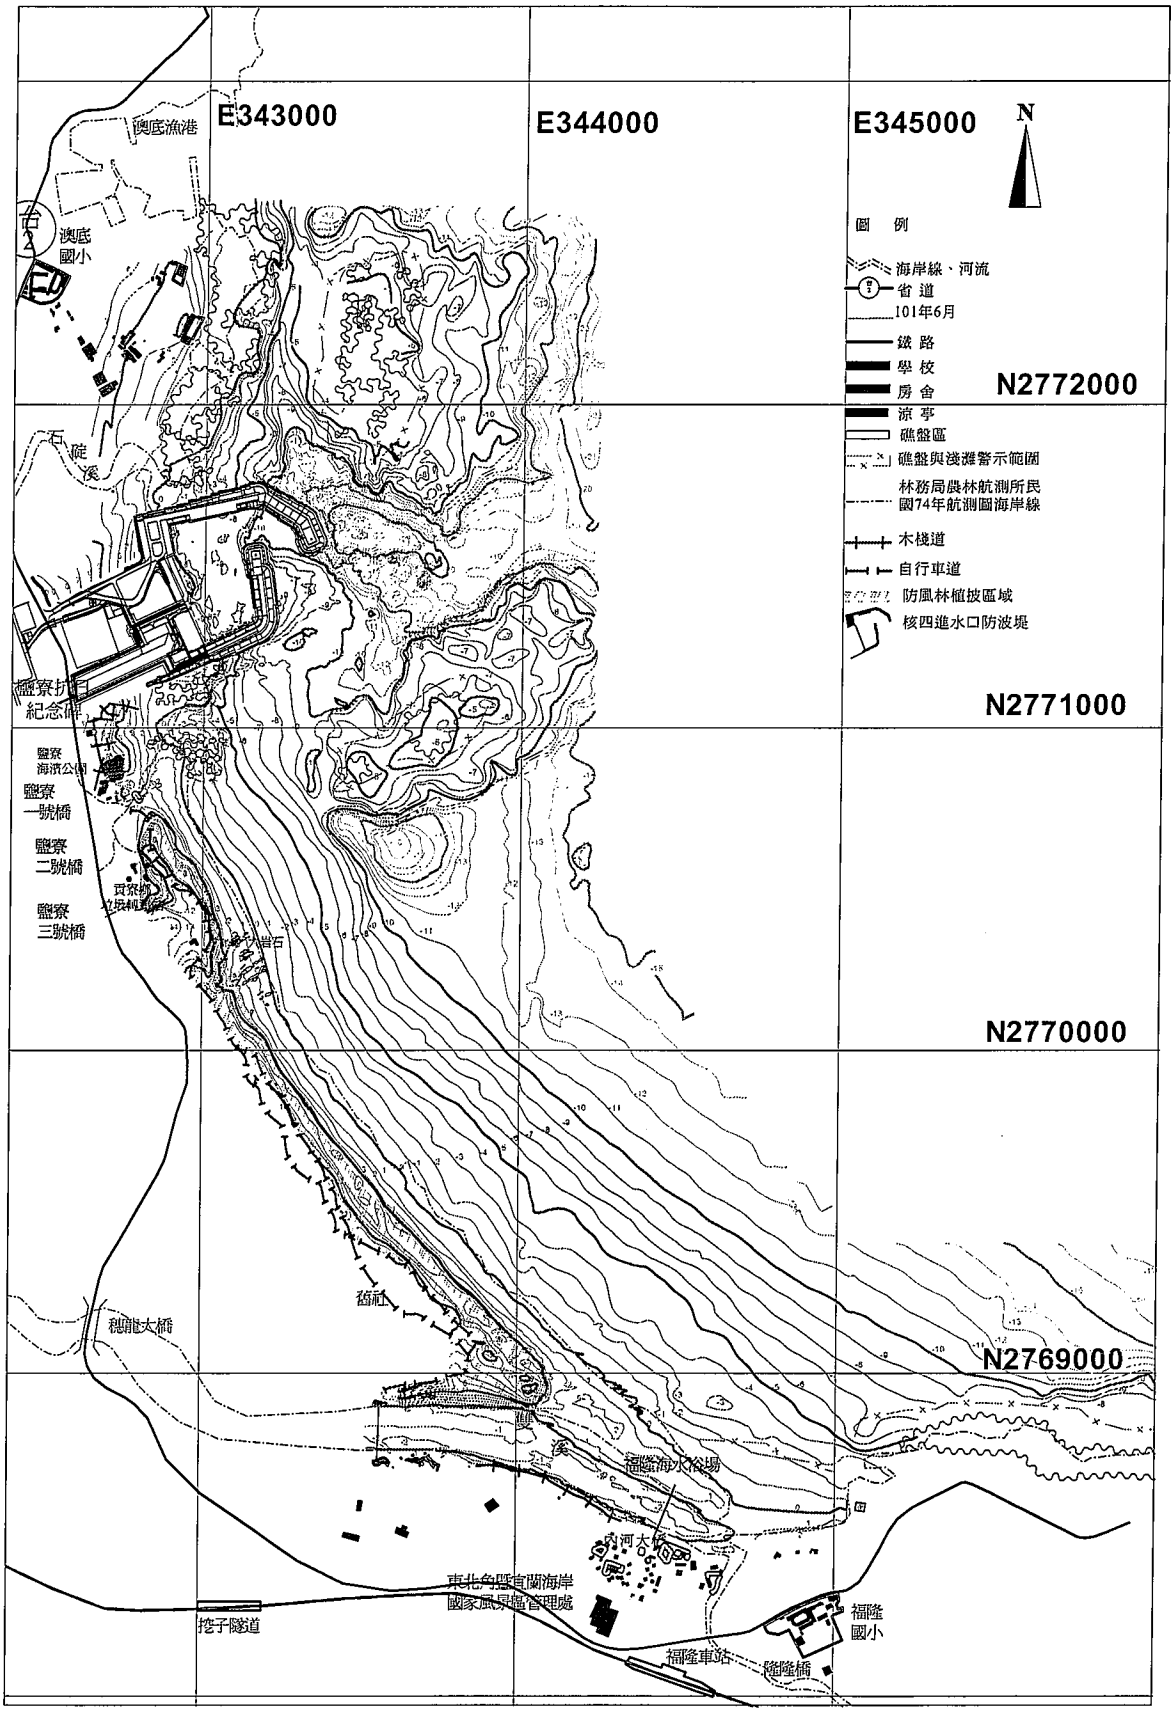


圖 2.16-2 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月海岸地形監測結果

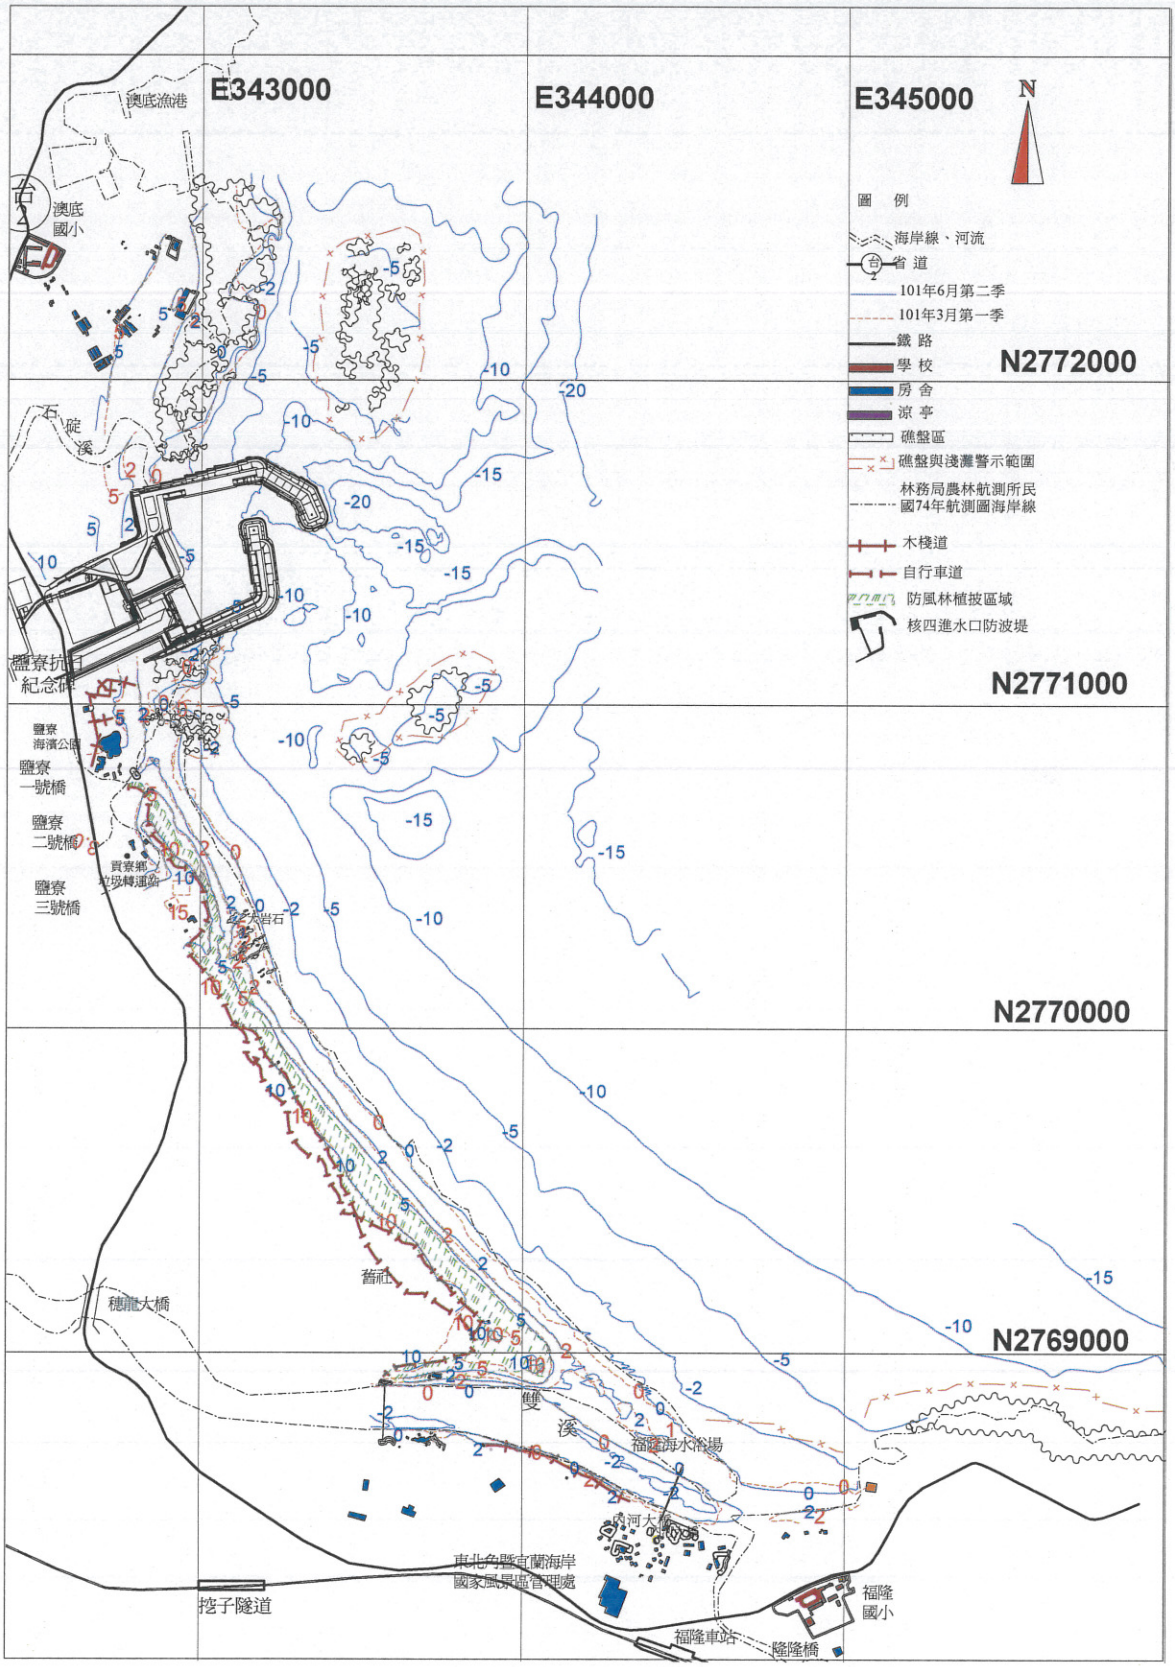


圖 2.16-3 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 101 年 3 月監測結果比較

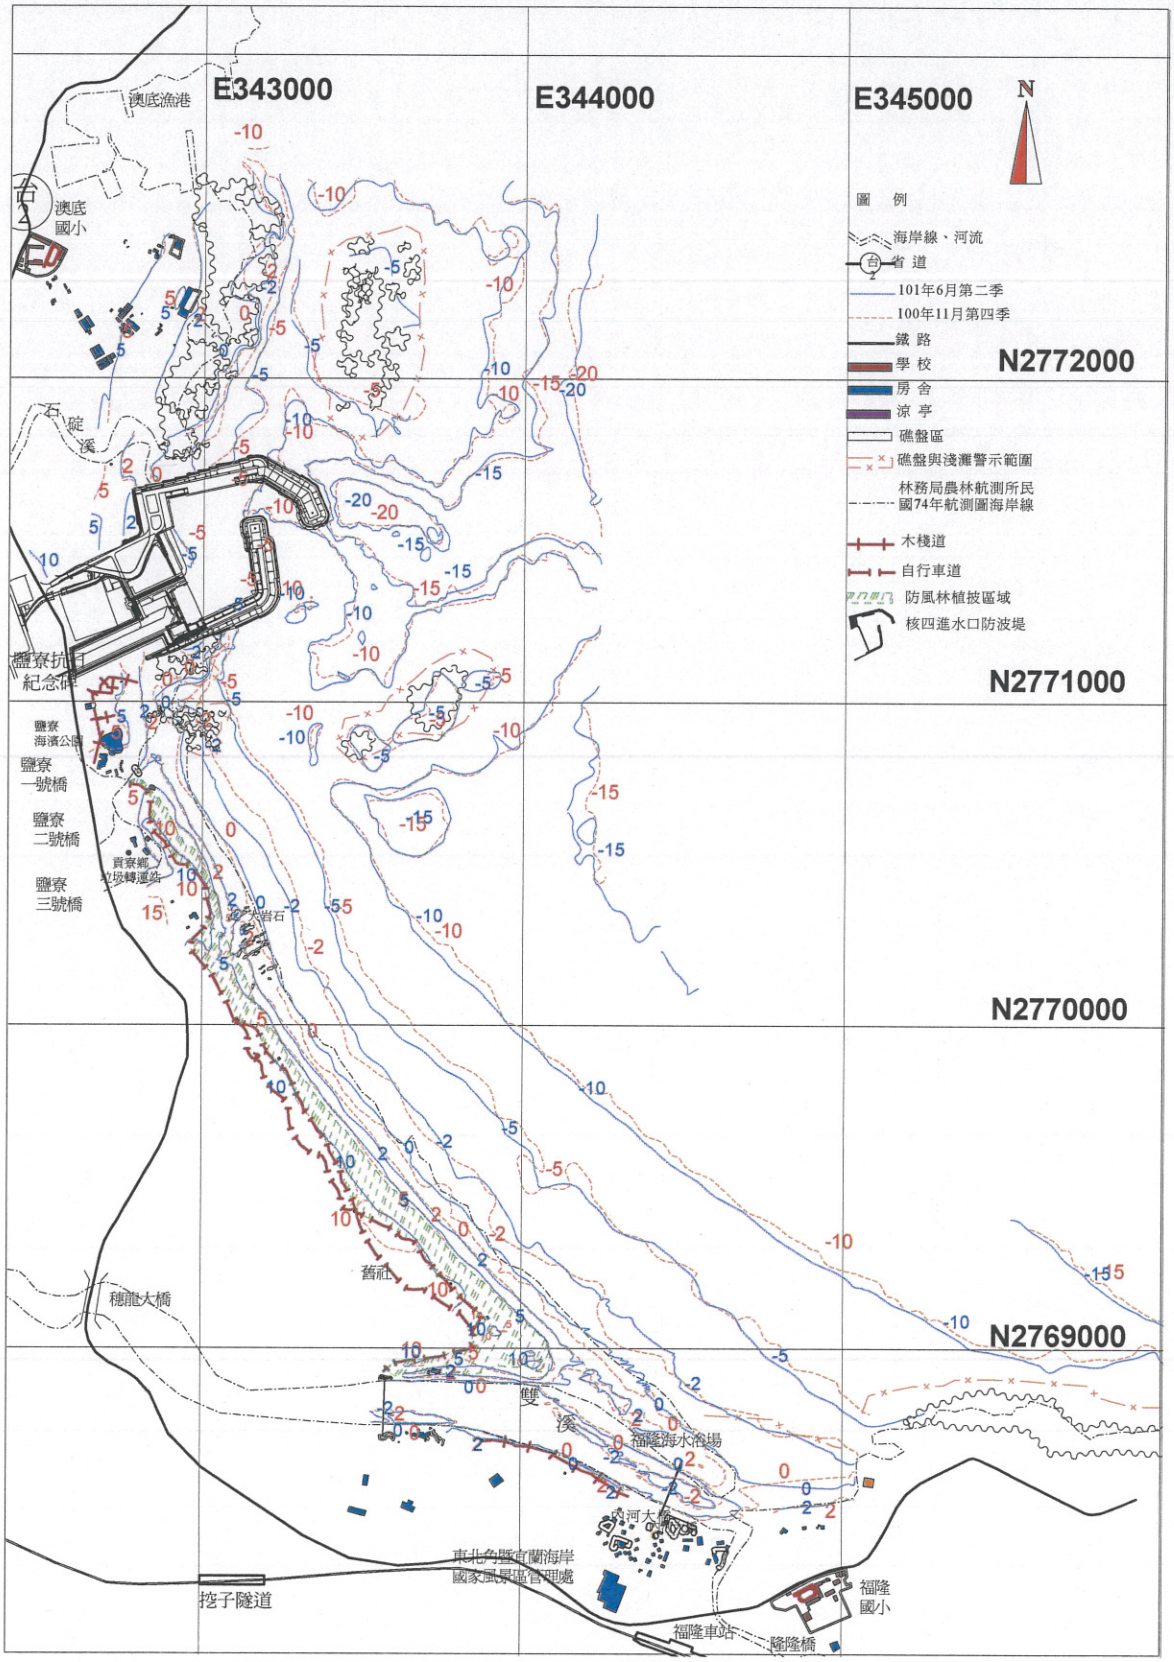


圖 2.16-4 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 100 年 11 月監測結果比較



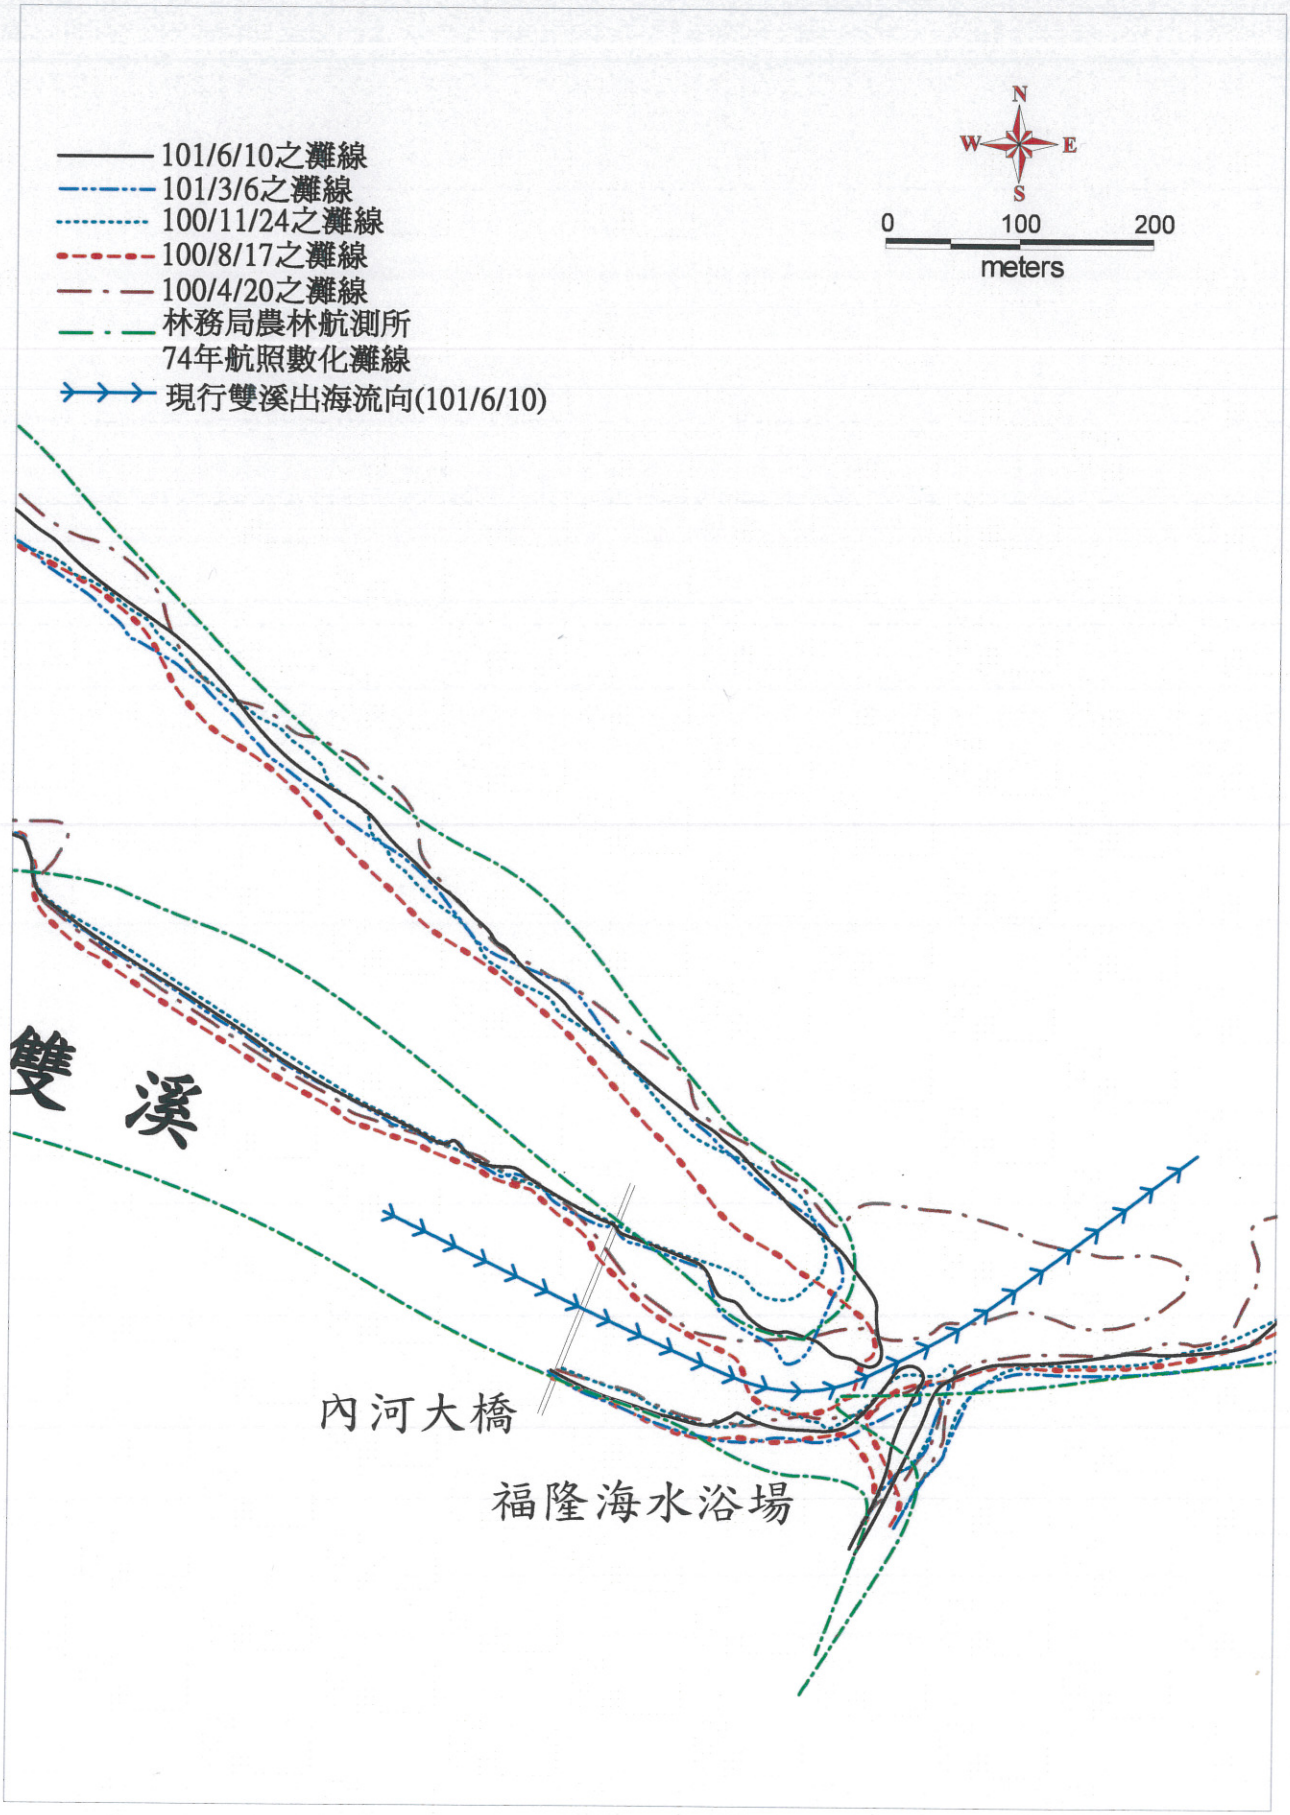



圖2.16-5 福隆海水浴場附近灘線變化及出海流向比較示意圖

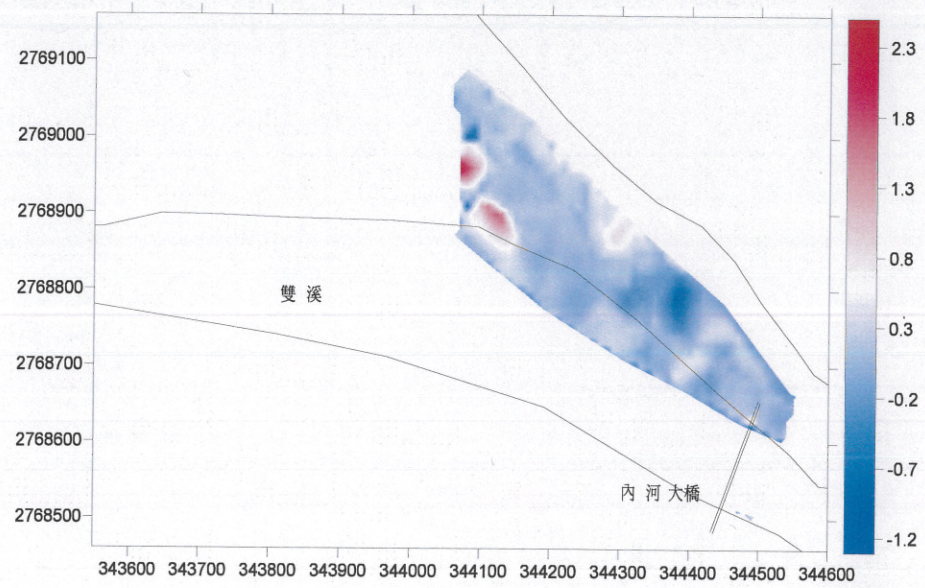

(A)101年6月與101年3月侵淤比較圖

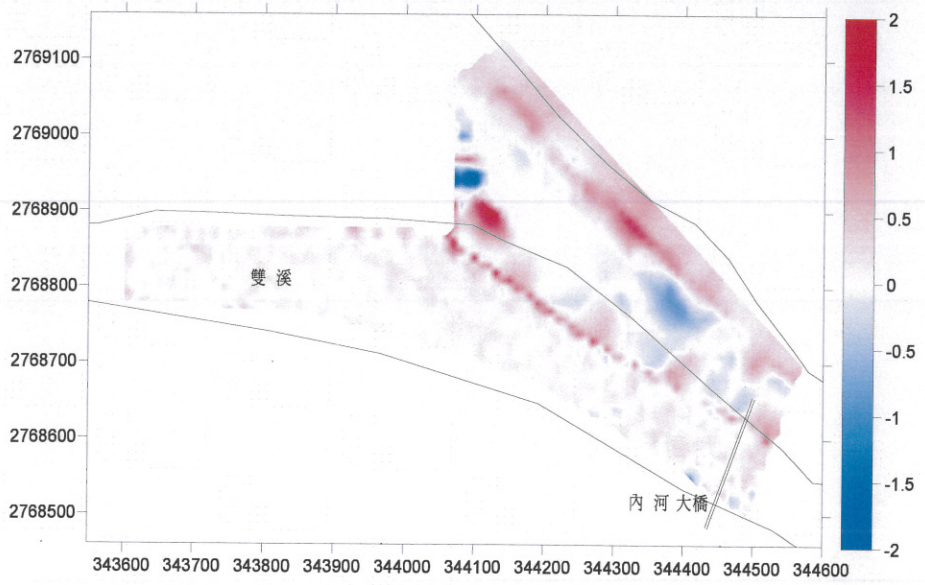


(B)101年6月與100年11月侵淤比較圖

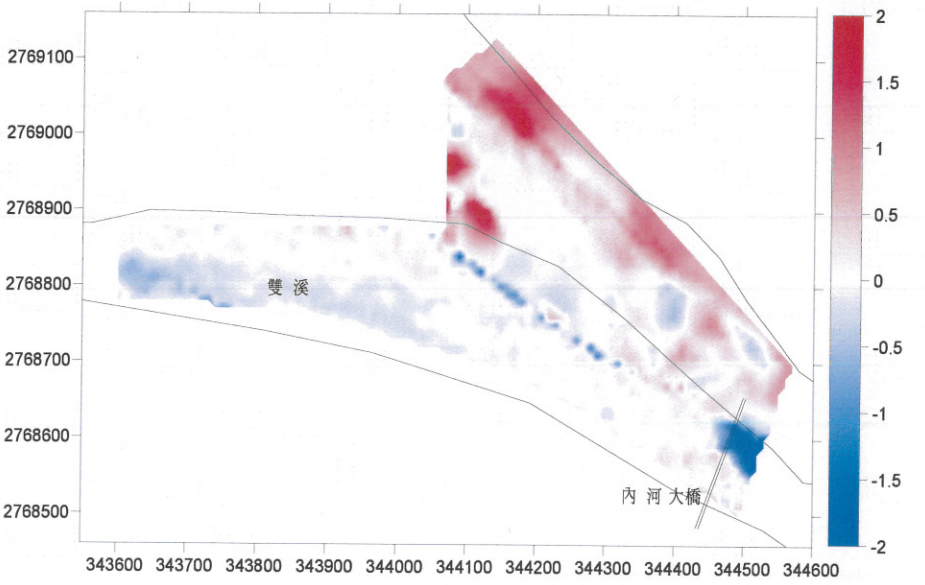


(C)101年6月與100年4月侵淤比較圖

圖2.16-6 福隆海水浴場與雙溪河道侵淤比較圖


內河大橋第 1 橋墩 101 年第 1 季（101.3.7）

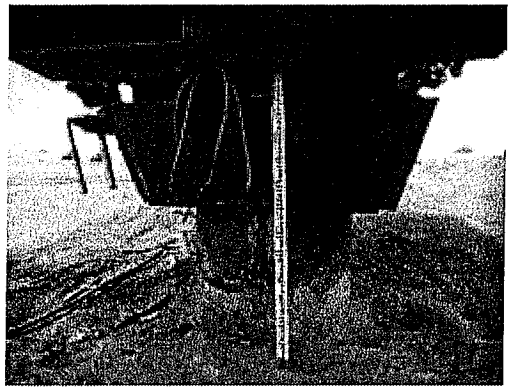


內河大橋第 1 橋墩 101 年第 2 季（101.6.11）

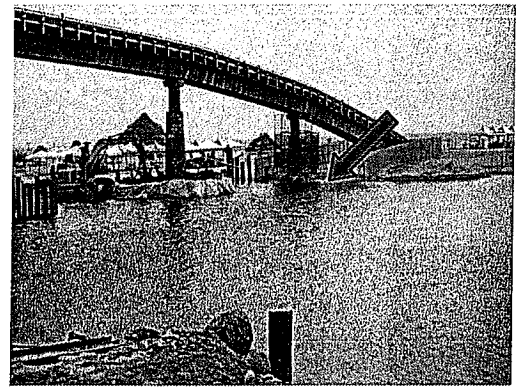


內河大橋第 2 橋墩 101 年第 1 季（101.3.7）

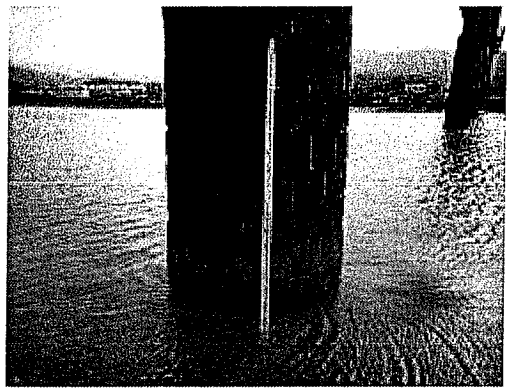


內河大橋第 2 橋墩 101 年第 2 季（101.6.11）

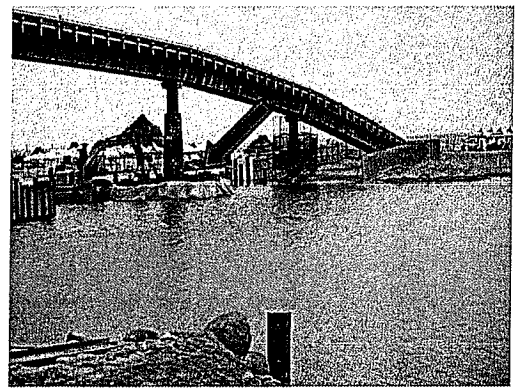


福隆南側河道救生樁 101 年第 1 季（101.3.7）

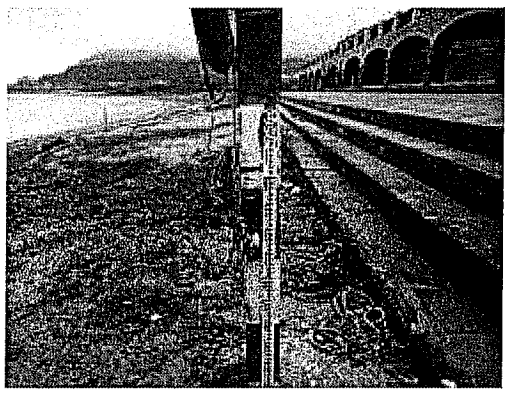

福隆南側河道救生樁 101 年第 2 季（101.6.11）

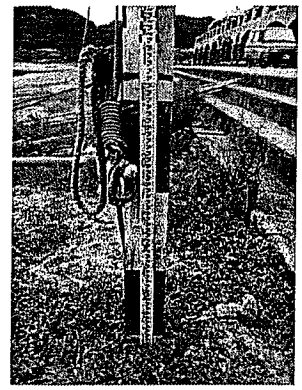

大岩石 1 號樁，101 年第 1 季（101.3.7）

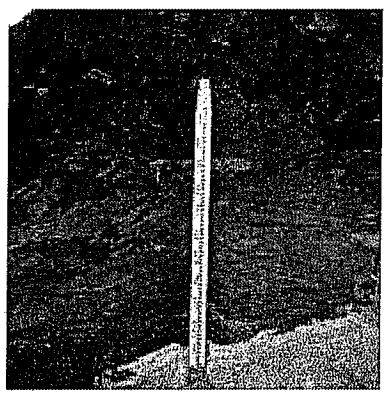


大岩石 1 號樁，101 年第 2 季（101.6.11）




照片 2.16-1　定位樁觀測情形


■ 大岩石 2 號樁，101 年第 1 季（101.3.7）

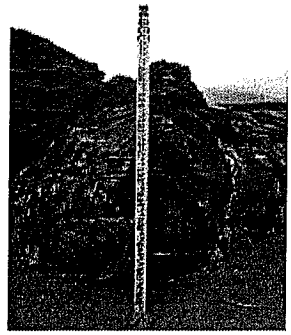


■ 大岩石 2 號樁，101 年第 2 季（101.6.11）

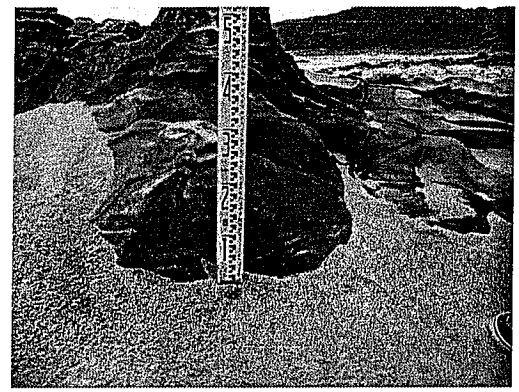


■ 大岩石 3 號樁，靠外海 101 年第 1 季（101.3.7）

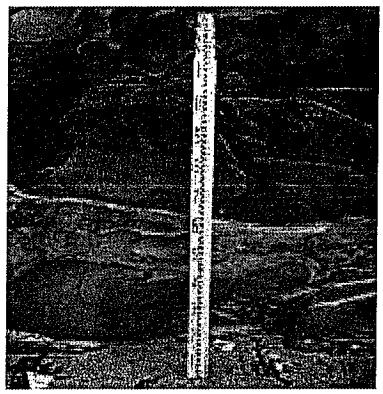


■ 大岩石 3 號樁，靠外海 101 年第 2 季（101.6.11）

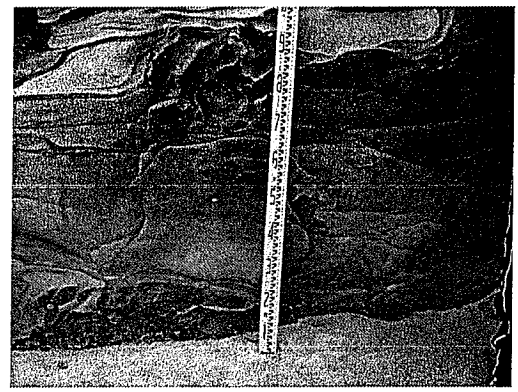


■大岩石救生樁，101 年第 1 季（101.3.7）

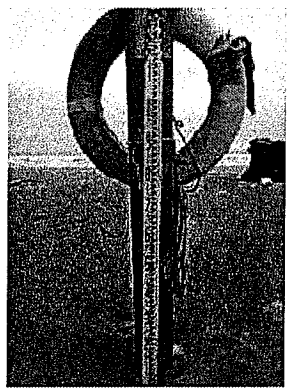


■大岩石救生樁，101 年第 2 季（101.6.11）

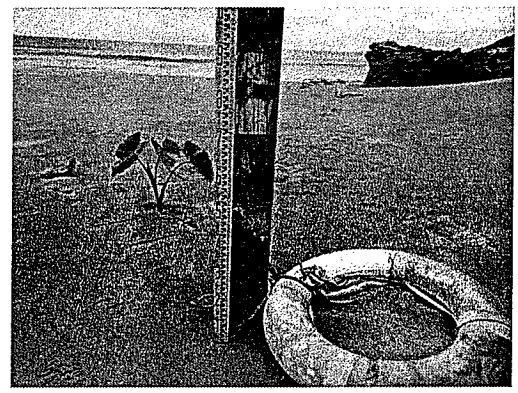

■舊社 1 號樁（北側），101 年第 1 季（101.3.7）

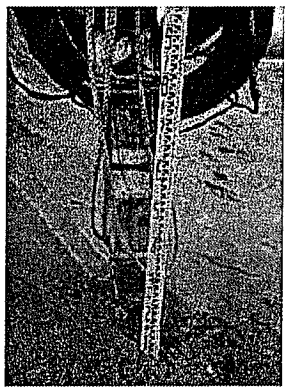


■舊社 1 號樁（北側），101 年第 2 季（101.6.11）

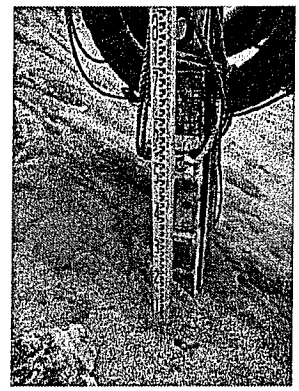


照片 2.16-1　定位樁觀測情形（續 1）


舊社 2 號樁（南側），101 年第 1 季（101.3.7）

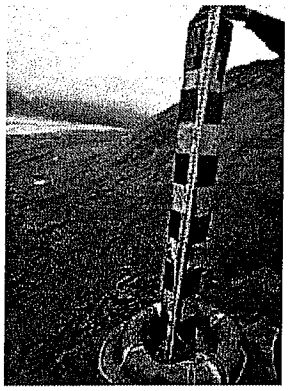

舊社 2 號樁（南側），101 年第 2 季（101.6.11）

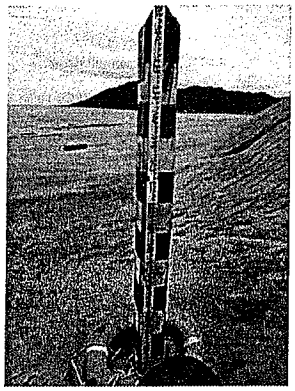


鹽寮 1 號樁，101 年第 1 季（101.3.7）

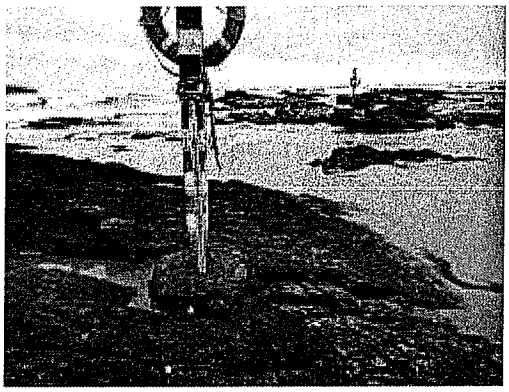


鹽寮 1 號樁，101 年第 2 季（101.6.11）




鹽寮 2 號樁，101 年第 1 季（101.3.7）

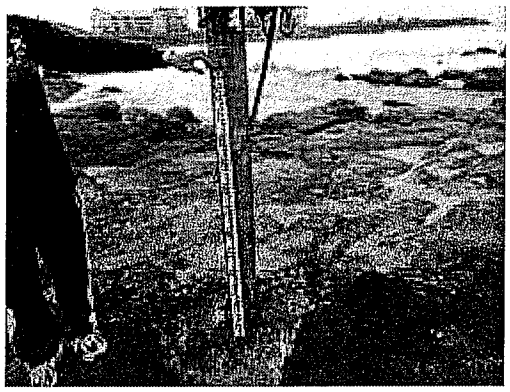


鹽寮 2 號樁，101 年第 2 季（101.6.11）

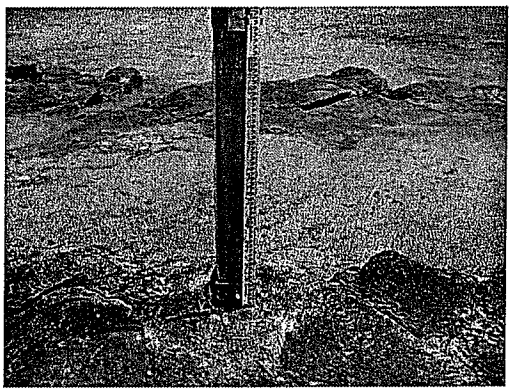

鹽寮 3 號樁，101 年第 1 季（101.3.7）

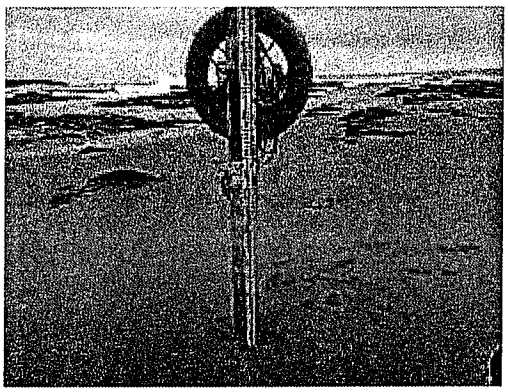


鹽寮 3 號樁，101 年第 2 季（101.6.11）

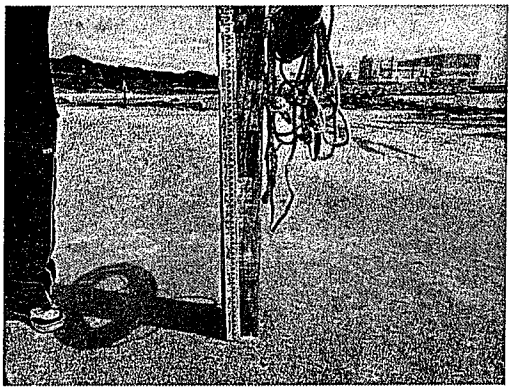


照片 2.16-1　定位樁觀測情形（續 2）


鹽寮 4 號樁，101 年第 1 季（101.3.7）

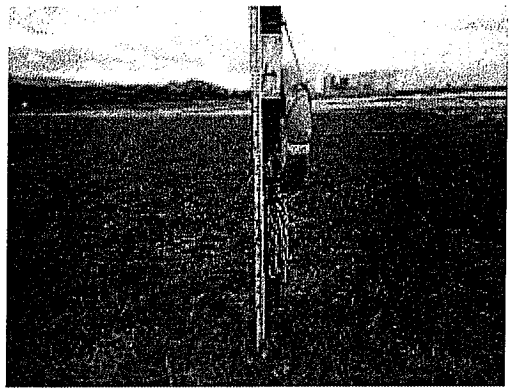


鹽寮 4 號樁，101 年第 2 季（101.6.11）

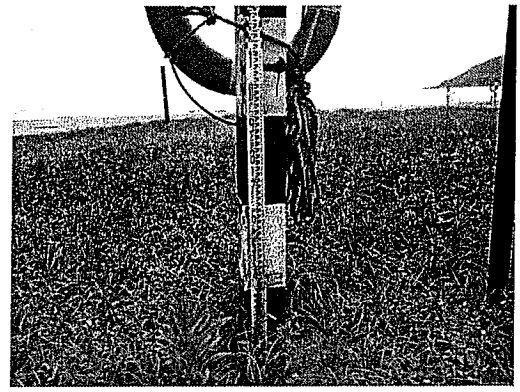

鹽寮 5 號樁，101 年第 1 季（101.3.7）

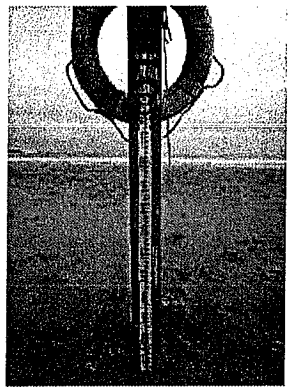

鹽寮 5 號樁，101 年第 2 季（101.6.11）

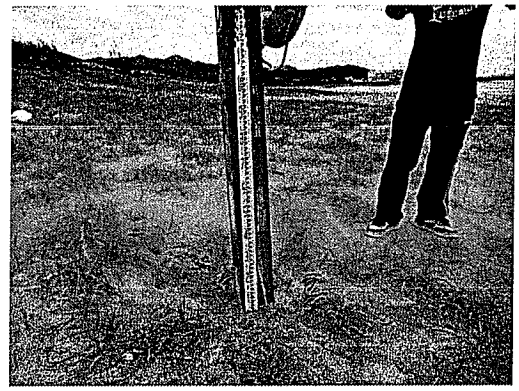

照片 2.16-1　定位樁觀測情形（續 3）

3 檢討與建議

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

第三章　檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

監測結果綜合檢討，除針對本季監測結果說明外，亦與上季（101 年 1~3 月）、歷年同季（4~6 月）及歷年所有調查結果加以分析，各項結果分述如后：

1.氣象觀測

⑴風向與風速

在盛行風向方面，本季（4~6月）以北北東風、南南東風、南風及西南風為主，其5月份之盛行風向與去年及歷年同期略有差異外，4、6月之盛行風向與歷年同期及100年同期差異不大。

在風速方面，本季低塔風速介於1.6~3.1m/sec之間，高塔風速介於2.4~4.0m/sec之間，與歷年同期相較變化不大（詳表2.1-1）。

⑵氣溫、露點溫度、相對濕度及雨量

本季（4~6月）觀測之平均氣溫（詳表2.1-2）介於22.1~27.0℃之間，本季之平均氣溫與100年同期（20.8~28.1℃）及歷年同期（21.0~26.5℃）測值相近；本季月平均露點溫度（詳表2.1-3）介於19.2~24.2℃之間，其測值與100年同期（16.8~23.9℃）及歷年同期（18.3~23.6℃）測值相近。本季之平均相對濕度介於83.9~85.2%之間，其測值與100年同期（81.8~88.3%）及歷年同期（84.3~85.2%）測值相近（詳表2.1-4）；本季各月雨量累計分別為204.5mm、499.0mm及297.5mm。

⑶大氣穩定度（以垂直溫差推算）

綜合本季低塔和高塔垂直溫差之觀測結果，4~6月份之氣象塔均以D級（中性）及E級（微穩定）之分佈機率最高，與100年同期及歷年同期之分佈狀況相近。

2.空氣品質監測

為瞭解貢寮地區歷年空氣品質變化狀況，並建立長期空氣品質資料，茲整理本監測工作歷年之監測結果，其資料日期為82年8月至101年6月，分別列如表3.1-1~表3.1-10及圖3.1-1~圖3.1-2所示，並分析如後。

(1)總懸浮微粒（TSP）

各測站歷年之總懸浮微粒監測結果詳表3.1-1，本季月平均值介於19~63 μg/m^3；本季各測站24小時（最大值）測值介於21~127 μg/m^{3}之間，均符合空氣品質標準。歷年各測站24小時測值介於10~368 μg/m^{3}之間，共計有10次超出空氣品質總懸浮微粒24小時值標準，主要因測站附近房舍裝修、道路施工及台2省道道路揚塵影響，其發生時間及原因說明如下：

①福隆海水浴場測站：84 年 6 月 26 日及 85 年 9 月 22 日，因附近裝修和道路施工造成揚塵達 368μg/m^3 及 304μg/m^3。

②貢寮焚化廠入口旁民宅測站：84 年 3 月份因屋主整理廢五金及 88 年 5 月份受台 2 省道道路揚塵影響分別達 286μg/m^3 及 254μg/m^3。

③龍門測站：98 年 4 月 25 日受沙塵暴影響達 271μg/m^3，依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為 98 年 4 月 25 日至 98 年 4 月 27 日。

④澳底測站：98 年 4 月 25 日受沙塵暴影響達 291μg/m^3，依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為 98 年 4 月 25 日至 98 年 4 月 27 日。

⑤石碇宮測站：98 年 4 月 25 日 16:00 至 26 日 16:00 受沙塵暴影響達 262μg/m^3，依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為

98 年 4 月 25 日至 98 年 4 月 27 日。

⑥龍門測站：99 年 3 月 21 日受沙塵暴影響達 754μg/m^3，依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為 99 年 3 月 21 日至 99 年 3 月 23 日。

⑦澳底測站：99 年 3 月 21 日受沙塵暴影響達 748μg/m^3，依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為 99 年 3 月 21 日至 99 年 3 月 23 日。

⑧龍門測站：99 年 4 月 29 日受沙塵暴影響達 312μg/m^3，依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為 99 年 4 月 28 日至 99 年 4 月 29 日。

其餘均未超過空氣品質標準總懸浮微粒24小時值250μg/m^{3}之規定，顯示本區域之空氣品質總懸浮微粒尚稱良好。各測站之間，以貢寮焚化廠入口旁之民宅測站之平均測值最高，其次為石碇宮測站，而以川島養殖池測站平均測值最低，各測站歷年測值除受測站附近之道路施工及台2省道之道路揚塵影響測值有偏高外，其餘季節性變化並不明顯。有關各月總懸浮微粒平均值變化趨勢如圖3.1-1所示。

⑵懸浮微粒（PM_{10}）

自88年5月起台灣電力公司於龍門及澳底各設置空氣品質連續監測站始進行懸浮微粒（PM_{10}）監測，其監測結果詳表3.1-2及圖3.1-2，本季懸浮微粒月平均測值介於31.4~46.1μg/m^3，介於歷年（8.8~95.2 μg/m^3）範圍內。本季各測站日平均（最大值）介於47.1~89.6μg/m^{3}之間。

歷年各測站24小時測值介於9.2~279.2μg/m^{3}之間，歷次共計有36天次懸浮微粒日平均值最大值超出空氣品質標準125μg/m^{3}之法規值，其發生時間及原因分別如下：

①龍門站：

A. 89 年 12 月最大日平均值為 132.1μg/m^3，監測當時適值核四暫停施工期間，故龍門站超出標準情形非屬核四工程影響。

B. 93 年 2 月最大日平均值為 128.3μg/m^3（93 年 2 月 15 日），依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為 93 年 2 月 12~19 日，影響最嚴重之時間為 93 年 2 月 15~16 日，而本計畫之連續測站龍門站 93 年 2 月 15、16 日之 PM_{10} 分別為 128μg/m^3 及 73μg/m^3，93 年 2 月 17 日之後便降至 35μg/m^3 以下，TSP 亦呈相同趨勢，於 93 年 2 月 15、16 日分別為 171.3μg/m^3 及 103.6μg/m^3，93 年 2 月 17 日之後便降至 55μg/m^3 以下；而此現象亦出現於其他人工測站，如川島養殖池及貢寮焚化廠入口旁之民宅 2 測站於 93 年 2 月 15 日之 TSP 測值分別為 85μg/m^3 及 198μg/m^3，之後即降至 23~37μg/m^3 及 75~109μg/m^3，差值在數十 μg/m^3 以上。再由環保署網站查詢可知萬里及汐止 2 測站於 93 年 2 月 15 日之 PM_{10} 分別為 134.5μg/m^3 及 127.6μg/m^3 亦可佐證，此現象明顯受到大陸沙塵暴影響。

C.95 年 3 月 19、29 日最大日平均值分別為 223.6μg/m^3 及 134.8μg/m^3，由環保署網站查詢（依據環保署所公佈之資訊，大陸沙塵暴影響時間為 95 年 3 月 19~20 日），萬里及汐止 2 測站於 95 年 3 月份之 PM_{10} 最大值分別為 268μg/m^3 及 365μg/m^3，其可反應 3 月 19 日測值偏高，主要受大陸沙塵暴影響，而 3 月 29 日之測值偏高之原因，研判受環境背景影響。

D.95 年 4 月 3 日最大日平均值為 191.2μg/m^3，由環保署網站查詢，萬里及汐止 2 測站於 4 月 3 日 PM_{10} 測值分別為 105μg/m^3 及 142 μg/m^3，均有偏高之情形，由該測站所在位置（位於核四廠區東南側）及當日盛行風向（南南東風）研判，非核四施工工程影響。

E.96 年 1 月 28 日最大日平均值為 125.6μg/m^3，由環保署網站查詢，萬里、汐止及基隆等 3 測站於 1 月 28 日 之 PM_{10} 小時最大值分別為 234μg/ m^3、200μg/m^3 及 191μg/ m^3，均有偏高之情形，主要受大陸沙塵暴影響。

F.96 年 12 月 30 日最大日平均值為 145.5μg/m^3，由環保署網站查詢，其萬里、汐止等 2 測站於 12 月 30 日之 PM_{10} 小時最大值分別為 139μg/ m^3、219μg/ m^3，均有偏高之情形，主要受大陸沙塵暴影響。

G.97 年 3 月 3 日最大日平均值為 137.1μg/m^3，由環保署網站查詢，萬里、汐止等 2 測站於 3 月 3 日 PM_{10} 小時最大值分別為 137μg/m^3、144μg/m^3，均有偏高之情形，主要受大陸沙塵暴影響。

H.98 年 4 月 21、25 日最大日平均值分別為 133.7μg/m^3 及 262.2μg/m^3，與環保署汐止、基隆及萬里測站 4 月 21 日之懸浮微粒測值（分別為 110μg/m^3、95μg/m^3 及 116μg/m^3）及 4 月 25 日之懸浮微粒測值（分別為 263μg/m^3、242μg/m^3 及 300μg/m^3）比對顯示，該 2 日測值均有一致升高之趨勢，其中 4 月 25~27 日更為環保署發佈大陸沙塵暴影響時間，顯示當日測值應為整體空氣品質環境不良影響。

I. 98 年 10 月 8 日最大日平均值分別為 126.0μg/m^3，與環保署萬里測站 10 月 8 日之懸浮微粒日平均值 172.5μg/m^3 比對顯示，該日測值均有一致升高之趨勢，顯示當日測值應為整體空氣品質環境不良影響。

J. 98 年 12 月 31 日最大日平均值分別為 139.3μg/m^3，與環保署萬里測站 12 月 31 日之懸浮微粒日平均值 150.3μg/m^3、汐止 12 月 31 日之懸浮微粒日平均值 112.3μg/m^3 比對顯示，該日測值均有一致升高之趨勢，其中台灣地區受中國大陸華北 12 月 24 日沙塵暴影響，於 12 月 26 日起空氣品質不良，顯示當日測值應受其整體環境背景影響。

K. 99 年 1 月 29 日最大日平均值分別為 134.4g/m^3，與澳底連續監測站 1 月 29 日平均值為 119.9μg/m^3，亦有一致偏高趨勢，且比對環保署萬里測站 1 月 29 日懸浮微粒測值顯示，萬里測站當日之日平均值雖符合空氣品質標準，但為 99 年 1 月各日中最高值，且當日各時段多有高於 100μg/m^3 情形（小時最大值為 138μg/m^3），顯示

1 月 29 日測值應受其整體環境背景影響。

L. 99 年 4 月 29 日最大日平均值分別為 203.0μg/m^3，主要係受中國大陸華北 4 月 28 日之沙塵暴影響（環保署公告沙塵暴影響時間為 4 月 28~29 日），且比對環保署萬里測站 4 月 29 日懸浮微粒測值顯示，萬里測站當日之日平均值為 163.3μg/m^3，顯示整體環境背景不佳係受大陸沙塵暴影響。

M. 99 年 12 月 3 日及 99 年 12 月 4 日最大日平均值分別為 147.4μg/m^3 及 138.6μg/m^3，主要係受中國大陸華北 12 月 3 日之沙塵暴影響(環保署公告沙塵暴影響時間為 12 月 2~4 日），且比對環保署萬里測站 12 月 3、4 日懸浮微粒日平均值分別為 148.6μg/m^3、110.6μg/m^3 以及汐止測站 12 月 3、4 日懸浮微粒日平均值分別為 123.6μg/m^3、113.1μg/m^3，顯示整體環境背景不佳係受大陸沙塵暴影響。

②澳底站：

A.90 年 5 月（2 天次）、91 年 2 月、93 年 4 月之最大日平均值分別為 155.7μg/m^3、125.3μg/m^3 及 129.2μg/m^3，因澳底站係設置於澳底國小內，依監測當時之風向（90 年 5 月為北北西及西南西風，91 年 2 月為東南東風，93 年 4 月為南南東風）研判，應受台 2 省道交通揚塵及海邊風沙所影響。

B.95 年 3 月 19、29 日最大日平均值分別為 220.0μg/m^3 及 138.2μg/m^3，再由環保署網站查詢（依據環保署所公佈之資訊，該次大陸沙塵暴影響時間為 95 月 3 月 19~20 日）可知萬里及汐止 2 測站於 95 年 3 月份之 PM_{10} 最大值分別為 268μg/m^3 及 365μg/m^3 亦可佐證，此現象明顯受到大陸沙塵暴影響。

C.95 年 4 月 3 日最大日平均值為 133.7μg/m^3，由環保署網站查詢，萬里及汐止 2 測站於 4 月 3 日 PM_{10} 測值分別為 105μg/m^3 及 142 μg/m^3，均有偏高之情形，由該測站所在位置（位於核四廠區東南側）及當日盛行風向（南南東風）研判，非核四施工工程影響。

D.96 年 1 月 28 日最大日平均值為 127.8μg/m^3，由環保署網站查詢，

萬里、汐止及基隆等 3 測站於 1 月 28 日 之 PM_{10} 小時最大值分別為 234μg/ m^3、200μg/m^3 及 191μg/ m^3，均有偏高之情形，主要受大陸沙塵暴影響。

E.96 年 12 月 30 日最大日平均值為 149.4μg/m^3，由環保署網站查詢，萬里、汐止等 2 測站於 12 月 30 日 之 PM_{10} 小時最大值分別為 139~219μg/ m^3，均有偏高之情形，主要受大陸沙塵暴影響。

F.97 年 3 月 3 日最大日平均值為 155.3μg/m^3，由環保署網站查詢，萬里、汐止等 2 測站於 3 月 3 日 之 PM_{10} 小時最大值分別為 137 μg/m^3、144μg/m^3，主要受大陸沙塵暴影響；至於 3 月 21 日澳底站測值 126.3μg/m^3 超出標準部分，萬里及汐止資料得知 3 月 20~22 日萬里及汐止測站之懸浮微粒測值亦偏高，為 89~122μg/m^3，顯示為整體環境懸浮微粒空氣品質惡化所致。

G.97 年 10 月 24 日最大日平均值為 135.9μg/m^3，經參考環保署 10 月 24 日汐止及萬里測站懸浮微粒測值資料，發現該日測值均有一致升高之趨勢，顯示當日測值應受其整體環境背景影響。

H.98 年 3 月 21、23 日最大日平均值分別為 134.1μg/m^3 及 125.1 μg/m^3，與龍門連續監測站及環保署汐止及萬里測站 3/21（分別為 120.1 μg/m^3、113μg/m^3 及 115μg/m^3）及 3 月 23 日之懸浮微粒測值（分別為 114.6μg/m^3、90μg/m^3 及 118μg/m^3）比對顯示，該日測值均有一致升高之趨勢，顯示當日測值應受其整體環境背景影響，另因澳底國小進行校舍整建工程，對測值亦有影響。

I.98 年 4 月 21、25 日最大日平均值分別為 151.9μg/m^3 及 279.2μg/m^3，與環保署汐止、基隆及萬里測站 4 月 21 日之懸浮微粒測值（分別為 110μg/m^3、95μg/m^3 及 116μg/m^3）及 4 月 25 日之懸浮微粒測值（分別為 263μg/m^3、242μg/m^3 及 300μg/m^3）比對顯示，該 2 日測值均有一致升高之趨勢，其中 4 月 25 日更為環保署發佈大陸沙塵暴影響時間，顯示當日測值應為整體空氣品質環境不良影響。

J.98 年 12 月 31 日最大日平均值為 137.4μg/m^3，與環保署萬里測站

12 月 31 日之懸浮微粒日平均值 150.3μg/m^3、汐止 12 月 31 日之懸浮微粒日平均值 112.3μg/m^3 比對顯示，該日測值均有一致升高之趨勢，其中台灣地區受中國大陸華北 12 月 24 日沙塵暴影響，於 12 月 26 日起空氣品質不良，顯示當日測值應受其整體環境背景影響。

K.99 年 4 月 29 日最大日平均值分別為 133.3μg/m^3，主要係受中國大陸華北 4 月 28 日之沙塵暴影響（環保署公告沙塵暴影響時間為 4 月 28~29 日），且比對環保署萬里測站 4 月 29 日懸浮微粒測值顯示，萬里測站當日之日平均值為 163.3μg/m^3，顯示整體環境背景不佳係受大陸沙塵暴影響。

L. 99 年 12 月 3 日及 99 年 12 月 4 日最大日平均值分別為 140.1μg/m^3 及 148.0μg/m^3，主要係受中國大陸華北 12 月 3 日之沙塵暴影響（環保署公告沙塵暴影響時間為 12 月 2~4 日），且比對環保署萬里測站 12 月 3、4 日懸浮微粒日平均值分別為 148.6μg/m^3、110.6μg/m^3 以及汐止測站 12 月 3、4 日懸浮微粒日平均值分別為 123.6μg/m^3、113.1μg/m^3，顯示整體環境背景不佳係受大陸沙塵暴影響。

M.101 年 3 月 24 日之日平均值為 132.6μg/m^3，主要係受大陸沙塵暴影響（環保署公告沙塵暴影響時間為 3 月 24~25 日），與環保署萬里及汐止測站 3 月 24 日之懸浮微粒測值（分別為 112.0μg/m^3 及 130.1μg/m^3）比對顯示，該日測值均有一致升高之趨勢，顯示當日測值應為整體空氣品質環境不良影響。

⑶氮氧化物

各測站歷年之氮氧化物日平均值最大值詳如表3.1-3，小時平均值最大值則詳如表3.1-4;本季日平均值最大值介於0.006~0.019ppm之間，介於100年同期（0.006~0.031ppm）及上季（0.006~0.028ppm）範圍內，且均介於歷年（0.003~0.163ppm）範圍內；本季小時平均值最大值介於0.008~0.049ppm之間，介於100年同期（0.011~0.141ppm）及上季（0.011~0.056ppm）範圍內，且介於歷年（0.003~0.368ppm）範圍內。

依各測站歷年資料顯示，日平均值最大值及小時平均值最大值均以貢寮焚化廠入口旁民宅測站之測值為最高，分別發生在85年5月及85年4月，惟各測站歷年測值之季節性變化趨勢穩定。

⑷二氧化氮

各測站歷年之二氧化氮最大日平均值詳如表3.1-5，小時平均值最大值則詳如表3.1-6；本季日平均值最大值介於0.004~0.014ppm之間，介於100年同期（0.003~0.016ppm）及上季（0.003~0.017ppm）範圍內，且均介於歷年（0.002~0.075ppm）範圍內；本季小時平均值最大值介於0.005~0.029ppm之間，與100年同期（0.004~0.048ppm）及上季（0.009~0.032ppm）差異不大，且均介於歷年（0.004~0.172ppm）範圍內。歷次最高值0.172ppm發生於93年3月福隆海水浴場測站，主因為受鄰近地區燃放鞭炮所致。歷年來小時平均測值均低於空氣品質標準二氧化氮小時平均值0.25ppm之要求，顯示本區域空氣品質二氧化氮之現況良好。

⑸一氧化碳

各測站歷年之一氧化碳小時平均值最大值詳如表3.1-7，本季測值介於0.3~1.1ppm之間，與100年同期(0.3~0.9ppm)及上季(0.3~2.1ppm)差異不大，且均介於歷年（0.14~8.5ppm）範圍內，其最高值8.5ppm係發生於石碇宮測站85年8月之測值（其原因為石碇宮旁有人焚燒紙錢不慎所致），惟歷年測值均未超過空氣品質一氧化碳小時平均值35ppm之規定，此外各測站歷年測值並無特別明顯季節性之變化。

各測站歷年之一氧化碳最大8小時平均值詳如表3.1-8，本季測值介於0.2~0.5ppm之間，與100年同期（0.2~0.7ppm）及上季（0.3~1.0ppm）差異不大，且均介於歷年（0.2~3.8ppm）範圍內，歷年最大8小時平均值均符合空氣品質標準9ppm之規定。各測站間之歷年平均值差異不大，亦無季節性變化。

⑹非甲烷碳氫化合物

各測站歷次之非甲烷碳氫化合物日平均值最大值詳如表3.1-9所示，小時平均值最大值詳如表3.1-10；本季日平均測值最大值介於0.12~0.61 ppm之間，與100年同期（0.15~0.55ppm）及上季（0.13~0.48ppm）差異不大，且均介於歷年（0.02~2.60ppm）範圍內；本季小時平均測值最大值介於0.16~2.79ppm之間，與100年同期（0.24~1.90ppm）及上季（0.16~0.82ppm）略高，惟介於歷年（0.04~5.87ppm）範圍內，其日平均值最大值及小時平均值最大值均以85年8月貢寮國小測站測值較高外，其餘各站歷年監測平均值均不高且相近。

依據歷年監測結果顯示，7處測站之總懸浮微粒（TSP）、氮氧化物（NO_X）、二氧化氮（NO_2）、一氧化碳（CO）及非甲烷碳氫化合物（NMHC）之濃度測值，計有10次總懸浮微粒24小時測值及36天次懸浮微粒日平均值超出法規值，超出空氣品質標準情形多受鄰近其他污染源（如貢寮焚化廠入口旁民宅之廢五金燃燒、台2省道交通量及福隆海水浴場整修工程等）或大陸沙塵暴環境背景影響。整體而言，除上述幾項超出空氣品質標準情形外，核四歷年監測之粒狀污染物（TSP及PM_{10}）多低於環境空氣品質標準，而NO_2及CO等氣狀污染物濃度亦均遠低於環境空氣品質標準。由於目前核四工區周界均設置有施工圍籬，並於工區確實落實施工車輛洗車及施工作業面灑水作業，減少空氣污染程度。依目前監測結果顯示本地區長期之空氣品質尚屬良好，對廠區周界範圍及鄰近敏感點之空氣品質影響誠屬有限。

3.噪音與振動監測

原自84年7月起於台2省道與102縣道交叉口、貢寮國小及龍門社區活動中心3個測站進行監測，後依原子能委員會核能四廠環境保護監督委員會之建議，目前分別於台2省道與102縣道交叉口、鹽寮海濱公園、福隆街上、102縣道之新社橋及過港部落等5處進行噪音與振動監測，以下就各測站歷年之監測結果做分析。

(1)噪音部份

有關歷年監測工作監測結果整理於表3.1-11至表3.1-15，並繪如圖3.1-3至圖3.1-8所示。惟噪音自100年1月起依據「噪音管制區劃定作業準則」（一般地區環境音量標準，98年9月4日行政院環境保護署環署空字第0980078181號令發布）及環境音量標準（道路交通噪音環境音量標準，99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布），故監測結果依法規規定修改為$L_{日}$、$L_{晚}$及$L_{夜}$之方式表示。針對省道旁之3處測點分述如后：台2省道與102甲縣道交叉口測站本季非假日及假日測值分別介於67.9~72.7dB(A)及66.5~72.2dB(A)之間，與100年同期（66.1~73.2dB(A)）及上季（66.7~74.6dB(A)）相較測值差異不大，均介於歷年（63.7~83.3dB(A)）範圍內；鹽寮海濱公園測站本季非假日及假日測值分別介於67.4~70.4dB(A)及65.5~70.4dB(A)之間，與100年同期（64.9~70.7dB(A)）及上季（63.7~71.8dB(A)）相較測值差異不大，惟均介於歷年（56.3~80.2dB(A)）範圍內；福隆街上測站本季非假日及假日測值分別介於72.4~75.2dB(A)及69.7~74.9dB(A)之間，與100年同期（67.7~74.7dB(A)）及上季（67.8~76.4B(A)）相較測值差異不大，均皆介於歷年（60.7~79.7dB(A)）範圍內。整體而言，此3個測站因位處省道旁，噪音主要來自往來省道之車輛及假日之遊客嬉戲聲，故歷年測值大多超過環境音量標準。

有關非省道旁之測點共2處，其分述如后：102縣道之新社橋測站本季非假日及假日測值分別介於55.2~62.5dB(A)及52.4~65.8dB(A)之間，其測值與100年同期（55.8~69.4dB(A)）及上季（54.1~64.6dB(A)）相較測值差異不大，惟均皆介於歷年（45.7~83.7dB(A)）範圍內；過港部落本季非假日及假日測值分別介於42.5~51.8dB(A)及40.4~56.8dB(A)之間，與去年同期（43.1~52.0dB(A)）及上季（41.6~57.6dB(A)）相較測值差異不大，惟測值均介於歷年（37.4~70.0dB(A)）範圍內。因102縣道之新社橋及過港部落兩測站位於非省道旁，受車流影響較小，且過港部落屬噪音管制區劃定作業準則之一般地區第二類管制區限值，其管制

標準較環境音量標準道路交通噪音之標準嚴格，測站音源多來自於社區之居民活動及車輛影響等為主。

整體而言，當地由於屬國家風景特定區，環境噪音標準較嚴格，而當地受台2省道交通、社區活動及地處海邊之海浪、風聲影響，環境背景音量於施工前即多有超出標準情形；本季於核四主體工程最近之鹽寮海濱公園及過港部落測站而言，非假日（施工）$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量在2.0dB(A)內，依環保署環境影響評估技術規範之營建工程噪音評估模式技術規範之標準評估（圖2.3-1），鹽寮海濱公園及過港部落測站之噪音影響程度均屬「無影響或可忽略」程度，且本季過港部落測站之非假日$L_{日}$測值均符合該區之噪音管制標準，顯示核四施工之噪音影響輕微。

⑵振動部份

本季監測工作振動之$L_{V(24小時)}$監測結果，整理於表3.1-16，並繪如圖3.1-9~圖3.1-10所示。本季(30.0~53.2dB)與100年同期(30.0~49.2dB)及上季(30.0~51.9dB)相較測值差異不大，為測值均介於歷年(30.0~62.0 dB）範圍內，歷年最高值發生於100年1月鹽寮海濱公園，其與台2省道新建工程施工影響有關。惟歷次監測結果發現，以省道旁測站（台2省道與102甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園、福隆街上）之測值明顯高於非省道旁之測站（102縣道之新社橋、過港部落），其應與受到省道交通運輸車輛及台2省道新建工程之影響有關，尤其以上下班尖峰時段車輛較為頻繁之時段最為顯著。

4.交通流量監測

本季交通流量與歷年同季、上季及歷年監測之調查結果整理於表3.1-17，並繪如圖3.1-11及3.1-12所示，綜合其成果，大體而言假日之小客車當量數（P.C.U./日）高於非假日，歷年監測結果均呈一致之情形。茲就調查結果分析如下：

(1)台 2 省道交通量

台2省道旁測站包括：台2省道與102甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆測站，由於測站位屬於東北角海岸國家風景區台2省道上，每逢例假日多有大量遊憩之車潮湧入，易造成車流量增加，本季非假日及假日車流量分別約介於13,502.0~19,571.0P.C.U./日及15,049.0~21,170.5P.C.U./日之間，與100年同期(非假日：13,340.0~19,916.5P.C.U./日，假日：13,093.5~23,307.5P.C.U./日)相較測值差異不大，與上季(非假日：12,346.5~17,394.0 P.C.U./日，假日：7,876.5~14,780.0P.C.U./日)相較非假日及假日測值均有較高之情形。本季非假日之測值介於歷年調查車流量9,227.0~29,555.0P.C.U./日，假日之測值介於歷年調查車流量7,876.5~35,695.0P.C.U./日之間；本季於5月5日至6月30日，福隆海水浴場舉辦「2012福隆國際沙雕藝術季」，活動聚辦期間吸引大量遊憩車輛前往福隆地區，惟本季5月份及6月份執行省道旁之測站監測作業時，其車流量應受舉辦活動影響，較4月份車流量偏高。歷年於82~86年交通量較高，自87年來則趨於穩定，主要與特種車減少有關，並未因核四施工或當地活動而有明顯阻塞之情形，故交通衝擊屬可接受範圍內。

(2)非省道交通量

102縣道之新社橋與過港部落兩測站因較為偏僻，其車流量少，但假日時有遊客驅車前往草嶺古道或至海邊戲水會行經102縣道或過港部落，故使其2處歷年車流量均呈現假日高於非假日之趨勢。本季102縣道之新社橋與過港部落2測站，本季非假日及假日車流量分別介於59.5~1,683.0P.C.U./日及60.5~2,884.0P.C.U./日之間，與100年同期(非假日：63.5~2,073.0P.C.U./日，假日：91.5~3,968.0P.C.U./日)相較非假日及假日測值略低，與上季(非假日：57.0~1,524.5P.C.U./日，假日：33.0~2,533.5P.C.U./日)相較測值差異不大。自97年8月起假日車潮略有增加之情形，應與當地部分旅遊景點開放有關。惟與歷年調查非假日及假日車流量均介於17.0~11,442.5P.C.U./日及26.0~27,695.0P.C.U./

日。惟2測站交通服務水準均可維持A級服務水準，交通運輸品質仍屬良好等級。

5.河川水文監測

有關石碇溪與雙溪本季與歷年同季之河川水文監測結果整理於表3.1-18。在河川水位、流量、流速與含砂量方面，本季石碇溪及雙溪河川流量介於0.240~17.116cms及3.057~270.736cms之間；歷年同季石碇溪及雙溪河川流量介於0.064~7.712cms及0.236~130.774cms之間；上季石碇溪及雙溪河川流量介於0.704~3.296cms及7.996~43.087cms之間，本季因6月12日單日降雨達193.0mm，故各測站測值多高於去年同期及歷年同期觀測值。

6.河川水質監測

針對河川水質與工程施工較有關之懸浮固體物、導電度及較常超出甲類水質標準之溶氧量、生化需氧量、氨氮等水質項目，比較其歷年測值變化趨勢如表3.1-19~表3.1-24及圖3.1-13~圖3.1-18所示。

本季溶氧量測值介於4.8~8.6mg/L之間，與歷年同季（1.2~11.2mg/L）及上季（4.3~9.3mg/L）相較差異不太，本季各測值均介於歷年（1.2~12.6 mg/L）範圍內。

本季生化需氧量測值介低於偵測極限（ND＜1.0mg/L）~6.2mg/L之間，本季測值與歷年同季（低於偵測極限（ND＜1.0mg/L）~19.3mg/L之間）及上季（介於偵測極限（ND＜1.0mg/L）~2.3mg/L之間）差異不大，且介於歷年（低於偵測極限（ND＜1.0mg/L）~61.9mg/L之間）範圍內。

本季氨氮測值介於低於偵測極限(ND＜0.01mg/L)~1.36mg/L之間。支流暗渠上游（沼澤區）、澳底二號橋攔水堰上游及澳底二號橋水質偶有變差且變化較大，主要係因支流暗渠上游（沼澤區）位於廠區排水匯入前，但其上游有養豬廢水及居民之生活污水排入，而澳底二號

橋攔水堰上游測站匯集廠外生活、養殖污水及廠區排水（詳圖1.4-5），另澳底二號橋站位於石碇溪與台2省道交會處（詳圖1.4-5），部分澳底地區之生活污水沿台2省道收集，於此處排入石碇溪，因此支流暗渠上游（沼澤區）、澳底二號橋攔水堰上游及澳底二號橋水質水質受石碇溪流量及澳底生活污水排入影響。若採樣時適逢污水排入，則水質普遍不佳；若無污水排放，則因石碇溪本流及核四廠區匯集之山泉水稀釋作用，水質尚屬良好。且本季測值均介於歷年同季（介於低於偵測極限（ND＜0.01mg/L）~5.84mg/L間）、上季（介於低於偵測極限（ND＜0.01mg/L）~0.64mg/L之間）及歷年（介於低於偵測極限(ND＜0.01mg/L)~18.2mg/L之間）範圍內。

歷年懸浮固體濃度偏高情形多與降雨沖刷河岸泥砂有關，本季各測站懸浮固體測值介於2.4~19.1mg/L之間，測值介於歷年同季（介於低於偵測極限（ND＜1.0mg/L）~973mg/L之間）內，本季測值與上季（介於2.4~9.5mg/L之間）差異不大，若與歷年各測站測值比較，歷年以90年6月澳底二號橋測站懸浮固體物濃度高達973mg/L最高，惟當日該測站上游測站—澳底二號橋攔水堰上游測值僅11.6mg/L，由於澳底二號橋攔水堰上游測站位於核四廠周界（相關測站位置分佈詳圖2.6-1），其測值代表核四廠出廠之水質狀況，因此該日澳底二號橋測站懸浮固體物偏高情形與核四工程之影響較小。至於支流暗渠上游測站雖多次測值偏高，惟此測站無廠區排水排入，主要為支流上游養殖污水及民生污水排入所致。

至於導電度本季測值介於79~2,690μmho/cm 25℃之間，略高於上季（介於82~1,540μmho/cm 25℃之間），惟本季測值均在歷年同季（介於45.6~17,700μmho/cm 25℃之間）及歷年（介於9.6~45,900 μmho/cm 25℃之間）範圍內。

硝酸鹽氮方面，本季測值介於0.04~1.43mg/L之間，本季測值與上季（介於0.31~0.77mg/L之間）差異不大，且介於歷年同季（介於低於

偵測極限（ND＜0.01mg/L）~27.8mg/L之間）及歷年（介於低於偵測極限（ND＜0.01mg/L）~27.8mg/L之間）測值間。

⑵河川水質污染分析

目前核四廠區僅逕流水會流入雙溪，惟於流入前會先經滯洪池後再排入雙溪，且逕流時間長，故對雙溪水質之影響輕微，故以下僅針對石碇溪水質進行污染程度分析。本季石碇溪水質污染程度分析結果，除支流暗渠上游（沼澤區）屬輕度~中度污染外，其餘均屬未（稍）受污染。石碇溪支流暗渠上游（沼澤區）測站之污染情形較為嚴重，與歷年比較差異不大，由測站相關位置（如前圖2.6-1所示）及污染情形分析，澳底二號橋攔水堰上游測站匯集廠外生活、養殖污水及廠區排水，惟水質有較上游工區排水匯入前之支流暗渠上游（沼澤區）水質良好之情形。

綜合歷年石碇溪河川水質監測結果而言，其溶氧、大腸桿菌群、生化需氧量及氨氮等項目之污染濃度均有偏高情形，中、下游河段有達到輕度~嚴重污染程度，主要係因石碇溪流量少、流速低，且沿線為澳底主要住宅區，導致污染量超出河川涵容能力所致，惟近5年來，廠區排放混合山泉水排入石碇溪下游，使水量增多，亦使水質略微改善，多屬未稍受~輕度污染程度。

7.廠區水質監測

⑴廠區排水水質分析

針對工程施工影響較大之測項進行分析，歷年監測結果（表3.1-25~表3.1-27及圖3.1-19~圖3.1-20）顯示，本季pH介於7.092~8.174之間，與歷年同季（5.0~8.9）及上季（6.763~8.062）相較差異不大，而歷年pH測值介於5.01~9.55之間，其88年4月各測站測值有偏低情形，惟後續監測迄今已有所改善。

本季懸浮固體測值介於低於偵測極限（ND<1.0 mg/L）~14.5mg/L之間，本季各測站均符合放流水標準，與歷年同季（介於低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~547mg/L之間）及上季(介於低於偵測極限（ND<1.0 mg/L）~5.8mg/L之間)相較，本季測值與上季差異不大，且介於歷年同季範圍內，亦介於歷年測值範圍內（介於低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~547mg/L之間）。

本季生化需氧量各測值介於低於偵測極限值（ND<1.0mg/L）~52.4 mg/L之間，本季各測站均符合放流水標準，與歷年同季（低於偵測極限值（ND<1.0mg/L）~49.3mg/L之間）差異不大，但高於上季（介於低於偵測極限值（ND<1.0mg/L）~5.4mg/L之間）測值。

整體而言，廠區排水歷年僅懸浮固體及生化需氧量之測值偶有超過放流水相關標準之情形為主，惟對周遭環境之影響尚屬輕微。

⑵廠區排水污染量推估

就施工人員污染排放總量對河川水質影響之推估方面，由於雙溪流域未流經核四廠區，故其水質乃自然背景現況之反應，與核四施工較無相關，因此乃針對石碇溪水質影響進行推估。目前廠區內之員工污水多已納入污水處理廠處理，惟尚有少部分為經化糞池處理符合放流水標準後再予排放，本季生化需氧量及氨氮之排放污染量分別為1.09公斤/日及1.66公斤/日，介於歷年生化需氧量之排放範圍（0.05~5.58公斤/日）內；石碇溪2號測站歷年背景流量介於0.064~4.884CMS，而歷年澳底二號橋實測生化需氧量及氨氮之季平均值分別為低於偵測極限（ND<1.0 mg/L）~2.73mg/L及0.12~2.34mg/L，故推算本廠區排放之生化需氧量及氨氮污染量分別約佔石碇溪背景污染量之0.05%~6.27%及0.14%~23.53%，其對石碇溪水質之影響尚屬有限。由於河川沿線有養豬場分佈，且澳底地區之餐廳及家庭生活污水大多排放至石碇溪，故推測石碇溪水質主要是受此類污染源所影響。

8.地下水監測

(1)地下水水位

本區域地下水主要以石碇溪及太平洋為主要流出區，地下水流向由山區往平地流，於鹽寮海濱公園以北、廠區內側區域之地下水大致以石碇溪為流出區，鹽寮海濱公園以南區域地下水則流向鹽寮海域，有關核四環評報告所調查之水位流向如圖3.1-21所示。而為瞭解歷年地下水監測井之水位變化情況，茲摘錄核四環評報告及施工期間82年迄今之水位調查結果如表3.1-28及圖3.1-22~3.1-23所示。

本季（4~6月）整體而言，山區監測井中GM11、GM12、GM13之月平均水位標高約在28.50~44.29公尺之間（歷年水位標高介於21.98~53.06公尺，上季水位標高介於29.47~45.83公尺）；其餘平地監測井之月平均水位介於1.09~19.92公尺之間（歷年水位標高介於-0.75~19.75公尺，上季水位標高介於1.72~19.91公尺），水位變化不大。

依歷年地下水位統計結果，以GM7、P5-1等2口監測井水位變化較大，約自91年1月起水位下降，主要係該2口監測井均緊鄰工區開挖區域（如1、2號機及核廢料廠房旁之GM7監測井、冷卻水進出水暗渠旁P5-1），受抽水影響地下水水位，目前水位已有逐漸回升情形（詳圖3.1-22）。

分析水位變化對鄰近環境之影響，主要受抽水導致水位下降將影響下游區之取水，惟工區緊鄰海邊，其間僅有零星住戶，對用水需求影響不大；而由於本區域多屬岩盤地形，地下水水量原即不豐，故開挖抽水將不致於有地層下陷之虞。至於因工程可能不慎引起污染，由於抽水將導致更多鄰近地下水流入開挖區，污染應不致於外洩至區外地層中，且由目前監測結果亦均在歷年變化範圍內，無惡化情形。

(2)地下水水質

由表3.1-29~表3.1-40核四環評報告及本監測工作歷年較重要之12項水質監測資料，本季僅GM3-1監測井氨氮（測值介於0.67~0.84mg/L）、

重金屬鐵（測值介於1.410~2.740mg/L）、重金屬錳（測值介於3.17~4.06mg/L）等3項目有未符合第二類「地下水污染監測標準」之情形，其餘各測值均符合各項第二類「地下水污染監測標準」；歷年監測結果以總硬度（歷年各監測井測值介於低於偵測極限(ND<2.0mg/L)~4,149 mg/L之間）、氨氮（歷年各監測井測值介於低於偵測極限(ND<0.01 mg/L)~1.42mg/L之間）、總有機碳（歷年各監測井測值介於0.05~59mg/L之間）、硫酸鹽（歷年各監測井測值介於1.0~207mg/L之間）、重金屬之鐵（歷年各監測井測值介於低於偵測極限(ND<0.026 mg/L)~43.5mg/L之間）、錳（歷年各監測井測值介於低於偵測極限(ND<0.006 mg/L)~6.12 mg/L之間）測值有超出第二類「地下水污染監測基準」情形。

依據歷年核四環境監測結果與環評階段背景調查結果比較，本計畫區地下水於施工前有機污染以及重金屬鐵、錳濃度即有偏高情形，核四施工至今並無惡化情形；並輔以地下水流向及工程施工內容研判，水質較差之監測井非受核四工程影響，本季調查結果，僅GM3-1監測井之氨氮及重金屬鐵、錳測值有超出監測標準，惟GM3-1監測井自設井之初即有測值超出標準之情形，且測值均介於歷年範圍內。台電公司將持續辦理地下水環境監測工作，並加強污染源之資料蒐集、調查與分析工作。

⑶海水入侵研究

由歷年導電度及氯鹽之測值變化可知，僅GM10監測井之測值曾高達前述1,400μmho/cm及330mg/L之水質鹽化限值，GM10監測井之最高值則分別為2,173μmho/cm（90年12月）及625mg/L（90年4月），詳圖3.1-24及圖3.1-25所示。

GM10之導電度與氯鹽測值多在鹽化限值附近變動，該監測井雖位於廠址西南側，惟其地下水流向為由龍門社區往海岸線方向，亦非受核四工程影響。由於GM10監測井位於海邊，依其水位及導電度、氯鹽濃度較高情形研判，可能與地處海淡水混合區有關。

此外針對工區進行開挖區域（如1、2號機及核廢料廠房旁之GM7及GM14-1監測井及冷卻水進出水暗渠工程旁之P5-1監測井之導電度進行分析發現，本季以GM10監測井鄰近海邊測值有偏高之情形，測值介於900~1,260μmho/cm之間，惟各監測井測值均在鹽化限值1,400μmho/cm內，且屬環境背景值範圍內。

9.河域生態監測

本季河域生態各項測的測值，在葉綠素*a*含量方面， 4月份石碇溪與雙溪之平均含量分別為0.35μg/L及0.61μg/L；6月份石碇溪與雙溪之平均含量分別為0.23μg/L及0.21μg/L。本季監測值與去年同季相較之下，石碇溪6月份的監測值與去年同季相同，4月份則低於去年同季，雙溪在4月份高於去年同季，在6月份則低於去年同季，顯示石碇溪與雙溪的監測值與去年同季有差異，然而差異並不大，顯示石碇溪與雙溪測站葉綠素*a*含量的變動值在正常變動範圍之內。在附著藻方面，4月份的採樣顯示，於石碇溪最多出現30種，雙溪最多出現32種；6月份的採樣顯示，於石碇溪最多出現43種，雙溪最多出現29種；與去年同季相比，石碇溪與雙溪的附著藻類調查種類數幾乎都高於去年同季，僅有雙溪在4月份略低於去年同季，同時也高於上一季，顯示本季在附著藻這個監測因子，種類有增加的趨勢。本季石碇溪較主要優勢種類為短柄曲殼藻、隱頭舟形藻及克勞氏菱形藻，與上季相似。雙溪較優勢種類為短柄曲殼藻及克勞氏菱形藻。在浮游植物平均細胞數含量方面，本季4月份的採樣結果顯示，石碇溪為42,504cells/L，雙溪為66,352cells/L；種類組成方面，在石碇溪測站以線形曲殼藻、微小異極藻及穀皮菱形藻較為優勢；而在雙溪測站則以線形曲殼藻、隱頭舟形藻及穀皮菱形藻較為優勢。在與去年同季相較之下，本季石碇溪皆高於去年同季，雙溪4月份略低於去年同季，6月份明顯高於去年同季。

本季4月份浮游動物之平均總個體含量，石碇溪的採樣結果為4,183 ind./m^3，雙溪為7,750ind./m^3；6月份浮游動物之平均總個體含量，石碇溪的採樣結果為68ind./m^3，雙溪為43ind./m^3。在浮游動物方面，石碇溪與

雙溪所調查到的數量，石碇溪與雙溪在4月份的調查數量與去年同季差異並不大，而6月份的調查數量與去年同季相比卻明顯較低。在數量上石碇溪以枝腳類及軟體動物較多。在雙溪測站的優勢浮游動物種類則以猛水蚤及軟體動物在數量上最為優勢。

在水生昆蟲的調查採樣方面，本季4月及6月份於石碇溪及雙溪採集到之水生昆蟲種類數，有蜉蝣目、蜻蛉目、毛翅目、襀翅目及雙翅目5個目。4月份於石碇溪及雙溪分別調查到9種及8種，個體隻數分別出現35隻及56隻；6月份於石碇溪及雙溪皆調查到8種，個體隻數分別出現35隻及85隻。本季4月份的調查採樣顯示，在石碇溪的水生昆蟲數量與去年同季相同，而雙溪則略低於去年同季，整體而言，差異不大。本季6月份的調查採樣顯示，在石碇溪及雙溪的水生昆蟲數量皆高於去年同季。本季石碇溪與測站較為優勢的水生昆蟲種類為吉田扁蜉蝣及雙棘四節蜉蝣；而雙溪測站較為優勢的水生昆蟲種類則為吉田扁蜉蝣及吉本扁蜉蝣。

本季4月份魚類及無脊椎動物的調查採樣中，魚類在石碇溪採獲13種173尾，調查採獲數量與去年同季相比，低於去年同季；雙溪採獲12種140尾，調查採獲數量與去年同季相比，高於去年同季。本季6月份魚類的調查採樣中，在石碇溪採獲12種178尾，調查採獲數量與去年同季相比，低於去年同季；雙溪採獲12種135尾，調查採獲數量與去年同季相比，高於去年同季。在本季的調查，魚種組成方面，在石碇溪以大鱗鮻、尼羅口孵魚、花身雞魚及粗首馬口鱲(粗首鱲)較為優勢；在雙溪樣站則以粗首馬口鱲(粗首鱲)、台灣石魚賓、大鱗鮻及明潭吻鰕虎出現的數量最多，石碇溪及雙溪的優勢魚種稍有不同。

在甲殼類的採樣調查方面，在本季4月份於石碇溪採獲11種62隻，雙溪出現4種30隻，數量與去年相比，石碇溪高於去年同季，雙溪則低於去年同季。本季6月份，於石碇溪採獲9種46隻，雙溪出現4種24隻，數量與去年相比，石碇溪低於去年同季，雙溪則與去年同季的調查數量相同。本季石碇溪以雙齒近相手蟹、北方呼喚招潮蟹、台灣沼蝦及多齒新米蝦在數量上較為優勢，上季數量較少的北方呼喚招潮蟹及台灣沼蝦本季的

調查數量有恢復的跡象；在雙溪則以雙齒近相手蟹及台灣沼蝦在數量上較為優勢，與前幾季的調查結果相似。

在軟體動物的採樣調查方面，本季4月份在石碇溪出現7種38隻個體；在雙溪出現5種36隻個體。數量與去年同季相比，石碇溪及雙溪皆低於去年同季。本季6月份在石碇溪出現6種52隻個體，雙溪出現5種27隻個體，數量與去年同季相比，石碇溪高於去年同季，雙溪則低於去年同季。本季在軟體動物在數量上，石碇溪測站以網蠏、小皇冠蜑螺及福壽螺最為優勢，雙溪以網蠏及福壽螺最為優勢。軟體動物的調查方面，值得探討的是以往常見的小皇冠蜑螺自100年第2季以來數量大幅度減少之後，自上季（101年2月）開始發現數量有逐漸恢復的趨勢，本季4月份數量雖有微幅下降，然而6月份的調查數量則又有微幅增加，顯示族群數量已逐漸恢復。

河域生態葉綠素*a*等生物因子的長期變動於測值如圖3.1-26所示，若以長期趨勢而言，葉綠素*a*含量的長期季節變動明顯，而其中較高含量大約出現在8月份，其中又以89年8月及90年8月出現最高含量的現象，而96、97及98年的8月也有較高含量出現的趨勢。而較低含量則大多出現在12月份，97年12月份以及98年12月份的低監測值即反應出這個低含量的趨勢，100年第4季石碇溪及雙溪的監測值也同樣較低。而石碇溪及雙溪間葉綠素*a*含量的比較，在前幾季雙溪的葉綠素*a*含量大多數皆略高於石碇溪，且石碇溪及雙溪的葉綠素*a*含量的變動變動趨勢頗為一致；而在本季4月份的調查顯示，雙溪高於石碇溪，而6月份則石碇溪及雙溪監測值的差異並不大。

附著藻類的監測方面，以長期的趨勢而言，附著藻類出現之種類數的長期季節變動較不明顯，大致上維持在同一水平，上下變動並不會很大，至於石碇溪及雙溪之間附著藻種類數的變動，有著相同的變化趨勢，大致而言，在前幾季中，雙溪附著藻類出現之種類數略為高於石碇溪，而在100年第1季的採樣結果也顯示具有這個趨勢。然而在100年第2季時則呈現石碇溪的監測值些略高於雙溪，至於到去年第3季，則又出現雙溪

高於石碇溪的現象，在100年第4季的調查結果顯示10月份時石碇溪及雙溪的調查結果相同，而12月時雙溪則高於石碇溪。上季的監測值則顯示石碇溪略高於雙溪；而本季則4月份時石碇溪及雙溪數值接近，6月份時的監測值則顯示石碇溪略高於雙溪，此顯示石碇溪及雙溪的附著藻類在近年來調查數量略有差異，然而變化並不大。本季石碇溪及雙溪的監測值與長期監測值相較之下，石碇溪與雙溪皆高於長期監測值。浮游植物細胞數的監測方面，過去的調查顯示，較高含量大都出現在4、6、8月份，而較低含量大都出現在12月份，而98年12月至99年2月份的低監測值也反映出這個趨勢。至於石碇溪及雙溪之間浮游植物細胞數含量的比較，則以雙溪略高於石碇溪，在100年第3季也呈現這個趨勢，而100年第4季在10月份則顯示同樣趨勢，與近年來趨勢相同，而在100年第4季12月份則顯示石碇溪高於雙溪，與過去幾季不同，顯示這個監測值在上季略有變化，而在上季與本季4月份又回復到雙溪高於石碇溪，然而在6月份監測值則顯示石碇溪及雙溪差異不大，顯示該測值仍有變動，然而以長期趨勢看來，屬正常變動範圍。在長期監測值方面，石碇溪與雙溪的測值皆低於長期平均值。

浮游動物個體數量監測方面，在季節的變動上，大致上來說，石碇溪較雙溪為明顯，較高含量有時以出現在6、8月份為主，98年6月雙溪測站的高監測值也反映了這個趨勢，異常高含量於90年8月出現於石碇溪測站；若以過去的趨勢而言，石碇溪及雙溪含量的比較，石碇溪略高於雙溪，然而自97年之後，石碇溪及雙溪的浮游動物調查數量差異逐漸縮小而趨於一致，而去年第1季浮游動物調查監測值也同樣有這個趨勢，同時雙溪的監測值略高於石碇溪，而在100年第2季與第3季，雙溪的監測值也都高於石碇溪，而100年第4季10月的調查顯示石碇溪的監測值高於雙溪，與過去略有不同，而100年第4季12月的調查顯示雙溪的監測值又再度高於石碇溪，而上季的調查結果也呈現這個趨勢，而本季4月份的監測結果也呈現這個趨勢，顯示近幾季石碇溪及雙溪的浮游動物數量互有變化，但結果與近年趨勢相似。然而就數量而言，石碇溪及雙溪的浮游動物個

體數量在本季6月份明顯低於其他季別，為近年來的最低數量。在數量監測方面，雙溪4月份的監測值高於長期平均值，其餘皆低於長期平均值。

水生昆蟲及魚類、甲殼類及軟體動物等4個生物監測項目方面，其數量的長期變動如圖3.1-26所示。水生昆蟲數量的變動在石碇溪較明顯，石碇溪於91年2月出現異常高的數量，而後於97年6月也出現較高的採獲數量。於本季所調查的監測值可發現石碇溪與雙溪的水生昆蟲監測數量皆低於長期平均值，尤其石碇溪更是明顯低於長期平均值，顯示最近幾季以來，石碇溪的水生昆蟲數量明顯降低，且並無明顯恢復。至於石碇溪及雙溪水生昆蟲數量的比較，監測資料顯示從97年4月以來，石碇溪的數量有顯著高於雙溪的趨勢，而在99年第2季，石碇溪所採獲水生昆蟲的數量則僅略較雙溪為高，石碇溪及雙溪之間逐漸趨於接近，而自99年第3季以來，石碇溪及雙溪的調查數量則差異不大。100年第2季與第3季的水生昆蟲調查結果顯示雙溪的調查數量已高於石碇溪，本季則延續這個趨勢，雙溪明顯高於石碇溪。本季的水生昆蟲與長期平均值相較之下，石碇溪及雙溪仍低於長期平均值，尤其石碇溪更為明顯，這個監測結果與去年一整年相似。

魚類數量的監測調查方面，石碇溪及雙溪所調查到魚類數量的比較，長期而言，石碇溪明顯高於雙溪，而100年一整年4季以來的調查結果也都同樣顯示具有這個趨勢。100年第1季的調查資料顯示石碇溪的魚類調查採樣數量低於長期平均值，雙溪則高於長期平均值，100年第2、第3與第4季以及上季的調查監測皆顯示石碇溪及雙溪都高於長期監測值，而本季則也同樣維持相同的趨勢，顯示石碇溪及雙溪的魚類數量趨於穩定。甲殼類動物調查採獲數量於92年6月至93年6月有明顯的增加，尤其以石碇溪較為明顯，石碇溪及雙溪採獲量的比較，則互有高低，98年8月、10月及12月的調查採樣以至於到99年第4季的調查結果，顯示石碇溪及雙溪的甲殼類調查數量有較為接近的趨勢存在，在去年的情形，第1季的調查結果也同樣符合這個趨勢。而100年第2季則是顯示石碇溪高於雙溪，而在去年第3季，也同樣是石碇溪高於雙溪，而在100年第4季10月份，也同

樣是石碇溪高於雙溪，但100年第4季12月份，則顯示石碇溪及雙溪的調查結果相近，在上季則是石碇溪又再度高於雙溪，而本季也具有相同趨勢。本季的甲殼類調查數量在石碇溪與雙溪皆高於長期平均值。

關於軟體動物這項生物監測因子，石碇溪及雙溪的軟體動物數量繼89年出現較高量後，於92年6月至93年8月間亦明顯出現較高數量，尤其雙溪軟體動物數量的增加更為顯著。至於石碇溪及雙溪之間軟體動物調查數量的比較，92年6月以前以石碇溪較多；於92年6月至93年8月間，以雙溪的數量明顯高於石碇溪；而在93年8月、10月及12月，又以石碇溪的數量高於雙溪，而從100年一整年4季中，石碇溪及雙溪軟體動物類的調查數量有相近的趨勢，差異並不大，上季則呈現石碇溪明顯高於雙溪的趨勢，而本季同樣具有這個趨勢，在長期數量監測方面，本季石碇溪與雙溪的軟體動物數量皆高於長期平均值。

綜合上述監測結果，各項生物因子監測值與上季及100年同季的比較結果如表3.1-41所示。與去年同季比較，除了石碇溪在6月份的葉綠素*a*、4月份的水生昆蟲與雙溪6月份的甲殼類調查數量與去年同季相同外，其餘各項生物監測因子與去年同季相較之下，皆有變化。各項生物監測因子中，其中變化較大的是石碇溪及雙溪在6月的浮游植物細胞數含量與浮游動物數量，本季石碇溪及雙溪在6月的浮游植物細胞數含量達到100年同季6月的3倍以上，而本季6月石碇溪及雙溪的浮游動物數量則與此相反，與去年同季6月相較之下，調查數量極低，對此現象應持續進行監測以了解後續變化情形。在其他各項生物監測因子方面，附著藻類、魚類總數、葉綠素*a*含量、水生昆蟲、甲殼類與軟體動物數量雖與去年同季的調查結果有差異，但變化相對較小，可視為於不同調查時間進行調查所產生的生物族群合理變動。一般而言，本季大多數生物監測因子與去年同季相較之下，雖有變動，然而以長期趨勢來看，監測值應仍屬正常範圍，惟變化較大的浮游植物細胞數含量與浮游動物數量須再持續進行監測。

在所監測的指標生物項目方面，與去年同季比較，各項指標生物的監測因子變化皆大。各項指標生物監測值普遍高於去年同季，所有指標

生物的監測值中，只有魚類的大鱗鮻與甲殼類的日本絨螯蟹調查數量略低於去年同季，其餘指標生物的監測數量都高於去年同季，這個調查結果顯示粗首馬口鱲、矽藻細胞數、吉田扁蜉蝣，以及石碇溪的小皇冠蜑螺(棘蜑螺)、雙溪的台灣蜆等指標生物在石碇溪與雙溪的調查數量與去年同季相比都有成長，顯示各項指標生物的數量仍屬穩定。

在各項水域指標性生物的監測項目中，魚類因為體型大，可見度高，因此通常是最引人注目的。本季在石碇溪上游的指標生物粗首馬口鱲(粗首鱲)的調查監測方面的調查數量顯示高於100年同季，然而雙溪測站的調查數量低於去年同季，顯示石碇溪及雙溪的粗首馬口鱲數量雖已逐漸恢復，但族群數量仍在持續不停的變動，因此雙溪的粗首馬口鱲仍須留意其族群數量，預計將對石碇溪上游測站的粗首馬口鱲持續進行監測，以瞭解後續情形。而另一種指標魚類大鱗鮻的監測，本季的監測資料顯示，去年度在石碇溪及雙溪測站所調查到的大鱗鮻數量已顯示石碇溪及雙溪的大鱗鮻數量都有恢復的跡象，本季的調查數量在石碇溪及雙溪都高於去年同季，顯示石碇溪及雙溪的大鱗鮻數量雖已逐漸恢復，但雙溪的大鱗鮻族群數量仍明顯較石碇溪少，因此有必要針對雙溪中、下游測站的大鱗鮻持續進行監測，以瞭解後續恢復情形。石碇溪上游測站的另一種指標性生物吉田扁蜉蝣，本季的調查數量在石碇溪及雙溪都高於去年同季，顯示在石碇溪及雙溪的吉田扁蜉蝣數量已有成長的趨勢，但石碇溪的數量仍明顯較雙溪少，對此需持續予以監測。

在甲殼類方面，本季在石碇溪所調查紀錄的日本絨螯蟹數量低於100年同季與上季，同時近幾季的日本絨螯蟹數量仍持續有變化，而調查發現，石碇溪上游測站仍有人為捕捉的現象，推測已對該測站的日本絨螯蟹數量造成影響，將持續對石碇溪的日本絨螯蟹族群量加以監測，以了解後續族群變化的狀況。在軟體動物的調查方面，石碇溪中游的指標生物軟體動物小皇冠蜑螺，在99年第4季的調查資料顯示在石碇溪樣站所調查到的小皇冠蜑螺數量明顯變少，這結果充分顯示石碇溪中游測站所進行的施工已不僅影響到魚類的數量，同時也嚴重影響該處軟體動物等水

域生物，此已造成該區域的魚類及軟體動物生物量減少，調查資料顯示，本年（101年）第1季在石碇溪中游測站的小皇冠蜑螺的數量仍持續減少，自100年第2季6月時數量已極為稀少，而到100年第3季更只調查到1隻，推測小皇冠蜑螺數量的大量減少，應與當時棲地的破壞與水質污染有關。然而經過去年一整年的持續監測，到去年第4季時，調查結果顯示該測站的小皇冠蜑螺數量已逐漸恢復，而上季數量的恢復情形更較上季為佳，此應與棲地與水質的恢復有關。根據本季的調查，石碇溪中游測站的指標性生物小皇冠蜑螺數量與去年同季相較之下，數量已有增多的趨勢，顯示小皇冠蜑這種指標生物在前幾季大量減少後，已有恢復的跡象，然而本季的數量仍較上季少了許多，對此將持續監測後續族群恢復狀況。至於另一種軟體動物類的指標生物台灣蜆，根據其在雙溪測站的調查結果顯示，近幾季的調查數量皆不多，但數量穩定，本季的調查數量即略高於去年同季，然而少於上季，然而根據近年來的採樣調查結果推測，此應屬於族群數量變動的正常值，對將此予以持續監測。

石碇溪與雙溪測站皆屬於典型的溪流水域生態系，溪流環境生態中的許多種生物的生存皆仰賴棲地的維護與水質的穩定。石碇溪上游測站自99年第3季開始，在進行河堤改建的工程，造成溪水混濁，對水域生態造成嚴重影響，雖然已施工完成，但根據前幾季該測站的調查資料顯示，確實已造成影響。另一方面，自99年第2季開始，石碇溪中游測站正在進行橋樑改建的工程，橫跨在河道的壩體也拆除了，因此造成該測站水域環境有大幅改變，遇到施工時，水色也經常呈現混濁的土黃色，而反映出來的的調查結果是石碇溪中游測站在該段時間的調查魚類數量大減，而從99年第4季開始的調查結果顯示，石碇溪中游測站的魚類調查現況情況仍未有明顯的改善，經過100年整年的調查監測後發現，該兩處測站的棲地已逐漸恢復，水色也有恢復的跡象，且該測站的指標性物種如吉田扁蜉蝣與粗首馬口鱲已有恢復的跡象，且於上季以及本季也是顯示同樣的趨勢，顯示這些指標物種在持續監測之下，已能清楚的了解到族群數量的恢復，這更突顯長期監測工作的重要性。

10.海域水質監測

由於本區海域水質尚屬良好，多項污染物分析值均在方法偵測極限以下，因此，茲就海域水質與工程施工較有關係之懸浮固體物、濁度及曾經超過水質標準之生化需氧量與大腸桿菌群等水質項目，比較其歷年測值變化趨勢（詳圖3.1-27~圖3.1-30及表3.1-42~表3.1-45所示）。

在懸浮固體物方面，本季測值介於1.2~9.8mg/L之間，本季測值與上季（介於1.1~2.9mg/L之間）差異不大，且介於歷年同季（介於低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~43.5mg/L之間）及歷年測值（介於低於偵測極限（ND<1mg/L）~49.5mg/L之間）範圍內。由歷年監測結果顯示，監測初期（82年8月至84年7月）濃度較高，多介於10~50mg/L之間，而後懸浮固體物濃度值則多在5~20mg/L之間振盪變化，僅幾次測值高出20mg/L，其發生時間多在9月、11月至翌年2月，研判可能係因本區海域位於台灣東北角，由於受颱風或東北季風之影響，使得波浪擾動及降雨量增加，以致沿岸水體之懸浮固體物濃度上升。

在生化需氧量方面，本季測值介於1.0~1.9 mg/L之間，本季測值與歷年同季（介於低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~4.5mg/L）及上季（測值介於低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~1.9 mg/L之間）差異不大，且介於歷年測值（介於低於偵測極限（ND<1.0mg/L）~6.9mg/L之間）範圍內。

大腸桿菌群方面，本季測值介於低於偵測極限（ND<10CFU/100mL）~2.6×10^{3}CFU/100mL間，略高於上季（介於低於偵測極限（ND<10 CFU/100mL）~25CFU/100mL間），但介於歷年同季（介於低於偵測極限（ND<10CFU/100mL）~8.6×10^{4}CFU/100mL間）測值範圍內，而歷年測值介於低於偵測極限（ND<10CFU/100mL）~2.7×10^{5}CFU/100mL之間，本季測值均在歷年範圍內。

另針對海域施工可能引起海水濁度增加問題，因海事工程已完工，本季濁度測值介於0.50~11NTU間，屬環境背景值，本季測值略高於上季（介於0.40~1.3NTU間），皆介於歷年同季（介於低於偵測極限（ND<0.05

mg/L)~21.8NTU間)及歷年(介於低於偵測極限(ND<0.05mg/L)~21.8NTU)範圍內，就歷年調查濁度變化情形繪圖如圖3.1-30所示，除部分測值偏高外，其餘測值大多低於6NTU，90年度以來亦多維持在10NTU以內。

整體而言，本計畫海域水質監測點均位於近岸，易受沙灘遊憩活動及陸源污染物排放影響，導致水質較差，而本海域因屬甲類海域水體，海洋環境品質標準較嚴，故漁港或河口時有超出甲類海域海洋環境品質標準情形，本季澳底漁港4、6月份之生化需氧量（測值分別為2.1mg/L及3.1mg/L）有超出甲類海域海洋環境品質標準；至於外海區域，因東北角風浪強及潮流帶動影響，水體混合狀況良好，因此污染物不易集中，本季各測值除5月4號測站表、底層之大腸桿菌群測值有超出甲類海域海洋環境品質標準外，其餘各測站各測值均符合甲類海域海洋環境品質標準，惟海事工程已於94年7月完工，且測值均在歷年範圍內，整體海域水質尚稱良好。

11.海域生態監測

海域各測站環境因子調查結果顯示，營養鹽中的硝酸鹽濃度介於4.40~79.51μg/L之間；亞硝酸鹽濃度介於<0.42~1.83μg/L之間；磷酸鹽濃度均為<0.93μg/L；矽酸鹽濃度介於57.51~520.26μg/L之間，多數測站並無明顯水層濃度變化；葉綠素a含量介於0.08~0.50μgChla/L之間；總氮各測值介於0.03~0.10mg/L之間，總磷各測值介於0.02~0.12mg/L之間，各測站（水平分布）及水層（垂直分布）間的濃度變化不大，測值呈現較為均勻分佈的現象。

基礎生產力各測值介於0.23~1.90μgC/L/hr之間（平均值為0.84μgC/L/hr），與100年同季差異不大。植物性浮游生物在表層水(0m)、中層水(3m)及、底層水的平均細胞數含量分別為21.1×10^3cells/L、6.89×10^3cells/L、6.69×10^3cells/L，總平均含量為8.55×10^3cells/L。種類組成中以矽藻類出現的種類及數量最多，但在數量上於0m以藍綠藻的鐵氏束毛藻較為優勢、其次矽藻類旋鏈角刺藻，在3m水層是以矽藻的旋鏈角刺

藻較為優勢，其次為近岸卵形藻與鐵氏束毛藻，底層如同3m水層是以矽藻的旋鏈角刺藻較為優勢，其次近岸卵形藻與線形曲殼藻，顯示各水層的優勢藻種頗為一致，至於0m水層出現較大量藍綠藻的鐵氏束毛藻，顯示季節變動影響著藻類相的變化型態。動物性浮游生物垂直分佈平均豐度為27.2×10^3ind/1,000m^3。種類組成以介形類及橈足類的哲水蚤為主要優勢種，其次為夜光蟲及棘皮幼生，水平分佈平均豐度為8.4×10^3 ind/1,000m^3。種類組成亦以夜光蟲及哲水蚤為主要優勢種，其次是棘皮幼生及介形類，兩者分佈種類組成頗為相似，群聚結構顯示與一般近海海域特性相類似。

潮間帶沙底質底棲無脊椎動物的分佈及種類組成主要分佈於低潮線0 m及5 m處樣區，種類組成單純，僅發現沙底質常見的多毛類。澳底岩礁底質測站發現22種339隻底棲無脊椎動物，其中以黑齒牡蠣及黑瘤海蜷為優勢物種，其中牡蠣多棲息在接近低潮線附近，而黑瘤海蜷則多聚集在石縫或岩石底面；鹽寮岩礁底質測站發現13種102隻底棲無脊椎動物，以棲息在接近低潮線的黑齒牡蠣為主要優勢種。亞潮帶的沙質區共發現10種共92隻底棲無脊椎動物，就生物豐富度而言，以普通文蛤數量較多，沙底質環境的擾動大，影響歷年的物種組成。亞潮帶岩礁底質，大礁測站以瘤菟葵為優勢物種，與過去結果相似；淺礁測站則以白尖紫叢海膽為優勢物種。

本季調查海域魚卵與仔稚魚平均密度分別為708個/1,000m^{3}及52尾/1,000m^3。成魚於鹽寮及澳底礁石區分別記錄到57種及59種，鹽寮及澳底兩礁石區合計記錄到30科83種魚類。以單一魚種所記錄到之數量而言，鹽寮及澳底兩礁石區均以霓虹雀鯛的尾數最多，數量居次則為斑鰭光鰓雀鯛。鹽寮及澳底兩區合計，以隆頭魚科記錄到23種、雀鯛科記錄到12種及蝴蝶魚科記錄到7種為較大科別，顯示本海域本季主要以定棲性魚種為主。歧異指數在鹽寮礁石區為2.81，澳底礁石區為3.22，鹽寮及澳底兩處合併計算為3.13。與去年同季比較，本季的魚卵密度、仔稚魚密度、成魚種類數及歧異指數均高於去年同季。魚類指標魚種霓虹雀鯛及燕尾光

鰓雀鯛的數量，在鹽寮礁石區均高於100年同季，而在澳底礁石區則為低於100年同季或持平。

大型海藻於澳底潮間帶海蝕平台發現藻類15種，水深3公尺以淺潮下帶共記錄62種（未含無節珊瑚藻1種）；鹽寮的潮間帶發現藻類10種，礁塊垂直面的潮下帶共發現55種（未含無節珊瑚藻1種）。亞潮帶大型海藻相以紅藻為主，大礁南側發現17種（未包括無節珊瑚藻）。優勢藻種為貝狀耳殼藻及太平洋寬珊藻。淺礁南側發現10種（未包括無節珊瑚藻），以紅羽凹頂藻及匍扇藻為較主要優勢藻種，其次為貝狀耳殼藻。覆蓋率大礁南側水深5m平均26.40%，水深10m平均27.60%。淺礁南側水深5m平均19.58%，水深10m平均23.70%。本季大型海藻潮間帶與潮下帶種類數與覆蓋率均較上季（101年2月）增加，主要是受到季節性生長的影響。

根據本季大礁與淺礁海域水深5 m及10 m監測站珊瑚群聚的調查，珊瑚種類組成與群聚指標皆與歷年結果相似，大礁及淺礁的珊瑚群聚皆以團塊形及表覆形的石珊瑚種類為主，且以菊珊瑚科的種類數及個體數最多。根據本季大礁與淺礁海域水深5 m及10 m監測站珊瑚群聚的調查結果，各監測站各項指數多在歷年95%信賴區間內，並未呈現異常變動，整體而言本季鹽寮海域的珊瑚群聚都在合理變動範圍之內。

海域生態各項非生物的環境因子測值與上季（101年2月）及去年（100年）同季的比較結果如表3.1-46所示，若與去年（100年）同季比較，海域生態各項非生物的環境因子測值與去年同季比較，營養鹽及葉綠素*a*平均含量相似。整體而言，海域生態環境變動不大。

本季海域生態各項生物因子測值與去年同季的比較結果如表3.1-47所示，浮游植物細胞含量與去年同季相較為高且與上季（101年2月）相較為增加趨勢，在優勢種類主要以矽藻的旋鏈角刺藻為優勢種，其中0m水層以鐵氏束毛藻較為優勢，相似於去年同季的0m水層，數量上較高於去年（100年）同季與上季（101年2月），可能是受到季節變動的影響仍要繼續觀察其藻種的變動及數量上的變動。浮游動物含量個體量雖較去

年同季相較降低的變動，而生物量則是低於去年（100年）同季，但相較於上季（101年2月）有增加，未來仍需繼續觀察。本季橈腳類比例在分佈上相較於去年（100年）同季有增加的變動，但相較上季（101年2月）比例降低，仍須繼續留意觀察監測。而本季底棲無脊椎動物潮間帶岩礁種類數、魚卵密度含量、仔稚魚密度含量、成魚種類數及歧異指數、大型藻類種類數皆較高於去年同季，而底棲無脊椎動物亞潮帶岩礁種類數、大型藻類種類數潮間帶、珊瑚種類數及覆蓋率皆相較略低於去年同季，其餘生物因子則變動不大，仍為一般沿近海域該季較常出現之現象。另指標性物種與去年同季比對結果，如表3.1-48所示，就選定之指標物種的變化而言，與去年（100年）同季比較，本季指標物種共26項測值中（不包含大型藻類潮間帶石花菜），指標性物種矽藻細胞數、澳底黑齒牡蠣個體數、淺礁白尖紫叢海膽覆蓋率、鹽寮霓虹雀鯛尾數、淺礁太平洋寬珊藻覆蓋率、貝狀耳殼藻覆蓋率、淺礁菊珊瑚群體數、淺礁微孔珊瑚群體相較於去年同季高，哲水蚤個體量、澳底黑瘤海蜷個體數、鹽寮黑齒牡蠣、瘤菟葵覆蓋率、澳底霓虹雀鯛尾數、大礁太平洋寬珊藻覆蓋率、大礁菊珊瑚群體數、腦紋珊瑚群體數、大礁微孔珊瑚群體數較低於去年（100年）同季，其餘指標性物種則差異不大。本季多項指標物種的生態測值與去年同季比較，雖多項測值（26項測值中，有11項）有略為降低變動，但其他一些指標性物種測值仍顯示較大的季節上變動，將持續監測追蹤。

海域生態重要生物因子測值的長期變動分析，水體內的生物，浮游植物細胞數含量的長期變動如圖3.1-31所示，季節變動明顯，較高含量常出現在11月份（95年11月除外)，於93年11月則出現特別高含量的現象，較低含量大都出現在2~3月份，本季（101年5）細胞數含量仍低於長期平均值。浮游動物個體量低於長期平均值的季節變動。如圖3.1-31所示，較高含量出現在5月份及8月份，較低含量大都出現在2月份。在礁石區魚類中，於鹽寮及澳底礁石區出現魚種數的變動如圖3.1-32所示；鹽寮及澳底礁石區自82年8月至101年2月平均各為44種及48種，本季（101年5月）鹽

寮礁石區魚種數（57種）及澳底礁石區魚種數（59種）均高於上述的長期平均值。一般而言，每年夏季（8月）所出現的魚種數目通常較高，到秋季（11月）開始下降，並於冬季降到低點，而在春季（5月）持平或開始上升。這種季節性的變化幾為常態，以近幾年（95~100年）的冬-春季數據來看，春季裡的魚種數目皆較冬季者略高，不過多在長期平均值上下變動，因此本季礁岩區魚種數目較上季（101年2月）及長期平均值高，應屬於正常的季節性變動。在魚卵密度方面，長期數據顯示其在時間軸上的起伏很大，在歷次調查中，只有18次超過平均值，其中以5月份出現次數最多，其次為8月份，其餘各季的密度均在長期平均值以下（長期趨勢示於圖3.1-32）。以最近幾年（96~100年）的數據來看，春季及夏季裡（5月及8月）的密度相對較高，而秋季及冬季裡（11月及2月）則會出現較低量；本季的魚卵密度較上季增加，與季節性長期變動的傾向相符。此外，本季的魚卵密度已經接近長期平均值，顯示100年度的魚卵密度偏低已經有恢復的現象。仔稚魚密度在時間軸上的變動亦大；長期以來，只有在19次調查中超過平均值，其中以5月份及8月份出現次數最多，其餘各季的密度均在長期平均值以下（長期趨勢示於圖3.1-32）。以最近10年的數據來看，在每年秋季的仔稚魚密度通常最低，在冬季持平或開始上升，並在春季升高至最高點，類似的季節變化在93~99年反覆出現。本季的仔稚魚密度近於52尾/1000m^3，此較上季（2月）增加，符合長期的季節變化趨勢。仔稚魚的密度自98年以來連續多季呈現偏低，至本季（5月）依然未見回復，雖然仍具季節變化趨勢，不過一直未達長期平均值（590尾/1000m^3），在接下來的夏季將關注仔稚魚密度是否有持續出現低值的現象。大型藻類長期變動於潮下帶的紅藻類種類數如圖3.1-33所示，季節變動明顯，近5年的變動趨勢均在長期平均值間上下變動，種類數並未出現有逐年減少的現象，本季潮下帶的紅藻類的種類數，鹽寮及澳底均高於長期平均值，屬於季節性生長。就太平洋寬珊藻與貝狀耳殼藻的覆蓋率而言，除大礁的貝狀耳殼藻低於長期平均值外，其餘各測站不同深度海域的平均覆蓋率均略高於或接近長期平均值。本本季珊瑚群聚覆蓋率除了淺礁10m測站之外，其餘礁區均略低於長期平均值。珊瑚群聚覆

蓋率長期變動分析如圖3.1-34所示，以淺礁水深10m平均珊瑚覆蓋率14.00%及淺礁5m測站的平均珊瑚覆蓋率12.81%較高，而以大礁水深10m測站的平均珊瑚覆蓋率3.78%最低，與過去的調查資料相似。本季珊瑚群聚的調查結果顯示，整體而言各監測站珊瑚群體數及覆蓋率變化屬於正常之季節性變動，大部分樣站各項指數在歷年95%信賴區間內，符合長期變化趨勢，並未呈現異常變動。另外，本季潛水觀察結果也顯示，大礁與淺礁海域珊瑚群聚呈現明顯的空間分布特性，各條測線的珊瑚種類數、群體數及覆蓋率變動較大。

海域各項環境因子施工前與施工後比較如表3.1-49所示，硝酸鹽含量施工後平均值40.5/L低於施工前平均值93.1μg/L，亞硝酸鹽含量施工後平均值6.20μg/L低於施工前平均值10.6μg/L，磷酸鹽含量施工後平均值7.07μg/L低於施工前平均值28.3μg/L，矽酸鹽含量於施工後平均值172.9μg/L低於施工前平均值256μg/L。總氮含量施工後平均值0.11mg/L略低於施工前平均值0.16mg/L，總磷含量施工後平均值0.03mg/L低於施工前平均值0.09mg/L。葉綠素*a*含量施工後平均值0.41μg/L低於施工前平均值1.4μg/L，基礎生產力施工後平均值0.93μgC/L/hr高於施工前平均值0.5μgC/L/hr。海域各項環境因子測值於施工後與施工前比較，並未出現有明顯異常現象。海域生態的生物因子施工前與施工後比較如表3.1-50所示，浮游植物施工後平均含量為426×100cells/L，低於施工前平均含量的474×100cells/L。可能受到季節變動引響，浮游動物平均含量施工後為615×10^3ind./1000m^3，遠高於施工前 的95×10^3ind./1000m^3。魚卵密度於施工後平均為1,207個/1000m^3，略低於施工前的1,264個/1000m^3。仔稚魚密度於施工後平均密度為578尾/1000m^3，高於施工前的平均密度81尾/1000m^3近期因浮游植物細胞數仍偏低，導致施工後的浮游植物平均值低於較施工前，仍須繼續觀察，其餘海域生態生物因子測值於施工後均高於或相似於施工前，顯示於調查期間海域施工對海域生態影響應不顯著。

12.漁業調查

歷年（82年8月~101年6月）貢寮地區各類漁法作業之單位努力漁獲量（CPUE）、及單位努力漁獲產值（IPUE）變化趨勢如圖3.1-35~3.1-36所示。

在釣具漁業方面，本季（101年4~6月）CPUE介於12.2~18.9公斤/日/戶，與去年同期相較，各月份CPUE值較去年同期互有高低，與歷年同期相較，4月僅高於99年，5月居第12位，6月僅次於84年、85年。本季（101年4~6月）IPUE則分別為3,098~4,197元/日/戶，各月份IPUE值均較去年同期減少，與歷年同期相較4月僅高於93年、99年，5月僅高於94年、95年，6月居第14。

在火誘網漁業方面，本季（101年4~6月）CPUE介於104~603公斤/日/戶，與去年同期各月份(27~831公斤/日/戶)比較互有增減，與歷年同期相較，本季各測值均介於歷年同期範圍內（4.7~1,089月/日/戶）。本季（101年4~6月）IPUE則分別為12,187~14,564元/日/戶，與去年同期相較各月份互有增減；與歷年同期相較，本季各測值均介於歷年同期範圍內（682~29,835元/日/戶）。

在刺網漁業方面，本季（101年1~6月）CPUE介於9.5~15.5公斤/日/戶，各月份與去年同期比較互有高低（11.7~29.0公斤/日/戶），與歷年同期相較則4月居第14位，5月為歷年最低，6月僅高於99年。本季（101年4~6月）IPUE為4,506~5,774元/日/戶，皆低於去年同期（5,648~8,003元/日/戶）；與歷年同期相較4月低於100年、96年、95年，5月居第12位，6月居第7。

鏢旗漁業作業期間僅有3~4個月左右，約在10月至翌年1、2月間，因此漁船皆為兼營性質，在非漁期時則從事火誘網、刺網、釣具等漁業，本季（101年4~6月）調查期間並非貢寮地區鏢旗魚之漁期，無漁獲資料。

飛魚卵漁業以5~7月為漁期，本季（101年4~6月）調查期間貢寮地區無標本戶漁船從事飛魚卵作業，無漁獲資料。

本季（101年4~6月）貢寮地區九孔養殖標本戶的產量與產值，分別為3,507公斤及292.2萬元，均介於歷年之產量（84~77,426公斤）及產值

（150,500~108,000,000元）間，而鮑魚養殖標本戶的產量與產值，分別是3,600公斤及311.0萬元，與歷年（99~100年）之產量（210~6,180公斤）與產值（230,000~5,680,000元）差異不大。由標本戶單位面積的產量來推估，101年4~6月間貢寮地區九孔養殖標本戶皆處於放養階段，僅有二戶較為例外，有採收九孔，故不進行總產量與總產值推估；鮑魚的總產量為11,122公斤，總產值約為960.8萬元。本季（101年4~6月，農曆3月11至5月12日）已有部分的養殖戶開始養殖九孔，放養九孔的標本戶其仔苗來源為日本的公貝與台灣的母貝雜交的仔苗放養。而養殖鮑魚的養殖戶本季（101年4~6月）有採收，採收規格大小大約是1斤13~20粒左右。

13.海象調查

根據CTD調查結果顯示，本季各測站之表層水溫約在20.2℃~24.9℃之間，與100年同期之監測結果（19.1℃~26.5℃）比較差異不大；在水層垂直水溫分佈情況方面，除5、6月份A10、B8、B10、D6、D8、D10、F8、F10等測站之上、下水層溫差約在4.0℃~7.5℃左右，其餘各測站並無明顯斜溫層。本季各測站之鹽度介於33.5PSU~34.0PSU之間，與100年同期（33.6PSU~34.5PSU）及上季（32.8PSU~34.5PSU）相較差異不大；此區域之水體混合狀況大致良好。

本季浮標流況大致上呈現漲潮西北流、退潮東南流之流況，少數浮標則呈現流向較不穩定；至於浮標之平均流速則呈鹽寮灣內流速較鹽寮灣外流速為低的情形，本季浮標流向及流速與歷年同期、上季及歷年相近。

在沿岸潮位調查方面，本區潮汐係以半日潮為主，本季4~6月份之平均潮位介於18~60公分（相對於基隆港平均海平面），平均潮差介於52~56公分，就台灣地區而言，屬潮差較小之區域。另外，本季最高潮位87公分，發生於6月5日6:20。100年同期（100年4~6月）平均潮位約在9~28公分（相對於基隆港平均海平面），平均潮差為51~56公分，最高潮位為74公分，本季平均潮位較去年同期略高。而上季（101年1~3月）之平均潮

位約介於5~15公分（相對於基隆港平均海平面），平均潮差介於54~58公分，最高潮位為71公分。本季與100年同期、上季調查結果比較差異不大。

在沿岸水溫之調查方面，自92年8月份起，配合潮位塔遷移至進水口防波堤邊觀測，該處水深6公尺，儀器深4公尺。本季4~6月份測得月平均水溫分別為119.8℃、20.5℃及25.1℃，其平均水溫較上季（101年1~3月）之平均水溫（15.7℃~17.7℃）略高，但與100年同期（100年4~6月分別為18.6℃、21.9℃及24.8℃）差異不大。

14.景觀與遊憩活動調查

(1)遊客門票數調查

鹽寮海濱公園及福隆海水浴場之遊客數與門票調查自83年9月開始執行，自86年7月始增加龍門公園，歷年來門票數統計結果如表3.1-51所示；大體而言，若不考慮公園或浴場因故關閉此類特殊原因，遊客人數均以夏季（6~10月）較高，而以11月至3月之遊客數較低。

鹽寮海濱公園因受到85年7月底賀伯颱風侵襲，造成園內設施破壞迄89年農曆春節後方重新開放，以夏季遊客人數最高，除屬夏季適合海邊活動而吸引較多人潮外，氣候條件（如降雨）或有無舉辦活動亦為主要影響因素之一。如90年8月間舉辦「棕櫚鹽寮海岸」活動及91年7月舉辦砂雕活動，吸引大量遊客前來，單日遊客人數達1、2萬人；此外，於颱風季節受氣候及園區關閉影響，門票數大為降低，如91年9月因辛樂克颱風來襲，於91年9月5日~91年9月21日間園區關閉，未對外營業，92年11月10日再度關閉整修，皆為影響遊客門票數之主要原因。本季各月遊客總人次介於259~527人次/月之間，與100年同期（335~1,028人次/月）減少，較上季（88~233人次/月）多有成長，惟介於歷年遊客總人次在12~23,506人次/月之間。

龍門公園為86年第3季新增之遊客門票數調查點，為一露營、烤肉區，主要遊客來源為機關團體舉辦之休閒活動。本季各月遊客總人次

在3,502~4,497人次/月之間，較100年同期（2,311~4,076人次/月）及上季（817~2,348人次/月）遊客總人次相較增加。歷年遊客門票數介於193~30,143人次/月之間

福隆海水浴場歷年遊客門票數則在279~805,316人次/月之間，為東北角地區重要之遊憩活動景點，每年夏季為其活動旺季，若舉辦大型活動（如海洋音樂祭、砂雕活動）則會吸引數萬~數十萬人次前往。本季各月遊客總人次在在11,760~137,621人次/月之間，因受天氣不良影響，各月遊客人數遊憩景點遊客數均較100年同期（12,726~167,363人次/月）減少，但較上季（1,140~2,564人次/月）遊客總人次增加。

鹽寮海濱公園位於台2省道旁，在此停留之遊客多為路過東北角地區，在此稍作休息的遊客；龍門公園除受季節及氣候影響外，近年來亦受民宿增加，救國團活動人數減少影響；福隆海水浴場除受季節及氣候影響外，其每年舉辦之沙雕活動及海洋音樂祭亦為影響遊客數之主要原因（海洋音樂祭當月之遊客數為平常之數十倍）。此3個遊憩區皆以夏季、天氣晴朗之假日或假期遊客人數較多。

⑵核四施工對遊憩與景觀品質之影響

根據現場調查人員之觀察，各觀景點中第1觀景點於91年7月起施工面擴大，93年7月起更因大樓興建及施工作業日益頻繁，觀景品質降低；第4觀景點及第5觀景點（西向）自90年2月復工後於1、2號機廠址之施工作業益加頻繁，而自95/8起因廠房共同通風塔施工完成，導致結構物佔視覺面積加大，而致觀景品質略微降低，第5觀景點（北向）於88年7月起因重件碼頭海域施工等均造成景觀品質之影響；第3觀景點自90年10月進行進水暗渠工程，因大面積之開挖整地作業，景觀品質變化程度最大，由原99年9月前之「中自然完整性」降為「低自然完整性」，已加設台2省道旁之圍籬並於堆置土方上植草綠化，其植生綠化成效逐年呈現，目前已回復至「中自然完整性」，雖受99年9月起之台二省道改道工程施工開挖及路面鋪整影響，景觀略受影響，惟整體景

觀品質並未明顯惡化，仍維持在中自然完整性；7號觀景點自89年第3季起因生水池工程施工，可見到山坡上裸露之地表，使評分降低，89年第4季起廠區已加強植生復育工作，而自96年5月起再度進行開挖作業，可見到山坡上裸露之地表，景觀品質略微下降；其餘觀景點附近無工程開挖故尚無影響（詳表3.1-52）。本季與100年同期相較，各觀景點之景觀變化差異不大。

⑶核四景觀美化改善措施

為減低核四施工對附近遊憩與景觀品質之影響，本工程施工同時亦著重景觀美化工作之推動，針對施工活動最直接影響之鹽寮海濱公園，工區於台2省道及各施工區已規劃相關美化工程及於假日提供停車場供遊客使用等方式予以改善。在美化工程部分，目前於澳底2號橋以北綠帶已於87年10月8日全部竣工，89年11月16日撫育期滿，90年2月19日驗收完成並併入年度廠區植栽養護工程；進水口區與鹽寮海濱公園地界多層次綠化工程亦於89年7月全部竣工；台2省道亦已於90年12月設立美化圍籬以減緩用路人及鹽寮海濱公園遊憩民眾之視覺衝擊。

至於台2省道澳底至龍門社區（舊社）段及鹽寮海濱公園因可見廠區內超高型施工機具及廠房共同通風塔，視覺衝擊較大之區域，工區目前已配合「公路局台2線鹽寮段新闢工程細部設計」之路線、高程設計，辦理綠帶二期(澳底二號橋以南段)之規劃設計中，並於台2線鹽寮段新闢工程完工後發包施工，屆時將沿台2省道施築一道15~50公尺寬之高坡緩衝綠帶，以有效改善台2省道沿線觀景點之視覺景觀。

15.海域漂砂調查

自94年第2季起調整海域漂砂調查方式後，另自99年第2季起規劃5個捕砂施測點，新增編號S4與S5位於較外海水深約10~11m等深線處，由北而南分佈。以八方向捕砂器搭配海流監測，以掌握海底底質受波浪、水流作用，沿底床附近運動時之各方向輸砂量，並藉施測當時所得之主要輸砂方向，幫助推估調查區域內之漂砂優勢方向。自94年第2季起至本季

（101年6月）已完成29次調查，歷次砂樣調查之綜合歸類比較如表3.1-53，平均粒徑比較如表3.1-54，運動輸砂的情況如表3.1-55所示。本季（101年6月）各測站8方向之粒徑分佈趨勢差異不大，各測站均為細砂，平均粒徑大小在132.1~ 249.9μm之間。

本季（101年6月）各測站之進砂速率在近岸測站方面，進砂量以S2有向北及向南遞增之趨勢，以S1測站之進砂量最大，S1進砂速率在4.26~11.01 cm^3/min之間，S2進砂速率在2.49~8.06 cm^3/min之間，S3進砂速率在2.69~11.33 cm^3/min之間，輸砂主要以垂直岸線方向運動為主；而在輸砂趨勢上，除S2測站為垂直岸線向西南外，S2及S3測站主要以離岸線東向為主。在外海測站方面，S4進砂速率在4.98~10.29 cm^3/min之間，S5進砂速率在4.52~7.93 cm^3/min之間，輸砂主要運動方向均以離岸為主。整體而言，本季（101年6月第2季）採樣時天候狀況良好，進砂速率較上季（101年3月）為小（詳表3.1-55）。在最大淨輸砂趨勢上，本季、上季及100年同季均以離岸趨勢為主。

自94年第2季至101年第2季已完成29次之海域漂砂調查，在主要輸砂來向各方向記錄之次數上，以各測站分別進行統計分析，S1測站輸砂運動方向主要來自東方，記錄次數為14次，其次是東北方與西方，記錄次數分別為11次及10次，漂砂運動方向以垂直岸線為主；S2測站輸砂運動方向主要來自西南方，記錄次數為16次，其次是東北方與西方，記錄次數各為12次與9次，漂砂運動方向主要以垂直岸線為主；S3測站輸砂運動方向主要來自西南方，記錄次數為14次，其次是東北方，記錄次數為9次，除南方為0次外其餘各方向之記錄次數差異不大，漂砂運動方向以垂直岸線為主。相關統計成果如表3.1-56、圖3.1-37與圖3.1-38所示。

在各測站之最大淨輸砂方向記錄次數上，以各測站分別進行統計分析，S1測站最大淨輸砂方向主要堆積在西方及西南方，記錄次數各為8次，其次是東南方，記錄次數為7次，漂砂向岸堆積之趨勢較大；S2測站最大淨輸砂方向主要堆積在東北方及東方，記錄次數各為7次，其餘北方與東南方，記錄次數各為5次，漂砂向外海推移之趨勢較為明顯，其次是平行

岸線方向；S3測站最大淨輸砂方向主要堆積在南方，記錄次數為8次，其次是北方、東南方與東北方，記錄次數各為5次，漂砂向福隆海水浴場推移之趨勢略大於向外海方向。相關統計成果如表3.1-57、圖3.1-39與圖3.1-40所示。

以各調查季節分別進行統計分析，以調查海域而論，在主要輸砂來向3測站各方向記錄之次數統計上，歷年第1季輸砂運動方向主要來自東北方與西南方，記錄次數各為7次，其次是東方與西方，記錄次數各為6次，漂砂運動方向以垂直岸線為主；第2季輸砂運動方向主要來自東北方，記錄次數為11次，其次是西南方，記錄次數為9次，漂砂運動方向以垂直岸線為主；第3季輸砂運動方向主要來自西南方，記錄次數為10次，其次是西方與東北方，記錄次數各為7次與6次，漂砂運動方向以垂直岸線為主；第4季輸砂運動方向主要來自東北方，記錄次數為10次，其次為東方9次，西南方則為8次，漂砂運動方向以垂直岸線為主。相關統計成果如表3.1-58、圖3.1-41與圖3.1-42所示。

在最大淨輸砂方向3測站各方向記錄之次數統計上，歷年第1季最大淨輸砂方向主要堆積在東南方，記錄次數為6次，其次是東北方，記錄次數為5次，西南方為4次，漂砂向外海推移之趨勢較大；第2季最大淨輸砂方向主要堆積在東方，記錄次數為7次，漂砂向外海推移之趨勢較為明顯；第3季最大淨輸砂方向主要堆積在南方，記錄次數為5次，其次是東南方，記錄次數為4次，其餘各方向次數約略相等，記錄次數最多3次，其次為2次，漂砂向外海推移之趨勢略大；第4季最大淨輸砂方向主要堆積在西南方，記錄次數為5次，其次北方、東南方與西北方，統計次數各為4次，其次東北方與西方則為3次，漂砂以向岸推移之趨勢為主，其次是平行岸線方向。相關統計成果如表3.1-59、圖3.1-43與圖3.1-44所示。

綜合而言，依歷次漂砂調查之統計分析顯示，各測站之漂砂運動方向主要均以垂直岸線方向運動為主，S1測站長期調查結果最大淨輸砂趨勢以向岸為主，S2測站則以離岸為主，S3測站則以向海水浴場及平行岸線方向推移為主；依季節而論，第1、2季最大淨輸砂方向以向外海推移之趨勢為主，第3季漂砂在平行岸線與離岸推移趨勢差異不大，第4季以

向岸推移之趨勢為主，其次是平行岸方向。各測站漂砂之歷季表現，S1測站各季大致以向岸堆積之趨勢為主；S2測站在第1~3季大致上為向外海推移之趨勢，在第4季時向岸與平行岸線趨勢不明顯，平行岸線趨勢略大；S3測站在第1、2季時，為向外海推移之趨勢，第3季時，為平行岸線向南推移之趨勢，第4季時向、離岸趨勢不明顯。

由歷年底質粒徑樣品分析結果，本調查區內最主要砂源為雙溪溪口，漂砂方向主要往北，愈往東北受砂源之影響愈小，影響範圍往北約達石碇溪口南側、核四進水口防波堤附近海域，石碇溪以北幾乎不受雙溪砂源之影響。石碇溪本身因輸砂量較雙溪少，且附近礁岩區較淺，故其輸沙受波浪作用後，較難停留於此礁岩區。

漂砂方向主要受季風、潮流及颱風等因素影響，於冬季因持續受東北季風影響，導致粒徑分佈往沿岸方向漂移，至夏季西南風逐漸盛行，而使漂砂方向轉往東北東方向漂移；惟於7~9月之颱風季節，常因颱風之豪雨及波浪作用，而使河水挾帶大量砂原至外海，導致雙溪河岸之砂量有流失之虞。

16.海岸地形調查

(1)地形變化

為比較本季地形變化特性，特將本季（101年6月）與上季（101年3月）、去年同期（100年4月）及海事工程施工前（87年6月）之地形變化做比較，其水深-15,-10,-5,-2,0,+2,+5,+10,+15m等深線繪製如前圖2.16-3、圖2.16-3、圖3.1-45至圖3.1-47所示，並利用侵淤圖（圖3.1-48至圖3.1-51）顯示其地形變化，砂量侵淤量變化如圖3.1-52，計算量如表3.1-60。由各等深線分析圖可知，自94年第3季以來，於石碇溪以北之沿岸地形因為礁盤地形，所以並無太大變化，只有少許的侵淤互現之現象；而核四進水口防波堤區內除疏濬外，其地形變化亦較小，但在南北堤堤頭附近則依不同季節而有所變化。

陸域部份，本季(101年6月)與上季(101年3月)相較(詳圖2.16-3)，於石碇溪南岸至進水口北防波堤間之灘線高程+2m~0m線間有侵蝕情形；於鹽寮海濱公園之灘線高程+5m~+2m線間大多有淤積情形，高程在0m~+2m間則有侵蝕情形；大岩石以北至鹽寮海濱公園間高程線表現大致相同，灘線略向外海推移，植被以下沙灘坡降較上季略為陡峭，砂量體積增加；大岩石以南至福隆海水浴場以北（X-46附近，詳附錄IV.10-1圖）之間，在+5m~2m間為淤積情形，+2m~0m間亦呈現淤積情形，顯示此段海岸侵淤特性表現與鹽寮海濱公園至大岩石間大致相同，植被稜線向岸側退縮，植被以下灘面坡降較上季略為平緩，沙灘面積增加；福隆海水浴場沙灘向東南略為推移，河道略窄，北側之0m線向外海推移，南側則向河道略為推移，沙灘面積較上季增加。

表3.1-60及圖3.1-52為鹽寮海濱公園附近砂量變化趨勢圖，由該圖表顯示，隨季節變遷及颱風侵襲等因素影響，沙灘砂量呈累積/流失等互現情形，本季在西南季風持續作用中，陸域整體砂量有淤積之情形。陸域部份砂量（詳圖3.1-52所示A+B區，高程0~+3m）在西南季風持續作用下，較上季（101年3月）約增加44,569立方公尺，陸域整體平均高程增加，其中大岩石以北陸域高程較上季增加約8cm，大岩石以南陸域高程則約增加約27cm。整體而言，陸域高低潮位線落差並不明顯，高程在+5m至0m間坡降較上季（101年3月）平緩，稜線與灘線大多向外海推移，沙灘面積增加；雙溪河道於N26以南至內河大橋間寬度差異不大，沙嘴向東南方推移約50m。

海域部份，本季（101年6月）與100年11月相較（詳圖2.16-4），於鹽寮海濱公園0m~-10m線間均以淤積情形為主；鹽寮海濱公園至大岩石間，0m~-2m間以淤積情形為主，-2m~-10m間則侵蝕情形明顯，灘線向外海推移；大岩石以南至N21舊社附近，北段部份0m~-2m線間均以向外海推移為主，有淤積之情形，而在-3m~-10m間，均呈現侵蝕現象；N21舊社以南至N26福隆海水浴場以北（X-46附近，詳附錄IV.10-1）之

間，表現與大岩石以南至N21舊社間相同；N26以南至福隆海水浴場雙溪河口附近，表現亦與前段相同，雙溪沙嘴向東南推移。

表3.1-60及圖3.1-52為近岸砂量變化趨勢圖，由該圖表顯示，隨季節變遷及颱風侵襲等因素影響，沙灘砂量呈累積、流失等互現情形，本季在西南季風持續作用下，海域砂量在0m~-3m間呈現淤積之情形，-3m~-5m間則呈現侵蝕之情形。海域近岸部份砂量(詳圖3.1-52所示C+D區，高程0~-5m）在季節風作用過後，較100年11月侵蝕約121,152立方公尺，高程平均約降低16cm，C區0~-3m間海域較100年11月淤積約35,663立方公尺，高程平均增加約8cm；D區-3~-5m間海域較100年11月侵蝕約156,815立方公尺，高程平均約降低47cm。近岸海域坡降較100年11月有較大變化。

自上季（100年11月）至本季（101年6月）所調查的海陸域地形整體趨勢，於澳底漁港至石碇溪以北之海岸地形幾乎無太大之變化，而於鹽寮海濱公園至福隆海水浴場以北，陸域砂量總體積為淤積狀態，海域砂量總體積則呈現侵蝕情形，海灘灘面坡降較上季略為陡峭，近岸海域坡降則較100年11月有較大變化。

颱風可能對本區之海域漂砂運動產生較大影響，亦可能在颱風時期增加雙溪之逕流量，將雙溪之砂源帶入海中；另雙溪河道亦可能在氣候之作用下，成為福隆附近漂砂之堆積處與輸出來源。歷年行經本區域之颱風明顯造成福隆沙洲與河道之變遷，自99年以來未有明顯造成本區域影響之颱風，受季風之交替作用後，沙灘與近岸海域侵淤變化表現相對較為明顯，而侵襲本區域之颱風對整體漂砂侵淤量則產生較大之變化趨勢。

雙溪河口灘線一年來之變化比較發現（參考圖2.16-5），在季風風浪作用下，福隆海水浴場沙嘴大致以東北-西南向擺盪遷移，自97年第4季以來，沙嘴位置已大致回復至97年8月辛樂克颱風來襲前之範圍。自

100年11月以來，河口沙嘴向東南推移約75m，本季河道寬度縮減，在最低潮時雙溪出海口河道寬約為20m。

本季與100年同期相較（詳圖3.1-52、表3.1-60），整體陸域（A+B區）砂量增加約94,188立方公尺，平均高程增加約45cm；本季與87年6月（海事工程施工前）相較（詳圖3.1-52、表3.1-60），整體陸域砂量則增加約56,906立方公尺，平均高程增加約27 cm，顯示目前陸域總砂量與87年6月施工前增加。整體近岸海域部份（C+D區），本季與87年6月（海事工程施工前）相較，砂量增加約29,840立方公尺，平均高程增加約4cm；自87年6月(海事工程施工前)以來(詳圖3.1-52、表3.1-60)，整體近岸海域砂量則增加約188,600立方公尺，平均高程增加約25cm。依上列之比對數據顯示，目前陸域總砂量與87年6月施工前略有增加，近岸海域總砂量亦有增加。

⑵沙灘定位樁調查

福隆內河大橋之第1橋墩與大岩石岸側1號定位樁於92年第1季設置，大岩石2、3號定位樁則於92年第2季設置，鹽寮1~3號定位樁於96年第2季完成設置，另於99年第1季增設內河大橋第2橋墩、福隆南側河道救生樁、舊社1號樁（北側）與舊社2號樁（南側）、大岩石救生樁與鹽寮4、5號樁等7處做為觀測之定位樁，於鹽寮、大岩石、舊社、福隆等4區共計設置14處定位樁。

自各觀測樁設置以來，定位樁觀測結果（表3.1-61及圖3.1-53）顯示，福隆內河大橋之第1橋墩定位線高程累積增加約49cm，福隆內河大橋之第2橋墩定位線高程累積降低約45cm，福隆救生樁定位線高程累積尚無變化；舊社1號樁（北側）高程累積降低約107cm，舊社2號樁（南側）高程累積增加約49cm。在大岩石附近之定位樁，靠岸測之大岩石1號樁高程累積下降約23cm，靠外海之大岩石3號樁高程累積增加約221cm，中間之大岩石2號樁則高程累積增加約88cm，大岩石救生樁程累積增加約40cm；在大岩石附近之定位樁，於本季內、外灘高程增加。

至於鹽寮公園附近之鹽寮1號樁與鹽寮2號樁，近幾次之持續觀察結果岩盤均已裸露，附近灘面高程本季略有下降，鹽寮3號樁則略有增加，顯示鹽寮溪以北之沙灘在不受劇烈天候影響下，大致應已趨於穩定；鹽寮1、2號樁，歷次高程累積下降分別為76cm與42cm，鹽寮3號樁歷次高程累積增加11cm；鹽寮溪以南之鹽寮4號樁歷次高程累積增加約12cm，而鹽寮溪以南與大岩石中間之鹽寮5號定位樁歷次高程累積亦增加約8cm。

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

本季（101 年 4~6 月）各項環境監測，包括氣象觀測、空氣品質監測、噪音與振動監測、交通流量監測、河川水文監測、河川水質監測、廠區水質、地下水監測、河域生態監測、海域水質監測、海域生態監測、漁業調查、海象調查、景觀遊憩調查、海域漂砂調查及海岸地形調查等 16 項，其中石碇溪部分測站之有機污染潛勢較高，依據多次現勘結果發現石碇溪沿岸有養殖、畜牧及生活污水等污染源排入，為主要之背景污染源，故推測石碇溪水質主要是受此類污染源所影響。

本季超出管制或未符合參考標準，或與以往監測結果較有差異之項目包括噪音、雙溪河川水質、地下水及海域水質等，茲就上次及本次監測結果處理情形說明如表 3.1-62 及表 3.1-63。

表3.1-1 核四施工環境監測歷年空氣品質總懸浮微粒監測結果

單位:μg/m³

測站	監測地點													
	澳底國小		龍門社區		貢寮國小		福隆海水浴場		川島養殖池		石碇宮		貢寮焚化廠入口旁之民宅	
時間	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值
84年1月	57	91	23	32	37	55	51	66	30	42	40	54	149	173
84年2月	66	77	80	98	86	91	32	57	46	57	88	103	48	59
84年3月	117	149	73	87	60	75	93	115	50	64	93	113	191	286
84年4月	77	102	56	93	94	155	69	78	66	87	70	100	112	120
84年5月	95	184	31	48	30	48	52	56	44	56	49	74	66	85
84年6月	26	29	55	71	68	78	168	368	47	54	84	117	123	130
84年7月	45	53	81	95	91	141	54	85	31	34	46	58	91	95
84年8月	31	37	24	28	21	25	37	44	12	14	41	42	93	115
84年9月	55	67	33	41	32	42	30	32	59	81	82	93	151	211
84年10月	83	98	105	117	53	54	92	125	41	41	73	92	105	117
84年11月	82	121	70	118	49	73	64	75	43	53	110	213	148	177
84年12月	80	146	56	72	28	42	96	134	51	93	79	107	126	194
85年1月	84	152	49	51	38	46	57	70	49	90	42	59	79	116
85年2月	82	88	67	105	61	85	40	50	46	74	137	179	145	176
85年3月	52	59	38	42	25	42	51	81	75	116	57	83	78	105
85年4月	48	61	42	78	40	44	57	65	32	35	37	42	74	103
85年5月	89	108	104	134	61	101	121	217	34	46	70	77	120	220
85年6月	89	57	104	36	61	42	121	111	34	37	70	79	120	97
85年7月	42	50	27	31	32	58	113	171	20	24	61	68	62	66
85年8月	42	75	47	63	69	80	113	125	27	36	62	69	46	48
85年9月	68	86	99	151	39	53	154	304	29	39	44	54	87	101
85年10月	53	82	68	84	33	39	67	123	33	42	61	71	56	60
85年11月	86	110	116	121	30	50	121	174	51	67	94	105	106	125
85年12月	110	177	82	100	88	91	152	228	77	104	137	152	83	93
86年1月	43	66	49	92	27	37	56	69	62	99	74	84	78	107
86年2月	69	92	43	51	28	40	68	106	23	27	39	40	56	62
86年3月	35	41	34	39	48	55	79	137	49	58	55	61	85	112
86年4月	76	89	80	104	64	74	145	185	60	70	83	102	71	76
86年5月	61	67	49	54	29	36	72	90	51	68	57	66	56	83
86年6月	38	42	43	57	63	76	28	37	40	68	49	60	50	63
86年7月	38	49	20	24	40	47	58	76	29	33	49	54	51	54
86年8月	135	184	30	35	47	49	21	24	36	40	57	66	28	30
86年9月	90	115	52	58	52	58	65	110	49	60	73	76	46	59
86年10月	54	80	73	78	84	90	104	131	44	53	51	62	54	61
86年11月	102	123	51	61	52	65	83	98	30	36	69	75	96	116
86年12月	98	124	58	73	29	34	43	49	34	41	62	81	73	93
87年1月	70	77	40	67	40	47	66	95	58	86	28	33	75	105
87年2月	99	113	33	56	34	44	56	65	31	42	38	51	124	128
87年3月	65	89	60	82	26	29	55	63	32	42	79	100	80	102
87年4月	95	137	42	75	39	46	25	27	39	61	89	130	46	52
87年5月	34	37	46	70	36	45	64	71	26	30	37	46	37	41
87年6月	44	61	29	34	51	65	22	24	32	45	57	96	43	45
87年7月	26	42	32	36	49	52	44	43	19	28	85	99	113	160
87年8月	32	39	26	29	34	41	52	80	32	40	60	72	76	112
87年9月	29	32	73	84	66	78	44	61	28	30	53	59	58	74
87年10月	42	48	41	64	34	42	18	21	46	58	89	129	44	78
87年11月	146	176	53	63	33	33	40	44	40	54	69	94	139	148
87年12月	89	104	106	136	44	80	88	93	82	135	118	181	75	93
88年1月	132	176	75	103	56	109	68	120	31	38	102	174	66	71
88年2月	130	156	130	176	45	69	56	72	100	169	90	112	139	198
88年3月	62	75	49	61	38	43	47	63	33	44	54	61	52	74
88年4月	79	105	88	119	66	80	110	139	76	90	58	82	95	205
88年5月	56	68	38	41	37	39	33	52	44	53	76	107	59	254
88年6月	60	61	36	42	37	39	47	49	49	56	70	92	43	51

表3.1-1 核四施工環境監測歷年空氣品質總懸浮微粒監測結果（續1）

單位:μg/m^3

測站	監測地點													
	澳底國小		龍門社區		貢寮國小		福隆海水浴場		川島養殖池		石碇宮		貢寮焚化廠入口旁之民宅	
時間	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值
88年7月	52	86	38	43	42	48	25	32	44	49	67	92	58	60
88年8月	46	55	25	29	24	28	25	29	33	34	71	80	36	41
88年9月	35	40	27	34	45	52	⊏	⊏	65	69	55	60	61	68
88年10月	64	90	74	83	56	80	46	76	27	29	76	99	99	104
88年11月	66	72	37	43	56	57	67	71	59	69	93	109	76	99
88年12月	116	139	65	82	76	79	49	56	75	85	101	114	80	94
89年1月	-	-	-	-	40	52	70	84	69	79	165	211	154	191
89年2月	-	-	-	-	63	92	63	80	73	100	52	68	50	72
89年3月	-	-	-	-	59	67	113	196	80	107	60	83	74	115
89年4月	-	-	-	-	56	62	83	120	108	163	72	104	86	127
89年5月	-	-	-	-	71	107	85	136	58	88	91	142	96	141
89年6月	-	-	-	-	33	35	37	38	25	29	60	66	41	50
89年7月	-	-	-	-	53	114	27	29	29	36	89	118	41	47
89年8月	-	-	-	-	28	29	29	31	28	36	36	41	57	63
89年9月	-	-	-	-	51	63	30	35	43	48	49	61	46	55
89年10月	-	-	-	-	50	89	38	47	26	30	42	52	52	58
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	-	-	-	-	26	39	41	50	39	46	54	74	48	63
90年3月	-	-	-	-	58	76	67	113	135	166	152	193	115	150
90年4月	-	-	-	-	45	52	59	71	19	22	39	46	37	50
90年5月	-	-	-	-	30	37	61	76	38	42	40	44	52	55
90年6月	-	-	-	-	22	30	30	36	28	32	49	65	25	34
90年7月	-	-	-	-	37	44	21	26	32	36	52	61	23	26
90年8月	-	-	-	-	23	25	35	48	39	47	85	104	61	63
90年9月	-	-	-	-	32	34	116	153	37	42	80	83	57	63
90年10月	-	-	-	-	34	42	96	141	47	61	88	125	123	148
90年11月	-	-	-	-	51	61	100	119	37	47	112	123	86	90
90年12月	-	-	-	-	29	41	93	129	94	122	54	77	105	133
91年1月	-	-	-	-	10	10	83	107	62	117	31	41	58	68
91年2月	-	-	-	-	35	39	98	114	41	52	84	145	84	102
91年3月	-	-	-	-	75	129	73	111	55	73	145	231	65	76
91年4月	-	-	-	-	32	43	40	44	101	139	59	85	116	165
91年5月	-	-	-	-	23	33	30	36	47	59	72	86	41	45
91年6月	-	-	-	-	36	46	39	42	58	63	51	80	88	103
91年7月	-	-	-	-	46	49	39	56	36	40	77	82	61	95
91年8月	-	-	-	-	29	33	20	21	23	31	41	54	32	40
91年9月	-	-	-	-	34	37	21	23	27	40	71	75	48	76
91年10月	-	-	-	-	60	78	37	48	71	89	114	152	100	123
91年11月	-	-	-	-	51	63	75	83	63	116	69	86	134	162
91年12月	-	-	-	-	43	61	62	75	54	66	82	108	71	80
92年1月	-	-	-	-	40	83	77	133	51	88	74	123	90	151
92年2月	-	-	-	-	37	48	54	86	48	64	72	108	73	115
92年3月	-	-	-	-	47	71	66	95	32	45	83	100	61	88
92年4月	-	-	-	-	60	98	75	106	47	54	84	94	76	83
92年5月	-	-	-	-	26	29	57	68	35	37	87	112	38	43
92年6月	-	-	-	-	38	52	28	31	35	41	65	92	52	58
92年7月	-	-	-	-	29	31	28	35	34	36	67	93	55	62
92年8月	-	-	-	-	37	45	37	45	19	25	53	58	30	34
92年9月	-	-	-	-	25	29	35	66	25	30	88	100	23	29
92年10月	77	130	77	130	53	70	74	86	39	62	59	70	128	151
92年11月	58	96	58	105	44	59	61	82	22	26	45	58	42	55
92年12月	79	138	74	136	69	126	57	104	28	46	109	137	96	123

表3.1-1 核四施工環境監測歷年空氣品質總懸浮微粒監測結果（續2）

單位:μg/m^3

測站	監測地點													
	澳底國小		龍門社區		貢寮國小		福隆海水浴場		川島養殖池		石碇宮		貢寮焚化廠入口旁之民宅	
時間	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值
93年1月	74	140	56	141	35	44	64	79	28	29	19	25	72	77
93年2月	81	169	74	171	68	127	32	41	49	85	55	84	127	198
93年3月	57	107	53	96	41	49	77	103	41	47	58	82	83	95
93年4月	85	123	73	127	43	60	66	80	66	66	91	108	75	91
93年5月	57	104	58	91	32	57	14	21	50	61	69	80	44	50
93年6月	63	99	57	105	50	60	33	34	15	15	68	79	27	32
93年7月	31	58	33	59	56	60	39	48	36	38	116	142	55	59
93年8月	57	76	57	76	17	27	35	39	27	36	69	80	42	48
93年9月	72	138	52	106	25	32	30	41	41	47	73	80	85	117
93年10月	73	143	73	124	78	90	94	98	56	77	73	75	89	119
93年11月	76	105	72	132	41	57	87	105	33	35	72	81	46	54
93年12月	76	123	67	132	32	45	47	74	52	80	104	136	116	123
94年1月	52	89	53	85	31	36	57	78	43	55	74	105	74	83
94年2月	48	109	49	107	34	41	46	49	39	46	47	54	54	86
94年3月	64	138	67	135	47	56	47	55	56	74	120	134	62	89
94年4月	77	147	65	129	31	37	48	59	59	67	113	124	91	132
94年5月	66	96	59	92	32	35	26	32	38	51	90	93	87	96
94年6月	66	113	57	97	25	30	38	44	40	42	102	121	70	74
94年7月	71	119	58	131	29	32	36	47	27	30	116	120	56	60
94年8月	61	91	52	77	22	23	22	22	45	52	97	144	45	68
94年9月	64	110	55	97	18	22	53	59	54	57	58	75	119	120
94年10月	85	146	76	137	17	19	96	126	59	68	34	37	95	105
94年11月	76	185	64	136	28	38	110	117	28	43	47	57	59	75
94年12月	76	170	55	116	47	72	47	78	86	100	92	118	62	69
95年1月	43	75	54	100	26	41	73	97	35	57	64	74	76	93
95年2月	64	148	53	101	16	20	36	43	33	36	47	62	95	99
95年3月	78	233	69	230	36	41	47	54	46	50	39	45	67	79
95年4月	77	180	71	167	34	35	102	133	42	51	130	138	68	90
95年5月	54	106	44	87	59	89	73	98	64	91	52	93	63	98
95年6月	41	66	42	61	52	85	30	43	38	42	80	117	82	127
95年7月	40	60	36	51	29	34	43	55	30	31	73	79	106	138
95年8月	47	95	53	97	25	37	53	73	17	18	85	96	67	109
95年9月	62	114	74	158	34	38	43	54	47	60	43	52	87	101
95年10月	72	137	96	178	55	64	45	57	62	83	49	63	66	91
95年11月	63	126	81	175	59	104	32	33	66	87	99	146	125	197
95年12月	52	102	74	125	37	63	53	78	40	36	27	74	57	74
96年1月	62	157	82	196	76	116	126	212	35	50	70	96	94	113
96年2月	60	123	76	140	58	68	76	139	44	60	139	147	60	70
96年3月	56	114	63	127	43	52	58	77	19	21	64	104	101	112
96年4月	69	143	57	114	52	68	42	57	38	42	80	88	41	44
96年5月	73	146	75	146	45	49	64	98	78	87	125	137	87	97
96年6月	44	66	53	72	36	49	30	34	28	35	71	87	53	74
96年7月	58	93	59	76	37	42	44	45	47	52	101	110	57	61
96年8月	49	77	53	100	35	43	19	25	34	44	63	73	37	44
96年9月	62	106	66	119	35	42	78	94	39	45	69	71	38	43
96年10月	82	109	88	121	34	41	111	130	30	31	78	85	56	65
96年11月	79	122	87	143	51	69	53	71	59	80	67	83	99	124
96年12月	86	188	92	186	34	65	42	60	52	70	68	112	95	114
97年1月	71	139	63	114	34	42	50	76	37	48	99	118	58	90
97年2月	72	134	72	135	42	65	86	176	67	82	119	151	89	107
97年3月	100	160	91	171	52	75	108	125	64	88	119	152	72	83
97年4月	86	141	66	127	31	43	42	64	33	51	105	128	54	65
97年5月	77	129	57	119	34	37	31	36	52	60	75	94	88	128
97年6月	62	92	47	72	25	26	24	27	35	50	65	85	39	49

表3.1-1 核四施工環境監測歷年空氣品質總懸浮微粒監測結果（續3）

單位:μg/m^3

測站	監測地點													
	澳底國小		龍門社區		貢寮國小		福隆海水浴場		川島養殖池		石碇宮		貢寮焚化廠入口旁之民宅	
時間	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值	平均值	24小時最大值
97年7月	68	127	57	119	24	33	34	35	53	61	56	71	54	84
97年8月	72	95	51	70	13	13	39	45	32	37	134	225	35	42
97年9月	71	114	61	104	28	34	33	45	39	42	90	95	55	60
97年10月	91	166	71	110	39	46	56	68	35	40	66	86	53	61
97年11月	85	119	61	99	16	21	39	53	33	35	104	142	49	55
97年12月	84	141	61	128	50	62	57	83	30	31	94	171	45	65
98年1月	81	167	66	96	16	18	96	153	42	60	66	114	102	127
98年2月	88	145	76	135	61	76	57	71	62	71	41	44	80	98
98年3月	89	170	76	149	42	49	117	172	78	110	142	151	76	95
98年4月	97	291	82	271	38	49	36	65	32	38	173	262	49	60
98年5月	86	121	76	99	37	45	48	52	69	84	75	86	48	60
98年6月	75	103	67	90	25	28	39	59	80	101	88	142	72	87
98年7月	60	74	63	79	30	34	26	35	30	35	48	54	39	46
98年8月	71	104	72	104	34	39	30	35	25	31	48	63	50	56
98年9月	78	115	75	99	28	42	36	51	41	50	66	93	70	91
98年10月	107	185	106	189	22	27	92	111	53	65	54	67	110	149
98年11月	84	123	72	116	23	31	42	48	71	93	111	135	54	61
98年12月	94	214	83	184	33	49	106	193	27	42	87	110	60	74
99年1月	90	149	85	204	40	51	92	176	53	70	62	105	76	137
99年2月	85	172	92	173	23	32	41	49	26	32	62	67	42	53
99年3月	106	748	120	754	51	54	44	47	29	39	117	176	94	109
99年4月	74	216	101	312	48	69	44	75	33	47	56	97	68	92
99年5月	77	114	80	144	39	52	46	49	33	40	80	104	59	66
99年6月	53	86	70	106	27	42	25	29	33	40	93	125	68	85
99年7月	60	84	54	76	30	36	27	32	26	29	76	81	53	72
99年8月	56	85	52	79	33	42	24	27	22	25	71	121	55	58
99年9月	59	84	52	84	33	38	23	26	25	35	56	82	44	53
99年10月	82	128	70	112	38	41	94	129	58	71	81	105	49	79
99年11月	87	151	71	146	18	20	29	35	34	56	76	101	69	90
99年12月	95	168	91	182	60	86	41	46	90	171	81	90	120	198
100年1月	63	99	61	97	30	52	58	77	44	79	54	81	49	65
100年2月	74	109	59	99	26	37	55	81	29	37	48	68	84	106
100年3月	89	143	72	121	57	99	51	88	71	99	81	125	70	74
100年4月	91	197	76	149	38	44	63	113	36	54	47	54	48	54
100年5月	67	116	54	95	23	26	64	70	32	46	30	34	55	70
100年6月	60	77	45	62	23	26	40	43	30	34	32	41	35	40
100年7月	57	87	41	66	17	19	42	46	25	27	26	33	29	32
100年8月	54	87	39	67	17	18	19	26	14	15	21	29	21	23
100年9月	76	115	63	100	22	31	70	84	59	66	52	65	42	63
100年10月	79	108	69	121	42	61	75	130	32	43	77	85	35	51
100年11月	67	98	56	92	38	48	29	46	42	57	28	40	34	61
100年12月	63	86	59	80	22	23	106	200	42	47	52	108	50	87
101年1月	73	100	60	93	29	37	38	58	17	20	48	63	40	57
101年2月	50	73	43	69	22	31	28	34	33	54	37	50	28	35
101年3月	73	168	62	138	40	45	113	195	21	29	56	72	32	47
101年4月	63	127	55	102	31	34	19	21	62	87	47	57	34	47
101年5月	57	94	50	81	34	46	48	60	34	38	42	61	22	26
101年6月	54	74	46	68	22	22	37	45	22	26	21	23	41	52

(1)空氣品質標準總懸浮微粒24小時值為250μg/m^3。

(2)"ㄈ"表受地震影響，電源中斷，陰影則表超出法規標準。

(3)"-"表示監測工作停止執行。

(4)澳底國小及龍門社區兩測站自88年5月起設置自動連續監測站，89/1~92/9總懸浮微粒暫停監測，92/10起再度開始監測。

表3.1-2 核四施工環境監測歷年空氣品質懸浮微粒監測結果

單位:μg/m^3

測站	監測地點					
	澳底國小			龍門社區		
時間	平均值	日平均值（最大值）	日平均值（最小值）	平均值	日平均值（最大值）	日平均值（最小值）
88年5月	54.6	76.8	35.6	36.6	53.2	16.9
88年6月	56.3	81.9	40.5	38.1	65.8	21.5
88年7月	56.4	73.7	46.3	38.8	59.3	15.1
88年8月	53.7	72.9	40.8	35.1	57.9	22.0
88年9月	56.9	88.0	36.8	40.3	72.6	22.2
88年10月	59.3	97.9	30.7	41.6	72.8	27.0
88年11月	64.7	92.3	42.7	46.6	78.5	27.4
88年12月	58.9	93.3	33.4	48.0	87.2	22.8
89年1月	52.4	93.9	29.0	49.6	99.1	22.6
89年2月	44.0	89.5	29.1	32.9	94.7	20.6
89年3月	-	-	-	-	-	-
89年4月	58.8	112.6	24.2	39.9	77.4	19.3
89年5月	63.0	93.5	35.4	34.2	47.2	25.7
89年6月	45.0	54.9	36.3	43.5	70.2	22.6
89年7月	41.0	57.6	27.9	36.7	60.0	21.4
89年8月	8.8	69.1	26.5	40.5	57.0	28.4
89年9月	57.5	71.6	45.9	47.5	67.6	29.4
89年10月	66.1	87.5	50.4	54.2	61.1	32.7
89年11月	36.8	58.4	15.7	51.8	94.8	26.7
89年12月	67.5	84.6	49.0	60.9	132.1	35.9
90年1月	72.4	106.0	39.4	52.2	75.6	29.9
90年2月	68.1	96.2	42.4	59.8	111.6	38.3
90年3月	74.0	96.5	60.8	75.4	121.5	38.8
90年4月	74.3	114.9	42.7	71.0	115.8	40.3
90年5月	82.3	155.7	49.1	57.9	113.9	29.6
90年6月	60.2	115.7	40.0	29.6	49.3	19.3
90年7月	64.2	91.6	39.3	34.8	51.9	21.4
90年8月	48.0	73.9	32.0	51.4	96.9	26.1
90年9月	77.8	97.4	42.7	50.8	71.4	17.3
90年10月	57.7	78.0	31.8	57.4	81.1	31.5
90年11月	66.5	87.4	45.3	61.6	86.3	43.0
90年12月	57.5	74.4	39.1	54.3	87.9	34.9
91年1月	68.1	98.7	45.3	44.7	85.4	22.9
91年2月	60.0	125.3	29.0	48.5	94.2	33.9
91年3月	69.2	100.8	48.8	51.5	86.1	30.4
91年4月	67.4	116.3	44.4	48.9	74.5	29.8
91年5月	47.5	65.5	35.6	55.5	88.2	32.3
91年6月	38.7	55.7	26.5	46.6	65.2	31.5
91年7月	46.6	93.0	28.4	41.9	67.8	19.7
91年8月	45.0	96.3	23.6	34.1	58.1	15.7
91年9月	53.2	83.3	29.1	39.7	72.3	10.9
91年10月	74.9	113.6	48.8	33.7	55.6	20.9
91年11月	64.3	107.1	32.8	46.1	74.3	17.1
91年12月	54.0	93.4	26.9	36.9	72.3	25.1
92年1月	49.3	93.3	24.1	51.6	80.5	19.7
92年2月	49.1	80.6	22.4	46.0	74.1	23.7
92年3月	59.6	100.5	36.9	46.3	89.4	20.2
92年4月	64.2	100.2	39.5	37.7	49.2	26.8
92年5月	53.7	94.3	33.6	46.9	86.3	22.7
92年6月	51.5	85.4	36.8	34.9	43.2	24.4
92年7月	44.2	61.5	31.6	46.1	67.3	32.0
92年8月	46.9	81.2	23.3	28.2	47.0	20.8
92年9月	50.7	87.8	28.1	43.8	73.0	21.8
92年10月	46.4	73.6	24.5	54.7	79.9	26.2
92年11月	37.5	69.1	23.8	53.3	87.2	23.5
92年12月	50.0	50.6	27.5	58.7	124.1	15.5

表3.1-2 核四施工環境監測歷年空氣品質懸浮微粒監測結果（續1）

單位:μg/m^3

測站	監測地點					
	澳底國小			龍門社區		
時間	平均值	日平均值（最大值）	日平均值（最小值）	平均值	日平均值（最大值）	日平均值（最小值）
93年1月	54.3	87.4	38.3	38.4	113.5	14.1
93年2月	68.8	121.3	23.8	50.0	128.3	21.6
93年3月	52.4	77.6	30.0	31.1	48.5	14.1
93年4月	72.2	129.2	37.5	49.7	77.8	26.4
93年5月	39.2	75.6	30.6	44.2	74.9	13.3
93年6月	37.8	62.9	28.8	39.3	63.8	20.7
93年7月	30.5	47.9	20.1	13.6	20.6	9.2
93年8月	42.0	59.1	17.9	40.1	72.2	16.8
93年9月	42.1	87.4	23.8	32.8	68.2	11.3
93年10月	63.0	113.6	34.9	29.3	38.5	19.8
93年11月	56.4	83.9	31.0	62.1	98.5	38.2
93年12月	48.5	58.9	25.2	57.2	103.6	24.5
94年1月	44.8	80.2	24.5	40.8	63.8	25.1
94年2月	45.5	89.1	23.7	29.8	45.7	13.0
94年3月	52.5	85.1	32.9	56.1	119.0	28.1
94年4月	64.6	116.9	33.5	35.4	74.7	15.9
94年5月	41.7	63.2	18.3	36.5	68.8	15.8
94年6月	35.6	47.9	21.6	23.9	38.3	9.4
94年7月	50.6	78.6	28.9	33.1	60.2	16.0
94年8月	38.2	50.9	21.3	23.9	37.4	10.6
94年9月	44.0	57.0	24.8	39.7	48.2	30.8
94年10月	77.8	109.7	43.0	64.1	118.0	21.9
94年11月	53.5	114.6	31.1	44.6	92.9	27.3
94年12月	55.8	96.1	20.8	45.8	83.4	13.8
95年1月	49.4	91.1	23.8	43.6	79.7	21.8
95年2月	45.9	75.5	29.3	48.4	71.7	14.9
95年3月	70.7	220.0	26.4	66.1	223.6	18.0
95年4月	82.8	133.7	33.6	95.2	191.2	27.8
95年5月	35.4	46.1	21.4	28.1	37.7	16.3
95年6月	28.8	39.3	20.9	30.8	41.3	24.7
95年7月	29.4	36.5	19.9	20.1	27.1	10.2
95年8月	40.5	77.4	20.2	36.0	69.8	12.6
95年9月	53.6	76.0	28.1	43.2	61.6	28.1
95年10月	62.4	119.3	32.4	50.2	113.9	16.4
95年11月	43.7	71.3	31.7	34.1	66.0	13.6
95年12月	52.2	90.3	30.2	55.5	91.7	35.5
96年1月	54.9	127.8	18.7	53.7	125.6	18.5
96年2月	45.1	97.0	21.0	41.5	103.5	17.1
96年3月	39.3	75.0	21.1	43.3	82.5	23.2
96年4月	48.8	121.2	14.8	41.4	103.1	12.6
96年5月	60.2	117.2	39.3	57.1	122.7	36.1
96年6月	30.3	52.9	13.3	35.0	54.3	21.6
96年7月	40.4	61.3	29.4	38.4	53.2	23.5
96年8月	35.0	41.6	29.1	32.4	49.7	22.2
96年9月	45.0	59.9	32.3	44.3	96.0	22.0
96年10月	57.8	78.6	44.2	55.3	85.7	21.4
96年11月	58.2	78.8	38.3	57.8	77.1	29.7
96年12月	61.5	149.4	40.8	53.0	141.5	31.5
97年1月	39.3	61.1	24.1	36.3	78.2	22.8
97年2月	47.5	71.2	27.8	43.9	61.4	24.1
97年3月	74.7	155.3	36.6	67.2	137.1	27.4
97年4月	65.0	110.3	35.1	53.4	115.8	19.9
97年5月	57.1	92.2	36.1	41.1	79.9	19.6
97年6月	45.3	73.2	31.4	32.4	57.8	20.3

表3.1-2 核四施工環境監測歷年空氣品質懸浮微粒監測結果（續2）

單位:μg/m^3

測站	監測地點					
	澳底國小			龍門社區		
時間	平均值	日平均值（最大值）	日平均值（最小值）	平均值	日平均值（最大值）	日平均值（最小值）
97年7月	55.0	91.6	32.0	48.8	90.2	22.2
97年8月	53.2	67.9	31.7	39.9	62.9	20.1
97年9月	48.8	74.3	24.4	39.8	74.3	17.4
97年10月	76.7	135.9	45.6	57.1	103.4	23.3
97年11月	66.4	106.3	45.1	58.4	96.9	27.2
97年12月	67.7	97.9	40.6	55.6	86.5	31.5
98年1月	60.2	106.1	34.1	49.3	78.9	24.9
98年2月	61.4	123.3	30.8	50.8	99.8	22.0
98年3月	73.7	134.1	33.6	59.0	120.1	21.4
98年4月	73.2	279.2	34.8	57.3	262.2	21.4
98年5月	63.9	89.5	38.1	49.3	65.9	21.8
98年6月	48.2	68.0	33.6	33.5	53.9	21.1
98年7月	46.6	58.9	30.5	34.2	49.0	19.8
98年8月	51.1	71.4	28.6	45.4	65.7	24.6
98年9月	55.9	80.7	39.0	50.8	71.5	24.5
98年10月	67.6	91.2	28.0	88.8	126.0	28.8
98年11月	55.4	97.5	28.3	54.6	101.6	27.2
98年12月	68.1	137.4	34.6	66.8	139.3	23.0
99年1月	73.1	119.9	33.8	65.0	134.4	24.1
99年2月	59.9	86.8	34.3	61.4	101.4	25.0
99年3月	51.4	77.4	20.6	48.9	80.7	14.5
99年4月	49.2	133.6	22.6	64.9	203.0	24.5
99年5月	63.7	96.2	40.7	49.9	83.7	17.7
99年6月	43.6	57.2	33.1	40.3	71.1	25.7
99年7月	45.2	60.8	22.8	34.4	45.9	19.0
99年8月	44.8	68.0	29.2	34.7	55.5	24.4
99年9月	42.4	56.4	25.5	35.0	56.4	17.2
99年10月	61.1	105.4	29.2	55.2	101.3	23.2
99年11月	69.0	124.3	33.6	51.2	114.9	23.4
99年12月	76.2	148.0	35.8	69.6	147.4	24.9
100年1月	47.0	76.5	28.1	48.3	77.1	23.7
100年2月	62.3	101.3	28.3	44.4	77.6	17.0
100年3月	66.6	104.7	45.8	43.8	69.6	20.9
100年4月	65.6	104.0	45.7	48.8	90.4	22.1
100年5月	50.4	98.9	23.3	39.6	72.7	15.3
100年6月	42.4	53.6	27.6	33.9	46.1	23.5
100年7月	39.0	70.9	30.5	29.6	54.4	18.3
100年8月	39.9	66.7	25.8	29.2	49.7	15.8
100年9月	62.8	98.0	39.9	54.5	88.9	33.9
100年10月	57.3	101.1	29.4	50.4	107.1	16.3
100年11月	43.4	72.8	24.0	39.9	72.7	17.1
100年12月	40.8	60.9	22.1	39.1	56.6	20.6
101年1月	56.8	79.7	27.1	45.4	69.0	17.1
101年2月	33.0	57.7	19.2	27.9	57.9	12.7
101年3月	51.6	132.6	18.0	45.8	115.6	15.8
101年4月	39.8	89.6	23.0	38.0	81.7	18.6
101年5月	46.1	81.3	27.5	36.3	69.1	15.0
101年6月	40.3	52.7	24.5	31.4	47.1	19.5

(1)空氣品質標準懸浮微粒日平均值為125μg/m^3。

(2)陰影部份表超出空氣品質標準。

(3)"-"表示監測工作停止執行。

(4)澳底國小及龍門社區兩測站自88年5月起設置自動連續監測站始開始監測懸浮微粒。

表3.1-3 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物日平均值(最大值)監測結果

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	0.020	0.028	0.015	0.031	-	-	-
82年9月	0.010	0.010	0.012	0.028	-	-	-
82年10月	0.007	0.013	0.015	0.011	-	-	-
82年11月	0.035	0.008	0.010	0.020	-	-	-
82年12月	0.022	0.004	0.013	0.023	-	-	-
83年1月	0.039	0.014	0.013	0.071	-	-	-
83年2月	0.022	0.022	0.024	0.051	-	-	-
83年3月	0.010	0.020	0.019	0.043	-	-	-
83年4月	0.028	0.016	0.020	0.045	-	-	-
83年5月	0.028	0.017	0.026	0.044	-	-	-
83年6月	0.021	0.018	0.020	0.053	-	-	-
83年7月	0.032	0.024	0.016	0.045	-	-	-
83年8月	0.010	0.008	0.023	0.017	-	-	-
83年9月	0.007	0.009	0.006	0.020	-	-	-
83年10月	0.029	0.017	0.021	0.038	-	-	-
83年11月	0.031	0.024	0.019	0.046	-	-	-
83年12月	0.015	0.025	0.023	0.049	-	-	-
84年1月	0.020	0.022	0.029	0.034	0.005	0.042	0.096
84年2月	0.024	0.020	0.030	0.030	0.020	0.043	0.039
84年3月	0.023	0.008	0.033	0.034	0.017	0.037	0.090
84年4月	0.024	0.019	0.021	0.032	0.020	0.027	0.044
84年5月	0.031	0.018	0.017	0.039	0.011	0.039	0.066
84年6月	0.022	0.018	0.023	0.048	0.020	0.039	0.078
84年7月	0.020	0.021	0.026	0.037	0.013	0.033	0.055
84年8月	0.025	0.019	0.012	0.027	0.010	0.021	0.050
84年9月	0.017	0.014	0.020	0.022	0.017	0.026	0.061
84年10月	0.020	0.017	0.014	0.029	0.011	0.037	0.027
84年11月	0.032	0.022	0.021	0.015	0.014	0.054	0.091
84年12月	0.028	0.023	0.028	0.023	0.014	0.040	0.028
85年1月	0.020	0.020	0.018	0.026	0.014	0.048	0.068
85年2月	0.019	0.020	0.024	0.015	0.015	0.053	0.042
85年3月	0.037	0.018	0.021	0.021	0.017	0.031	0.073
85年4月	0.049	0.033	0.025	0.031	0.033	0.022	0.141
85年5月	0.040	0.036	0.025	0.030	0.040	0.047	* 0.163
85年6月	0.036	0.026	0.042	0.044	0.024	0.060	0.088
85年7月	0.035	0.018	0.015	0.043	0.017	0.059	0.115
85年8月	0.024	0.024	0.025	0.028	0.018	0.050	0.044
85年9月	0.033	0.030	0.042	0.026	0.024	0.025	0.054
85年10月	0.021	0.012	0.027	0.026	0.014	0.030	0.062
85年11月	0.015	0.007	0.003	0.025	0.017	0.045	0.022
85年12月	0.033	0.018	0.017	0.017	0.006	0.041	0.049
86年1月	0.032	0.023	0.020	0.036	0.014	0.042	0.050
86年2月	0.019	0.021	0.009	0.037	0.012	0.029	0.040
86年3月	0.025	0.025	0.020	0.032	0.016	0.028	0.055
86年4月	0.022	0.018	0.025	0.019	0.014	0.031	0.046
86年5月	0.031	0.016	0.015	0.018	0.017	0.024	0.044
86年6月	0.028	0.015	0.026	0.019	0.012	0.027	0.045
86年7月	0.027	0.016	0.022	0.020	0.021	0.027	0.037
86年8月	0.020	0.027	0.022	0.026	0.020	0.033	0.049
86年9月	0.018	0.015	0.025	0.022	0.016	0.027	0.044
86年10月	0.040	0.022	0.031	0.024	0.012	0.024	0.039
86年11月	0.025	0.021	0.021	0.049	0.015	0.033	0.032
86年12月	0.039	0.020	0.035	0.039	0.027	0.035	0.050
87年1月	0.040	0.022	0.025	0.020	0.018	0.025	0.067
87年2月	0.040	0.017	0.025	0.024	0.003	0.034	0.061
87年3月	0.009	0.019	0.015	0.025	0.009	0.035	0.033
87年4月	0.021	0.010	0.014	0.017	0.009	0.035	0.023
87年5月	0.015	0.011	0.009	0.011	0.007	0.023	0.020
87年6月	0.024	0.008	0.017	0.007	0.007	0.023	0.030

表3.1-3 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物日平均值(最大值)監測結果（續1）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.007	0.008	0.015	0.019	0.007	0.027	0.026
87年8月	0.014	0.008	0.011	0.008	0.007	0.021	0.018
87年9月	0.008	0.006	0.022	0.007	0.010	0.013	0.020
87年10月	0.015	0.004	0.015	0.025	0.004	0.019	0.015
87年11月	0.004	0.012	0.016	0.003	0.010	0.018	0.030
87年12月	0.004	0.008	0.013	0.021	0.004	0.016	0.006
88年1月	0.010	0.008	0.012	0.027	0.004	0.031	0.009
88年2月	0.018	0.011	0.025	0.019	0.007	0.027	0.013
88年3月	0.015	0.016	0.017	0.016	0.010	0.026	0.033
88年4月	0.018	0.009	0.012	0.015	0.007	0.017	0.024
88年5月	0.022	0.011	0.015	0.028	0.005	0.028	0.024
88年6月	0.014	0.013	0.020	0.018	0.008	0.022	0.021
88年7月	0.020	0.011	0.018	0.015	0.008	0.028	0.025
88年8月	0.019	0.017	0.014	0.016	0.012	0.026	0.017
88年9月	0.014	0.013	0.017	匚	0.008	0.017	0.019
88年10月	0.011	0.006	0.021	0.028	0.008	0.026	0.018
88年11月	0.022	0.014	0.014	0.013	0.008	0.013	0.032
88年12月	0.025	0.012	0.008	0.020	0.007	0.014	0.036
89年1月	0.030	0.016	0.021	0.021	0.009	0.026	0.038
89年2月	0.030	0.016	0.015	0.018	0.010	0.026	0.037
89年3月	0.031	0.022	0.017	0.016	0.005	0.040	0.048
89年4月	0.028	0.015	0.013	0.018	0.014	0.035	0.039
89年5月	0.025	0.009	0.019	0.013	0.009	0.035	0.040
89年6月	0.015	0.012	0.019	0.012	0.010	0.027	0.026
89年7月	0.019	0.011	0.011	0.025	0.009	0.033	0.020
89年8月	0.018	0.030	0.014	0.021	0.020	0.027	0.027
89年9月	0.017	0.026	0.014	0.026	0.008	0.010	0.015
89年10月	0.019	0.029	0.011	0.031	0.011	0.030	0.022
89年11月	0.015	0.026	-	-	-	-	-
89年12月	0.019	0.010	-	-	-	-	-
90年1月	0.018	0.016	-	-	-	-	-
90年2月	0.026	0.017	0.014	0.028	0.008	0.041	0.030
90年3月	0.029	0.017	0.013	0.016	0.008	0.022	0.033
90年4月	0.024	0.015	0.017	0.028	0.012	0.022	0.024
90年5月	0.025	0.011	0.015	0.096	0.010	0.026	0.062
90年6月	0.020	0.011	0.013	0.025	0.009	0.032	0.027
90年7月	0.014	0.008	0.014	0.035	0.011	0.030	0.027
90年8月	0.020	0.012	0.027	0.018	0.007	0.033	0.020
90年9月	0.019	0.018	0.025	0.014	0.017	0.024	0.020
90年10月	0.016	0.014	0.019	0.022	0.008	0.020	0.017
90年11月	0.021	0.009	0.014	0.023	0.011	0.017	0.024
90年12月	0.025	0.014	0.014	0.006	0.007	0.024	0.012
91年1月	0.027	0.013	0.007	0.005	0.008	0.017	0.037
91年2月	0.026	0.014	0.014	0.011	0.011	0.022	0.037
91年3月	0.032	0.017	0.016	0.020	0.025	0.034	0.036
91年4月	0.025	0.012	0.012	0.020	0.009	0.031	0.010
91年5月	0.019	0.014	0.015	0.019	0.017	0.024	0.027
91年6月	0.018	0.011	0.009	0.018	0.015	0.033	0.024
91年7月	0.018	0.009	0.012	0.018	0.011	0.035	0.014
91年8月	0.019	0.008	0.014	0.014	0.009	0.026	0.014
91年9月	0.018	0.008	0.011	0.020	0.010	0.025	0.029
91年10月	0.020	0.014	0.016	0.021	0.021	0.026	0.013
91年11月	0.027	0.016	0.012	0.022	0.008	0.022	0.035
91年12月	0.022	0.011	0.012	0.027	0.007	0.031	0.027
92年1月	0.023	0.011	0.014	0.015	0.006	0.029	0.017
92年2月	0.023	0.012	0.020	0.018	0.008	0.039	0.042
92年3月	0.024	0.011	0.014	0.015	0.015	0.028	0.019
92年4月	0.025	0.011	0.011	0.010	0.008	0.027	0.027
92年5月	0.026	0.012	0.015	0.012	0.007	0.027	0.029
92年6月	0.023	0.011	0.015	0.023	0.010	0.026	0.020

表3.1-3 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物日平均值(最大值)監測結果（續2）

(單位: ppm)

測站	監測地點						
時間	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年7月	0.019	0.015	0.012	0.033	0.012	0.026	0.026
92年8月	0.018	0.009	0.019	0.011	0.016	0.035	0.020
92年9月	0.014	0.009	0.019	0.017	0.010	0.027	0.017
92年10月	0.021	0.012	0.011	0.010	0.006	0.024	0.008
92年11月	0.017	0.014	0.013	0.014	0.009	0.030	0.015
92年12月	0.020	0.015	0.015	0.015	0.014	0.024	0.007
93年1月	0.025	0.014	0.011	0.014	0.014	0.014	0.017
93年2月	0.017	0.011	0.007	0.024	0.009	0.040	0.034
93年3月	0.018	0.009	0.009	0.042	0.008	0.024	0.014
93年4月	0.027	0.026	0.014	0.017	0.012	0.029	0.024
93年5月	0.020	0.020	0.010	0.016	0.013	0.027	0.038
93年6月	0.032	0.013	0.012	0.016	0.007	0.028	0.020
93年7月	0.020	0.020	0.013	0.027	0.010	0.039	0.020
93年8月	0.031	0.016	0.010	0.015	0.008	0.032	0.020
93年9月	0.029	0.014	0.007	0.018	0.007	0.036	0.023
93年10月	0.027	0.013	0.011	0.006	0.010	0.015	0.011
93年11月	0.020	0.025	0.015	0.013	0.010	0.016	0.028
93年12月	0.025	0.026	0.015	0.013	0.011	0.048	0.016
94年1月	0.030	0.016	0.012	0.008	0.010	0.015	0.045
94年2月	0.042	0.022	0.022	0.015	0.022	0.035	0.022
94年3月	0.055	0.007	0.015	0.017	0.017	0.030	0.017
94年4月	0.054	0.009	0.010	0.010	0.019	0.041	0.030
94年5月	0.026	0.010	0.009	0.013	0.009	0.027	0.028
94年6月	0.029	0.011	0.009	0.013	0.010	0.027	0.018
94年7月	0.023	0.006	0.014	0.013	0.007	0.027	0.015
94年8月	0.033	0.006	0.010	0.015	0.006	0.021	0.009
94年9月	0.019	0.006	0.009	0.035	0.008	0.031	0.030
94年10月	0.015	0.009	0.015	0.010	0.014	0.019	0.013
94年11月	0.019	0.011	0.008	0.007	0.012	0.024	0.034
94年12月	0.025	0.014	0.011	0.020	0.007	0.021	0.023
95年1月	0.027	0.019	0.008	0.021	0.009	0.041	0.027
95年2月	0.021	0.013	0.007	0.017	0.011	0.044	0.039
95年3月	0.029	0.019	0.013	0.019	0.014	0.021	0.019
95年4月	0.023	0.010	0.006	0.011	0.014	0.038	0.030
95年5月	0.021	0.009	0.013	0.016	0.009	0.023	0.023
95年6月	0.025	0.014	0.011	0.012	0.011	0.020	0.028
95年7月	0.017	0.013	0.015	0.009	0.006	0.019	0.018
95年8月	0.022	0.012	0.011	0.016	0.009	0.024	0.021
95年9月	0.021	0.015	0.011	0.012	0.011	0.020	0.028
95年10月	0.027	0.030	0.008	0.020	0.007	0.019	0.024
95年11月	0.028	0.012	0.011	0.020	0.008	0.021	0.025
95年12月	0.026	0.012	0.008	0.022	0.010	0.027	0.034
96年1月	0.024	0.020	0.008	0.016	0.009	0.038	0.018
96年2月	0.026	0.017	0.018	0.014	0.012	0.042	0.030
96年3月	0.027	0.027	0.010	0.012	0.006	0.026	0.020
96年4月	0.025	0.012	0.011	0.012	0.012	0.032	0.035
96年5月	0.041	0.037	0.016	0.023	0.009	0.032	0.025
96年6月	0.024	0.011	0.011	0.020	0.012	0.026	0.029
96年7月	0.017	0.012	0.010	0.016	0.009	0.024	0.019
96年8月	0.020	0.011	0.014	0.009	0.010	0.020	0.024
96年9月	0.021	0.010	0.010	0.017	0.007	0.018	0.018
96年10月	0.018	0.010	0.011	0.008	0.011	0.024	0.022
96年11月	0.017	0.008	0.008	0.011	0.007	0.021	0.015
96年12月	0.029	0.014	0.009	0.017	0.013	0.023	0.025
97年1月	0.008	0.007	0.011	0.012	0.008	0.033	0.024
97年2月	0.013	0.007	0.009	0.015	0.009	0.043	0.014
97年3月	0.012	0.008	0.011	0.010	0.010	0.034	0.021
97年4月	0.028	0.012	0.008	0.009	0.007	0.038	0.017
97年5月	0.035	0.013	0.007	0.016	0.007	0.024	0.017
97年6月	0.022	0.010	0.007	0.011	0.012	0.022	0.015
97年7月	0.019	0.009	0.009	0.010	0.007	0.026	0.013
97年8月	0.014	0.009	0.008	0.008	0.010	0.051	0.009
97年9月	0.019	0.011	0.007	0.011	0.012	0.022	0.015

表3.1-3 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物日平均值(最大值)監測結果（續3）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
97年10月	0.011	0.005	0.006	0.012	0.007	0.016	0.014
97年11月	0.012	0.005	0.010	0.014	0.012	0.036	0.018
97年12月	0.015	0.007	0.010	0.015	0.010	0.022	0.018
98年1月	0.024	0.012	0.008	0.009	0.009	0.020	0.016
98年2月	0.022	0.010	0.011	0.016	0.008	0.019	0.018
98年3月	0.023	0.015	0.012	0.010	0.007	0.041	0.017
98年4月	0.017	0.010	0.011	0.017	0.011	0.034	0.017
98年5月	0.016	0.008	0.008	0.009	0.009	0.027	0.013
98年6月	0.013	0.010	0.009	0.017	0.009	0.026	0.009
98年7月	0.033	0.011	0.009	0.007	0.009	0.031	0.023
98年8月	0.013	0.013	0.008	0.013	0.008	0.026	0.011
98年9月	0.014	0.009	0.006	0.013	0.006	0.027	0.022
98年10月	0.017	0.008	0.008	0.016	0.007	0.020	0.017
98年11月	0.021	0.013	0.013	0.009	0.009	0.024	0.024
98年12月	0.025	0.017	0.009	0.018	0.014	0.026	0.025
99年1月	0.008	0.005	0.009	0.015	0.007	0.050	0.025
99年2月	0.008	0.004	0.021	0.017	0.020	0.027	0.023
99年3月	0.007	0.003	0.011	0.017	0.009	0.038	0.026
99年4月	0.020	0.011	0.013	0.012	0.010	0.041	0.023
99年5月	0.018	0.013	0.010	0.012	0.014	0.040	0.026
99年6月	0.026	0.012	0.010	0.015	0.008	0.034	0.022
99年7月	0.018	0.011	0.010	0.014	0.008	0.035	0.017
99年8月	0.018	0.011	0.011	0.015	0.007	0.036	0.024
99年9月	0.015	0.017	0.011	0.011	0.006	0.022	0.014
99年10月	0.018	0.009	0.009	0.009	0.006	0.020	0.014
99年11月	0.020	0.010	0.007	0.018	0.007	0.031	0.017
99年12月	0.022	0.013	0.012	0.011	0.009	0.026	0.018
100年1月	0.021	0.013	0.006	0.006	0.006	0.022	0.009
100年2月	0.025	0.016	0.019	0.009	0.007	0.021	0.015
100年3月	0.022	0.017	0.008	0.013	0.006	0.014	0.013
100年4月	0.017	0.008	0.007	0.009	0.008	0.014	0.016
100年5月	0.018	0.009	0.007	0.011	0.011	0.021	0.031
100年6月	0.016	0.008	0.006	0.010	0.006	0.011	0.019
100年7月	0.015	0.010	0.010	0.012	0.008	0.010	0.012
100年8月	0.012	0.007	0.008	0.009	0.008	0.011	0.013
100年9月	0.015	0.008	0.007	0.010	0.006	0.016	0.009
100年10月	0.021	0.007	0.008	0.011	0.007	0.018	0.011
100年11月	0.020	0.008	0.007	0.012	0.008	0.013	0.013
100年12月	0.024	0.013	0.006	0.011	0.008	0.019	0.014
101年1月	0.017	0.011	0.006	0.009	0.006	0.015	0.006
101年2月	0.022	0.010	0.014	0.014	0.010	0.013	0.019
101年3月	0.023	0.014	0.010	0.015	0.011	0.028	0.017
101年4月	0.019	0.008	0.006	0.009	0.006	0.016	0.008
101年5月	0.017	0.008	0.006	0.009	0.009	0.019	0.010
101年6月	0.014	0.008	0.006	0.015	0.006	0.009	0.008

註：(1)空氣品質標準未對氮氧化物訂定限值。

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值。

(4)"Ｃ"表受地震影響，電源中斷。

(5)"-"表示監測工作停止執行。

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值。

表3.1-4 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物小時平均值(最大值)監測結果

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	0.052	0.047	0.031	0.068	-	-	-
82年9月	0.033	0.020	0.029	0.112	-	-	-
82年10月	0.014	0.028	0.027	0.022	-	-	-
82年11月	0.085	0.020	0.033	0.067	-	-	-
82年12月	0.060	0.006	0.040	0.060	-	-	-
83年1月	0.093	0.026	0.027	0.134	-	-	-
83年2月	0.040	0.031	0.039	0.095	-	-	-
83年3月	0.032	0.057	0.034	0.094	-	-	-
83年4月	0.057	0.032	0.032	0.115	-	-	-
83年5月	0.081	0.033	0.056	0.072	-	-	-
83年6月	0.045	0.036	0.034	0.184	-	-	-
83年7月	0.063	0.040	0.033	0.124	-	-	-
83年8月	0.025	0.033	0.036	0.032	-	-	-
83年9月	0.019	0.035	0.013	0.044	-	-	-
83年10月	0.060	0.034	0.031	0.111	-	-	-
83年11月	0.065	0.067	0.035	0.210	-	-	-
83年12月	0.038	0.045	0.038	0.098	-	-	-
84年1月	0.044	0.038	0.086	0.071	0.018	0.081	0.204
84年2月	0.053	0.036	0.056	0.067	0.035	0.082	0.120
84年3月	0.048	0.025	0.105	0.067	0.037	0.095	0.168
84年4月	0.041	0.027	0.035	0.067	0.050	0.088	0.100
84年5月	0.080	0.028	0.030	0.068	0.014	0.078	0.119
84年6月	0.040	0.027	0.038	0.096	0.029	0.102	0.130
84年7月	0.057	0.037	0.073	0.067	0.019	0.073	0.137
84年8月	0.047	0.034	0.017	0.045	0.022	0.040	0.135
84年9月	0.035	0.073	0.036	0.053	0.028	0.042	0.151
84年10月	0.049	0.029	0.036	0.071	0.014	0.089	0.093
84年11月	0.070	0.042	0.044	0.031	0.019	0.138	0.169
84年12月	0.063	0.033	0.041	0.041	0.020	0.082	0.069
85年1月	0.033	0.032	0.084	0.088	0.026	0.089	0.148
85年2月	0.037	0.035	0.051	0.032	0.082	0.104	0.080
85年3月	0.052	0.031	0.036	0.047	0.028	0.059	0.154
85年4月	0.080	0.057	0.036	0.069	0.066	0.051	* 0.368
85年5月	0.142	0.061	0.063	0.056	0.107	0.107	0.281
85年6月	0.066	0.048	0.073	0.079	0.037	0.116	0.172
85年7月	0.091	0.025	0.027	0.173	0.020	0.123	0.265
85年8月	0.049	0.094	0.038	0.076	0.023	0.104	0.084
85年9月	0.092	0.053	0.073	0.055	0.037	0.035	0.172
85年10月	0.034	0.023	0.064	0.051	0.020	0.052	0.118
85年11月	0.031	0.016	0.011	0.043	0.020	0.053	0.077
85年12月	0.092	0.027	0.039	0.052	0.013	0.074	0.100
86年1月	0.066	0.036	0.042	0.058	0.017	0.125	0.097
86年2月	0.031	0.035	0.023	0.149	0.035	0.069	0.075
86年3月	0.045	0.044	0.049	0.070	0.035	0.086	0.143
86年4月	0.058	0.028	0.038	0.039	0.024	0.069	0.082
86年5月	0.058	0.031	0.036	0.036	0.031	0.054	0.089
86年6月	0.045	0.024	0.076	0.032	0.023	0.055	0.078
86年7月	0.046	0.021	0.036	0.032	0.036	0.055	0.085
86年8月	0.025	0.041	0.033	0.058	0.032	0.085	0.071
86年9月	0.032	0.021	0.037	0.049	0.018	0.052	0.071
86年10月	0.052	0.027	0.058	0.055	0.020	0.042	0.075
86年11月	0.037	0.038	0.036	0.077	0.019	0.058	0.080
86年12月	0.062	0.025	0.060	0.081	0.036	0.064	0.069
87年1月	0.067	0.036	0.058	0.046	0.030	0.077	0.123
87年2月	0.056	0.023	0.050	0.048	0.005	0.062	0.085
87年3月	0.031	0.041	0.038	0.052	0.022	0.064	0.073
87年4月	0.104	0.018	0.029	0.038	0.019	0.077	0.059
87年5月	0.039	0.019	0.027	0.034	0.015	0.068	0.053
87年6月	0.039	0.015	0.042	0.023	0.017	0.054	0.054

表3.1-4 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物小時平均值(最大值)監測結果（續1）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.013	0.020	0.030	0.032	0.013	0.065	0.047
87年8月	0.033	0.017	0.026	0.013	0.012	0.052	0.038
87年9月	0.025	0.016	0.043	0.035	0.020	0.037	0.040
87年10月	0.034	0.010	0.037	0.087	0.006	0.059	0.031
87年11月	0.011	0.022	0.038	0.012	0.035	0.034	0.100
87年12月	0.006	0.015	0.042	0.039	0.008	0.026	0.018
88年1月	0.021	0.020	0.027	0.060	0.007	0.079	0.031
88年2月	0.036	0.031	0.043	0.084	0.019	0.065	0.037
88年3月	0.032	0.040	0.041	0.029	0.026	0.048	0.086
88年4月	0.032	0.019	0.023	0.041	0.016	0.053	0.056
88年5月	0.053	0.018	0.035	0.086	0.014	0.083	0.072
88年6月	0.028	0.022	0.038	0.027	0.023	0.049	0.045
88年7月	0.032	0.026	0.062	0.035	0.027	0.076	0.051
88年8月	0.059	0.021	0.025	0.032	0.025	0.068	0.047
88年9月	0.041	0.019	0.033	匚	0.013	0.032	0.033
88年10月	0.023	0.011	0.046	0.085	0.017	0.074	0.058
88年11月	0.043	0.022	0.033	0.036	0.015	0.031	0.066
88年12月	0.039	0.020	0.019	0.064	0.014	0.022	0.092
89年1月	0.058	0.032	0.045	0.045	0.020	0.062	0.090
89年2月	0.048	0.029	0.038	0.034	0.029	0.062	0.073
89年3月	0.076	0.061	0.048	0.036	0.016	0.074	0.094
89年4月	0.053	0.032	0.028	0.047	0.033	0.053	0.062
89年5月	0.089	0.022	0.049	0.052	0.025	0.075	0.063
89年6月	0.038	0.022	0.032	0.077	0.023	0.066	0.058
89年7月	0.047	0.026	0.023	0.043	0.032	0.087	0.049
89年8月	0.038	0.034	0.029	0.043	0.045	0.056	0.051
89年9月	0.043	0.038	0.035	0.047	0.035	0.016	0.040
89年10月	0.037	0.043	0.026	0.072	0.036	0.080	0.054
89年11月	0.076	0.083	-	-	-	-	-
89年12月	0.159	0.025	-	-	-	-	-
90年1月	0.044	0.031	-	-	-	-	-
90年2月	0.044	0.040	0.027	0.088	0.021	0.086	0.088
90年3月	0.069	0.046	0.040	0.058	0.025	0.053	0.069
90年4月	0.044	0.027	0.041	0.056	0.023	0.052	0.043
90年5月	0.064	0.025	0.033	0.154	0.024	0.062	0.113
90年6月	0.038	0.028	0.032	0.058	0.018	0.079	0.096
90年7月	0.030	0.020	0.028	0.097	0.020	0.074	0.058
90年8月	0.048	0.027	0.051	0.053	0.017	0.084	0.039
90年9月	0.029	0.066	0.040	0.034	0.025	0.082	0.034
90年10月	0.038	0.019	0.032	0.030	0.014	0.049	0.045
90年11月	0.047	0.041	0.039	0.071	0.021	0.030	0.040
90年12月	0.045	0.049	0.025	0.014	0.028	0.062	0.028
91年1月	0.061	0.044	0.021	0.007	0.017	0.035	0.089
91年2月	0.075	0.041	0.038	0.025	0.020	0.104	0.088
91年3月	0.089	0.037	0.038	0.068	0.050	0.107	0.063
91年4月	0.045	0.033	0.029	0.036	0.017	0.158	0.041
91年5月	0.039	0.045	0.031	0.045	0.027	0.048	0.049
91年6月	0.034	0.026	0.022	0.045	0.028	0.096	0.053
91年7月	0.043	0.022	0.027	0.056	0.067	0.080	0.031
91年8月	0.034	0.023	0.029	0.061	0.016	0.078	0.050
91年9月	0.043	0.017	0.025	0.055	0.018	0.050	0.049
91年10月	0.046	0.045	0.049	0.063	0.036	0.069	0.054
91年11月	0.046	0.043	0.027	0.053	0.024	0.101	0.092
91年12月	0.110	0.040	0.040	0.056	0.014	0.122	0.102
92年1月	0.048	0.021	0.043	0.036	0.012	0.100	0.074
92年2月	0.038	0.024	0.038	0.041	0.024	0.094	0.099
92年3月	0.068	0.043	0.040	0.061	0.047	0.073	0.067
92年4月	0.058	0.017	0.026	0.023	0.014	0.079	0.060
92年5月	0.043	0.026	0.025	0.023	0.012	0.064	0.064
92年6月	0.041	0.035	0.022	0.034	0.014	0.074	0.038

表3.1-4 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物小時平均值(最大值)監測結果（續2）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年7月	0.063	0.025	0.022	0.066	0.019	0.102	0.050
92年8月	0.034	0.030	0.033	0.024	0.021	0.087	0.049
92年9月	0.039	0.029	0.027	0.062	0.014	0.068	0.062
92年10月	0.021	0.087	0.021	0.027	0.011	0.070	0.036
92年11月	0.057	0.057	0.029	0.044	0.016	0.092	0.038
92年12月	0.045	0.021	0.031	0.042	0.024	0.047	0.009
93年1月	0.070	0.027	0.023	0.029	0.030	0.049	0.033
93年2月	0.040	0.012	0.015	0.117	0.016	0.096	0.092
93年3月	0.044	0.017	0.018	0.183	0.015	0.071	0.040
93年4月	0.049	0.051	0.023	0.042	0.017	0.072	0.066
93年5月	0.037	0.059	0.022	0.052	0.021	0.070	0.063
93年6月	0.047	0.032	0.018	0.035	0.010	0.076	0.048
93年7月	0.064	0.041	0.023	0.052	0.022	0.132	0.054
93年8月	0.057	0.043	0.019	0.046	0.021	0.074	0.033
93年9月	0.047	0.027	0.017	0.042	0.012	0.116	0.046
93年10月	0.046	0.034	0.020	0.007	0.016	0.016	0.017
93年11月	0.045	0.033	0.021	0.060	0.016	0.034	0.065
93年12月	0.089	0.037	0.029	0.017	0.017	0.104	0.060
94年1月	0.046	0.040	0.025	0.027	0.021	0.024	0.081
94年2月	0.062	0.036	0.050	0.028	0.058	0.073	0.067
94年3月	0.084	0.020	0.023	0.040	0.031	0.083	0.047
94年4月	0.098	0.023	0.027	0.024	0.048	0.138	0.060
94年5月	0.092	0.003	0.019	0.040	0.025	0.063	0.048
94年6月	0.056	0.019	0.016	0.030	0.032	0.079	0.040
94年7月	0.023	0.052	0.023	0.041	0.011	0.072	0.029
94年8月	0.064	0.088	0.012	0.036	0.008	0.048	0.018
94年9月	0.036	0.033	0.020	0.172	0.022	0.102	0.057
94年10月	0.051	0.026	0.023	0.026	0.017	0.037	0.033
94年11月	0.054	0.023	0.015	0.023	0.017	0.069	0.078
94年12月	0.073	0.038	0.019	0.046	0.009	0.039	0.050
95年1月	0.047	0.041	0.016	0.047	0.015	0.080	0.054
95年2月	0.040	0.035	0.015	0.031	0.018	0.067	0.102
95年3月	0.052	0.041	0.038	0.049	0.017	0.063	0.050
95年4月	0.051	0.018	0.008	0.024	0.027	0.080	0.075
95年5月	0.049	0.022	0.027	0.042	0.022	0.052	0.039
95年6月	0.077	0.035	0.024	0.020	0.015	0.061	0.058
95年7月	0.034	0.028	0.026	0.017	0.009	0.060	0.035
95年8月	0.040	0.067	0.021	0.037	0.012	0.060	0.039
95年9月	0.038	0.029	0.024	0.020	0.015	0.061	0.058
95年10月	0.056	0.048	0.019	0.045	0.011	0.043	0.054
95年11月	0.056	0.047	0.022	0.046	0.016	0.058	0.060
95年12月	0.063	0.036	0.017	0.056	0.019	0.063	0.096
96年1月	0.051	0.030	0.015	0.045	0.019	0.083	0.052
96年2月	0.059	0.039	0.040	0.022	0.035	0.097	0.111
96年3月	0.059	0.059	0.016	0.037	0.010	0.053	0.043
96年4月	0.049	0.033	0.022	0.030	0.031	0.085	0.086
96年5月	0.072	0.079	0.033	0.071	0.017	0.083	0.046
96年6月	0.052	0.026	0.018	0.035	0.017	0.074	0.072
96年7月	0.051	0.029	0.023	0.048	0.018	0.060	0.045
96年8月	0.040	0.023	0.020	0.024	0.019	0.051	0.063
96年9月	0.053	0.040	0.022	0.035	0.016	0.031	0.035
96年10月	0.054	0.021	0.020	0.022	0.020	0.050	0.058
96年11月	0.054	0.019	0.027	0.023	0.010	0.097	0.042
96年12月	0.070	0.030	0.017	0.036	0.021	0.079	0.064
97年1月	0.048	0.043	0.024	0.033	0.021	0.089	0.085
97年2月	0.055	0.044	0.027	0.036	0.028	0.081	0.064
97年3月	0.057	0.046	0.024	0.017	0.023	0.085	0.082
97年4月	0.052	0.041	0.020	0.023	0.011	0.079	0.041
97年5月	0.080	0.042	0.013	0.029	0.008	0.064	0.039
97年6月	0.047	0.110	0.012	0.019	0.016	0.044	0.023
97年7月	0.035	0.026	0.017	0.019	0.015	0.049	0.034
97年8月	0.036	0.062	0.012	0.022	0.015	0.088	0.016
97年9月	0.043	0.034	0.012	0.019	0.016	0.044	0.023

表3.1-4 核四施工環境監測歷年空氣品質氮氧化物小時平均值(最大值)監測結果（續3）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
97年10月	0.039	0.023	0.012	0.026	0.012	0.054	0.031
97年11月	0.056	0.021	0.022	0.042	0.024	0.071	0.045
97年12月	0.050	0.027	0.025	0.035	0.022	0.052	0.047
98年1月	0.059	0.024	0.016	0.024	0.020	0.061	0.026
98年2月	0.108	0.025	0.041	0.030	0.014	0.061	0.033
98年3月	0.094	0.042	0.019	0.022	0.019	0.116	0.037
98年4月	0.045	0.032	0.023	0.027	0.021	0.085	0.043
98年5月	0.035	0.026	0.022	0.026	0.014	0.090	0.031
98年6月	0.032	0.023	0.015	0.035	0.025	0.057	0.022
98年7月	0.051	0.027	0.016	0.014	0.015	0.058	0.033
98年8月	0.035	0.058	0.017	0.026	0.013	0.061	0.021
98年9月	0.037	0.014	0.009	0.033	0.011	0.054	0.074
98年10月	0.034	0.031	0.019	0.044	0.015	0.041	0.042
98年11月	0.046	0.022	0.023	0.020	0.057	0.058	0.070
98年12月	0.069	0.046	0.023	0.048	0.022	0.085	0.091
99年1月	0.037	0.017	0.030	0.042	0.014	0.136	0.049
99年2月	0.017	0.013	0.045	0.057	0.047	0.068	0.054
99年3月	0.020	0.007	0.021	0.043	0.024	0.145	0.049
99年4月	0.038	0.027	0.023	0.026	0.019	0.132	0.048
99年5月	0.048	0.033	0.021	0.024	0.030	0.127	0.046
99年6月	0.076	0.032	0.017	0.033	0.030	0.088	0.050
99年7月	0.033	0.024	0.018	0.027	0.015	0.085	0.033
99年8月	0.046	0.025	0.019	0.069	0.013	0.080	0.056
99年9月	0.058	0.052	0.030	0.033	0.008	0.052	0.049
99年10月	0.049	0.032	0.022	0.019	0.007	0.066	0.032
99年11月	0.045	0.020	0.020	0.039	0.016	0.083	0.044
99年12月	0.046	0.032	0.021	0.025	0.015	0.117	0.039
100年1月	0.044	0.039	0.015	0.009	0.008	0.065	0.016
100年2月	0.094	0.043	0.042	0.019	0.016	0.068	0.041
100年3月	0.050	0.036	0.024	0.027	0.016	0.032	0.044
100年4月	0.052	0.025	0.025	0.020	0.016	0.035	0.059
100年5月	0.039	0.036	0.015	0.022	0.018	0.041	0.141
100年6月	0.032	0.018	0.013	0.028	0.011	0.032	0.084
100年7月	0.033	0.032	0.056	0.031	0.017	0.021	0.028
100年8月	0.029	0.016	0.015	0.025	0.014	0.036	0.066
100年9月	0.047	0.016	0.011	0.019	0.009	0.035	0.021
100年10月	0.039	0.016	0.017	0.031	0.009	0.046	0.030
100年11月	0.047	0.020	0.022	0.042	0.020	0.034	0.066
100年12月	0.039	0.022	0.018	0.028	0.016	0.046	0.036
101年1月	0.046	0.037	0.022	0.023	0.013	0.035	0.011
101年2月	0.044	0.030	0.031	0.019	0.030	0.034	0.031
101年3月	0.051	0.039	0.030	0.047	0.031	0.056	0.032
101年4月	0.049	0.020	0.024	0.022	0.010	0.031	0.014
101年5月	0.046	0.016	0.010	0.021	0.016	0.036	0.019
101年6月	0.031	0.035	0.011	0.026	0.008	0.022	0.017

註：(1)空氣品質標準未對氮氧化物訂定限值。

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值。

(4)"C"表受地震影響，電源中斷。

(5)"-"表示監測工作停止執行。

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值。

表3.1-5 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮日平均值(最大值)監測結果

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	0.008	0.007	0.007	0.012	-	-	-
82年9月	0.004	0.006	0.008	0.014	-	-	-
82年10月	0.006	0.012	0.012	0.008	-	-	-
82年11月	0.013	0.006	0.009	0.012	-	-	-
82年12月	0.014	0.004	0.005	0.013	-	-	-
83年1月	0.020	0.012	0.008	0.021	-	-	-
83年2月	0.015	0.014	0.013	0.022	-	-	-
83年3月	0.006	0.016	0.012	0.022	-	-	-
83年4月	0.012	0.010	0.013	0.012	-	-	-
83年5月	0.019	0.012	0.018	0.014	-	-	-
83年6月	0.008	0.008	0.009	0.015	-	-	-
83年7月	0.013	0.010	0.008	0.012	-	-	-
83年8月	0.005	0.005	0.010	0.006	-	-	-
83年9月	0.003	0.005	0.004	0.005	-	-	-
83年10月	0.018	0.009	0.013	0.013	-	-	-
83年11月	0.009	0.005	0.013	0.013	-	-	-
83年12月	0.012	0.016	0.014	0.019	-	-	-
84年1月	0.012	0.016	0.020	0.016	0.004	0.015	0.026
84年2月	0.017	0.017	0.022	0.021	0.012	0.017	0.014
84年3月	0.016	0.006	0.018	0.014	0.015	0.016	0.029
84年4月	0.012	0.012	0.012	0.025	0.014	0.014	0.028
84年5月	0.014	0.012	0.010	0.019	0.007	0.018	0.022
84年6月	0.014	0.011	0.015	0.028	0.010	0.019	0.020
84年7月	0.009	0.018	0.019	0.022	0.007	0.015	0.018
84年8月	0.013	0.013	0.006	0.011	0.006	0.012	0.011
84年9月	0.012	0.008	0.010	0.013	0.013	0.013	0.020
84年10月	0.013	0.011	0.008	0.014	0.006	0.020	0.017
84年11月	0.019	0.013	0.010	0.008	0.008	0.025	0.026
84年12月	0.017	0.014	0.018	0.012	0.009	0.015	0.011
85年1月	0.013	0.013	0.010	0.013	0.009	0.022	0.025
85年2月	0.013	0.013	0.013	0.009	0.010	0.023	0.024
85年3月	0.023	0.012	0.014	0.016	0.012	0.020	0.032
85年4月	0.034	0.022	0.016	0.016	0.027	0.011	0.052
85年5月	0.022	0.023	0.017	0.021	0.017	0.018	* 0.075
85年6月	0.023	0.019	0.025	0.028	0.017	0.029	0.032
85年7月	0.016	0.016	0.008	0.014	0.010	0.027	0.052
85年8月	0.017	0.018	0.020	0.021	0.016	0.041	0.018
85年9月	0.020	0.020	0.025	0.014	0.017	0.016	0.021
85年10月	0.011	0.007	0.014	0.016	0.010	0.020	0.019
85年11月	0.008	0.005	0.002	0.017	0.009	0.021	0.009
85年12月	0.020	0.008	0.011	0.010	0.006	0.020	0.018
86年1月	0.023	0.015	0.011	0.017	0.009	0.022	0.014
86年2月	0.011	0.012	0.006	0.019	0.009	0.016	0.018
86年3月	0.014	0.016	0.012	0.016	0.011	0.013	0.020
86年4月	0.014	0.011	0.013	0.011	0.009	0.017	0.022
86年5月	0.015	0.010	0.010	0.013	0.010	0.012	0.020
86年6月	0.018	0.009	0.014	0.010	0.007	0.015	0.017
86年7月	0.016	0.009	0.015	0.011	0.013	0.019	0.024
86年8月	0.012	0.013	0.012	0.017	0.009	0.014	0.016
86年9月	0.011	0.010	0.013	0.012	0.010	0.013	0.016
86年10月	0.017	0.013	0.018	0.013	0.005	0.009	0.016
86年11月	0.016	0.014	0.011	0.027	0.009	0.018	0.013
86年12月	0.024	0.010	0.014	0.018	0.017	0.016	0.019
87年1月	0.022	0.014	0.016	0.014	0.012	0.015	0.022
87年2月	0.027	0.007	0.015	0.014	0.002	0.017	0.030
87年3月	0.004	0.013	0.011	0.013	0.007	0.016	0.016
87年4月	0.015	0.007	0.006	0.010	0.007	0.020	0.011
87年5月	0.009	0.009	0.003	0.008	0.004	0.008	0.008
87年6月	0.015	0.004	0.009	0.003	0.004	0.016	0.017

表3.1-5 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮日平均值(最大值)監測結果（續1）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.003	0.005	0.009	0.011	0.004	0.017	0.005
87年8月	0.009	0.005	0.005	0.003	0.004	0.014	0.010
87年9月	0.004	0.005	0.018	0.004	0.006	0.007	0.010
87年10月	0.011	0.003	0.009	0.009	0.003	0.013	0.007
87年11月	0.003	0.009	0.010	0.003	0.006	0.009	0.018
87年12月	0.002	0.005	0.009	0.013	0.003	0.008	0.004
88年1月	0.007	0.005	0.009	0.019	0.003	0.015	0.005
88年2月	0.012	0.009	0.018	0.013	0.005	0.014	0.007
88年3月	0.012	0.010	0.009	0.010	0.008	0.016	0.020
88年4月	0.012	0.007	0.009	0.009	0.006	0.010	0.014
88年5月	0.017	0.007	0.009	0.014	0.003	0.011	0.010
88年6月	0.010	0.009	0.012	0.012	0.006	0.012	0.010
88年7月	0.012	0.006	0.009	0.005	0.006	0.015	0.011
88年8月	0.011	0.014	0.009	0.010	0.009	0.015	0.007
88年9月	0.006	0.009	0.009	ㄈ	0.006	0.009	0.010
88年10月	0.008	0.004	0.015	0.008	0.004	0.010	0.011
88年11月	0.012	0.010	0.008	0.008	0.005	0.007	0.014
88年12月	0.014	0.010	0.005	0.011	0.005	0.007	0.019
89年1月	0.020	0.011	0.015	0.011	0.007	0.011	0.018
89年2月	0.020	0.012	0.008	0.015	0.005	0.025	0.017
89年3月	0.023	0.019	0.012	0.012	0.004	0.024	0.023
89年4月	0.020	0.013	0.008	0.012	0.010	0.015	0.018
89年5月	0.016	0.008	0.009	0.010	0.005	0.018	0.021
89年6月	0.011	0.009	0.013	0.008	0.006	0.013	0.014
89年7月	0.012	0.009	0.007	0.016	0.004	0.011	0.010
89年8月	0.009	0.006	0.011	0.015	0.015	0.015	0.017
89年9月	0.009	0.006	0.009	0.012	0.006	0.007	0.010
89年10月	0.012	0.008	0.007	0.015	0.007	0.017	0.008
89年11月	0.007	0.008	-	-	-	-	-
89年12月	0.008	0.006	-	-	-	-	-
90年1月	0.012	0.012	-	-	-	-	-
90年2月	0.015	0.012	0.004	0.008	0.006	0.019	0.012
90年3月	0.018	0.012	0.008	0.013	0.006	0.009	0.023
90年4月	0.017	0.012	0.011	0.020	0.005	0.009	0.014
90年5月	0.015	0.008	0.009	0.010	0.006	0.007	0.010
90年6月	0.012	0.007	0.006	0.008	0.007	0.014	0.006
90年7月	0.009	0.005	0.006	0.017	0.007	0.010	0.017
90年8月	0.012	0.009	0.012	0.012	0.002	0.016	0.004
90年9月	0.012	0.007	0.011	0.005	0.006	0.007	0.013
90年10月	0.011	0.006	0.007	0.014	0.006	0.014	0.010
90年11月	0.015	0.007	0.009	0.014	0.008	0.015	0.017
90年12月	0.017	0.011	0.009	0.004	0.004	0.012	0.007
91年1月	0.019	0.010	0.005	0.004	0.005	0.012	0.018
91年2月	0.019	0.012	0.006	0.005	0.005	0.010	0.017
91年3月	0.020	0.014	0.008	0.013	0.016	0.023	0.019
91年4月	0.017	0.009	0.008	0.005	0.007	0.015	0.006
91年5月	0.014	0.008	0.011	0.011	0.008	0.011	0.011
91年6月	0.011	0.008	0.004	0.010	0.009	0.015	0.008
91年7月	0.012	0.007	0.009	0.009	0.004	0.017	0.006
91年8月	0.015	0.007	0.008	0.005	0.003	0.010	0.004
91年9月	0.013	0.006	0.006	0.007	0.004	0.010	0.007
91年10月	0.015	0.008	0.011	0.011	0.019	0.013	0.009
91年11月	0.017	0.009	0.008	0.012	0.004	0.011	0.017
91年12月	0.015	0.009	0.008	0.017	0.005	0.013	0.014
92年1月	0.018	0.009	0.007	0.010	0.003	0.013	0.010
92年2月	0.016	0.010	0.015	0.011	0.006	0.020	0.026
92年3月	0.017	0.009	0.008	0.010	0.009	0.019	0.012
92年4月	0.017	0.010	0.009	0.008	0.006	0.013	0.014
92年5月	0.017	0.010	0.009	0.008	0.004	0.014	0.013
92年6月	0.017	0.009	0.007	0.013	0.007	0.005	0.004
92年7月	0.012	0.006	0.008	0.010	0.004	0.011	0.015
92年8月	0.013	0.007	0.012	0.007	0.010	0.023	0.010
92年9月	0.003	0.006	0.007	0.011	0.007	0.012	0.008

表3.1-5 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮日平均值(最大值)監測結果（續2）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年10月	0.011	0.005	0.007	0.007	0.005	0.013	0.006
92年11月	0.012	0.009	0.010	0.010	0.005	0.015	0.008
92年12月	0.013	0.002	0.009	0.010	0.010	0.011	0.005
93年1月	0.013	0.010	0.007	0.011	0.011	0.011	0.012
93年2月	0.009	0.005	0.005	0.011	0.006	0.019	0.015
93年3月	0.010	0.003	0.007	0.033	0.005	0.014	0.010
93年4月	0.014	0.009	0.010	0.011	0.008	0.017	0.014
93年5月	0.011	0.012	0.006	0.011	0.009	0.014	0.015
93年6月	0.010	0.010	0.009	0.007	0.005	0.014	0.011
93年7月	0.011	0.003	0.009	0.009	0.006	0.012	0.012
93年8月	0.023	0.012	0.007	0.007	0.006	0.013	0.014
93年9月	0.023	0.006	0.003	0.010	0.004	0.011	0.016
93年10月	0.017	0.008	0.008	0.004	0.007	0.010	0.008
93年11月	0.012	0.011	0.007	0.009	0.006	0.011	0.015
93年12月	0.019	0.011	0.009	0.010	0.008	0.022	0.011
94年1月	0.027	0.012	0.009	0.004	0.008	0.007	0.024
94年2月	0.034	0.013	0.016	0.010	0.015	0.017	0.013
94年3月	0.037	0.006	0.012	0.013	0.013	0.020	0.010
94年4月	0.043	0.007	0.007	0.007	0.018	0.021	0.016
94年5月	0.019	0.003	0.007	0.010	0.006	0.014	0.017
94年6月	0.020	0.003	0.006	0.009	0.007	0.012	0.010
94年7月	0.015	0.007	0.009	0.007	0.004	0.012	0.010
94年8月	0.028	0.011	0.009	0.005	0.004	0.009	0.006
94年9月	0.017	0.007	0.004	0.017	0.007	0.012	0.019
94年10月	0.010	0.007	0.010	0.007	0.009	0.011	0.009
94年11月	0.015	0.009	0.005	0.005	0.006	0.011	0.018
94年12月	0.015	0.009	0.010	0.016	0.005	0.013	0.011
95年1月	0.015	0.014	0.005	0.012	0.007	0.018	0.017
95年2月	0.016	0.011	0.005	0.010	0.007	0.032	0.023
95年3月	0.020	0.016	0.010	0.010	0.009	0.012	0.013
95年4月	0.015	0.008	0.004	0.005	0.009	0.022	0.014
95年5月	0.015	0.006	0.008	0.012	0.006	0.011	0.012
95年6月	0.017	0.010	0.005	0.005	0.004	0.014	0.015
95年7月	0.011	0.010	0.010	0.004	0.005	0.005	0.008
95年8月	0.013	0.009	0.010	0.011	0.005	0.015	0.013
95年9月	0.014	0.009	0.005	0.005	0.004	0.014	0.015
95年10月	0.019	0.018	0.006	0.007	0.005	0.010	0.014
95年11月	0.018	0.010	0.007	0.012	0.006	0.013	0.012
95年12月	0.017	0.010	0.005	0.014	0.007	0.016	0.015
96年1月	0.012	0.016	0.005	0.010	0.006	0.017	0.012
96年2月	0.012	0.015	0.014	0.011	0.008	0.022	0.014
96年3月	0.016	0.016	0.008	0.009	0.004	0.017	0.012
96年4月	0.017	0.009	0.008	0.009	0.008	0.016	0.022
96年5月	0.032	0.035	0.011	0.014	0.007	0.018	0.016
96年6月	0.015	0.008	0.006	0.010	0.010	0.013	0.013
96年7月	0.007	0.008	0.006	0.011	0.005	0.012	0.009
96年8月	0.013	0.007	0.006	0.004	0.006	0.010	0.008
96年9月	0.013	0.009	0.006	0.014	0.004	0.012	0.011
96年10月	0.013	0.008	0.007	0.005	0.008	0.015	0.014
96年11月	0.010	0.007	0.006	0.007	0.005	0.011	0.008
96年12月	0.023	0.012	0.007	0.009	0.007	0.011	0.014
97年1月	0.014	0.010	0.007	0.008	0.006	0.016	0.016
97年2月	0.023	0.013	0.006	0.010	0.008	0.024	0.010
97年3月	0.016	0.012	0.008	0.009	0.007	0.023	0.017
97年4月	0.019	0.010	0.007	0.006	0.005	0.020	0.011
97年5月	0.025	0.011	0.005	0.008	0.005	0.014	0.011
97年6月	0.013	0.008	0.005	0.005	0.009	0.005	0.006
97年7月	0.010	0.007	0.005	0.008	0.005	0.009	0.007
97年8月	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.018	0.004
97年9月	0.012	0.009	0.005	0.005	0.009	0.005	0.006
97年10月	0.011	0.006	0.003	0.007	0.005	0.007	0.008
97年11月	0.010	0.007	0.007	0.008	0.008	0.014	0.010
97年12月	0.015	0.011	0.007	0.010	0.008	0.011	0.011
98年1月	0.014	0.010	0.005	0.007	0.007	0.011	0.011
98年2月	0.015	0.008	0.007	0.010	0.006	0.010	0.010
98年3月	0.017	0.013	0.006	0.007	0.004	0.024	0.012

表3.1-5 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮日平均值(最大值)監測結果（續3）

(單位: ppm)

測站 時間	監測地點						
	澳底 國小	龍門 社區	貢寮 國小	福隆 海水浴場	川島 養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠 入口旁之民宅
98年4月	0.013	0.008	0.010	0.013	0.007	0.019	0.011
98年5月	0.010	0.007	0.005	0.007	0.008	0.014	0.010
98年6月	0.009	0.007	0.007	0.011	0.005	0.011	0.006
98年7月	0.019	0.008	0.006	0.004	0.006	0.009	0.018
98年8月	0.009	0.007	0.005	0.008	0.006	0.014	0.006
98年9月	0.008	0.008	0.004	0.007	0.005	0.013	0.010
98年10月	0.013	0.006	0.004	0.011	0.005	0.012	0.015
98年11月	0.014	0.011	0.009	0.007	0.005	0.011	0.015
98年12月	0.018	0.015	0.005	0.013	0.012	0.012	0.014
99年1月	0.015	0.022	0.006	0.008	0.005	0.024	0.014
99年2月	0.033	0.018	0.018	0.008	0.017	0.013	0.008
99年3月	0.015	0.010	0.009	0.012-	0.006	0.022	0.017
99年4月	0.015	0.009	0.011	0.009	0.008	0.021	0.018
99年5月	0.013	0.008	0.007	0.009	0.012	0.021	0.009
99年6月	0.013	0.008	0.007	0.011	0.005	0.012	0.014
99年7月	0.018	0.011	0.007	0.009	0.005	0.016	0.010
99年8月	0.018	0.011	0.008	0.007	0.005	0.020	0.008
99年9月	0.015	0.017	0.006	0.005	0.004	0.008	0.007
99年10月	0.012	0.007	0.006	0.006	0.005	0.011	0.008
99年11月	0.014	0.008	0.005	0.012	0.005	0.015	0.005
99年12月	0.017	0.012	0.009	0.009	0.008	0.015	0.012
100年1月	0.015	0.012	0.004	0.004	0.004	0.011	0.006
100年2月	0.014	0.012	0.014	0.006	0.005	0.013	0.009
100年3月	0.016	0.010	0.005	0.011	0.005	0.012	0.009
100年4月	0.008	0.005	0.005	0.007	0.007	0.009	0.011
100年5月	0.008	0.004	0.005	0.008	0.005	0.014	0.016
100年6月	0.006	0.004	0.003	0.005	0.004	0.006	0.009
100年7月	0.011	0.008	0.005	0.008	0.005	0.005	0.006
100年8月	0.008	0.005	0.004	0.007	0.005	0.007	0.006
100年9月	0.010	0.006	0.003	0.006	0.005	0.007	0.004
100年10月	0.011	0.005	0.005	0.007	0.003	0.012	0.007
100年11月	0.011	0.005	0.005	0.008	0.006	0.007	0.006
100年12月	0.013	0.010	0.005	0.009	0.005	0.012	0.009
101年1月	0.011	0.008	0.004	0.007	0.003	0.010	0.005
101年2月	0.015	0.008	0.010	0.008	0.008	0.009	0.015
101年3月	0.016	0.010	0.006	0.010	0.009	0.017	0.011
101年4月	0.013	0.006	0.004	0.007	0.004	0.012	0.006
101年5月	0.012	0.005	0.005	0.007	0.006	0.011	0.006
101年6月	0.010	0.005	0.005	0.014	0.004	0.005	0.007

註：(1)空氣品質標準未對二氧化氮最大日平均值訂定限值

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值

(4)"Ｃ"表受地震影響，電源中斷

(5)"-"表示監測工作停止執行

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值

表3.1-6 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮小時平均值(最大值)監測結果

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	0.011	0.012	0.010	0.018	-	-	-
82年9月	0.006	0.013	0.014	0.048	-	-	-
82年10月	0.011	0.023	0.020	0.015	-	-	-
82年11月	0.027	0.017	0.015	0.045	-	-	-
82年12月	0.029	0.006	0.017	0.036	-	-	-
83年1月	0.037	0.021	0.017	0.031	-	-	-
83年2月	0.024	0.020	0.024	0.033	-	-	-
83年3月	0.021	0.046	0.025	0.033	-	-	-
83年4月	0.033	0.022	0.022	0.020	-	-	-
83年5月	0.042	0.022	0.032	0.028	-	-	-
83年6月	0.019	0.017	0.025	0.035	-	-	-
83年7月	0.026	0.029	0.012	0.024	-	-	-
83年8月	0.020	0.020	0.023	0.012	-	-	-
83年9月	0.013	0.010	0.010	0.011	-	-	-
83年10月	0.030	0.017	0.019	0.022	-	-	-
83年11月	0.020	0.014	0.019	0.027	-	-	-
83年12月	0.022	0.027	0.021	0.027	-	-	-
84年1月	0.024	0.023	0.072	0.028	0.015	0.030	0.038
84年2月	0.035	0.034	0.035	0.065	0.026	0.031	0.030
84年3月	0.038	0.022	0.042	0.029	0.035	0.032	0.042
84年4月	0.022	0.022	0.021	0.060	0.043	0.034	0.081
84年5月	0.031	0.022	0.021	0.029	0.009	0.032	0.031
84年6月	0.026	0.018	0.024	0.037	0.016	0.030	0.027
84年7月	0.016	0.032	0.070	0.032	0.012	0.027	0.029
84年8月	0.020	0.015	0.008	0.021	0.009	0.024	0.017
84年9月	0.021	0.015	0.016	0.022	0.022	0.020	0.039
84年10月	0.023	0.022	0.019	0.022	0.010	0.032	0.057
84年11月	0.032	0.026	0.021	0.020	0.013	0.044	0.041
84年12月	0.029	0.025	0.030	0.019	0.014	0.028	0.020
85年1月	0.023	0.023	0.018	0.036	0.022	0.032	0.034
85年2月	0.030	0.027	0.025	0.024	0.015	0.037	0.058
85年3月	0.033	0.024	0.026	0.034	0.022	0.034	0.049
85年4月	0.056	0.045	0.023	0.046	0.059	0.026	0.099
85年5月	0.062	0.037	0.036	0.034	0.040	0.040	0.114
85年6月	0.042	0.029	0.043	0.054	0.029	0.059	0.044
85年7月	0.028	0.023	0.012	0.022	0.012	0.048	0.099
85年8月	0.025	0.043	0.033	0.038	0.019	0.064	0.023
85年9月	0.049	0.033	0.078	0.026	0.029	0.022	0.052
85年10月	0.019	0.017	0.028	0.032	0.014	0.036	0.035
85年11月	0.016	0.013	0.010	0.031	0.012	0.029	0.023
85年12月	0.049	0.015	0.025	0.028	0.012	0.034	0.033
86年1月	0.042	0.028	0.030	0.024	0.012	0.045	0.025
86年2月	0.019	0.022	0.016	0.036	0.024	0.030	0.025
86年3月	0.028	0.032	0.024	0.026	0.021	0.027	0.029
86年4月	0.036	0.020	0.023	0.027	0.015	0.030	0.039
86年5月	0.032	0.021	0.021	0.026	0.018	0.027	0.031
86年6月	0.026	0.014	0.035	0.020	0.014	0.024	0.034
86年7月	0.023	0.012	0.024	0.017	0.024	0.030	0.044
86年8月	0.016	0.019	0.020	0.048	0.015	0.021	0.027
86年9月	0.016	0.014	0.019	0.027	0.011	0.021	0.028
86年10月	0.027	0.015	0.024	0.025	0.010	0.018	0.028
86年11月	0.026	0.020	0.017	0.042	0.012	0.033	0.028
86年12月	0.035	0.013	0.020	0.033	0.025	0.030	0.029
87年1月	0.046	0.025	0.037	0.030	0.021	0.036	0.032
87年2月	0.049	0.013	0.033	0.021	0.005	0.030	0.042
87年3月	0.015	0.030	0.022	0.022	0.019	0.030	0.028
87年4月	0.048	0.015	0.014	0.019	0.015	0.039	0.027
87年5月	0.025	0.017	0.010	0.025	0.010	0.017	0.019
87年6月	0.023	0.009	0.019	0.008	0.011	0.031	0.027

表3.1-6 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮小時平均值(最大值)監測結果（續1）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.007	0.016	0.014	0.019	0.010	0.033	0.011
87年8月	0.021	0.012	0.015	0.006	0.010	0.030	0.017
87年9月	0.010	0.014	0.032	0.011	0.012	0.022	0.016
87年10月	0.020	0.005	0.018	0.044	0.004	0.047	0.016
87年11月	0.007	0.017	0.021	0.010	0.029	0.018	0.038
87年12月	0.004	0.010	0.023	0.023	0.005	0.013	0.012
88年1月	0.014	0.017	0.022	0.040	0.006	0.031	0.018
88年2月	0.028	0.026	0.030	0.035	0.014	0.025	0.018
88年3月	0.025	0.029	0.027	0.017	0.022	0.027	0.042
88年4月	0.022	0.017	0.013	0.019	0.012	0.021	0.033
88年5月	0.041	0.014	0.018	0.030	0.009	0.026	0.022
88年6月	0.021	0.016	0.017	0.017	0.015	0.027	0.024
88年7月	0.019	0.013	0.027	0.010	0.018	0.044	0.021
88年8月	0.029	0.017	0.017	0.014	0.017	0.038	0.013
88年9月	0.014	0.014	0.022	匚	0.010	0.017	0.017
88年10月	0.019	0.009	0.033	0.019	0.008	0.020	0.033
88年11月	0.028	0.019	0.015	0.020	0.010	0.016	0.028
88年12月	0.026	0.017	0.014	0.028	0.011	0.012	0.029
89年1月	0.043	0.027	0.025	0.029	0.017	0.025	0.034
89年2月	0.027	0.021	0.023	0.028	0.020	0.033	0.029
89年3月	0.045	0.040	0.030	0.027	0.007	0.039	0.042
89年4月	0.043	0.030	0.019	0.030	0.025	0.026	0.032
89年5月	0.042	0.019	0.020	0.027	0.016	0.033	0.031
89年6月	0.024	0.016	0.021	0.023	0.013	0.032	0.027
89年7月	0.029	0.022	0.013	0.027	0.007	0.022	0.021
89年8月	0.022	0.014	0.025	0.025	0.028	0.033	0.023
89年9月	0.022	0.015	0.020	0.021	0.011	0.011	0.023
89年10月	0.021	0.012	0.015	0.028	0.020	0.030	0.028
89年11月	0.015	0.025	-	-	-	-	-
89年12月	0.021	0.018	-	-	-	-	-
90年1月	0.024	0.027	-	-	-	-	-
90年2月	0.028	0.029	0.012	0.016	0.014	0.030	0.025
90年3月	0.039	0.025	0.022	0.027	0.021	0.019	0.035
90年4月	0.035	0.024	0.022	0.031	0.013	0.020	0.026
90年5月	0.037	0.020	0.016	0.019	0.015	0.017	0.021
90年6月	0.025	0.013	0.016	0.019	0.017	0.023	0.013
90年7月	0.018	0.014	0.013	0.043	0.014	0.026	0.038
90年8月	0.025	0.021	0.039	0.039	0.006	0.042	0.011
90年9月	0.023	0.016	0.018	0.014	0.012	0.016	0.020
90年10月	0.023	0.013	0.012	0.021	0.012	0.030	0.022
90年11月	0.025	0.019	0.018	0.030	0.019	0.026	0.031
90年12月	0.027	0.031	0.016	0.010	0.017	0.027	0.017
91年1月	0.041	0.037	0.014	0.005	0.015	0.023	0.042
91年2月	0.032	0.031	0.014	0.012	0.009	0.045	0.034
91年3月	0.032	0.025	0.019	0.038	0.026	0.051	0.033
91年4月	0.029	0.019	0.016	0.013	0.013	0.049	0.028
91年5月	0.029	0.022	0.022	0.022	0.013	0.028	0.024
91年6月	0.020	0.019	0.008	0.017	0.015	0.039	0.019
91年7月	0.023	0.019	0.015	0.019	0.022	0.031	0.010
91年8月	0.026	0.011	0.015	0.021	0.005	0.020	0.010
91年9月	0.028	0.017	0.012	0.014	0.008	0.022	0.013
91年10月	0.030	0.020	0.040	0.033	0.033	0.026	0.033
91年11月	0.029	0.024	0.015	0.027	0.012	0.043	0.033
91年12月	0.040	0.031	0.022	0.035	0.011	0.039	0.030
92年1月	0.047	0.019	0.020	0.023	0.007	0.040	0.031
92年2月	0.028	0.019	0.023	0.019	0.013	0.035	0.048
92年3月	0.030	0.028	0.022	0.029	0.027	0.041	0.026
92年4月	0.030	0.016	0.018	0.020	0.010	0.044	0.039
92年5月	0.033	0.023	0.017	0.015	0.007	0.030	0.020
92年6月	0.027	0.022	0.013	0.022	0.010	0.010	0.005
92年7月	0.027	0.014	0.018	0.017	0.009	0.044	0.029
92年8月	0.025	0.015	0.019	0.011	0.013	0.049	0.018
92年9月	0.006	0.023	0.010	0.018	0.010	0.026	0.014

表3.1-6 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮小時平均值(最大值)監測結果（續2）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年10月	0.018	0.014	0.010	0.019	0.009	0.026	0.023
92年11月	0.033	0.016	0.028	0.020	0.011	0.037	0.020
92年12月	0.024	0.008	0.015	0.017	0.018	0.022	0.008
93年1月	0.064	0.027	0.021	0.017	0.028	0.031	0.027
93年2月	0.019	0.005	0.012	0.023	0.013	0.037	0.029
93年3月	0.022	0.004	0.015	* 0.172	0.011	0.028	0.028
93年4月	0.024	0.009	0.017	0.022	0.013	0.037	0.020
93年5月	0.018	0.025	0.012	0.033	0.017	0.036	0.020
93年6月	0.017	0.025	0.013	0.012	0.008	0.041	0.024
93年7月	0.025	0.005	0.013	0.017	0.013	0.035	0.022
93年8月	0.035	0.024	0.010	0.020	0.013	0.031	0.027
93年9月	0.044	0.014	0.007	0.015	0.009	0.023	0.031
93年10月	0.030	0.017	0.012	0.006	0.013	0.012	0.011
93年11月	0.025	0.034	0.013	0.035	0.011	0.023	0.031
93年12月	0.042	0.025	0.013	0.014	0.013	0.041	0.037
94年1月	0.041	0.029	0.014	0.005	0.014	0.012	0.036
94年2月	0.055	0.020	0.032	0.023	0.030	0.027	0.033
94年3月	0.059	0.012	0.018	0.029	0.029	0.044	0.040
94年4月	0.071	0.020	0.013	0.015	0.044	0.070	0.035
94年5月	0.029	0.009	0.013	0.021	0.018	0.030	0.031
94年6月	0.031	0.006	0.010	0.015	0.019	0.029	0.016
94年7月	0.026	0.016	0.014	0.011	0.006	0.032	0.016
94年8月	0.059	0.026	0.010	0.014	0.005	0.015	0.011
94年9月	0.026	0.016	0.010	0.072	0.018	0.024	0.034
94年10月	0.021	0.020	0.014	0.020	0.011	0.021	0.019
94年11月	0.031	0.020	0.011	0.013	0.010	0.018	0.031
94年12月	0.032	0.026	0.018	0.032	0.007	0.021	0.025
95年1月	0.038	0.039	0.014	0.020	0.011	0.031	0.029
95年2月	0.030	0.024	0.011	0.022	0.012	0.042	0.049
95年3月	0.038	0.035	0.033	0.029	0.010	0.028	0.027
95年4月	0.029	0.015	0.006	0.014	0.022	0.044	0.042
95年5月	0.022	0.015	0.017	0.025	0.017	0.017	0.016
95年6月	0.054	0.027	0.011	0.010	0.008	0.038	0.034
95年7月	0.030	0.020	0.017	0.007	0.008	0.013	0.016
95年8月	0.028	0.063	0.018	0.018	0.009	0.031	0.019
95年9月	0.031	0.017	0.011	0.010	0.008	0.038	0.034
95年10月	0.048	0.035	0.010	0.016	0.009	0.022	0.025
95年11月	0.041	0.027	0.012	0.029	0.013	0.026	0.033
95年12月	0.055	0.027	0.010	0.026	0.015	0.030	0.043
96年1月	0.030	0.046	0.010	0.020	0.014	0.044	0.029
96年2月	0.026	0.029	0.029	0.017	0.020	0.049	0.037
96年3月	0.039	0.039	0.012	0.029	0.009	0.033	0.034
96年4月	0.030	0.019	0.019	0.021	0.021	0.027	0.046
96年5月	0.063	0.078	0.028	0.027	0.013	0.055	0.029
96年6月	0.043	0.019	0.012	0.019	0.013	0.030	0.031
96年7月	0.022	0.022	0.013	0.021	0.012	0.025	0.022
96年8月	0.028	0.014	0.010	0.007	0.011	0.028	0.014
96年9月	0.025	0.019	0.014	0.030	0.012	0.022	0.016
96年10月	0.028	0.018	0.014	0.016	0.018	0.027	0.034
96年11月	0.025	0.018	0.016	0.017	0.007	0.032	0.018
96年12月	0.040	0.020	0.012	0.019	0.014	0.033	0.030
97年1月	0.033	0.030	0.012	0.020	0.017	0.034	0.037
97年2月	0.041	0.029	0.015	0.027	0.025	0.047	0.034
97年3月	0.034	0.031	0.021	0.015	0.018	0.034	0.033
97年4月	0.033	0.024	0.018	0.018	0.009	0.036	0.028
97年5月	0.042	0.030	0.008	0.014	0.007	0.027	0.024
97年6月	0.023	0.017	0.009	0.008	0.013	0.009	0.010
97年7月	0.025	0.021	0.008	0.012	0.011	0.018	0.015
97年8月	0.016	0.012	0.010	0.008	0.010	0.023	0.007
97年9月	0.018	0.019	0.009	0.008	0.013	0.009	0.010
97年10月	0.023	0.013	0.006	0.014	0.007	0.017	0.017
97年11月	0.026	0.015	0.014	0.020	0.013	0.025	0.021
97年12月	0.033	0.020	0.015	0.020	0.014	0.025	0.022

表3.1-6 核四施工環境監測歷年空氣品質二氧化氮小時平均值(最大值)監測結果（續3）

(單位: ppm)

測站 時間	監測地點						
	澳底 國小	龍門 社區	貢寮 國小	福隆 海水浴場	川島 養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠 入口旁之民宅
98年1月	0.036	0.021	0.012	0.018	0.012	0.023	0.016
98年2月	0.028	0.023	0.016	0.016	0.010	0.026	0.023
98年3月	0.037	0.032	0.012	0.018	0.013	0.048	0.024
98年4月	0.029	0.024	0.021	0.021	0.015	0.044	0.021
98年5月	0.026	0.022	0.011	0.019	0.011	0.035	0.020
98年6月	0.019	0.015	0.010	0.015	0.014	0.024	0.014
98年7月	0.024	0.013	0.011	0.009	0.010	0.016	0.024
98年8月	0.018	0.020	0.009	0.014	0.010	0.032	0.010
98年9月	0.018	0.013	0.006	0.016	0.009	0.023	0.028
98年10月	0.027	0.014	0.011	0.027	0.012	0.028	0.038
98年11月	0.023	0.019	0.016	0.013	0.019	0.028	0.024
98年12月	0.051	0.044	0.011	0.045	0.017	0.029	0.030
99年1月	0.034	0.073	0.014	0.020	0.013	0.045	0.030
99年2月	0.122	0.043	0.040	0.021	0.038	0.041	0.041
99年3月	0.031	0.026	0.018	0.021	0.019	0.050	0.029
99年4月	0.029	0.023	0.015	0.022	0.013	0.054	0.035
99年5月	0.025	0.018	0.015	0.016	0.021	0.049	0.031
99年6月	0.028	0.018	0.012	0.021	0.018	0.027	0.023
99年7月	0.023	0.014	0.011	0.014	0.009	0.039	0.016
99年8月	0.023	0.016	0.011	0.013	0.009	0.037	0.020
99年9月	0.021	0.025	0.016	0.012	0.006	0.014	0.013
99年10月	0.028	0.019	0.012	0.011	0.006	0.029	0.018
99年11月	0.025	0.017	0.015	0.027	0.012	0.034	0.029
99年12月	0.030	0.023	0.015	0.016	0.012	0.052	0.026
100年1月	0.033	0.034	0.008	0.008	0.006	0.024	0.011
100年2月	0.038	0.038	0.034	0.013	0.014	0.034	0.024
100年3月	0.035	0.021	0.012	0.026	0.013	0.026	0.024
100年4月	0.030	0.020	0.021	0.016	0.013	0.022	0.035
100年5月	0.030	0.032	0.010	0.020	0.011	0.026	0.048
100年6月	0.018	0.013	0.004	0.010	0.007	0.014	0.024
100年7月	0.021	0.024	0.017	0.016	0.009	0.008	0.015
100年8月	0.014	0.011	0.008	0.012	0.008	0.015	0.024
100年9月	0.019	0.011	0.005	0.014	0.008	0.010	0.008
100年10月	0.023	0.012	0.011	0.015	0.006	0.031	0.011
100年11月	0.023	0.016	0.020	0.019	0.019	0.015	0.024
100年12月	0.027	0.019	0.013	0.024	0.009	0.025	0.022
101年1月	0.025	0.021	0.014	0.018	0.009	0.024	0.009
101年2月	0.026	0.021	0.022	0.016	0.022	0.018	0.025
101年3月	0.032	0.027	0.023	0.023	0.030	0.032	0.024
101年4月	0.024	0.016	0.011	0.014	0.008	0.024	0.011
101年5月	0.029	0.010	0.008	0.018	0.011	0.022	0.012
101年6月	0.021	0.023	0.006	0.023	0.005	0.010	0.015

註：(1)空氣品質標準二氧化氮小時平均值為0.25ppm。

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值。

(4)"□"表受地震影響，電源中斷。

(5)"-"表示監測工作停止執行。

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值。

表3.1-7 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳小時平均值(最大值)監測結果

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	1.80	1.90	1.40	2.50	-	-	-
82年9月	1.50	1.20	1.30	2.70	-	-	-
82年10月	1.60	1.30	1.30	1.40	-	-	-
82年11月	1.20	1.20	2.90	1.30	-	-	-
82年12月	0.90	1.10	1.00	1.00	-	-	-
83年1月	0.80	1.30	1.30	8.00	-	-	-
83年2月	0.80	1.10	1.00	0.90	-	-	-
83年3月	1.50	1.30	1.00	1.00	-	-	-
83年4月	2.40	1.70	1.50	1.60	-	-	-
83年5月	2.00	1.20	1.80	1.60	-	-	-
83年6月	1.80	1.60	1.20	1.00	-	-	-
83年7月	1.00	1.40	1.60	1.50	-	-	-
83年8月	1.60	1.00	1.20	3.10	-	-	-
83年9月	6.20	2.70	2.50	3.60	-	-	-
83年10月	1.30	2.00	2.80	2.40	-	-	-
83年11月	2.10	2.20	1.10	2.30	-	-	-
83年12月	1.20	1.50	1.10	2.60	-	-	-
84年1月	1.90	1.70	1.50	1.50	1.50	1.20	2.90
84年2月	0.90	1.40	1.80	2.40	2.20	1.40	2.40
84年3月	3.60	1.50	2.50	1.40	1.40	1.60	1.60
84年4月	1.40	1.20	0.80	1.60	1.20	1.30	1.20
84年5月	1.60	1.40	1.70	1.50	1.20	1.50	2.60
84年6月	1.00	1.30	1.00	0.90	1.30	1.60	1.40
84年7月	1.00	1.10	1.60	1.20	0.90	1.50	1.30
84年8月	1.30	0.90	0.70	1.50	0.90	2.20	2.10
84年9月	0.90	1.40	1.50	1.30	0.90	1.80	1.60
84年10月	1.60	1.30	1.60	1.50	0.80	1.90	2.20
84年11月	1.30	1.20	1.20	2.70	0.60	3.10	1.50
84年12月	1.70	1.30	2.30	1.50	0.90	1.00	2.10
85年1月	1.60	1.10	2.40	1.90	2.40	1.10	1.20
85年2月	1.00	1.30	1.60	1.50	2.70	2.00	2.40
85年3月	1.20	1.20	1.80	0.60	2.80	2.10	2.10
85年4月	2.10	0.70	0.90	1.20	0.90	0.90	1.80
85年5月	1.00	1.20	1.20	0.90	1.20	1.10	2.00
85年6月	1.90	2.10	1.30	2.10	1.10	1.00	0.90
85年7月	1.60	2.80	0.50	3.30	1.10	1.80	3.50
85年8月	1.10	0.80	1.10	1.10	0.70	* 8.50	1.10
85年9月	1.00	0.90	1.30	0.80	1.10	1.00	2.10
85年10月	0.70	1.10	0.80	0.90	0.90	0.80	1.00
85年11月	1.30	0.90	0.50	0.80	0.30	2.20	0.90
85年12月	1.50	0.50	1.40	0.60	0.80	0.80	1.80
86年1月	1.00	0.50	1.00	0.50	0.60	1.10	0.80
86年2月	0.50	0.70	1.20	3.70	1.70	1.20	1.70
86年3月	1.40	0.50	1.70	0.70	1.20	0.70	1.40
86年4月	0.70	0.30	0.90	0.40	0.70	1.00	0.60
86年5月	1.10	1.10	1.10	0.80	1.00	1.40	0.80
86年6月	0.70	0.40	0.30	0.40	0.60	0.90	0.70
86年7月	0.60	0.50	0.50	0.70	0.60	1.30	0.80
86年8月	0.90	0.73	0.70	0.70	0.90	1.30	1.00
86年9月	1.80	0.80	0.40	0.50	0.80	0.60	1.00
86年10月	0.80	0.30	0.90	0.90	0.60	0.90	0.80
86年11月	1.00	0.70	0.89	1.02	0.90	1.00	0.50
86年12月	1.80	0.70	0.80	1.10	1.00	1.10	1.40
87年1月	0.90	1.50	1.30	0.70	1.30	0.70	1.70
87年2月	1.50	0.93	1.20	0.96	0.71	1.42	1.54
87年3月	0.55	0.99	1.65	0.90	0.78	1.13	1.04
87年4月	2.00	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.80
87年5月	0.90	1.00	1.20	0.90	0.90	1.20	0.80
87年6月	1.10	0.70	1.00	0.40	0.30	0.60	0.50

表3.1-7 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳小時平均值(最大值)監測結果（續1）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50
87年8月	0.70	0.40	1.00	0.90	0.30	1.10	0.40
87年9月	1.30	0.60	1.10	1.00	0.70	1.20	1.10
87年10月	1.20	0.30	0.60	0.40	0.70	0.50	1.00
87年11月	0.80	0.90	0.40	0.30	0.60	0.50	0.70
87年12月	0.80	0.80	0.50	0.70	0.40	0.80	0.60
88年1月	1.30	0.80	1.00	1.50	0.90	1.00	0.60
88年2月	0.90	0.80	1.00	1.10	0.60	0.70	1.30
88年3月	0.90	0.70	0.90	0.80	1.00	1.00	0.90
88年4月	0.90	0.90	1.00	0.90	0.70	0.90	1.20
88年5月	1.70	0.80	0.90	1.50	0.80	0.80	0.90
88年6月	1.00	0.70	0.70	0.90	0.70	0.80	1.00
88年7月	0.98	0.47	0.90	0.81	0.64	0.89	0.92
88年8月	0.81	0.56	0.61	0.77	0.67	0.85	0.50
88年9月	0.51	0.44	0.84	匚	0.63	0.86	0.49
88年10月	0.83	0.55	0.85	0.57	0.40	0.94	0.80
88年11月	1.10	0.60	0.70	0.30	0.87	0.89	1.05
88年12月	0.71	0.76	0.83	0.91	0.61	0.55	0.75
89年1月	1.10	0.90	1.10	1.00	0.80	1.30	1.00
89年2月	1.00	0.70	0.90	0.50	0.90	0.70	1.10
89年3月	1.50	1.00	1.00	1.00	0.50	1.20	1.50
89年4月	1.00	0.70	0.74	1.19	0.85	0.62	0.66
89年5月	1.00	4.20	0.82	0.54	0.49	0.72	0.67
89年6月	0.90	1.10	0.71	0.71	0.67	1.02	0.69
89年7月	0.80	1.00	0.39	0.95	0.33	0.68	0.42
89年8月	0.80	0.90	0.65	0.56	0.46	0.65	0.82
89年9月	0.80	0.90	0.92	0.64	0.40	0.70	0.87
89年10月	1.10	1.10	0.84	0.48	0.67	1.34	0.65
89年11月	1.90	1.90	-	-	-	-	-
89年12月	1.00	1.90	-	-	-	-	-
90年1月	1.00	0.80	-	-	-	-	-
90年2月	1.30	0.60	0.92	0.75	0.78	1.16	0.82
90年3月	1.20	0.60	0.90	0.89	0.84	0.80	0.94
90年4月	1.30	0.90	0.87	0.90	0.85	0.41	0.86
90年5月	1.20	1.00	1.15	1.04	0.31	0.93	1.05
90年6月	1.00	0.70	0.36	0.75	0.83	0.80	1.02
90年7月	1.00	0.80	0.42	1.63	0.61	1.20	1.49
90年8月	1.00	0.77	0.79	1.17	0.83	1.53	1.42
90年9月	0.77	0.65	1.47	0.69	0.62	1.23	0.61
90年10月	0.97	0.58	1.37	1.64	0.85	1.40	1.12
90年11月	1.00	0.73	0.98	1.57	0.96	1.23	1.10
90年12月	1.00	0.62	0.79	0.74	0.74	1.53	0.79
91年1月	0.90	0.70	0.40	0.82	1.15	1.40	0.99
91年2月	0.90	0.70	0.81	0.50	0.96	1.27	1.15
91年3月	0.90	0.60	0.98	0.79	0.89	1.48	1.26
91年4月	0.99	0.62	0.73	0.87	1.05	0.84	0.97
91年5月	1.63	0.65	0.54	0.81	0.48	1.20	0.98
91年6月	1.00	0.36	0.88	1.11	0.75	1.90	0.84
91年7月	0.71	0.60	0.90	0.76	0.58	1.45	0.67
91年8月	0.96	0.40	0.78	0.62	0.72	1.34	0.68
91年9月	0.95	0.45	0.65	0.69	0.76	1.00	1.39
91年10月	1.10	3.40	0.59	1.36	1.09	1.85	1.14
91年11月	1.40	1.40	0.58	1.19	1.11	1.21	0.83
91年12月	0.90	1.40	0.48	0.73	0.63	1.08	1.06
92年1月	0.89	0.71	1.15	1.05	0.45	1.12	1.09
92年2月	0.86	0.59	1.16	0.81	0.78	1.25	1.10
92年3月	0.83	0.67	0.50	1.06	1.21	1.35	0.99
92年4月	0.93	0.99	0.97	0.74	0.85	1.13	1.24
92年5月	0.19	0.95	0.47	1.02	0.76	1.06	1.24
92年6月	1.03	0.80	0.43	0.73	0.62	1.24	0.93
92年7月	0.86	0.80	0.62	0.81	0.45	1.16	1.02
92年8月	1.05	0.80	0.75	0.75	0.54	1.72	0.59
92年9月	0.88	0.62	0.57	0.64	0.42	1.25	0.89

表3.1-7 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳小時平均值(最大值)監測結果（續2）

(單位: ppm)

測站 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年10月	1.04	1.65	0.50	0.45	0.48	1.22	0.77
92年11月	0.95	1.06	0.98	0.76	0.59	0.90	0.85
92年12月	0.89	0.62	0.59	0.93	0.73	0.51	1.11
93年1月	1.19	1.30	0.61	0.62	0.50	0.57	0.73
93年2月	1.55	1.25	0.57	0.91	0.83	1.06	0.66
93年3月	1.38	1.02	0.69	1.94	0.44	0.65	0.36
93年4月	1.60	0.84	0.68	0.72	0.38	1.33	0.68
93年5月	1.37	1.15	0.70	0.88	0.64	1.43	0.53
93年6月	0.93	1.55	0.77	0.76	0.65	0.97	1.17
93年7月	1.16	0.77	0.53	0.81	0.51	0.80	0.86
93年8月	1.09	1.60	0.61	0.49	0.74	1.29	0.62
93年9月	1.22	0.62	0.46	0.88	0.70	0.90	1.15
93年10月	1.50	0.70	0.17	0.14	0.74	0.44	0.30
93年11月	2.30	0.80	0.22	0.38	0.37	0.14	0.32
93年12月	1.00	0.90	0.30	0.39	0.18	0.31	0.36
94年1月	0.95	0.99	0.51	0.55	0.75	1.20	1.04
94年2月	1.03	0.95	0.83	0.82	0.67	1.04	0.91
94年3月	1.14	0.97	0.55	0.75	0.74	0.89	0.74
94年4月	1.10	1.00	0.60	0.60	0.80	0.60	0.80
94年5月	1.10	2.10	0.80	0.60	0.60	1.10	0.90
94年6月	1.00	1.00	0.60	0.60	0.90	1.10	0.90
94年7月	1.14	3.25	0.76	0.55	0.55	0.64	0.62
94年8月	1.05	0.87	0.33	0.68	0.58	0.65	0.59
94年9月	1.00	0.95	0.69	0.57	0.54	0.76	0.89
94年10月	1.03	0.61	0.73	0.50	0.47	0.96	0.63
94年11月	1.12	0.55	0.65	1.02	0.67	0.77	0.82
94年12月	0.92	1.00	0.70	0.70	0.76	1.49	0.48
95年1月	1.16	1.19	0.53	0.91	0.76	0.80	0.84
95年2月	1.05	0.90	0.78	0.85	0.63	0.50	0.81
95年3月	1.14	1.30	0.44	1.12	0.77	0.96	1.13
95年4月	0.90	1.00	0.59	0.51	0.87	1.12	0.82
95年5月	0.87	0.47	0.52	0.49	0.68	1.09	0.55
95年6月	0.72	0.46	0.37	0.59	0.38	0.86	0.46
95年7月	0.60	0.20	0.70	0.45	0.50	0.97	0.49
95年8月	0.70	0.60	1.05	0.77	0.67	0.94	2.30
95年9月	1.00	1.00	0.53	0.50	0.49	0.99	0.96
95年10月	0.87	2.25	0.80	0.70	0.70	0.60	0.60
95年11月	1.15	2.23	0.40	0.80	1.30	1.20	1.00
95年12月	1.25	0.87	0.50	1.30	0.80	1.20	1.10
96年1月	1.34	1.02	0.74	0.73	0.51	1.42	0.97
96年2月	1.05	0.75	0.96	0.58	0.74	0.87	0.96
96年3月	0.80	0.76	0.71	0.69	0.63	0.61	1.80
96年4月	0.82	0.56	0.80	0.70	0.60	1.00	0.60
96年5月	0.86	0.55	0.60	0.60	0.40	1.60	0.90
96年6月	0.77	0.46	0.70	0.70	0.50	0.90	0.90
96年7月	1.03	0.89	0.50	0.60	0.80	0.80	1.10
96年8月	1.00	0.60	0.90	0.50	0.70	1.00	0.40
96年9月	1.06	0.80	0.80	0.80	0.50	0.90	0.60
96年10月	1.53	1.25	0.46	2.77	0.63	0.66	0.76
96年11月	0.94	0.58	0.76	0.43	0.38	0.73	0.49
96年12月	1.41	0.89	0.58	0.47	0.44	0.60	0.99
97年1月	1.18	4.05	0.85	0.42	0.68	1.54	0.62
97年2月	1.24	1.13	0.75	0.74	0.53	1.38	0.69
97年3月	1.90	1.30	0.87	1.01	0.71	1.20	0.52
97年4月	1.22	1.16	0.37	0.58	0.77	1.00	0.51
97年5月	0.93	0.46	0.51	0.70	0.42	0.86	0.52
97年6月	4.62	0.46	0.90	0.50	0.51	1.30	0.47
97年7月	1.25	1.11	0.50	0.63	0.52	0.84	0.54
97年8月	0.99	0.76	0.47	0.45	0.70	1.14	0.34
97年9月	1.05	1.06	0.73	0.59	0.87	0.98	0.78
97年10月	0.78	0.67	0.66	0.46	0.42	1.18	1.23
97年11月	0.86	0.72	0.76	0.42	0.41	1.42	0.41
97年12月	1.18	1.20	0.74	0.36	0.53	0.96	0.56

表3.1-7 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳小時平均值(最大值)監測結果（續3）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
98年1月	1.16	1.16	0.53	1.04	0.68	0.85	0.45
98年2月	1.36	1.08	0.67	0.66	0.97	1.02	0.74
98年3月	2.12	1.09	0.52	0.72	0.85	1.51	1.19
98年4月	1.30	1.03	0.58	0.42	0.84	1.71	0.46
98年5月	1.01	1.03	0.52	0.47	0.35	1.06	0.43
98年6月	0.97	1.28	0.65	0.43	0.53	1.23	0.65
98年7月	1.25	0.72	0.50	0.37	0.59	1.02	0.32
98年8月	0.96	1.78	0.55	0.43	0.38	1.26	0.47
98年9月	0.80	0.87	0.65	0.43	0.64	1.12	1.03
98年10月	1.27	0.94	0.87	0.83	0.63	1.13	0.82
98年11月	0.83	1.32	0.63	0.60	0.84	0.96	1.17
98年12月	1.49	1.50	0.59	1.21	0.40	1.35	1.35
99年1月	1.24	4.68	0.66	0.71	0.56	1.44	0.93
99年2月	0.96	1.21	0.98	0.57	0.89	0.87	0.91
99年3月	1.63	1.40	0.67	0.89	0.77	1.11	1.90
99年4月	1.27	1.25	0.62	0.69	0.55	0.82	0.62
99年5月	1.2	1.6	0.6	0.7	0.4	1.0	0.6
99年6月	1.1	1.1	0.7	0.4	0.5	1.3	0.7
99年7月	1.0	1.0	0.7	0.3	0.5	0.9	0.5
99年8月	1.1	0.7	1.1	0.3	0.6	0.8	0.9
99年9月	1.1	1.3	0.6	0.7	0.5	0.6	1.1
99年10月	2.6	1.1	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4
99年11月	1.1	1.1	0.7	1.0	0.3	0.8	1.3
99年12月	0.9	0.9	0.6	0.8	0.5	0.9	0.8
100年1月	1.5	1.2	0.4	1.6	0.4	0.8	0.4
100年2月	1.1	1.0	0.8	0.4	0.6	1.7	0.5
100年3月	1.1	1.2	0.9	0.7	0.8	0.3	0.5
100年4月	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
100年5月	0.9	0.9	0.4	0.7	0.7	0.8	0.5
100年6月	0.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.9	0.5
100年7月	0.6	0.8	0.3	0.5	0.7	0.5	0.8
100年8月	0.8	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7
100年9月	0.9	1.0	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5
100年10月	1.0	1.2	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8
100年11月	1.4	1.4	1.3	0.3	0.7	0.5	0.7
100年12月	1.0	1.3	0.8	1.1	0.6	0.4	0.5
101年1月	1.0	1.2	0.6	0.3	0.4	0.9	0.4
101年2月	2.1	1.3	0.6	0.7	1.2	1.6	0.6
101年3月	1.1	1.4	0.8	0.6	0.9	0.6	1.0
101年4月	1.1	0.8	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6
101年5月	1.0	1.1	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4
101年6月	0.9	0.9	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5

註：(1)空氣品質標準一氧化碳最大小時平均值為9ppm。

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值。

(4)"⊏"表受地震影響，電源中斷。

(5)"-"表示監測工作停止執行。

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值。

(7)一氧化碳有效位數表示依環檢所99年3月5日環檢一字第0990000919號函修正。

表3.1-8 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳 8小時平均值(最大值)監測結果

(單為: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	1.80	1.70	1.40	2.00	-	-	-
82年9月	1.40	1.10	1.20	1.70	-	-	-
82年10月	1.50	1.20	1.00	1.00	-	-	-
82年11月	1.10	1.00	1.60	1.30	-	-	-
82年12月	0.70	0.50	0.80	1.00	-	-	-
83年1月	0.30	1.20	1.00	1.80	-	-	-
83年2月	0.70	0.70	0.80	0.70	-	-	-
83年3月	1.00	0.80	0.70	0.80	-	-	-
83年4月	1.70	1.20	1.40	1.40	-	-	-
83年5月	1.20	1.10	1.50	1.10	-	-	-
83年6月	0.90	1.20	0.80	0.80	-	-	-
83年7月	0.90	1.20	0.80	0.80	-	-	-
83年8月	1.50	1.20	1.00	3.80	-	-	-
83年9月	3.70	2.10	2.20	2.90	-	-	-
83年10月	0.80	1.30	2.50	1.30	-	-	-
83年11月	1.70	1.40	1.10	2.10	-	-	-
83年12月	0.70	1.30	0.80	1.90	-	-	-
84年1月	1.80	0.90	0.90	1.40	1.10	1.00	2.20
84年2月	0.40	1.10	1.20	1.80	1.70	1.50	1.20
84年3月	1.50	1.00	1.50	0.80	1.00	1.00	1.10
84年4月	1.20	1.00	0.50	1.00	0.80	0.80	1.00
84年5月	1.20	1.00	1.40	1.30	1.00	1.20	1.90
84年6月	0.90	1.10	0.80	0.70	1.20	1.20	1.20
84年7月	0.86	1.00	1.22	1.00	0.78	1.20	1.19
84年8月	1.00	0.78	0.61	1.35	0.63	1.56	1.59
84年9月	0.71	0.66	1.10	1.06	0.56	1.48	1.31
84年10月	2.00	1.20	0.90	1.20	1.10	1.30	1.50
84年11月	1.00	0.80	0.60	2.50	0.60	1.30	1.40
84年12月	1.40	1.20	2.10	1.40	0.80	0.80	1.90
85年1月	2.00	0.80	1.30	1.60	2.10	1.50	1.10
85年2月	0.90	1.10	1.30	1.20	1.60	1.40	1.80
85年3月	1.00	0.90	1.70	0.50	2.20	1.80	1.90
85年4月	1.80	1.60	0.70	1.00	0.70	0.70	0.70
85年5月	0.70	1.00	0.90	0.80	0.80	1.00	0.90
85年6月	1.30	1.60	1.10	1.60	0.90	0.90	0.70
85年7月	1.10	2.00	0.40	2.30	0.50	1.10	2.00
85年8月	0.70	0.70	0.80	1.00	0.60	* 3.80	0.70
85年9月	0.90	0.50	1.10	0.50	0.90	0.40	0.70
85年10月	0.60	1.00	0.60	0.40	0.60	0.40	0.70
85年11月	1.10	0.80	0.30	0.60	0.20	1.20	0.40
85年12月	1.30	0.40	1.30	0.50	0.70	0.60	1.70
86年1月	0.60	0.40	0.70	0.50	0.50	0.70	0.70
86年2月	0.40	0.60	1.00	0.90	1.50	1.00	0.80
86年3月	0.70	0.40	0.80	0.50	0.90	0.30	0.90
86年4月	0.50	0.30	0.60	0.40	0.40	0.50	0.60
86年5月	0.70	0.80	0.80	0.50	0.60	1.10	0.60
86年6月	0.50	0.40	0.20	0.30	0.60	0.60	0.50
86年7月	0.46	0.34	0.44	0.54	0.50	1.05	0.69
86年8月	0.84	0.69	0.56	0.69	0.76	1.18	0.85
86年9月	1.41	0.80	0.31	0.38	0.68	0.41	0.91
86年10月	0.60	0.50	0.70	0.50	0.30	0.60	0.70
86年11月	0.94	0.59	0.78	0.80	0.48	0.98	0.36
86年12月	1.49	0.61	0.68	0.70	0.86	0.89	1.21
87年1月	0.81	0.98	0.83	0.53	1.19	0.61	1.68
87年2月	1.20	0.63	1.03	0.90	0.50	1.39	1.30
87年3月	0.43	0.89	1.29	0.74	0.66	0.59	0.98
87年4月	1.10	0.50	0.60	0.60	0.70	0.60	0.60
87年5月	0.70	0.90	1.10	0.50	0.80	1.00	0.70
87年6月	1.00	0.40	0.90	0.30	0.20	0.50	0.40

表3.1-8 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳 8小時平均值(最大值)監測結果(續1)

(單為: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.30	0.60	0.50	0.40	0.30	0.50	0.40
87年8月	0.20	0.30	0.70	0.70	0.20	0.80	0.40
87年9月	0.70	0.50	0.90	0.90	0.60	0.90	1.00
87年10月	0.90	0.30	0.40	0.30	0.60	0.40	0.60
87年11月	0.40	0.80	0.30	0.30	0.40	0.50	0.60
87年12月	0.70	0.60	0.30	0.60	0.30	0.80	0.50
88年1月	1.00	0.70	0.70	1.20	0.90	0.80	0.50
88年2月	0.80	0.70	0.80	0.70	0.50	0.60	1.20
88年3月	0.60	0.50	0.50	0.80	0.80	0.80	0.60
88年4月	0.60	0.80	0.70	0.80	0.60	0.70	0.70
88年5月	1.30	0.50	0.70	1.00	0.70	0.60	0.60
88年6月	0.70	0.50	0.30	0.80	0.70	0.70	0.70
88年7月	0.66	0.42	0.80	0.52	0.42	0.68	0.86
88年8月	0.51	0.45	0.54	0.52	0.47	0.54	0.39
88年9月	0.34	0.36	0.73	匚	0.46	0.76	0.45
88年10月	0.60	0.50	0.75	0.49	0.33	0.83	0.67
88年11月	0.71	0.48	0.39	0.15	0.63	0.75	0.91
88年12月	0.62	0.62	0.54	0.70	0.56	0.47	0.53
89年1月	_(註6)	_(註6)	0.90	0.70	0.70	0.80	0.70
89年2月	_(註6)	_(註6)	0.60	0.40	0.50	0.60	1.00
89年3月	_(註6)	_(註6)	0.70	0.60	0.40	1.10	1.30
89年4月	_(註6)	_(註6)	0.69	1.10	0.66	0.50	0.62
89年5月	_(註6)	_(註6)	0.65	0.43	0.41	0.55	0.58
89年6月	_(註6)	_(註6)	0.65	0.60	0.60	0.60	0.55
89年7月	_(註6)	_(註6)	0.29	0.51	0.30	0.57	0.33
89年8月	_(註6)	_(註6)	0.49	0.45	0.34	0.46	0.65
89年9月	_(註6)	_(註6)	0.82	0.50	0.33	0.61	0.76
89年10月	_(註6)	_(註6)	0.72	0.39	0.64	0.96	0.35
89年11月	_(註6)	_(註6)	-	-	-	-	-
89年12月	_(註6)	_(註6)	-	-	-	-	-
90年1月	_(註6)	_(註6)	-	-	-	-	-
90年2月	_(註6)	_(註6)	0.82	0.72	0.73	0.99	0.58
90年3月	_(註6)	_(註6)	0.75	0.79	0.77	0.57	0.77
90年4月	_(註6)	_(註6)	0.78	0.77	0.74	0.27	0.81
90年5月	_(註6)	_(註6)	0.95	0.87	0.21	0.55	0.93
90年6月	_(註6)	_(註6)	0.33	0.56	0.65	0.78	0.98
90年7月	_(註6)	_(註6)	0.29	0.80	0.47	0.97	0.70
90年8月	_(註6)	_(註6)	0.33	0.77	0.58	1.15	0.86
90年9月	_(註6)	_(註6)	1.38	0.62	0.56	0.90	0.56
90年10月	_(註6)	_(註6)	0.99	1.45	0.82	1.22	0.94
90年11月	_(註6)	_(註6)	0.86	1.33	0.85	1.18	0.86
90年12月	_(註6)	_(註6)	0.71	0.69	0.59	1.42	0.68
91年1月	_(註6)	_(註6)	0.35	0.76	1.05	0.66	0.75
91年2月	_(註6)	_(註6)	0.65	0.36	0.65	1.19	1.00
91年3月	_(註6)	_(註6)	0.93	0.71	0.83	1.24	1.12
91年4月	_(註6)	_(註6)	0.69	0.78	1.01	0.74	0.93
91年5月	_(註6)	_(註6)	0.50	0.76	0.41	1.08	0.79
91年6月	_(註6)	_(註6)	0.71	0.98	0.66	1.04	0.77
91年7月	_(註6)	_(註6)	0.80	0.68	0.50	1.20	0.57
91年8月	_(註6)	_(註6)	0.61	0.49	0.60	1.26	0.61
91年9月	_(註6)	_(註6)	0.61	0.61	0.68	0.95	0.85
91年10月	_(註6)	_(註6)	0.54	1.08	1.02	1.71	1.06
91年11月	_(註6)	_(註6)	0.47	1.04	0.90	1.03	0.78
91年12月	_(註6)	_(註6)	0.39	0.53	0.55	0.98	0.92
92年1月	_(註6)	_(註6)	1.06	1.03	0.41	1.07	0.96
92年2月	_(註6)	_(註6)	0.84	0.74	0.70	1.17	0.99
92年3月	_(註6)	_(註6)	0.37	1.05	0.85	0.93	0.79
92年4月	_(註6)	_(註6)	0.69	0.66	0.81	0.83	1.19
92年5月	_(註6)	_(註6)	0.82	0.91	0.69	0.94	1.19
92年6月	_(註6)	_(註6)	0.71	0.64	0.60	1.09	0.80

表3.1-8 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳 8小時平均值(最大值)監測結果(續2)

(單為: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年7月	_(註6)	_(註6)	0.53	0.59	0.43	0.88	0.89
92年8月	_(註6)	_(註6)	0.63	0.54	0.36	1.57	0.50
92年9月	_(註6)	_(註6)	0.41	0.54	0.37	1.11	0.65
92年10月	_(註6)	_(註6)	0.48	0.41	0.43	1.16	0.70
92年11月	_(註6)	_(註6)	0.80	0.67	0.52	0.57	0.54
92年12月	_(註6)	_(註6)	0.44	0.90	0.58	0.35	1.04
93年1月	_(註6)	_(註6)	0.56	0.58	0.43	0.46	0.56
93年2月	_(註6)	_(註6)	0.51	0.75	0.69	0.91	0.48
93年3月	_(註6)	_(註6)	0.52	0.86	0.33	0.61	0.34
93年4月	_(註6)	_(註6)	0.46	0.57	0.37	1.07	0.57
93年5月	_(註6)	_(註6)	0.61	0.73	0.54	0.86	0.47
93年6月	_(註6)	_(註6)	0.70	0.64	0.58	0.66	1.00
93年7月	_(註6)	_(註6)	0.52	0.75	0.43	0.61	0.68
93年8月	_(註6)	_(註6)	0.42	0.41	0.69	1.00	0.57
93年9月	_(註6)	_(註6)	0.39	0.84	0.62	0.78	0.96
93年10月	_(註6)	_(註6)	0.48	0.20	1.10	0.73	0.45
93年11月	_(註6)	_(註6)	0.70	0.69	0.53	0.59	0.67
93年12月	_(註6)	_(註6)	0.63	0.56	0.75	1.01	0.99
94年1月	_(註6)	_(註6)	0.48	0.53	0.71	1.10	0.85
94年2月	_(註6)	_(註6)	0.75	0.70	0.55	0.95	0.87
94年3月	_(註6)	_(註6)	0.49	0.61	0.61	0.67	0.70
94年4月	_(註6)	_(註6)	0.50	0.50	0.70	0.50	0.50
94年5月	_(註6)	_(註6)	0.70	0.60	0.50	0.90	0.70
94年6月	_(註6)	_(註6)	0.50	0.50	0.80	0.80	0.70
94年7月	_(註6)	_(註6)	0.69	0.48	0.53	0.55	0.54
94年8月	_(註6)	_(註6)	0.26	0.65	0.56	0.55	0.43
94年9月	_(註6)	_(註6)	0.54	0.42	0.43	0.66	0.66
94年10月	_(註6)	_(註6)	0.71	0.25	0.45	0.87	0.55
94年11月	_(註6)	_(註6)	0.59	0.81	0.61	0.54	0.70
94年12月	_(註6)	_(註6)	0.60	0.50	0.70	0.65	0.42
95年1月	_(註6)	_(註6)	0.39	0.89	0.56	0.72	0.72
95年2月	_(註6)	_(註6)	0.70	0.58	0.42	0.40	0.68
95年3月	_(註6)	_(註6)	0.38	0.78	0.66	0.84	0.69
95年4月	_(註6)	_(註6)	0.53	0.40	0.80	0.99	0.55
95年5月	_(註6)	_(註6)	0.46	0.44	0.60	0.81	0.45
95年6月	_(註6)	_(註6)	0.33	0.43	0.25	0.62	0.36
95年7月	_(註6)	_(註6)	0.57	0.38	0.42	0.79	0.43
95年8月	_(註6)	_(註6)	0.80	0.72	0.63	0.87	1.03
95年9月	_(註6)	_(註6)	0.40	0.43	0.45	0.65	0.59
95年10月	_(註6)	_(註6)	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60
95年11月	_(註6)	_(註6)	0.40	0.70	0.90	1.10	0.50
95年12月	_(註6)	_(註6)	0.40	1.10	0.60	1.10	0.80
96年1月	_(註6)	_(註6)	0.52	0.55	0.44	1.12	0.72
96年2月	_(註6)	_(註6)	0.76	0.52	0.59	0.77	0.82
96年3月	_(註6)	_(註6)	0.42	0.60	0.56	0.43	1.07
96年4月	_(註6)	_(註6)	0.70	0.60	0.40	0.60	0.50
96年5月	_(註6)	_(註6)	0.50	0.60	0.40	1.10	0.50
96年6月	_(註6)	_(註6)	0.60	0.60	0.50	0.70	0.60
96年7月	_(註6)	_(註6)	0.40	0.60	0.70	0.60	0.80
96年8月	_(註6)	_(註6)	0.70	0.40	0.50	0.60	0.30
96年9月	_(註6)	_(註6)	0.59	0.73	0.38	0.57	0.44
96年10月	_(註6)	_(註6)	0.40	0.71	0.54	0.39	0.57
96年11月	_(註6)	_(註6)	0.65	0.38	0.32	0.62	0.27
96年12月	_(註6)	_(註6)	0.43	0.44	0.34	0.46	0.91
97年1月	_(註6)	_(註6)	0.75	0.32	0.54	0.93	0.48
97年2月	_(註6)	_(註6)	0.57	0.63	0.49	0.94	0.55
97年3月	_(註6)	_(註6)	0.73	0.84	0.59	1.01	0.45
97年4月	_(註6)	_(註6)	0.34	0.55	0.71	0.75	0.45
97年5月	_(註6)	_(註6)	0.47	0.64	0.39	0.63	0.38
97年6月	_(註6)	_(註6)	0.81	0.43	0.45	0.87	0.39
97年7月	_(註6)	_(註6)	0.32	0.54	0.45	0.67	0.47
97年8月	_(註6)	_(註6)	0.44	0.40	0.60	0.80	0.33
97年9月	_(註6)	_(註6)	0.56	0.46	0.44	0.80	0.66

表3.1-8 核四施工環境監測歷年空氣品質一氧化碳 8小時平均值(最大值)監測結果(續3)

(單為: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
97年10月	_(註6)	_(註6)	0.41	0.39	0.35	0.45	1.13
97年11月	_(註6)	_(註6)	0.60	0.35	0.25	0.87	0.27
97年12月	_(註6)	_(註6)	0.62	0.31	0.43	0.83	0.40
98年1月	_(註6)	_(註6)	0.47	0.93	0.62	0.65	0.37
98年2月	_(註6)	_(註6)	0.53	0.48	0.94	0.69	0.54
98年3月	_(註6)	_(註6)	0.33	0.51	0.62	0.75	1.05
98年4月	_(註6)	_(註6)	0.51	0.38	0.68	0.73	0.38
98年5月	_(註6)	_(註6)	0.34	0.40	0.32	0.50	0.34
98年6月	_(註6)	_(註6)	0.54	0.39	0.44	0.59	0.54
98年7月	_(註6)	_(註6)	0.33	0.23	0.45	0.55	0.28
98年8月	_(註6)	_(註6)	0.33	0.35	0.31	0.48	0.38
98年9月	_(註6)	_(註6)	0.56	0.38	0.61	0.61	0.72
98年10月	_(註6)	_(註6)	0.62	0.67	0.56	0.45	0.54
98年11月	_(註6)	_(註6)	0.45	0.56	0.60	0.71	0.53
98年12月	_(註6)	_(註6)	0.49	1.05	0.31	0.80	0.89
99年1月	_(註6)	_(註6)	0.51	0.53	0.43	1.18	0.86
99年2月	_(註6)	_(註6)	0.80	0.55	0.73	0.61	0.64
99年3月	_(註6)	_(註6)	0.64	0.72	0.64	0.85	1.77
99年4月	_(註6)	_(註6)	0.57	0.52	0.50	0.52	0.52
99年5月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.6	0.3	0.5	0.3
99年6月	_(註6)	_(註6)	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5
99年7月	_(註6)	_(註6)	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3
99年8月	_(註6)	_(註6)	0.8	0.3	0.4	0.7	0.4
99年9月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4
99年10月	_(註6)	_(註6)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
99年11月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.7	0.2	0.5	0.8
99年12月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7
100年1月	_(註6)	_(註6)	0.4	1.5	0.3	0.6	0.2
100年2月	_(註6)	_(註6)	0.7	0.4	0.4	1.1	0.5
100年3月	_(註6)	_(註6)	0.8	0.6	0.6	0.2	0.5
100年4月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3
100年5月	_(註6)	_(註6)	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4
100年6月	_(註6)	_(註6)	0.2	0.3	0.3	0.7	0.4
100年7月	_(註6)	_(註6)	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6
100年8月	_(註6)	_(註6)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6
100年9月	_(註6)	_(註6)	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4
100年10月	_(註6)	_(註6)	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6
100年11月	_(註6)	_(註6)	0.9	0.2	0.4	0.4	0.6
100年12月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
101年1月	_(註6)	_(註6)	0.6	0.3	0.4	0.8	0.3
101年2月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.6	0.4	1.0	0.5
101年3月	_(註6)	_(註6)	0.5	0.6	0.7	0.5	0.8
101年4月	_(註6)	_(註6)	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5
101年5月	_(註6)	_(註6)	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
101年6月	_(註6)	_(註6)	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5

註：(1)空氣品質標準一氧化碳最大8小時平均值為9ppm。

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值。

(4)"Ｃ"表受地震影響，電源中斷。

(5)"-"表示監測工作停止執行。

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值。

(7)一氧化碳有效位數表示依環檢所99年3月5日環檢一字第0990000919號函修正。

表3.1-9 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物日平均值(最大值)監測結果

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	0.20	0.30	0.30	0.40	-	-	-
82年9月	0.10	0.50	0.30	0.10	-	-	-
82年10月	0.50	0.60	0.40	0.40	-	-	-
82年11月	0.50	0.40	0.30	0.40	-	-	-
82年12月	0.50	0.40	0.30	0.30	-	-	-
83年1月	0.10	0.60	0.20	0.30	-	-	-
83年2月	0.10	0.40	0.50	0.20	-	-	-
83年3月	0.20	0.30	0.20	0.20	-	-	-
83年4月	0.70	0.50	0.60	0.30	-	-	-
83年5月	0.40	0.30	0.60	0.40	-	-	-
83年6月	0.40	0.60	0.60	0.40	-	-	-
83年7月	0.50	0.30	0.40	0.80	-	-	-
83年8月	0.30	0.40	0.40	2.60	-	-	-
83年9月	1.00	0.30	0.30	0.90	-	-	-
83年10月	0.59	0.41	0.41	0.38	-	-	-
83年11月	1.19	0.34	0.92	0.30	-	-	-
83年12月	0.65	0.37	0.28	1.09	-	-	-
84年1月	0.15	0.29	0.15	0.12	0.30	0.40	0.21
84年2月	0.31	0.28	0.29	0.34	0.33	0.36	0.24
84年3月	0.06	0.18	0.22	0.21	0.20	0.24	0.09
84年4月	0.32	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.12
84年5月	0.36	0.33	0.18	0.23	0.38	0.17	0.14
84年6月	0.56	0.40	0.35	0.38	0.27	0.73	0.55
84年7月	0.12	0.24	0.29	0.63	0.43	0.12	0.36
84年8月	0.29	0.35	0.33	0.47	0.31	0.31	0.43
84年9月	0.28	0.27	0.26	0.29	0.30	0.18	0.37
84年10月	0.22	0.14	0.08	0.10	0.11	0.10	0.13
84年11月	0.22	0.20	0.39	0.21	0.47	0.27	0.39
84年12月	0.16	0.14	0.76	0.09	0.08	0.21	0.03
85年1月	0.22	0.14	0.08	0.19	0.21	0.26	0.19
85年2月	0.22	0.02	0.10	0.05	0.03	0.20	0.18
85年3月	0.21	0.10	0.16	0.16	0.12	0.07	0.25
85年4月	0.19	0.09	0.07	0.06	0.09	0.11	0.23
85年5月	0.27	0.32	0.10	0.19	0.10	0.15	0.51
85年6月	0.36	0.17	0.27	0.24	0.25	0.15	0.15
85年7月	0.32	0.09	0.07	0.36	0.09	0.12	0.47
85年8月	0.96	0.88	* 2.30	1.35	0.61	0.82	0.96
85年9月	0.76	0.42	0.27	0.32	0.54	0.45	0.48
85年10月	0.37	0.17	0.36	0.29	0.32	0.59	0.59
85年11月	0.36	0.50	0.43	0.41	0.26	0.29	0.21
85年12月	0.76	0.41	0.90	0.29	0.99	0.24	1.28
86年1月	0.26	0.21	0.62	0.36	0.23	0.31	0.30
86年2月	0.13	0.47	0.65	0.29	0.73	0.30	0.29
86年3月	0.20	0.16	0.10	0.30	0.11	0.14	0.18
86年4月	0.23	0.15	0.13	0.08	0.12	0.23	0.14
86年5月	0.23	0.17	0.60	0.15	0.08	0.12	0.20
86年6月	0.43	0.27	0.16	0.17	0.29	0.24	0.31
86年7月	0.33	0.93	0.44	0.77	0.16	0.28	0.21
86年8月	0.21	0.20	0.40	0.41	0.26	0.24	0.46
86年9月	0.36	0.35	0.30	0.14	0.38	0.19	0.23
86年10月	0.46	0.24	0.29	0.25	0.15	0.13	0.23
86年11月	0.21	0.12	0.14	0.22	0.13	0.14	0.12
86年12月	0.34	0.28	0.23	0.30	0.22	0.28	0.34
87年1月	0.26	0.23	0.27	0.30	0.25	0.25	0.26
87年2月	0.51	0.30	0.34	0.17	0.20	0.19	0.40
87年3月	0.23	0.23	0.20	0.18	0.28	0.21	0.14
87年4月	0.41	0.32	0.29	0.28	0.32	0.26	0.32
87年5月	0.44	0.26	0.31	0.30	0.30	0.26	0.33
87年6月	0.52	0.18	0.32	0.17	0.30	0.24	0.26

表3.1-9 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物日平均值(最大值)監測結果（續1）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.35	0.42	0.42	0.46	0.24	0.43	0.35
87年8月	0.18	0.24	0.26	0.76	0.41	0.27	0.26
87年9月	0.32	0.23	0.41	0.29	0.32	0.27	0.30
87年10月	0.44	0.36	0.44	0.25	0.29	0.16	0.22
87年11月	0.28	0.28	0.26	0.20	0.19	0.23	0.25
87年12月	0.25	0.24	0.24	0.27	0.26	0.26	0.21
88年1月	0.39	0.31	0.40	0.42	0.27	0.42	0.31
88年2月	0.48	0.32	0.32	0.27	0.25	0.23	0.43
88年3月	0.34	0.22	0.20	0.19	0.23	0.25	0.26
88年4月	0.49	0.20	0.24	0.31	0.35	0.29	0.30
88年5月	0.28	0.25	0.29	0.22	0.26	0.21	0.33
88年6月	0.29	0.22	0.33	0.22	0.26	0.37	0.23
88年7月	0.41	0.28	0.37	0.29	0.28	0.26	0.27
88年8月	0.33	0.24	0.27	0.31	0.23	0.38	0.30
88年9月	0.30	0.27	0.39	⊏	0.35	0.46	0.34
88年10月	0.33	0.14	0.20	0.20	0.21	0.23	0.16
88年11月	0.62	0.20	0.25	0.29	0.19	0.20	0.22
88年12月	0.36	0.17	0.25	0.26	0.16	0.27	0.26
89年1月	0.39	0.32	0.21	0.20	0.15	0.26	0.33
89年2月	0.37	0.49	0.16	0.24	0.32	0.35	0.26
89年3月	0.26	0.58	0.25	0.19	0.19	0.40	0.29
89年4月	0.24	0.43	0.26	0.25	0.35	0.21	0.26
89年5月	0.58	0.53	0.24	0.17	0.21	0.30	0.53
89年6月	0.34	0.51	0.25	0.20	0.22	0.30	0.24
89年7月	0.36	0.54	0.28	0.22	0.21	0.23	0.74
89年8月	0.56	0.42	0.26	0.25	0.25	0.22	0.29
89年9月	0.53	0.48	0.22	0.23	0.20	0.29	0.20
89年10月	0.38	0.58	0.18	0.31	0.22	0.41	0.26
89年11月	0.24	0.55	-	-	-	-	-
89年12月	0.58	0.29	-	-	-	-	-
90年1月	0.34	0.37	-	-	-	-	-
90年2月	0.36	0.33	0.34	0.38	0.16	0.16	0.27
90年3月	0.41	0.32	0.20	0.20	0.27	0.35	0.31
90年4月	0.45	0.24	0.23	0.30	0.46	0.42	0.22
90年5月	0.22	0.53	0.23	0.23	0.41	0.37	0.23
90年6月	0.49	0.46	0.47	0.17	0.32	0.36	0.24
90年7月	0.36	0.44	0.39	0.29	0.25	0.29	0.37
90年8月	0.27	0.56	0.21	0.19	0.43	0.21	0.49
90年9月	0.22	0.48	0.40	0.21	0.47	0.40	0.51
90年10月	0.44	0.36	0.21	0.25	0.18	0.27	0.32
90年11月	0.28	0.28	0.33	0.36	0.29	0.21	0.21
90年12月	0.25	0.24	0.25	0.25	0.28	0.21	0.27
91年1月	0.24	0.20	0.27	0.21	0.30	0.21	0.33
91年2月	0.41	0.19	0.26	0.21	0.24	0.25	0.44
91年3月	0.66	0.28	0.36	0.24	0.36	0.26	0.48
91年4月	0.22	0.27	0.29	0.18	0.25	0.23	0.28
91年5月	0.24	0.28	0.28	0.21	0.20	0.23	0.33
91年6月	0.38	0.39	0.34	0.33	0.24	0.26	0.34
91年7月	0.37	0.28	0.34	0.18	0.20	0.30	0.29
91年8月	0.34	0.29	0.34	0.21	0.26	0.22	0.32
91年9月	0.20	0.32	0.29	0.24	0.20	0.24	0.35
91年10月	0.56	0.41	0.29	0.22	0.27	0.22	0.26
91年11月	0.89	0.36	0.29	0.23	0.28	0.31	0.23
91年12月	0.46	0.31	0.35	0.45	0.39	0.21	0.23
92年1月	0.21	0.35	0.44	0.18	0.38	0.24	0.18
92年2月	0.35	0.30	0.30	0.23	0.20	0.27	0.21
92年3月	0.33	0.54	0.29	0.16	0.30	0.28	0.23
92年4月	0.47	0.3.7	0.19	0.21	0.22	0.26	0.25
92年5月	0.43	0.32	0.25	0.22	0.16	0.30	0.26
92年6月	0.47	0.37	0.28	0.28	0.36	0.23	0.22

表3.1-9 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物日平均值(最大值)監測結果（續2）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年7月	0.56	0.39	0.22	0.33	0.27	0.31	0.26
92年8月	0.59	0.46	0.30	0.20	0.31	0.37	0.47
92年9月	0.30	0.38	0.26	0.48	0.27	0.23	0.53
92年10月	0.30	0.28	0.40	0.40	0.19	0.24	0.23
92年11月	0.25	0.31	0.25	0.19	0.36	0.22	0.31
92年12月	0.62	0.35	0.24	0.19	0.17	0.29	0.19
93年1月	0.49	0.33	0.37	0.18	0.32	0.33	0.26
93年2月	0.17	0.37	0.20	0.23	0.26	0.24	0.28
93年3月	0.16	0.34	0.18	0.16	0.18	0.29	0.27
93年4月	0.53	0.45	0.29	0.29	0.24	0.25	0.26
93年5月	0.60	0.35	0.27	0.23	0.28	0.36	0.27
93年6月	0.34	0.62	0.20	0.39	0.21	0.32	0.26
93年7月	0.61	0.68	0.46	0.33	0.35	0.32	0.35
93年8月	0.17	0.52	0.35	0.20	0.31	0.29	0.43
93年9月	0.50	0.68	0.29	0.23	0.27	0.39	0.33
93年10月	0.37	1.14	0.21	0.24	0.24	0.32	0.29
93年11月	0.83	0.96	0.17	0.29	0.22	0.27	0.27
93年12月	0.54	0.55	0.29	0.46	0.31	0.23	0.27
94年1月	0.42	0.62	0.31	0.25	0.25	0.31	0.25
94年2月	0.48	0.28	0.24	0.27	0.20	0.28	0.23
94年3月	0.46	0.19	0.25	0.25	0.41	0.53	0.37
94年4月	0.71	0.18	0.36	0.27	0.26	0.42	0.51
94年5月	0.60	0.48	0.25	0.25	0.34	0.23	0.26
94年6月	0.72	0.34	0.27	0.26	0.30	0.29	0.27
94年7月	0.89	0.20	0.39	0.29	0.25	0.35	0.29
94年8月	0.75	0.53	0.36	0.34	0.30	0.23	0.29
94年9月	0.76	0.61	0.40	0.21	0.25	0.29	0.39
94年10月	0.82	0.47	0.19	0.28	0.19	0.30	0.27
94年11月	0.44	0.28	0.27	0.14	0.14	0.27	0.50
94年12月	1.22	0.47	0.27	0.44	0.15	0.21	0.18
95年1月	1.24	0.41	0.32	0.28	0.44	0.28	0.27
95年2月	0.99	0.94	0.22	0.48	0.28	0.26	0.44
95年3月	0.34	0.30	0.19	0.28	0.19	0.23	0.21
95年4月	0.47	0.56	0.36	0.22	0.45	0.36	0.20
95年5月	0.45	0.39	0.23	0.30	0.23	0.25	0.21
95年6月	0.42	0.42	0.25	0.43	0.40	0.29	0.30
95年7月	0.44	0.24	0.21	0.23	0.27	0.29	0.32
95年8月	0.32	0.33	0.14	0.17	0.16	0.26	0.29
95年9月	0.45	0.32	0.19	0.20	0.22	0.24	0.26
95年10月	0.55	0.25	0.24	0.16	0.26	0.20	0.19
95年11月	0.41	0.29	0.27	0.19	0.11	0.21	0.22
95年12月	0.39	0.34	0.16	0.21	0.23	0.23	0.23
96年1月	1.17	0.20	0.14	0.22	0.17	0.27	0.26
96年2月	0.49	0.29	0.21	0.18	0.23	0.28	0.24
96年3月	0.29	0.18	0.61	0.17	0.20	0.21	0.31
96年4月	0.38	0.27	0.21	0.17	0.19	0.20	0.22
96年5月	0.54	0.28	0.22	0.23	0.19	0.31	0.26
96年6月	0.22	0.16	0.18	0.23	0.16	0.22	0.23
96年7月	0.28	0.20	0.17	0.17	0.26	0.21	0.26
96年8月	0.38	0.27	0.18	0.19	0.19	0.21	0.19
96年9月	0.38	0.51	0.15	0.24	0.12	0.17	0.17
96年10月	0.34	0.48	0.18	0.19	0.22	0.19	0.20
96年11月	0.25	0.38	0.19	0.14	0.13	0.17	0.17
96年12月	0.32	0.39	0.20	0.15	0.15	0.36	0.24
97年1月	0.42	0.48	0.25	0.20	0.18	0.24	0.19
97年2月	0.46	0.28	0.17	0.22	0.23	0.27	0.20
97年3月	0.52	0.30	0.23	0.22	0.24	0.33	0.20
97年4月	0.64	0.52	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21
97年5月	0.29	0.29	0.21	0.18	0.21	0.20	0.13
97年6月	0.78	0.34	0.13	0.21	0.15	0.20	0.20
97年7月	0.62	0.35	0.17	0.24	0.18	0.27	0.20
97年8月	0.34	0.30	0.18	0.19	0.18	0.26	0.22
97年9月	0.33	0.25	0.21	0.22	0.20	0.20	0.21

表3.1-9 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物日平均值(最大值)監測結果（續3）

(單位: ppm)

測站 時間	監測地點						
	澳底 國小	龍門 社區	貢寮 國小	福隆 海水浴場	川島 養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠 入口旁之民宅
97年10月	0.32	0.17	0.27	0.18	0.24	0.17	0.21
97年11月	0.62	0.17	0.14	0.17	0.18	0.27	0.18
97年12月	0.50	0.16	0.18	0.14	0.21	0.19	0.25
98年1月	0.30	0.14	0.18	0.19	0.18	0.18	0.15
98年2月	0.30	0.14	0.19	0.22	0.16	0.20	0.24
98年3月	0.32	0.14	0.15	0.15	0.24	0.28	0.17
98年4月	0.38	0.15	0.19	0.19	0.23	0.30	0.17
98年5月	0.39	0.17	0.13	0.16	0.17	0.24	0.19
98年6月	0.41	0.23	0.23	0.18	0.19	0.22	0.18
98年7月	0.37	0.23	0.17	0.17	0.26	0.21	0.20
98年8月	0.42	0.22	0.16	0.15	0.20	0.18	0.30
98年9月	0.13	0.13	0.15	0.19	0.21	0.23	0.20
98年10月	0.47	0.13	0.27	0.23	0.28	0.20	0.25
98年11月	0.42	0.21	0.21	0.16	0.23	0.17	0.28
98年12月	0.20	0.19	0.14	0.20	0.16	0.18	0.24
99年1月	0.37	0.27	0.16	0.18	0.16	0.32	0.21
99年2月	0.39	0.17	0.26	0.19	0.25	0.19	0.21
99年3月	0.35	0.31	0.19	0.20	0.18	0.25	0.24
99年4月	0.38	0.21	0.22	0.19	0.16	0.22	0.21
99年5月	0.40	0.16	0.20	0.25	0.20	0.23	0.16
99年6月	0.64	0.36	0.24	0.20	0.16	0.20	0.24
99年7月	0.39	0.28	0.21	0.18	0.15	0.20	0.24
99年8月	0.56	0.18	0.22	0.24	0.18	0.22	0.21
99年9月	0.35	0.17	0.22	0.16	0.16	0.27	0.19
99年10月	0.41	0.22	0.17	0.14	0.19	0.19	0.17
99年11月	0.56	0.34	0.17	0.24	0.11	0.20	0.17
99年12月	0.33	0.57	0.17	0.16	0.18	0.21	0.20
100年1月	0.33	0.52	0.16	0.19	0.22	0.20	0.16
100年2月	0.69	0.57	0.34	0.16	0.19	0.24	0.17
100年3月	0.51	0.48	0.18	0.18	0.23	0.15	0.14
100年4月	0.55	0.36	0.17	0.19	0.20	0.26	0.24
100年5月	0.36	0.47	0.21	0.19	0.24	0.18	0.23
100年6月	0.43	0.41	0.15	0.19	0.21	0.23	0.17
100年7月	0.32	0.34	0.19	0.19	0.24	0.21	0.27
100年8月	0.46	0.45	0.21	0.21	0.21	0.22	0.19
100年9月	0.40	0.38	0.19	0.21	0.17	0.22	0.21
100年10月	0.35	0.27	0.14	0.15	0.21	0.22	0.21
100年11月	0.42	0.41	0.17	0.18	0.19	0.20	0.19
100年12月	0.36	0.30	0.16	0.12	0.17	0.15	0.17
101年1月	0.43	0.45	0.22	0.19	0.15	0.21	0.16
101年2月	0.48	0.28	0.25	0.25	0.18	0.21	0.20
101年3月	0.29	0.37	0.22	0.13	0.21	0.22	0.17
101年4月	0.61	0.50	0.18	0.13	0.14	0.18	0.21
101年5月	0.58	0.47	0.14	0.12	0.15	0.17	0.13
101年6月	0.38	0.37	0.21	0.17	0.18	0.18	0.28

註：(1)空氣品質標準未對非甲烷碳氫化合物訂定限值。

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值。

(4)"C"表受地震影響，電源中斷。

(5)"-"表示監測工作停止執行。

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值。

表3.1-10 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物小時平均值(最大值)監測結果

(單位: ppm)

測站	監測地點						
時間	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
82年8月	0.30	0.30	0.70	0.60	-	-	-
82年9月	0.10	1.10	0.40	0.10	-	-	-
82年10月	0.80	0.90	0.70	0.60	-	-	-
82年11月	0.80	0.50	0.50	0.80	-	-	-
82年12月	1.10	0.50	0.60	0.40	-	-	-
83年1月	0.30	0.80	0.30	1.90	-	-	-
83年2月	0.20	0.50	1.10	0.80	-	-	-
83年3月	0.50	0.60	0.30	0.80	-	-	-
83年4月	1.10	1.80	0.80	0.50	-	-	-
83年5月	2.00	0.50	0.70	0.50	-	-	-
83年6月	0.80	0.70	0.90	0.80	-	-	-
83年7月	0.70	0.70	0.60	1.40	-	-	-
83年8月	0.74	2.30	1.17	5.87	-	-	-
83年9月	1.97	0.80	0.76	1.67	-	-	-
83年10月	1.09	0.89	0.78	0.62	-	-	-
83年11月	3.24	0.77	2.69	0.57	-	-	-
83年12月	2.56	0.76	0.39	3.55	-	-	-
84年1月	0.29	0.92	0.23	0.28	0.77	0.89	0.51
84年2月	0.71	0.60	0.64	0.76	0.78	0.83	0.58
84年3月	0.12	0.35	0.50	0.36	0.31	0.65	0.22
84年4月	0.61	0.80	0.90	0.24	0.24	0.23	0.40
84年5月	0.77	0.52	0.33	0.77	1.84	0.29	0.47
84年6月	0.94	0.76	0.94	0.92	1.14	0.97	0.96
84年7月	0.56	0.36	0.74	1.20	0.59	0.20	0.66
84年8月	0.43	0.58	0.49	0.70	0.85	0.67	0.68
84年9月	0.78	0.72	0.66	0.47	0.88	0.26	0.55
84年10月	0.79	0.51	0.15	1.46	0.18	0.22	0.29
84年11月	0.40	0.45	0.75	3.08	0.57	1.32	0.54
84年12月	0.33	1.02	1.32	0.17	0.19	0.80	0.16
85年1月	0.79	0.51	0.15	* 0.38	0.38	0.54	0.31
85年2月	0.61	0.04	0.87	0.16	0.07	0.30	0.24
85年3月	0.51	0.21	0.25	0.42	0.29	0.12	0.80
85年4月	0.52	0.85	0.19	0.18	0.23	0.68	0.39
85年5月	0.48	0.85	0.19	0.48	0.28	0.45	0.58
85年6月	0.76	0.34	0.73	0.70	0.91	0.39	0.45
85年7月	0.89	0.18	0.15	2.34	0.31	0.38	0.92
85年8月	1.57	2.00	* 4.40	1.50	0.90	0.82	2.30
85年9月	1.76	0.86	0.71	0.54	0.70	0.60	1.03
85年10月	0.61	0.29	0.95	0.46	0.61	1.05	1.08
85年11月	0.60	0.57	0.57	0.67	1.49	0.60	0.62
85年12月	0.97	0.49	1.07	0.63	1.27	0.40	1.70
86年1月	0.40	0.30	0.93	0.55	0.37	0.48	0.49
86年2月	0.24	0.60	0.80	0.47	0.90	0.41	0.42
86年3月	0.38	0.35	0.35	2.53	0.28	0.72	0.28
86年4月	0.43	0.20	0.37	0.15	0.35	0.45	0.37
86年5月	0.68	0.29	0.70	0.37	0.13	0.20	0.29
86年6月	0.65	0.37	0.27	0.48	0.52	0.39	0.64
86年7月	0.54	1.20	0.66	0.83	0.29	0.41	0.40
86年8月	0.30	0.48	0.65	0.65	0.53	0.36	0.84
86年9月	0.71	0.65	0.55	0.18	0.65	0.43	0.51
86年10月	0.76	0.36	0.37	0.34	0.23	0.17	0.76
86年11月	0.27	0.18	0.23	0.27	0.20	0.22	0.27
86年12月	0.50	0.38	0.41	0.54	0.33	0.47	0.49
87年1月	0.30	0.26	0.34	0.33	0.28	0.26	0.30
87年2月	0.92	0.47	0.62	0.33	0.30	0.29	0.80
87年3月	0.30	0.42	0.33	0.27	0.53	0.32	0.30
87年4月	0.68	0.41	0.61	0.46	0.45	0.34	0.53
87年5月	0.77	0.51	0.51	0.53	0.45	0.34	0.64
87年6月	0.82	0.23	0.48	0.20	0.41	0.38	0.38

表3.1-10 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物小時平均值(最大值)監測結果（續1）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
87年7月	0.59	0.53	0.56	0.64	0.39	0.62	0.67
87年8月	0.23	0.37	0.43	1.30	0.61	0.35	0.35
87年9月	0.53	0.31	0.58	0.34	0.54	0.35	0.53
87年10月	0.90	0.41	0.72	0.35	0.36	0.50	0.32
87年11月	0.41	0.36	0.45	0.22	0.25	0.40	0.34
87年12月	0.47	0.32	0.35	0.53	0.30	0.33	0.25
88年1月	0.58	0.43	0.48	0.90	0.61	0.69	0.34
88年2月	0.64	0.56	0.37	0.54	0.27	0.27	0.68
88年3月	0.52	0.36	0.60	0.32	0.43	0.41	0.48
88年4月	0.75	0.29	0.45	0.43	0.40	0.53	0.57
88年5月	0.60	0.40	0.46	0.26	0.40	0.30	0.47
88年6月	0.88	0.30	0.46	0.30	0.29	0.62	0.29
88年7月	0.57	0.37	0.48	0.35	0.47	0.48	0.47
88年8月	0.46	0.26	0.34	0.39	0.29	0.54	0.37
88年9月	0.39	0.35	0.52	ㄈ	0.38	0.57	0.38
88年10月	0.44	0.16	0.24	0.26	0.39	0.33	0.20
88年11月	0.90	0.25	0.50	0.50	0.30	0.24	0.44
88年12月	0.56	0.26	0.32	0.54	0.19	0.33	0.38
89年1月	0.80	0.62	0.38	0.42	0.16	0.42	0.51
89年2月	0.78	0.83	0.42	0.30	0.45	0.56	0.42
89年3月	0.78	0.87	0.53	0.39	0.25	0.66	0.50
89年4月	0.56	0.83	0.32	0.39	0.68	0.28	0.44
89年5月	0.91	0.85	0.43	0.42	0.25	0.35	0.61
89年6月	0.70	0.82	0.45	0.31	0.30	0.38	0.38
89年7月	0.57	0.84	0.30	0.31	0.43	0.28	2.69
89年8月	0.77	0.81	0.39	0.28	0.46	0.33	0.53
89年9月	0.78	0.81	0.30	0.28	0.22	0.39	0.32
89年10月	0.66	0.86	0.27	0.41	0.32	0.57	0.31
89年11月	0.42	0.71	-	-	-	-	-
89年12月	0.81	0.43	-	-	-	-	-
90年1月	0.44	0.54	-	-	-	-	-
90年2月	0.82	0.65	0.42	0.65	0.21	0.27	0.43
90年3月	0.75	0.73	0.37	0.32	0.40	0.44	0.52
90年4月	0.90	0.43	0.34	0.49	0.56	0.55	0.32
90年5月	0.33	0.78	0.47	0.39	0.65	0.53	0.32
90年6月	0.79	0.84	0.59	0.22	0.38	0.44	0.32
90年7月	0.64	0.75	0.47	1.25	0.37	0.45	2.96
90年8月	0.56	0.87	0.94	0.34	0.55	0.80	0.62
90年9月	0.43	0.70	0.58	0.26	0.60	0.83	0.74
90年10月	0.41	0.51	0.36	0.56	0.36	0.63	0.67
90年11月	0.40	0.39	0.54	0.58	0.48	0.41	0.46
90年12月	0.43	0.38	0.40	0.29	0.32	0.32	0.37
91年1月	0.45	0.48	0.40	0.22	0.46	0.85	1.06
91年2月	0.67	0.45	0.49	0.22	0.45	0.40	0.63
91年3月	0.98	0.51	0.42	0.35	0.53	0.30	0.70
91年4月	0.44	0.88	0.53	0.24	0.30	0.32	0.38
91年5月	0.45	0.68	0.38	0.28	0.25	0.34	0.49
91年6月	0.85	0.53	0.47	0.44	0.39	0.39	0.46
91年7月	0.64	0.51	0.55	0.25	0.25	0.56	0.48
91年8月	0.58	0.53	0.43	0.25	0.29	0.33	0.54
91年9月	0.45	0.52	0.38	0.29	0.39	0.38	0.76
91年10月	0.89	0.50	0.37	0.40	0.39	0.24	0.29
91年11月	0.93	0.86	0.39	0.35	0.42	0.62	0.48
91年12月	0.71	0.75	0.41	0.56	0.51	0.34	0.28
92年1月	0.38	0.54	0.59	0.22	0.54	0.28	0.31
92年2月	0.77	0.61	0.44	0.36	0.25	0.43	0.26
92年3月	0.61	0.59	0.44	0.18	0.45	0.69	0.40
92年4月	0.77	0.74	0.30	0.25	0.25	0.35	0.36
92年5月	0.90	0.46	0.37	0.34	0.18	0.38	0.41
92年6月	0.90	0.65	0.34	0.31	0.45	0.40	0.28

表3.1-10 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物小時平均值(最大值)監測結果（續2）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
92年7月	1.71	0.75	0.30	0.50	0.37	0.44	0.31
92年8月	1.23	0.89	0.47	0.32	0.40	0.54	0.61
92年9月	0.54	0.75	0.33	0.65	0.59	0.61	0.60
92年10月	0.57	0.62	0.49	0.44	0.23	0.34	0.34
92年11月	0.44	0.54	0.44	0.25	0.40	0.29	0.99
92年12月	1.19	0.76	0.31	0.24	0.24	0.31	0.22
93年1月	1.20	0.65	0.43	0.21	0.53	0.35	0.35
93年2月	0.34	0.64	0.25	0.38	0.31	0.35	0.56
93年3月	0.19	0.46	0.25	0.18	0.19	0.41	0.34
93年4月	0.99	0.93	0.39	0.35	0.35	0.31	0.32
93年5月	0.72	0.48	0.34	0.34	0.40	0.46	0.35
93年6月	0.70	0.82	0.26	0.41	0.27	0.39	0.58
93年7月	0.92	2.83	0.52	0.47	0.48	0.43	0.53
93年8月	1.19	0.77	0.38	0.34	0.44	0.45	0.48
93年9月	0.95	0.96	0.34	0.28	0.32	0.46	0.49
93年10月	0.82	1.66	0.31	0.32	0.26	0.37	0.46
93年11月	1.35	1.70	0.25	0.31	0.26	0.36	0.34
93年12月	0.76	0.71	0.34	0.55	0.36	0.33	0.34
94年1月	0.75	0.96	0.52	0.30	0.31	0.35	0.31
94年2月	0.64	0.59	0.29	0.28	0.25	0.43	0.28
94年3月	0.64	0.51	0.28	0.27	0.48	0.62	0.48
94年4月	1.1	0.71	0.39	0.34	0.31	0.49	0.56
94年5月	0.99	0.98	0.28	0.33	0.37	0.31	0.33
94年6月	0.99	0.41	0.30	0.32	0.34	0.36	0.35
94年7月	0.99	0.94	0.48	0.35	0.33	0.41	0.34
94年8月	0.98	1.87	0.43	0.38	0.33	0.30	0.43
94年9月	0.97	0.74	0.47	0.27	0.33	0.41	0.43
94年10月	1.00	0.60	0.23	0.34	0.26	0.39	0.32
94年11月	0.55	0.39	0.35	0.36	0.35	0.42	0.55
94年12月	1.54	0.66	0.22	0.33	0.14	0.18	0.17
95年1月	1.64	0.95	0.38	0.40	0.52	0.59	0.53
95年2月	1.47	0.64	0.25	0.67	0.48	0.33	0.61
95年3月	0.66	0.59	0.25	0.54	0.22	0.39	0.35
95年4月	0.49	0.82	0.42	0.36	0.50	0.60	0.47
95年5月	0.49	0.41	0.27	0.47	0.27	0.33	0.27
95年6月	0.49	0.48	0.30	0.54	0.47	0.43	0.37
95年7月	0.48	0.29	0.36	0.45	0.68	0.42	0.42
95年8月	0.46	0.42	0.27	0.24	0.17	0.60	0.57
95年9月	0.58	0.42	0.23	0.96	0.30	0.43	0.35
95年10月	0.82	0.40	0.29	0.21	0.29	0.32	0.27
95年11月	0.66	0.67	0.32	0.21	0.17	0.43	0.29
95年12月	0.52	0.81	0.17	0.30	0.23	0.26	0.31
96年1月	1.46	0.48	0.16	0.35	0.24	0.39	0.33
96年2月	0.67	0.92	0.29	0.19	0.36	0.38	0.53
96年3月	0.40	0.36	2.62	0.20	0.22	0.33	1.20
96年4月	0.50	0.65	0.27	0.23	0.24	0.34	0.99
96年5月	0.61	0.41	0.31	0.29	0.22	0.56	0.32
96年6月	0.30	0.20	0.23	0.31	0.28	0.30	0.41
96年7月	0.40	0.30	0.28	0.25	0.38	0.29	0.43
96年8月	0.81	0.40	0.25	0.29	0.28	0.47	0.32
96年9月	0.61	0.68	0.21	0.31	0.22	0.37	0.23
96年10月	0.59	0.58	0.22	0.94	0.30	0.32	0.40
96年11月	0.38	1.13	0.23	0.27	0.17	0.26	0.44
96年12月	0.50	0.63	0.21	0.19	0.25	0.75	0.75
97年1月	0.50	0.62	0.33	0.25	0.24	0.46	0.51
97年2月	0.86	0.62	0.20	0.36	0.37	0.57	0.42
97年3月	0.84	0.52	0.30	0.28	0.31	0.41	0.26
97年4月	0.98	0.75	0.32	0.29	0.31	0.37	0.38
97年5月	0.68	0.39	0.23	0.29	0.22	0.30	0.20
97年6月	1.27	0.63	0.25	0.29	0.25	0.37	0.50

表3.1-10 核四施工環境監測歷年空氣品質非甲烷碳氫化合物小時平均值(最大值)監測結果（續3）

(單位: ppm)

測站 / 時間	監測地點						
	澳底國小	龍門社區	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
97年7月	0.96	0.79	0.25	0.35	0.30	0.34	0.30
97年8月	0.68	0.48	0.19	0.24	0.46	0.54	0.26
97年9月	0.44	0.33	0.28	0.29	0.25	0.34	0.26
97年10月	0.48	0.34	0.34	0.24	0.34	0.35	0.28
97年11月	0.77	0.36	0.20	0.20	0.27	0.53	0.32
97年12月	0.72	0.32	0.25	0.18	0.32	0.27	0.40
98年1月	0.60	0.32	0.25	0.30	0.24	0.26	0.22
98年2月	0.77	0.48	0.29	0.35	0.20	0.33	0.39
98年3月	0.84	0.41	0.20	0.27	0.28	0.56	0.27
98年4月	1.66	0.27	0.32	0.23	0.29	0.55	0.25
98年5月	0.50	0.38	0.21	0.22	0.22	0.42	0.39
98年6月	0.98	0.38	0.34	0.22	0.22	0.47	0.23
98年7月	0.61	0.48	0.22	0.22	0.29	0.29	0.30
98年8月	0.85	0.39	0.30	0.20	0.25	0.45	1.58
98年9月	0.82	0.44	0.23	0.24	0.29	0.41	0.32
98年10月	0.64	0.21	0.34	0.38	0.33	0.50	0.37
98年11月	0.68	1.44	0.36	0.19	0.31	0.36	0.61
98年12月	0.29	0.27	0.21	0.33	0.20	0.33	0.55
99年1月	1.30	1.35	0.22	0.31	0.22	0.49	0.36
99年2月	0.55	0.65	0.53	0.28	0.45	0.29	0.37
99年3月	0.48	2.12	0.28	0.31	0.29	0.41	0.41
99年4月	0.48	0.34	0.38	0.31	0.24	0.36	0.35
99年5月	0.50	0.77	0.30	0.33	0.28	0.48	0.27
99年6月	1.26	1.93	0.57	0.30	0.26	0.44	0.86
99年7月	1.14	0.74	0.31	0.22	0.17	0.47	0.94
99年8月	0.79	0.56	0.32	0.45	0.24	0.34	0.34
99年9月	0.47	0.38	0.34	0.19	0.17	0.37	0.36
99年10月	0.85	0.39	0.22	0.18	0.21	0.30	0.23
99年11月	0.94	0.50	0.23	0.63	0.15	0.39	0.29
99年12月	0.77	3.84	0.23	0.37	0.26	0.31	0.28
100年1月	0.64	0.79	0.26	0.21	0.24	0.32	0.17
100年2月	1.11	2.89	0.49	0.17	0.24	0.32	0.20
100年3月	1.30	0.82	0.26	0.28	0.27	0.22	0.17
100年4月	0.97	0.60	0.31	0.30	0.25	0.29	0.27
100年5月	0.60	1.90	0.30	0.27	0.28	0.25	0.40
100年6月	0.96	0.81	0.24	0.28	0.28	0.26	0.36
100年7月	0.50	0.61	0.20	0.25	0.30	0.23	0.40
100年8月	0.60	0.60	0.24	0.24	0.26	0.24	0.39
100年9月	0.47	0.50	0.37	0.27	0.19	0.30	0.23
100年10月	0.50	0.74	0.21	0.19	0.24	0.23	0.27
100年11月	0.58	0.54	0.20	0.22	0.25	0.28	0.39
100年12月	0.50	0.35	0.22	0.20	0.25	0.21	0.23
101年1月	0.54	0.55	0.40	0.25	0.16	0.44	0.23
101年2月	0.68	0.55	0.47	0.44	0.40	0.39	0.38
101年3月	0.82	0.50	0.42	0.17	0.30	0.41	0.22
101年4月	1.44	0.99	0.26	0.16	0.19	0.18	0.28
101年5月	2.79	1.11	0.17	0.20	0.23	0.19	0.18
101年6月	0.55	0.50	0.26	0.22	0.21	0.31	0.52

註：(1)空氣品質標準未對非甲烷碳氫化合物訂定限值。

(2)各測站平均值表示本空氣品質監測工作自82年以後之歷次監測結果之平均值。

(3)"*"表示本監測工作空氣品質歷次監測結果之最高值。

(4)"□"表受地震影響，電源中斷。

(5)"-"表示監測工作停止執行。

(6)澳底國小及龍門社區兩測站自89年1月起採用澳底及龍門自動連續監測站測值。

表3.1-11 核四台2省道與102甲縣道交叉口施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表

單位：dB(A)

測站名稱：台2省道與102甲縣道交叉口（第三類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：75(73)		註1 $L_{日}$：76(75)		註1 $L_{晚}$：75(73)		註1 $L_{夜}$：73(70)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：76		註2 $L_{晚}$：75		註2 $L_{夜}$：72	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
84年01月	74.8	75.5 *	76.7 *	76.7 *	76.3 *	74.4	75.7 *	72.6
84年03月	76.1 *	76.0 *	77.6 *	76.8 *	74.7	73.9	73.8 *	73.8 *
84年05月	76.2 *	75.5 *	76.9 *	82.8 *	74.5	74.5	73.1 *	72.0
84年08月	78.3 *	76.5 *	78.4 *	76.8 *	76.0 *	74.7	75.8 *	74.2 *
84年10月	78.5 *	76.5 *	79.3 *	78.6 *	76.2 *	74.4	74.8 *	73.5 *
84年12月	78.6 *	78.3 *	79.7 *	78.5 *	77.3 *	78.0 *	76.9 *	76.2 *
85年01月	75.0	74.8	76.6 *	75.4	73.0	73.7	72.8	72.9
85年04月	80.0 *	80.0 *	80.0 *	79.9 *	78.9 *	78.3 *	78.4 *	78.3 *
85年05月	76.9 *	75.4 *	79.1 *	75.8	73.7	72.5	73.4 *	73.0
85年08月	74.3	71.6	74.3	73.8	74.7	73.1	70.4	69.1
85年10月	76.7 *	75.7 *	77.2 *	75.3	75.2 *	73.6	73.6 *	72.7
85年12月	76.6 *	76.1 *	77.2 *	76.6 *	76.1 *	74.3	73.9 *	73.0
86年02月	82.0 *	80.4 *	82.2 *	80.2 *	79.0 *	78.7 *	83.3 *	78.4 *
86年04月	78.4 *	75.8 *	78.2 *	76.1 *	74.3	73.8	74.2 *	73.3 *
86年05月	79.0 *	77.6 *	77.9 *	76.6 *	74.0	73.2	75.4 *	74.9 *
86年08月	75.5 *	72.3	74.0	72.5	72.1	71.2	71.9	70.0
86年10月	72.4	73.3	71.9	72.9	67.1	68.4	69.4	69.8
86年11月	74.6	73.1	74.1	73.7	71.1	71.2	72.6	70.9
87年02月	74.6	67.1	76.9 *	69.2	77.7 *	68.4	72.7	70.1
87年04月	69.5	69.1	74.4	67.1	66.0	71.1	73.8 *	71.5
87年06月	74.1	69.7	75.3	75.1	73.1	73.2	74.7 *	74.8 *
87年08月	75.2 *	72.1	81.6 *	76.0	76.4 *	76.1 *	74.7 *	73.4 *
87年09月	81.0 *	75.7 *	79.1 *	80.6 *	80.2 *	78.5 *	79.2 *	76.9 *
87年12月	74.2	73.9	77.1 *	77.5 *	77.6 *	82.2 *	78.9 *	76.6 *
88年01月	74.8	73.5	75.1	78.9 *	74.5	76.3 *	75.6 *	76.9 *
88年04月	77.4 *	78.3 *	80.2 *	79.5 *	78.9 *	79.3 *	78.7 *	79.4 *
88年05月	71.7	74.3	72.5	74.0	71.3	72.4	71.2	72.0
88年06月	71.3	72.4	72.6	73.5	71.1	72.0	69.7	71.9
88年07月	72.5	71.6	73.9	74.3	72.3	73.4	69.0	72.8
88年08月	68.4	70.6	70.7	71.4	68.9	68.9	68.4	70.4
88年09月	73.5	72.9	74.1	74.6	71.8	72.2	75.2 *	71.5
88年10月	70.9	73.0	74.2	76.2 *	71.8	74.1	73.1 *	71.5
88年11月	68.8	75.3 *	77.6 *	77.1 *	79.3 *	75.9 *	72.9	75.9 *
88年12月	72.4	72.8	73.8	75.2	73.0	76.6 *	73.5 *	72.9
89年1月	73.4	71.4	75.3	75.6	72.6	73.9	74.1 *	71.9
89年2月	73.1	72.2	73.8	73.1	73.0	71.7	71.9	72.1
89年3月	74.8	75.8 *	76.3 *	77.7 *	75.8 *	77.1 *	75.2 *	73.6 *
89年4月	75.9 *	73.8	75.9	76.6 *	76.1 *	76.2 *	74.4 *	74.5 *
89年5月	75.1 *	70.4	75.1	74.4	73.6	75.6 *	72.3	72.6
89年6月	72.3	70.8	73.7	72.9	72.0	70.4	74.8 *	69.6
89年7月	68.0	72.8	74.3	74.8	72.7	73.3	71.6	71.6
89年8月	70.8	73.3	74.8	75.5	72.7	73.7	70.6	71.3
89年9月	73.0	74.3	75.9	77.5 *	74.3	77.7 *	73.3 *	73.0
89年10月	75.0	75.2 *	76.0	75.3	74.4	75.0	74.5 *	74.1 *
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-

表3.1-11 核四台2省道與102甲縣道交叉口施工期間
環境監測歷年噪音監測結果統計表（續1）

單位：dB(A)

測站名稱：台2省道與102甲縣道交叉口（第三類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：75(73)		註1 $L_{日}$：76(75)		註1 $L_{晚}$：75(73)		註1 $L_{夜}$：73(70)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：76		註2 $L_{晚}$：75		註2 $L_{夜}$：72	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	74.4	71.4	77.6 *	75.9	75.4 *	74.5	74.1 *	72.9
90年3月	71.9	72.6	75.4	75.4	73.1	74.4	73.6 *	72.3
90年4月	75.0	72.6	76.0	75.3	74.4	75.7 *	73.2 *	71.4
90年5月	74.9	74.0	76.6 *	75.7	75.3 *	75.2 *	75.0 *	75.2 *
90年6月	73.3	74.4	75.6	75.7	74.3	74.7	73.4 *	73.5 *
90年7月	74.1	72.3	75.1	74.6	73.1	73.7	71.7	71.8
90年8月	74.2	72.2	75.3	74.8	72.9	73.4	72.7	71.8
90年9月	74.9	73.5	75.1	75.3	74.3	75.7 *	72.9	73.5 *
90年10月	70.2	71.9	77.9 *	74.9	75.6 *	73.7	73.9 *	72.4
90年11月	76.0 *	72.9	76.5 *	76.0	74.5	75.1 *	74.3 *	74.6 *
90年12月	74.6	72.4	75.4	74.7	74.9	75.6 *	73.4 *	72.7
91年1月	71.7	68.6	73.3	74.9	72.6	71.8	71.7	70.2
91年2月	71.7	72.2	75.1	75.1	73.2	74.4	71.5	71.1
91年3月	71.7	70.9	74.8	75.4	72.0	72.9	71.4	71.0
91年4月	71.4	72.3	76.3 *	75.7	74.4	73.6	72.0	71.0
91年5月	71.1	71.1	77.0 *	73.0	74.8	72.1	70.8	72.8
91年6月	75.2 *	71.1	76.6 *	76.5 *	75.0	75.9 *	74.8 *	73.8 *
91年7月	74.8	75.3 *	79.8 *	77.2 *	75.7 *	75.3 *	75.6 *	74.0 *
91年8月	72.9	72.0	77.0 *	75.7	74.2	74.2	72.2	72.5
91年9月	74.6	75.0	76.6 *	76.2 *	75.4 *	74.6	75.1 *	73.1 *
91年10月	74.0	73.8	77.0 *	76.6 *	74.1	74.6	72.7	73.2 *
91年11月	73.9	72.9	76.8 *	76.1 *	74.5	75.3 *	73.6 *	75.6 *
91年12月	74.8	71.0	75.0	75.4	73.7	75.2 *	71.3	70.8
92年1月	74.3	72.1	75.7	75.2	74.2	74.5	72.7	72.5
92年2月	75.6 *	74.7	76.0	76.9 *	74.2	75.2 *	75.1 *	73.2 *
92年3月	73.7	73.9	76.3 *	75.9	75.2 *	73.5	73.4 *	73.3 *
92年4月	75.7 *	74.0	76.8 *	75.4	76.5 *	74.1	75.6 *	71.8
92年5月	75.1 *	73.5	76.2 *	76.7 *	74.9	74.2	73.4 *	72.3
92年6月	77.0 *	74.2	77.2 *	76.3 *	75.7 *	74.5	74.8 *	73.5 *
92年7月	75.5 *	73.9	76.4 *	77.5 *	74.3	76.6 *	73.8 *	75.3 *
92年8月	76.1 *	75.3 *	77.4 *	76.4 *	75.0	74.3	74.9 *	73.7 *
92年9月	73.7	73.6	75.8	76.1 *	78.1 *	75.9 *	74.2 *	73.3 *
92年10月	73.2	71.9	75.4	76.5 *	75.4 *	75.7 *	75.3 *	71.5
92年11月	71.8	68.4	76.4 *	74.6	73.4	75.8 *	74.4 *	70.5
92年12月	70.4	72.5	75.1	75.0	74.8	76.6 *	70.6	72.4
93年1月	73.8	68.4	75.4	74.9	72.1	72.8	72.3	71.0
93年2月	66.7	68.2	72.8	72.4	70.1	72.0	67.6	68.6
93年3月	69.0	69.0	72.9	72.9	72.0	70.6	69.4	69.1
93年4月	66.6	69.4	72.2	73.1	69.8	67.8	67.0	68.6
93年5月	71.2	70.8	76.1 *	76.7 *	74.5	73.3	71.8	71.7
93年6月	72.3	71.4	78.6 *	77.1 *	74.0	75.0	71.0	73.7 *
93年7月	71.8	71.9	74.8	75.1	72.2	73.4	71.5	72.0
93年8月	72.7	73.1	80.6 *	75.3	72.2	71.9	71.1	72.8
93年9月	71.0	71.2	76.6 *	74.0	72.0	69.8	72.0	71.4
93年10月	72.9	71.1	75.6	75.6	71.5	72.0	72.3	72.6
93年11月	76.1 *	70.4	72.5	71.6	70.9	67.9	70.7	69.8
93年12月	71.4	69.1	73.6	72.1	72.8	73.1	69.8	68.8

表3.1-11 核四台2省道與102甲縣道交叉口施工期間
環境監測歷年噪音監測結果統計表（續2）

單位：dB(A)

測站名稱：台2省道與102甲縣道交叉口（第三類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：75(73)		註1 $L_{日}$：76(75)		註1 $L_{晚}$：75(73)		註1 $L_{夜}$：73(70)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：76		註2 $L_{晚}$：75		註2 $L_{夜}$：72	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
94年1月	73.5	71.9	77.5 *	77.5 *	72.7	73.5	72.5	72.8
94年2月	70.5	68.8	71.8	71.7	68.9	70.8	67.9	68.4
94年3月	70.5	71.8	72.6	74.8	70.4	71.9	71.2	70.7
94年4月	73.2	74.5	77.3 *	76.8 *	75.6 *	72.2	72.0	73.0
94年5月	73.6	72.5	77.0 *	76.4 *	74.0	74.5	74.7 *	73.0
94年6月	69.0	69.6	70.5	71.7	67.8	71.3	67.0	70.9
94年7月	71.5	71.5	76.7 *	75.5	71.7	72.0	72.1	73.1 *
94年8月	77.5 *	77.6 *	77.5 *	77.6 *	73.5	77.6 *	75.0 *	77.5 *
94年9月	72.7	69.7	76.7 *	77.0 *	74.7	77.5 *	70.6	71.8
94年10月	75.3 *	75.0	76.8 *	77.0 *	75.3 *	76.0 *	73.4 *	73.7 *
94年11月	70.9	73.8	76.4 *	77.8 *	74.8	72.4	71.6	72.0
94年12月	69.9	68.3	75.5	74.6	75.3 *	73.9	69.2	70.3
95年1月	67.0	64.5	71.2	71.7	68.5	67.7	66.2	66.8
95年2月	66.5	63.7	71.6	71.9	74.7	70.0	67.8	66.5
95年3月	70.4	70.9	75.5	74.8	70.9	72.3	71.7	71.6
95年4月	73.2	72.7	75.9	76.2 *	73.8	76.7 *	72.6	72.3
95年5月	73.0	72.2	75.1	73.7	73.5	71.4	73.7 *	72.0
95年6月	70.5	70.5	77.0 *	76.2 *	70.1	72.9	71.4	72.6
95年7月	74.3	71.3	75.4	73.5	73.0	72.3	70.8	71.2
95年8月	70.4	71.5	73.5	74.9	72.4	71.6	70.3	72.6
95年9月	70.5	71.3	75.1	75.6	74.7	72.8	71.9	71.7
95年10月	71.1	70.6	76.4 *	76.0	75.2 *	74.6	71.6	72.2
95年11月	69.3	70.9	74.7	73.1	73.1	70.7	71.0	71.9
95年12月	70.8	72.1	75.5	75.8	75.9 *	74.1	72.5	72.7
96年1月	72.4	72.7	78.5 *	74.7	73.9	73.3	72.8	71.8
96年2月	74.0	75.5 *	75.6	76.7 *	76.5 *	76.5 *	73.7 *	74.4 *
96年3月	72.7	71.8	74.1	74.7	74.5	73.3	71.9	71.9
96年4月	75.1 *	74.1	76.2 *	76.5 *	75.5 *	76.3 *	73.9 *	74.7 *
96年5月	75.0	71.6	75.7	71.0	70.7	69.2	72.6	71.7
96年6月	75.6 *	71.8	75.4	72.2	70.5	70.0	74.6 *	71.3
96年7月	73.8	74.0	74.1	74.3	68.8	71.4	72.5	73.6 *
96年8月	74.8	74.1	74.7	74.1	70.5	69.8	74.3 *	74.5 *
96年9月	74.3	73.6	74.5	73.0	71.2	69.3	73.1 *	71.4
96年10月	75.1 *	74.1	76.2 *	76.5 *	75.5 *	76.3 *	73.9 *	74.7 *
96年11月	74.0	72.4	72.9	74.2	68.9	67.9	70.9	70.3
96年12月	73.3	71.5	74.2	71.4	70.5	68.5	70.0	68.9
97年1月	75.1 *	74.1	76.2 *	76.5 *	75.5 *	76.3 *	73.9 *	74.7 *
97年2月	72.4	70.7	72.1	72.0	69.6	70.6	70.3	69.0
97年3月	72.9	71.0	73.4	71.6	70.9	67.2	69.9	68.0
97年4月	72.4	69.9	70.4	69.1	77.9 *	66.2	68.7	68.0
97年5月	71.2	71.2	71.4	71.0	67.5	66.8	68.2	67.9
97年6月	68.9	68.6	68.5	68.6	65.2	65.2	65.8	65.4
97年7月	70.0	68.8	70.8	68.6	66.4	63.9	66.2	65.5
97年8月	70.4	68.5	71.5	69.0	66.9	66.5	67.8	66.1
97年9月	69.3	69.1	71.3	70.5	67.3	67.0	66.5	66.7
97年10月	69.3	69.7	70.3	68.4	66.9	64.6	66.5	65.4
97年11月	69.8	67.5	70.9	71.3	68.2	71.4	67.5	65.7
97年12月	71.4	70.1	72.1	71.2	66.7	65.7	68.2	66.4

表3.1-11 核四台2省道與102甲縣道交叉口施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表（續3）

單位：dB(A)

測站名稱：台2省道與102甲縣道交叉口（第三類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：75(73)		註1 $L_{日}$：76(75)		註1 $L_{晚}$：75(73)		註1 $L_{夜}$：73(70)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：76		註2 $L_{晚}$：75		註2 $L_{夜}$：72	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
98年1月	71.4	69.4	71.2	70.0	68.3	68.2	69.9	68.4
98年2月	70.6	68.9	70.3	69.6	66.8	66.6	67.9	66.4
98年3月	70.9	67.8	72.1	68.8	66.3	66.9	67.3	66.6
98年4月	70.1	68.1	69.9	69.9	68.7	67.3	67.3	68.0
98年5月	70.6	69.9	69.0	70.0	67.3	67.4	66.9	68.2
98年6月	69.9	67.3	71.2	68.3	68.6	68.0	67.6	65.3
98年7月	69.6	67.9	71.3	68.6	69.4	65.8	67.5	65.6
98年8月	72.9	69.1	70.6	70.2	67.5	67.5	69.1	67.9
98年9月	71.8	70.2	71.1	70.6	68.5	69.0	68.6	67.2
98年10月	70.9	68.9	71.8	69.2	68.7	66.2	67.7	66.3
98年11月	73.4	72.2	72.5	72.0	70.5	68.6	70.0	69.0
98年12月	73.8	73.2	72.6	73.4	70.6	69.9	70.4	70.1
99年1月	—	—	72.5	72.0	69.5	65.9	70.7	70.3
99年2月	—	—	70.5	69.8	66.6	67.6	68.7	68.7
99年3月	—	—	72.7	72.4	69.5	67.4	71.0	69.9
99年4月	—	—	72.9	68.8	70.9	65.5	70.2	67.1
99年5月	—	—	73.5	69.1	68.2	66.2	69.2	67.4
99年6月	—	—	72.8	70.9	69.7	66.9	71.5	69.9
99年7月	—	—	72.5	71.7	68.9	67.4	71.1	71.0
99年8月	—	—	73.3	72.0	67.8	67.7	72.1 *	71.9
99年9月	—	—	72.2	70.2	68.1	67.3	71.7	71.1
99年10月	—	—	72.2	71.1	68.0	66.5	71.0	69.1
99年11月	—	—	72.6	70.5	69.3	65.7	71.4	69.8
99年12月	—	—	73.3	71.7	70.6	68.5	71.9	70.1
100年1月	—	—	75.4	69.2	70.2	65.5	70.5	66.9
100年2月	—	—	73.3	71.7	68.5	67.1	72.3 *	70.7
100年3月	—	—	71.9	69.1	68.6	66.5	71.5	67.6
100年4月	—	—	73.0	72.1	70.4	69.2	71.9	70.8
100年5月	—	—	73.2	72.3	69.7	66.2	72.2 *	71.5
100年6月	—	—	72.8	71.5	69.9	66.1	72.0	71.4
100年7月	—	—	71.9	70.7	69.0	67.6	71.2	69.2
100年8月	—	—	71.3	69.0	67.4	65.8	69.9	68.7
100年9月	—	—	73.3	72.3	69.9	67.9	72.4 *	72.1 *
100年10月	—	—	72.2	72.7	70.8	67.1	71.2	72.2 *
100年11月	—	—	73.3	73.6	69.4	69.9	71.6	70.8
100年12月	—	—	71.9	70.8	68.7	68.3	70.7	70.6
101年1月	—	—	73.4	71.8	70.3	67.3	72.0 *	72.0 *
101年2月	—	—	74.6	74.4	71.5	70.4	73.2 *	73.7 *
101年3月	—	—	73.3	70.7	67.1	66.7	73.5 *	69.2
101年4月	—	—	72.0	71.8	68.9	66.9	71.8	72.2 *
101年5月	—	—	72.7	70.8	70.1	67.9	71.9	70.8
101年6月	—	—	71.6	69.0	67.9	66.5	70.4	67.4
歷年min	66.5	63.7	68.5	67.1	65.2	63.9	65.8	65.3
歷年max	82.0 *	80.4 *	82.2 *	82.8 *	80.2 *	82.2 *	83.3 *	79.4 *
歷年平均	74.1	73.1	75.5	74.9	73.4	73.3	72.9 *	72.3 *
歷年中數值	73.2	72.2	75.1	74.6	72.7	72.3	72.0	71.8

註：1.行政院環保署，民國85年1月31日(85)環署空字第01467號令發布。

$L_{早}$：5:00 - 7:00、$L_{日}$：7:00 - 20:00、$L_{晚}$：20:00 -22:00、$L_{夜}$：82年12月以前22:00 - 5:00；83年1月以後0:00 - 05:00及22:00 - 24:00。

2.道路交通噪音環境音量標準，係依據99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布之『環境音量標準』。

日間：第三、四類管制區指上午七時至晚上八時；晚間：第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時；

夜間：第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

3. "*" 表示超過法規標準值。歷年平均及歷年中數值統計時間自84/1迄今。

4.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-12 核四鹽寮海濱公園施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表

單位：dB(A)

測站名稱：鹽寮海濱公園（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
84年01月	78.4 *	77.4 *	80.0 *	77.7 *	77.9 *	75.4 *	76.5 *	74.9 *
84年03月	77.4 *	78.1 *	78.9 *	78.1 *	77.1 *	75.6 *	75.0 *	75.3 *
84年05月	78.3 *	76.8 *	78.5 *	73.5	76.1 *	73.1 *	75.6 *	74.8 *
84年08月	67.3	75.6 *	71.5	74.7 *	73.5 *	72.6 *	69.9 *	73.6 *
84年10月	75.5 *	74.8 *	75.5 *	75.0 *	73.5 *	72.8 *	74.6 *	72.2 *
84年12月	77.6 *	76.1 *	77.4 *	75.8 *	74.5 *	74.3 *	75.2 *	74.4 *
85年01月	76.0 *	76.5 *	76.7 *	75.5 *	73.0 *	74.6 *	73.9 *	74.3 *
85年04月	77.8 *	78.7 *	77.1 *	78.8 *	76.9 *	76.4 *	76.3 *	76.3 *
85年05月	76.7 *	76.2 *	76.0 *	74.6 *	74.8 *	71.0 *	74.4 *	73.1 *
85年08月	77.1 *	76.1 *	76.8 *	75.8 *	74.2 *	74.5 *	73.9 *	73.6 *
85年10月	77.9 *	76.0 *	77.9 *	75.8 *	75.8 *	75.8 *	75.5 *	75.5 *
85年12月	76.8 *	76.6 *	77.4 *	76.4 *	76.9 *	74.3 *	74.5 *	73.2 *
86年02月	70.8 *	69.3	71.8	70.3	69.1	69.0	68.7 *	67.9 *
86年04月	75.3 *	74.3 *	75.7 *	73.4	73.0 *	69.5	72.4 *	71.9 *
86年05月	78.9 *	78.2 *	78.0 *	77.1 *	74.8 *	74.4 *	76.9 *	75.7 *
86年08月	75.8 *	73.3 *	75.5 *	73.8	72.4 *	71.9 *	72.1 *	71.3 *
86年10月	75.3 *	74.7 *	76.2 *	75.3 *	72.9 *	71.3 *	71.7 *	71.0 *
86年11月	71.7 *	60.2	70.6	69.4	67.4	67.3	79.0 *	64.6
87年02月	78.2 *	79.2 *	77.6 *	76.9 *	78.4 *	74.0 *	75.2 *	75.7 *
87年04月	74.4 *	73.4 *	76.8 *	72.3	78.0 *	69.9	74.9 *	70.1 *
87年06月	60.6	67.0	70.1	70.2	63.8	69.1	64.0	70.5 *
87年08月	75.2 *	74.8 *	75.3 *	75.2 *	76.5 *	76.6 *	75.1 *	74.9 *
87年09月	75.4 *	70.8 *	70.8	74.7 *	72.1 *	73.6 *	71.8 *	75.4 *
87年12月	70.0	65.7	68.9	67.6	66.8	67.9	66.8	68.3 *
88年01月	65.6	65.4	68.6	67.3	65.4	64.6	65.3	68.9 *
88年04月	74.8 *	78.3 *	80.2 *	79.5 *	78.9 *	79.3 *	78.7 *	79.4 *
88年05月	71.7 *	74.3 *	72.5	74.0	71.3 *	72.4 *	71.2 *	72.0 *
88年06月	68.1	67.8	71.1	69.7	69.6	68.6	68.7 *	67.3 *
88年07月	68.2	68.8	72.7	70.0	71.0 *	66.2	69.8 *	68.2 *
88年08月	66.9	68.2	69.3	69.8	67.5	68.5	66.3	66.6
88年09月	63.1	69.5	67.8	67.2	68.3	65.4	67.7 *	64.4
88年10月	67.8	69.1	71.3	70.1	68.6	70.1 *	68.1 *	68.4 *
88年11月	69.0	66.5	68.5	68.6	69.8	68.3	67.3 *	66.8
88年12月	67.3	69.9	72.8	71.7	74.4 *	70.6 *	68.5 *	71.7 *
89年1月	70.0	73.2 *	76.1 *	77.4 *	73.1 *	70.9 *	72.5 *	73.7 *
89年2月	67.7	67.4	67.9	68.3	65.7	67.6	67.7 *	68.1 *
89年3月	70.3 *	69.0	71.2	73.5	72.4 *	69.3	69.8 *	70.1 *
89年4月	66.2	69.6	70.3	71.9	71.6 *	71.9 *	67.5 *	67.5 *
89年5月	70.5 *	69.2	70.5	70.3	69.5	71.0 *	70.1 *	69.4 *
89年6月	65.3	65.4	69.4	68.8	66.2	66.8	66.4	67.6 *
89年7月	65.9	64.6	68.8	69.5	66.3	69.4	66.8	66.8
89年8月	68.3	71.1 *	71.4	74.0	69.4	73.0 *	69.3 *	69.5 *
89年9月	68.6	70.6 *	73.9	72.5	70.4 *	72.3 *	69.6 *	71.6 *
89年10月	70.2 *	71.8 *	74.5 *	74.6 *	68.9	74.0 *	70.4 *	70.0 *
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-

表3.1-12 核四鹽寮海濱公園施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續1）

單位：dB(A)

測站名稱：鹽寮海濱公園（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	66.2	72.0 *	74.5 *	73.5	75.2 *	73.6 *	72.1 *	72.8 *
90年3月	70.7 *	69.0	75.3 *	73.7	69.6	71.8 *	69.1 *	71.8 *
90年4月	68.8	69.8	73.5	72.2	72.1 *	70.5 *	69.9 *	69.8 *
90年5月	67.7	67.6	74.4 *	72.3	70.0	65.5	70.9 *	67.5 *
90年6月	56.3	70.9 *	75.1 *	73.7	73.0 *	71.1 *	69.2 *	71.4 *
90年7月	70.1 *	67.7	71.1	70.9	69.9	69.2	69.0 *	68.7 *
90年8月	64.4	67.7	70.1	72.2	69.1	72.0 *	66.7	68.7 *
90年9月	66.7	68.8	69.8	68.9	69.6	68.2	69.7 *	69.1 *
90年10月	69.5	69.3	71.4	71.8	69.0	69.7	69.4 *	69.5 *
90年11月	68.6	67.0	71.1	70.4	72.0 *	70.1 *	69.9 *	68.5 *
90年12月	66.6	66.1	69.9	69.6	68.3	66.6	67.5 *	65.9
91年1月	69.1	70.4 *	72.8	72.3	70.3 *	69.0	71.6 *	71.0 *
91年2月	69.2	73.2 *	74.2 *	73.2	72.7 *	71.5 *	72.1 *	71.5 *
91年3月	70.9 *	72.7 *	72.0	72.8	70.4 *	70.2 *	70.7 *	71.2 *
91年4月	70.3 *	72.0 *	73.0	72.9	72.4 *	69.1	71.2 *	70.2 *
91年5月	69.8	69.0	72.3	72.7	72.4 *	71.7 *	70.7 *	68.5 *
91年6月	68.5	68.6	70.5	71.2	70.9 *	68.9	69.2 *	68.1 *
91年7月	68.1	69.1	71.2	72.4	66.0	73.2 *	68.5 *	69.5 *
91年8月	69.7	68.9	72.8	73.2	71.0 *	70.1 *	68.9 *	69.3 *
91年9月	69.0	71.9 *	74.0	74.0	73.0 *	73.8 *	70.9 *	72.0 *
91年10月	67.9	68.7	74.7 *	70.8	70.1 *	70.8 *	68.9 *	68.3 *
91年11月	71.2 *	70.7 *	72.6	72.5	70.9 *	71.4 *	70.3 *	71.0 *
91年12月	68.5	71.3 *	75.0 *	74.3 *	72.4 *	73.1 *	70.2 *	72.4 *
92年1月	69.3	72.2 *	73.2	73.2	69.5	74.6 *	69.7 *	71.3 *
92年2月	66.0	68.7	71.3	70.8	69.2	69.1	68.6 *	68.4 *
92年3月	69.7	67.1	74.7 *	70.7	70.4 *	73.1 *	69.5 *	71.0 *
92年4月	67.7	67.7	70.6	72.8	69.4	71.2 *	68.9 *	68.6 *
92年5月	70.0	71.9 *	73.3	71.6	68.8	69.4	68.8 *	69.8 *
92年6月	68.7	68.0	73.7	70.3	66.5	68.1	68.6 *	68.0 *
92年7月	66.6	71.0 *	73.1	71.1	69.1	69.1	68.2 *	70.2 *
92年8月	69.7	68.9	74.0	72.2	69.7	70.2 *	69.6 *	70.4 *
92年9月	69.0	69.3	71.6	72.7	69.0	71.4 *	68.7 *	70.8 *
92年10月	72.9 *	69.5	72.6	72.3	70.1 *	69.0	70.8 *	70.6 *
92年11月	68.7	69.1	74.0	71.6	69.2	71.8 *	69.6 *	70.0 *
92年12月	69.2	67.8	71.8	72.1	71.5 *	70.5 *	70.1 *	69.9 *
93年1月	67.3	68.1	75.1 *	71.7	72.8 *	68.8	69.5 *	69.2 *
93年2月	69.9	69.8	74.4 *	73.7	74.2 *	71.3 *	71.4 *	70.4 *
93年3月	68.3	69.1	76.2 *	72.7	70.8 *	73.4 *	70.1 *	71.6 *
93年4月	70.9 *	68.8	74.6 *	72.0	70.8 *	70.1 *	70.3 *	71.0 *
93年5月	70.9 *	70.6 *	76.5 *	73.9	70.7 *	69.4	69.5 *	68.7 *
93年6月	67.0	67.9	74.7 *	71.6	69.8	69.4	68.9 *	69.9 *
93年7月	70.1 *	69.5	71.6	71.6	69.7	69.8	69.6 *	68.6 *
93年8月	70.1 *	70.7 *	72.5	70.9	68.9	70.0	70.8 *	68.9 *
93年9月	69.8	68.4	72.2	72.2	69.5	68.2	69.0 *	69.0 *
93年10月	67.0	69.1	70.9	71.6	71.7 *	69.5	68.6 *	69.5 *
93年11月	68.6	67.3	71.4	71.8	69.5	70.6 *	69.1 *	70.5 *
93年12月	70.0	69.5	72.7 *	72.9	70.5 *	72.1 *	70.6 *	69.6 *

表3.1-12 核四鹽寮海濱公園施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續2）

單位：dB(A)

測站名稱：鹽寮海濱公園（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
94年1月	69.1	69.9	72.2	71.8	70.1 *	69.0	70.6 *	70.8 *
94年2月	70.3 *	70.1 *	71.3	70.2	70.1 *	68.3	71.0 *	70.6 *
94年3月	70.6 *	70.8 *	72.0	71.8	73.1 *	68.6	71.5 *	70.7 *
94年4月	71.1 *	71.8 *	72.8	71.8	71.3 *	70.8 *	70.5 *	70.4 *
94年5月	71.5 *	71.9 *	72.3	72.7	70.9 *	70.0	71.7 *	70.5 *
94年6月	69.4	70.3 *	72.3	71.1	68.0	71.3 *	70.4 *	69.8 *
94年7月	71.5 *	69.0	71.9	71.5	70.4 *	71.7 *	70.2 *	71.4 *
94年8月	72.1 *	72.6 *	75.2 *	73.8	73.6 *	73.8 *	73.5 *	72.3 *
94年9月	70.3 *	73.4 *	72.8	73.4	69.5	70.8 *	71.1 *	72.1 *
94年10月	71.5 *	71.7 *	72.3	74.7 *	71.0 *	71.2 *	70.6 *	71.7 *
94年11月	70.2 *	70.4 *	73.2	71.3	73.0 *	70.3 *	71.5 *	70,5 *
94年12月	72.1 *	71.6 *	72.6	73.6	70.3 *	72.8 *	70.9 *	71.0 *
95年1月	71.4 *	70.0	72.3	71.8	72.7 *	71.1 *	71.2 *	70.6 *
95年2月	72.4 *	72.4 *	73.3	72.9	72.4 *	71.1 *	72.4 *	72.3 *
95年3月	70.7 *	71.5 *	72.2	74.5 *	72.1 *	73.0 *	72.0 *	71.9 *
95年4月	69.1	73.3 *	72.6	73.7	70.3 *	69.6	70.2 *	72.0 *
95年5月	72.4 *	70.0	73.8	73.2	72.9 *	71.0 *	71.6 *	71.6 *
95年6月	73.8 *	72.0 *	74.7 *	73.5	70.8 *	71.0 *	71.4 *	71.6 *
95年7月	72.3 *	71.7 *	74.3 *	73.4	73.1 *	71.3 *	71.6 *	72.0 *
95年8月	71.9 *	73.3 *	74.1 *	74.1 *	74.2 *	74.8 *	72.1 *	72.6 *
95年9月	72.0 *	71.1 *	74.3 *	73.8	72.5 *	72.3 *	71.5 *	72.5 *
95年10月	72.3 *	72.5 *	73.7	73.6	71.3 *	71.8 *	71.4 *	72.0 *
95年11月	70.3 *	72.1 *	73.8	73.8	71.4 *	71.8 *	71.6 *	71.3 *
95年12月	71.0 *	71.1 *	73.9	72.3	71.8 *	71.4 *	70.5 *	71.1 *
96年1月	72.2 *	70.7 *	75.4 *	72.8	71.9 *	71.7 *	71.7 *	71.5 *
96年2月	71.5 *	71.4 *	74.2 *	73.5	71.7 *	71.0 *	71.0 *	71.4 *
96年3月	70.0	72.2 *	74.0	73.6	70.0	73.7 *	71.8 *	72.1 *
96年4月	73.4 *	72.5 *	75.2 *	74.2 *	79.2 *	71.1 *	73.5 *	72.4 *
96年5月	71.2 *	73.8 *	74.7 *	74.5 *	73.9 *	71.1 *	72.9 *	72.7 *
96年6月	72.2 *	71.5 *	74.7 *	73.0	74.9 *	72.1 *	72.5 *	71.8 *
96年7月	71.7 *	72.2 *	73.9	74.3 *	71.7 *	73.3 *	71.3 *	73.3 *
96年8月	71.8 *	70.2 *	73.7	73.9	71.5 *	71.6 *	71.8 *	71.6 *
96年9月	72.5 *	75.5 *	75.0 *	74.5 *	71.6 *	70.1 *	74.7 *	70.9 *
96年10月	73.4 *	72.5 *	75.2 *	74.2 *	76.2 *	71.1 *	73.3 *	72.4 *
96年11月	75.9 *	74.3 *	75.1 *	75.6 *	69.4	68.6	73.0 *	70.3 *
97年12月	75.1 *	73.5 *	75.0 *	73.0	71.7 *	70.0	70.9 *	70.4 *
97年1月	73.4 *	72.5 *	75.2 *	74.2 *	76.2 *	71.1 *	73.5 *	72.4 *
97年2月	75.2 *	73.7 *	74.8 *	75.1 *	71.4 *	70.7 *	72.0 *	70.6 *
97年3月	73.3 *	72.7 *	73.9	73.6	71.6 *	69.9	69.9 *	69.5 *
97年4月	74.2 *	74.0 *	73.7	74.0	70.4 *	69.5	70.3 *	70.2 *
97年5月	74.4 *	73.8 *	74.2 *	73.1	71.1 *	68.1	70.1 *	69.6 *
97年6月	74.0 *	73.0 *	73.4	72.9	70.7 *	67.5	69.7 *	68.6 *
97年7月	72.7 *	72.7 *	73.0	72.5	71.8 *	67.7	68.7 *	68.5 *
97年8月	73.1 *	70.4 *	72.9	71.2	68.5	67.3	69.6 *	66.9
97年9月	73.9 *	73.1 *	73.1	72.3	69.3	68.9	69.7 *	69.2 *
97年10月	72.9 *	71.2 *	73.3	71.5	69.7	67.3	69.5 *	67.9 *
97年11月	75.2 *	72.9 *	74.7 *	73.7	69.9	69.2	70.4 *	70.5 *
97年12月	74.6 *	73.8 *	74.9 *	74.1 *	70.5 *	69.2	70.6 *	69.4 *

表3.1-12 核四鹽寮海濱公園施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續3）

單位：dB(A)

測站名稱：鹽寮海濱公園（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
98年1月	73.6 *	72.3 *	75.2 *	74.0 *	70.3 *	69.6	71.5 *	70.7 *
98年2月	73.9 *	73.1 *	74.9 *	73.9	71.0 *	69.0	70.9 *	69.4 *
98年3月	74.0 *	70.2 *	73.9	72.5	70.1 *	69.3	69.6 *	69.1 *
98年4月	74.3 *	70.5 *	74.2 *	72.3	70.1 *	68.8	70.8 *	68.0 *
98年5月	74.5 *	70.8 *	73.4	71.8	69.8	67.2	69.7 *	68.1 *
98年6月	74.3 *	71.2 *	74.1 *	72.1	68.6	67.4	69.6 *	67.4 *
98年7月	73.2 *	71.2 *	73.2	71.8	70.4 *	68.5	69.5 *	67.8 *
98年8月	73.9 *	69.9	73.3	71.3	69.3	68.3	69.0 *	68.0 *
98年9月	73.7 *	73.8 *	73.7	73.5	70.3 *	68.6	69.9 *	69.8 *
98年10月	73.9 *	71.3 *	74.3 *	71.8	69.9	67.3	69.5 *	68.8 *
98年11月	74.9 *	73.8 *	74.3 *	75.1 *	70.0	68.6	70.7 *	69.8 *
98年12月	75.0 *	75.9 *	74.2 *	75.5 *	72.4 *	70.6 *	71.2 *	72.1 *
99年1月	—	—	73.7	73.6	70.3 *	67.6	70.7 *	70.6 *
99年2月	—	—	73.3	73.1	70.5 *	68.8	70.9 *	70.7 *
99年3月	—	—	73.5	73.6	70.9 *	69.7	71.0 *	70.3 *
99年4月	—	—	73.5	71.3	71.9 *	67.9	70.6 *	67.0 *
99年5月	—	—	73.0	72.3	69.2	68.1	70.7 *	69.7 *
99年6月	—	—	73.7	71.8	70.7 *	67.4	70.4 *	68.9 *
99年7月	—	—	74.2 *	73.5	69.3	68.1	70.5 *	70.1 *
99年8月	—	—	73.6	73.0	69.4	67.9	70.6 *	70.1 *
99年9月	—	—	73.1	72.7	69.1	67.6	70.4 *	70.1 *
99年10月	—	—	73.4	72.4	68.7	67.3	69.3 *	68.5 *
99年11月	—	—	74.0	72.2	70.2 *	66.0	69.9 *	68.4 *
99年12月	—	—	73.7	72.0	69.6	66.2	69.9 *	68.1 *
100年1月	—	—	78.0 *	72.9	74.7 *	71.1 *	73.3 *	69.7 *
100年2月	—	—	77.8 *	77.4 *	73.8 *	72.8 *	75.3 *	74.7 *
100年3月	—	—	70.5	68.8	66.7	64.0	67.9 *	66.8
100年4月	—	—	70.5	70.7	67.2	66.2	68.8 *	65.8
100年5月	—	—	69.5	69.3	67.3	64.9	69.1 *	68.3 *
100年6月	—	—	70.5	69.8	67.5	65.0	69.3 *	68.7 *
100年7月	—	—	69.9	67.9	67.7	66.4	69.6 *	67.8 *
100年8月	—	—	69.6	66.6	67.2	64.1	69.0 *	67.1 *
100年9月	—	—	70.9	70.2	68.1	65.4	70.4 *	70.2 *
100年10月	—	—	70.6	71.2	68.7	66.2	70.2 *	70.4 *
100年11月	—	—	70.9	71.0	68.3	69.1	69.8 *	68.7 *
100年12月	—	—	72.1	68.7	68.9	66.7	70.6 *	67.4 *
101年1月	—	—	70.7	68.5	68.0	63.7	69.3 *	67.9 *
101年2月	—	—	71.8	71.8	69.3	68.5	70.9 *	71.1 *
101年3月	—	—	71.8	69.1	67.3	65.6	71.4 *	68.1 *
101年4月	—	—	69.9	69.9	67.4	66.5	70.4 *	70.4 *
101年5月	—	—	70.1	68.6	68.7	66.7	70.2 *	68.5 *
101年6月	—	—	69.6	67.6	67.5	65.5	70.1 *	66.4
歷年min	56.3	60.2	67.8	66.6	63.8	63.7	64.0	64.4
歷年max	78.9 *	79.2 *	80.2 *	79.5 *	79.2 *	79.3 *	79.0 *	79.4 *
歷年平均	72.5 *	72.3 *	73.9	73.1	71.9 *	70.9 *	71.4 *	71.0 *
歷年中數值	70.9 *	71.1 *	73.4	72.5	70.4 *	70.0	70.4 *	70.2 *

註：1.行政院環保署，民國85年1月31日(85)環署空字第01467號令發布。
$L_{早}$：5:00 - 7:00、$L_{日}$：7:00 - 20:00、$L_{晚}$：20:00 -22:00、$L_{夜}$：82年12月以前22:00 - 5:00；83年1月以後0:00 - 05:00及22:00 - 24:00。

2.道路交通噪音環境音量標準，係依據99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布之『環境音量標準』。
日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；
夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時。

3. "*" 表示超過法規標準值。歷年平均及歷年中數值統計時間自84/1迄今。

4.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-13 核四福隆街上施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表

單位：dB(A)

測站名稱：福隆街上（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
84年08月	74.4 *	72.8 *	73.7	72.2	71.6 *	69.9	72.2 *	70.0 *
84年10月	76.6 *	75.3 *	76.1 *	74.8 *	73.3 *	71.8 *	73.8 *	72.3 *
84年12月	76.8 *	75.6 *	76.8 *	75.5 *	74.4 *	73.8 *	75.0 *	74.0 *
85年01月	76.2 *	75.8 *	76.7 *	75.4 *	74.0 *	73.6 *	74.2 *	74.2 *
85年04月	77.3 *	75.2 *	77.5 *	73.0	75.4 *	73.3 *	75.1 *	74.0 *
85年05月	78.3 *	77.6 *	77.6 *	76.3 *	75.4 *	72.7 *	76.0 *	75.0 *
85年08月	76.3 *	74.8 *	76.2 *	75.1 *	73.1 *	72.2 *	72.8 *	72.3 *
85年10月	77.0 *	76.4 *	77.8 *	76.4 *	74.9 *	74.0 *	74.5 *	74.5 *
85年12月	75.1 *	75.1 *	75.7 *	74.4 *	75.2 *	72.4 *	73.2 *	71.8 *
86年02月	76.8 *	75.5 *	77.2 *	76.0 *	75.1 *	75.0 *	75.1 *	74.6 *
86年04月	77.3 *	76.5 *	77.6 *	76.1 *	75.1 *	74.8 *	74.4 *	74.0 *
86年05月	77.6 *	75.8 *	76.2 *	74.4 *	72.8 *	71.7 *	74.4 *	73.8 *
86年08月	76.8 *	74.5 *	76.8 *	75.0 *	74.4 *	73.6 *	74.1 *	76.7 *
86年10月	76.7 *	79.7 *	76.8 *	79.0 *	74.2 *	73.5 *	74.2 *	76.1 *
86年11月	75.7 *	74.6 *	75.6 *	74.9 *	72.3 *	72.5 *	73.0 *	72.0 *
87年02月	71.2 *	66.6	71.5	67.3	66.3	62.4	67.9 *	65.3
87年04月	76.0 *	68.7	76.8 *	71.5	78.8 *	72.0 *	75.3 *	71.6 *
87年06月	76.4 *	70.5 *	67.2	67.8	67.4	66.4	67.0	68.3 *
87年08月	73.3 *	75.5 *	75.1 *	74.1 *	73.9 *	73.2 *	73.3 *	74.3 *
87年09月	72.9 *	75.6 *	74.1 *	75.8 *	73.2 *	76.6 *	72.4 *	73.3 *
87年12月	67.5	68.6	72.7	73.5	68.5	70.6 *	68.0 *	68.3 *
88年01月	65.7	68.0	69.3	70.7	67.3	69.7	67.1 *	67.3 *
88年04月	70.0	67.9	70.7	70.3	69.9	70.7 *	70.1 *	67.2 *
88年05月	68.6	67.3	72.8	71.1	70.9 *	69.9	69.1 *	67.7 *
88年06月	69.1	67.3	72.7	70.6	69.9	69.7	68.5 *	67.5 *
88年07月	70.3 *	67.4	72.9	70.6	69.8	70.2 *	69.0 *	68.0 *
88年08月	67.6	67.1	69.9	70.0	68.3	68.4	66.5	66.5
88年09月	68.4	68.6	71.9	74.0	69.3	71.6 *	69.4 *	69.4 *
88年10月	67.1	66.6	71.3	70.4	69.3	70.0	68.6 *	69.2 *
88年11月	70.6 *	68.5	70.6	70.6	71.7 *	69.9	69.8 *	68.6 *
88年12月	69.4	72.7 *	77.2 *	74.9 *	75.3 *	72.5 *	71.5 *	72.3 *
89年1月	68.9	71.7 *	74.3 *	76.5 *	72.8 *	71.5 *	71.5 *	73.5 *
89年2月	72.1 *	71.7 *	72.7	72.7	70.1 *	72.1 *	71.6 *	73.3 *
89年3月	69.3	69.8	74.0	75.6 *	68.4	73.4 *	70.7 *	71.5 *
89年4月	67.0	70.2 *	72.8	72.8	74.4 *	71.9 *	68.1 *	70.1 *
89年5月	68.2	68.4	72.5	73.4	68.6	72.8 *	70.8 *	70.9 *
89年6月	67.5	69.0	74.8 *	73.4	74.2 *	73.2 *	69.9 *	72.7 *
89年7月	68.6	68.7	74.2 *	74.7 *	71.9 *	72.3 *	68.8 *	69.6 *
89年8月	71.5 *	70.8 *	73.0	73.6	70.0	71.6 *	69.8 *	71.3 *
89年9月	66.4	67.7	74.4 *	72.9	70.2 *	72.2 *	68.9 *	69.4 *
89年10月	67.8	70.7 *	74.5 *	74.1 *	69.8	74.3 *	70.8 *	69.8 *
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	70.1 *	72.2 *	76.2 *	75.5 *	77.5 *	74.7 *	73.5 *	74.2 *
90年3月	74.9 *	78.9 *	78.2 *	77.3 *	74.3 *	71.3 *	76.5 *	74.1 *
90年4月	69.8	70.5 *	75.5 *	75.9 *	73.9 *	69.8	72.8 *	70.5 *
90年5月	70.7 *	66.8	74.8 *	75.3 *	74.9 *	73.1 *	72.1 *	71.9 *
90年6月	68.4	70.0	74.1 *	72.2	73.0 *	72.5 *	70.0 *	70.3 *

表3.1-13 核四福隆街上施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續1）

單位：dB(A)

測站名稱：福隆街上（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
90年7月	69.6	68.7	73.5	73.1	73.8 *	71.5 *	71.4 *	72.3 *
90年8月	67.4	67.5	70.2	70.4	69.5	69.8	68.5 *	67.6 *
90年9月	69.9	70.3 *	74.2 *	73.1	72.8 *	72.9 *	70.7 *	70.5 *
90年10月	70.0	71.4 *	75.6 *	75.7 *	71.2 *	75.4 *	71.3 *	74.1 *
90年11月	69.3	74.1 *	74.7 *	76.5 *	71.7 *	70.4 *	71.0 *	70.8 *
90年12月	70.6 *	68.8	74.7 *	75.5 *	71.6 *	72.8 *	71.6 *	78.5 *
91年1月	69.6	69.9	73.2	74.7 *	71.7 *	71.7 *	71.9 *	70.0 *
91年2月	68.0	68.1	72.2	71.4	69.4	69.6	69.2 *	70.0 *
91年3月	67.1	67.3	71.2	71.3	70.4 *	67.7	68.5 *	67.5 *
91年4月	73.9 *	70.5 *	73.9	73.3	72.7 *	70.4 *	72.3 *	71.6 *
91年5月	70.3 *	70.2 *	73.0	73.4	72.2 *	71.5 *	69.5 *	70.0 *
91年6月	69.4	69.5	71.7	74.2 *	68.8	71.7 *	68.6 *	70.7 *
91年7月	71.1 *	73.2 *	75.8 *	76.5 *	73.7 *	74.7 *	72.8 *	70.8 *
91年8月	70.0	68.8	74.7 *	74.9 *	69.0	73.4 *	71.6 *	70.7 *
91年9月	72.4 *	68.9	75.0 *	73.8	71.0 *	71.8 *	70.3 *	68.2 *
91年10月	70.4 *	68.6	73.5	72.7	71.4 *	71.0 *	71.3 *	69.5 *
91年11月	68.2	63.7	69.6	72.6	70.0	76.2 *	73.1 *	67.5 *
91年12月	72.5 *	67.1	73.7	72.4	71.2 *	71.9 *	69.9 *	71.0 *
92年1月	67.8	68.7	71.7	73.7	69.4	71.1 *	70.7 *	69.9 *
92年2月	70.5 *	69.0	74.4 *	75.6 *	72.3 *	73.6 *	71.9 *	71.1 *
92年3月	69.5	68.9	73.9	75.0 *	72.5 *	71.7 *	70.1 *	71.2 *
92年4月	69.5	73.0 *	74.1 *	75.5 *	73.4 *	74.6 *	71.1 *	71.7 *
92年5月	67.7	70.2 *	74.3 *	73.9	74.5 *	70.9 *	69.3 *	70.6 *
92年6月	68.6	72.1 *	74.0	76.4 *	74.6 *	74.2 *	73.6 *	71.3 *
92年7月	68.5	69.5	74.4 *	76.4 *	70.2 *	70.5 *	71.2 *	71.4 *
92年8月	71.0 *	70.0	74.0	73.6	73.9 *	75.4 *	69.6 *	70.9 *
92年9月	69.3	70.0	72.7	76.1 *	71.4 *	71.7 *	70.8 *	68.9 *
92年10月	71.1 *	70.4 *	73.5	75.9 *	70.8 *	73.3 *	69.8 *	71.7 *
92年11月	72.0 *	69.6	76.0 *	74.8 *	72.8 *	69.5	71.2 *	71.9 *
92年12月	70.1 *	69.8	75.0 *	72.7	73.8 *	73.0 *	71.5 *	69.7 *
93年1月	69.3	71.1 *	74.5 *	76.7 *	72.8 *	74.4 *	72.0 *	73.7 *
93年2月	70.9	70.4 *	74.1 *	77.2 *	69.4	72.9 *	69.7 *	70.0 *
93年3月	70.2 *	70.5 *	75.9 *	77.1 *	73.2 *	71.8 *	70.6 *	70.7 *
93年4月	71.3 *	69.6	77.0 *	75.7 *	72.5 *	73.6 *	72.4 *	72.7 *
93年5月	71.4 *	70.7 *	74.6 *	74.9 *	73.3 *	72.6 *	71.6 *	71.7 *
93年6月	70.7 *	71.9 *	75.1 *	75.7 *	73.7 *	74.1 *	73.3 *	72.7 *
93年7月	70.7 *	72.0 *	75.4 *	76.8 *	73.7 *	77.8 *	71.7 *	74.8 *
93年8月	72.7 *	71.2 *	75.3 *	75.0 *	72.7 *	74.3 *	72.3 *	69.7 *
93年9月	71.2 *	72.0 *	77.5 *	77.7 *	74.8 *	75.1 *	71.8 *	73.5 *
93年10月	71.9 *	71.5 *	74.8 *	75.5 *	72.6 *	73.9 *	71.1 *	73.1 *
93年11月	69.1	68.6	73.7	74.0	71.0 *	72.3 *	69.8 *	70.7 *
93年12月	69.9	70.8 *	74.5 *	74.9 *	74.3 *	74.1 *	70.5 *	70.9 *
94年1月	69.3	73.1 *	70.3	75.2 *	71.7 *	72.6 *	68.1 *	72.8 *
94年2月	70.0	70.5 *	72.5	74.8 *	70.3 *	72.8 *	71.5 *	70.0 *
94年3月	72.2 *	71.3 *	73.4	75.8 *	72.2 *	74.1 *	71.2 *	70.8 *
94年4月	68.8	70.9 *	74.3 *	74.5 *	74.0 *	74.1 *	70.6 *	71.6 *
94年5月	71.0 *	69.6	71.1	72.4	61.9	74.2 *	72.5 *	69.7 *
94年6月	60.7	62.9	72.0	65.5	70.4 *	65.6	67.2 *	62.4

表3.1-13 核四福隆街上施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續2）

單位：dB(A)

測站名稱：福隆街上（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
94年7月	68.3	68.1	71.7	74.0	72.5 *	70.8 *	69.4 *	63.1
94年8月	75.6 *	72.5 *	73.2	77.6 *	68.6	75.1 *	73.3 *	73.6 *
94年9月	71.5 *	72.6 *	73.2	75.4 *	73.3 *	74.3 *	71.6 *	72.7 *
94年10月	70.3 *	72.0 *	73.0	77.3 *	70.7 *	76.0 *	72.1 *	74.2 *
94年11月	71.7 *	69.5	74.8 *	74.9 *	73.4 *	72.9 *	71.8 *	71.5 *
94年12月	70.5 *	71.7 *	75.3 *	73.4	72.5 *	74.0 *	72.1 *	71.6 *
95年1月	72.7 *	68.5	76.3 *	74.2 *	75.1 *	74.9 *	73.2 *	71.4 *
95年2月	69.3	71.2 *	73.4	74.0	74.4 *	73.3 *	70.9 *	71.9 *
95年3月	68.7	71.9 *	73.1	76.7 *	73.0 *	75.3 *	69.5 *	71.5 *
95年4月	73.2 *	74.4 *	74.4 *	76.5 *	72.0 *	75.7 *	71.8 *	74.8 *
95年5月	69.5	70.4 *	74.1 *	75.1 *	73.0 *	72.4 *	71.0 *	71.1 *
95年6月	71.4 *	70.8 *	74.0	72.5	69.8	70.8 *	71.7 *	70.6 *
95年7月	74.5 *	72.8 *	75.9 *	76.8 *	73.5 *	76.8 *	73.0 *	74.3 *
95年8月	71.6 *	70.9 *	74.2 *	75.0 *	73.3 *	72.3 *	71.7 *	71.2 *
95年9月	71.2 *	73.3 *	74.0	75.1 *	70.8 *	72.3 *	70.7 *	71.1 *
95年10月	70.2 *	71.4 *	73.2	75.2 *	71.9 *	70.8 *	71.9 *	71.8 *
95年11月	70.7 *	68.0	75.2 *	74.7 *	71.8 *	71.0 *	70.7 *	70.2 *
95年12月	69.2	68.2	74.2 *	73.9	67.9	73.7 *	70.4 *	71.2 *
96年1月	73.5 *	70.8 *	77.8 *	77.3 *	75.0 *	75.4 *	74.1 *	73.8 *
96年2月	70.6 *	70.0	74.0	76.0 *	74.1 *	74.0 *	71.2 *	71.5 *
96年3月	70.1 *	67.6	73.0	71.5	71.0 *	69.5	69.7 *	68.0 *
96年4月	69.0	67.6	73.6	74.1 *	71.2 *	69.9	69.8 *	69.3 *
96年5月	67.9	66.2	71.1	70.5	68.0	68.5	69.7 *	68.4 *
96年6月	69.9	69.1	71.0	72.9	72.7 *	71.4 *	68.0 *	68.7 *
96年7月	65.0	67.1	72.7	73.5	67.4	70.5 *	68.7 *	68.6 *
96年8月	67.4	72.7 *	71.7	75.1 *	70.1 *	70.7 *	69.9 *	70.9 *
96年9月	69.9	69.3	73.9	73.1	70.6 *	71.0 *	70.0 *	68.7 *
96年10月	69.0	67.6	73.6	74.1 *	71.2 *	69.9	69.8 *	69.3 *
96年11月	76.9 *	75.7 *	75.3 *	74.2 *	73.2 *	70.0	74.5 *	72.0 *
96年12月	76.9 *	75.8 *	76.0 *	74.7 *	73.8 *	72.0 *	73.5 *	73.8 *
97年1月	69.0	67.6	73.6	74.1 *	71.2 *	69.9	69.8 *	69.3 *
97年2月	76.7 *	76.0 *	76.1 *	75.9 *	73.9 *	72.9 *	74.1 *	73.4 *
97年3月	75.6 *	74.7 *	75.7 *	74.5 *	73.9 *	71.4 *	72.8 *	71.3 *
97年4月	75.7 *	74.0 *	76.1 *	73.1	72.8 *	68.6	72.8 *	72.1 *
97年5月	75.1 *	73.9 *	73.3	73.4	69.9	68.9	72.1 *	71.8 *
97年6月	74.0 *	72.5 *	72.8	70.4	70.1 *	66.4	71.8 *	70.1 *
97年7月	75.2 *	74.7 *	73.4	72.4	70.3 *	69.0	72.7 *	71.8 *
97年8月	74.0 *	73.8 *	72.8	70.8	70.1 *	68.5	72.2 *	70.1 *
97年9月	75.3 *	73.2 *	73.6	71.1	71.7 *	69.1	72.0 *	70.2 *
97年10月	75.7 *	73.9 *	74.6 *	71.6	71.8 *	69.3	72.7 *	71.1 *
97年11月	74.4 *	74.4 *	75.2 *	74.1 *	72.0 *	69.7	72.9 *	73.0 *
97年12月	76.3 *	75.1 *	75.6 *	75.0 *	73.0 *	71.1 *	73.8 *	73.4 *
98年1月	74.7 *	73.7 *	74.9 *	73.3	72.7 *	71.0 *	72.9 *	71.9 *
98年2月	75.3 *	73.0 *	74.7 *	71.6	72.8 *	70.5 *	73.4 *	71.9 *
98年3月	76.5 *	75.4 *	75.4 *	73.4	72.1 *	70.5 *	73.5 *	72.6 *
98年4月	76.3 *	73.4 *	75.5 *	73.3	73.4 *	70.3 *	74.8 *	72.8 *
98年5月	76.3 *	72.6 *	74.4 *	71.4	72.6 *	68.8	73.3 *	71.7 *
98年6月	76.3 *	75.0 *	74.3 *	72.2	70.1 *	71.5 *	73.0 *	72.7 *

表3.1-13 核四福隆街上施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續3）

單位：dB(A)

測站名稱：福隆街上（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
98年7月	75.4 *	73.0 *	73.8	71.3	71.4 *	69.8	72.6 *	71.9 *
98年8月	75.8 *	75.9 *	74.0	73.4	71.9 *	71.5 *	73.5 *	73.6 *
98年9月	76.1 *	75.7 *	74.8 *	73.0	72.0 *	70.4 *	73.4 *	72.2 *
98年10月	75.9 *	72.4 *	74.8 *	72.0	71.3 *	69.5	72.8 *	71.3 *
98年11月	76.1 *	75.4 *	75.1 *	73.4	72.7 *	69.9	73.5 *	72.5 *
98年12月	76.9 *	76.2 *	75.1 *	74.5 *	71.6 *	71.2 *	74.0 *	73.8 *
99年1月	—	—	75.8 *	75.0 *	71.8 *	69.2	70.7 *	73.2 *
99年2月	—	—	74.2 *	73.7	72.4 *	70.9 *	70.9 *	73.4 *
99年3月	—	—	75.2 *	74.5 *	73.0 *	71.9 *	71.0 *	73.3 *
99年4月	—	—	74.3 *	70.7	73.9 *	70.2 *	70.6 *	69.7 *
99年5月	—	—	74.2 *	71.0	71.3 *	70.2 *	70.7 *	71.7 *
99年6月	—	—	74.5 *	71.1	72.9 *	69.0	70.4 *	71.6 *
99年7月	—	—	74.4 *	73.8	72.1 *	70.7 *	70.5 *	73.5 *
99年8月	—	—	74.8 *	73.9	71.8 *	71.3 *	70.6 *	74.6 *
99年9月	—	—	74.4 *	73.2	70.9 *	69.4	70.4 *	72.3 *
99年10月	—	—	74.6 *	73.1	70.5 *	70.5 *	73.1 *	72.7 *
99年11月	—	—	78.8 *	72.3	71.8 *	67.8	73.1 *	71.5 *
99年12月	—	—	73.2	71.2	70.0	66.6	72.1 *	71.1 *
100年1月	—	—	76.8 *	71.1	74.0 *	70.7 *	74.2 *	70.8 *
100年2月	—	—	76.1 *	75.7 *	72.8 *	70.3 *	75.2 *	74.8 *
100年3月	—	—	75.2 *	72.0	70.9 *	68.4	75.2 *	70.9 *
100年4月	—	—	73.6	73.0	70.5 *	69.5	73.0 *	70.1 *
100年5月	—	—	73.9	72.8	70.5 *	67.7	74.0 *	73.1 *
100年6月	—	—	74.7 *	72.7	71.5 *	67.8	73.6 *	74.3 *
100年7月	—	—	74.4 *	71.4	71.1 *	69.6	74.1 *	72.3 *
100年8月	—	—	74.1 *	72.1	71.5 *	67.8	73.7 *	72.1 *
100年9月	—	—	74.5 *	72.8	70.3 *	68.7	74.2 *	74.1 *
100年10月	—	—	75.5 *	73.8	71.6 *	70.5 *	75.4 *	74.2 *
100年11月	—	—	74.7 *	72.7	71.0 *	72.0 *	73.5 *	73.0 *
100年12月	—	—	76.9 *	72.2	73.6 *	70.9 *	75.4 *	72.8 *
101年1月	—	—	75.2 *	73.4	72.9 *	67.8	74.7 *	73.5 *
101年2月	—	—	76.4 *	76.2 *	74.0 *	71.8 *	75.2 *	75.6 *
101年3月	—	—	75.9 *	73.3	71.5 *	69.2	75.8 *	72.2 *
101年4月	—	—	75.2 *	74.2 *	72.8 *	70.1 *	75.1 *	74.9 *
101年5月	—	—	74.1 *	70.7	72.9 *	69.7	74.1 *	72.9 *
101年6月	—	—	74.3 *	70.0	72.4 *	69.8	74.4 *	71.0 *
歷年min	60.7	62.9	67.2	65.5	61.9	62.4	66.5	62.4
歷年max	78.3 *	79.7 *	78.8 *	79.0 *	78.8 *	77.8 *	76.5 *	76.7 *
歷年平均	72.9 *	72.4 *	74.6 *	74.3 *	72.4 *	72.2 *	72.2 *	72.0 *
歷年中數值	71.1 *	71.2 *	74.4 *	74.0	72.1 *	71.5 *	71.9 *	71.6 *

註：1.行政院環保署，民國85年1月31日(85)環署空字第01467號令發布。
$L_{早}$：5:00 - 7:00、$L_{日}$：7:00 - 20:00、$L_{晚}$：20:00 -22:00、$L_{夜}$：82年12月以前22:00 - 5:00；83年1月以後0:00 - 05:00及22:00 - 24:00。

2.道路交通噪音環境音量標準，係依據99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布之『環境音量標準』。
日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；
夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時。

3. "*" 表示超過法規標準值。歷年平均及歷年中數值統計時間自84/1迄今。

4.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-14 核四102縣道之新社橋施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表

單位：dB(A)

測站名稱：102縣道之新社橋（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
84年08月	51.5	59.6	48.9	66.8	48.2	62.0	51.2	62.8
84年10月	60.6	62.1	63.9	67.0	57.1	59.8	59.8	57.3
84年12月	63.8	58.5	66.9	67.5	58.5	58.7	56.7	56.2
85年01月	64.8	56.9	65.2	66.0	59.0	56.5	53.5	56.5
85年04月	66.7	63.7	67.2	71.2	64.2	68.5	59.9	61.0
85年05月	66.2	62.1	66.1	68.1	58.3	59.6	58.6	60.7
85年08月	58.4	60.1	68.9	61.8	55.2	57.5	52.7	51.7
85年10月	56.9	58.2	63.8	67.8	56.1	64.3	55.1	59.2
85年12月	57.2	56.9	60.5	64.1	52.9	53.2	58.6	60.1
86年02月	58.6	57.4	62.6	65.2	57.8	56.1	55.7	58.3
86年04月	60.2	61.9	63.7	64.9	57.3	56.3	62.3	57.1
86年05月	60.4	59.2	62.9	64.7	55.3	57.0	60.1	60.9
86年08月	58.9	53.7	62.1	58.4	60.9	63.1	56.8	60.6
86年10月	57.9	58.0	59.2	61.1	59.4	55.3	57.0	56.4
86年11月	46.3	45.7	55.4	51.8	63.3	50.7	48.5	48.3
87年02月	53.9	52.1	56.9	58.8	51.7	54.2	57.0	51.6
87年04月	66.7	72.2 *	74.8 *	73.5	72.5 *	71.2 *	70.4 *	78.2 *
87年06月	60.6	67.3	65.0	68.4	62.4	67.0	64.6	63.7
87年08月	61.7	61.0	64.0	63.7	59.8	62.3	60.7	60.6
87年09月	61.4	58.9	65.6	66.3	63.0	65.6	62.1	61.9
87年12月	64.0	67.5	64.5	65.5	66.8	63.9	62.7	65.6
88年01月	56.5	56.0	58.1	58.1	56.9	53.9	56.8	56.8
88年04月	62.1	59.9	62.4	65.2	58.5	60.2	57.2	56.8
88年05月	54.3	55.6	56.9	58.2	53.2	53.1	53.9	53.9
88年06月	54.8	58.2	60.1	60.4	56.3	57.3	56.9	57.2
88年07月	53.4	63.1	61.9	63.4	57.3	62.1	59.9	60.9
88年08月	58.6	54.3	64.1	60.5	61.1	58.1	59.8	58.7
88年09月	60.8	59.8	63.1	62.8	60.9	61.0	59.3	60.1
88年10月	70.8 *	68.1	68.3	66.4	68.1	65.9	66.2	66.6
88年11月	54.0	58.4	62.9	65.0	57.6	63.1	58.4	60.9
88年12月	57.4	56.5	60.8	59.9	61.1	57.7	55.0	58.8
89年1月	57.9	60.9	61.5	63.1	62.3	63.8	58.4	59.7
89年2月	63.7	60.5	66.6	67.7	61.7	65.3	64.1	63.9
89年3月	68.1	67.8	68.8	69.0	69.0	66.9	69.7 *	67.2 *
89年4月	61.6	64.0	67.1	68.7	61.3	64.2	64.3	62.8
89年5月	59.5	61.4	65.4	67.3	62.1	62.9	59.9	61.6
89年6月	64.0	64.7	66.1	66.4	66.7	65.5	66.4	65.9
89年7月	57.6	57.4	60.0	64.9	56.5	58.2	60.5	58.8
89年8月	67.7	66.4	68.1	67.3	66.5	66.4	65.4	66.2
89年9月	62.1	60.4	62.0	63.8	61.4	63.1	62.3	62.9
89年10月	61.6	60.7	63.8	63.1	60.0	62.0	61.3	60.1
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	64.9	57.5	66.8	62.9	61.9	61.5	66.6	60.0
90年3月	62.4	60.9	65.8	66.1	64.4	64.8	63.9	61.9
90年4月	61.6	62.4	65.8	68.1	65.1	65.4	64.8	64.0
90年5月	63.2	67.1	62.3	69.6	63.0	61.3	63.6	67.9 *
90年6月	65.4	66.3	67.0	69.1	66.0	66.0	66.4	67.9 *

表3.1-14 核四102縣道之新社橋施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表（續1）

單位：dB(A)

測站名稱：102縣道之新社橋（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
90年7月	64.1	64.9	66.8	67.1	61.4	65.3	63.7	64.3
90年8月	63.5	63.7	65.5	65.5	62.4	63.8	61.9	62.0
90年9月	65.2	66.2	67.0	69.1	65.9	65.8	66.3	67.8 *
90年10月	64.8	60.3	68.3	65.9	65.6	63.0	62.7	62.8
90年11月	64.5	64.5	66.2	65.5	64.9	64.4	65.6	65.7
90年12月	62.9	64.5	61.5	65.0	62.8	63.6	64.2	64.3
91年1月	61.6	63.8	64.5	67.0	61.5	64.1	62.1	62.1
91年2月	62.0	58.6	65.0	65.0	66.7	64.0	63.5	62.4
91年3月	61.3	60.5	64.3	64.6	59.9	63.5	61.4	60.8
91年4月	60.4	64.0	64.6	68.8	60.9	63.1	61.0	62.4
91年5月	64.8	62.2	65.2	64.2	64.0	63.5	64.0	66.5
91年6月	66.7	67.4	62.6	66.7	59.8	65.7	62.7	66.4
91年7月	60.8	63.6	65.0	68.6	61.6	66.0	63.1	63.7
91年8月	62.0	65.9	65.6	64.8	61.6	63.4	62.3	62.2
91年9月	64.2	64.4	63.8	65.9	65.8	62.1	62.5	65.5
91年10月	64.8	62.0	66.5	66.7	63.4	64.1	62.7	62.3
91年11月	60.5	61.1	63.0	62.3	58.9	59.6	59.7	60.1
91年12月	56.1	58.0	61.2	63.6	58.2	59.0	57.7	57.4
92年1月	60.8	60.7	64.1	65.1	59.4	59.8	60.4	60.9
92年2月	67.5	67.1	67.1	68.1	65.7	66.8	66.2	67.8 *
92年3月	61.5	63.9	65.1	65.2	63.0	62.0	61.8	62.3
92年4月	60.7	62.6	65.9	67.3	63.5	62.9	63.8	63.4
92年5月	59.9	65.1	59.6	63.5	60.6	61.4	60.8	64.2
92年6月	61.4	62.8	68.6	68.3	66.4	63.8	64.1	63.3
92年7月	63.2	58.5	64.4	64.7	62.3	63.7	62.8	62.5
92年8月	61.3	63.1	63.5	65.2	62.3	61.0	62.4	64.3
92年9月	59.8	55.5	62.0	61.6	57.0	60.2	58.6	58.9
92年10月	60.3	58.3	64.6	62.0	61.1	58.7	61.0	59.1
92年11月	60.1	62.6	64.4	65.1	62.9	61.5	62.8	63.6
92年12月	63.8	59.6	62.7	64.1	60.2	64.2	61.9	61.1
93年1月	59.5	60.4	63.5	63.8	62.4	61.5	61.3	60.0
93年2月	60.7	62.4	65.7	67.5	62.5	61.0	61.4	60.4
93年3月	59.7	61.7	63.9	68.9	62.4	62.2	60.5	62.5
93年4月	57.0	59.6	62.7	63.5	59.3	61.5	61.5	59.2
93年5月	58.8	59.1	61.3	64.3	58.5	61.9	58.1	60.8
93年6月	58.0	60.6	61.8	65.4	61.2	62.9	59.1	60.4
93年7月	62.9	59.7	63.2	64.3	61.6	62.0	60.9	62.2
93年8月	61.3	62.3	65.4	65.9	53.2	59.5	60.2	61.9
93年9月	57.4	60.1	63.4	63.5	59.1	60.2	57.5	61.0
93年10月	58.9	62.3	64.1	65.5	60.6	61.6	60.8	62.7
93年11月	58.6	62.1	64.5	65.9	62.0	63.6	60.5	61.4
93年12月	61.3	62.7	63.7	65.0	59.0	61.4	60.0	60.4
94年1月	62.7	63.8	64.4	66.1	62.5	64.4	63.2	64.2
94年2月	58.0	61.6	62.6	63.1	58.3	60.6	60.3	61.6
94年3月	63.3	61.5	64.3	62.6	59.6	60.6	61.6	60.4
94年4月	59.1	61.4	62.8	64.4	63.1	60.8	61.4	61.0
94年5月	61.4	58.2	65.2	65.8	69.2	59.1	65.9	65.1
94年6月	52.1	58.3	59.8	61.2	60.3	56.1	51.7	59.9

表3.1-14 核四102縣道之新社橋施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表（續2）

單位：dB(A)

測站名稱：102縣道之新社橋（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
94年7月	64.5	60.9	64.8	64.9	61.0	63.3	63.1	59.6
94年8月	59.4	64.3	64.9	68.9	61.1	64.5	62.1	67.4 *
94年9月	61.7	62.9	65.8	65.9	66.4	66.1	64.8	65.4
94年10月	62.6	63.4	63.5	65.7	59.6	63.7	61.3	62.3
94年11月	61.1	63.4	65.0	65.9	63.0	64.8	61.2	62.7
94年12月	59.7	60.9	64.3	63.9	59.8	63.8	60.2	61.4
95年1月	60.6	61.9	63.7	65.8	61.3	61.0	62.0	60.8
95年2月	60.3	61.8	64.4	65.2	60.1	63.3	61.1	61.3
95年3月	60.9	62.2	64.2	65.1	61.6	62.2	60.3	62.4
95年4月	63.6	69.1	66.4	67.5	66.1	64.1	63.3	64.1
95年5月	61.1	66.8	64.3	65.9	62.1	61.0	60.9	63.8
95年6月	61.8	60.8	63.2	63.2	61.1	61.1	60.2	60.2
95年7月	61.3	61.0	64.3	65.3	61.7	62.5	61.3	63.5
95年8月	65.3	64.7	68.7	68.2	65.4	66.7	66.1	65.5
95年9月	62.9	67.2	67.0	67.2	63.8	62.5 *	63.8 *	64.5
95年10月	58.9	60.8	62.6	63.5	60.3	60.5	60.6	60.4
95年11月	59.6	62.4	62.2	63.4	57.4	60.2	59.3	61.1
95年12月	59.7	57.7	63.3	65.7	59.9	58.8	61.9	59.2
96年1月	60.0	60.6	64.4	65.5	59.4	60.3	60.4	61.5
96年2月	62.0	63.1	65.0	67.1	62.2	64.3	62.2	63.2
96年3月	56.6	58.3	62.0	63.2	55.6	60.0	56.3	57.2
96年4月	58.2	59.3	63.9	63.0	60.5	61.8	61.8	60.2
96年5月	57.7	57.4	63.0	63.7	63.5	57.7	60.9	60.4
96年6月	58.4	57.3	63.0	63.8	59.4	61.9	59.8	60.7
96年7月	60.2	62.1	62.1	63.2	60.2	61.3	58.8	60.4
96年8月	56.7	57.6	64.0	63.2	61.5	58.9	59.9	59.0
96年9月	57.2	60.1	63.0	64.0	60.7	61.8	59.2	60.8
96年10月	58.2	59.3	63.9	63.0	60.5	61.8	61.8	60.2
96年11月	59.1	57.9	64.4	67.0	59.4	59.7	57.6	64.1
96年12月	57.8	61.3	63.1	69.0	59.3	62.4	55.5	56.7
97年1月	58.2	59.3	63.9	63.0	60.5	61.8	61.8	60.2
97年2月	59.3	57.5	64.4	64.1	58.9	59.7	55.6	56.2
97年3月	56.9	58.0	62.5	65.3	55.2	57.5	52.1	54.7
97年4月	60.4	56.3	63.0	63.8	55.1	57.5	51.8	60.0
97年5月	65.3	58.4	62.0	65.7	58.3	58.6	58.4	56.5
97年6月	59.3	58.0	61.7	66.0	56.8	57.5	61.6	60.3
97年7月	55.1	59.4	62.0	65.6	57.9	59.9	55.3	58.6
97年8月	61.1	54.2	61.4	64.1	56.6	56.7	53.0	54.8
97年9月	64.3	61.5	63.5	83.7 *	61.3	61.2	59.8	60.0
97年10月	58.5	55.7	60.6	64.1	54.8	56.9	53.6	52.5
97年11月	57.8	60.7	61.9	63.5	53.4	55.9	51.3	57.8
97年12月	58.2	58.7	63.8	66.8	59.9	58.3	52.3	59.8
98年1月	58.9	56.8	62.0	64.2	56.6	58.6	53.6	56.1
98年2月	61.2	58.6	62.2	67.2	59.1	61.3	55.6	57.5
98年3月	61.3	60.3	63.4	64.8	59.9	60.9	56.7	55.6
98年4月	57.3	58.2	63.2	64.7	62.5	59.8	58.6	65.0
98年5月	63.0	58.9	62.0	65.3	56.7	58.1	58.5	55.1
98年6月	58.6	58.3	61.8	63.3	59.4	57.4	62.4	57.6

表3.1-14 核四102縣道之新社橋施工期間環境監測歷年噪音監測結果統計表（續3）

單位：dB(A)

測站名稱：102縣道之新社橋（第二類管制區內緊鄰8公尺（含）以上道路）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：70(66)		註1 $L_{日}$：74(69)		註1 $L_{晚}$：70(66)		註1 $L_{夜}$：67(62)	
	註2 —		註2 $L_{日}$：74		註2 $L_{晚}$：70		註2 $L_{夜}$：67	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
98年7月	59.9	62.8	64.0	64.8	59.1	59.6	56.3	59.9
98年8月	60.8	60.0	62.2	63.8	58.5	59.7	56.2	55.9
98年9月	59.7	60.6	65.8	64.3	59.0	59.0	55.2	55.4
98年10月	58.8	60.5	63.2	66.6	57.8	59.4	54.0	55.0
98年11月	57.6	62.3	62.1	65.0	56.6	56.2	53.7	59.7
98年12月	62.1	58.0	62.8	65.9	56.0	57.6	52.8	53.3
99年1月	—	—	62.5	63.7	56.7	57.1	55.1	56.4
99年2月	—	—	63.3	65.2	56.5	57.7	55.3	56.0
99年3月	—	—	62.2	64.6	58.4	58.7	51.9	56.8
99年4月	—	—	65.2	64.6	59.3	59.4	54.7	55.9
99年5月	—	—	61.7	61.9	57.7	58.3	57.0	55.9
99年6月	—	—	61.9	65.7	57.8	57.5	55.8	56.3
99年7月	—	—	62.6	66.0	59.1	60.7	57.5	55.3
99年8月	—	—	62.5	64.6	57.5	60.0	53.9	61.8
99年9月	—	—	63.7	63.2	57.0	58.0	54.7	55.0
99年10月	—	—	61.4	64.4	58.9	57.6	54.7	57.1
99年11月	—	—	64.3	68.9	56.9	59.2	56.9	62.3
99年12月	—	—	64.3	63.4	55.2	58.4	53.8	54.5
100年1月	—	—	63.0	64.8	59.8	58.6	57.3	56.7
100年2月	—	—	62.6	65.6	56.7	64.2	57.4	57.2
100年3月	—	—	68.3	61.5	59.0	57.6	56.8	56.0
100年4月	—	—	65.5	69.4	64.3	58.4	59.6	55.8
100年5月	—	—	65.8	64.8	58.8	57.7	57.4	61.1
100年6月	—	—	64.0	64.6	57.3	59.8	56.6	57.8
100年7月	—	—	61.8	63.4	57.5	60.5	56.9	55.7
100年8月	—	—	61.3	64.2	56.8	58.6	56.0	54.0
100年9月	—	—	63.1	65.6	57.7	58.4	54.8	56.9
100年10月	—	—	63.2	65.4	57.6	59.4	55.8	57.9
100年11月	—	—	62.5	65.3	56.2	59.0	55.4	57.1
100年12月	—	—	64.7	64.1	58.5	61.6	58.3	55.8
101年1月	—	—	62.2	63.6	55.9	60.0	54.1	55.7
101年2月	—	—	64.1	63.0	58.9	60.0	55.2	58.0
101年3月	—	—	61.9	64.6	58.5	58.8	55.7	57.6
101年4月	—	—	59.8	62.6	56.8	54.7	55.2	52.4
101年5月	—	—	61.5	65.8	58.0	61.2	56.3	58.1
101年6月	—	—	62.5	64.0	57.4	58.9	56.6	58.5
歷年min	46.3	45.7	48.9	51.8	48.2	50.7	48.5	48.3
歷年max	70.8 *	72.2 *	74.8 *	83.7 *	72.5 *	71.2	70.4	78.2 *
歷年平均	61.9	62.4	64.4	67.0	61.7	62.1	61.1	62.6
歷年中數值	60.6	60.8	63.7	65.0	59.8	61.0	59.9	60.4

註：1.行政院環保署，民國85年1月31日(85)環署空字第01467號令發布。
$L_{早}$：5:00 - 7:00、$L_{日}$：7:00 - 20:00、$L_{晚}$：20:00 -22:00、$L_{夜}$：82年12月以前22:00 - 5:00；83年1月以後0:00 - 05:00及22:00 - 24:00。

2.道路交通噪音環境音量標準，係依據99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令修正發布之『環境音量標準』。
日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；
夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時。

3. "*" 表示超過法規標準值。歷年平均及歷年中數值統計時間自84/1迄今。

4.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-15 核四過港部落施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表

單位：dB(A)

測站名稱：過港部落（一般地區第二類管制區）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：55		註1 $L_{日}$：60		註1 $L_{晚}$：55		註1 $L_{夜}$：50	
	註2 —		註2 $L_{日}$：60		註2 $L_{晚}$：55		註2 $L_{夜}$：50	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
84年08月	65.1 *	57.2 *	65.2 *	56.9	61.5 *	51.9	67.2 *	53.1 *
84年10月	49.6	51.3	50.7	54.5	48.0	59.5 *	52.0 *	53.9 *
84年12月	47.7	51.7	59.7	50.1	46.6	46.5	50.0	50.6 *
85年01月	46.9	50.6	49.2	55.9	47.7	50.1	49.4	49.9
85年04月	54.7	56.3 *	55.6	53.6	53.3	51.7	53.0 *	54.3 *
85年05月	50.7	50.5	49.4	55.0	43.0	41.1	47.1	50.0
85年08月	48.5	52.5	53.9	56.7	48.4	46.9	53.0 *	49.7
85年10月	52.0	56.9 *	57.0	58.1	58.1 *	63.8 *	58.4 *	62.3 *
85年12月	59.4 *	54.1	57.2	62.0 *	54.5	56.7 *	53.2 *	57.3 *
86年02月	53.9	52.6	50.4	54.3	48.7	51.9	51.9 *	54.8 *
86年04月	53.7	57.3 *	59.1	54.4	51.8	43.7	50.1 *	48.2
86年05月	49.3	51.2	55.7	52.9	50.0	50.1	52.0 *	52.6 *
86年08月	41.3	54.3	50.6	62.1 *	52.4	55.6 *	49.5	54.3 *
86年10月	46.6	51.7	54.8	57.1	53.2	54.2	52.0 *	52.2 *
86年11月	54.6	51.4	63.8 *	56.2	57.3 *	57.9 *	53.4 *	54.5 *
87年02月	50.4	51.4	52.1	58.0	52.5	54.5	58.5 *	53.8 *
87年04月	47.9	52.5	54.1	57.7	49.5	53.8	49.2	52.9 *
87年06月	57.4 *	49.2	68.2 *	65.9 *	66.6 *	58.6 *	64.5 *	56.0 *
87年08月	60.7 *	60.5 *	62.7 *	64.2 *	59.0 *	59.7 *	58.7 *	62.3 *
87年09月	62.4 *	65.9 *	64.8 *	69.0 *	60.2 *	60.2 *	59.7 *	66.2 *
87年12月	58.4 *	60.1 *	60.0	62.3 *	57.4 *	60.0 *	57.9 *	60.0 *
88年01月	57.1 *	62.2 *	60.1 *	63.2 *	58.4 *	60.0 *	58.5 *	59.9 *
88年04月	61.2 *	60.4 *	62.9 *	64.5 *	60.5 *	62.2 *	61.5 *	60.6 *
88年05月	58.4 *	55.4 *	60.2 *	59.7	57.2 *	56.8 *	55.3 *	55.0 *
88年06月	56.2 *	56.0 *	58.0	60.8 *	54.6	57.1 *	54.8 *	55.8 *
88年07月	58.4 *	60.1 *	60.6 *	64.2 *	57.0 *	60.7 *	57.7 *	59.7 *
88年08月	48.7	50.4	50.5	57.1	44.7	50.6	48.6	50.3 *
88年09月	58.3 *	59.2 *	60.4 *	61.8 *	57.8 *	58.5 *	56.4 *	56.0 *
88年10月	53.2	56.3 *	57.2	59.7	56.2 *	55.8 *	53.9 *	52.1 *
88年11月	52.0	51.7	57.0	59.4	53.0	53.7	52.7 *	54.9 *
88年12月	56.4 *	55.2 *	57.4	58.4	55.2 *	54.8	54.9 *	56.1 *
89年1月	52.1	52.7	54.1	57.0	50.0	53.5	50.8 *	52.3 *
89年2月	60.4 *	61.2 *	58.9	60.8 *	54.7	56.5 *	57.7 *	58.7 *
89年3月	57.8 *	54.9	57.6	59.7	55.0	56.9 *	55.9 *	57.1 *
89年4月	61.6 *	52.4	67.1 *	55.9	61.3 *	53.8	64.3 *	51.2 *
89年5月	52.1	57.7 *	56.1	57.9	54.3	55.0	53.4 *	54.9 *
89年6月	54.5	52.9	57.1	57.3	54.6	55.6 *	54.9 *	53.6 *
89年7月	50.2	52.6	55.7	52.8	51.9	54.6	50.7 *	50.2 *
89年8月	49.0	51.3	54.2	54.8	47.0	52.5	56.8 *	52.1 *
89年9月	56.8 *	57.5 *	57.2	59.8	57.7 *	56.7 *	54.9 *	55.1 *
89年10月	59.2 *	58.1 *	59.6	59.4	58.7 *	58.2 *	57.8 *	56.6 *
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	54.6	50.3	55.1	55.7	52.5	53.2	51.7 *	53.0 *
90年3月	47.5	43.9	50.8	52.8	51.2	45.0	48.7	43.6
90年4月	52.4	51.9	57.7	58.5	55.5 *	55.3 *	52.8 *	52.6 *
90年5月	50.2	56.9 *	55.9	59.6	53.8	56.3 *	51.2 *	52.7 *
90年6月	50.9	50.6	53.2	55.1	50.9	52.3	49.8	50.6 *

表3.1-15 核四過港部落施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續1）

單位：dB(A)

測站名稱：過港部落（一般地區第二類管制區）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：55		註1 $L_{日}$：60		註1 $L_{晚}$：55		註1 $L_{夜}$：50	
	註2 —		註2 $L_{日}$：60		註2 $L_{晚}$：55		註2 $L_{夜}$：50	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
90年7月	50.0	49.8	51.2	54.1	48.7	51.8	48.4	49.7
90年8月	42.2	44.7	44.8	48.3	43.4	48.3	43.5	45.7
90年9月	50.9	51.1	53.1	55.1	50.7	51.9	49.8	50.3 *
90年10月	50.2	50.5	53.0	56.1	48.6	51.5	48.8	50.2 *
90年11月	52.1	52.3	54.8	58.3	52.0	52.2	50.4 *	51.1 *
90年12月	53.7	53.9	55.3	58.7	52.3	54.0	52.8 *	52.8 *
91年1月	51.8	53.7	55.3	58.8	53.8	53.2	51.0 *	52.4 *
91年2月	59.3 *	57.4 *	60.4 *	58.6	60.6 *	57.3 *	59.4 *	59.3 *
91年3月	51.5	51.1	52.8	55.3	51.5	51.3	50.0	49.6
91年4月	49.5	50.1	53.3	56.8	51.5	50.9	48.0	49.7
91年5月	52.8	52.5	56.8	57.8	54.2	57.2 *	51.0 *	51.9 *
91年6月	53.9	54.8	56.5	59.6	52.2	56.3 *	51.6 *	53.3 *
91年7月	49.1	50.6	54.1	53.6	49.1	55.0	47.4	51.2 *
91年8月	47.8	51.1	50.4	50.5	47.9	52.6	49.3	49.6
91年9月	53.7	54.1	58.3	60.5 *	53.9	56.2 *	51.4 *	52.6 *
91年10月	47.9	50.2	51.3	55.0	50.4	47.7	46.8	51.6 *
91年11月	50.9	55.0	64.3 *	60.0	54.0	53.9	51.7 *	52.8 *
91年12月	45.9	58.4 *	56.6	62.0 *	48.5	59.9 *	53.9 *	59.5 *
92年1月	50.9	52.5	54.0	56.4	50.7	50.6	49.5	50.8 *
92年2月	54.0	52.6	54.6	56.1	50.4	53.5	50.9 *	50.2 *
92年3月	54.0	52.6	54.6	56.1	50.4	53.5	50.9 *	50.2 *
92年4月	54.8	54.6	58.3	58.9	56.0 *	56.1 *	53.9 *	52.0 *
92年5月	55.1 *	55.5 *	56.4	57.4	53.1	52.5	51.3 *	50.2 *
92年6月	48.9	51.1	55.5	48.8	52.3	47.5	51.0 *	52.9 *
92年7月	53.4	54.7	57.3	58.7	58.0 *	57.0 *	54.1 *	53.5 *
92年8月	54.0	57.4 *	56.9	57.9	55.7 *	55.3 *	52.4 *	52.1 *
92年9月	53.6	52.0	52.5	51.2	50.9	51.2	51.7 *	51.2 *
92年10月	44.3	44.7	62.8 *	50.8	70.0 *	48.4	64.8 *	50.0
92年11月	57.4 *	50.8	55.9	54.3	57.5 *	55.2 *	57.3 *	50.5 *
92年12月	50.1	54.0	53.9	54.0	50.8	51.8	51.2 *	54.2 *
93年1月	49.0	50.1	49.2	52.8	50.9	56.4 *	49.7	50.9 *
93年2月	47.7	52.7	51.2	58.2	51.0	56.7 *	54.1 *	55.0 *
93年3月	49.5	54.1	50.7	57.3	49.8	60.6 *	49.4	58.6 *
93年4月	43.2	51.4	48.6	54.8	48.7	54.7	46.2	50.5 *
93年5月	49.8	54.2	52.5	56.1	53.1	57.8 *	53.0 *	54.5 *
93年6月	48.2	56.5 *	53.8	58.0	53.0	54.0	48.8	55.7 *
93年7月	42.1	53.3	49.1	52.7	48.2	50.3	44.9	51.0 *
93年8月	48.6	51.7	53.8	53.4	50.4	51.9	56.3 *	52.7 *
93年9月	52.2	49.5	53.7	50.3	49.1	49.4	51.1 *	50.0
93年10月	54.3	54.4	56.3	52.6	52.8	52.9	55.2 *	54.0 *
93年11月	54.2	56.7 *	53.6	52.7	51.4	55.5 *	51.1 *	53.0 *
93年12月	54.2	52.8	55.3	55.6	59.6 *	53.2	53.8 *	55.1 *
94年1月	46.6	53.9	47.3	53.7	46.9	54.1	48.6	54.4 *
94年2月	57.2 *	54.4	58.9	56.9	56.7 *	56.0 *	58.3 *	56.4 *
94年3月	51.6	54.0	52.2	53.3	55.4 *	50.2	51.4 *	52.4 *
94年4月	51.8	51.7	53.0	54.9	51.9	49.4	51.1 *	52.4 *
94年5月	53.9	53.3	54.3	53.3	52.9	53.9	55.9 *	52.6 *
94年6月	55.0	55.2 *	53.2	51.5	55.2 *	45.4	51.8 *	51.9 *

表3.1-15 核四過港部落施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續2）

單位：dB(A)

測站名稱：過港部落（一般地區第二類管制區）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：55		註1 $L_{日}$：60		註1 $L_{晚}$：55		註1 $L_{夜}$：50	
	註2 —		註2 $L_{日}$：60		註2 $L_{晚}$：55		註2 $L_{夜}$：50	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
94年7月	55.3 *	53.0	52.6	52.8	53.2	51.1	51.7 *	50.9 *
94年8月	43.9	46.1	54.9	49.8	44.5	48.9	45.9	49.0
94年9月	46.2	51.3	47.2	52.9	47.0	51.5	46.6	54.9 *
94年10月	50.6	49.2	50.5	48.1	51.2	47.6	47.8	47.0
94年11月	51.1	49.4	49.7	48.6	49.4	48.4	49.1	49.3
94年12月	49.9	48.4	46.5	47.2	45.9	47.8	48.4	48.2
95年1月	48.8	49.9	49.9	52.5	49.3	48.2	49.5	49.9
95年2月	45.6	46.9	48.3	47.6	47.8	46.6	48.1	48.3
95年3月	49.0	48.2	50.4	50.3	51.2	48.4	49.0	49.6
95年4月	51.0	48.9	50.4	51.1	50.5	50.0	50.4 *	49.3
95年5月	53.1	50.9	60.8 *	50.1	59.0 *	50.3	53.9 *	49.8
95年6月	50.7	50.3	49.8	50.3	48.5	48.6	49.1	49.0
95年7月	54.2	52.5	52.8	53.6	52.8	54.2	53.2 *	52.8 *
95年8月	53.3	52.6	52.8	53.3	51.9	52.1	52.0 *	52.3 *
95年9月	52.5	54.3	51.3	52.7	49.2	49.4	50.3 *	52.0 *
95年10月	53.1	53.0	52.8	52.6	51.2	51.7	51.8 *	52.2 *
95年11月	49.9	49.6	49.4	48.9	49.1	49.4	48.5	48.7
95年12月	52.9	51.7	54.1	51.2	54.7	50.4	52.4 *	51.1 *
96年1月	50.2	50.8	49.4	51.7	47.9	50.2	49.9	50.6 *
96年2月	52.5	51.8	52.4	50.6	50.7	49.4	51.4 *	49.6
96年3月	51.1	49.6	50.9	49.7	48.1	50.0	49.7	53.2 *
96年4月	48.0	49.6	50.1	50.2	48.9	48.3	50.3 *	49.6
96年5月	48.2	54.8	58.1	50.5	45.4	47.8	48.0	47.7
96年6月	49.7	48.8	49.9	49.0	50.0	47.9	47.9	48.7
96年7月	48.3	44.0	48.2	50.4	46.0	44.9	46.5	46.6
96年8月	43.1	48.8	49.6	50.2	44.1	50.2	45.5	53.4 *
96年9月	55.0	45.8	48.5	50.7	47.9	45.5	49.7	46.2
96年10月	48.0	49.6	50.1	50.2	48.9	48.3	50.3 *	49.6
96年11月	52.9	44.9	51.9	54.5	54.5	54.5	52.9 *	48.9
96年12月	49.2	56.2 *	51.5	50.3	47.7	49.8	48.2	46.8
97年1月	48.0	49.6	50.1	50.2	48.9	48.3	50.3 *	49.6
97年2月	52.9	44.9	51.9	54.5	54.5	54.5	52.9 *	48.9
97年3月	48.9	50.9	48.8	50.4	43.1	42.5	40.5	45.3
97年4月	52.0	52.1	48.7	52.5	43.2	42.9	42.5	44.1
97年5月	52.6	53.7	49.2	51.5	47.1	47.8	47.8	50.4 *
97年6月	50.6	52.0	48.2	51.5	46.5	43.6	49.4	47.9
97年7月	50.1	51.6	48.7	52.7	47.4	55.8 *	48.5	50.2 *
97年8月	49.6	49.8	50.3	50.1	47.2	48.6	43.1	45.0
97年9月	53.2	52.4	52.3	52.4	52.6	52.1	42.6	46.1
97年10月	47.9	49.4	51.4	50.5	53.1	48.7	53.9 *	55.9 *
97年11月	43.1	44.9	47.9	49.4	44.2	46.2	42.4	43.1
97年12月	47.3	45.7	51.5	50.7	52.4	50.0	46.3	46.1
98年1月	51.3	46.1	51.5	54.2	45.3	51.0	47.8	47.0
98年2月	45.0	43.0	46.9	54.7	44.7	45.3	40.7	40.6
98年3月	49.9	47.4	57.7	50.0	45.5	40.6	49.5	37.4
98年4月	49.2	49.3	50.1	61.1 *	53.3	55.2 *	40.3	41.9
98年5月	52.5	50.9	49.2	49.8	49.6	42.2	51.0 *	47.0
98年6月	50.5	52.4	49.5	50.8	43.6	42.7	45.0	43.6

表3.1-15 核四過港部落施工期間環境監測
歷年噪音監測結果統計表（續3）

單位：dB(A)

測站名稱：過港部落（一般地區第二類管制區）								
環境音量標準	註1 $L_{早}$：55		註1 $L_{日}$：60		註1 $L_{晚}$：55		註1 $L_{夜}$：50	
	註2 —		註2 $L_{日}$：60		註2 $L_{晚}$：55		註2 $L_{夜}$：50	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
98年7月	48.4	49.0	55.3	49.0	52.0	51.6	49.2	55.6 *
98年8月	45.1	44.4	49.5	50.3	45.7	55.2 *	41.1	44.9
98年9月	49.6	50.3	48.8	52.0	47.3	47.2	45.2	49.6
98年10月	47.5	46.0	51.9	53.5	47.9	46.7	47.3	46.1
98年11月	53.8	50.9	55.8	53.4	53.6	52.0	53.4 *	46.9
98年12月	46.9	42.4	48.0	48.8	47.7	47.6	48.5	44.1
99年1月	—	—	50.5	49.5	46.0	48.6	45.5	47.4
99年2月	—	—	47.7	56.0	44.6	57.3 *	40.3	43.6
99年3月	—	—	47.7	47.9	43.2	49.3	43.9	44.9
99年4月	—	—	51.7	49.6	51.8	48.9	48.6	46.5
99年5月	—	—	51.7	49.2	56.3 *	40.6	49.0	46.1
99年6月	—	—	61.9 *	51.0	43.7	39.2	43.3	43.9
99年7月	—	—	51.7	54.8	47.8	49.2	45.1	48.9
99年8月	—	—	50.8	49.6	49.4	47.3	42.5	43.7
99年9月	—	—	48.8	49.2	45.1	42.5	44.6	46.5
99年10月	—	—	63.3 *	51.3	53.2	50.3	51.6 *	48.6
99年11月	—	—	49.8	48.2	49.9	41.9	46.6	48.8
99年12月	—	—	61.9 *	48.0	46.5	49.0	44.4	49.5
100年1月	—	—	51.6	50.4	49.9	53.1	50.0	48.6
100年2月	—	—	48.6	48.3	47.4	47.6	43.1	45.3
100年3月	—	—	51.3	48.1	46.9	47.3	44.9	43.2
100年4月	—	—	50.1	50.3	49.2	46.4	43.1	44.6
100年5月	—	—	51.3	50.2	50.3	45.9	47.1	43.2
100年6月	—	—	52.0	51.4	46.5	46.7	49.1	46.6
100年7月	—	—	51.8	49.2	52.6	48.5	47.3	46.6
100年8月	—	—	50.0	48.6	46.1	49.5	40.3	44.0
100年9月	—	—	51.2	50.2	46.8	45.8	45.7	45.9
100年10月	—	—	50.5	52.3	46.2	47.5	44.6	47.6
100年11月	—	—	48.3	55.4	51.8	48.3	43.2	44.5
100年12月	—	—	51.5	51.1	49.4	50.3	52.8 *	47.5
101年1月	—	—	47.9	55.8	46.7	49.7	46.3	49.1
101年2月	—	—	54.4	54.5	50.4	57.6 *	53.2 *	51.9 *
101年3月	—	—	53.1	49.2	42.0	47.4	41.6	42.4
101年4月	—	—	48.9	49.1	46.3	40.4	43.9	46.9
101年5月	—	—	46.8	52.2	42.5	56.8 *	47.2	44.8
101年6月	—	—	51.8	50.1	48.2	44.2	46.5	46.2
歷年min	41.3	42.4	44.8	47.2	42.0	39.2	40.3	37.4
歷年max	65.1 *	65.9 *	68.2 *	69.0 *	70.0 *	63.8 *	67.2 *	66.2 *
歷年平均	53.9	54.2	56.5	56.6	54.5	53.9	53.8 *	53.3 *
歷年中數值	51.1	51.9	44.8	53.4	50.7	51.4	50.2 *	50.3 *

註：1.行政院環保署，民國85年1月31日(85)環署空字第01467號令發布。

$L_{早}$： 5:00 - 7:00、$L_{日}$：7:00 - 20:00、$L_{晚}$：20:00 -22:00、$L_{夜}$：82年12月以前22:00 - 5:00；83年1月以後0:00 - 05:00及22:00 - 24:00。

2.一般地區環境音量標準，係依據98年9月4日行政院環境保護署環署空字第0980078181號令發布之『噪音管制區劃定作業準則』。

日間：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；晚間：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；

夜間：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時。

3. "*" 表示超過法規標準值。歷年平均及歷年中數值統計時間自84/1迄今。

4.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-16 核四施工環境監測歷年振動$L_{v10(24小時)}$監測結果統計表

單位：dB

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
82年10月	30.0	30.0	52.8	48.7	-	-	-	-	-	-
82年12月	30.0	30.0	53.9	50.5	-	-	-	-	-	-
83年02月	30.0	30.0	53.7	54.1	-	-	-	-	-	-
83年04月	30.5	30.1	52.6	48.4	-	-	-	-	-	-
83年06月	30.2	30.0	51.7	47.3	-	-	-	-	-	-
83年09月	30.1	30.0	52.3	48.1	-	-	-	-	-	-
83年10月	33.2	33.9	51.8	48.3	-	-	-	-	-	-
83年12月	31.2	30.1	50.1	50.2	-	-	-	-	-	-
84年01月	32.8	31.8	48.1	46.2	-	-	-	-	-	-
84年03月	39.9	38.5	48.8	47.4	-	-	-	-	-	-
84年05月	30.2	30.0	48.2	43.0	-	-	-	-	-	-
84年08月	31.2	30.0	49.2	36.7	45.8	51.1	30.0	30.4	36.0	33.2
84年10月	30.3	30.0	45.2	42.2	53.0	48.8	30.0	30.3	30.0	30.9
84年12月	31.0	30.8	46.6	43.5	45.6	44.7	30.0	31.8	30.0	30.0
85年01月	37.1	37.2	50.2	44.4	52.6	50.4	30.0	30.0	30.0	30.0
85年04月	33.3	30.4	47.9	46.1	52.4	41.3	60.7	37.9	30.0	30.0
85年05月	32.6	31.8	47.8	45.6	52.0	49.7	30.0	31.2	30.0	31.6
85年08月	36.0	36.7	47.4	45.3	52.3	50.1	31.5	32.3	30.3	31.5
85年10月	31.6	30.2	42.5	44.3	51.3	48.9	30.6	30.8	30.0	30.0
85年12月	31.7	30.7	42.7	41.2	52.2	50.0	30.3	32.1	30.0	30.0
86年02月	38.1	35.9	48.0	45.5	52.2	50.8	30.0	31.0	30.0	30.0
86年04月	37.2	33.2	41.0	41.8	51.6	46.6	30.1	31.3	30.0	30.0
86年05月	39.7	37.8	39.4	36.2	52.1	49.9	31.2	32.0	30.5	30.6
86年08月	44.5	42.1	30.3	30.0	47.4	44.7	30.0	30.0	30.3	30.0
86年10月	43.7	41.5	30.8	30.0	47.7	45.6	32.2	32.7	31.2	30.1
86年11月	39.5	37.3	38.4	37.0	44.7	43.1	30.5	30.3	30.1	30.1
87年02月	41.1	36.3	32.6	31.8	48.1	34.9	32.5	36.3	30.0	30.0
87年04月	36.4	36.3	30.0	34.2	49.2	40.5	30.4	30.1	30.1	30.4
87年06月	39.3	37.5	30.0	30.0	30.8	30.7	30.6	30.8	30.3	31.2
87年08月	39.0	41.0	35.3	35.2	46.8	46.5	30.2	30.2	30.2	30.7
87年09月	38.3	40.8	38.0	37.6	38.0	40.3	31.0	31.4	30.2	31.1
87年12月	40.3	41.4	36.5	36.3	41.7	41.7	31.5	30.4	30.0	30.0
88年01月	37.4	37.0	32.7	30.1	36.2	38.0	30.0	30.0	30.0	30.6
88年04月	42.4	40.9	32.3	30.3	42.9	45.2	30.0	30.2	30.0	30.1
88年05月	35.8	39.2	36.7	37.3	43.7	40.1	37.3	37.4	30.6	31.5
88年06月	36.4	37.1	34.0	33.4	41.3	40.0	32.9	32.9	31.1	31.0
88年07月	38.5	38.3	33.2	31.8	40.8	38.9	32.3	32.3	30.5	31.3
88年08月	34.8	36.2	32.7	32.9	42.0	42.2	32.4	31.0	36.0	30.4
88年09月	36.5	35.4	33.3	33.2	43.5	41.9	33.7	33.8	30.3	30.9
88年10月	36.6	37.8	32.8	33.1	39.3	38.1	31.4	32.0	30.4	30.6
88年11月	35.6	34.1	33.0	32.7	37.9	36.7	32.7	32.2	30.2	30.4
88年12月	34.1	34.4	36.5	35.5	41.6	41.5	30.0	31.2	30.0	30.1

表3.1-16 核四施工環境監測歷年振動$L_{v10(24小時)}$

監測結果統計表（續1）

單位：dB

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
89年1月	37.2	35.4	35.3	35.4	44.3	44.1	32.1	32.6	30.0	30.2
89年2月	39.7	37.9	36.6	35.9	40.2	41.7	32.6	32.1	30.0	30.0
89年3月	43.0	39.5	31.0	31.4	39.8	41.1	31.2	32.4	30.0	30.3
89年4月	44.6	43.2	33.3	32.2	41.4	40.7	33.6	34.6	33.6	30.0
89年5月	43.6	42.0	32.9	32.7	42.7	42.7	32.8	34.8	30.0	30.0
89年6月	46.1	41.3	35.2	34.2	41.7	40.8	30.6	33.1	30.0	30.0
89年7月	40.7	37.5	35.6	34.4	40.7	41.8	31.2	32.6	30.0	30.0
89年8月	38.4	38.9	31.2	30.5	44.7	44.8	30.0	30.9	33.8	30.0
89年9月	41.8	41.8	30.5	31.8	46.7	39.8	30.8	36.9	31.2	38.7
89年10月	40.1	36.2	30.8	30.4	48.3	46.3	36.9	30.9	31.2	30.0
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	44.9	43.3	31.8	31.6	45.9	45.7	31.1	33.2	30.0	30.0
90年3月	45.2	43.2	33.7	30.3	48.4	45.1	41.3	35.6	51.2	30.5
90年4月	41.0	39.0	31.5	30.2	49.9	44.0	33.9	37.5	30.2	30.2
90年5月	44.6	41.3	30.5	30.3	45.8	46.8	40.7	33.8	30.0	30.4
90年6月	41.5	39.7	31.5	30.6	44.3	38.5	30.4	31.3	30.1	30.3
90年7月	38.9	36.4	33.7	34.0	44.0	43.3	31.4	32.6	30.0	30.2
90年8月	44.1	38.8	35.5	32.1	41.4	38.8	33.8	32.5	30.0	30.2
90年9月	45.3	41.4	32.4	31.5	41.9	41.3	30.5	31.5	30.2	30.6
90年10月	43.6	40.9	33.1	33.0	42.0	39.8	31.5	33.8	30.0	30.5
90年11月	42.7	40.4	31.4	31.1	40.8	40.2	30.1	30.0	30.0	30.2
90年12月	43.7	42.3	33.7	34.8	38.0	42.3	30.6	32.9	30.0	30.4
91年1月	40.1	38.4	31.8	31.9	39.3	39.0	31.8	32.4	30.0	30.8
91年2月	42.1	39.8	32.7	33.3	38.9	36.1	33.4	33.2	30.0	30.0
91年3月	41.4	38.8	32.5	32.2	41.5	41.1	32.4	33.0	30.0	30.5
91年4月	40.6	38.6	32.7	31.8	35.7	36.8	30.7	30.4	30.0	30.2
91年5月	42.4	42.0	31.8	32.0	38.5	39.9	30.7	30.4	30.0	30.1
91年6月	44.8	41.4	31.5	31.4	36.7	38.3	30.4	30.9	30.0	30.4
91年7月	46.9	44.0	31.5	32.5	47.9	46.3	35.4	37.6	30.0	30.0
91年8月	44.1	41.4	31.2	32.0	47.2	44.1	32.7	34.3	31.3	31.3
91年9月	39.4	39.0	32.0	32.8	47.2	45.8	40.3	30.7	31.1	33.1
91年10月	39.6	38.7	31.6	31.8	46.9	44.0	33.6	36.1	34.2	30.0
91年11月	39.1	39.0	31.8	31.2	45.4	43.5	35.3	32.5	30.2	31.7
91年12月	38.9	38.8	32.4	32.1	44.5	43.5	33.7	34.2	30.5	30.0
92年1月	40.8	38.2	31.4	32.1	42.8	43.5	36.8	38.4	30.2	30.4
92年2月	39.7	39.3	32.6	31.5	44.8	45.3	30.8	31.7	30.1	30.6
92年3月	39.9	37.8	32.1	34.2	44.1	43.7	31.9	33.7	30.0	30.0
92年4月	41.4	38.4	32.0	32.7	44.6	45.5	32.8	33.5	30.0	30.3
92年5月	39.4	37.2	32.9	32.3	45.2	46.3	31.7	30.0	30.2	30.5
92年6月	46.0	37.9	32.5	31.6	45.4	45.3	34.8	33.5	35.3	30.4

表3.1-16 核四施工環境監測歷年振動$L_{v10(24小時)}$

監測結果統計表（續2）

單位：dB

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
92年7月	41.3	37.6	33.1	32.1	44.9	45.9	35.7	37.3	30.2	30.2
92年8月	40.3	38.8	33.2	32.3	43.8	44.2	30.5	32.1	30.3	30.8
92年9月	35.1	34.9	32.1	31.9	43.2	43.5	31.9	32.9	33.9	30.0
92年10月	40.2	39.5	32.2	32.8	44.5	45.1	33.0	32.0	32.3	32.8
92年11月	39.8	37.3	34.2	32.5	44.6	45.0	30.2	30.9	30.0	30.0
92年12月	40.2	40.4	31.9	32.6	44.9	44.4	31.2	33.5	37.4	30.0
93年1月	43.8	43.7	34.1	32.1	42.6	44.3	33.5	34.6	30.2	30.0
93年2月	47.8	48.6	33.5	32.2	47.2	43.2	33.8	35.0	30.8	30.0
93年3月	41.9	39.7	33.7	31.9	48.4	44.5	32.0	32.1	30.3	30.0
93年4月	41.1	41.6	33.6	33.3	45.6	42.0	30.2	34.3	30.0	30.0
93年5月	36.7	36.5	34.4	31.5	43.3	44.5	30.5	34.0	30.0	30.0
93年6月	40.5	39.1	37.1	32.0	46.0	43.5	31.4	33.9	30.0	30.0
93年7月	36.9	36.7	32.7	32.5	44.1	45.0	32.0	33.9	32.9	30.0
93年8月	37.6	37.4	33.0	32.2	46.1	46.3	33.5	35.6	30.0	30.0
93年9月	37.1	37.8	33.7	33.0	46.1	48.6	30.8	32.9	30.0	30.0
93年10月	37.9	36.9	32.5	33.0	44.7	43.4	32.9	33.0	30.0	30.0
93年11月	34.1	34.3	32.6	31.8	45.1	45.3	33.8	33.7	30.0	30.0
93年12月	38.7	39.7	33.5	32.7	43.0	43.2	32.0	33.6	31.4	30.7
94年1月	36.5	38.0	33.4	33.0	49.1	43.4	31.0	34.6	31.9	30.0
94年2月	42.3	42.9	35.3	34.8	42.9	43.9	32.7	32.6	30.0	30.4
94年3月	36.7	37.5	34.2	34.1	43.5	44.7	32.5	32.7	30.0	30.2
94年4月	41.5	41.1	34.8	33.8	43.4	42.3	32.8	33.7	30.0	30.0
94年5月	37.1	37.4	34.0	33.6	53.5	49.5	33.7	32.4	30.0	30.1
94年6月	41.5	43.4	36.5	34.0	51.8	47.4	30.2	32.7	30.0	30.0
94年7月	37.5	36.2	34.7	34.8	52.8	47.5	30.6	34.5	30.0	30.0
94年8月	44.7	45.4	35.5	36.0	60.3	49.9	31.7	37.6	31.7	31.9
94年9月	46.1	44.8	35.0	35.0	45.8	50.0	33.9	34.7	30.2	30.2
94年10月	42.3	42.2	34.4	34.7	46.0	45.8	31.8	33.5	30.2	30.2
94年11月	38.0	38.0	34.5	34.6	43.0	45.1	31.3	33.5	36.4	30.0
94年12月	42.5	40.6	34.8	35.4	44.9	44.3	35.0	34.9	30.0	30.2
95年1月	39.5	39.6	35.2	34.6	43.5	44.4	31.5	34.2	30.3	30.2
95年2月	41.5	40.6	35.8	35.4	41.6	42.8	33.9	33.9	30.0	30.1
95年3月	36.1	37.3	34.9	36.0	47.6	44.8	32.6	33.2	30.0	30.0
95年4月	40.8	43.4	34.8	35.8	46.5	47.1	33.6	35.2	30.4	33.4
95年5月	37.2	35.7	35.2	35.1	47.8	46.3	31.0	32.5	30.2	30.0
95年6月	36.3	37.6	35.2	35.2	46.5	43.3	33.6	33.8	30.0	30.0
95年7月	42.7	43.2	34.8	35.0	44.9	45.2	35.0	35.5	30.3	30.3
95年8月	44.1	42.6	34.1	34.0	46.7	45.2	33.0	33.6	30.0	30.1
95年9月	42.4	40.9	34.9	34.6	46.5	45.5	33.0	34.1	30.1	30.2
95年10月	44.8	48.9	35.0	34.4	45.3	44.5	32.7	34.2	30.2	30.2
95年11月	43.4	43.5	34.6	34.7	46.1	45.5	32.2	33.2	30.0	30.0
95年12月	42.3	41.2	35.4	34.9	45.9	45.4	32.8	33.4	30.1	30.0

表3.1-16 核四施工環境監測歷年振動$L_{v10(24小時)}$
監測結果統計表（續3）

單位：dB

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
96年1月	42.0	39.5	34.7	34.0	49.4	50.1	32.9	34.1	30.2	30.2
96年2月	39.6	40.6	33.8	34.7	45.0	45.9	33.4	34.9	30.0	30.0
96年3月	40.3	39.1	34.0	34.9	42.6	43.3	35.6	34.8	30.0	30.0
96年4月	42.2	42.0	35.2	34.6	43.8	44.6	34.7	35.5	30.0	30.4
96年5月	40.8	38.1	35.2	33.9	48.4	48.0	35.2	34.8	30.4	32.0
96年6月	42.6	36.5	33.7	33.0	49.1	45.9	33.1	33.8	30.0	30.0
96年7月	42.2	41.2	34.6	35.2	43.4	44.9	32.8	33.5	30.0	30.0
96年8月	37.0	37.3	34.0	33.7	45.3	44.2	33.1	32.4	30.1	30.0
96年9月	37.9	38.1	35.3	34.0	44.6	42.0	35.1	35.9	30.5	34.1
96年10月	35.9	38.1	35.0	34.8	57.0	48.9	33.1	31.0	30.1	30.0
96年11月	44.5	39.0	32.1	32.4	55.4	47.6	32.8	32.8	30.5	30.9
96年12月	43.9	38.1	35.0	34.1	55.7	54.4	30.2	31.0	37.7	30.0
97年1月	40.3	38.7	32.9	32.9	53.4	46.6	32.1	32.1	30.0	30.0
97年2月	36.9	38.0	30.0	32.0	55.8	52.4	33.9	32.8	30.5	30.6
97年3月	37.3	37.5	30.4	30.2	55.8	55.1	31.6	32.2	30.0	30.1
97年4月	36.2	32.2	30.3	30.3	55.0	51.0	30.0	30.0	30.0	30.0
97年5月	36.4	35.5	31.2	30.7	48.2	47.1	30.0	30.0	30.0	30.0
97年6月	35.2	34.4	30.5	30.3	46.9	42.7	30.0	30.0	30.0	30.0
97年7月	36.3	34.2	30.3	30.1	47.4	46.4	30.0	30.0	30.0	30.7
97年8月	34.5	31.2	30.2	30.0	46.6	42.2	30.0	30.0	30.0	30.0
97年9月	34.8	33.9	31.5	33.8	47.3	42.3	30.0	30.0	30.0	30.0
97年10月	35.1	32.1	33.6	33.4	47.6	43.2	30.0	30.3	30.0	30.0
97年11月	36.0	33.8	30.7	30.2	47.4	46.4	30.0	31.2	30.0	30.0
97年12月	35.0	34.3	30.4	30.1	48.7	47.2	30.0	30.0	30.0	30.0
98年1月	34.9	32.3	30.7	30.1	48.1	44.6	30.0	30.0	30.0	30.0
98年2月	36.6	35.5	30.6	30.1	48.1	43.8	30.0	30.6	30.2	30.0
98年3月	37.0	33.6	30.3	30.0	49.5	47.0	30.0	30.0	30.0	30.0
98年4月	36.9	32.7	30.5	30.0	48.5	44.2	30.0	30.1	30.0	30.0
98年5月	36.4	31.9	30.3	30.0	48.2	42.9	30.0	30.0	30.0	30.0
98年6月	39.8	36.7	30.7	30.0	48.3	46.6	30.0	30.0	30.0	30.0
98年7月	36.3	32.7	30.4	30.0	47.6	43.5	30.0	30.0	30.0	30.0
98年8月	36.0	31.6	30.1	30.0	47.8	47.0	30.0	30.0	30.0	30.0
98年9月	35.4	34.9	30.6	30.2	47.9	46.5	30.0	30.0	30.0	30.0
98年10月	36.7	32.7	30.6	30.0	48.8	43.8	30.0	30.4	30.0	30.0
98年11月	36.6	36.7	30.6	30.3	49.2	47.2	30.0	30.0	30.0	30.1
98年12月	37.3	36.3	31.0	30.3	49.1	47.7	30.0	30.0	30.0	30.0
99年1月	37.4	37.0	30.9	30.4	49.0	48.0	30.0	30.0	30.0	30.0
99年2月	37.5	35.2	30.5	30.0	48.5	46.4	30.0	30.0	30.0	30.0
99年3月	37.7	37.0	30.9	30.3	49.2	47.5	30.0	30.0	30.0	30.0
99年4月	37.1	31.1	30.8	30.0	48.2	40.8	30.0	30.0	30.0	30.0
99年5月	40.9	36.3	30.6	30.0	48.8	44.5	30.0	30.0	30.0	30.0

表3.1-16 核四施工環境監測歷年振動$L_{v10(24小時)}$監測結果統計表（續4）

單位：dB

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
99年6月	39.7	36.6	31.3	30.2	48.7	44.9	30.0	30.7	30.0	30.0
99年7月	36.4	35.9	35.6	36.1	49.2	48.1	30.0	30.3	30.0	30.0
99年8月	37.0	36.1	30.3	30.2	49.2	47.8	30.0	30.9	30.0	30.0
99年9月	36.9	36.3	31.4	30.9	48.6	46.9	30.0	30.1	30.0	30.0
99年10月	35.9	35.6	30.6	30.4	48.1	46.9	30.0	30.0	32.2	30.0
99年11月	36.5	34.1	31.0	30.0	48.4	44.5	30.0	30.5	30.0	30.0
99年12月	36.3	34.4	31.2	34.9	47.3	43.9	30.1	30.0	30.2	30.8
100年1月	36.6	32.9	51.2	62.0	47.8	43.0	30.0	30.0	31.0	32.9
100年2月	37.9	37.6	49.0	47.8	48.1	46.9	30.0	31.2	30.0	30.0
100年3月	39.1	34.6	49.1	42.7	48.3	44.0	31.2	30.0	30.1	30.0
100年4月	38.0	36.7	43.9	42.3	49.2	47.0	30.4	30.2	30.0	30.0
100年5月	38.6	38.0	42.5	41.5	48.8	46.6	32.3	32.9	30.0	30.0
100年6月	38.6	38.1	42.6	41.6	49.0	47.0	30.0	30.5	30.4	30.0
100年7月	38.2	35.6	42.4	37.8	49.0	44.6	30.0	30.0	30.0	30.0
100年8月	36.8	32.7	42.0	36.9	48.4	44.0	30.2	30.3	30.0	30.0
100年9月	38.0	37.9	42.0	41.5	48.9	47.8	30.0	30.2	30.0	30.0
100年10月	35.3	34.8	44.5	43.8	49.2	48.2	30.0	30.3	30.0	34.6
100年11月	36.0	35.3	44.8	43.7	49.1	45.6	30.3	32.4	30.0	30.0
100年12月	35.0	32.3	43.8	40.6	49.1	46.2	30.0	30.5	30.0	30.0
101年1月	35.9	32.3	43.6	39.1	50.8	46.4	30.0	30.0	30.0	30.0
101年2月	36.9	35.7	44.7	42.8	51.9	50.1	30.0	30.0	30.0	30.0
101年3月	36.1	33.0	43.7	40.8	51.2	48.1	30.0	31.0	30.0	30.0
101年4月	36.3	36.1	43.7	43.1	53.2	52.6	30.0	30.1	30.0	30.0
101年5月	34.7	32.6	42.7	39.4	51.9	47.4	30.0	30.3	30.0	30.6
101年6月	33.8	30.5	42.8	37.5	52.8	46.1	30.0	30.3	30.0	30.1
歷年min	30.0	30.0	30.0	30.0	30.8	30.7	30.0	30.0	30.0	30.0
歷年max	47.8	48.9	53.9	62.0	60.3	55.1	60.7	38.4	51.2	38.7
歷年平均	40.2	39.0	42.2	42.5	48.7	46.1	39.2	32.8	32.9	30.6
歷年中數值	38.1	37.5	33.7	33.3	46.9	44.8	31.2	32.1	30.0	30.0

註：自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-17 核四施工環境監測歷年交通流量監測結果比較表

單位：P.C.U./日

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
84年01月	23140.0	21807.0	22308.0	21548.0	-	-	-	-	-	-
84年03月	21881.0	26458.0	20095.0	24177.0	-	-	-	-	-	-
84年05月	27787.0	26338.0	24702.0	27226.0	-	-	-	-	-	-
84年08月	22967.0	30800.0	19919.0	25405.0	21988.0	26005.0	1089.0	1537.0	32.0	306.0
84年10月	22790.0	28296.0	21115.0	19973.0	23148.0	24196.0	585.0	1029.0	21.0	144.0
84年12月	24478.0	23619.0	21478.0	22963.0	22841.0	23466.0	142.0	1087.0	17.0	49.0
85年01月	22997.0	21905.0	17521.0	18485.0	19793.0	18796.0	796.0	1020.0	39.0	47.0
85年04月	29555.0	31884.0	17847.0	27906.0	21382.0	18940.0	2065.0	2027.0	24.0	34.0
85年05月	21957.0	26183.0	23522.0	24132.0	17988.0	18589.0	831.0	2239.0	38.0	162.0
85年08月	24392.0	35695.0	22054.0	32047.0	19242.0	29072.0	1478.0	2329.0	89.0	130.0
85年10月	20140.0	25143.0	19753.0	23465.0	20044.0	23919.0	2232.0	3098.0	88.0	103.0
85年12月	16371.0	24021.0	15376.0	20560.0	14112.0	20970.0	699.0	944.0	55.0	62.0
86年02月	20441.0	20739.0	14191.0	15557.0	13805.0	15924.0	1003.0	1026.0	20.0	88.0
86年04月	14131.0	22519.0	13015.0	19753.0	13939.0	23491.0	1240.0	4394.0	58.0	80.0
86年05月	23501.0	29028.0	25199.0	26055.0	23546.0	25910.0	3508.0	3896.0	70.0	121.0
86年08月	23534.5	23553.0	21277.0	21884.0	22312.0	22673.5	1473.0	1795.0	18.0	26.0
86年10月	18534.5	18703.0	17269.5	16959.0	17542.0	17666.0	1238.5	1486.0	131.0	119.0
86年11月	12464.5	16494.0	12124.0	16040.0	12435.0	16237.0	-	-	-	-
86年12月	-	-	-	-	-	-	504.0	679.5	27.5	30.0
87年02月	20643.5	22205.0	19462.5	21793.5	17050.0	17783.0	804.0	1524.0	23.5	35.5
87年04月	17167.0	19642.0	15758.5	18337.0	16708.5	20117.0	4313.0	3127.5	69.0	117.0
87年06月	15838.0	22048.0	14757.5	19830.5	15437.5	21109.0	1053.5	1279.0	110.5	304.0
87年08月	13088.0	19398.0	10839.0	16660.0	12033.0	18221.0	1094.0	1933.0	69.0	241.0
87年09月	16307.5	23639.0	14645.5	20825.0	15435.0	22055.0	1037.0	1853.0	114.5	306.5
87年12月	18233.5	23876.0	17449.0	22928.5	18088.5	23534.0	1821.0	1993.0	68.5	94.0
88年01月	20519.0	25393.0	19832.0	23382.0	19193.0	22773.5	1656.0	2424.5	75.0	175.5
88年04月	22157.5	24768.5	18408.5	18542.5	22135.5	24081.0	1281.0	2422.5	111.5	152.5
88年05月	18704.5	23918.0	16821.0	23466.5	17331.0	23557.5	944.0	970.5	145.5	253.0
88年06月	19888.5	22546.6	18688.6	21003.9	18487.0	21846.3	1104.8	1484.7	153.7	243.2
88年07月	20517.5	23191.5	19431.5	20438.0	17319.5	21335.0	1015.5	2080.0	230.0	225.0
88年08月	19851.5	21216.0	18879.5	20338.5	20232.5	21502.0	1274.5	1146.5	81.5	256.5
88年09月	18599.0	24752.0	18216.5	23538.5	17827.0	24323.5	1412.5	1682.5	121.0	203.0
88年10月	14831.0	18516.0	12545.5	16373.0	13416.0	17909.0	1021.0	1049.0	103.0	238.0
88年11月	18963.5	24832.0	18281.5	22502.0	19213.0	23467.5	870.0	1331.0	72.0	165.0
88年12月	18251.0	22703.0	15412.0	19711.0	17529.5	22207.5	788.5	1278.0	61.0	87.0
89年1月	18847.0	23097.0	17351.5	21820.0	19805.0	24625.0	1711.0	2753.5	38.5	95.5
89年2月	17117.0	23506.0	15088.0	21944.5	16602.5	23559.0	1357.5	2151.5	63.0	108.0
89年3月	18934.0	23991.5	16439.0	21890.0	17901.0	23328.5	1142.5	2769.0	45.0	156.0
89年4月	17079.0	22674.0	14520.5	20294.0	16213.5	21678.0	1191.0	1994.5	62.0	75.0
89年5月	17149.0	24123.5	14718.0	20314.0	16209.0	21944.5	1498.0	3053.0	73.5	84.5
89年6月	16226.5	25906.0	15115.5	26392.0	16281.5	28571.0	562.0	1630.0	22.0	51.0
89年7月	19800.0	23022.0	17860.0	21463.0	18967.5	22551.5	1682.5	1756.5	44.5	87.5
89年8月	20707.5	25980.0	20607.0	26580.5	19432.5	27598.5	1150.5	3163.0	73.5	125.5
89年9月	18850.5	23730.5	17872.0	23149.5	17160.5	18979.5	1295.5	972.5	67.0	26.0
89年10月	21615.5	27491.5	20605.0	25152.5	19095.5	23488.0	1177.0	1485.0	69.0	114.5
89年11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3.1-17 核四施工環境監測歷次交通流量監測結果比較表（續1）

單位：P.C.U./日

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
90年1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90年2月	19479.0	21833.0	15937.0	19729.0	17124.5	20856.0	1901.5	1891.0	117.0	186.5
90年3月	16984.0	25570.0	14615.5	22597.0	18936.5	25974.0	1638.0	1883.0	71.0	48.5
90年4月	18062.5	24263.5	16642.5	22045.5	18213.0	23092.0	1170.0	2254.0	50.5	112.0
90年5月	20494.0	26046.5	17227.5	23544.0	18649.5	25564.5	1412.5	1646.0	67.0	206.5
90年6月	19974.5	23290.5	16946.0	19430.5	17778.0	20800.5	1539.5	1602.0	99.0	229.0
90年7月	19132.0	25031.0	16388.0	22357.5	17743.5	23438.5	1510.5	3321.0	42.5	96.0
90年8月	14468.5	24282.0	16852.5	21941.0	17749.5	23064.0	1349.5	2584.0	103.0	49.0
90年9月	19998.0	22427.5	16319.0	18564.5	17430.0	19511.0	1546.0	1592.5	92.0	229.0
90年10月	17913.5	21353.5	16720.0	19999.0	17986.5	21356.5	1634.5	2954.5	46.5	97.5
90年11月	13468.0	24287.5	13633.0	20538.5	15111.5	21705.5	1141.5	1242.0	68.5	194.0
90年12月	21577.0	24870.0	19157.5	21566.0	20797.5	23275.0	868.5	1311.5	25.5	76.5
91年1月	22013.5	23737.0	20663.0	24340.5	21363.0	24008.0	1253.5	2811.5	158.5	54.0
91年2月	14541.5	22728.5	18324.5	22136.5	17536.0	20985.5	1320.5	2306.0	130.0	139.5
91年3月	17624.0	23798.0	15974.5	21598.5	17150.5	22618.5	984.5	2765.0	62.0	81.0
91年4月	22013.5	23737.0	20663.0	24340.5	21363.0	24008.0	1253.5	2811.5	158.5	54.0
91年5月	14541.5	22728.5	18324.5	22136.5	17536.0	20985.5	1320.5	2306.0	130.0	139.5
91年6月	17624.0	23798.0	15974.5	21598.5	17150.5	22618.5	984.5	2765.0	62.0	81.0
91年7月	17578.5	28889.5	16303.0	28972.0	16960.5	28560.0	1634.5	9396.0	20.5	50.5
91年8月	14438.5	24590.5	18109.0	22045.5	18716.5	22896.0	1121.5	2759.0	80.0	52.5
91年9月	19198.0	26672.5	17806.0	25650.5	18577.0	27336.0	1630.0	1342.5	84.0	205.0
91年10月	16184.0	19491.5	14137.5	16313.5	14788.0	17363.0	1342.5	2288.5	86.0	130.0
91年11月	13892.5	23100.5	15266.0	21764.0	16140.5	22744.5	1796.5	2564.0	56.0	144.0
91年12月	17244.5	21670.0	16518.0	20197.5	16862.5	22026.0	1453.0	2581.5	106.5	193.0
92年1月	18838.5	24129.5	16921.0	21579.5	17931.5	23178.0	1365.0	2367.5	42.5	108.0
92年2月	13923.0	23922.5	17382.5	22092.5	18313.0	23231.5	1133.0	1520.0	43.0	109.0
92年3月	17251.5	21902.0	16308.5	19712.0	17234.5	20760.0	1425.0	2137.0	61.0	50.0
92年4月	16414.5	24344.0	14092.0	21576.5	14870.0	22836.0	1015.5	2204.0	59.5	106.5
92年5月	13410.5	20486.5	16616.0	18702.0	17118.5	20152.0	1206.5	1186.5	53.0	124.5
92年6月	16632.0	22639.5	14835.5	19746.5	15408.5	21086.0	1195.0	1922.0	49.5	45.0
92年7月	18617.5	33366.5	16809.5	31300.5	17867.5	35536.5	2228.0	6008.0	78.0	228.0
92年8月	16455.5	26166.0	18748.5	23154.0	19444.5	24402.0	1069.5	1725.0	50.5	188.5
92年9月	16408.0	22118.0	16840.0	21799.5	17152.5	22690.5	1219.0	2031.5	81.0	55.5
92年10月	14993.0	27901.5	14229.5	29804.5	14876.0	28184.0	1676.0	3651.5	64.5	82.0
92年11月	13419.5	21746.0	16438.5	20632.0	17077.0	21789.5	787.0	1416.0	67.0	43.0
92年12月	11014.0	15096.5	10483.0	14414.5	10799.5	15062.0	889.5	1386.5	34.0	39.0
93年1月	18124.0	20919.0	17358.5	19939.5	18035.5	20963.5	1146.0	2474.5	66.5	62.0
93年2月	11214.0	22599.5	14441.0	21673.0	15058.0	22952.5	1464.5	2534.5	70.5	79.5
93年3月	19084.5	22778.5	17644.0	21367.0	18622.0	22489.0	1011.0	2370.5	83.0	64.0
93年4月	17655.0	22411.0	16576.0	20823.5	17299.5	21950.0	1379.5	2784.5	76.5	107.5
93年5月	15165.5	23852.5	14538.5	21522.5	15409.5	23139.5	1156.0	2486.5	90.0	57.0
93年6月	17980.0	23683.0	17348.0	22398.0	18385.0	23889.5	1352.0	3254.5	159.5	43.5
93年7月	17857.0	25796.0	17094.0	24765.0	18093.5	25900.5	1183.0	4021.5	148.5	48.5
93年8月	17557.5	24922.5	17557.5	24922.5	18229.5	26513.5	1512.0	3589.5	90.0	61.0
93年9月	18887.0	23940.0	17615.5	22872.0	18662.0	23916.5	1216.5	2491.5	94.0	64.5
93年10月	13977.5	25645.0	13471.0	24361.0	14168.0	25794.5	1312.0	3817.0	66.0	62.5
93年11月	12971.5	24644.5	15473.0	23251.0	16609.0	24448.0	1579.0	4280.5	51.0	60.5
93年12月	18362.5	24723.5	16969.0	22983.5	18184.5	24384.0	1182.0	2875.0	111.0	107.0

表3.1-17 核四施工環境監測歷次交通流量監測結果比較表（續2）

單位：P.C.U./日

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
94年1月	17883.0	23193.5	16410.5	21762.5	17384.5	22912.0	1621.0	4766.0	87.5	63.5
94年2月	16856.5	23001.5	15535.0	22267.0	16520.5	23252.0	681.5	1509.5	39.0	46.5
94年3月	19872.0	27088.0	18550.5	25569.0	20077.5	27077.0	1808.0	3080.0	65.0	78.5
94年4月	14473.5	22062.5	14150.0	21599.0	17494.5	25275.0	1228.5	3149.5	55.5	83.5
94年5月	12477.5	22923.5	11594.5	21643.5	12404.0	22939.0	1390.5	3419.0	62.0	87.5
94年6月	21116.0	25099.5	19929.0	23983.5	17987.0	23930.0	1589.0	3186.5	82.0	117.5
94年7月	18007.5	21014.5	17479.5	19922.5	18351.0	21180.0	1921.5	3098.5	75.0	99.0
94年8月	22592.5	26774.5	21577.5	24854.0	15882.0	28175.5	2025.5	9737.0	141.0	192.0
94年9月	17210.5	24953.5	16140.0	23478.0	16546.5	24650.5	1340.0	3157.5	118.0	111.0
94年10月	23662.0	17027.5	22020.0	15041.5	23480.5	16094.5	1464.0	3096.0	91.5	139.0
94年11月	19627.0	23221.5	18164.5	21675.0	19806.0	23269.0	1604.5	3462.5	94.5	183.5
94年12月	13094.5	17789.5	11407.5	15864.0	12204.5	16977.0	2088.0	1120.0	59.0	65.5
95年1月	13927.5	23345.0	12559.0	20988.5	13475.5	22880.0	970.5	3688.0	65.5	75.0
95年2月	15417.0	19369.0	14173.0	17655.5	14815.5	18726.0	1172.5	946.5	62.5	74.5
95年3月	15929.0	23944.0	13847.5	15995.0	14942.0	22864.5	1296.5	2465.0	53.5	54.0
95年4月	18146.0	19231.5	15829.5	16773.5	17310.5	18035.5	1151.5	2556.0	72.5	91.0
95年5月	18790.5	18693.5	16298.0	16484.0	17995.5	17740.0	790.5	1791.0	81.5	67.5
95年6月	16288.0	18383.5	15141.0	16117.5	16414.0	17943.5	1023.5	1432.5	46.5	52.0
95年7月	18630.0	33043.5	15813.5	29752.5	16956.5	31449.5	11442.5	13006.5	95.5	90.0
95年8月	19652.0	25679.5	16771.0	21831.5	17731.0	24190.0	1799.5	3183.0	78.5	77.0
95年9月	14021.5	20617.0	11883.5	17605.5	13034.0	19402.5	1121.0	2355.0	48.0	81.0
95年10月	16824.0	21025.0	13835.0	18093.5	15297.0	19549.0	1303.0	27695.0	59.5	63.5
95年11月	16236.0	22211.0	13585.0	19020.0	14345.5	20364.5	1159.5	2631.0	68.0	61.5
95年12月	16548.5	18844.5	13669.5	15416.0	14864.5	16890.5	1425.5	2097.0	57.0	39.5
96年1月	17279.0	18102.5	16071.5	17020.0	16120.0	16951.5	2336.5	1121.0	35.5	45.0
96年2月	20055.0	18889.0	17066.0	15153.5	18100.0	16475.0	1481.5	2782.0	41.5	63.0
96年3月	16617.0	17982.0	14586.5	14769.5	14638.0	15520.0	1620.5	2119.0	52.0	50.5
96年4月	18460.0	20448.5	15945.5	17841.0	16791.5	19464.5	1156.0	2516.5	58.0	68.0
96年5月	19742.0	18540.0	15680.0	13698.5	16444.5	14698.0	1617.0	2615.5	47.0	76.0
96年6月	17900.5	14729.5	14668.0	12307.0	15619.5	13312.0	1186.5	2644.0	67.0	38.0
96年7月	13154.5	20736.5	10033.5	17157.5	11446.0	18761.0	970.5	1101.5	77.0	45.5
96年8月	18038.5	19372.5	15188.0	16488.0	15962.0	17533.0	1130.5	3039.0	38.5	44.5
96年9月	17066.5	16806.5	13036.0	15302.5	14220.5	16775.5	997.5	2662.0	93.5	196.5
96年10月	15722.5	16710.5	12462.5	14225.5	13762.5	15506.5	1088.5	2205.5	149.5	170.0
96年11月	13845.0	18603.0	10755.5	15143.0	11891.0	16926.5	1175.5	1666.5	125.5	154.5
96年12月	14419.5	17345.5	11523.0	13874.5	12558.0	15065.0	1026.5	1970.0	194.0	99.5
97年1月	16056.5	17808.5	12891.5	14086.5	14137.0	15891.5	1095.0	1576.5	28.5	83.5
97年2月	12842.5	15871.5	9544.5	12783.0	10966.0	14008.0	1052.5	2055.5	36.5	148.0
97年3月	12393.0	14505.0	9227.0	11273.0	9891.5	12394.5	1521.5	2819.5	33.5	165.5
97年4月	19866.5	16394.0	15957.0	16641.0	13149.0	11971.5	1185.0	1910.5	55.5	84.0
97年5月	18940.5	19562.5	16110.0	16760.5	13563.0	13753.5	1584.0	2034.0	62.0	99.5
97年6月	18434.5	19677.5	14809.0	16332.5	10781.0	12543.0	1427.0	3166.5	55.5	151.0
97年7月	18271.5	19149.0	14621.5	16846.0	11894.0	13974.0	1452.0	2568.0	64.5	289.5
97年8月	17447.0	16754.0	13845.5	14177.5	11587.5	13909.0	1530.0	3491.0	68.0	84.0
97年9月	19547.0	19159.5	14627.5	15516.5	12008.0	13614.5	1376.5	3491.5	103.0	96.5
97年10月	18672.5	19347.5	15185.0	15993.5	12971.5	15002.0	1620.5	4150.0	103.5	94.5
97年11月	20311.0	20356.0	16417.0	17722.5	11325.0	13843.5	1208.0	4030.5	81.0	116.0
97年12月	19190.5	18703.0	15878.0	16225.5	13795.5	15410.0	1661.5	3125.5	80.5	74.0
98年1月	17639.0	12667.5	13834.5	12086.5	11708.0	9833.5	1409.0	1746.0	34.0	49.5
98年2月	19908.0	19412.0	16262.5	16812.0	11858.0	15629.0	1449.0	4010.5	66.0	81.0
98年3月	17931.5	16407.0	14077.5	15500.0	13295.5	15197.0	1492.5	2629.0	64.5	101.0

表3.1-17 核四施工環境監測歷次交通流量監測結果比較表（續3）

單位：P.C.U./日

測站名稱	台2省道與102甲縣道交叉口		鹽寮海濱公園		福隆街上		102縣道之新社橋		過港部落	
監測時間	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日	非假日	假日
98年4月	20204.5	17616.0	15966.5	15672.0	11614.0	13016.0	1330.0	2866.0	63.5	136.5
98年5月	18456.0	16737.0	14103.5	15124.5	12123.0	13697.5	1284.5	3035.0	63.0	177.0
98年6月	19225.5	18593.0	14351.5	15330.5	13038.5	14905.5	1563.5	2412.5	97.5	100.0
98年7月	19499.0	19550.5	15469.5	17403.5	13555.0	16312.5	1566.0	2389.0	85.5	153.5
98年8月	18905.0	18644.5	15197.0	17136.5	13129.5	16580.5	1653.5	2593.0	120.5	176.0
98年9月	19467.5	20352.5	15021.0	16603.0	13073.0	15087.0	1736.0	2529.5	93.0	133.5
98年10月	19594.5	15945.0	15536.0	14430.5	13415.5	12977.0	1695.0	3608.5	115.5	132.5
98年11月	20938.5	21212.0	17141.0	18577.5	13754.0	16310.5	1487.5	2661.0	92.0	90.5
98年12月	19704.0	16865.0	16037.5	14157.0	13196.0	12074.0	1451.0	2615.0	74.0	85.5
99年1月	19476.0	16075.0	15363.5	13448.0	13082.5	12040.0	1383.0	1595.0	98.5	72.0
99年2月	17267.0	13195.0	14468.5	11407.5	11826.0	10227.5	1713.5	2465.0	56.0	63.5
99年3月	19510.0	16763.5	15924.0	14217.5	13693.0	12712.5	1460.5	2119.0	96.5	94.5
99年4月	16764.5	14766.0	13313.0	13672.5	11393.5	11891.5	1512.5	1618.0	48.0	45.5
99年5月	18502.0	16468.5	15002.0	14667.0	12617.5	13317.5	1203.5	2216.0	49.5	65.5
99年6月	19051.5	21824.5	15599.5	19998.0	12867.0	18093.0	1686.0	3297.5	68.0	75.0
99年7月	20616.0	21757.5	16956.5	20283.5	13886.5	17241.0	1713.0	3920.0	93.5	137.5
99年8月	19882.5	19512.0	16524.0	16711.5	13693.5	15835.0	1768.0	4129.0	87.5	99.5
99年9月	18149.5	17775.0	14591.0	15363.5	12824.5	14102.0	1911.5	2945.5	61.0	75.5
99年10月	15971.5	14708.0	12986.0	12154.5	10495.5	10702.0	1236.0	2365.5	72.5	94.0
99年11月	17184.5	14814.5	13846.0	13359.5	12024.0	12689.5	1918.0	3926.0	65.5	116.5
99年12月	18015.5	14879.5	14200.5	13162.0	12660.0	12655.0	1898.0	2529.0	78.0	82.0
100年1月	16416.5	11388.5	12917.5	10622.5	11866.0	10964.0	1101.0	1554.0	35.0	64.0
100年2月	15471.0	12818.0	12553.5	11283.5	10930.5	9656.5	1184.0	2702.5	55.0	104.0
100年3月	15699.5	12822.0	14794.5	13525.5	11516.5	11235.0	2054.5	1527.0	71.0	94.0
100年4月	18067.0	16174.5	15267.0	14160.5	13340.0	13093.5	2040.5	2201.5	63.5	91.5
100年5月	18868.0	23307.5	15611.0	22071.5	14046.0	18698.5	2073.0	3968.0	75.0	94.0
100年6月	19916.5	21855.0	17218.5	19859.5	14958.5	18608.5	1681.5	2422.0	70.0	102.5
100年7月	20154.0	19195.0	16754.0	17174.0	15397.0	16805.5	1464.5	2176.5	52.5	86.5
100年8月	17252.5	13731.5	14275.0	11971.5	12566.5	11185.0	1529.5	2350.0	74.0	84.5
100年9月	18497.5	18000.0	16369.0	17962.0	14344.0	15237.0	1697.0	2582.0	89.0	101.0
100年10月	17956.5	16581.5	15569.5	14793.5	14152.0	15424.5	1528.5	2380.5	69.5	99.5
100年11月	18011.5	17693.5	15695.0	16487.5	13004.0	12566.0	1730.0	3072.5	57.5	81.5
100年12月	16154.5	14843.5	13754.5	13177.5	12214.0	13471.0	1323.0	2148.5	57.5	117.0
101年1月	16801.0	9912.5	14046.0	8374.0	12346.5	7876.5	1429.0	1173.5	76.5	63.0
101年2月	17394.0	14018.0	15196.0	12695.5	13267.0	12483.0	1230.5	1119.5	57.0	33.0
101年3月	16555.0	14780.0	14235.5	14273.5	12998.5	12771.5	1524.5	2533.5	66.5	94.5
101年4月	17778.5	17289.5	14908.0	15810.5	14308.0	15049.0	1515.5	2721.0	67.5	88.5
101年5月	19571.0	21170.5	17685.0	19970.0	17402.0	18091.5	1306.0	2638.0	59.5	60.5
101年6月	18010.5	17756.5	15204.0	17816.0	13502.0	16747.5	1683.0	2884.0	104.0	120.0
歷年MIN	11014.0	9912.5	9227.0	8374.0	9891.5	7876.5	142.0	679.5	17.0	26.0
歷年MAX	29555.0	35695.0	25199.0	32047.0	23546.0	35536.5	11442.5	27695.0	230.0	306.5
歷年平均	18053.0	21332.9	16071.7	19290.8	15852.0	19495.5	1444.9	2681.3	73.9	106.8

註：自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表 3.1-18 核四施工環境監測河川水文監測結果比較表

測站	期程	河川月平均水位(m)	河川斷面積(m^2)	含砂量(ppm)	平均流速(m/sec)	流量(cms)
石碇溪 1 號測站	本季 (101 年 4~6 月)	1.67~2.78	1.52~11.44	0~288	0.12~1.13	0.240~12.923
	100 年同期	1.59~2.00	0.83~2.79	0~63	0.08~0.65	0.067~2.876
	歷年同期	1.31~2.21	0.37~13.73	0~125	0.14~0.87	0.064~4.890
	上季 (101 年 1~3 月)	1.78~1.94	1.95~3.85	0~54	0.34~0.82	0.704~3.166
石碇溪 2 號測站	本季 (101 年 4~6 月)	0.39~1.01	0.83~8.64	-	0.28~1.98	0.253~17.116
	100 年同期	0.38~0.55	0.30~2.56	-	0.23~1.15	0.072~2.946
	歷年同期	0.36~0.58	0.26~4.27	-	0.12~2.29	0.064~7.172
	上季 (101 年 1~3 月)	0.44~0.55	1.52~3.26	-	0.68~1.01	1.047~3.296
雙溪 1 號測站	本季 (101 年 4~6 月)	0.36~3.60	7.84~227.85	0~888	0.28~1.11	3.057~43.485
	100 年同期	0.28~0.82	8.41~52.74	0~42	0.18~0.61	1.488~32.360
	歷年同期	0.20~1.36	3.76~96.54	0~135	0.05~1.00	0.893~96.388
	上季 (101 年 1~3 月)	0.51~0.78	29.44~57.94	0~47	0.27~0.71	7.996~41.047
雙溪 2 號測站	本季 (101 年 4~6 月)	0.27~4.02	4.30~227.85	0~846	0.54~1.19	3.182~270.736
	100 年同期	0.27~1.00	2.05~56.31	0~41	0.31~0.82	1.550~33.598
	歷年同期	0.27~1.27	2.05~102.70	0~123	0.08~1.27	0.236~130.774
	上季 (101 年 1~3 月)	0.55~0.88	31.47~62.17	0~45	0.27~0.69	8.505~43.087

註：1.歷年同期資料係摘錄「核能四廠發電工程施工期間環境監測」報告，其資料統計時間自國 82 年至 100 年之資料。

2.石碇溪 2 號測站自 89 年 1 月起新增。

表3.1-19 核四施工環境監測歷年河川水質溶氧監測結果

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
82/8	-	-	-	-	9.0	8.8	7.3	-
82/9	-	-	-	-	7.2	9.1	7.0	-
82/10	-	-	-	-	8.3	10.0	9.4	-
82/11	-	-	-	-	9.1	10.5	11.3	-
82/12	-	-	-	-	9.4	9.9	10.1	-
83/1	-	-	-	-	10.7	10.4	10.4	-
83/2	-	-	-	-	9.9	7.4	9.6	-
83/3	-	-	-	-	9.8	10.0	9.8	-
83/4	-	-	-	-	8.0	8.4	8.0	-
83/5	-	-	-	-	7.9	9.8	8.3	-
83/6	-	-	-	-	7.8	7.6	7.2	-
83/7	-	-	-	-	5.6	8.3	6.7	-
83/8	-	-	-	-	8.0	8.9	7.4	-
83/9	-	-	-	-	7.0	6.1	6.4	-
83/10	-	-	-	-	6.2	8.6	5.1	-
83/11	-	-	-	-	9.2	11.1	11.4	-
83/12	-	-	-	-	8.2	9.7	9.9	-
84/1	-	-	-	-	10.8	11.2	9.9	-
84/2	-	-	-	-	9.4	9.1	8.8	-
84/3	-	-	-	-	10.1	11.4	11.4	-
84/4	-	-	-	-	9.4	9.8	9.9	-
84/5	-	-	-	-	8.9	9.0	8.9	-
84/6	-	-	-	-	8.7	9.2	9.2	-
84/7	-	-	-	-	7.9	9.9	7.5	-
84/8	8.4	-	-	-	6.2	8.4	8.1	-
84/9	6.9	-	-	-	6.0	7.1	4.6	-
84/10	8.4	-	-	-	10.1	9.2	8.8	-
84/11	9.1	-	-	-	9.3	8.8	8.9	-
84/12	8.7	-	-	-	9.4	9.6	9.3	-
85/1	9.3	-	-	-	9.3	9.7	9.3	-
85/2	10.7	-	-	-	10.6	9.5	10.7	-
85/3	10.0	-	-	-	9.8	8.8	10.2	-
85/4	9.8	-	-	-	8.8	8.9	9.0	-
85/5	9.0	-	-	-	8.9	9.0	8.7	-
85/6	8.2	-	-	-	7.2	8.3	8.4	-
85/7	9.0	-	-	-	8.8	8.9	8.7	-
85/8	7.9	-	-	-	7.9	8.6	8.1	-
85/9	8.0	-	-	-	7.5	10.1	7.5	-
85/10	8.0	-	-	-	7.7	9.3	8.1	-
85/11	8.1	-	-	-	7.7	8.9	8.0	-
85/12	9.5	-	-	-	9.3	10.0	9.4	-
86/1	10.3	-	-	-	10.3	10.1	10.3	-
86/2	9.6	-	-	-	9.8	9.8	9.7	-
86/3	7.6	-	-	-	8.1	12.1	7.4	-
86/4	8.5	-	-	-	8.2	10.1	9.0	-
86/5	7.7	-	-	-	7.8	9.4	8.4	-
86/6	8.0	-	-	-	7.6	9.6	8.2	-
86/7	7.5	-	-	-	7.5	9.5	7.9	-
86/8	7.0	7.6	-	-	5.7	9.7	5.6	-
86/9	8.5	8.1	-	-	7.8	8.4	9.3	-
86/10	9.0	8.2	-	-	8.2	9.4	9.6	-
86/11	8.5	8.1	-	-	8.2	8.1	8.6	-
86/12	9.7	9.1	-	-	9.4	9.5	9.5	-
87/1	6.4	8.6	-	-	8.8	10.0	8.7	-
87/2	8.7	8.9	-	-	9.8	9.3	9.4	-
87/3	7.7	7.3	-	-	8.8	9.1	7.4	-
87/4	8.5	8.1	-	-	8.2	8.1	8.6	-
87/5	8.7	8.2	-	-	8.0	9.4	8.4	-
87/6	8.0	7.3	-	-	5.1	8.0	8.8	-
87/7	7.6	7.7	-	-	6.8	8.3	6.1	-
87/8	4.6	4.0	-	-	7.0	6.0	3.1	-
87/9	7.5	7.5	-	-	7.9	6.2	7.2	-

表3.1-19 核四施工環境監測歷年河川水質
溶氧監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
87/10	7.7	3.5	-	-	7.5	4.3	6.6	-
87/11	8.1	8.5	-	-	8.2	7.2	7.6	-
87/12	5.6	8.3	-	-	8.1	8.1	8.1	-
88/1	5.1	7.7	-	-	7.4	7.0	7.2	-
88/2	8.5	8.7	-	-	8.8	7.5	8.0	-
88/3	6.0	8.5	-	-	8.2	8.1	8.2	-
88/4	6.2	8.4	-	-	8.1	8.0	7.8	-
88/5	6.1	8.3	-	-	8.0	7.8	8.1	-
88/6	6.1	8.4	-	-	8.1	7.8	8.0	-
88/7	6.3	8.1	-	-	8.1	7.6	8.0	-
88/8	6.5	8.2	-	-	8.1	7.8	8.1	-
88/9	7.8	8.1	-	-	5.8	5.6	7.6	-
88/10	7.0	7.5	-	-	6.1	5.9	6.9	-
88/11	8.1	8.1	-	-	8.1	8.2	8.2	-
88/12	8.2	8.0	-	-	8.1	8.1	7.9	-
89/1	8.3	8.2	-	-	8.3	8.4	8.2	-
89/2	8.0	7.9	-	-	8.0	7.8	7.6	-
89/3	7.2	7.6	-	-	7.2	7.9	7.2	-
32599	7.1	7.9	-	-	8.0	8.0	7.8	-
32629	7.9	7.8	-	-	7.8	8.0	7.9	-
89/6	7.5	7.6	-	-	7.7	7.8	7.9	-
89/7	7.4	7.5	-	-	7.1	7.9	7.8	-
89/8	6.8	5.6	-	-	6.0	6.7	5.5	-
89/9	6.4	5.9	-	-	6.0	6.7	6.2	-
89/10	6.4	5.9	-	-	5.1	6.0	4.3	-
89/11	-	-	-	-	-	-	-	-
89/12	-	-	-	-	-	-	-	-
90/1	-	-	-	-	-	-	-	-
90/2	10.9	9.7	-	-	9.6	9.9	9.8	-
90/3	10.6	11.0	-	-	9.8	10.3	9.3	-
90/4	8.9	9.4	-	-	7.9	9.4	9.3	-
90/5	8.3	8.5	4.6	8.4	8.0	7.9	7.4	-
90/6	8.9	9.0	7.2	9.0	9.3	9.2	9.0	-
90/7	8.4	8.0	8.9	7.8	7.6	9.2	8.4	-
90/8	8.4	7.6	6.2	9.9	7.0	8.5	6.3	-
90/9	7.3	8.1	4.0	8.4	7.3	7.9	8.5	-
90/10	8.7	8.1	2.2	8.3	8.3	8.7	8.9	-
90/11	7.8	6.7	2.6	8.4	7.4	8.2	7.2	-
90/12	8.0	8.6	3.1	8.5	8.6	9.4	8.3	
91/1	10.0	9.0	4.2	8.9	8.9	9.7	8.0	-
91/2	8.8	8.6	4.9	8.8	8.8	9.2	8.7	-
91/3	7.9	7.9	2.0	8.8	7.7	8.0	7.0	-
91/4	8.5	7.4	1.8	8.0	8.0	7.0	7.2	-
91/5	7.3	7.2	9.9	11.2	7.7	7.8	6.9	-
91/6	8.9	8.7	3.1	8.7	8.5	8.7	8.6	-
91/7	9.5	9.4	4.4	9.3	9.4	9.3	9.4	-
91/8	7.5	7.5	5.4	8.3	7.5	8.2	6.8	-
91/9	8.4	7.7	3.2	8.3	8.3	9.0	8.2	-
91/10	7.9	7.7	1.6	7.2	7.2	7.3	7.3	-
91/11	9.0	9.1	4.2	9.0	9.2	9.0	8.7	-
91/12	8.9	9.1	4.1	8.7	9.1	8.9	8.7	-
92/1	9.2	9.4	6.1	9.3	9.1	9.3	9.2	-
92/2	9.6	9.0	1.7	8.8	8.9	7.6	8.6	-
92/3	6.3	6.5	6.2	7.6	7.1	7.2	7.2	-
92/4	8.6	8.9	3.8	9.2	9.1	9.0	8.4	-
92/5	8.4	9.1	1.2	9.3	8.7	8.6	8.2	-
92/6	8.6	8.4	7.3	8.7	8.4	8.9	7.8	-
92/7	7.9	7.1	8.6	8.3	8.2	9.2	8.0	-
92/8	7.7	7.8	10.1	7.2	6.5	9.4	6.3	-
92/9	7.4	6.9	6.1	7.9	6.6	8.7	6.4	-
92/10	7.8	9.1	8.0	7.7	7.8	8.4	8.7	-
92/11	8.0	8.0	4.9	7.2	7.0	7.1	8.1	-
92/12	8.7	7.1	7.1	7.1	6.5	7.2	6.9	-

表3.1-19 核四施工環境監測歷年河川水質
溶氧監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
93/1	8.8	8.6	1.5	8.9	7.4	8.3	7.2	-
93/2	8.2	8.9	9.2	8.1	8.0	9.5	9.3	-
93/3	9.5	7.9	3.0	7.4	7.7	10.9	9.0	-
93/4	6.3	5.4	1.8	5.6	5.8	7.1	6.2	-
93/5	5.6	7.5	2.6	5.6	5.2	5.8	5.4	-
93/6	5.1	4.5	7.6	4.5	3.3	6.7	5.9	-
93/7	4.7	4.8	7.8	4.7	4.9	6.4	4.6	-
93/8	5.4	5.7	4.5	5.3	5.1	5.1	5.2	-
93/9	5.4	5.7	4.5	5.3	5.1	5.1	5.2	-
93/10	6.4	6.5	5.2	6.5	6.4	6.3	6.0	-
93/11	5.7	5.5	3.4	4.5	5.0	6.3	5.8	-
93/12	6.3	6.1	4.7	6.3	6.2	6.1	6.2	-
94/1	6.3	5.7	3.5	5.9	6.1	6.6	6.3	-
94/2	5.6	5.8	5.6	6.3	6.8	6.0	6.2	-
94/3	5.4	5.2	4.8	5.2	5.0	5.4	5.2	-
94/4	6.0	5.8	3.5	6.4	6.3	6.5	5.3	-
94/5	3.6	4.4	2.1	3.6	3.9	3.9	3.8	-
94/6	4.2	4.3	5.1	3.9	3.9	4.3	3.6	-
94/7	7.5	8.7	8.7	8.9	8.6	7.4	7.1	-
94/8	8.2	8.4	8.5	8.3	8.1	7.9	7.3	-
94/9	8.5	7.6	7.0	7.7	7.9	8.6	7.8	-
94/10	4.3	4.5	3.2	4.4	4.8	4.6	4.8	-
94/11	6.2	6.6	2.1	5.5	5.6	6.7	5.7	-
94/12	7.1	6.9	6.5	6.6	7.2	7.3	7.1	-
95/1	5.8	6.1	4.0	6.1	6.2	6.1	5.9	-
95/2	7.0	7.2	4.7	7.0	6.9	6.8	7.2	-
95/3	8.1	8.3	8.6	8.7	8.7	8.6	8.1	-
95/4	5.3	9.2	4.1	7.6	8.5	7.5	6.6	-
95/5	6.6	7.3	5.1	7.6	8.1	8.0	7.0	-
95/6	8.7	9.8	5.7	9.2	9.4	8.9	9.6	-
95/7	7.2	8.2	5.2	6.8	6.9	8.1	6.8	-
95/8	8.0	8.6	11.2	7.5	7.1	6.6	6.1	-
95/9	7.8	8.0	6.3	7.9	7.9	8.0	8.0	-
95/10	7.5	8.3	4.7	7.9	7.9	8.1	7.3	-
95/11	8.7	8.6	6.1	8.4	8.4	8.5	8.3	-
95/12	8.9	8.8	6.4	8.6	8.9	7.3	9.1	-
96/1	8.2	8.2	6.5	8.4	8.1	8.3	8.3	-
96/2	6.6	7.0	4.5	6.8	6.8	8.7	6.9	-
96/3	7.9	7.8	4.2	8.2	8.1	8.0	7.9	-
96/1	8.2	8.2	6.5	8.4	8.1	8.3	8.3	-
96/2	6.6	7.0	4.5	6.8	6.8	8.7	6.9	-
96/3	7.9	7.8	4.2	8.2	8.1	8.0	7.9	-
96/4	6.9	7.4	4.1	6.9	7.2	8.2	6.8	-
96/5	7.0	7.0	4.1	7.2	7.3	7.8	7.3	-
96/6	8.2	7.3	8.3	7.4	7.9	8.7	8.3	-
96/7	7.2	6.7	8.6	6.6	6.8	7.0	4.8	-
96/8	7.3	5.8	12.6	6.4	6.0	7.2	6.5	-
96/9	7.4	7.0	5.3	7.0	7.1	7.5	7.3	-
96/10	6.7	6.6	5.4	6.6	6.8	7.0	6.9	-
96/11	7.6	7.5	5.0	7.0	7.1	7.5	7.5	-
96/12	6.6	6.8	3.2	6.2	6.7	6.8	6.3	-
97/1	7.4	7.3	5.2	7.0	7.2	7.6	7.5	-
97/2	6.9	7.2	5.0	7.3	7.3	7.3	7.8	-
97/3	7.0	7.8	4.3	7.4	7.4	8.2	7.4	-
97/4	6.3	6.5	3.4	7.1	6.7	7.2	6.5	-
97/5	8.5	8.3	4.7	8.3	8.5	7.3	8.4	-
97/6	6.5	6.2	7.0	7.6	8.1	7.2	6.5	-
97/7	6.6	6.5	5.0	6.8	7.0	7.0	6.6	-
97/8	6.8	6.6	4.7	6.9	7.2	7.1	6.6	-
97/9	8.4	8.3	4.4	7.3	6.1	8.5	7.4	-
97/10	7.7	8.6	4.8	6.8	6.8	7.7	7.5	-
97/11	9.4	9.8	4.7	9.0	9.9	10.1	9.5	-
97/12	8.8	7.7	4.2	8.1	8.4	8.3	8.8	-

表3.1-19 核四施工環境監測歷年河川水質
溶氧監測結果（續3）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
98/1	9.7	10.1	6.1	9.9	9.9	9.8	9.8	-
98/2	8.7	9.5	4.6	9.1	9.2	9.7	9.0	-
98/3	8.7	8.8	6.0	8.5	8.9	8.9	8.7	-
98/4	9.2	9.2	4.6	9.1	9.2	10.1	9.1	-
98/5	9.4	9.2	5.4	9.4	9.2	10.3	8.7	-
98/6	8.3	8.7	5.6	8.2	8.1	8.6	8.2	-
98/7	7.1	6.9	6.6	6.8	6.7	7.2	7.0	-
98/8	6.9	7.8	7.8	7.2	7.2	7.6	7.7	-
98/9	6.7	7.2	7.2	7.7	6.9	7.7	7.3	-
98/10	8.3	8.5	4.3	8.7	8.1	8.2	8.4	-
98/11	8.3	8.5	3.1	8.2	8.4	8.4	8.3	-
98/12	9.7	9.4	4.4	9.2	9.2	9.3	9.2	-
99/1	9.6	9.8	4.8	9.6	9.8	9.2	9.3	-
99/2	9.3	9.2	2.8	9.1	9.1	9.4	9.2	-
99/3	9.0	8.1	1.9	8.2	8.6	9.7	8.0	-
99/4	8.5	8.9	5.1	8.3	9.0	8.4	8.4	-
99/5	8.4	8.7	7.1	8.1	8.8	8.3	8.4	-
99/6	8.2	8.1	2.8	8.1	8.0	7.8	7.8	-
99/7	8.4	8.2	6.1	7.6	7.3	8.2	7.0	-
99/8	7.3	7.4	7.9	6.5	6.4	7.5	7.3	-
99/9	7.9	8.2	4.2	8.3	8.0	8.0	8.0	-
99/10	7.7	7.6	5.7	7.6	7.6	7.5	7.5	-
99/11	8.9	8.8	4.4	8.9	9.0	8.9	8.9	-
99/12	6.9	7.2	1.7	7.1	7.1	7.1	6.8	-
100/1	10.0	9.9	8.0	10.1	10.1	10.1	10.2	-
100/2	9.2	9.5	3.2	9.7	9.6	9.2	9.3	-
100/3	8.3	9.0	2.4	8.6	8.7	8.7	8.5	-
100/4	7.7	8.1	5.9	9.4	9.8	8.4	8.4	-
100/5	7.2	7.2	3.0	6.9	6.8	8.5	6.7	-
100/6	8.6	8.5	3.2	8.3	8.3	8.7	8.7	-
100/7	7.2	7.5	7.4	7.8	7.3	7.6	7.4	-
100/8	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.4	6.6	-
100/9	7.6	7.6	6.4	7.1	7.4	7.5	7.5	-
100/10	7.9	7.7	4.2	8.1	8.4	7.8	8.4	-
100/11	7.9	7.8	4.9	8.1	8.2	7.9	7.9	-
100/12	9.5	9.6	6.8	9.5	9.4	9.4	9.5	-
101/1	7.5	7.8	6.0	7.6	7.6	7.6	7.6	-
101/2	8.8	8.9	4.5	9.0	9.0	9.0	9.3	-
101/3	8.5	8.9	4.3	9.0	8.9	8.5	8.8	-
101/4	7.7	7.8	6.3	7.6	7.7	7.8	7.5	-
101/5	8.0	8.6	4.8	8.3	8.3	8.3	8.2	-
101/6	7.4	8.1	6.2	7.9	7.2	8.6	8.1	-

註：1. 上游水文站自84年8月新增、石碇溪廠界測站自86年8月新增、支流暗渠上游及澳底二號橋攔水堰上游測站自90年5月新增。

2.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-20 核四施工環境監測歷年河川水質
生化需氧量監測結果

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
82/8	-	-	-	-	3.7	1.1	1.1	-
82/9	-	-	-	-	3.7	0.5	1.6	-
82/10	-	-	-	-	1.1	1.3	0.7	-
82/11	-	-	-	-	0.4	0.1	ND	-
82/12	-	-	-	-	0.3	1.0	ND	-
83/1	-	-	-	-	1.3	0.5	0.3	-
83/2	-	-	-	-	1.8	1.0	0.8	-
83/3	-	-	-	-	0.7	0.5	0.7	-
83/4	-	-	-	-	0.5	0.4	0.7	-
83/5	-	-	-	-	0.3	0.7	0.6	-
83/6	-	-	-	-	0.6	0.4	0.5	-
83/7	-	-	-	-	1.5	1.4	0.9	-
83/8	-	-	-	-	0.9	0.2	0.3	-
83/9	-	-	-	-	0.9	2.5	0.6	-
83/10	-	-	-	-	2.1	2.0	1.3	-
83/11	-	-	-	-	5.2	0.7	1.0	-
83/12	-	-	-	-	1.3	0.0	0.1	-
84/1	-	-	-	-	1.2	1.3	0.7	-
84/2	-	-	-	-	1.9	0.5	1.0	-
84/3	-	-	-	-	0.5	0.6	1.0	-
84/4	-	-	-	-	1.1	0.3	0.3	-
84/5	-	-	-	-	1.1	0.6	0.3	-
84/6	-	-	-	-	1.0	1.2	1.2	-
84/7	-	-	-	-	4.0	2.1	1.3	-
84/8	1.6	-	-	-	0.8	0.3	0.5	-
84/9	0.9	-	-	-	1.6	0.6	0.6	-
84/10	0.4	-	-	-	0.9	0.3	0.4	-
84/11	1.0	-	-	-	1.0	0.6	0.5	-
84/12	1.0	-	-	-	0.7	0.8	0.5	-
85/1	2.0	-	-	-	0.9	0.7	1.1	1.0
85/2	0.8	-	-	-	0.8	0.8	1.0	1.0
85/3	1.7	-	-	-	1.6	1.7	2.4	1.0
85/4	1.1	-	-	-	1.8	1.8	1.7	1.0
85/5	0.6	-	-	-	0.9	0.8	0.4	1.0
85/6	0.9	-	-	-	1.4	0.5	0.6	1.0
85/7	1.1	-	-	-	2.7	0.9	1.8	1.0
85/8	1.2	-	-	-	2.4	1.5	1.0	1.0
85/9	1.4	-	-	-	1.1	1.7	1.4	1.0
85/10	1.4	0.9	-	-	2.0	2.3	2.1	1.0
85/11	0.4	4.4	-	-	1.1	0.9	0.8	1.0
85/12	1.4	1.3	-	-	1.4	0.6	0.9	1.0
86/1	1.8	1.3	-	-	1.6	1.0	1.3	1.0
86/2	1.3	0.8	-	-	1.1	1.2	1.1	1.0
86/3	5.3	1.3	-	-	1.2	1.1	0.6	1.0
86/4	0.5	0.5	-	-	1.4	0.3	0.3	1.0
86/5	0.9	0.8	-	-	1.0	1.0	0.9	1.0
86/6	1.2	1.6	-	-	4.8	2.4	2.4	1.0
86/7	0.7	1.4	-	-	0.4	0.4	1.0	1.0
86/8	2.6	2.7	-	-	3.3	2.8	2.2	1.0
86/9	0.5	0.5	-	-	1.0	0.5	0.5	1.0
86/10	1.3	0.5	-	-	1.6	0.5	0.5	1.0
86/11	0.5	1.2	-	-	1.1	0.5	1.5	1.0
86/12	2.4	2.1	-	-	2.3	1.5	2.3	1.0
87/1	1.2	1.0	-	-	1.5	1.8	1.1	1.0
87/2	1.8	0.5	-	-	1.7	1.8	0.5	1.0
87/3	2.3	2.6	-	-	1.6	1.4	2.0	1.0
87/4	0.5	0.5	-	-	1.4	0.5	1.1	1.0
87/5	1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
87/6	0.5	0.5	-	-	1.4	0.5	0.5	1.0
87/7	0.5	0.5	-	-	3.2	0.5	0.5	1.0
87/8	0.5	0.5	-	-	1.6	0.5	0.5	1.0
87/9	0.5	1.0	-	-	0.5	1.0	1.0	1.0

表3.1-20 核四施工環境監測歷年河川水質
生化需氧量監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
87/10	1.3	2.3	-	-	2.2	2.6	2.1	1.0
87/11	1.2	0.5	-	-	3.7	1.3	0.5	1.0
87/12	6.3	6.8	-	-	0.5	1.4	4.2	1.0
88/1	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
88/2	2.3	1.0	-	-	2.7	0.5	1.1	1.0
88/3	0.5	0.5	-	-	0.5	1.7	1.4	1.0
88/4	1.7	1.1	-	-	2.5	1.8	1.8	1.0
88/5	1.4	1.9	-	-	3.3	1.3	1.1	1.0
88/6	1.8	1.2	-	-	1.4	1.2	1.5	1.0
88/7	1.3	1.4	-	-	1.9	1.6	1.6	1.0
88/8	0.5	1.3	-	-	1.9	1.4	1.6	1.0
88/9	1.8	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
88/10	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
88/11	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
88/12	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/1	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/2	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/3	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
32599	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/5	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/6	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/7	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/8	0.5	0.5	-	-	1.5	0.5	0.5	1.0
89/9	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
89/10	0.5	0.5	-	-	1.7	0.5	0.5	1.0
89/11	-	-	-	-	-	-	-	1.0
89/12	-	-	-	-	-	-	-	1.0
90/1	-	-	-	-	-	-	-	1.0
90/2	0.5	0.5	-	-	2.2	0.5	0.5	1.0
90/3	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	1.0
90/4	0.5	0.5	-	-	2.0	0.5	2.1	1.0
90/5	0.5	0.5	0.5	2.3	0.5	0.5	0.5	1.0
90/6	0.5	0.5	0.5	0.5	5.7	0.5	0.5	1.0
90/7	0.5	0.5	5.9	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
90/8	0.5	0.5	10.8	0.5	1.8	0.5	1.9	1.0
90/9	0.5	0.5	5.9	1.7	0.5	0.5	0.5	1.0
90/10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
90/11	0.5	1.7	3.6	0.5	1.7	0.5	0.5	1.0
90/12	1.6	0.5	4.0	1.7	0.5	0.5	0.5	1.0
91/1	0.5	0.5	2.9	0.5	2.3	0.5	0.5	1.0
91/2	0.5	0.5	2.1	1.8	0.5	0.5	0.5	1.0
91/3	0.5	0.5	0.5	0.5	3.1	0.5	0.5	1.0
91/4	1.6	0.5	3.8	2.4	2.5	0.5	0.5	1.0
91/5	0.5	0.5	19.3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
91/6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
91/7	2.3	0.8	3.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
91/8	0.8	0.8	9.4	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
91/9	0.8	0.8	5.2	1.8	1.7	0.8	0.8	1.0
91/10	2.6	3.3	4.9	4.0	3.3	3.0	3.1	1.0
91/11	0.8	0.8	2.4	1.7	1.5	0.8	0.8	1.0
91/12	5.7	3.3	6.1	1.9	0.8	0.8	0.8	1.0
92/1	0.8	0.8	1.8	1.6	2.0	0.8	0.8	1.0
92/2	0.8	0.8	9.0	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
92/3	0.8	0.8	4.4	6.3	2.5	1.7	0.8	1.0
92/4	1.6	0.8	4.1	2.2	4.1	0.8	0.8	1.0
92/5	0.8	0.8	4.9	1.7	1.6	0.8	1.9	1.0
92/6	0.8	0.8	8.0	1.6	2.4	0.8	2.1	1.0
92/7	0.8	0.8	9.7	0.8	2.1	0.8	0.8	1.0
92/8	0.8	0.8	12.4	7.9	3.0	2.6	4.9	1.0
92/9	0.8	0.8	13.0	1.6	1.9	0.8	1.9	1.0
92/10	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
92/11	0.8	0.8	1.5	1.8	0.8	0.8	0.8	1.0
92/12	0.8	0.8	2.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0

表3.1-20 核四施工環境監測歷年河川水質
生化需氧量監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
93/1	1.8	0.8	8.0	0.8	0.8	0.8	0.8	2.0
93/2	1.9	0.8	0.8	0.8	1.8	0.8	0.8	2.0
93/3	0.8	0.8	4.1	0.8	0.8	0.8	0.8	2.0
93/4	1.0	1.0	8.6	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
93/5	1.0	1.0	11.1	5.3	2.0	1.0	1.0	2.0
93/6	1.0	1.0	6.6	1.0	2.9	1.0	2.1	2.0
93/7	1.0	1.0	14.8	2.0	2.4	1.0	1.0	2.0
93/8	1.0	3.6	7.9	3.4	4.6	2.4	2.8	2.0
93/9	4.8	1.0	2.2	1.0	1.0	1.0	2.6	2.0
93/10	2.2	2.9	1.0	3.9	3.9	1.0	1.0	2.0
93/11	1.0	1.0	3.8	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
93/12	7.8	3.4	3.7	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
94/1	8.9	10.9	3.7	10.2	9.1	1.0	1.0	1.0
94/2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
94/3	1.0	1.0	2.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
94/4	1.0	1.0	8.7	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0
94/5	1.0	1.0	2.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
94/6	0.8	ND	4.2	2.6	2.6	ND	0.7	1.0
94/7	0.7	1.1	5.0	3.5	1.6	1.1	3.7	1.0
94/8	0.7	1.2	9.6	1.7	2.8	1.2	3.1	1.0
94/9	8.4	2.5	6.8	3.4	1.6	2.5	2.4	1.0
94/10	1.5	ND	3.4	1.6	ND	1.4	3.4	1.0
94/11	ND	ND	5.2	2.5	1.4	0.5	ND	1.0
94/12	1.9	ND	2.0	2.1	1.5	2.4	1.5	1.0
95/1	ND	ND	ND	1.0	1.4	1.0	ND	1.0
95/2	ND	ND	1.6	1.8	2.0	ND	ND	1.0
95/3	1.4	1.3	1.4	2.0	1.4	ND	ND	1.0
95/4	1.1	ND	3.8	1.5	1.7	ND	ND	1.0
95/5	2.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
95/6	ND	1.8	3.1	ND	1.7	1.2	ND	1.0
95/7	1.0	1.5	14.8	4.2	3.8	5.2	4.1	1.0
95/8	1.7	1.6	28.3	5.1	4.2	1.1	4.9	1.0
95/9	ND	ND	1.3	ND	ND	ND	ND	1.0
95/10	ND	ND	13.8	1.5	1.6	ND	ND	1.0
95/11	ND	ND	5.4	1.6	1.1	ND	ND	1.0
95/12	1.2	1.9	2.0	1.3	ND	ND	ND	1.0
96/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
96/2	ND	ND	5.5	1.4	1.2	1.6	2.8	1.0
96/3	ND	ND	7.3	ND	ND	ND	ND	1.0
96/4	2.6	2.4	6.8	2.5	2.8	ND	2.9	1.0
96/5	ND	ND	8.0	2.3	ND	ND	ND	1.0
96/6	ND	ND	8.0	ND	ND	ND	ND	1.0
96/7	ND	ND	11.3	3.1	ND	ND	4.8	1.0
96/8	ND	ND	61.9	5.1	7.9	ND	12.1	1.0
96/9	ND	ND	8.0	2.7	ND	ND	4.9	1.0
96/10	ND	ND	4.6	ND	ND	ND	ND	1.0
96/11	2.6	ND	3.3	2.2	ND	ND	ND	1.0
96/12	ND	2.3	3.5	3.3	ND	ND	ND	1.0
97/1	4.2	5.3	4.2	ND	ND	ND	ND	1.0
97/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
97/12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
98/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
98/2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
98/3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0

表3.1-20 核四施工環境監測歷年河川水質
生化需氧量監測結果（續3）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
98/4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
98/5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
98/6	ND	ND	2.0	2.3	ND	ND	ND	1.0
98/7	ND	ND	11.1	4.4	4.8	ND	ND	1.0
98/8	ND	ND	6.1	ND	2.4	ND	ND	1.0
98/9	ND	1.9	15.5	1.7	6.7	ND	1.4	1.0
98/10	ND	ND	1.6	ND	ND	ND	ND	1.0
98/11	ND	ND	6.9	ND	ND	ND	ND	1.0
98/12	ND	ND	2.7	ND	ND	1.8	ND	1.0
99/1	ND	ND	1.8	ND	ND	ND	ND	1.0
99/2	ND	ND	3.0	ND	ND	ND	ND	1.0
99/3	ND	ND	7.1	1.5	1.3	ND	ND	1.0
99/4	1.9	2.0	4.9	1.9	3.4	ND	1.8	1.0
99/5	1.7	ND	13.3	2.2	2.3	ND	ND	1.0
99/6	ND	ND	4.1	3.3	ND	ND	ND	1.0
99/7	2.3	1.4	14.3	3.1	2.0	1.1	1.4	1.0
99/8	1.4	2.1	11.8	2.9	3.1	2.0	1.2	1.0
99/9	ND	ND	14.9	1.1	1.4	ND	ND	1.0
99/10	4.1	3.3	4.2	3.7	ND	3.6	1.9	1.0
99/11	2.0	2.0	6.4	1.4	ND	ND	1.4	1.0
99/12	ND	ND	5.9	ND	ND	2.2	ND	1.0
100/1	ND	ND	1.5	ND	ND	ND	ND	1.0
100/2	1.1	1.1	3.4	ND	ND	ND	ND	1.0
100/3	1.1	ND	2.9	1.5	1.8	ND	ND	1.0
100/4	1.5	ND	2.3	3.3	1.1	ND	ND	1.0
100/5	ND	ND	9.0	ND	2.1	1.7	ND	1.0
100/6	ND	ND	2.8	ND	ND	ND	ND	1.0
100/7	1.1	ND	8.7	1.4	ND	ND	2.1	1.0
100/8	ND	1.6	31.1	2.4	2.3	ND	2.7	1.0
100/9	ND	ND	6.3	3.2	3.8	ND	2.0	1.0
100/10	ND	ND	1.9	ND	ND	ND	ND	1.0
100/11	ND	ND	2.6	ND	1.5	ND	ND	1.0
100/12	ND	ND	5.1	2.1	ND	ND	ND	1.0
101/1	ND	ND	1.8	ND	ND	1.2	ND	1.0
101/2	1.3	ND	1.4	1.3	1.9	ND	ND	1.0
101/3	ND	1.4	2.2	2.3	2.3	ND	ND	1.0
101/4	<1.0	<1.0	3.6	1.6	<1.0	<1.0	1.2	1.0
101/5	3.3	<1.0	6.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
101/6	<1.0	<1.0	2.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0

註：1. 上游水文站自84年8月新增、石碇溪廠界測站自85年10月新增、支流暗渠上游及澳底二號橋攔水堰上游測站自90年5月新增。
2.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。
3.ND表示低於儀器偵測極限。

表3.1-21 核四施工環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
82/8	-	-	-	-	17.0	8.5	9.0	-
82/9	-	-	-	-	15.0	6.3	9.3	-
82/10	-	-	-	-	6.0	9.7	10.3	-
82/11	-	-	-	-	1.5	0.0	0.5	-
82/12	-	-	-	-	6.5	8.0	3.5	-
83/1	-	-	-	-	0.5	0.0	0.0	-
83/2	-	-	-	-	77.8	61.8	82.5	-
83/3	-	-	-	-	4.3	3.0	3.8	-
83/4	-	-	-	-	4.3	3.0	2.5	-
83/5	-	-	-	-	6.0	2.5	11.5	-
83/6	-	-	-	-	5.0	6.5	4.3	-
83/7	-	-	-	-	6.3	4.8	4.5	-
83/8	-	-	-	-	8.3	2.8	9.0	-
83/9	-	-	-	-	123.0	192.0	304.0	-
83/10	-	-	-	-	13.0	12.0	6.0	-
83/11	-	-	-	-	6.3	1.0	2.0	-
83/12	-	-	-	-	7.8	5.8	5.5	-
84/1	-	-	-	-	4.5	3.3	2.0	-
84/2	-	-	-	-	6.2	5.2	2.2	-
84/3	-	-	-	-	3.0	1.5	1.2	-
84/4	-	-	-	-	7.0	3.0	3.2	-
84/5	-	-	-	-	7.0	5.8	2.2	-
84/6	-	-	-	-	12.4	5.4	6.2	-
84/7	-	-	-	-	7.5	8.2	6.8	-
84/8	2.5	-	-	-	5.6	2.5	0.0	-
84/9	4.0	-	-	-	11.0	2.7	21.0	-
84/10	21.0	-	-	-	8.0	17.0	12.0	-
84/11	0.0	-	-	-	4.1	0.0	0.0	-
84/12	59.0	-	-	-	31.0	31.0	14.0	-
85/1	299.0	-	-	-	14.0	6.0	6.3	4.0
85/2	5.1	-	-	-	4.2	12.0	6.2	4.0
85/3	2.6	-	-	-	4.3	8.2	5.5	4.0
85/4	2.9	-	-	-	4.6	8.7	7.2	4.0
85/5	3.6	-	-	-	5.8	5.5	7.5	4.0
85/6	2.9	-	-	-	11.0	10.0	15.0	4.0
85/7	3.3	-	-	-	12.0	20.0	43.0	4.0
85/8	1.0	-	-	-	7.0	4.8	4.1	4.0
85/9	4.0	-	-	-	6.0	146.0	13.0	4.0
85/10	3.8	7.4	-	-	3.8	1.4	4.5	4.0
85/11	4.5	7.0	-	-	6.1	2.6	8.9	4.0
85/12	4.7	8.6	-	-	9.0	3.4	2.9	4.0
86/1	18.0	16.0	-	-	9.0	31.0	22.0	4.0
86/2	12.0	8.8	-	-	11.0	4.4	2.8	4.0
86/3	7.7	21.0	-	-	12.0	5.2	7.6	4.0
86/4	66.0	14.0	-	-	8.4	4.7	13.0	4.0
86/5	142.0	24.0	-	-	11.0	10.0	138.0	4.0
86/6	217.0	21.0	-	-	25.0	2.3	137.0	4.0
86/7	19.0	23.0	-	-	14.0	22.0	63.0	4.0
86/8	20.0	13.0	-	-	8.8	5.1	26.0	4.0
86/9	5.2	12.0	-	-	8.5	5.0	3.7	4.0
86/10	5.8	10.0	-	-	8.0	1.0	3.2	4.0
86/11	5.6	7.8	-	-	6.1	2.8	10.0	4.0
86/12	6.0	10.0	-	-	8.8	4.4	7.4	4.0
87/1	2.3	4.6	-	-	7.4	2.0	4.0	4.0
87/2	4.2	8.0	-	-	1.0	2.6	3.6	4.0
87/3	25.5	26.1	-	-	16.2	21.5	22.2	4.0
87/4	3.3	5.3	-	-	6.8	3.2	5.2	4.0
87/5	9.4	14.0	-	-	10.0	1.0	6.5	4.0
87/6	1.0	13.5	-	-	8.6	4.3	5.1	4.0
87/7	7.5	5.2	-	-	6.7	3.9	8.5	4.0
87/8	7.6	6.7	-	-	11.8	5.4	14.7	4.0
87/9	5.5	12.7	-	-	9.0	8.3	19.0	4.0

表3.1-21 核四施工環境監測歷年河川水質懸浮固體監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
87/10	17.0	15.6	-	-	12.2	9.8	10.4	4.0
87/11	5.8	1.0	-	-	16.0	44.0	58.0	4.0
87/12	31.3	57.1	-	-	26.7	36.7	96.9	4.0
88/1	39.3	53.9	-	-	28.7	64.8	45.9	4.0
88/2	6.7	7.5	-	-	14.4	1.0	1.0	4.0
88/3	2.4	7.1	-	-	6.1	4.2	4.3	4.0
88/4	4.7	2.0	-	-	9.2	8.0	5.3	4.0
88/5	3.4	2.8	-	-	7.4	9.1	12.1	4.0
88/6	7.6	9.9	-	-	9.2	19.5	24.0	4.0
88/7	2.9	4.8	-	-	6.3	25.2	16.7	4.0
88/8	2.0	5.4	-	-	5.8	10.0	5.3	4.0
88/9	13.2	4.0	-	-	5.8	13.7	10.5	4.0
88/10	26.0	5.9	-	-	32.6	5.1	5.8	4.0
88/11	2.0	2.0	-	-	2.0	2.0	2.0	4.0
88/12	2.0	4.1	-	-	6.0	2.0	2.0	4.0
89/1	10.4	2.0	-	-	2.0	4.1	5.0	4.0
89/2	4.7	6.5	-	-	6.6	46.8	5.7	4.0
89/3	8.7	5.1	-	-	7.0	22.7	2.0	4.0
32599	2.0	2.0	-	-	2.0	2.0	2.0	4.0
32629	2.0	5.8	-	-	4.6	2.0	2.0	4.0
89/6	8.3	7.8	-	-	8.3	7.9	9.9	4.0
89/7	2.0	4.0	-	-	4.6	2.0	9.0	4.0
89/8	9.4	17.1	-	-	7.7	6.4	10.4	4.0
89/9	4.0	5.7	-	-	6.0	2.0	6.3	4.0
89/10	2.0	2.0	-	-	4.5	6.9	5.5	4.0
89/11	-	-	-	-	-	-	-	4.0
89/12	-	-	-	-	-	-	-	4.0
90/1	-	-	-	-	-	-	-	4.0
90/2	6.0	4.6	-	-	2.0	2.0	4.8	4.0
90/3	2.0	2.0	-	-	2.0	2.0	4.1	4.0
90/4	5.6	7.2	-	-	5.5	11.4	8.4	4.0
90/5	4.4	8.2	9.4	4.1	4.1	4.1	4.6	4.0
90/6	7.9	10.5	10.6	11.6	973.0	7.6	12.1	4.0
90/7	2.0	2.0	28.1	2.0	5.2	2.0	6.7	4.0
90/8	7.6	5.6	23.5	2.0	6.9	2.0	5.1	4.0
90/9	10.8	25.2	23.6	53.6	14.8	5.3	6.2	4.0
90/10	5.1	5.2	60.0	6.0	4.8	5.0	5.0	4.0
90/11	2.0	5.7	31.0	4.3	6.9	2.0	2.0	4.0
90/12	100.0	38.7	102.0	13.9	16.0	6.3	2.0	4.0
91/1	4.7	6.3	30.9	4.8	5.9	2.0	2.0	4.0
91/2	4.7	7.2	45.3	6.2	6.6	2.0	2.0	4.0
91/3	8.3	2.0	45.4	2.0	2.0	2.0	5.0	4.0
91/4	109.0	6.9	53.4	4.6	4.6	5.2	6.9	4.0
91/5	2.0	5.0	42.6	2.0	2.0	8.5	11.8	4.0
91/6	2.0	2.0	16.8	5.7	6.1	33.7	22.2	4.0
91/7	8.2	8.2	47.6	8.7	7.7	90.4	52.1	4.0
91/8	226.0	31.8	62.5	8.7	8.7	11.8	9.7	4.0
91/9	11.5	9.4	26.2	13.4	8.3	6.4	16.5	4.0
91/10	23.7	29.4	25.0	32.6	29.3	20.9	22.8	4.0
91/11	5.8	5.1	18.6	4.3	7.4	12.3	10.9	4.0
91/12	21.7	12.1	26.0	24.8	14.6	4.2	10.4	4.0
92/1	116.0	104.0	15.1	7.4	6.6	10.5	7.1	4.0
92/2	2.0	6.5	18.6	2.0	2.0	4.0	4.1	4.0
92/3	2.0	9.5	13.1	2.0	5.4	5.3	7.5	4.0
92/4	2.0	5.4	9.6	2.0	2.0	6.7	11.8	4.0
92/5	2.0	7.3	19.2	9.1	6.5	9.6	14.5	4.0
92/6	2.0	2.0	33.6	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
92/7	4.8	6.2	38.6	5.7	7.8	2.0	4.1	4.0
92/8	2.0	2.0	41.6	21.9	10.3	2.0	7.8	4.0
92/9	2.0	4.9	21.2	4.3	4.5	2.0	5.2	4.0
92/10	9.1	13.1	8.2	15.1	14.7	11.9	12.2	4.0
92/11	13.7	19.6	10.1	16.4	18.4	24.0	30.5	4.0
92/12	2.0	6.9	8.4	14.1	7.6	18.1	5.7	4.0

表3.1-21 核四施工環境監測歷年河川水質
懸浮固體監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
93/1	2.0	2.0	22.4	2.0	4.2	2.0	8.1	1.9
93/2	6.0	6.8	5.0	6.4	5.9	4.5	4.1	1.9
93/3	2.0	2.0	13.8	5.1	2.0	2.0	2.0	1.9
93/4	4.5	6.8	18.2	8.5	10.2	26.8	5.0	1.9
93/5	21.5	34.0	23.2	34.2	30.5	11.0	16.2	1.9
93/6	19.8	27.2	25.5	10.8	10.2	2.5	5.0	1.9
93/7	22.2	16.8	47.2	9.0	9.8	4.5	7.2	1.9
93/8	50.5	127.0	39.8	50.8	57.2	94.2	121.0	1.9
93/9	13.0	12.0	10.1	6.7	7.0	11.0	27.5	1.9
93/10	133.0	148.0	22.5	151.0	164.0	274.0	431.0	1.9
93/11	1.0	7.0	35.5	2.5	2.9	2.5	3.6	1.9
93/12	9.8	8.2	24.2	14.8	15.5	3.0	13.8	1.9
94/1	3.5	3.5	16.8	2.8	3.5	2.5	6.8	1.0
94/2	8.2	5.0	10.2	5.5	5.5	13.8	14.0	1.0
94/3	1.5	4.5	29.2	1.1	1.2	1.0	3.5	1.0
94/4	ND	2.6	20.5	ND	1.0	ND	4.0	1.0
94/5	2.0	8.6	40.9	6.4	8.6	ND	ND	1.0
94/6	2.5	6.2	31.5	7.0	6.8	0.5	0.7	1.0
94/7	1.0	2.5	32.5	3.5	6.5	5.5	11.2	1.0
94/8	4.5	17.5	64.0	5.2	6.2	14.2	6.8	1.0
94/9	20.0	5.2	12.5	5.8	6.5	4.0	3.2	1.0
94/10	180.0	7.8	9.2	7.8	6.8	2.5	7.8	1.0
94/11	1.3	4.5	12.8	4.5	8.2	3.7	2.7	1.0
94/12	2.3	3.3	2.5	2.5	4.0	2.3	ND	1.0
95/1	ND	7.1	12.5	1.3	ND	ND	34.0	1.0
95/2	1.0	8.0	19.8	1.7	1.5	5.4	9.2	1.0
95/3	4.5	6.2	5.5	7.8	7.8	2.5	3.5	1.0
95/4	4.0	4.0	12.8	5.0	5.0	12.5	7.8	1.0
95/5	ND	4.5	10.0	5.5	5.8	6.8	9.0	1.0
95/6	ND	6.5	9.8	4.5	4.5	0.5	ND	1.0
95/7	3.0	5.0	23.8	5.5	7.2	8.2	5.2	1.0
95/8	6.0	1.5	70.2	6.5	11.2	6.8	8.5	1.0
95/9	2.0	4.0	3.0	4.7	3.5	0.5	2.0	1.0
95/10	ND	4.0	13.5	4.0	2.0	1.5	2.5	1.0
95/11	2.0	5.0	33.2	6.5	6.8	4.0	5.5	1.0
95/12	4.0	11.8	3.8	6.0	7.8	0.5	3.0	1.0
96/1	4.9	2.8	3.8	6.8	3.3	4.3	1.8	1.0
96/2	3.0	1.5	12.0	6.8	7.3	6.6	7.8	1.0
96/3	3.3	6.5	13.8	9.8	9.2	6.8	6.0	1.0
96/4	3.3	5.2	29.2	4.3	6.5	20.8	12.5	1.0
96/5	4.3	3.0	17.0	4.0	5.8	13.8	7.5	1.0
96/6	9.3	5.8	20.8	4.5	8.5	6.8	9.6	1.0
96/7	ND	5.2	22.5	5.3	5.1	8.6	8.5	1.0
96/8	ND	ND	143.0	7.5	8.3	9.3	13.3	1.0
96/9	2.0	11.4	22.5	12.0	12.5	12.6	23.5	1.0
96/10	6.2	6.3	10.0	7.8	6.0	3.8	8.1	1.0
96/11	14.5	7.2	10.8	12.6	9.9	21.5	34.0	1.0
96/12	93.5	16.0	17.0	10.8	12.0	17.5	12.9	1.0
97/1	7.0	6.9	8.7	7.2	23.5	11.4	6.2	1.0
97/2	5.2	7.5	10.0	8.0	4.0	10.0	4.0	1.0
97/3	21.5	3.5	20.5	7.5	6.9	24.5	15.0	1.0
97/4	4.4	12.8	11.9	8.8	8.5	16.0	8.8	1.0
97/5	5.8	24.5	23.5	4.0	3.0	21.3	13.0	1.0
97/6	ND	54.5	20.5	4.0	2.0	ND	7.3	1.0
97/7	3.7	7.2	28.0	3.2	7.6	14.0	17.5	1.0
97/8	3.3	4.1	20.5	3.8	15.0	3.2	14.5	1.0
97/9	4.8	7.1	20.5	6.5	8.3	11.7	3.7	1.0
97/10	ND	ND	16.5	1.5	2.7	ND	2.2	1.0
97/11	2.7	5.5	6.9	5.8	6.0	7.6	5.8	1.0
97/12	ND	10.5	23.0	5.5	2.0	11.7	9.2	1.0

表3.1-21 核四施工環境監測歷年河川水質
懸浮固體監測結果（續3）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
98/1	1.2	4.2	18.5	8.6	3.6	3.3	8.2	1.0
98/2	3.4	6.5	12.0	3.8	3.3	9.9	8.7	1.0
98/3	ND	3.1	22.8	3.7	4.4	24.2	7.2	1.0
98/4	ND	2.3	15.0	2.4	2.9	6.0	4.1	1.0
98/5	2.6	7.5	10.5	2.4	3.4	13.8	10.2	1.0
98/6	4.5	3.7	10.0	4.4	4.1	2.4	8.8	1.0
98/7	2.3	3.5	23.0	5.7	7.8	6.3	5.0	1.0
98/8	2.0	3.4	14.8	7.2	7.0	3.1	5.3	1.0
98/9	8.2	5.2	27.2	3.9	11.9	11.1	4.5	1.0
98/10	ND	1.9	6.9	2.4	2.8	9.7	5.0	1.0
98/11	1.4	3.9	14.0	1.7	1.8	5.3	4.4	1.0
98/12	1.4	1.5	9.1	1.9	4.2	10.0	19.2	1.0
99/1	10.0	1.2	7.2	3.0	2.4	4.6	20.1	1.0
99/2	1.6	1.5	8.5	3.0	2.7	5.8	8.4	1.0
99/3	ND	3.4	13.0	1.5	3.7	4.1	4.4	1.0
99/4	2.2	2.2	8.0	11.1	8.7	9.0	4.2	1.0
99/5	2.4	1.8	21.0	3.7	11.9	12.2	9.8	1.0
99/6	3.5	3.1	12.1	4.8	5.4	7.2	13.0	1.0
99/7	3.9	4.7	21.8	5.2	5.4	10.7	20.0	1.0
99/8	3.4	2.0	29.2	6.7	11.1	5.1	5.3	1.0
99/9	1.5	5.2	28.5	3.7	4.2	2.2	3.7	1.0
99/10	4.2	5.5	6.1	5.4	5.9	12.2	14.3	1.0
99/11	152.0	10.5	12.0	8.6	6.6	ND	2.6	1.0
99/12	146.0	12.1	12.1	8.5	8.7	2.2	1.9	1.0
100/1	4.6	5.6	3.9	6.3	8.0	4.0	4.3	1.0
100/2	109.0	3.1	9.0	1.1	2.8	6.3	3.7	1.0
100/3	2.0	3.2	5.6	1.8	2.4	1.6	2.6	1.0
100/4	2.4	1.9	6.2	2.4	2.8	1.4	3.6	1.0
100/5	4.0	5.2	23.2	2.8	5.2	6.4	4.0	1.0
100/6	1.3	3.6	6.4	3.9	2.8	3.2	4.8	1.0
100/7	1.8	2.1	17.1	2.1	3.4	3.2	5.2	1.0
100/8	2.5	2.7	92.5	3.1	3.3	4.2	6.0	1.0
100/9	2.7	2.6	13.9	4.5	4.2	4.3	3.8	1.0
100/10	1.8	3.5	6.4	3.4	4.2	1.4	3.2	1.0
100/11	7.8	14.6	10.1	9.8	9.6	12.8	15.5	1.0
100/12	3.2	4.3	7.4	4.1	4.9	6.2	9.7	1.0
101/1	3.6	4.3	4.6	3.6	4.8	3.6	5.6	1.0
101/2	2.8	2.5	5.4	3.7	4.4	4.1	8.4	1.0
101/3	2.4	2.6	9.5	3.4	3.5	4.2	3.4	1.0
101/4	3.8	3.1	6.0	4.4	6.5	4.0	3.6	1.0
101/5	4.0	3.6	6.9	2.6	2.4	3.8	18.4	1.0
101/6	2.8	4.0	19.1	4.9	4.6	8.2	5.4	1.0

註：1. 上游水文站自84年8月新增、石碇溪廠界測站自85年10月新增、支流暗渠上游及澳底二號橋攔水堰上游測站自90年5月新增。
2. 自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。
3. ND表示低於儀器偵測極限。

表3.1-22 核四施工環境監測歷年河川水質
氨氮監測結果

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
82/8	-	-	-	-	3.02	0.08	0.09	0.05
82/9	-	-	-	-	0.86	0.09	0.06	0.05
82/10	-	-	-	-	0.69	0.06	0.09	0.05
82/11	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.05
82/12	-	-	-	-	0.03	0.00	0.00	0.05
83/1	-	-	-	-	0.03	0.07	0.03	0.05
83/2	-	-	-	-	0.28	0.10	0.09	0.05
83/3	-	-	-	-	0.20	0.02	0.05	0.05
83/4	-	-	-	-	0.06	0.06	0.09	0.05
83/5	-	-	-	-	0.10	0.05	0.16	0.05
83/6	-	-	-	-	0.20	0.05	0.00	0.05
83/7	-	-	-	-	0.54	0.04	0.05	0.05
83/8	-	-	-	-	0.37	0.00	0.00	0.05
83/9	-	-	-	-	0.26	0.09	0.09	0.05
83/10	-	-	-	-	0.88	0.08	0.06	0.05
83/11	-	-	-	-	1.16	0.00	0.00	0.05
83/12	-	-	-	-	0.20	0.04	0.05	0.05
84/1	-	-	-	-	0.41	0.06	0.06	0.05
84/2	-	-	-	-	0.63	0.00	0.00	0.05
84/3	-	-	-	-	0.13	0.03	0.02	0.05
84/4	-	-	-	-	0.13	0.00	0.00	0.05
84/5	-	-	-	-	0.28	0.08	0.04	0.05
84/6	-	-	-	-	0.20	0.03	0.04	0.05
84/7	-	-	-	-	0.56	0.00	0.00	0.05
84/8	0.11	-	-	-	1.19	0.00	0.00	0.05
84/9	0.04	-	-	-	1.04	0.06	0.29	0.05
84/10	0.00	-	-	-	0.05	0.00	0.08	0.05
84/11	0.09	-	-	-	0.26	0.05	0.07	0.05
84/12	0.20	-	-	-	0.32	0.34	0.25	0.05
85/1	0.12	-	-	-	0.20	0.00	0.00	0.04
85/2	0.05	-	-	-	0.12	0.04	0.00	0.04
85/3	0.19	-	-	-	0.18	0.06	0.09	0.04
85/4	0.10	-	-	-	0.16	0.11	0.08	0.04
85/5	0.02	-	-	-	0.17	0.06	0.08	0.04
85/6	0.11	-	-	-	0.37	0.09	0.27	0.04
85/7	0.02	-	-	-	1.34	0.02	0.06	0.04
85/8	0.07	-	-	-	0.26	0.12	0.08	0.04
85/9	0.23	-	-	-	1.26	0.11	0.04	0.04
85/10	0.30	0.07	-	-	0.41	0.10	0.06	0.04
85/11	0.22	0.14	-	-	0.48	0.10	0.12	0.04
85/12	0.16	0.16	-	-	0.30	0.05	0.11	0.04
86/1	0.33	0.22	-	-	0.53	0.02	0.06	0.04
86/2	0.22	0.09	-	-	0.26	0.08	0.07	0.04
86/3	0.25	0.11	-	-	0.41	0.02	0.07	0.04
86/4	0.08	0.12	-	-	0.35	0.07	0.05	0.04
86/5	0.13	0.19	-	-	0.28	0.02	0.06	0.04
86/6	0.09	0.09	-	-	0.40	0.02	0.02	0.04
86/7	0.18	0.13	-	-	0.27	0.04	0.15	0.04
86/8	0.02	0.05	-	-	0.33	0.02	0.07	0.04
86/9	0.05	0.05	-	-	0.29	0.02	0.02	0.04
86/10	0.13	0.06	-	-	0.25	0.04	0.02	0.04
86/11	0.02	0.05	-	-	0.15	0.02	0.05	0.04
86/12	0.07	0.06	-	-	0.38	0.02	0.04	0.04
86/4	0.08	0.12	-	-	0.35	0.07	0.05	0.04
86/5	0.13	0.19	-	-	0.28	0.02	0.06	0.04
86/6	0.09	0.09	-	-	0.40	0.02	0.02	0.04
86/7	0.18	0.13	-	-	0.27	0.04	0.15	0.04
86/8	0.02	0.05	-	-	0.33	0.02	0.07	0.04
86/9	0.05	0.05	-	-	0.29	0.02	0.02	0.04
86/10	0.13	0.06	-	-	0.25	0.04	0.02	0.04
86/11	0.02	0.05	-	-	0.15	0.02	0.05	0.04
86/12	0.07	0.06	-	-	0.38	0.02	0.04	0.04

表3.1-22 核四施工環境監測歷年河川水質
氨氮監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
87/10	0.02	0.02	-	-	0.08	0.02	0.02	0.04
87/11	0.32	0.02	-	-	0.16	0.05	0.39	0.04
87/12	0.11	0.06	-	-	0.13	0.02	0.06	0.04
88/1	0.23	0.39	-	-	0.63	0.02	0.02	0.04
88/2	0.10	0.14	-	-	0.30	0.02	0.02	0.04
88/3	0.10	0.04	-	-	0.19	0.02	0.02	0.04
88/4	0.19	0.09	-	-	0.57	0.05	0.13	0.04
88/5	0.09	0.06	-	-	0.46	0.05	0.07	0.04
88/6	0.10	0.04	-	-	0.19	0.02	0.02	0.04
88/7	0.07	0.04	-	-	0.33	0.07	0.17	0.04
88/8	0.05	0.02	-	-	0.70	0.05	0.09	0.04
88/9	0.13	0.11	-	-	2.59	0.20	0.32	0.04
88/10	0.05	0.07	-	-	0.14	0.02	0.02	0.04
88/11	0.16	0.13	-	-	0.26	0.10	0.15	0.04
88/12	0.06	0.07	-	-	0.10	0.02	0.02	0.04
89/1	0.35	0.36	-	-	0.28	0.13	0.12	0.04
89/2	0.08	0.40	-	-	0.15	0.31	0.12	0.04
89/3	0.13	0.07	-	-	0.24	0.08	0.10	0.04
89/4	0.02	0.09	-	-	0.23	0.06	0.07	0.04
89/5	0.08	0.09	-	-	0.16	0.19	0.09	0.04
89/6	0.07	0.05	-	-	0.14	0.06	0.12	0.04
89/7	0.04	0.02	-	-	0.11	0.06	0.02	0.04
89/8	0.02	0.09	-	-	0.24	0.06	0.08	0.04
89/9	0.05	0.28	-	-	0.31	0.02	0.02	0.04
89/10	0.05	0.28	-	-	0.78	0.04	0.07	0.04
89/11	-	-	-	-	-	-	-	0.04
89/12	-	-	-	-	-	-	-	0.04
90/1	-	-	-	-	-	-	-	0.04
90/2	0.34	0.17	-	-	0.30	0.11	0.07	0.04
90/3	0.12	0.08	-	-	0.34	0.07	0.07	0.04
90/4	0.18	0.16	-	-	0.75	0.09	0.12	0.04
90/5	0.25	0.13	1.19	0.18	0.47	0.02	0.13	0.04
90/6	0.06	0.12	0.33	0.02	0.34	0.05	0.06	0.04
90/7	0.11	0.13	0.55	0.30	0.33	0.11	0.45	0.04
90/8	0.08	0.19	4.39	0.17	2.02	0.02	0.12	0.04
90/9	0.11	0.19	0.91	0.19	0.56	0.09	0.10	0.04
90/10	0.11	0.06	0.63	0.28	0.27	0.05	0.07	0.04
90/11	0.10	0.20	3.16	0.06	0.36	0.02	0.10	0.04
90/12	0.28	0.18	1.67	0.82	0.27	0.05	0.02	0.04
91/1	0.21	0.16	1.63	0.17	2.28	0.34	0.05	0.04
91/2	0.19	0.04	0.40	0.18	0.20	0.03	0.06	0.04
91/3	0.09	0.05	2.14	0.56	0.72	0.07	0.07	0.04
91/4	0.09	0.06	2.16	0.51	0.60	0.06	0.09	0.04
91/5	0.09	0.06	3.47	0.06	0.51	0.05	0.06	0.04
91/6	0.10	0.07	1.59	0.24	0.19	0.02	0.08	0.04
91/7	0.11	0.12	1.76	0.30	0.22	0.05	0.06	0.04
91/8	0.10	0.10	2.33	0.90	0.64	0.06	0.10	0.04
91/9	0.81	0.17	3.78	0.87	0.49	0.06	0.04	0.04
91/10	0.19	0.36	3.13	0.32	0.46	0.13	0.12	0.04
91/11	0.05	0.04	1.03	0.18	0.24	0.02	0.02	0.04
91/12	0.85	0.34	2.13	0.60	0.39	0.05	0.04	0.04
92/1	0.06	0.05	0.58	0.09	0.13	0.04	0.05	0.04
92/2	0.04	0.06	4.58	0.17	0.59	0.02	0.04	0.04
92/3	0.09	0.10	0.09	0.50	0.30	0.08	0.09	0.04
92/4	0.18	0.14	1.57	0.31	0.32	0.02	0.06	0.04
92/5	0.24	0.05	2.30	0.49	0.31	0.05	0.09	0.04
92/6	0.21	0.08	2.85	0.45	0.34	0.05	0.09	0.04
92/7	0.13	0.19	2.56	0.16	0.52	0.12	0.08	0.04
92/8	0.08	0.07	3.25	1.44	18.20	0.09	0.09	0.04
92/9	0.06	0.06	3.25	0.56	0.86	0.04	0.18	0.04
92/10	0.08	0.09	0.38	0.09	0.12	0.08	0.09	0.04
92/11	0.04	0.09	0.40	0.09	0.22	0.02	0.02	0.04
92/12	0.23	0.13	1.56	0.63	0.34	0.14	0.09	0.04

表3.1-22 核四施工環境監測歷年河川水質
氨氮監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
93/1	0.56	0.28	4.88	0.90	0.45	0.09	0.10	0.03
93/2	0.14	0.04	0.24	0.16	0.20	0.05	0.02	0.03
93/3	0.28	0.22	2.45	0.77	0.29	0.05	0.05	0.03
93/4	1.12	0.51	2.35	1.10	5.84	0.14	0.20	0.03
93/5	0.48	0.37	1.36	0.78	0.50	0.13	0.16	0.03
93/6	0.21	0.31	1.08	0.83	0.69	0.19	0.22	0.03
93/7	0.30	0.17	0.36	0.97	0.62	0.09	0.09	0.03
93/8	0.18	0.56	1.05	0.45	0.49	0.11	0.12	0.03
93/9	0.23	0.14	0.68	0.25	0.24	0.13	0.16	0.03
93/10	0.24	0.25	1.05	0.33	0.34	0.19	0.12	0.03
93/11	0.50	0.14	0.90	0.30	0.28	0.04	0.05	0.03
93/12	0.31	0.10	1.46	0.24	0.23	0.06	0.07	0.03
94/1	0.64	0.74	0.60	0.46	0.68	0.50	0.31	0.01
94/2	2.21	0.04	3.01	1.63	1.16	0.01	1.03	0.01
94/3	0.30	0.57	3.28	0.33	0.37	0.02	0.03	0.01
94/4	0.02	0.02	3.96	0.01	0.66	0.03	0.01	0.01
94/5	0.35	0.14	1.28	0.87	0.23	0.03	0.04	0.01
94/6	0.82	0.06	2.49	0.30	0.64	0.67	0.66	0.01
94/7	0.11	0.11	1.46	0.45	0.48	1.10	3.70	0.01
94/8	0.44	0.34	1.36	1.37	0.85	1.20	3.10	0.01
94/9	0.71	0.70	1.52	0.93	0.66	2.50	2.40	0.01
94/10	0.06	0.17	1.33	0.49	0.47	0.14	0.23	0.01
94/11	0.09	0.07	1.26	0.65	0.29	0.01	0.02	0.01
94/12	0.58	0.07	0.24	0.22	0.22	0.03	0.02	0.01
95/1	0.07	0.11	1.09	0.47	0.36	0.02	0.02	0.01
95/2	0.38	0.13	0.79	0.34	0.29	0.05	0.04	0.01
95/3	0.68	0.80	0.64	0.79	0.77	0.59	0.58	0.01
95/4	0.26	0.04	1.98	0.54	0.38	0.03	0.04	0.01
95/5	0.63	0.08	1.03	0.56	0.51	0.06	0.01	0.01
95/6	0.21	0.07	0.78	0.20	0.20	0.01	0.02	0.01
95/7	0.01	0.04	1.99	0.76	0.76	0.01	0.22	0.01
95/8	0.07	0.04	1.22	1.32	0.96	0.01	0.06	0.01
95/9	0.19	0.04	0.48	0.15	0.16	0.02	0.02	0.01
95/10	0.12	0.03	2.94	0.42	0.53	0.01	0.02	0.01
95/11	0.12	0.04	2.78	0.72	0.42	0.01	0.01	0.01
95/12	0.02	0.07	0.41	0.07	0.05	0.01	0.03	0.01
96/1	0.06	0.02	0.18	0.11	0.13	0.01	0.02	0.01
96/2	0.29	0.17	1.55	0.63	0.61	0.01	0.01	0.01
96/3	0.22	0.09	1.88	0.38	0.45	0.01	0.09	0.01
96/4	0.27	0.80	1.13	0.27	0.29	0.04	0.10	0.01
96/5	0.43	0.14	4.19	0.53	0.50	0.01	0.08	0.01
96/6	0.05	0.04	2.84	0.55	0.29	0.01	0.01	0.01
96/7	0.01	0.01	4.57	1.02	0.92	0.01	0.73	0.01
96/8	0.01	0.03	0.11	1.74	1.72	0.01	0.01	0.01
96/9	0.07	0.06	3.41	0.59	0.53	0.04	0.05	0.01
96/10	0.18	0.08	1.23	0.20	0.12	0.02	0.12	0.01
96/11	0.10	0.05	0.75	0.18	0.08	0.01	0.02	0.01
96/12	0.08	0.02	1.28	0.40	0.25	0.15	0.04	0.01
97/1	0.09	0.09	0.10	0.10	0.05	0.03	0.07	0.01
97/2	0.10	0.02	0.09	0.09	0.09	0.01	0.09	0.01
97/3	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.02	0.04	0.01
97/4	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	ND	0.09	0.01
97/5	0.09	0.04	0.08	0.09	0.08	0.01	0.02	0.01
97/6	0.03	0.02	0.08	0.08	0.09	ND	ND	0.01
97/7	0.02	ND	ND	0.08	0.09	ND	0.05	0.01
97/8	ND	0.01	0.09	0.09	0.08	ND	ND	0.01
97/9	0.03	0.08	0.09	0.09	0.09	0.01	0.05	0.01
97/10	0.06	ND	0.02	0.06	0.08	ND	ND	0.01
97/11	ND	0.02	0.08	0.09	0.09	ND	0.02	0.01
97/12	0.06	0.03	0.09	0.08	0.09	0.09	ND	0.01
96/1	0.06	0.02	0.18	0.11	0.13	0.01	0.02	0.01
96/2	0.29	0.17	1.55	0.63	0.61	0.01	0.01	0.01
96/3	0.22	0.09	1.88	0.38	0.45	0.01	0.09	0.01

表3.1-22 核四施工環境監測歷年河川水質
氨氮監測結果（續3）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
98/1	0.09	0.05	0.09	0.08	0.08	0.03	0.03	0.01
98/2	0.04	0.03	0.09	0.09	0.08	0.03	0.03	0.01
98/3	0.07	0.05	0.09	0.09	0.09	0.04	ND	0.01
98/4	0.08	0.04	0.09	0.09	0.08	0.02	0.05	0.01
98/5	0.03	0.05	0.09	0.09	0.09	0.04	0.04	0.01
98/6	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.02	0.05	0.01
98/7	0.03	0.02	0.09	0.09	0.08	ND	0.06	0.01
98/8	0.07	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.04	0.01
98/9	0.04	0.05	3.65	0.38	0.47	0.02	0.04	0.01
98/10	0.05	0.03	0.58	0.20	0.24	0.02	0.02	0.01
98/11	0.03	0.04	3.08	0.66	0.52	0.01	0.03	0.01
98/12	0.08	ND	0.83	0.40	0.40	ND	0.06	0.01
99/1	0.03	0.03	0.62	0.33	0.22	0.03	0.03	0.01
99/2	0.10	0.03	1.27	0.49	0.47	0.04	0.05	0.01
99/3	0.04	0.04	2.81	0.86	0.45	0.02	0.04	0.01
99/4	0.02	ND	3.06	0.46	0.62	0.05	ND	0.01
99/5	0.02	ND	2.93	0.45	0.45	0.02	0.03	0.01
99/6	0.08	0.02	1.16	0.26	0.19	0.02	0.02	0.01
99/7	0.04	0.05	1.41	0.43	0.30	0.06	0.05	0.01
99/8	0.03	0.02	2.48	1.75	1.62	ND	ND	0.01
99/9	0.06	0.05	1.70	0.66	0.62	0.06	0.05	0.01
99/10	ND	ND	0.22	0.07	0.05	ND	ND	0.01
99/11	0.16	0.05	1.84	0.49	0.55	0.03	0.04	0.01
99/12	0.04	0.03	1.67	0.34	0.38	0.02	0.02	0.01
100/1	0.04	0.08	0.4	0.1	0.12	0.02	0.03	0.01
100/2	0.07	0.03	0.96	0.19	0.33	0.01	0.02	0.01
100/3	0.11	0.05	0.88	0.29	0.37	0.02	0.02	0.01
100/4	0.03	0.02	0.42	1	0.66	0.01	0.02	0.01
100/5	0.05	0.05	3.28	0.63	0.66	0.05	0.07	0.01
100/6	0.05	0.03	0.97	0.35	0.34	0.02	0.04	0.01
100/7	0.04	0.04	1.11	0.30	0.52	0.03	0.04	0.01
100/8	0.03	0.02	0.14	0.73	0.6	ND	ND	0.01
100/9	ND	ND	1.21	0.82	0.77	ND	ND	0.01
100/10	0.03	0.07	0.88	0.26	0.24	0.01	0.02	0.01
100/11	0.03	0.05	0.32	0.11	0.1	0.03	0.03	0.01
100/12	0.08	0.09	0.99	0.21	0.22	0.03	0.05	0.01
101/1	0.02	0.04	0.26	0.26	0.14	0.01	ND	0.01
101/2	0.12	0.06	0.35	0.23	0.32	0.02	0.02	0.01
101/3	0.08	0.06	0.64	0.22	0.24	0.02	0.02	0.01
101/4	0.16	0.07	0.96	0.84	0.76	0.03	0.08	0.01
101/5	0.03	0.03	1.36	0.25	0.25	ND	ND	0.01
101/6	0.02	0.03	0.75	0.12	0.14	0.02	ND	0.01

註：1. 上游水文站自84年8月新增、石碇溪廠界測站自85年10月新增、支流暗渠上游及澳底二號橋攔水堰上游測站自90年5月新增。
2.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。
3.ND表示低於儀器偵測極限。

表3.1-23 核四施工環境監測歷年河川水質
導電度監測結果

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
82/8	-	-	-	-	450	133	23000	-
82/9	-	-	-	-	332	313	42900	-
82/10	-	-	-	-	157.8	87.1	132.5	-
82/11	-	-	-	-	138	114	125	-
82/12	-	-	-	-	139	90.0	109	-
83/1	-	-	-	-	120	100.6	105.3	-
83/2	-	-	-	-	89.2	80.2	86.3	-
83/3	-	-	-	-	125.5	100.5	103.4	-
83/4	-	-	-	-	131.1	99.1	109.5	-
83/5	-	-	-	-	240	121.3	1848	-
83/6	-	-	-	-	141.3	103.9	145.7	-
83/7	-	-	-	-	4042	131.3	6080	-
83/8	-	-	-	-	1729	125.8	608	-
83/9	-	-	-	-	140	78.6	85.6	-
83/10	-	-	-	-	216	111	458	-
83/11	-	-	-	-	223	124	378	-
83/12	-	-	-	-	125	94.0	97.0	-
84/1	-	-	-	-	273	117	121	-
84/2	-	-	-	-	250	112	121	-
84/3	-	-	-	-	162	104	106	-
84/4	-	-	-	-	183.5	100.2	107.5	-
84/5	-	-	-	-	301	100	140	-
84/6	-	-	-	-	212	91.0	134	-
84/7	-	-	-	-	482	127	8170	-
84/8	133	-	-	-	1150	123	101	-
84/9	155	-	-	-	1218	139	12000	-
84/10	95.0	-	-	-	828	88.0	136	-
84/11	107	-	-	-	581	117	128	-
84/12	88.0	-	-	-	110	89.0	90.4	-
85/1	90.1	-	-	-	162.1	86.9	91.3	-
85/2	98.0	-	-	-	174.6	106.9	121.5	-
85/3	93.0	-	-	-	162	98.8	102.8	-
85/4	92.7	-	-	-	175.4	97.6	104.1	-
85/5	90.5	-	-	-	170.3	98.3	107.2	-
85/6	108	-	-	-	538	125	253	-
85/7	236	-	-	-	1720	159	12000	-
85/8	111	-	-	-	516	118	7200	-
85/9	119	-	-	-	187	138	8000	-
85/10	111	111	-	-	483	126	486	-
85/11	113	116	-	-	353	106	245	-
85/12	82.4	85.5	-	-	200	97.6	108	-
86/1	113	1320	-	-	152	115	131	-
86/2	104	107	-	-	142	110	110	-
86/3	133	125	-	-	330	124	386	-
86/4	134	117	-	-	364	118	1680	-
86/5	138	121	-	-	313	112	628	-
86/6	108	103	-	-	379	118	469	-
86/7	108	149	-	-	275	113	172	-
86/8	137	143	-	-	3890	115	320	-
86/9	106	101	-	-	98	107	124	-
86/10	95.7	102	-	-	118	96.8	118	-
86/11	100	92	-	-	175	106	140	-
86/12	99	106	-	-	135	104	108	-
87/1	114	102	-	-	185	110	119	-
87/2	101	105	-	-	170	107	129	-
87/3	99	157	-	-	118	85	81	-
87/4	100	170	-	-	660	120	750	-
87/5	128	107	-	-	194	115	107	-
87/6	116	102	-	-	519.0	106	125	-
87/7	113	144	-	-	808	132	9920	-
87/8	165	159.0	-	-	2130	189	38900	-
87/9	98.5	95.6	-	-	152	88	195	-

表3.1-23 核四施工環境監測歷年河川水質
導電度監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
87/10	79.2	136	-	-	123	121	81.7	-
87/11	107	99	-	-	146	111	124	-
87/12	73.1	73.6	-	-	277	68.5	68.2	-
88/1	77.1	92.7	-	-	248	69.4	60.4	-
88/2	89.3	104	-	-	173	114	267	-
88/3	78.5	86.4	-	-	209	90.7	104	-
88/4	110	114	-	-	262	119	129	-
88/5	99	104	-	-	445	112	351	-
88/6	89.9	107	-	-	173	92.6	106	-
88/7	89	98	-	-	170	99	111	-
88/8	113	143.0	-	-	94	138	95	-
88/9	145	143	-	-	11	145	140	-
88/10	87	164	-	-	137	95	114	-
88/11	108	114	-	-	270	129	4450	-
88/12	89	95	-	-	126	95	110	-
89/1	104	103	-	-	271	117	157	-
89/2	93.0	115	-	-	128	105	106	-
89/3	94	143	-	-	141	102	104	-
89/4	101.0	120.0	-	-	155	102.0	118	-
89/5	85.2	126	-	-	136.0	92	92.0	-
89/6	111	81.2	-	-	52.9	69	76	-
89/7	87.0	102	-	-	147	100.0	118	-
89/8	199	122	-	-	816	129	671	-
89/9	104.0	141.0	-	-	369	110.0	145	-
89/10	115	124	-	-	382	151	158	-
89/11	-	-	-	-	-	-	-	-
89/12	-	-	-	-	-	-	-	-
90/1	-	-	-	-	-	-	-	-
90/2	102	138	-	-	203	117.0	126.0	-
90/3	97	120	-	-	3590	120.0	353.0	-
90/4	102.0	118	-	-	151	107	122	-
90/5	109	118	180	143	244	130	146	-
90/6	85	952	129	105	80	87	88	-
90/7	112	121	334	221	443	160	184	-
90/8	121	128	421	189	546	153	7580	-
89/12	-	-	-	-	-	-	-	-
90/1	-	-	-	-	-	-	-	-
90/2	102	138	-	-	203	117	126	-
90/3	97.0	120	-	-	3590	120	353	-
90/4	102	118	-	-	151	107	122	-
90/5	109	118	180	143	244	130	146	-
90/6	85.0	952	129	105	80.0	87.0	88.0	-
90/7	112	121	334	221	443	160	184	-
90/8	121	128	421	189	546	153	7580	-
90/9	92	138	153	73	701	96	85	-
90/10	84	96	172	112	383	99	107	-
90/11	102	110	348	129	8530	116	125	-
90/12	122	117	213	185	155	114	134	-
91/1	121	120	224	152	668	184	1823	-
91/2	90	98	170	110	119	96	99	-
91/3	104	114	212	199	202	139	7480	-
91/4	115	118	255	174	465	133	186	-
91/5	108	120	324	155	327	136	1289	-
91/6	92	101	214	134	174	123	184	-
91/7	98.0	108	132	231.0	193	102.0	115.0	-
91/8	132.0	127.0	211	374	282	162.0	5030	-
91/9	122	118	174	286	172	117	226	-
91/10	109	125	258	166	140	138	2400	-
91/11	94	102	199	131	251	113	124	-
91/12	102.0	100.0	238	150	128	126.0	194.0	-
92/1	83	93	142	104	109	98	98	-
92/2	98	113	326	164	172	143	1050	-
92/3	100	96	153	106	111	9.6	98	-

表3.1-23 核四施工環境監測歷年河川水質
導電度監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
92/4	103	95	113	178	125	112	156	-
92/5	109	127	119	215	128	106	185	-
92/6	108	114	271	296	316	135	2700	-
92/7	120	119	300	182	193	134	10500	-
92/8	137.0	165	181	416	1510	162	42700	-
92/9	131	150	432	229	323	136	2560	-
92/10	96.3	120.0	184	117	119	107.0	117.0	-
92/11	87.2	100	170	116	117	90.7	95.8	-
92/12	118	128.0	285	196	264	117.0	120.0	-
93/1	96.7	106	255	171	235	133	3450	-
93/2	103	127	147	184	119	110	99.1	-
93/3	112	158	233	213	169	124	702	-
93/4	122	1060	252	185	287	126	226	-
93/5	132	106	168	262	255	99.6	394	-
93/6	125	48.5	94.2	95.5	169	126	6080	-
93/7	123	2260	166	551	625	132	6870	-
93/8	102	114	206	151	147	101	201	-
93/9	89.8	163	144	131	136	101	112	-
93/10	107	170	209	228	136	69.2	83.5	-
93/11	110	116	274	253	1020	111	121	-
93/12	98.5	106	192	155	169	111	113	-
94/1	104	104	165	185	396	118	121	-
94/2	80.6	87.2	137	120	106	83.8	82.8	-
94/3	87.4	93.4	193	161	186	97.2	98.8	-
94/4	154	163	395	447	540	161	2530	-
94/5	95.6	98.8	176	156	161	103	165	-
94/6	86.2	86.4	178	231	297	84.8	617	-
94/7	100	120	258	509	472	152	3850	-
94/8	117	310	335	368	499	133	14000	-
94/9	114	163	204	656	271	116	134	-
94/10	107	137	231	513	312	110	181	-
94/11	99.8	108	220	1320	2830	116	261	-
94/12	108	103	174	238	234	112	117	-
95/1	103	107	216	474	260	110	122	-
95/2	97.5	103	205	329	213	99.8	110	-
95/3	94	101	162	163	146	93.5	103	-
95/4	118	125	238	407	352	123	2750	-
95/5	111	115	183	299	225	113	124	-
95/6	101	113	200	267	217	106	112	-
95/7	129	136	461	327	355	140	15800	-
95/8	133	164	373	571	477	167	1770	-
95/9	95.2	100	159	186	174	117	118	-
95/10	104	112	288	315	327	114	3790	-
95/11	108	113	252	447	290	113	132	-
95/12	90.6	107	151	201	132	154	91.8	-
96/1	97.5	127	212	173	304	106	117	-
96/2	105	115	218	535	652	120	240	-
96/3	116	118	239	521	679	116	269	-
96/4	396	356	229	679	440	124	715	-
96/5	122	120	297	796	790	119	810	-
96/6	104	106	248	617	1280	124	266	-
96/7	169	149	284	1110	1050	128	7710	-
96/8	123	126	592	3400	7510	141	45900	-
96/9	108	111	283	668	513	108	2130	-
96/10	143	109	183	387	197	104	112	-
96/11	94.4	98.8	173	715	239	96.1	101.2	-
96/12	117	486	329	523	878	189	825	-
97/1	105	112	216	734	445	110	166	-
97/2	97.5	104	185	1140	350	103	122	-
97/3	91.9	88.1	215	737	463	93.6	131	-
97/4	95.2	59	144	800	532	103	1550	-
97/5	87.5	96.2	174	862	350	85.4	45.6	-
97/6	89.2	96.3	178	911	5750	95.5	1870	-

表3.1-23 核四施工環境監測歷年河川水質
導電度監測結果（續3）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
97/7	109	121.0	218	929	3220	101	337	-
97/8	112	126	224	524	1960	115	1960	-
97/9	119	110	196	1180	21400	102	3010	-
97/10	105	110	214	531	403	106	111	-
97/11	69	72.6	104	458	191	71.4	86.9	-
97/12	53.7	80.7	149	597	337	77.7	83.6	-
98/1	102	107	239	246	225	111	121	-
98/2	104.0	116	182	419	276	106	107	-
98/3	96.8	103	161	629	257	96.5	99.1	-
98/4	131	112	260	591	506	120	898	-
98/5	107	1030	203	496	490	120	189	-
98/6	106	121	87.7	718	442	121	825	-
98/7	131	135	295	1280	911	137	11000	-
98/8	118.0	124	360	385	4610	109	165	-
98/9	134	137	280	414	11700	132	5250	-
98/10	102	107	189	226	208	111	120	-
98/11	111	122	328	447	345	123	167	-
98/12	105	108	180	369	273	116	119	-
99/1	102	108	222	383	282	123	120	-
99/2	108	111	222	293	246	119	119	-
99/3	105	112	240	473	9530	122	3550	-
99/4	114	126	288	448	502	138	17700	-
99/5	105	116	245	289	280	122	2080	-
99/6	103	109	204	260	224	110	181	-
99/7	104	109	242	311	239	116	127	-
99/8	141	136	253	617	654	125	15300	-
99/9	112	124	272	333	354	121	2790	-
99/10	93	100	153	137	137	78	83	-
99/11	209	119	294	304	273	118	121	-
99/12	104	108	231	224	231	112	116	-
100/1	97	106	167	129	131	106	101	-
100/2	101	102	187	165	203	98	113	-
100/3	96	102	170	171	212	108	124	-
100/4	99	103	158	284	227	106.0	113	-
100/5	120	127	273	445	457	120	1460	-
100/6	97	108	184	150	226	105	125	-
100/7	103	117	235	291	342	121	7560	-
100/8	115	128	258	768	744	133	25300	-
100/9	121	123	202	411	437	143	6310	-
100/10	100	108	218	158	155	101	133	-
100/11	99	100	141	150	145	90	100	-
100/12	94	101	174	162	153	90	89	-
101/1	85	87	140	194	131	86	82	-
101/2	86	90	125	156	1540	87	90	-
101/3	88	92	140	163	550	94	98	-
101/4	111	116	164	656	326	122	2690	-
101/5	93	96	178	204	208	96	107	-
101/6	84	89	154	200	190	79	80	-

註：1. 上游水文站自84年8月新增、石碇溪廠界測站自85年10月新增、支流暗渠上游及澳底二號橋攔水堰上游測站自90年5月新增。

2. 自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-24 核四施工環境監測歷年河川水質
硝酸鹽氮監測結果

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
82/8	-	-	-	-	2.13	0.43	0.79	0.10
82/9	-	-	-	-	0.36	0.35	0.10	0.10
82/10	-	-	-	-	0.69	0.34	0.33	0.10
82/11	-	-	-	-	0.35	0.40	0.41	0.10
82/12	-	-	-	-	0.54	0.41	0.44	0.10
83/1	-	-	-	-	0.36	0.32	0.39	0.10
83/2	-	-	-	-	0.66	0.74	0.58	0.10
83/3	-	-	-	-	0.32	0.53	0.72	0.10
83/4	-	-	-	-	0.46	0.38	0.47	0.10
83/5	-	-	-	-	0.51	0.28	0.63	0.10
83/6	-	-	-	-	0.34	0.26	0.22	0.10
83/7	-	-	-	-	0.13	0.13	0.69	0.10
83/8	-	-	-	-	0.34	0.20	0.25	0.10
83/9	-	-	-	-	0.63	0.77	0.84	0.10
83/10	-	-	-	-	0.93	0.35	0.55	0.10
83/11	-	-	-	-	0.49	0.23	0.23	0.10
83/12	-	-	-	-	0.58	0.48	0.61	0.10
84/1	-	-	-	-	0.21	0.21	0.23	0.10
84/2	-	-	-	-	0.55	0.40	0.54	0.10
84/3	-	-	-	-	0.21	0.23	0.16	0.10
84/4	-	-	-	-	0.51	0.55	0.51	0.10
84/5	-	-	-	-	0.43	0.40	0.40	0.10
84/6	-	-	-	-	0.46	0.48	0.82	0.10
84/7	-	-	-	-	0.52	0.19	0.20	0.10
84/8	1.10	-	-	-	0.96	0.23	0.28	0.10
84/9	1.92	-	-	-	0.57	0.14	0.09	0.10
84/10	0.42	-	-	-	0.38	0.44	0.52	0.10
84/11	0.39	-	-	-	0.48	0.41	0.40	0.10
84/12	0.60	-	-	-	0.60	0.46	0.37	0.10
85/1	0.77	-	-	-	0.71	0.48	0.48	0.05
85/2	0.52	-	-	-	0.49	0.43	0.42	0.05
85/3	0.68	-	-	-	0.23	0.55	0.44	0.05
85/4	0.45	-	-	-	0.41	0.51	0.43	0.05
85/5	0.40	-	-	-	0.41	0.36	0.52	0.05
85/6	0.74	-	-	-	0.68	0.30	0.34	0.05
85/7	0.87	-	-	-	0.57	0.22	0.14	0.05
85/8	0.44	-	-	-	0.35	0.18	0.18	0.05
85/9	0.52	-	-	-	0.15	0.17	0.70	0.05
85/10	0.65	-	-	-	0.38	0.36	0.47	0.05
85/11	0.56	-	-	-	0.71	0.32	0.49	0.05
85/12	0.75	-	-	-	0.54	0.49	0.76	0.05
86/1	0.76	-	-	-	0.70	0.64	0.72	0.05
86/2	0.65	-	-	-	0.64	0.62	0.48	0.05
86/3	0.48	-	-	-	0.38	0.14	0.31	0.05
86/4	0.50	-	-	-	0.41	0.41	0.71	0.05
86/5	0.29	-	-	-	0.45	0.08	0.53	0.05
86/6	0.65	-	-	-	0.78	0.42	0.66	0.05
86/7	0.41	-	-	-	0.34	0.20	0.27	0.05
86/8	0.45	0.43	-	-	0.51	0.25	0.03	0.05
86/9	0.33	0.33	-	-	0.30	0.24	0.30	0.05
86/10	0.47	0.39	-	-	0.54	0.39	0.41	0.05
86/11	0.62	0.39	-	-	0.50	0.34	0.46	0.05
86/12	0.60	0.74	-	-	0.69	0.57	0.66	0.05
87/1	0.34	0.42	-	-	0.50	0.49	0.51	0.05
87/2	0.70	0.63	-	-	0.60	0.56	0.64	0.05
87/3	0.60	0.74	-	-	0.65	0.57	0.70	0.05
87/4	0.65	0.90	-	-	0.73	0.27	0.35	0.05
87/5	0.98	0.56	-	-	0.60	0.27	0.36	0.05
87/6	0.31	0.47	-	-	0.47	0.58	0.33	0.05
87/7	0.40	0.35	-	-	0.40	0.20	0.35	0.05
87/8	0.45	0.16	-	-	0.31	0.20	0.07	0.05
87/9	0.60	0.68	-	-	0.62	0.47	0.48	0.05

表3.1-24 核四施工環境監測歷年河川水質
硝酸鹽氮監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
87/10	0.47	0.44	-	-	0.40	0.00	0.00	0.05
87/11	0.55	0.41	-	-	0.39	0.01	0.01	0.05
87/12	0.68	0.58	-	-	0.53	0.01	0.04	0.05
88/1	0.72	0.80	-	-	0.62	0.52	0.55	0.05
88/2	0.53	0.72	-	-	0.64	0.38	0.37	0.05
88/3	0.46	0.28	-	-	0.45	0.28	0.40	0.05
88/4	1.12	1.04	-	-	0.78	0.37	0.28	0.05
88/5	0.71	0.72	-	-	0.69	0.45	0.56	0.05
88/6	0.55	0.50	-	-	0.50	0.44	0.48	0.05
88/7	0.62	0.64	-	-	0.47	0.62	0.54	0.05
88/8	0.17	0.36	-	-	0.24	0.19	0.14	0.05
88/9	0.19	0.17	-	-	0.19	0.19	0.08	0.05
88/10	0.18	0.16	-	-	0.39	0.33	0.23	0.05
88/11	0.02	0.01	-	-	0.03	0.01	0.01	0.05
88/12	0.77	0.80	-	-	0.75	0.62	0.72	0.05
89/1	0.73	0.54	-	-	0.75	3.18	0.67	0.05
89/2	0.90	0.95	-	-	1.00	0.73	0.69	0.05
89/3	0.48	0.50	-	-	0.50	0.45	0.48	0.05
89/4	0.49	0.66	-	-	0.51	0.58	0.44	0.05
89/5	0.23	0.28	-	-	0.28	0.78	0.87	0.05
89/6	0.19	0.71	-	-	0.32	0.66	0.23	0.05
89/7	0.04	0.03	-	-	0.03	0.60	0.60	0.05
89/8	0.03	0.02	-	-	0.02	0.29	0.22	0.05
89/9	0.12	0.12	-	-	0.07	0.29	0.29	0.05
89/10	0.39	0.29	-	-	0.28	0.35	0.30	0.05
89/11	-	-	-	-	-	-	-	0.05
89/12	-	-	-	-	-	-	-	0.05
90/1	-	-	-	-	-	-	-	0.05
90/2	0.14	0.03	-	-	0.05	0.01	0.01	0.05
90/3	0.06	0.03	-	-	0.03	0.01	0.01	0.05
90/4	0.60	0.55	-	-	0.78	0.35	0.16	0.05
90/5	0.55	0.52	0.33	0.51	0.67	0.53	0.88	0.05
90/6	0.45	0.56	0.51	0.65	0.68	0.53	0.71	0.05
90/7	0.85	0.66	0.24	0.61	0.60	0.23	0.22	0.05
90/8	0.82	0.41	0.10	0.81	0.86	0.38	0.40	0.05
90/9	0.65	0.81	0.43	0.46	0.48	0.54	0.57	0.05
90/10	0.35	0.34	0.26	0.28	0.30	0.43	0.28	0.05
90/11	0.65	0.67	0.06	0.59	0.50	0.30	0.42	0.05
90/12	0.69	0.53	0.30	0.71	0.66	0.51	0.52	0.05
91/1	0.56	0.65	0.21	0.67	0.60	0.38	0.41	0.01
91/2	0.60	0.64	0.62	0.64	0.67	0.52	0.55	0.01
91/3	0.84	0.85	0.22	0.62	0.67	0.56	0.38	0.01
91/4	0.68	0.58	0.14	0.60	0.56	0.39	0.33	0.01
91/5	0.85	0.59	0.18	0.51	0.48	0.26	0.26	0.01
91/6	0.35	0.34	0.20	0.35	0.29	0.44	0.45	0.01
91/7	0.74	0.55	0.32	0.56	0.54	0.49	0.50	0.01
91/8	0.63	0.97	0.37	0.58	0.63	0.28	0.33	0.01
91/9	0.92	0.76	0.04	0.63	0.64	0.38	0.42	0.01
91/10	0.86	0.66	0.23	0.73	0.78	0.72	0.64	0.01
91/11	0.94	0.64	0.45	0.63	0.62	0.70	0.77	0.01
91/12	0.42	0.24	0.31	0.44	0.32	0.22	0.33	0.01
92/1	0.02	0.02	0.19	0.02	0.03	0.00	0.01	0.01
92/2	0.05	0.03	0.98	0.02	0.07	0.00	0.01	0.01
92/3	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01
92/4	0.70	0.61	0.16	0.58	0.58	0.50	0.57	0.01
92/5	0.67	0.72	0.19	0.42	0.41	0.37	0.47	0.01
92/6	0.48	0.68	0.25	0.54	0.67	0.33	0.51	0.01
92/7	0.54	0.45	0.16	0.37	0.41	0.33	0.18	0.012
92/8	0.20	0.13	0.24	0.10	0.12	0.09	0.06	0.012
92/9	0.72	0.50	0.18	0.33	0.35	0.34	0.32	0.012
92/10	2.28	1.13	1.28	3.11	0.93	0.74	0.80	0.012
92/11	0.75	0.58	0.22	0.87	0.78	0.53	0.57	0.012
92/12	0.59	0.69	0.49	0.59	0.63	0.53	0.53	0.012

表3.1-24 核四施工環境監測歷年河川水質
硝酸鹽氮監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠 上游	澳底二號橋 攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
93/1	1.19	1.36	0.05	1.09	1.28	0.63	0.51	0.020
93/2	0.79	0.84	0.82	0.73	0.83	0.51	0.58	0.020
93/3	1.54	1.70	0.02	1.48	1.66	0.47	0.44	0.020
93/4	1.09	1.21	0.05	1.01	1.55	0.50	0.60	0.020
93/5	0.74	0.78	0.34	0.76	0.75	0.54	0.52	0.020
93/6	1.09	1.19	0.11	1.01	1.01	0.31	0.33	0.020
93/7	1.16	0.91	0.06	0.68	0.72	0.26	0.29	0.020
93/8	1.13	1.24	0.77	1.05	1.12	0.92	0.80	0.020
93/9	0.62	0.56	0.43	0.52	0.60	0.57	2.14	0.020
93/10	1.01	0.88	0.70	0.90	0.89	0.58	0.54	0.020
93/11	0.94	0.71	0.16	0.57	0.61	0.31	0.38	0.020
93/12	0.55	0.62	0.31	0.57	0.49	0.48	0.46	0.020
94/1	0.78	0.69	0.50	0.66	0.68	0.53	0.55	0.010
94/2	0.82	0.65	0.64	0.63	0.62	0.62	0.56	0.010
94/3	0.64	0.75	0.49	0.67	0.65	0.56	0.46	0.010
94/4	1.76	1.84	0.29	27.80	1.65	0.79	0.66	0.010
94/5	0.81	0.79	0.23	0.74	0.68	0.94	0.55	0.010
94/6	1.22	1.00	0.05	0.80	2.00	0.17	0.32	0.010
94/7	0.69	0.23	0.23	0.21	0.22	0.23	0.25	0.01
94/8	0.63	0.47	0.12	0.39	0.39	0.17	0.18	0.01
94/9	0.77	0.39	0.12	0.37	0.38	0.36	0.42	0.01
94/10	0.44	0.46	0.04	0.60	0.42	0.27	1.86	0.01
94/11	1.01	0.71	0.05	0.71	0.72	0.35	0.56	0.01
94/12	0.61	1.40	0.37	0.53	0.55	0.46	0.46	0.01
95/1	0.65	1.51	0.78	0.58	0.61	0.54	0.51	0.01
95/2	0.65	0.63	0.33	0.61	0.61	0.71	0.72	0.01
95/3	0.71	0.78	0.71	0.70	0.73	0.59	0.63	0.01
95/4	1.11	1.03	0.07	0.79	0.79	0.45	0.50	0.01
95/5	0.98	0.83	0.16	0.68	0.70	0.35	0.39	0.01
95/6	0.73	0.75	0.21	0.65	0.67	0.33	0.39	0.01
95/7	1.61	0.89	0.04	0.60	0.59	0.14	0.26	0.01
95/8	1.76	0.80	0.38	0.62	0.68	0.16	0.18	0.01
95/9	0.01	0.52	0.29	0.54	0.52	0.42	0.45	0.01
95/10	0.95	0.91	0.10	0.74	0.73	0.40	0.40	0.01
95/11	0.82	0.73	0.02	0.62	0.64	0.34	0.35	0.01
95/12	0.62	0.62	0.57	0.60	0.59	0.38	0.51	0.01
96/1	0.65	0.64	0.65	0.77	0.67	0.52	0.61	0.01
96/2	0.80	0.81	0.17	0.73	0.76	0.31	0.37	0.01
96/3	0.75	0.70	0.18	0.68	0.67	0.65	0.67	0.01
96/4	0.98	0.76	0.10	0.68	0.69	0.40	0.40	0.01
96/5	1.14	0.87	0.08	0.78	0.74	0.35	0.45	0.01
96/6	0.42	0.51	0.01	0.32	0.36	0.21	0.26	0.01
96/7	0.77	0.64	0.09	0.37	0.63	0.20	0.19	0.01
96/8	0.16	0.06	0.04	0.08	0.11	0.07	0.11	0.01
96/9	0.60	0.53	0.10	0.49	0.54	0.51	0.54	0.01
96/10	0.62	0.62	0.31	0.57	0.57	1.37	0.53	0.01
96/11	0.76	0.76	0.58	0.70	0.73	0.73	0.71	0.01
96/12	0.95	0.97	0.65	1.15	1.19	0.77	0.82	0.01
97/1	0.80	0.62	0.30	0.68	0.66	0.65	0.65	0.01
97/2	0.77	0.79	0.59	0.70	0.75	0.67	0.93	0.01
97/3	0.76	0.67	0.14	0.60	0.64	0.51	0.57	0.01
97/4	0.69	0.94	0.13	0.61	0.63	0.53	0.54	0.01
97/5	0.63	0.62	0.08	0.56	0.57	0.45	0.56	0.01
97/6	0.46	0.50	0.02	0.43	0.41	0.23	0.31	0.01
97/7	0.56	0.54	0.02	0.42	0.44	0.78	0.85	0.01
97/8	0.36	0.43	0.04	0.28	0.29	0.28	0.35	0.01
97/9	0.58	0.85	0.02	0.77	0.59	0.51	0.61	0.01
97/10	0.56	0.68	0.05	0.48	0.49	0.41	0.44	0.01
97/11	0.68	0.66	0.35	0.50	0.62	0.52	0.77	0.01
97/12	0.70	0.74	0.04	0.62	0.69	0.48	0.52	0.01
98/1	0.69	0.71	0.45	0.73	0.74	0.60	0.63	0.01
98/2	0.75	0.65	0.26	0.65	0.69	0.76	0.50	0.01
98/3	0.65	0.65	0.49	0.67	0.70	0.52	0.55	0.01

表3.1-24 核四施工環境監測歷年河川水質
硝酸鹽氮監測結果（續3）

單位：mg/L

測站名稱 調查日期	上游水文站	石碇溪廠界	支流暗渠上游	澳底二號橋攔水堰上游	澳底二號橋	貢寮國小	新社大橋	偵測極限值
98/4	1.07	0.76	0.03	0.74	0.68	0.57	0.58	0.01
98/5	0.50	0.55	0.11	0.56	0.57	0.35	0.96	0.01
98/6	0.51	0.53	0.14	0.54	0.53	0.27	0.34	0.01
98/7	0.34	0.32	0.08	0.74	0.56	0.17	0.20	0.01
98/8	0.48	0.50	0.07	0.52	0.54	0.40	0.43	0.01
98/9	0.46	0.38	0.03	0.41	0.33	0.25	0.27	0.01
98/10	0.67	0.68	0.30	0.79	0.82	0.61	0.62	0.01
98/11	0.58	0.63	0.01	0.65	0.65	0.26	0.31	0.01
98/12	0.64	0.55	0.17	0.52	0.55	0.44	0.47	0.01
99/1	0.62	0.64	0.30	0.60	0.62	0.50	0.57	0.01
99/2	0.74	0.66	0.09	0.73	0.77	0.51	0.50	0.01
99/3	0.46	0.50	0.01	0.41	0.42	0.29	0.33	0.01
99/4	0.51	0.47	0.04	0.81	0.84	0.24	0.22	0.01
99/5	0.37	0.47	0.02	0.78	0.77	0.22	0.27	0.01
99/6	0.37	0.38	0.03	0.42	0.46	0.25	0.32	0.01
99/7	0.30	0.38	0.04	0.33	0.34	0.30	0.36	0.01
99/8	0.25	0.19	0.07	0.53	0.55	0.11	0.13	0.01
99/9	0.49	0.43	0.02	0.47	0.46	0.26	0.34	0.01
99/10	0.51	0.51	0.37	0.55	0.55	0.41	0.42	0.01
99/11	0.63	0.57	0.03	0.71	0.76	0.55	0.53	0.01
99/12	0.52	0.53	0.04	0.54	0.54	0.35	0.41	0.01
100/1	0.69	0.75	0.70	0.73	0.73	0.57	0.59	0.01
100/2	0.58	0.58	0.17	0.74	0.70	0.41	0.46	0.01
100/3	0.58	0.58	0.14	0.79	0.76	0.37	0.39	0.01
100/4	0.54	0.61	0.70	0.65	0.78	0.44	0.53	0.01
100/5	0.92	0.78	2.09	0.88	0.89	0.57	0.60	0.01
100/6	0.53	0.53	1.08	0.66	0.57	0.41	0.44	0.01
100/7	0.24	0.36	0.08	0.40	0.49	0.18	0.20	0.01
100/8	0.27	0.20	0.07	0.55	0.53	0.09	0.07	0.01
100/9	0.64	0.55	0.03	1.49	1.46	0.18	0.20	0.01
100/10	0.60	0.61	0.17	0.65	0.67	0.51	0.51	0.01
100/11	0.80	0.85	0.35	0.74	0.77	0.51	0.54	0.01
100/12	0.61	0.78	0.78	0.82	0.83	0.78	0.61	0.01
101/1	0.74	0.74	0.62	0.72	0.74	0.63	0.64	0.01
101/2	0.68	0.67	0.39	0.77	0.74	0.45	0.50	0.01
101/3	0.63	0.60	0.31	0.69	0.71	0.47	0.50	0.01
101/4	1.14	1.16	0.22	1.17	1.43	0.52	0.47	0.01
101/5	0.42	0.55	0.04	0.54	0.55	0.35	0.38	0.01
101/6	0.46	0.51	0.14	0.57	0.61	0.43	0.46	0.01

註：1. 上游水文站自84年8月新增、石碇溪廠界測站自86年8月新增、支流暗渠上游及澳底二號橋攔水堰上游測站自90年5月新增。

2.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-25 核四施工環境監測歷年廠區水質
pH監測結果

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準			6.0~9.0			-
85年10月	6.7	7.1	7.2	-	-	-
85年11月	6.7	7.2	7.2	-	-	-
85年12月	6.4	6.8	7.0	-	-	-
86年1月	6.5	6.8	7.3	-	-	-
86年2月	6.4	7.1	6.8	-	-	-
86年3月	6.8	6.9	7.1	-	-	-
86年4月	6.8	6.8	7.3	-	-	-
86年5月	6.9	6.8	7.3	-	-	-
86年6月	6.5	6.5	6.7	-	-	-
86年7月	6.9	6.7	7.3	-	-	-
86年8月	7.6	6.7	7.7	7.1	7.0	-
86年9月	6.6	6.7	6.7	7.6	7.3	-
86年10月	6.6	6.8	6.8	6.8	7.5	-
86年11月	6.4	6.8	6.7	7.1	7.4	-
86年12月	6.7	7.1	7.0	7.4	7.6	-
87年1月	6.9	6.8	7.3	7.6	7.8	-
87年2月	6.4	6.8	6.3	7.4	7.4	-
87年3月	6.3	7.1	6.9	7.3	7.4	-
87年4月	6.9	6.8	7.5	7.5	7.7	-
87年5月	6.3	6.4	6.8	7.0	7.4	-
87年6月	6.4	6.8	6.7	7.3	7.2	-
87年7月	6.6	6.6	6.8	7.2	7.4	-
87年8月	7.1	6.3	6.9	6.6	6.9	-
87年9月	6.2	6.5	6.0	8.3	7.4	-
87年10月	6.5	7.0	6.5	7.1	7.2	-
87年11月	6.2	6.7	6.7	7.0	7.3	-
87年12月	6.9	7.3	7.4	8.0	7.7	-
88年1月	6.8	6.9	6.7	7.0	7.5	-
88年2月	6.8	7.0	7.2	7.6	7.7	-
88年3月	6.9	6.8	7.4	7.6	7.7	-
88年4月	5.1	5.0	5.5	5.0	5.6	-
88年5月	6.8	6.7	7.2	8.8	8.4	-
88年6月	7.0	6.9	7.2	8.0	7.6	-
88年7月	7.0	7.0	7.6	7.4	7.8	-
88年8月	7.4	7.3	7.5	7.8	8.0	-
88年9月	7.0	6.8	7.2	8.0	7.4	-
88年10月	6.8	7.3	6.9	7.1	7.7	-
88年11月	7.2	7.0	7.7	7.1	7.8	-
88年12月	6.3	7.0	7.3	7.0	7.3	-
89年1月	7.2	7.3	7.7	7.8	7.7	-
89年2月	6.6	7.1	6.9	7.4	7.7	-
89年3月	6.0	6.6	6.5	6.9	7.8	-
89年4月	6.7	7.1	7.3	7.8	7.8	-
89年5月	6.6	7.1	7.3	7.5	7.5	-
89年6月	6.4	7.1	6.9	7.3	7.4	-
89年7月	6.7	7.1	7.1	7.6	7.4	-
89年8月	6.9	7.2	7.2	7.4	7.6	-
89年9月	7.1	7.4	7.5	7.8	7.8	-
89年10月	7.0	6.8	7.5	7.1	7.6	-
89年11月	-	-	-	-	-	-
89年12月	-	-	-	-	-	-
90年1月	-	-	-	-	-	-
90年2月	6.7	7.1	7.2	7.5	7.7	-
90年3月	6.7	6.9	7.3	7.3	7.5	-
90年4月	6.8	7.5	7.1	7.3	8.0	-
90年5月	6.8	7.0	7.5	7.3	7.8	-
90年6月	6.2	6.5	7.0	7.0	7.1	-
90年7月	6.9	6.9	7.2	7.1	8.0	-
90年8月	6.6	6.6	7.7	7.7	8.1	-
90年9月	7.1	6.7	7.0	7.3	8.0	-
90年10月	6.3	7.0	7.0	7.3	7.6	-
90年11月	6.5	7.1	7.5	6.9	7.8	-
90年12月	6.7	6.8	7.1	7.3	7.2	-
91年1月	6.9	7.0	7.1	7.2	9.6	-
91年2月	6.7	7.0	7.1	7.2	8.1	-
91年3月	6.9	7.0	7.4	7.6	7.9	-
91年4月	6.6	6.9	7.0	6.8	7.6	-
91年5月	7.1	7.0	7.3	7.5	8.3	-
91年6月	6.5	6.8	7.0	7.2	8.0	-

表3.1-25 核四施工環境監測歷年廠區水質 pH監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準			6.0~9.0			-
91年7月	7.0	7.0	7.4	8.7	8.4	-
91年8月	7.2	7.3	7.7	8.1	7.9	-
91年9月	6.7	7.2	7.5	8.6	7.6	-
91年10月	6.9	6.9	7.3	8.2	8.3	-
91年11月	6.6	6.9	7.0	8.1	8.0	-
91年12月	6.9	6.9	7.2	7.2	7.8	-
92年1月	6.7	6.6	6.8	7.1	7.7	-
92年2月	6.8	6.9	6.9	7.3	8.2	-
92年3月	6.6	6.7	6.8	7.0	7.6	-
92年4月	6.6	6.8	7.3	7.1	6.9	-
92年5月	6.7	6.9	7.5	7.2	7.3	-
92年6月	7.0	7.0	7.5	7.4	7.1	-
92年7月	7.2	7.3	7.7	7.6	8.1	-
92年8月	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	-
92年9月	7.4	7.0	7.4	7.1	7.7	-
92年10月	6.8	6.8	6.8	7.5	8.0	-
92年11月	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	-
92年12月	7.1	7.1	7.3	8.1	7.9	-
93年1月	7.4	7.2	7.6	7.4	7.8	-
93年2月	6.7	7.0	6.8	7.3	7.2	-
93年3月	7.0	6.9	7.3	7.8	8.3	-
93年4月	7.0	6.5	6.7	8.2	7.3	-
93年5月	6.8	6.9	7.0	8.8	7.6	-
93年6月	7.2	5.8	7.6	7.0	7.4	-
93年7月	8.0	7.7	7.7	8.1	6.9	-
93年8月	7.0	6.9	7.3	7.5	6.5	-
93年9月	6.6	7.1	6.8	6.7	7.0	-
93年10月	6.8	6.9	7.5	7.3	7.7	-
93年11月	6.9	6.8	7.2	7.5	7.3	-
93年12月	6.4	6.8	6.4	6.7	8.0	-
94年1月	6.9	6.9	7.4	7.5	7.4	-
94年2月	6.5	7.8	7.3	8.1	8.3	-
94年3月	6.2	6.6	6.9	6.7	7.2	-
94年4月	6.7	6.6	7.2	6.8	7.4	-
94年5月	6.6	6.2	6.9	7.5	7.6	-
94年6月	6.5	6.7	6.9	7.6	7.5	-
94年7月	7.2	7.2	7.5	8.9	7.6	-
94年8月	7.2	7.4	7.3	8.6	8.0	-
94年9月	7.1	7.4	7.3	7.7	7.5	-
94年10月	7.5	7.2	7.5	8.5	7.6	-
94年11月	7.2	7.1	7.2	7.5	7.6	-
94年12月	6.8	7.2	7.0	7.4	7.0	-
95年1月	6.8	6.9	7.0	7.5	7.1	-
95年2月	6.7	7.0	7.2	6.9	7.4	-
95年3月	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	-
95年4月	7.2	7.0	6.8	7.9	7.3	-
95年5月	7.6	7.6	7.8	8.4	8.8	-
95年6月	6.3	6.7	6.9	7.3	7.3	-
95年7月	7.2	7.2	7.5	8.1	7.9	-
95年8月	7.1	7.2	7.5	8.6	7.8	-
95年9月	6.6	7.2	6.9	7.3	7.8	-
95年10月	7.0	7.0	7.3	8.1	7.9	-
95年11月	6.9	6.9	7.4	7.5	7.5	-
95年12月	6.4	6.9	6.7	6.7	6.8	-
96年1月	7.0	7.2	7.1	7.4	7.6	-
96年2月	7.3	6.4	6.6	8.8	6.6	-
96年3月	6.8	6.7	7.4	8.7	7.4	-
96年4月	7.7	7.2	7.2	8.8	7.7	-
96年5月	7.0	7.1	7.6	6.4	7.4	-
96年6月	6.9	7.0	7.1	8.2	7.4	-
96年7月	7.0	7.2	7.3	8.8	7.3	-
96年8月	7.7	7.3	7.3	8.7	7.6	-
96年9月	6.2	6.6	7.3	7.2	6.5	-
96年10月	6.5	7.0	6.7	6.9	7.3	-
96年11月	6.7	7.5	7.2	7.0	6.8	-
96年12月	6.5	6.7	6.7	8.1	6.2	-

表3.1-25 核四施工環境監測歷年廠區水質 pH監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準			6.0~9.0			-
97年1月	7.0	7.1	7.3	7.4	6.9	-
97年2月	6.3	7.1	6.2	7.6	6.4	-
97年3月	7.8	7.4	7.3	8.2	7.3	-
97年4月	7.0	7.4	7.7	7.5	7.6	-
97年5月	7.6	7.2	8.2	7.1	7.0	-
97年6月	8.6	7.1	7.2	6.8	7.9	-
97年7月	7.0	6.9	7.0	8.5	7.8	-
97年8月	6.7	7.4	7.0	8.7	7.7	-
97年9月	8.4	7.0	7.0	6.8	7.8	-
97年10月	6.5	7.0	6.9	7.6	7.6	-
97年11月	6.7	7.0	6.8	7.2	7.8	-
97年12月	6.5	7.4	7.0	7.6	7.9	-
98年1月	6.5	7.3	7.0	7.6	7.9	-
98年2月	6.5	6.9	6.6	7.5	7.6	-
98年3月	7.1	7.2	6.7	7.4	7.6	-
98年4月	7.4	6.9	6.9	7.9	7.6	-
98年5月	6.9	7.0	7.0	7.9	7.8	-
98年6月	7.6	7.4	7.2	7.2	7.6	-
98年7月	7.4	7.2	7.6	8.1	8.2	-
98年8月	7.2	6.6	6.9	7.8	7.3	-
98年9月	7.1	7.0	6.8	7.3	7.6	-
98年10月	6.9	6.5	6.5	7.0	7.1	-
98年11月	7.3	7.0	7.1	7.4	7.5	-
98年12月	7.5	7.1	7.0	7.2	7.7	-
99年1月	7.3	7.1	7.0	7.4	8.0	-
99年2月	7.6	7.0	7.1	7.4	7.8	-
99年3月	7.2	7.2	7.2	7.3	7.8	-
99年4月	7.8	7.1	7.3	8.9	7.8	-
99年5月	7.4	7.0	7.2	8.1	7.9	-
99年6月	7.5	7.0	7.3	8.3	8.0	-
99年7月	7.4	7.2	7.1	8.2	7.7	-
99年8月	7.2	7.9	7.4	7.7	7.4	-
99年9月	7.1	7.2	7.3	7.5	7.8	-
99年10月	6.8	6.9	6.7	7.4	8.1	-
99年11月	7.3	7.3	7.1	7.5	7.7	-
99年12月	7	7.0	7.2	7.4	7.4	-
100年1月	6.98	7.2	7.6	7.1	7.9	-
100年2月	7.072	7.4	7.2	7.8	7.9	-
100年3月	7.016	7.3	7.2	7.5	7.7	-
100年4月	7.302	7.5	7.6	7.7	7.7	-
100年5月	7.175	7.3	7.5	7.4	7.5	-
100年6月	6.8	7.3	6.9	7.9	7.4	-
100年7月	7.3	7.4	7.3	7.8	7.6	-
100年8月	7.4	7.5	7.6	8.3	7.3	-
100年9月	7.4	7.2	7.2	7.4	7.8	-
100年10月	7.4	7.0	7.2	7.5	7.5	-
100年11月	7.0	7.3	7.3	7.5	7.5	-
100年12月	6.9	6.9	6.9	7.0	7.4	-
101年1月	6.763	7.159	6.959	7.133	7.836	-
101年2月	6.850	7.308	6.966	7.471	7.445	-
101年3月	6.917	7.324	7.112	7.340	8.062	-
101年4月	7.594	7.092	7.154	7.306	8.139	-
101年5月	7.395	7.156	7.118	7.62	8.174	-
101年6月	7.295	7.166	7.147	7.527	7.774	-
歷次平均	6.9	7.0	7.1	7.5	7.6	-

註：1. 2號排洪渠道及鹽寮一號橋排洪渠道出口自86年8月新增。
2.陰影部分表示未符合放流水標準。
3.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-26 核四施工環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準	80（流量<50CMD） 50（250>流量>50CMD） 30（流量>250CMD）		30（流量 >250CMD）	30		-
85年10月	2.1	2.6	7.2	-	-	4.0
85年11月	ND	6.0	13.0	-	-	4.0
85年12月	13.0	7.5	5.3	-	-	4.0
86年1月	3.5	6.3	6.4	-	-	2.0
86年2月	2.5	7.7	5.5	-	-	2.0
86年3月	2.3	9.4	10.0	-	-	2.0
86年4月	3.9	6.6	4.0	-	-	2.0
86年5月	ND	9.0	8.6	-	-	2.0
86年6月	58.0	45.0	96.0	-	-	2.0
86年7月	ND	13.0	7.8	-	-	2.0
86年8月	2.6	3.8	14.0	5.9	12.0	2.0
86年9月	3.0	3.0	7.5	2.0	5.5	2.0
86年10月	2.4	4.1	6.0	3.4	3.7	2.0
86年11月	7.8	6.2	8.6	4.0	9.6	2.0
86年12月	ND	4.0	5.8	4.2	4.0	2.0
87年1月	1.6	8.1	11.0	2.1	3.2	4.0
87年2月	3.8	7.9	9.0	5.6	35.0	4.0
87年3月	11.2	9.9	14.3	14.6	50.0	4.0
87年4月	ND	6.0	7.0	5.4	2.8	4.0
87年5月	ND	6.9	9.0	7.5	108.0	4.0
87年6月	11.9	6.9	9.1	4.7	124.0	4.0
87年7月	13.0	39.0	24.0	7.4	272.0	4.0
87年8月	9.4	30.0	12.1	8.0	12.0	4.0
87年9月	4.0	5.6	5.9	5.7	ND	4.0
87年10月	2.8	4.5	5.6	13.2	7.4	4.0
87年11月	9.6	6.6	6.5	37.8	7.5	4.0
87年12月	29.1	5.6	32.8	61.3	8.2	4.0
88年1月	96.0	6.1	8.4	32.2	40.7	4.0
88年2月	94.0	5.1	5.3	48.8	10.2	4.0
88年3月	147.0	7.0	6.8	37.3	35.8	4.0
88年4月	18.5	16.6	7.6	12.7	5.4	4.0
88年5月	4.6	8.2	7.5	6.4	13.3	4.0
88年6月	ND	4.1	10.8	5.8	32.4	4.0
88年7月	3.1	2.1	3.4	5.6	ND	4.0
88年8月	8.2	33.3	46.8	38.6	39.8	4.0
88年9月	12.4	4.8	7.9	22.3	10.8	4.0
88年10月	11.0	7.5	8.7	8.3	4.0	4.0
88年11月	7.0	4.6	14.4	8.5	11.4	4.0
88年12月	ND	9.3	4.6	5.2	8.5	4.0
89年1月	ND	3.0	4.0	ND	8.5	4.0
89年2月	10.0	ND	4.6	5.5	4.5	4.0
89年3月	98.2	7.4	11.9	ND	23.9	4.0
89年4月	ND	4.3	4.6	ND	4.6	4.0
89年5月	2.3	ND	6.2	3.4	ND	4.0
89年6月	5.0	6.3	4.1	4.3	ND	4.0
89年7月	ND	5.6	5.4	ND	17.6	4.0
89年8月	ND	4.2	4.9	8.6	20.5	4.0
89年9月	9.5	ND	6.8	5.0	4.3	4.0
89年10月	7.4	4.6	5.3	19.5	15.0	4.0
89年11月	-	-	-	-	-	4.0
89年12月	-	-	-	-	-	4.0
90年1月	-	-	-	-	-	4.0
90年2月	40.9	16.2	7.9	ND	4.2	4.0
90年3月	4.0	2.0	5.7	ND	ND	4.0
90年4月	2.0	4.8	6.7	ND	4.1	4.0
90年5月	4.6	4.8	4.5	ND	ND	4.0
90年6月	ND	4.7	50.0	107.0	30.5	4.0
90年7月	4.9	4.2	ND	9.1	8.5	4.0
90年8月	ND	4.8	9.1	16.3	ND	4.0
90年9月	12.8	72.1	27.7	141.0	ND	4.0
90年10月	12.3	5.4	7.7	ND	ND	4.0
90年11月	ND	ND	5.8	ND	ND	4.0
90年12月	6.7	25.3	16.9	ND	ND	4.0
91年1月	12.2	ND	7.8	7.2	-(註4)	4.0
91年2月	6.0	ND	24.1	ND	8.7	4.0
91年3月	19.9	ND	9.0	ND	10.5	4.0

表3.1-26 核四施工環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準	80（流量<50CMD） 50（250>流量>50CMD） 30（流量>250CMD）		30（流量>250CMD）	30		-
91年4月	44.2	8.5	11.1	18.4	19.3	4.0
91年5月	30.9	4.8	ND	15.2	17.9	4.0
91年6月	53.0	8.5	13.5	ND	26.2	4.0
91年7月	8.2	16.2	13.3	12.7	468.0	4.0
91年8月	19.3	7.0	5.8	10.3	19.2	4.0
91年9月	10.5	11.3	16.2	8.4	5.1	4.0
91年10月	9.2	4.6	6.8	5.3	12.7	4.0
91年11月	9.4	4.6	9.0	16.5	29.2	4.0
91年12月	15.3	8.1	2.8	19.9	10.4	4.0
92年1月	15.5	7.4	4.1	21.0	5.8	4.0
92年2月	4.2	ND	7.0	ND	26.0	4.0
92年3月	15.2	28.6	9.7	9.0	-(註4)	4.0
92年4月	7.1	6.5	8.0	ND	ND	4.0
92年5月	8.9	36.0	6.5	11.6	ND	4.0
92年6月	11.7	32.5	15.4	8.7	ND	4.0
92年7月	11.5	11.8	10.9	ND	4.0	4.0
92年8月	ND	ND	4.3	ND	ND	4.0
92年9月	11.0	4.3	4.3	ND	ND	4.0
92年10月	8.20	4.4	7.8	9.4	-(註4)	4.0
92年11月	6.9	ND	ND	ND	4.2	4.0
92年12月	12.4	39.9	4.6	5.2	ND	4.0
93年1月	50.1	8.9	6.2	38.6	ND	1.9
93年2月	4.0	ND	ND	ND	ND	1.9
93年3月	6.4	8.2	ND	ND	ND	1.9
93年4月	33.5	21.0	6.5	9.0	ND	1.9
93年5月	8.2	8.8	10.5	41.5	3.0	1.9
93年6月	20.8	5.0	5.5	5.8	24.0	1.9
93年7月	50.8	11.8	14.5	42.8	39.5	1.9
93年8月	18.5	9.5	13.8	20.0	2.5	1.9
93年9月	4.0	3.5	6.5	5.5	ND	1.9
93年10月	16.2	9.6	10.8	3.0	6.1	1.9
93年11月	4.1	6.4	9.5	2.9	ND	1.9
93年12月	9.6	5.2	10.6	3.7	ND	1.9
94年1月	13.0	15.5	9.5	7.1	11.6	1.0
94年2月	7.8	7.5	8.5	5.0	ND	1.0
94年3月	5.5	6.5	7.2	ND	5.8	1.0
94年4月	8.0	10.0	13.5	8.8	ND	1.0
94年5月	13.7	28.6	19.1	6.8	11.2	1.0
94年6月	9.5	13.0	14.5	3.5	2.5	1.0
94年7月	14.0	16.0	9.2	11.0	2.3	1.0
94年8月	12.5	10.0	7.5	4.5	1.5	1.0
94年9月	3.5	5.5	5.0	7.8	3.0	1.0
94年10月	6.8	171.0	8.2	23.8	6.8	1.0
94年11月	14.2	16.0	8.6	188.0	ND	1.0
94年12月	3.3	4.8	7.8	4.5	3.7	1.0
95年1月	9.4	81.8	10.2	4.3	1.5	1.0
95年2月	8.1	15.8	12.0	ND	ND	1.0
95年3月	28.2	24.0	16.8	38.2	9.0	1.0
95年4月	8.8	7.0	21.2	9.0	3.5	1.0
95年5月	4.2	10.3	10.2	17.5	ND	1.0
95年6月	7.8	6.5	11.5	9.8	1.5	1.0
95年7月	10.2	5.0	9.5	37.0	ND	1.0
95年8月	12.0	4.0	12.5	58.5	ND	1.0
95年9月	ND	84.8	ND	ND	ND	1.0
95年10月	5.0	4.5	4.5	13.2	ND	1.0
95年11月	7.2	5.5	3.5	13.8	ND	1.0
95年12月	2.5	11.0	5.4	6.2	ND	1.0
96年1月	16.0	2.8	4.8	11.2	ND	1.0
96年2月	17.8	10.2	8.2	7.8	ND	1.0
96年3月	43.8	17.2	21.8	36.5	ND	1.0
96年4月	547	172	11.0	27.5	ND	1.0
96年5月	8.1	15.8	9.5	26.0	5.5	1.0
96年6月	7.5	2.2	19.0	4.8	28.8	1.0
96年7月	4.8	14	13.2	32.8	ND	1.0
96年8月	15.5	5.5	17.5	17.0	ND	1.0
96年9月	12.5	9.1	9.5	7.7	1.5	1.0

表3.1-26 核四施工環境監測歷年廠區水質懸浮固體監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準	80（流量<50CMD） 50（250>流量>50CMD） 30（流量>250CMD）		30（流量>250CMD）	30		-
96年10月	4.5	2.8	17.0	1.5	1.3	1.0
96年11月	7.5	4.5	8.2	6.5	8.3	1.0
96年12月	7.3	6.1	22.5	12.5	10.1	1.0
97年1月	5.5	20.0	13.5	10.6	11.0	1.0
97年2月	5.5	4.0	11.0	8.4	3.0	1.0
97年3月	41.0	79.5	10.8	29.0	6.2	1.0
97年4月	8.5	7.0	21.5	4.7	3.5	1.0
97年5月	33.5	33.5	37.5	6.1	5.5	1.0
97年6月	39.0	65.0	36.5	19.5	2.0	1.0
97年7月	4.7	16	11.5	3.7	1.7	1.0
97年8月	ND	17.5	13.5	15.5	ND	1.0
97年9月	2.7	41.0	9.8	13.5	1.6	1.0
97年10月	2.0	3.5	8.7	2.5	3.0	1.0
97年11月	10.2	7.3	7.5	9.0	2.0	1.0
97年12月	8.2	13.5	11.0	12.0	ND	1.0
98年1月	1.5	4.5	7.6	10.3	ND	1.0
98年2月	3.8	11.6	10.8	28.5	ND	1.0
98年3月	11.8	70.5	7.6	3.8	ND	1.0
98年4月	28.8	43.0	41.0	28.0	ND	1.0
98年5月	15.0	11.0	11.2	6.6	ND	1.0
98年6月	29.0	2.9	13.7	11.6	ND	1.0
98年7月	39.5	6.0	9.2	4.5	15.4	1.0
98年8月	16.1	2.4	8.9	13.0	11.3	1.0
98年9月	6.5	13.0	5.8	7.0	1.2	1.0
98年10月	17.1	5.1	3.8	2.5	ND	1.0
98年11月	13	4.7	7.4	2.0	ND	1.0
98年12月	17.4	4.3	6.5	19.5	ND	1.0
99年1月	23	1.6	5.1	2.9	ND	1.0
99年2月	42	16.0	9.2	8.0	ND	1.0
99年3月	6.3	4.0	13.5	3.2	ND	1.0
99年4月	18	5.3	4.1	8.0	ND	1.0
99年5月	10.2	4.8	9.1	21.6	ND	1.0
99年6月	48	35.0	36.5	5.9	ND	1.0
99年7月	35.2	35.8	38.2	2.4	ND	1.0
99年8月	34.8	78.8	36.3	5.3	4.5	1.0
99年9月	35.9	33.6	33.9	1.5	2.2	1.0
99年10月	35.4	36.1	35.0	2.5	ND	1.0
99年11月	9.1	2.7	4.1	1.0	ND	1.0
99年12月	3.8	2.0	8.0	1.1	ND	1.0
100年1月	14.5	5.5	5.3	3.0	ND	1.0
100年2月	1.4	2.1	14.2	1.5	ND	1.0
100年3月	1.6	1.2	6.2	1.2	ND	1.0
100年4月	2.9	2.8	16.8	1.8	3.0	1.0
100年5月	5.5	2.8	13.1	2.0	2.1	1.0
100年6月	4.9	6.5	8.9	ND	7.2	1.0
100年7月	4.4	1.4	4.0	3.0	2.5	1.0
100年8月	5.2	7.6	3.4	5.8	3.7	1.0
100年9月	7.1	1.4	7.5	5.9	ND	1.0
100年10月	15.3	2.0	6.6	1.5	2.2	1.0
100年11月	3.6	6.8	12.1	9.4	20.3	1.0
100年12月	8.4	5.2	5.4	3.4	6.4	1.0
101年1月	1.7	4.2	4.5	3.2	ND	1.0
101年2月	2.0	5.8	5.7	1.6	4.6	1.0
101年3月	1.6	1.7	5.6	2.6	1.6	1.0
101年4月	2.3	4.6	6.8	4.2	ND	1.0
101年5月	11.2	4.2	8.9	2.4	14.5	1.0
101年6月	9.0	1.8	6.2	3.2	2.7	1.0
歷次平均	16.9	14.3	11.3	13.0	13.0	-

註：1. 2號排洪渠道及鹽寮一號橋排洪渠道出口自86年8月新增。

2. ND表於儀器偵測極限，求歷年平均值時以1/2儀器偵測極限值計算；陰影部分表示未符合放流水標準。

3.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

4.鹽寮一號橋排洪渠道出口91/1、92/3及92/10採樣時因施工區排水量甚小，水深不足，不慎擾動底層淤泥，故結果不具代表性而不予列入。

表3.1-27 核四施工環境監測歷年廠區水質生化需氧量監測結果

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準	80（流量<50CMD） 50（250>流量>50CMD） 30（流量>250CMD）		30（流量 >250CMD）	30		-
85年10月	1.0	2.6	7.7	-	-	1.0
85年11月	3.4	8.2	8.4	-	-	1.0
85年12月	ND	1.5	2.7	-	-	1.0
86年1月	ND	1.6	5.6	-	-	2.0
86年2月	ND	1.4	1.9	-	-	2.0
86年3月	ND	2.2	5.3	-	-	2.0
86年4月	ND	1.2	1.3	-	-	2.0
86年5月	ND	1.0	4.1	-	-	2.0
86年6月	5.6	6.6	14.0	-	-	2.0
86年7月	ND	1.0	6.0	-	-	2.0
86年8月	3.8	5.0	15.0	4.4	3.9	2.0
86年9月	ND	1.9	2.1	ND	ND	2.0
86年10月	1.4	1.4	3.6	ND	ND	2.0
86年11月	ND	2.0	3.9	ND	ND	2.0
86年12月	ND	2.5	6.7	2.3	1.2	2.0
87年1月	2.8	2.1	7.8	ND	ND	1.0
87年2月	2.3	ND	4.0	ND	1.2	1.0
87年3月	1.6	4.1	3.9	ND	2.3	1.0
87年4月	ND	16.4	4.8	ND	ND	1.0
87年5月	4.3	3.2	6.9	1.4	ND	1.0
87年6月	ND	1.1	3.1	ND	1.2	1.0
87年7月	1.2	11.8	11.2	1.8	1.1	1.0
87年8月	3.3	1.5	1.1	4.5	1.1	1.0
87年9月	2.8	2.5	2.9	2.5	2.5	1.0
87年10月	3.3	1.8	2.2	2.2	ND	1.0
87年11月	1.6	1.8	3.0	1.6	ND	1.0
87年12月	4.4	5.8	7.5	9.1	2.0	1.0
88年1月	1.8	ND	ND	ND	ND	1.0
88年2月	ND	2.2	5.3	1.4	ND	1.0
88年3月	1.8	1.4	2.2	2.2	ND	1.0
88年4月	2.4	5.0	5.0	1.6	1.3	1.0
88年5月	2.4	2.4	7.4	1.6	1.7	1.0
88年6月	1.4	3.6	6.8	ND	5.6	1.0
88年7月	1.4	2.2	6.4	1.1	1.5	1.0
88年8月	1.6	10.0	24.9	<2	4.6	1.0
88年9月	ND	1.6	22.2	1.7	<1.5	1.0
88年10月	2.2	2.2	ND	ND	ND	1.0
88年11月	ND	ND	8.4	ND	ND	1.0
88年12月	ND	1.6	2.2	ND	ND	1.0
89年1月	ND	1.8	2.8	ND	ND	1.0
89年2月	ND	3.0	3.8	ND	ND	1.0
89年3月	2.8	ND	15.3	ND	ND	1.0
89年4月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
89年5月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
89年6月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
89年7月	ND	ND	6.0	ND	ND	1.0
89年8月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
89年9月	ND	ND	7.0	ND	ND	1.0
89年10月	15.5	ND	7.3	ND	ND	1.0
89年11月	-	-	-	-	-	1.0
89年12月	-	-	-	-	-	1.0
90年1月	-	-	-	-	-	1.0
90年2月	6.4	ND	8.4	ND	ND	1.0
90年3月	4.9	ND	9.0	ND	ND	1.0
90年4月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
90年5月	ND	ND	5.8	ND	ND	1.0
90年6月	ND	ND	3.3	ND	ND	1.0
90年7月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
90年8月	2.2	2.2	17.1	4.5	ND	1.0
90年9月	ND	ND	9.5	ND	ND	1.0
90年10月	ND	ND	4.5	ND	ND	1.0
90年11月	ND	ND	6.5	ND	ND	1.0
90年12月	1.8	3.7	9.2	ND	ND	1.0

表3.1-27 核四施工環境監測歷年廠區水質
化需氧量監測結果（續1）

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準	80（流量<50CMD） 50（250>流量>50CMD） 30（流量>250CMD）		30（流量 >250CMD）	30		-
91年1月	ND	3.1	2.2	ND	7.6	1.0
91年2月	ND	1.6	2.2	ND	ND	1.0
91年3月	ND	3.0	10.2	3.8	ND	1.0
91年4月	ND	2.3	19.8	6.9	ND	1.0
91年5月	ND	4.4	5.6	ND	ND	1.0
91年6月	ND	ND	4.2	ND	ND	1.0
91年7月	ND	2.5	4.6	ND	ND	1.0
91年8月	6.3	ND	10.3	5.4	ND	1.0
91年9月	ND	ND	14.9	ND	ND	1.0
91年10月	ND	8.1	4.7	ND	ND	1.0
91年11月	ND	ND	ND	3.4	ND	1.0
91年12月	3.3	ND	7.1	ND	13.1	1.0
92年1月	ND	1.6	3.0	ND	1.7	1.0
92年2月	ND	3.6	7.1	ND	ND	1.0
92年3月	7.8	ND	29.4	5.0	4.3	1.0
92年4月	8.2	6.1	8.8	ND	ND	1.0
92年5月	ND	ND	3.9	ND	ND	1.0
92年6月	5.4	3.6	22.1	3.2	ND	1.0
92年7月	8.0	ND	7.6	ND	ND	1.0
92年8月	ND	ND	ND	3.3	ND	1.0
92年9月	4.8	6.1	29.3	5.1	ND	1.0
92年10月	ND	ND	3.6	ND	ND	1.0
92年11月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
92年12月	6.8	3.5	ND	ND	ND	1.0
93年1月	ND	5.1	6.7	4.5	ND	1.0
93年2月	ND	ND	5.5	ND	ND	1.0
93年3月	6.7	5.2	21.1	ND	ND	1.0
93年4月	11.4	2.3	11.3	ND	ND	1.0
93年5月	ND	ND	6.4	ND	ND	1.0
93年6月	5.3	2.4	8.3	ND	2.9	1.0
93年7月	ND	4.6	9.6	2.4	2.4	1.0
93年8月	7.1	8.0	17.0	5.7	ND	1.0
93年9月	2.2	2.9	4.8	ND	11.9	1.0
93年10月	ND	ND	6.6	ND	2.9	1.0
93年11月	2.0	ND	8.3	2.8	ND	1.0
93年12月	ND	ND	ND	ND	3.3	1.0
94年1月	7.40	2.80	9.40	3.8	3.0	1.0
94年2月	ND	4.00	3.60	ND	ND	1.0
94年3月	3.2	ND	3.7	3.1	2.8	1.0
94年4月	8.2	3.9	10.5	ND	ND	1.0
94年5月	ND	ND	5.3	ND	ND	1.0
94年6月	8.5	4.7	10.0	3.4	ND	1.0
94年7月	5.3	4.6	17.3	ND	ND	1.0
94年8月	7.2	9.3	12.2	2.1	2.6	1.0
94年9月	3.1	3.5	5.1	7.2	3.5	1.0
94年10月	3.8	8.3	7.1	3.6	ND	1.0
94年11月	6.0	6.3	4.3	1.8	1.0	1.0
94年12月	1.6	4.4	2.2	1.6	1.1	1.0
95年1月	1.9	1.5	5.7	1.0	2.0	1.0
95年2月	1.0	ND	6.3	1.3	ND	1.0
95年3月	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
95年4月	2.2	2.6	8.5	1.2	ND	1.0
95年5月	1.4	12.0	2.4	ND	ND	1.0
95年6月	3.3	4.7	4.9	1.3	ND	1.0
95年7月	1.4	1.6	11.0	1.5	ND	1.0
95年8月	8.7	2.0	11.3	9.2	ND	1.0
95年9月	1.2	3.0	1.3	ND	ND	1.0
95年10月	2.6	4.4	2.6	1.2	ND	1.0
95年11月	5.2	1.8	4.9	1.2	3.6	1.0
95年12月	1.6	6.4	2.5	1.9	1.2	1.0
96年1月	5.0	1.8	ND	ND	ND	1.0
96年2月	7.9	7.5	5.6	4.3	4.0	1.0
96年3月	8.4	3.8	9.6	ND	2.0	1.0

表3.1-27 核四施工環境監測歷年廠區水質化需氧量監測結果（續2）

單位：mg/L

測站名稱 監測時間	辦公室 排水口(1)	辦公室 排水口(2)	宿舍區 排水口	2號排洪渠道	鹽寮一號橋 排洪渠道出口	偵測 極限
放流水標準	80（流量<50CMD） 50（250>流量>50CMD） 30（流量>250CMD）		30（流量 >250CMD）	30		-
96年4月	25.70	11.40	9.80	3.30	ND	1.0
96年5月	3.6	ND	10.5	ND	ND	1.0
96年6月	4.00	12.10	6.5	ND	2.7	1.0
96年7月	3.10	5.3	11.80	3.60	ND	1.0
96年8月	17.30	3.60	20.8	3.50	ND	1.0
96年9月	5.00	2.70	13.1	3.00	3.00	1.0
96年10月	ND	ND	2.9	ND	ND	1.0
96年11月	3.9	ND	3.8	4.1	ND	1.0
96年12月	3.8	2.8	4.7	3.2	ND	1.0
97年1月	4.1	3.1	8	2.1	9.6	1.0
97年2月	ND	ND	4.8	2.2	ND	1.0
97年3月	ND	5.2	ND	ND	ND	1.0
97年4月	ND	ND	4.3	ND	ND	1.0
97年5月	ND	ND	3.5	ND	ND	1.0
97年6月	ND	3.2	3.7	ND	ND	1.0
97年7月	2.4	ND	6.8	3.1	ND	1.0
97年8月	2.8	4.0	8.6	4.0	ND	1.0
97年9月	ND	7.5	ND	3.9	ND	1.0
97年10月	ND	ND	13.5	ND	ND	1.0
97年11月	4.2	ND	ND	ND	ND	1.0
97年12月	4.4	ND	8.1	ND	ND	1.0
98年1月	ND	ND	6.3	ND	ND	1.0
98年2月	5.2	ND	5	ND	ND	1.0
98年3月	16.20	1.3	ND	ND	ND	1.0
98年4月	28	ND	8.5	3.00	ND	1.0
98年5月	1.3	ND	6.20	ND	ND	1.0
98年6月	23	1.80	7.4	6.80	ND	1.0
98年7月	3.6	1.1	8.7	4.1	1.2	1.0
98年8月	7.5	1.4	9.5	ND	ND	1.0
98年9月	7.5	1.9	4	4.2	ND	1.0
98年10月	17.0	2.0	3.4	ND	ND	1.0
98年11月	10.3	ND	4.3	ND	ND	1.0
98年12月	17.5	ND	5.2	ND	ND	1.0
99年1月	20.7	ND	ND	ND	ND	1.0
99年2月	37.1	2	3.8	1.80	ND	1.0
99年3月	ND	3.2	10.6	ND	ND	1.0
99年4月	49.3	1.3	13.2	7.3	ND	1.0
99年5月	14.9	5	8.3	2.50	ND	1.0
99年6月	21.7	ND	4.7	ND	ND	1.0
99年7月	37.8	ND	24.2	ND	ND	1.0
99年8月	24.4	5.3	39.7	9.9	ND	1.0
99年9月	15.8	ND	19	ND	ND	1.0
99年10月	6.7	2.4	4.5	2.50	ND	1.0
99年11月	13.5	ND	5.4	1.0	ND	1.0
99年12月	4.5	6.3	9.0	1.1	ND	1.0
100年1月	3	1.1	3.4	1.7	ND	1.0
100年2月	1.3	ND	15.3	ND	ND	1.0
100年3月	2.7	ND	12.8	ND	ND	1.0
100年4月	2.4	1.4	11.5	ND	ND	1.0
100年5月	3.4	ND	6.4	ND	ND	1.0
100年6月	2.9	1.6	4.9	4.3	3.4	1.0
100年7月	4.4	ND	1.7	1.2	ND	1.0
100年8月	2	1.2	3.3	2.7	1.3	1.0
100年9月	13.7	1.3	4.2	4.0	ND	1.0
100年10月	19.5	1.9	7.9	ND	ND	1.0
100年11月	1.1	ND	4.1	3.0	2.3	1.0
100年12月	3	2.4	7.9	ND	1.6	1.0
101年1月	1.4	ND	1.5	ND	ND	1.0
101年2月	1.1	ND	3.7	ND	ND	1.0
101年3月	5.4	ND	3.4	ND	ND	1.0
101年4月	12.1	3.7	21.1	12.6	4.8	1.0
101年5月	52.4	ND	26.0	4.2	ND	1.0
101年6月	34.1	ND	14.2	3.0	ND	1.0
歷次平均	4.6	3.0	6.9	1.9	1.5	1.0

註：1. 2號排洪渠道及鹽寮一號橋排洪渠道出口自86年8月新增。
2. ND表於儀器偵測極限，求歷年平均值時以1/2儀器偵測極限值計算；陰影部分表示未符合放流水標準。
3.自89年11月至90年1月因行政院宣布暫停興建核能四廠發電工程，故暫停監測工作。

表3.1-28 核四施工環境監測歷年與本季平均地下水水位標高調查結果比較表

單位：公尺

監測井名稱		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
地面標高		9.92	—	5.93	—	—	16.71	18.09	42.30	43.56	55.25	19.49	—
井頂標高		10.42	9.530	6.43	12.139	20.583	17.21	18.58	42.89	44.00	55.77	19.96	12.69
本季	101年4月平均	10.13	6.70	2.04	5.93	19.11	14.18	1.26	28.50	32.77	40.34	10.52	7.40
	101年5月平均	9.87	7.18	2.52	7.52	19.86	14.30	1.09	30.06	35.20	44.29	11.46	7.91
	101年6月平均	9.99	7.09	3.26	7.08	19.92	13.80	1.69	28.95	34.46	41.66	10.60	7.40
去年同期	100年4月平均	10.07	6.73	1.94	5.89	1.24	13.89	1.00	28.56	33.01	41.23	10.39	7.46
	100年5月平均	10.23	6.66	1.80	6.29	18.37	13.93	0.85	28.43	33.66	42.99	11.08	7.71
	100年6月平均	10.19	8.72	2.03	6.28	17.23	13.60	0.78	28.84	33.43	41.50	10.88	7.37
歷年第2季季平均值	82年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	83年	—	—	3.96	—	—	14.05	1.02	29.04	31.27	38.87	12.70	—
	84年	—	—	2.90	—	—	13.81	0.63	28.36	31.27	40.57	11.80	—
	85年	—	—	3.07	—	—	13.86	0.81	28.86	31.08	43.11	11.65	—
	86年	—	—	3.47	—	—	13.82	1.03	29.54	32.15	44.43	12.38	—
	87年	—	—	2.92	—	—	13.69	0.87	24.84	31.41	40.35	11.85	—
	88年	—	—	3.60	—	—	13.57	0.91	27.05	31.48	42.62	12.18	—
	89年	10.05	—	3.91	—	—	13.77	1.04	27.88	32.08	43.86	12.34	—
	90年	9.98	—	3.24	—	—	13.98	1.26	26.57	32.73	44.98	11.59	—
	91年	10.15	6.58	2.18	0.02	12.40	13.74	0.86	26.05	32.42	44.65	4.88	7.02
	92年	9.75	6.64	2.00	0.64	12.67	13.64	0.73	24.69	32.07	43.43	5.83	7.69
	93年	10.29	6.89	2.22	0.92	12.85	13.97	0.88	28.05	33.31	43.40	6.42	7.96
	94年	10.34	6.97	2.50	2.22	13.04	14.37	1.08	29.26	34.75	46.76	7.44	6.20
	95年	10.41	6.73	2.39	5.42	13.08	14.20	0.85	29.20	34.49	46.39	8.79	8.08
	96年	10.39	7.87	2.58	2.91	11.28	13.88	0.88	28.81	32.77	45.70	9.27	6.61
	97年	10.09	6.67	3.16	3.79	11.06	13.17	1.08	28.82	33.58	45.49	9.64	6.99
	98年	9.82	6.63	3.40	5.64	12.05	13.75	0.87	28.64	33.50	41.38	10.00	7.44
	99年	10.24	6.62	—	5.79	12.31	14.10	0.75	28.72	33.38	41.59	11.06	7.77
	100年	10.16	7.37	1.92	6.15	12.28	13.81	0.88	28.61	33.37	41.91	10.78	7.52
核四環評平均測值		—	—	4.03	—	—	13.83	1.35	28.58	31.66	42.28	12.14	—

註：1.核四環評報告平均值係整理自「核能四廠第1、2號機發電計畫環境影響評估報告」，資料統計時間自76年10月至 78年11月;82年至100年平均系整理自本監測計畫歷次測值

2.GM2監測井之水位自89年1月起新增，故無82~88年資料。

3.P8監測井自90/4/20因坍孔暫停監測，而GM14監測井因填孔自91/1/10廢棄，該兩井自91/8/27新井完成後（分別為P8-1及GM14-1）重新監測。

4.GM3監測井因設置於私人土地上，於新井GM3-1設置完成後於91/8/27移至新井進行監測，另P5-1監測井設於原P5監測井附近，亦同時監測其水位變化。

5.GM6監測井因永久圍籬施工，99年3月8日剷除，並於99年11月於GM6-1監測井持續監測。

6.P8-1監測井因原設置坡面滑動，造成監測井損毀，於100年4月起，於P8-1'監測井持續監測。

表 3.1-29 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季 pH 監測結果表

監測井 / 水質項目	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
pH	本季	101年 4月	6.734	6.311	7.709	6.489	6.904	5.483	7.855	6.273	6.014	5.941	7.705	7.080
		101年 5月	6.721	6.198	7.615	6.004	6.901	5.593	7.573	6.166	5.398	5.630	7.550	6.936
		101年 6月	6.526	6.152	7.504	6.317	6.472	5.667	7.564	6.187	5.130	5.764	7.529	6.897
	去年	100年 1月	6.646	6.274	7.667	6.404	7.099	5.966	7.69	6.191	5.032	5.555	7.627	6.936
		100年 2月	6.605	6.241	7.762	6.510	6.882	5.653	7.49	6.274	5.338	5.578	7.793	7.095
		100年 3月	6.624	6.217	7.709	6.451	7.197	5.714	7.609	6.261	5.883	5.892	7.643	6.976
		100年 4月	6.750	6.264	7.654	6.522	7.471	5.743	7.731	6.262	6.119	5.898	7.728	7.000
		100年 5月	6.547	6.198	7.654	6.692	7.244	5.742	7.624	6.324	6.071	6.047	7.755	6.993
		100年 6月	6.558	6.212	7.624	6.496	6.820	5.676	7.512	6.255	5.854	5.907	7.523	6.923
		100年 7月	6.503	6.086	7.632	6.541	6.852	5.726	7.586	6.394	5.982	5.914	7.617	7.283
		100年 8月	6.726	6.203	7.849	6.647	6.964	6.052	7.751	6.453	6.236	6.206	7.611	7.213
		100年 9月	6.603	6.013	7.561	6.694	6.765	6.104	7.617	6.452	6.209	6.114	7.434	7.104
		100年10月	6.647	6.072	7.674	6.295	6.794	5.752	7.674	5.427	5.084	5.314	7.392	6.931
		100年11月	6.617	6.309	7.805	6.347	6.954	5.545	7.694	5.582	5.155	5.432	7.782	7.085
		100年12月	6.507	6.136	7.753	6.314	6.762	5.694	7.483	6.158	5.18	5.232	7.647	6.935
	歷年	82 年平均	-	5.70	6.47	7.30	-	6.04	7.52	6.28	5.94	6.02	7.84	-
		83 年平均	-	5.77	5.98	7.19	-	5.59	7.50	6.13	5.88	5.70	7.80	-
		84 年平均	-	5.91	6.70	7.48	-	5.85	7.73	6.21	5.85	5.72	8.16	-
		85 年平均	-	5.86	6.55	7.19	-	5.79	7.78	6.51	5.77	5.74	8.60	-
		86 年平均	-	5.87	6.33	7.19	-	5.85	7.66	6.34	5.82	5.50	8.54	-
		87 年平均	-	5.78	6.36	7.15	-	5.59	7.67	5.76	5.53	5.42	8.58	-
		88 年平均	-	5.93	6.02	6.83	-	5.83	7.67	6.51	5.73	5.39	8.23	-
		89 年平均	6.80	5.83	6.12	7.26	-	5.61	7.69	6.06	5.51	5.48	8.57	-
		90 年平均	6.42	5.90	6.05	7.24	-	5.75	7.61	6.21	5.56	5.55	7.99	-
		91 年平均	6.48	5.89	5.71	6.94	7.49	5.64	7.63	6.37	5.64	5.58	7.42	6.76
		92 年平均	6.69	6.11	5.75	6.75	6.97	5.79	7.69	6.52	5.80	5.85	7.35	6.91
		93 年平均	6.24	5.93	5.55	6.35	6.81	5.48	7.58	6.32	5.57	5.51	7.37	6.78
		94 年平均	6.43	6.01	5.49	6.40	6.41	5.64	7.34	5.65	5.13	5.28	7.41	6.78
		95年平均	6.68	6.22	5.99	6.47	6.45	5.71	7.51	5.43	5.27	5.82	7.36	7.07
		96年平均	6.57	5.86	5.94	6.48	6.59	5.59	7.30	5.38	5.21	5.73	7.74	6.83
		97 年平均	6.7	6.0	6.3	6.6	6.6	5.7	7.4	5.6	5.4	5.8	7.6	7.05
		98 年平均	6.4	6.0	6.3	6.5	7.0	5.7	7.5	5.9	5.6	5.8	7.4	6.9
		99 年平均	6.6	6.2	6.7	6.4	7.0	5.7	7.6	6.3	5.7	5.8	7.6	7.0
		100 年平均	6.611	6.185	7.695	6.493	6.984	5.781	7.622	6.169	5.679	5.757	7.629	7.040
	核四環評平均測值		-	6.04	6.10	7.25	-	7.54	6.07	7.56	6.02	6.24	8.01	6.40

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-30 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季導電度監測結果表

水質項目 \ 監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
導電度 (μmho/cm)	本季	101年 4月	235	427	446	382	331	115	900	224	292	164	748	761
		101年 5月	222	394	423	210	346	113	1250	189	193	127	745	762
		101年 6月	221	397	461	346	283	112	1260	206	190	142	760	796
	去年	100年 1月	230	473	477	365	466	129	1340	228	164	119	797	771
		100年 2月	229	464	436	361	454	127	1490	237	192	125	824	818
		100年 3月	229	452	450	412	442	125	1480	232	282	154	878	832
		100年 4月	226	456	456	393	436	124	1450	227	259	162	806	792
		100年 5月	230	439	463	445	402	127	1440	245	326	179	809	749
		100年 6月	227	486	452	403	342	125	1560	224	277	170	801	770
		100年 7月	239	419	478	389	326	131	1430	245	310	173	778	798
		100年 8月	228	427	484	411	324	154	1280	252	330	188	804	792
		100年 9月	231	412	481	417	642	157	1300	257	351	197	779	789
		100年10月	232	228	494	326	1050	146	1280	118	147	111	790	852
		100年11月	234	437	477	315	464	138	1120	126	139	111	799	879
		100年12月	225	440	363	311	312	120	1170	180	169	103	794	798
	歷年	82 年平均	-	203	412	480	-	251	1113	259	231	212	763	-
		83 年平均	-	283	317	538	-	161	1368	272	221	214	694	-
		84 年平均	-	176	286	617	-	144	1138	307	229	256	598	-
		85 年平均	-	182	307	635	-	147	712	259	186	183	557	-
		86 年平均	-	170	263	702	-	162	1593	264	187	166	643	-
		87 年平均	-	142	253	641	-	123	1302	217	177	176	652	-
		88 年平均	-	173	209	752	-	113	1820	221	174	153	753	-
		89 年平均	277	146	282	659	-	101	1546	377	125	134	809	-
		90 年平均	209	162	239	586	-	190	1735	396	234	137	730	-
		91 年平均	207	301	464	505	456	119	1681	370	154	139	614	660
		92 年平均	207	448	1147	381	451	121	1358	368	167	137	688	816
		93 年平均	209	432	1139	360	420	123	890	256	144	129	721	912
		94 年平均	218	421	1063	537	427	181	986	157	133	136	744	835
		95 年平均	227	385	798	336	364	131	589	181	148	136	741	693
		96 年平均	225	329	666	333	307	138	602	147	147	135	824	727
		97 年平均	261	290	679	303	306	116	636	122	152	113	771	651
		98 年平均	230	407	943	375	400	147	1391	205	232	142	775	838
		99 年平均	228	447	836	362	413	135	1293	229	237	152	806	830
		100 年平均	230	428	459	379	472	134	1362	214	246	149	805	803
	核四環評平均測值		-	164	141	427	-	260	139	757	157	221	701	-

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-31 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季氯鹽監測結果表

水質項目 \ 監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
氯鹽 (mg/L)	本季	101年 4月	25.6	22.0	19.1	33.8	28.1	22.0	170.0	21.6	22.8	20.6	22.8	24.0
		101年 5月	25.7	19.7	18.2	22.8	27.4	20.2	262.0	20.6	20.5	21.8	21.9	22.4
		101年 6月	25.3	19.3	14.0	33.7	24.5	18.5	260.0	21.0	20.2	19.1	20.1	21.3
	去年	100年 1月	29.2	25.8	26.4	31.1	52.0	23.3	285	19.5	28.5	20.4	26.7	29.2
		100年 2月	24.9	21.6	24.0	33.1	44.1	22.4	259	19.9	22.6	19.1	23.6	25.8
		100年 3月	25.3	21.6	24.2	31.6	40.4	22.4	28	19.3	23.6	20.3	23.3	25.9
		100年 4月	26.7	22.8	25.1	32.7	31.7	24	324	20.4	23.5	20.9	24.8	27.1
		100年 5月	24.7	21.3	23.9	31.1	30.2	22.6	303	19.1	23.3	20	23.8	25.5
		100年 6月	27	23.1	26.2	32.8	30.4	23.6	355	20.4	24.7	21	23.7	25.4
		100年 7月	24.9	21.0	24.6	33.5	29.6	21.8	270	20.5	24.1	20.7	21.6	23.8
		100年 8月	27.3	23.6	25.8	32.7	31.8	25.1	266	21.1	25.6	21.7	23.8	24.4
		100年 9月	25.1	21.5	19.9	30.6	27.8	23.7	268	19.8	23.9	23.5	24.0	26.5
		100年10月	28.4	20.8	33.2	34.2	29.0	28.7	270	21.6	29.9	21.2	24.9	31.5
		100年11月	28.2	23.5	33.3	34.4	25.2	29.8	238	23.2	27.0	21.6	24.6	29.6
		100年12月	25.6	21.5	14.7	32.1	27.0	22.3	220.0	20.0	23.0	21.3	21.3	21.4
	歷年	82 年平均	-	18.7	30.2	35.8	-	20.9	284.3	15.8	17.4	17.4	23.9	-
		83 年平均	-	43.5	55.7	41.8	-	27.3	266.2	16.5	18.5	18.5	25.1	-
		84 年平均	-	20.4	32.3	46.6	-	30.9	265.8	16.9	21.2	24.1	25.9	-
		85 年平均	-	31.3	41.7	40.0	-	28.5	88.5	17.2	22.3	29.1	23.5	-
		86 年平均	-	22.9	34.3	44.4	-	28.5	358.5	18.4	24.1	29.7	23.5	-
		87 年平均	-	13.5	22.4	44.2	-	21.7	322.1	20.8	25.2	31.1	23.7	-
		88 年平均	-	19.3	25.5	37.9	-	17.4	484.2	28.0	23.8	28.1	26.4	-
		89 年平均	27.3	15.3	29.7	26.4	-	19.7	409	18.8	20.7	25.5	25.8	-
		90 年平均	26.2	19.2	24.4	25.2	-	17.8	411.0	18.6	20.2	22.1	24.1	-
		91 年平均	27.1	26.0	28.3	26.3	33.2	20.6	350.1	20.2	21.8	22.4	25.3	50.5
		92 年平均	45.4	23.3	25.4	27.7	32.7	21.8	309.4	19.0	20.2	21.2	34.5	56.2
		93 年平均	25.8	23.8	32.2	28.8	36.2	26.4	177.6	73.6	20.5	19.8	27.4	57.4
		94 年平均	26.8	28.2	56.0	31.3	52.0	27.4	219.0	20.9	22.7	30.0	26.5	59.4
		95 年平均	32.0	31.7	43.6	41.1	33.9	25.9	65.9	26.2	28.3	20.4	31.5	37.6
		96 年平均	24.6	22.5	22.4	28.8	32.4	19.6	52.8	18.7	23.7	17.5	25.8	30.0
		97 年平均	40.4	26.1	61.1	29	38.6	23	98.6	17.8	22.4	16.6	23.5	26.9
		98 年平均	25.2	24.5	55.2	27.2	34.4	27.7	294.3	19.5	25.1	18.7	25.6	27.4
		99 年平均	25.6	24.0	30.9	31.7	35.0	90.8	201.5	21.5	23.9	21.0	24.8	26.1
		100 年平均	26.4	22.3	25.1	32.5	33.3	24.1	257.2	20.4	25.0	21.0	23.8	26.3
	核四環評平均測值		-	18.9	19.0	52.1	-	19.3	19.8	166.5	20.2	26	27.1	-

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。
2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-32 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季生化需氧量監測結果表

監測井 / 水質項目	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
生化需氧量 (mg/L)	本季	101年 4月	<1.0	<1.0	2.7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	<1.0
		101年 5月	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
		101年 6月	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	去年	100年 1月	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	<1.0
		100年 2月	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	2.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	<1.0	<1.0
		100年 3月	<1.0	2.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0
		100年 4月	1.0	1.3	<1.0	1.1	<1.0	1.3	1.9	2.3	<1.0	1.8	<1.0	3.3
		100年 5月	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.7	3.1	1.2	<1.0	1.6	<1.0	<1.0	<1.0
		100年 6月	<1.0	<1.0	1.3	<1.0	<1.0	1.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
		100年 7月	3.4	1.5	1.1	<1.0	<1.0	2.4	1.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1
		100年 8月	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
		100年 9月	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
		100年10月	<1.0	1.9	1.3	<1.0	1.5	<1.0	1.0	<1.0	1.8	<1.0	<1.0	<1.0
		100年11月	2.1	2.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
		100年12月	<1.0	3.0	<1.0	<1.0	2.1	1.2	1.3	2.6	1.3	<1.0	<1.0	<1.0
	歷年	82 年平均	-	0.3	0.3	0.4	-	0.2	0.6	0.1	0.4	0.5	0.7	-
		83 年平均	-	0.3	0.5	0.2	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	1.0	-
		84 年平均	-	0.2	0.3	0.4	-	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	1.2	-
		85 年平均	-	0.8	0.8	0.9	-	0.8	1.0	0.7	1.0	0.9	2.2	-
		86 年平均	-	0.8	0.7	0.6	-	0.9	0.7	1.3	1.2	0.9	2.4	-
		87 年平均	-	1.2	1.1	1.6	-	1.0	1.0	1.8	1.2	1.1	1.5	-
		88 年平均	-	0.5	0.7	0.6	-	0.6	0.6	0.9	0.9	0.6	0.9	-
		89 年平均	2.2	5.1	5.4	0.5	-	10.2	0.9	2.5	3.9	3.3	1.3	-
		90 年平均	0.5	0.5	0.5	0.6	-	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	-
		91 年平均	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1
		92 年平均	ND	1.0	0.7	0.8	1.4	0.6	1.3	1.0	0.7	0.7	ND	0.6
		93 年平均	1.0	1.3	0.9	1.3	1.3	1.1	2.0	0.9	1.4	1.3	1.4	1.8
		94 年平均	1.5	1.7	1.1	2.1	2.3	0.8	1.6	1.2	1.4	1.5	1.4	2.1
		95年平均	0.7	1.5	1.0	0.8	2.1	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.9
		96年平均	0.8	1.7	0.5	0.7	2.0	0.7	1.7	1.5	1.2	0.5	0.5	0.5
		97年平均	1.3	2.4	1.3	2.1	2.5	1.2	1.0	2.0	1.2	2.5	1.4	1
		98年平均	0.6	0.9	0.6	0.7	0.5	0.5	1.0	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6
		99 年平均	0.9	1.0	1.4	0.7	1.5	0.8	1.0	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6
		100 年平均	0.9	1.3	0.7	0.6	1.7	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.5	0.9
	核四環評平均測值		-	1.9	1.9	1.7	-	2.9	1.8	1.9	2.2	1.6	2.5	-

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-33 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季化學需氧量監測結果表

水質項目＼監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
化學需氧量 (mg/L)	本季	101年 4月	7.0	2.8	4.1	ND	2.7	4.9	2.1	ND	1.9	10.9	3.2	ND
		101年 5月	ND	4.4	ND	4.9	3.1	ND	8.3	ND	3.3	ND	4.0	3.5
		101年 6月	ND	5.9	2.9	ND	7.1	3.4	3.7	ND	7.4	ND	ND	ND
	去年	100年 1月	4.2	3.9	5.7	ND	65.5	3.1	2.2	2.9	5.5	19.1	7.1	4.4
		100年 2月	ND	4.4	3.0	4.7	23.8	3.1	7.6	2.0	2.2	12.4	4.4	3.8
		100年 3月	2.5	2.9	2.5	3.3	8.5	3.7	5.4	4.1	2.2	7.8	2.8	3.8
		100年 4月	ND	2.0	5.9	ND	7.0	ND	8.6	3.2	ND	7.8	ND	7.0
		100年 5月	3.2	5.0	ND	2.8	4.8	5.2	2.6	3.4	2.4	7.7	2.4	ND
		100年 6月	ND	2.6	4.5	ND	2.4	2.9	6	ND	2.8	3.7	2.2	2.8
		100年 7月	6.5	5.8	4.7	2.8	3.7	6.4	9.7	2.6	2.2	9.9	ND	3.6
		100年 8月	ND	3.4	3.4	ND	4.3	6.7	2.7	ND	ND	ND	ND	2.5
		100年 9月	2.2	2.2	7.4	ND	7.4	3.6	2.5	2.5	4.0	10.4	3.1	ND
		100年10月	3.3	4.1	6.1	5.0	13.2	3.7	8.5	11.1	7.7	3.7	2.3	2.8
		100年11月	3.7	3.2	5.8	ND	ND	ND	3.3	3.0	ND	ND	ND	2.4
		100年12月	ND	4.5	6.2	ND	8.3	2.1	4.0	5.3	5.9	3.3	ND	2.7
	歷年	82 年平均	-	4.6	14.2	8.4	-	5.8	5.8	4.0	9.8	7.0	9.4	-
		83 年平均	-	5.8	6.2	4.0	-	4.8	3.8	3.8	3.2	5.6	12.2	-
		84 年平均	-	5.0	4.9	4.2	-	7.5	9.7	3.6	6.5	5.5	4.6	-
		85 年平均	-	4.7	7.7	5.7	-	9.9	5.9	8.0	5.5	7.0	4.7	-
		86 年平均	-	4.6	6.8	2.2	-	5.1	11.5	4.5	3.2	5.0	5.2	-
		87 年平均	-	7.9	8.9	5.9	-	5.0	11.8	17.1	5.6	6.1	5.1	-
		88 年平均	-	4.6	3.5	4.5	-	6.6	13.0	3.6	4.5	7.5	3.9	-
		89 年平均	1.9	1.8	1.3	2.4	-	2.2	6.1	2.2	2.6	1.8	3.0	-
		90 年平均	3.6	2.8	3.0	3.8	-	2.4	7.4	2.8	3.0	2.4	3.4	-
		91 年平均	2.0	5.6	4.0	2.9	16.6	2.3	9.2	2.1	3.0	4.5	3.5	5.2
		92 年平均	2.6	7.1	3.7	2.9	6.3	2.6	7.8	4.4	3.9	2.7	2.9	3.6
		93 年平均	1.4	4.2	4.3	3.7	5.8	2.6	7.0	2.5	4.8	5.0	5.1	4.9
		94 年平均	2.9	8.4	4.6	6.3	9.6	2.8	8.1	3.4	4.6	4.2	3.2	6.2
		95年平均	3.8	7.0	5.5	6.5	11.4	5.8	5.3	5.1	5.5	4.4	3.8	3.7
		96年平均	5.2	9.2	3.7	5.2	9.5	4.4	5.6	7.8	8.0	5.5	4.5	5.2
		97 年平均	7.5	12.9	6.5	9.5	11.8	5.7	5.8	9.6	6.7	11.7	7.3	5.3
		98 年平均	2.4	3.7	2.5	2.6	3.9	3.2	5.4	3.7	4.4	4.1	2.2	4.1
		99 年平均	2.5	4.9	3.4	2.0	12.5	3.1	7.5	2.8	5.0	3.9	1.1	2.2
		100 年平均	2.6	3.7	4.7	2.1	5.8	3.5	5.3	3.5	3.2	7.3	2.4	3.2
	核四環評平均測值		-	8.8	8.4	-	12.5	10.6	11.6	11.9	9.9	11.8	11.1	-

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-34 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季氨氮監測結果表

水質項目 \ 監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
氨　氮 (mg/L)	本季	101年 4月	0.01	0.67	ND	0.01	ND	ND	0.04	0.03	ND	ND	0.17	0.21
		101年 5月	0.02	0.76	0.01	0.03	0.02	ND	0.17	ND	ND	ND	0.21	0.18
		101年 6月	0.02	0.84	ND	ND	0.01	0.03	0.14	ND	0.02	0.03	0.22	0.24
	去年	100年 1月	0.02	0.62	0.21	ND	0.64	ND	0.12	ND	0.02	0.02	0.16	0.14
		100年 2月	0.02	0.48	0.02	ND	0.57	ND	0.14	ND	0.02	ND	0.19	0.15
		100年 3月	0.02	0.54	ND	ND	0.56	0.01	0.11	0.01	ND	0.01	0.23	0.15
		100年 4月	0.03	0.55	ND	ND	0.34	ND	0.19	ND	ND	ND	0.24	0.18
		100年 5月	0.04	0.42	0.02	0.01	0.23	0.01	0.15	0.01	0.02	0.02	0.25	0.19
		100年 6月	0.03	0.51	0.03	0.01	0.16	0.02	0.16	0.02	0.03	0.01	0.17	0.15
		100年 7月	0.04	0.64	0.02	0.04	0.18	0.02	0.20	0.02	0.02	0.04	0.18	0.20
		100年 8月	0.04	0.71	0.02	ND	0.20	0.03	0.19	0.02	0.01	0.02	0.16	0.21
		100年 9月	0.05	0.49	0.03	ND	0.14	0.01	0.18	0.03	0.02	0.02	0.16	0.20
		100年10月	ND	0.49	0.01	ND	0.05	ND	0.17	0.01	0.02	0.02	0.20	0.17
		100年11月	0.03	0.56	0.02	ND	0.05	ND	0.12	0.02	ND	0.02	0.26	0.17
		100年12月	0.03	0.64	0.01	ND	0.03	ND	0.14	0.02	ND	0.03	0.21	0.12
	歷年	82 年平均	-	0.06	0.14	0.07	-	0.03	0.46	0.06	0.07	0.04	0.50	-
		83 年平均	-	0.02	0.04	0.05	-	0.02	0.49	0.03	0.03	0.03	0.48	-
		84 年平均	-	0.04	0.06	0.05	-	0.05	0.35	0.05	0.04	0.05	0.34	-
		85 年平均	-	0.15	0.07	0.11	-	0.16	0.13	0.09	0.09	0.16	0.28	-
		86 年平均	-	0.07	0.05	0.13	-	0.04	0.37	0.05	0.04	0.07	0.32	-
		87 年平均	-	0.10	0.11	0.08	-	0.06	0.24	0.09	0.06	0.06	0.35	-
		88 年平均	-	0.11	0.04	0.09	-	0.04	0.31	0.11	0.07	0.05	0.36	-
		89 年平均	0.10	0.04	0.06	0.06	-	0.08	0.31	0.05	0.05	0.04	0.37	-
		90 年平均	0.07	0.08	0.07	0.08	-	0.07	0.27	0.05	0.05	0.07	0.33	-
		91 年平均	0.05	0.18	0.05	0.07	0.73	0.05	0.24	0.04	0.05	0.05	0.10	0.19
		92 年平均	0.07	0.50	0.05	0.04	0.43	0.05	0.22	0.04	0.04	0.11	0.09	0.22
		93 年平均	0.07	0.68	0.10	0.06	0.50	0.07	0.14	0.09	0.06	0.07	0.28	0.31
		94 年平均	0.05	0.48	0.06	0.08	0.38	0.05	0.17	0.08	0.05	0.06	0.24	0.19
		95年平均	0.01	0.82	0.02	0.08	0.08	0.02	0.03	0.03	0.06	0.01	0.09	0.34
		96年平均	0.07	1.08	0.03	0.17	0.19	0.03	0.03	0.04	0.07	0.04	0.17	0.28
		97年平均	0.04	1.03	0.01	0.01	0.16	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.15	0.26
		98年平均	0.04	1.03	0.01	0.01	0.16	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.15	0.26
		99 年平均	0.07	0.68	0.46	0.23	0.50	0.22	0.18	0.22	0.26	0.18	0.21	0.18
		100 年平均	0.03	0.55	0.03	0.01	0.26	0.01	0.16	0.01	0.02	0.02	0.20	0.17

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-35 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季總有機碳監測結果表

水質項目＼監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
總有機碳 (mg/L)	本季	101年 4月	0.6	0.8	1.4	0.4	0.6	0.9	0.6	0.9	0.3	0.5	0.3	0.5
		101年 5月	0.2	0.8	1.3	0.5	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	0.7	0.2	0.6
		101年 6月	0.3	0.9	1.2	0.2	1.0	0.7	0.4	0.3	1.1	0.8	0.1	0.9
	去年	100年 1月	0.3	0.9	0.9	0.4	14	0.9	0.4	1.1	1.6	4.2	0.7	0.6
		100年 2月	0.6	1.0	0.8	0.6	5.2	1.0	0.4	0.7	1.0	1.3	0.4	0.9
		100年 3月	0.2	1.2	0.6	0.8	3.4	0.2	0.8	0.8	0.8	3.5	2.6	1.1
		100年 4月	1.1	1.0	1.0	0.7	3.6	3.3	1.8	2.0	1.0	1.5	0.4	1.7
		100年 5月	0.7	3.4	1.0	0.4	1.5	3.5	0.3	0.5	0.7	1.8	3.3	0.9
		100年 6月	0.5	0.8	1.7	0.2	1.0	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6
		100年 7月	2.7	0.8	1.2	1.0	0.6	1.2	1.1	0.6	0.6	1.1	0.2	0.5
		100年 8月	0.5	0.6	0.7	0.4	0.8	1.4	0.5	0.5	0.9	0.3	0.3	1.0
		100年 9月	0.6	0.8	1.1	0.4	1.5	0.7	0.3	0.8	1.1	1.2	0.7	0.9
		100年10月	0.8	1.1	1.8	0.7	1.7	0.5	1.2	1.4	1.3	0.5	0.4	0.6
		100年11月	0.8	0.8	1.6	0.3	0.9	0.2	0.2	1.1	0.6	0.5	0.2	0.5
		100年12月	0.5	1.2	2.3	0.3	1.3	0.8	0.4	1.2	0.9	0.6	0.3	0.9
	歷年	82 年平均	-	0.75	0.57	0.69	-	0.74	0.9	0.61	0.57	0.76	1.08	-
		83 年平均	-	0.68	0.51	0.58	-	0.45	0.48	0.56	0.64	0.78	1.05	-
		84 年平均	-	0.87	0.73	1.08	-	0.66	0.8	0.7	0.7	0.88	1.79	-
		85 年平均	-	0.62	0.39	0.60	-	0.54	0.67	0.59	0.41	0.47	0.73	-
		86 年平均	-	0.75	0.57	0.65	-	0.31	0.42	0.49	0.44	0.54	0.74	-
		87 年平均	-	1.82	1.94	2.25	-	0.93	1.44	2.91	1.73	1.07	1.59	-
		88 年平均	-	1.11	0.72	1.20	-	0.79	0.65	0.78	0.63	0.87	0.92	-
		89 年平均	0.82	0.79	1.21	1.51	-	0.79	1.02	0.92	0.69	0.59	1.68	-
		90 年平均	0.88	1.03	1.03	1.40	-	0.79	6.00	1.45	5.19	1.20	1.93	-
		91 年平均	1.76	1.78	0.95	1.19	2.44	1.05	1.18	1.81	1.91	1.49	1.59	2.12
		92 年平均	1.13	2.43	1.02	1.23	2.31	1.07	1.71	1.99	1.43	1.81	1.93	2.36
		93 年平均	0.81	1.55	1.02	0.94	2.14	0.71	1.08	1.04	0.98	1.26	1.34	1.49
		94 年平均	1.93	2.63	2.30	2.47	4.04	1.90	2.45	2.27	2.62	2.21	2.53	2.64
		95年平均	2.02	3.40	2.12	3.32	5.48	2.56	2.60	2.51	2.85	2.25	2.74	2.67
		96年平均	1.93	3.34	1.73	1.95	3.90	2.03	2.25	2.07	2.27	1.77	1.92	1.89
		97 年平均	1.81	3.33	1.44	1.14	2.77	0.90	1.15	1.88	1.64	1.12	0.95	1.17
		98 年平均	0.6	1.0	0.8	0.6	1.4	1.1	0.6	0.7	0.9	0.8	0.6	0.9
		99 年平均	0.55	1.69	1.70	0.75	4.48	1.73	1.24	1.03	1.46	0.91	0.74	1.05
		100 年平均	0.8	1.1	1.2	0.5	3.0	1.2	0.7	0.9	0.9	1.4	0.8	0.9

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-36 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季總硬度監測結果表

水質項目 \ 監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
總硬度 (mg/L)	本季	101年 4月	56.3	159	204	140	118	18.1	243	75.2	89.7	48.8	158	324
		101年 5月	60.8	155	192	68.8	128	16.6	302	55.3	48.0	26.8	146	345
		101年 6月	61.5	154	214	117	102	20.2	301	66.9	33.5	31.8	154	354
	去年	100年 1月	60.8	200	189	121	130	24.1	299	74.1	45.6	20.4	186	354
		100年 2月	70.8	171	192	129	129	42.9	315	93.8	43.3	46.9	179	374
		100年 3月	74.6	188	196	146	118	32.9	326	94.6	93.8	54.5	176	371
		100年 4月	61.0	166	173	130	105	19.6	320	76.8	75.2	49.1	123	338
		100年 5月	58.9	70.7	195	154	108	21.2	316	91.9	110	47.9	127	313
		100年 6月	64.5	180	199	132	114	20.2	331	69.7	88.3	42.5	144	344
		100年 7月	63.2	154	203	138	114	25.7	321	96.0	89.7	56.3	170	330
		100年 8月	61.5	159	205	154	97.4	71.1	295	87.8	106	51.9	145	328
		100年 9月	59.2	148	196	191	244	33.8	289	139	124	45.9	197	333
		100年10月	63.7	161	218	117	493	31.6	287	24.1	17.5	14.1	176	368
		100年11月	68.0	160	196	95.7	179	22.7	256	22.3	17.9	14.1	136	409
		100年12月	63.6	171	147	106	107	18.0	310	56.2	21.1	16.4	150	353
	歷年	82 年平均	-	58.8	41.0	140	-	91.4	357	107	82.0	67.8	2625	-
		83 年平均	-	72.3	46.4	1343	-	48.2	379	100	79.3	67.2	82.9	-
		84 年平均	-	48.6	27.8	207	-	33.5	371	100	56.7	57.7	49.6	-
		85 年平均	-	48.6	35.7	224	-	41.5	242	96.0	59.0	52.6	23.4	-
		86 年平均	-	51.1	27.7	246	-	35.2	516	103	53.4	33.7	36.3	-
		87 年平均	-	37.8	30.8	245	-	28.5	416	75.0	59.6	39.4	39.5	-
		88 年平均	-	47.8	27.6	285	-	26.2	649	61.0	48.0	34.2	54.1	-
		89 年平均	55.4	38.3	29.2	234	-	16.7	463	125	32.5	26.4	19.7	-
		90 年平均	57.8	42.2	27.2	192	-	23.2	479	171	37.7	33.5	85.7	-
		91 年平均	54.7	101	142	200	126	25.5	480	153	39.6	32.1	167	346
		92 年平均	53	166	507	134	148	24	381	151	36	36	204	380
		93 年平均	60.1	175.4	570.6	130.5	134.2	54.6	300.3	137.3	61.6	41.8	172.3	364.9
		94 年平均	65.0	153	444	116	120	46.2	295	51.3	30.9	42.4	164	348
		95年平均	63.5	134.5	288.1	122.8	90.6	24.4	233.8	38.9	25.3	33.4	163	255
		96年平均	72.0	117	273	120	86.6	23.7	219	36.5	30.2	44.5	84.5	265
		97 年平均	69.7	118.5	285.2	106.8	87.4	27.4	228.8	40.6	39.7	33.2	90.8	283.9
		98 年平均	70.2	154	315	140	109	47.7	335	79.3	75.8	44.6	172	366
		99 年平均	71.8	173.7	344.3	156.7	111.2	29.5	309.3	82.6	71.4	49.2	158.7	366.1
		100 年平均	64.2	161	192	134	162	30.3	305	77.2	69.4	38.3	159	351

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-37 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季濁度測值監測結果表

水質項目＼監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
濁度 (mg/L)	本季	101年 4月	8.0	5.1	6.0	0.25	9.7	7.9	8.0	5.0	6.1	8.2	4.8	8.0
		101年 5月	2.5	8.1	1.3	9.6	8.6	8.0	0.40	1.0	4.0	4.6	0.70	4.0
		101年 6月	7.6	9.1	3.1	0.30	7.8	9.2	0.65	2.7	2.7	2.9	0.70	5.1
	去年	100年 1月	8.6	9.4	7.6	0.40	8.9	9.6	2.0	1.8	9.1	7.5	6.7	9.4
		100年 2月	9.0	9.2	3.0	9.0	9.1	9.1	3.0	8.7	5.5	9.1	9.1	8.9
		100年 3月	9.4	7.8	0.95	2.1	5.6	9.2	0.80	4.2	9.4	8.4	9.1	4.0
		100年 4月	3.3	8.5	2.4	0.55	30	7.1	0.90	6.2	1.8	6.5	8.9	6.6
		100年 5月	6.9	8.9	4.1	0.95	14	8.6	0.60	9.9	2.2	8.6	8.8	8.5
		100年 6月	6.7	1.9	0.50	0.40	7.4	9.2	0.40	1.7	7.2	9.0	7.3	3.0
		100年 7月	5.9	3.2	1.0	0.60	25	8.9	0.70	5.3	3.2	3.3	1.5	13
		100年 8月	4.3	7.6	2.7	0.30	9.0	9.5	0.80	9.0	4.3	3.8	3.0	3.5
		100年 9月	2.0	1.8	3.1	1.1	36	20	1.0	4.8	12	9.4	3.1	9.7
		100年10月	2.8	8.4	2.0	1.5	8.8	7.2	0.15	5.7	3.4	8.8	2.9	8.9
		100年11月	3.9	3.8	1.4	1.6	3.5	0.70	0.50	8.0	6.4	3.3	4.6	8.7
		100年12月	8.6	2.0	1.1	1.2	9.4	9.4	0.15	2.7	9.3	9.4	4.7	2.0
	歷年	83 年平均	-	15.3	54.2	5.3	-	23.6	7.5	28.6	9.7	28.4	87.1	-
		84 年平均	-	8.6	72.9	16.2	-	166.4	25.3	21.9	6.8	6.4	28.8	-
		85 年平均	-	17.8	68.7	6.7	-	51.1	25.1	19.9	14.9	4.2	137.9	-
		86 年平均	-	18.5	175.0	18.0	-	14.9	4.2	27.1	6.4	7.0	12.0	-
		87 年平均	-	33.7	360.8	8.3	-	22.5	11.0	346.3	11.4	5.6	25.6	-
		88 年平均	-	23.3	21.5	8.9	-	37.2	1.5	31.6	7.4	4.9	9.7	-
		89 年平均	12.6	12.0	16.0	4.9	-	30.6	1.9	14.3	6.8	3.4	2.8	-
		90 年平均	15.2	10.3	90.8	6.4	-	33.6	9.5	3.0	13.6	4.5	3.8	-
		91 年平均	12.8	49.5	150	7.8	140	16.0	1.7	2.7	7.9	4.2	13.8	120
		92 年平均	11.0	67.7	29.9	24.6	25.9	10.2	1.2	13.7	8.9	3.0	9.3	27.5
		93 年平均	8.47	11.90	3.52	0.51	2.83	1.08	0.42	0.41	4.89	3.55	1.53	2.60
		94 年平均	1.20	10.50	4.39	1.33	0.56	2.15	0.79	0.55	0.52	0.60	0.98	1.02
		95年平均	0.61	0.61	0.56	0.60	0.63	0.55	0.57	0.63	0.61	0.63	0.62	0.59
		96年平均	0.56	0.58	0.56	0.53	0.54	0.54	0.55	0.56	0.56	0.54	0.52	0.56
		97 年平均	0.54	0.55	0.54	0.53	0.53	0.54	0.53	0.55	0.54	0.52	0.823	0.56
		98 年平均	0.52	0.53	0.53	0.51	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.54	0.53
		99 年平均	7.38	8.72	3.37	0.98	4.79	7.08	1.60	5.83	6.83	7.33	3.35	6.84
		100 年平均	6.0	6.0	2.5	1.6	14	9.0	0.92	5.7	6.2	7.3	5.8	7.2

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。
2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-38 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季懸浮固體測值監測結果表

水質項目＼監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
懸浮固體 (mg/L)	本季	101年 4月	8.2	5.4	6.2	<1.0	9.8	8.1	8.4	5.2	9.7	9.0	5.6	8.6
		101年 5月	2.6	8.8	2.2	9.8	8.9	8.3	<1.0	1.1	4.2	6.8	<1.0	4.2
		101年 6月	8.4	9.6	6.2	<1.0	8.8	9.7	<1.0	2.8	4.2	4.0	<1.0	5.5
	去年	100年 1月	9.7	9.6	9.1	<1.0	9.7	9.4	2.3	1.6	9.3	9.4	7.8	9.7
		100年 2月	9.1	9.3	5.2	9.4	6.3	9.3	2.4	9.0	5.4	9.6	9.4	9.5
		100年 3月	9.5	8.2	1.8	2.2	9.4	9.4	1.9	4.7	9.7	9.1	9.4	4.5
		100年 4月	3.6	9.0	3.6	<1.0	9.8	8.8	1.0	6.4	2.0	7.3	9.2	7.1
		100年 5月	1.8	9.1	1	<1.0	6.5	9.3	<1.0	3.8	1.8	9.2	9.4	2.9
		100年 6月	7.3	2.2	<1.0	<1.0	9.4	9.7	<1.0	2.7	7.5	9.4	7.9	3.2
		100年 7月	6.2	3.4	2.6	<1.0	9.8	9.4	<1.0	4.0	4.8	5.8	1.2	3.0
		100年 8月	4.5	8.9	3.6	<1.0	9.7	9.8	1.0	9.7	6.2	6.8	2.5	3.9
		100年 9月	2.2	2.4	5.0	2.7	9.7	9.9	1.5	5.9	9.7	8.6	3.5	9.9
		100年10月	3.7	7.9	2.1	1.8	9.6	7.8	<1.0	7.9	4.5	9.6	3.4	9.1
		100年11月	3.0	2.8	3.1	<1.0	9.6	<1.0	<1.0	8.4	9.8	4.3	2.7	4.4
		100年12月	9.6	1.9	1.6	4.4	9.8	9.7	<1.0	3.9	9.6	9.8	5.0	2.2
	歷年	83 年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		84 年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85 年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		86 年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		87 年平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		88 年平均	-	-	16.8	-	-	47.8	8.8	19.3	6.0	3.5	8.9	-
		89 年平均	10.7	-	33.3	-	-	31.8	0.5	25.2	11.2	5.0	2.4	-
		90 年平均	5.9	-	100	-	-	55.0	10.8	7.9	22.7	8.0	5.3	-
		91 年平均	8.9	83.3	57.6	21.4	273	23.2	2.8	6.4	16.6	8.8	28.7	201
		92 年平均	7.3	50.2	41.6	59.0	37.0	18.0	0.8	17.6	9.4	2.7	10.2	21.3
		93 年平均	2.5	2.1	2.7	0.6	0.7	2.1	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	1.0
		94 年平均	1.0	8.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.9
		95年平均	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		96年平均	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	4.1
		97 年平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		98 年平均	4.3	4.0	0.5	1.2	3.2	6.8	0.9	4.8	2.9	7.8	2.8	4.7
		99 年平均	7.4	8.3	2.3	1.8	7.0	8.5	1.2	6.1	7.6	9.0	4.6	6.2
		100 年平均	5.9	6.2	3.5	4.1	9.1	9.3	1.7	5.7	6.7	8.2	6.0	5.8

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。
2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-39 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季鐵監測結果表

水質項目＼監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
鐵 (mg/L)	本季	101年 4月	0.877	2.310	0.024	0.032	0.040	0.045	0.034	0.026	0.039	0.041	0.033	0.403
		101年 5月	0.969	1.410	0.030	0.031	0.037	0.195	0.017	0.031.	0.038	0.051	0.023	0.596
		101年 6月	1.010	2.740	ND	0.021	ND	0.055	0.029	0.026	0.108	0.028	0.029	0.047
	去年	100年 1月	0.499	2.05	0.025	0.050	1.200	0.049	0.054	0.033	0.076	0.148	0.039	0.275
		100年 2月	0.564	1.94	0.019	0.058	0.148	0.018	0.041	0.061	0.022	0.118	0.058	0.622
		100年 3月	0.881	1.96	0.034	0.053	0.220	0.045	0.060	0.037	0.059	0.100	0.108	0.931
		100年 4月	0.956	2.20	0.037	0.046	0.032	0.045	0.055	0.052	0.028	0.124	0.041	0.381
		100年 5月	0.908	1.97	0.041	0.041	0.061	0.042	0.072	0.048	0.039	0.057	0.039	0.579
		100年 6月	0.815	2.01	0.032	0.037	0.110	0.048	0.046	0.038	0.064	0.054	0.121	0.314
		100年 7月	1.10	2.08	0.062	0.113	0.112	0.076	0.096	0.073	0.050	0.06 0	0.088	0.173
		100年 8月	0.772	1.94	0.019	0.027	0.041	0.051	0.032	0.030	0.021	ND	0.025	0.353
		100年 9月	1.04	2.27	0.029	0.039	0.030	0.034	0.030	0.050	0.02	0.04 0	0.031	0.085
		100年10月	0.966	2.060	0.031	0.024	0.023	0.061	0.028	0.044	0.022	0.029	0.048	0.386
		100年11月	1.000	2.430	0.041	0.035	ND	0.061	0.035	0.035	0.036	0.03	0.025	0.063
		100年12月	0.813	2.500	0.017	0.020	0.022	0.082	0.032	0.031	0.031	0.032	0.031	0.537
	歷年	82 年平均	-	0.154	1.158	0.462	0.058	1.374	0.180	0.470	0.760	0.435	1.756	6.265
		83 年平均	-	0.867	2.673	0.628	0.053	2.168	0.196	1.164	0.670	0.654	7.054	8.493
		84 年平均	-	0.143	0.510	0.915	0.061	0.566	0.156	0.847	0.362	0.165	0.545	7.929
		85 年平均	-	0.027	0.021	0.098	0.025	0.054	0.036	0.165	0.052	0.055	0.048	2.833
		86 年平均	0.680	0.048	0.081	0.189	0.039	0.060	0.057	0.189	0.059	0.037	0.064	4.407
		87 年平均	0.312	0.041	0.080	0.139	0.039	0.057	0.060	0.091	0.054	0.051	0.090	2.869
		88 年平均	-	0.040	0.042	0.162	0.013	0.040	0.013	0.281	0.042	0.027	0.039	0.991
		89 年平均	0.413	0.032	0.037	0.083	0.024	0.060	0.041	0.205	0.046	0.033	0.050	1.183
		90 年平均	0.390	0.096	0.034	0.055	0.018	0.053	0.100	0.168	0.072	0.069	0.071	1.110
		91 年平均	0.761	1.171	0.215	0.185	0.074	0.077	0.089	0.086	0.142	0.067	0.217	0.740
		92 年平均	0.350	1.478	0.023	0.024	0.283	0.041	0.027	0.068	0.059	0.034	0.044	0.306
		93 年平均	1.032	3.817	0.325	0.194	1.515	0.357	0.264	0.734	0.627	0.415	0.221	1.659
		94 年平均	0.629	2.690	0.057	0.064	1.033	0.101	0.055	0.094	0.148	0.102	0.052	0.821
		95年平均	0.363	0.753	0.093	0.372	0.951	0.105	0.068	0.050	0.040	0.039	0.144	0.318
		96年平均	0.205	0.406	0.083	0.107	0.343	0.045	0.052	0.062	0.048	0.035	0.020	0.069
		97 年平均	0.346	0.822	0.045	0.025	0.057	0.025	0.033	0.064	0.041	0.034	0.016	0.157
		98 年平均	0.763	2.168	0.037	0.042	0.343	0.113	0.049	0.053	0.041	0.051	0.108	0.606
		99 年平均	0.854	2.063	0.049	0.082	0.308	0.086	0.097	0.073	0.084	0.084	0.062	0.513
		100 年平均	0.860	2.118	0.032	0.045	0.167	0.051	0.048	0.044	0.039	0.070	0.055	0.392

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。
2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表 3.1-40 核四施工環境監測地下水水質歷年與本季錳測值監測結果表

水質項目＼監測井	監測時間		GM2	GM3-1	GM6-1	P5-1	P8-1'	GM9	GM10	GM11	GM12	GM13	GM7	GM14-1
錳 (mg/L)	本季	101年 4月	0.133	3.900	0.004	0.018	0.018	0.010	0.032	0.242	0.138	0.011	0.008	0.046
		101年 5月	0.130	3.170	ND	0.009	0.039	0.003	0.011	0.189	0.073	0.016	0.006	0.056
		101年 6月	0.129	4.060	ND	0.010	0.089	0.002	0.012	0.195	0.061	0.022	0.007	0.039
	去年	100年 1月	0.129	3.47	0.019	0.050	0.451	0.004	0.02	0.242	0.057	0.034	0.008	0.061
		100年 2月	0.125	3.07	0.004	0.024	0.388	0.005	0.015	0.223	0.071	0.018	0.007	0.063
		100年 3月	0.133	3.77	0.003	0.046	0.290	0.003	0.016	0.240	0.122	0.017	0.009	0.064
		100年 4月	0.142	3.52	0.004	0.030	0.367	0.008	0.018	0.242	0.121	0.015	0.009	0.060
		100年 5月	0.139	3.33	0.005	0.028	0.384	0.005	0.017	0.296	0.188	0.011	0.011	0.053
		100年 6月	0.132	3.25	ND	0.027	0.491	0.004	0.016	0.232	0.132	0.012	0.008	0.058
		100年 7月	0.140	3.70	0.004	0.038	0.314	0.007	0.017	0.294	0.131	0.01	0.013	0.044
		100年 8月	0.139	3.59	0.005	0.043	0.374	0.003	0.015	0.301	0.163	0.00	0.01	0.038
		100年 9月	0.134	3.78	0.01	0.037	0.550	ND	0.014	0.314	0.221	0.00	0.013	0.037
		100年10月	0.134	3.530	0.009	0.013	0.236	0.004	0.013	0.067	0.053	0.027	0.011	0.055
		100年11月	0.130	3.780	ND	0.009	0.139	0.009	0.012	0.033	0.048	0.028	0.006	0.072
		100年12月	0.136	3.730	ND	0.012	0.087	0.006	0.012	0.175	0.050	0.034	0.006	0.071
	歷年	82 年平均	-	0.034	0.078	0.022	0.004	0.216	0.036	0.258	0.173	0.145	0.056	0.135
		83 年平均	-	0.034	0.044	0.028	0.001	0.079	0.040	0.310	0.166	0.126	0.114	0.170
		84 年平均	-	0.010	0.012	0.030	0.007	0.018	0.065	0.232	0.140	0.037	0.025	0.164
		85 年平均	-	0.007	0.009	0.027	0.011	0..014	0.015	0.209	0.124	0.007	0.005	0.161
		86 年平均	0.170	0.011	0.010	0.039	0.006	0.015	0.038	0.284	0.122	0.043	0.045	0.178
		87 年平均	0.137	0.016	0.021	0.038	0.004	0.011	0.032	0.173	0.094	0.040	0.022	0.145
		88 年平均	-	0.037	0.018	0.036	0.002	0.011	0.044	0.166	0.082	0.031	0.024	0.138
		89 年平均	-	0.017	0.017	0.043	0.005	0.005	0.032	0.201	0.044	0.029	0.017	0.152
		90 年平均	0.135	0.051	0.018	0.025	0.005	0.006	0.044	0.070	0.061	0.032	0.021	0.160
		91 年平均	0.132	0.046	1.790	0.146	0.151	0.008	0.032	0.035	0.060	0.021	0.035	0.074
		92 年平均	0.121	2.460	0.032	0.057	0.428	0.008	0.023	0.060	0.056	0.033	0.013	0.052
		93 年平均	0.102	2.738	0.031	0.064	0.333	0.010	0.036	0.219	0.075	0.079	0.011	0.044
		94 年平均	0.117	2.338	0.012	0.061	0.424	0.010	0.016	0.167	0.019	0.037	0.013	0.039
		95年平均	0.118	4.188	0.009	0.162	0.323	0.009	0.011	0.203	0.039	0.010	0.009	0.039
		96年平均	0.108	4.666	0.008	0.108	0.147	0.004	0.028	0.248	0.064	0.015	0.007	0.040
		97 年平均	0.111	4.124	0.005	0.019	0.124	0.005	0.006	0.199	0.064	0.010	0.015	0.042
		98 年平均	0.134	3.900	0.007	0.043	0.170	0.091	0.018	0.257	0.108	0.020	0.015	0.053
		99 年平均	0.159	3.883	0.092	0.066	0.259	0.046	0.019	0.278	0.104	0.015	0.011	0.058
		100 年平均	0.134	3.543	0.007	0.030	0.339	0.005	0.015	0.222	0.113	0.017	0.009	0.056

註：1.核四環評平均測值係摘錄自「核能四廠第 1、2 號機發電計畫環境影響評估報告」（80 年 11 月）；82～100 年平均測值係整理本監測報告歷次測值。

2.GM2 監測井之水位自 89 年 1 月起新增，故無 82~88 年年資料。P8 監測井自 90/4/20 因坍孔暫停監測，而 GM14 監測井因填孔自 91/1/10 廢棄，該兩井自 91/8/27 新井完成後（分別為 P8-1 及 GM14-1）恢復監測。GM3 監測井因設置於私人土地上，於新井 GM3-1 設置完成後於 91/8/27 移至新井進行監測，另 P5-1 監測井設於原 P5 監測井附近，亦於 91/8 起移至新井進行水質監測；GM6 因永久圍籬施工損毀，於原監測井附近設置新井 GM6-1，並於 99/11 移至新井進行監測。地下水 P8-1 監測井因原山坡設置位置坡面滑動，造成監測井毀壞，於原監測井附近設置新井 GM8-1'，並於 100/4 移至新井進行監測。

表3.1-41 核四施工環境101年第2季河域生態比較

生態類別	比較期間	上季(註1)	本季(註1)	去年同季(註	比較結果(註2)
葉綠素*a*含量 (μg/L)	石碇溪	0.35	0.35	0.56	低於去年同季
			0.23	0.23	與去年同季相同
	雙溪	0.27	0.61	0.41	高於去年同季
			0.21	0.47	低於去年同季
附著藻類種類數(註3)	石碇溪	26	30	23	高於去年同季
			43	18	高於去年同季
	雙溪	23	32	38	低於去年同季
			29	28	高於去年同季
浮游植物細胞數平均含量(cells/L)	石碇溪	48,510	42,504	34,892	高於去年同季
			80,608	25,373	高於去年同季
	雙溪	91,520	66,352	67,320	低於去年同季
			78,716	14,667	高於去年同季
浮游動物平均個體量 (ind./m^3)	石碇溪	2,300	4,183	3,267	高於去年同季
			68	17,367	低於去年同季
	雙溪	9,883	7,750	9,917	低於去年同季
			43	38,450	低於去年同季
水生昆蟲 (總隻數)	石碇溪	59	35	35	與去年同季相同
			35	16	高於去年同季
	雙溪	68	56	60	低於去年同季
			85	47	高於去年同季
魚類 (總尾數)	石碇溪	228	173	188	低於去年同季
			178	241	低於去年同季
	雙溪	165	140	130	高於去年同季
			135	98	高於去年同季
甲殼類 (總個體數)	石碇溪	49	62	46	高於去年同季
			46	59	低於去年同季
	雙溪	29	30	44	低於去年同季
			24	24	與去年同季相同
軟體動物類 (總個體數)	石碇溪	92	38	48	低於去年同季
			52	32	高於去年同季
	雙溪	51	36	47	低於去年同季
			27	33	低於去年同季
河域生態綜合分析	與去年同季比較，除了石碇溪在6月份的葉綠素*a*、4月份的水生昆蟲與雙溪6月份的甲殼類調查數量與去年同季相同外，其餘各項生物監測因子與去年同季相較之下，皆有變化。各項生物監測因子中，其中變化較大的是兩溪在6月的浮游植物細胞數含量與浮游動物數量，本季兩溪在6月的浮游植物細胞數含量達到去年同季6月的3倍以上。而本季6月兩溪的浮游動物數量則與此相反，與去年同季6月相較之下，調查數量極低，對此現象應持續進行監測以了解後續變化情形。在其他各項生物監測因子方面，附著藻類、魚類總數、葉綠素*a*含量、水生昆蟲、甲殼類與軟體動物數量雖與去年同季的調查結果有差異，但變化相對較小，可視為於不同調查時間進行調查所產生的生物族群合理變動。一般而言，本季大多數生物監測因子與去年同季相較之下，雖有變動，然而以長期趨勢來看，監測值應仍屬正常範圍，惟變化較大的浮游植物細胞數含量與浮游動物數量須再持續進行監測。					

註:1.上季為101年2月，本季101年4月(上欄)及6月(下欄)，去年同季為100年4月(上欄)及6月(下欄)。

2.比較結果係指以本季與去年同季的數值比較為研判標準。

3.附著藻類種類數是選用三個測站所出現種類數最高者為準。

表3.1-42 核四施工環境監測歷年海域水質懸浮固體監測結果

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
82/8	8.6	6.8	7.2	-	13	-	9.3	10.6
82/9	11.3	17.7	11	-	11	-	0.7	12.7
82/10	37.0	26.0	25.0	-	29.5	-	30.5	30.0
82/11	7.8	25.0	14.3	-	19.5	-	24.5	18.3
82/12	28.3	19.5	18.3	-	24.8	-	24.0	25.5
83/1	<1.0	<1.0	<1.0	-	<1.0	-	<1.0	<1.0
83/2	3.8	3.5	2.3	-	2.3	-	2.8	2.5
83/3	2.6	7.5	2.2	-	1.8	-	1.7	3.3
83/4	4.0	4.0	1.5	-	1.0	-	2.5	0.5
83/5	2.3	2.5	3.5	-	3.0	-	2.0	1.8
83/6	1.8	4.8	5.8	-	7.0	-	1.5	2.0
83/7	23.5	20.8	10.0	-	15.0	-	13.0	20.3
83/8	20.0	25.5	22.8	-	20.3	-	21.3	21.3
83/9	22.0	24.3	36.3	-	21.8	-	22.5	22.5
83/10	17.5	10.8	17.5	-	16.0	-	12.8	23.0
83/11	24.8	22.3	21.5	-	23.0	-	24.8	34.5
83/12	18.3	32.3	22.3	-	18.0	-	13.5	23.0
84/1	10.8	49.5	13.5	-	31.5	-	7.8	12.5
84/2	47.0	28.2	23.2	-	26.2	-	30.0	26.5
84/3	27.2	28.9	28.0	-	23.8	-	29.0	30.2
84/4	16.8	19.5	17.5	-	13.8	-	13.2	43.5
84/5	28.5	28.5	27.5	-	26.8	-	21.5	29.2
84/6	19.0	19.2	15.2	-	19.0	-	14.4	18.2
84/7	21.0	21.4	12.0	-	17.2	-	13.2	19.6
84/8	6.3	10.2	6.4	6.5	4.3	8.6	5.6	5.2
84/9	2.0	4.7	2.3	2.9	2.7	4.9	4.6	4.8
84/10	5.2	5.5	<1.0	4.1	5.2	2.8	4.3	7.3
84/11	15.0	9.1	8.7	6.8	5.7	5.6	3.7	5.4
84/12	6.2	4.7	7.3	10.0	9.0	7.9	12.0	12.0
85/1	6.2	3.6	2.3	2.4	2.8	2.7	3.0	4.2
85/2	5.0	8.0	8.0	7.3	6.0	11.0	8.0	7.0
85/3	16.0	17.0	12.0	12.0	9.3	7.2	11.0	7.6
85/4	12.0	9.4	6.2	11.0	7.8	9.1	5.9	6.0
85/5	6.6	9.6	13.0	7.2	6.0	3.9	16.0	10.0
85/6	5.5	7.5	12.0	7.0	5.4	7.6	4.7	7.1
85/7	6.6	7.8	8.7	10.0	7.6	7.8	7.0	8.5
85/8	2.3	3.5	3.1	5.6	10.0	3.4	3.4	5.1
85/9	12.0	28.0	10.0	9.4	8.8	8.9	8.6	7.7
85/10	8.1	12.0	7.9	10.0	9.0	18.0	8.3	8.7
85/11	8.6	4.7	8.5	7.3	2.5	6.6	5.0	12.0
85/12	8.1	10.0	9.9	12.0	7.3	8.6	11.0	9.7
86/1	8.0	12.0	11.0	7.7	7.8	8.6	8.2	11.0
86/2	4.0	6.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0
86/3	11.0	11.0	16.0	16.0	16.0	14.0	16.0	16.0
86/4	14.0	9.2	14.0	8.4	8.3	12.0	8.8	8.2
86/5	7.5	8.2	7.8	7.7	7.4	12.0	7.1	10.0
86/6	8.1	9.1	8.9	7.4	6.5	6.9	5.8	6.0
86/7	4.3	4.9	2.7	4.6	4.6	4.9	3.5	3.4
86/8	6.7	11.0	5.2	11.0	7.2	9.8	3.2	13.0
86/9	13.0	5.9	6.9	5.8	4.8	8.4	8.7	3.3
86/10	6.1	7.9	<1.0	4.4	4.3	4.7	4.1	5.3
86/11	8.6	15.0	33.0	12.0	12.0	5.8	3.6	15.0
86/12	8.7	5.3	12.2	15.6	10.6	11.8	17.8	20.0
87/1	8.2	9.2	8.8	9.1	9.1	10.0	7.6	7.9
87/2	18.0	26.0	27.0	22.0	22.0	24.0	16.0	22.0
87/3	4.2	2.6	4.7	3.4	7.0	4.6	16.0	5.8
87/4	5.0	5.2	5.2	13.0	7.2	11.0	9.0	6.0
87/5	6.1	6.0	11.0	5.9	5.8	7.2	6.7	8.6
87/6	6.2	4.9	7.0	7.0	7.4	6.8	6.6	7.4
87/7	6.6	6.5	7.5	5.8	8.6	7.1	8.0	9.7
87/8	11.3	13.1	7.2	10.1	9.8	9.5	9.1	9.7
87/9	7.8	7.0	8.7	8.5	6.0	7.7	10.2	9.8
87/10	6.3	5.6	3.1	2.5	3.6	3.8	3.9	4.7
87/11	5.0	13.0	5.9	9.6	6.6	5.2	12.9	13.2
87/12	4.3	9.3	7.3	8.7	6.0	7.4	6.0	4.7

表3.1-42 核四施工環境監測歷年海域水質懸浮固體監測結果（續1）

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
88/1	11.7	8.3	5.4	8.9	8.2	6.6	6.6	7.0
88/2	6.1	10.2	8.8	9.7	10.0	6.4	4.4	9.4
88/3	16.2	11.7	14.6	10.7	16.0	10.4	12.0	10.8
88/4	7.9	7.9	9.6	10.6	11.3	8.5	7.3	9.5
88/5	3.2	8.7	5.4	4.4	7.3	4.4	6.2	5.3
88/6	5.6	15.0	15.4	10.0	10.2	9.2	8.0	5.0
88/7	5.2	10.5	5.1	7.1	5.2	5.3	2.9	3.7
88/8	9.6	7.6	8.7	6.3	7.1	8.2	14.2	9.8
88/9	8.3	10.3	8.6	11.2	9.4	9.2	8.7	16.1
88/10	5.2	6.8	6.4	6.3	6.0	10.0	5.8	5.8
88/11	4.5	6.1	5.4	3.1	5.3	4.8	2.2	5.6
88/12	11.2	17.2	14.6	13.1	11.5	15.2	15.8	18.7
89/1	4.0	5.7	5.1	3.8	3.2	3.8	4.2	3.3
89/2	<1.0	5.7	8.8	7.9	10.5	6.1	10.1	10.5
89/3	5.1	4.4	6.4	6.1	8.7	9.8	7.8	11.7
89/4	6.6	ND	4.5	6.2	<1.0	5.2	<1.0	4.0
89/5	8.9	ND	7.9	7.8	6.9	6.8	6.3	6.1
89/6	8.2	4.4	8.0	9.5	7.2	7.0	20.5	7.3
89/7	14.6	12.9	12.9	14.8	13.1	15.6	11.7	13.5
89/8	7.4	12.1	8.6	8.4	9.4	9.0	10.8	12.1
89/9	5.6	5.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	10.4
89/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.1	<1.0	<1.0
89/11	-	-	-	-	-	-	-	-
89/12	-	-	-	-	-	-	-	-
90/1	-	-	-	-	-	-	-	-
90/2	7.0	10.2	9.1	6.2	7.7	4.6	5.1	6.6
90/3	5.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.1	<1.0
90/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/9	12.0	13.2	14.1	6.3	2.0	10.4	7.2	22.1
90/10	7.7	7.4	7.7	6.9	2.0	2.0	8.3	7.5
90/11	12.2	9.7	9.0	8.5	6.3	5.9	8.3	7.0
90/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	<1.0
91/2	<1.0	2.3	4.1	3.6	2.1	4.4	3.1	4.4
91/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/4	7.5	12.1	5.7	12.8	8.1	10.5	7.3	20.3
91/5	9.2	10.2	10.1	5.8	4.0	4.2	7.0	6.3
91/6	<1.0	<1.0	<1.0	13.0	<1.0	2.0	<1.0	<1.0
91/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/8	2.2	<1.0	<1.0	<1.0	2.4	2.2	2.8	3.3
91/9	4.4	7.9	6.1	4.6	5.7	4.6	5.8	5.5
91/10	5.7	9.0	9.1	10.7	8.9	7.3	8.2	5.5
91/11	<1.0	7.0	5.5	7.4	7.1	9.4	8.8	6.3
91/12	6.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	5.0	5.8	8.0
92/1	9.8	8.8	8.5	7.9	7.9	8.2	7.2	9.9
92/2	<1.0	6.6	10.0	5.1	8.4	10.9	9.6	9.4
92/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/6	4.5	5.9	4.9	7.5	4.2	4.4	6.9	6.1
92/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/4	7.0	<1.0	2.5	8.2	3.5	8.0	2.5	3.0
93/5	5.5	18.5	6.2	7.8	7.8	5.0	3.5	11.2
93/6	6.0	6.7	6.7	6.0	6.0	3.3	<1.0	11.0

表3.1-42 核四施工環境監測歷年海域水質懸浮固體監測結果（續2）

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
93/7	4.0	3.0	3.5	4.3	6.7	5.9	4.5	4.0
93/8	4.0	3.0	2.0	3.5	4.0	4.7	3.0	5.0
93/9	14.8	11.3	4.0	9.5	4.0	8.3	5.8	7.0
93/10	ND	2.5	4.0	9.0	4.0	14.0	3.0	9.8
93/11	ND	9.8	10.6	17.0	9.0	86.5	3.0	14.8
93/12	5.5	16.0	7.9	21.8	4.0	10.5	11.0	13.5
94/1	<1.0	<1.0	22.0	16.8	4.0	3.4	3.3	6.2
94/2	<1.0	<1.0	1.6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	4.1
94/3	1.5	1.5	<1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	2.5
94/4	1.3	<1.0	<1.0	2.5	1.9	4.8	<1.0	<1.0
94/5	10.1	23.6	12.1	14.4	20.7	10.7	7.5	19.9
94/6	2.5	7.2	4.5	6.5	3.5	13.2	5.2	10.5
94/7	3.0	8.5	5.2	<1.0	1.5	1.3	4.5	2.0
94/8	3.0	2.5	4.5	5.2	2.0	1.5	6.2	5.8
94/9	1.5	2.0	1.8	3.8	3.8	5.8	2.8	3.5
94/10	7.2	7.2	4.0	6.2	4.0	5.0	7.2	7.8
94/11	3.3	9.2	4.7	6.4	3.8	7.1	2.1	13.2
94/12	3.0	4.5	3.5	23.4	11.0	3.8	2.5	3.8
95/1	2.5	1.0	3.2	4.5	3.8	0.5	9.1	<1.0
95/2	4.0	0.5	2.5	8.2	6.2	6.8	4.5	9.5
95/3	2.0	3.0	4.0	1.5	10.6	3.0	10.5	13.3
95/4	2.0	3.0	1.5	1.5	2.0	0.5	9.8	2.0
95/5	1.2	2.0	6.6	1.8	8.7	1.5	12.8	13.0
95/6	4.0	6.5	8.5	5.0	11.0	6.0	15.5	9.2
95/7	4.5	5.5	5.0	8.0	8.5	8.5	6.0	9.5
95/8	1.5	10.2	1.5	13.5	4.0	0.5	2.5	6.0
95/9	8.4	4.7	8.5	6.1	7.1	5.0	7.9	6.6
95/10	10.5	6.8	8.8	9.8	5.0	12.5	3.0	11.0
95/11	3.0	4.0	3.0	2.0	2.5	3.5	5.5	3.5
95/12	2.6	5.6	5.5	9.8	4.9	6.5	3.3	<1.0
96/1	6.5	3.0	7.0	27.0	4.8	8.4	16.5	12.8
96/2	4.8	3.0	1.5	6.3	4.8	8.8	4.3	7.0
96/3	6.8	3.0	6.2	3.3	2.0	2.5	3.0	2.8
96/4	<1.0	2.0	2.3	6.3	3.3	7.3	3.3	7.0
96/5	4.0	3.0	<1.0	5.0	3.0	<1.0	5.2	5.4
96/6	9.3	12.3	9.3	13.0	7.2	13.0	7.6	11.8
96/7	13.5	16.2	6.8	14.8	2.8	16.0	10.0	22.5
96/8	7.3	9.8	9.1	14.5	<1.0	19.5	6.2	7.9
96/9	4.0	2.8	4.5	5.6	5.5	6.7	4.8	9.8
96/10	4.8	5.2	3.6	5.8	5.9	4.6	4.8	10.2
96/11	7.9	5.5	9.9	10.9	10.5	7.5	5.6	8.8
96/12	7.1	15.0	4.8	7.0	6.1	3.0	2.8	9.1
97/1	10.0	6.9	11.6	8.9	9.0	10.1	7.0	6.0
97/2	13.0	15.5	12.5	8.2	12.2	8.0	10.0	10.2
97/3	11.6	16.0	3.5	12.0	6.9	6.5	7.9	6.1
97/4	2.9	3.5	5.5	4.7	3.8	3.7	6.1	7.7
97/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/6	2.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	3.0
97/7	2.7	3.7	2.0	2.2	1.5	3.0	4.0	1.1
97/8	5.5	5.6	3.6	2.1	5.5	5.1	3.0	3.5
97/9	5.2	8.3	8.0	7.5	4.2	13.0	3.2	9.8
97/10	3.7	5.3	6.1	5.9	7.8	4.5	4.0	5.5
97/11	7.0	4.0	5.5	6.8	21.5	28.5	17.5	19.0
97/12	2.1	3.6	2.6	3.4	4.3	2.5	4.3	2.2
98/1	5.7	4.8	4.5	4.8	5.4	5.5	4.0	3.9
98/2	2.8	3.7	2.6	2.9	2.4	1.9	3.4	3.6
98/3	2.8	2.8	3.7	7.3	3.9	3.3	3.7	3.0
98/4	4.7	4.1	3.3	3.1	2.5	3.5	2.4	2.4
98/5	2.2	2.2	2.7	3.6	2.5	1.7	1.5	1.9
98/6	1.2	4.8	3.9	4.7	2.6	2.8	7.2	7.0
98/7	3.7	3.9	2.8	2.6	3.6	4.8	3.1	3.5
98/8	2.3	2.9	2.3	1.7	1.3	1.6	1.9	1.6
98/9	4.5	5.3	5.0	4.4	3.6	3.3	3.1	4.6
98/10	7.3	4.1	6.3	7.1	8.1	6.3	4.2	5.7
98/11	3.0	11.8	4.5	4.2	5.2	4.1	6.3	5.0
98/12	2.3	1.9	2.2	2.0	2.4	1.2	2.8	3.8

表3.1-42 核四施工環境監測歷年海域水質懸浮固體監測結果（續3）

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
99/1	2.7	1.7	2.6	2.5	1.5	2.0	2.4	3.1
99/2	2.9	3.6	2.6	3.1	5.0	3.7	2.1	3.6
99/3	1.9	2.3	1.8	2.3	1.9	1.8	2.1	1.6
99/4	2.3	2.0	1.5	3.7	ND	1.4	1.8	2.1
99/5	3.0	5.1	3.1	2.6	1.9	2.9	2.3	2.3
99/6	2.0	2.3	2.6	4.3	1.9	1.8	5.5	6.7
99/7	2.0	1.5	1.2	2.5	1.3	3.3	2.0	5.0
99/8	2.2	1.7	1.4	1.4	1.0	2.2	3.3	2.4
99/9	3.4	3.4	2.7	4.1	4.8	3.2	4.8	5.1
99/10	2.9	2.6	4.1	4.0	1.8	2.6	2.1	2.6
99/11	3.5	2.7	<1.0	3.5	1.2	3.6	4.5	2.9
99/12	4.4	5.1	2.4	5.1	3.5	3.5	5.2	4.5
100/1	3.5	3.5	2.3	3.8	3.0	3.0	2.8	3.2
100/2	4.0	3.6	3.5	4.0	3.6	3.7	3.0	4.9
100/3	5.1	3.4	3.7	6.0	3.1	3.6	4.8	2.5
100/4	2.8	2.9	2.7	3.2	3.5	4.4	6.4	5.2
100/5	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
100/6	1.5	1.6	1.7	2.8	2.3	1.1	3.0	4.5
100/7	1.6	2.7	1.7	2.8	1.7	2.2	1.5	2.3
100/8	1.7	1.6	1.7	1.4	2.0	2.6	1.5	2.4
100/9	1.3	1.8	1.3	1.4	2.2	2.3	1.1	2.7
100/10	2.3	1.3	1.1	1.6	2.2	1.5	2.0	1.9
100/11	3.3	4.2	3.8	5.3	5.9	4.9	6.3	6.8
100/12	2.2	2.8	1.8	1.4	3.6	2.4	2.3	2.5
101/1	2.9	2.4	2.6	1.6	2.5	2.5	1.9	2.2
101/2	1.8	1.9	2.6	1.9	1.3	2.2	1.8	1.3
101/3	2.1	1.4	1.8	2.1	2.2	2.5	1.1	1.3
101/4	2.0	1.4	1.4	1.8	1.3	2.2	1.2	1.6
101/5	1.6	1.5	1.8	1.8	1.4	1.5	9.4	9.8
101/6	2.6	2.7	2.4	2.6	2.1	2.2	5.0	4.5

註："-"表無測值。

表3.1-43 核四施工環境監測歷年海域水質生化需氧量監測結果

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
82/8	3.9	0.7	1.0	-	0.9	-	1.7	2.0
82/9	2.7	3.8	1.5	-	2.5	-	1.3	3.5
82/10	6.9	2.8	0.7	-	0.1	-	0.4	0.4
82/11	0.8	3.3	0.3	-	1.0	-	0.6	1.6
82/12	3.9	2.9	0.6	-	0.3	-	0.7	1.2
83/1	0.2	1.4	0.1	-	0.2	-	0.6	0.1
83/2	1.0	0.5	0.3	-	0.4	-	0.3	0.5
83/3	1.1	0.3	0.8	-	0.4	-	0.3	4.3
83/4	1.0	1.1	0.5	-	0.6	-	1.1	0.6
83/5	1.0	0.7	1.7	-	1.0	-	0.8	0.4
83/6	1.1	3.6	0.5	-	0.6	-	0.7	0.3
83/7	1.9	2.1	1.5	-	0.8	-	0.6	0.7
83/8	1.1	1.1	0.5	-	1.2	-	0.9	0.6
83/9	1.2	1.5	1.1	-	0.6	-	0.6	1.0
83/10	1.8	1.7	0.4	-	0.7	-	0.5	0.9
83/11	1.2	1.5	0.7	-	1.0	-	0.9	0.8
83/12	1.1	3.0	0.5	-	0.1	-	0.7	0.8
84/1	0.8	3.6	0.4	-	0.5	-	0.4	0.8
84/2	2.3	2.2	1.0	-	0.8	-	1.0	1.4
84/3	1.0	1.3	0.5	-	0.6	-	0.9	1.0
84/4	2.6	3.8	0.5	-	0.6	-	0.8	0.9
84/5	2.1	1.1	1.3	-	1.6	-	1.3	1.5
84/6	1.2	1.4	0.6	-	0.3	-	0.4	0.3
84/7	6.7	1.6	1.7	-	1.0	-	0.6	1.2
84/8	1.1	2.6	0.8	1.5	0.7	1.6	0.8	1.4
84/9	ND	0.3	1.1	1.2	0.8	0.9	1.1	0.9
84/10	0.3	0.5	0.4	ND	0.2	0.3	0.2	0.4
84/11	1.4	1.7	1.1	0.8	1.2	1.5	0.8	1.1
84/12	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	0.6	0.9
85/1	1.2	1.3	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	0.8
85/2	0.7	1.6	0.6	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7
85/3	1.4	0.8	1.0	0.9	0.9	1.2	1.3	1.1
85/4	1.0	1.1	0.3	1.0	0.4	1.0	0.7	0.9
85/5	0.5	0.4	1.3	1.5	0.8	0.7	0.5	0.7
85/6	0.9	1.3	1.0	1.7	0.8	1.4	0.7	1.1
85/7	1.1	0.9	1.1	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6
85/8	0.9	0.9	1.2	0.9	1.2	1.0	1.3	0.9
85/9	0.8	0.5	0.8	0.8	3.1	0.6	0.7	1.1
85/10	1.2	1.0	0.8	0.9	0.9	2.0	1.1	1.1
85/11	2.0	0.6	0.3	1.1	1.0	1.4	1.5	1.0
85/12	0.9	0.9	0.7	0.9	0.4	0.6	0.7	0.9
86/1	1.3	1.6	1.4	1.0	1.0	0.9	1.2	2.5
86/2	0.9	1.5	0.4	0.9	0.4	0.8	0.5	0.5
86/3	0.7	0.6	1.8	0.7	1.2	0.9	0.9	0.8
86/4	2.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.1	0.4
86/5	0.7	0.3	0.6	0.8	1.3	0.8	0.7	0.8
86/6	0.8	0.9	0.9	0.8	0.3	0.7	0.2	0.8
86/7	1.0	3.6	3.4	3.8	2.5	2.8	3.5	4.3
86/8	1.0	<1.0	1.6	<1.0	<1.0	1.2	1.1	1.2
86/9	1.4	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	ND	1.3	<1.0
86/10	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
86/11	<1.0	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	1.4
86/12	1.9	1.3	<1.0	1.2	1.3	1.0	1.3	<1.0
87/1	1.5	<1.0	1.4	1.2	1.0	<1.0	1.8	2.0
87/2	2.1	1.1	1.6	<1.0	2.1	2.6	<1.0	1.1
87/3	1.2	1.5	1.4	<1.0	1.4	1.0	1.3	<1.0
87/4	<1.0	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
87/5	1.7	2.9	0.5	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.3
87/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
87/7	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0
87/8	1.4	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
87/9	<1.0	<1.0	1.2	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
87/10	1.8	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.4
87/11	1.5	1.3	0.5	<1.0	1.0	1.5	1.1	1.8
87/12	1.6	1.6	1.4	1.5	1.7	1.4	1.2	1.7

表3.1-43 核四施工環境監測歷年海域水質生化需氧量監測結果(續1)

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
88/1	1.0	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
88/2	1.1	1.0	1.8	1.3	1.9	2.0	1.9	2.0
88/3	1.7	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
88/4	<1.0	<1.0	1.1	1.2	<1.0	1.2	<1.0	1.1
88/5	1.4	2.5	1.4	<1.0	1.6	1.5	<1.0	<1.0
88/6	1.8	3.1	1.5	1.2	1.3	0.5	1.4	1.1
88/7	2.2	2.8	1.6	2.0	2.0	1.6	2.3	2.3
88/8	1.3	<1.0	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
88/9	<1.0	<1.0	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
88/10	<1.0	<1.0	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
88/11	1.2	1.2	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
88/12	1.4	1.5	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
89/1	<1.0	2.5	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/2	<1.0	<1.0	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/3	<1.0	<1.0	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/4	<1.0	<1.0	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/5	1.5	1.5	<1.0	ND	3.2	1.1	1.5	<1.0
89/6	1.7	1.5	1.3	1.7	1.7	1.3	1.5	1.5
89/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.7
89/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/11	-	-	-	-	-	-	-	-
89/12	-	-	-	-	-	-	-	-
90/1	-	-	-	-	-	-	-	-
90/2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/1	1.6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.4
91/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/11	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
91/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/1	<1.0	1.7	0.5	0.5	1.5	1.6	1.1	1.9
92/2	<1.0	1.0	1.1	1.5	1.3	1.2	<1.0	0.5
92/3	<1.0	0.5	1.5	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	1.0
92/4	<1.0	0.5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/5	<1.0	1.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
92/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/1	<1.0	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	1.9	1.1	<1.0
93/2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/3	1.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.3	<1.0

表3.1-43 核四施工環境監測歷年海域水質
生化需氧量監測結果(續2)

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
93/7	2.8	<1.0	3.5	1.0	2.1	<1.0	<1.0	<1.0
93/8	4.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
93/9	2.3	<1.0	<1.0	<1.0	2.3	2.1	2.5	<1.0
93/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0
93/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	2.4
93/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	3.6
94/1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.7	<1.0	2.6
94/2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
94/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
95/1	1.4	2.0	1.6	1.8	2.0	1.6	2.2	1.6
95/2	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	1.0	1.1	<1.0	1.5
95/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
95/4	1.5	2.0	1.2	1.4	3.1	<1.0	1.0	1.3
95/5	<1.0	<1.0	1.2	<1.0	1.3	<1.0	4.5	1.0
95/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	1.2	<1.0
95/7	<1.0	1.4	1.8	1.2	4.4	<1.0	3.0	1.3
95/8	1.2	<1.0	1.3	1.3	<1.0	<1.0	4.2	1.3
95/9	1.4	<1.0	2.5	<1.0	1.6	2.0	<1.0	2.3
95/10	<1.0	2.2	2.2	1.2	1.4	2.3	1.1	2.7
95/11	<1.0	2.2	1.3	2.6	1.2	<1.0	<1.0	1.6
95/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/2	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.6
96/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
96/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.1	<1.0	<1.0	<1.0
96/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
97/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/2	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0
98/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/6	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/7	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
98/12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

表3.1-43 核四施工環境監測歷年海域水質生化需氧量監測結果(續3)

單位：mg/L

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
99/1	1.3	1.8	<1.0	<1.0	1.8	<1.0	<1.0	<1.0
99/2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
99/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
99/4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
99/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
99/6	3.0	3.0	2.9	3.0	3.2	3.2	3.9	3.9
99/7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	1.9	1.8
99/8	3.1	3.8	3.7	3.9	3.0	3.3	3.1	2.9
99/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	<1.0	<1.0
99/10	1.6	1.8	1.9	2.0	1.5	1.7	1.2	1.8
99/11	1.4	1.2	1.3	1.7	1.2	1.4	1.4	1.6
99/12	3.6	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	1.7	1.2
100/1	2.2	1.5	1.3	1.5	2.2	1.9	1.6	1.6
100/2	1.5	1.8	1.4	1.9	1.4	2.0	2.2	1.5
100/3	2.0	1.9	1.8	1.7	1.4	1.4	1.7	1.6
100/4	2.1	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	2.2
100/5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.7	2.5	3.0	2.2
100/6	1.9	1.9	2.1	1.8	1.4	2.2	2.1	2.3
100/7	3.1	2.7	2.1	1.8	<1.0	2.4	1.6	2.5
100/8	1.6	1.6	2.2	5.0	3.7	4.2	3.0	3.7
100/9	2.5	2.8	1.7	1.8	2.8	2.4	2.5	2.8
100/10	1.3	1.7	1.5	1.4	1.5	1.7	1.7	1.3
100/11	1.8	1.8	1.8	1.9	1.3	1.5	1.9	1.4
100/12	2.2	1.4	2.6	2.5	2.9	2.6	2.4	2.9
101/1	1.6	1.7	1.8	1.4	<1.0	1.9	1.4	1.1
101/2	1.7	1.7	1.8	1.5	1.9	1.7	1.7	1.9
101/3	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7
101/4	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7
101/5	1.8	1.9	1.8	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8
101/6	1.8	1.6	1.6	1.4	1.7	1.0	1.8	1.5

註：1."-"表無測值。2.陰影表超出甲類海域海洋環境品質標準。

表3.1-44 核四施工環境監測歷年海域水質大腸桿菌群監測結果

單位：CFU/100ml

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
82/8	12	2	1.1	-	1.1	-		
82/9	1.1	1.1	1.1	-	1.1	-	1.1	1.1
82/10	1.2×10^{2}	1.1	12	-	3.3	-	8.9	1.1
82/11	1.3×10^{4}	2.1×10^{3}	4	-	5.8×10^{2}	-	87	56
82/12	1.1	1.1	1.1	-	1.1	-	1.1	1.1
83/1	1.1×10^{2}	2.1×10^{2}	8.2×10^{2}	-	3.2×10^{2}	-	4.7×10^{2}	3.0×10^{2}
83/2	<1.0	<1.0	2	-	<1.0	-	2	<1.0
83/3	13	<1.0	<1.0	-	<1.0	-	4.2	<1.0
83/4	2.0×10^{3}	8.9×10^{2}	1.1×10^{2}	-	14	-	3.3×10^{2}	15
83/5	2.0×10^{2}	3.8×10^{2}	3.28×10^{2}	-	2	-	3	1.7×10^{2}
83/6	7	<1.0	<1.0	-	14	-	2	<1.0
83/7	<1.0	<1.0	<1.0	-	<1.0	-	<1.0	<1.0
83/8	<1.0	<1.0	<1.0	-	<1.0	-	<1.0	<1.0
83/9	<1.0	23	<1.0	-	<1.0	-	<1.0	<1.0
83/10	2	1.1	20	-	2	-	<1.0	<1.0
83/11	32	43	30	-	4.5×10^{2}	-	47	20
83/12	1.1×10^{3}	44	49	-	1.3×10^{2}	-	5.3×10^{2}	<1.0
84/1	<1.0	7	5	-	2	-	1.1	1.1
84/2	8.6×10^{2}	75	53	-	77	-	2.4×10^{3}	49
84/3	8	13	50	-	6	-	5	69
84/4	3.6×10^{3}	34	1.6×10^{3}	-	8.6×10^{2}	-	4.2×10^{2}	36
84/5	1.4×10^{3}	5.6×10^{2}	39	-	7.6×10^{2}	-	97	38
84/6	<1.0	1.1	<1.0	-	<1.0	-	<1.0	<1.0
84/7	<1.0	<1.0	<1.0	-	<1.0	-	<1.0	<1.0
84/8	<1.0	1.4×10^{3}	2.2×10^{2}	2.2×10^{2}	<1.0	1.6×10^{2}	4.3×10^{2}	<1.0
84/9	1.1	12	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3
84/10	70	3.0×10^{2}	1.53×10^{2}	8.2×10^{2}	4.1×10^{2}	8.0×10^{2}	3.2×10^{2}	1.15×10^{2}
84/11	30	1.49×10^{4}	1.0×10^{2}	8.4×10^{2}	2.6×10^{2}	1.1×10^{2}	10	3.15×10^{2}
84/12	<1.0	10	40	<1.0	<1.0	10	<1.0	<1.0
85/1	2	3	2	2	1.1	1.1	<1.0	1.1
85/2	1.0×10^{3}	70	1.9×10^{2}	<1.0	95	<1.0	80	1.1
85/3	1.1×10^{2}	1.05×10^{2}	2.85×10^{2}	10	8.77×10^{2}	40	4.53×10^{2}	1.517×10^{3}
85/4	1.0×10^{3}	8.6×10^{4}	20	2.2×10^{4}	60	1.5×10^{4}	20	7.0×10^{3}
85/5	<1.0	<1.0	1.3×10^{2}	<1.0	3.8×10^{2}	<1.0	6.2×10^{2}	<1.0
85/6	<1.0	<1.0	2.8	<1.0	7	1.1	1.1	7
85/7	9.3×10^{4}	2.7×10^{3}	3.3×10^{4}	7.1×10^{3}	1.37×10^{4}	2.1×10^{2}	5.9×10^{3}	60
85/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1	40	<1.0	<1.0
85/9	2	<1.0	3	1.1	5	<1.0	<1.0	4
85/10	2	4.0×10^{3}	2.1×10^{3}	9.2×10^{4}	15	1.5×10^{4}	30	6.0×10^{2}
85/11	52	9	7	11	4	13	2.95×10^{2}	26
85/12	6	6.8×10^{2}	21	4.05×10^{2}	1.75×10^{2}	4.05×10^{2}	1.05×10^{2}	1.4×10^{2}
86/1	1.1	5	<1.0	<1.0	1.1	<1.0	3	<1.0
86/2	<1.0	<1.0	4	2.0×10^{2}	60	1.1	1.9×10^{2}	3.5×10^{2}
86/3	6	6	8	10	13	10	2	<1.0
86/4	68	11	64	6	53	3	22	2
86/5	20	7	<1.0	2	2	14	3	6
86/6	<1.0	1.3×10^{2}	4	67	30	5.6×10^{2}	41	9.8×10^{2}
86/7	2.0×10^{2}	30	5.0×10^{2}	8.0×10^{2}	6.0×10^{2}	1.5×10^{3}	1.2×10^{2}	6.0×10^{2}
86/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.3×10^{3}	<1.0	<1.0	44
86/9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
86/10	<1.0	2	<1.0	3	1.1	21	<1.0	<1.0
86/11	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
86/12	2.8×10^{2}	3.0×10^{2}	1.1×10^{2}	4.65×10^{2}	90	3.8×10^{2}	38	3.7×10^{2}
87/1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
87/2	3	3	8	6	5	12	10	9
87/3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.1×10^{3}	9
87/4	6	16	<1.0	<1.0	<1.0	3	1.1	1.1
87/5	2.1×10^{3}	6.65×10^{2}	2.61×10^{2}	6	4.9×10^{2}	2.9×10^{2}	1.1×10^{3}	28
87/6	7.5×10^{2}	43	8.2×10^{2}	31	1.5×10^{2}	17	70	17
87/7	1.2×10^{2}	1.35×10^{2}	80	1.25×10^{2}	4.1×10^{2}	70	57	71
87/8	18	9.0×10^{2}	3	43	5.4×10^{2}	5	15	1.55×10^{2}
87/9	50	8	2.9×10^{2}	64	2.0×10^{4}	25	5.0×10^{3}	38
87/10	29	78	13	6	8	9	20	3
87/11	40	27	54	36	24	3.6×10^{2}	6.4×10^{3}	89
87/12	2.22×10^{2}	1.11×10^{2}	3.22×10^{2}	18	2.0×10^{2}	18	56	1.67×10^{2}

表3.1-44 核四施工環境監測歷年海域水質大腸桿菌群監測結果(續1)

單位：CFU/100ml

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
88/1	4	<1.0	<1.0	<1.0	2	<1.0	25	<1.0
88/2	4.2×10^{2}	35	68	26	38	11	76	48
88/3	1.1	2	49	ND	85	1.1	ND	<1.0
88/4	16	4	68	3.8×10^{3}	24	6	1.9×10^{2}	22
88/5	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
88/6	4.4×10^{3}	5.0×10^{3}	3.8×10^{3}	3.4×10^{2}	2.6×10^{3}	2.7×10^{2}	2.4×10^{3}	1.6×10^{2}
88/7	10	1.7×10^{2}	1.8×10^{2}	1.1×10^{2}	9.6×10^{2}	10	<1.0	30
88/8	1	1	ND	22	ND	3	1	3
88/9	90	1.4×10^{2}	90	20	20	50	1.3×10^{2}	1.3×10^{2}
88/10	20	60	70	30	20	20	30	30
88/11	5	10	40	60	1.1×10^{2}	30	10	20
88/12	2.4×10^{5}	2.2×10^{5}	4.6×10^{5}	2.4×10^{5}	1.5×10^{4}	2.1×10^{5}	1.8×10^{4}	2.0×10^{5}
89/1	20	70	20	10	60	30	8.9×10^{2}	60
89/2	40	20	3.8×10^{2}	ND	3.6×10^{2}	20	1.1×10^{3}	80
89/3	50	10	1.0×10^{2}	30	70	20	3.4×10^{2}	1.2×10^{2}
89/4	30	<1.0	20	10	40	20	90	1.0×10^{2}
89/5	<1.0	<1.0	4.5×10^{2}	<1.0	20	<1.0	50	ND
89/6	20	20	1.0×10^{2}	50	10	50	1.6×10^{4}	3.0×10^{2}
89/7	450	1.0×10^{2}	1.1×10^{2}	1.1×10^{2}	6	2.5×10^{2}	4.4×10^{2}	1.2×10^{2}
89/8	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/9	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
89/11	-	-	-	-	-	-	-	-
89/12	-	-	-	-	-	-	-	-
90/1	-	-	-	-	-	-	-	-
90/2	10	<1.0	<1.0	<1.0	10	<1.0	30	<1.0
90/3	1.0×10^{2}	15	35	5	25	<1.0	1.1×10^{2}	1.8×10^{2}
90/4	90	2.0×10^{4}	8	4.2×10^{2}	40	50	1.0×10^{2}	8.5×10^{2}
90/5	65	10	10	10	2.0×10^{2}	1.1×10^{3}	10	2.5×10^{2}
90/6	70	1.3×10^{2}	<1.0	<1.0	1.7×10^{2}	20	6.7×10^{3}	20
90/7	<1.0	15	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	10
90/8	20	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
90/9	10	15	6.2×10^{2}	10	4.4×10^{2}	15	9.6×10^{2}	35
90/10	40	30	40	20	10	10	6.6×10^{2}	5
90/11	95	55	1.3×10^{2}	1.8×10^{2}	2.8×10^{2}	20	35	15
90/12	15	35	45	30	75	15	12	1.6×10^{2}
91/1	<10	<10	<10	20	<10	<10	70	15
91/2	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
91/3	20	1.2×10^{2}	85	15	340	<10	1.3×10^{2}	<10
91/4	220	<10	1.7×10^{2}	75	1.6×10^{2}	1.3×10^{2}	3.0×10^{2}	1.7×10^{2}
91/5	25	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10
91/6	60	1.4×10^{2}	2.0×10^{2}	95	3.1×10^{2}	35	80	25
91/7	70	15	25	10	1.0×10^{2}	20	60	<10
91/8	35	50	25	75	9.5×10^{2}	20	75	10
91/9	2.3×10^{3}	<10	<10	<10	3.5×10^{3}	2.6×10^{2}	1.0×10^{2}	<10
91/10	3.6×10^{2}	65	25	95	1.6×10^{2}	70	50	4.1×10^{2}
91/11	<10	<10	<10	<10	<10	15	10	<10
91/12	15	1.2×10^{2}	65	4.5×10^{2}	50	20	4.1×10^{2}	5.0×10^{3}
92/1	25	25	80	<10	20	<10	20	20
92/2	15	15	45	50	30	30	20	35
92/3	2.8×10^{2}	35	15	<10	5.3×10^{2}	15	5	<10
92/4	20	10	<10	<10	1.3×10^{2}	10	5	<10
92/5	1.6×10^{2}	<10	<10	<10	2.4×10^{2}	20	10	<10
92/6	1.0×10^{2}	1.7×10^{2}	50	10	4.7×10^{3}	15	40	3.7×10^{3}
92/7	1.5×10^{2}	1.7×10^{2}	30	<10	<10	<10	15	15
92/8	ND	ND	ND	-	<10	<10	<10	<10
92/9	45	ND	ND	-	<10	30	<10	70
92/10	ND	ND	4.6×10^{2}	1.4×10^{2}	65	25	<10	<10
92/11	2.4×10^{2}	6.8×10^{2}	2.2×10^{2}	2.1×10^{4}	40	8.1×10^{2}	10	4.0×10^{3}
92/12	1.4×10^{2}	ND	2.1×10^{2}	2.4×10^{2}	90	9.3×10^{2}	2.2×10^{2}	8.2×10^{2}
93/1	80	25	55	<10	95	35	<10	15
93/2	2.1×10^{2}	1.8×10^{2}	2.3×10^{4}	60	35	<10	2.3×10^{2}	60
93/3	7.9×10^{3}	2.4×10^{2}	4.7×10^{3}	2.0×10^{4}	2.0×10^{3}	2.0×10^{4}	2.0×10^{4}	2.0×10^{4}
93/4	<10	1.2×10^{2}	1.0×10^{2}	25	30	<10	40	10
93/5	1.0×10^{3}	85	2.1×10^{3}	1.7×10^{3}	5.6×10^{2}	4.0×10^{2}	6.8×10^{2}	1200
93/6	<10	<10	<10	<10	35	<10	<10	<10

表3.1-44 核四施工環境監測歷年海域水質
大腸桿菌群監測結果(續2)

單位：CFU/100ml

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
93/7	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
93/8	<10	<10	<10	2.2×10^{4}	<10	<10	<10	<10
93/9	<10	<10	<10	<10	20	<10	<10	<10
93/10	<10	1.3×10^{2}	2.5×10^{2}	1.3×10^{3}	440	3.0×10^{3}	3.6×10^{3}	1.3×10^{4}
93/11	<10	35	<10	<10	<10	<10	<10	65
93/12	8.7×10^{3}	4.1×10^{3}	2.4×10^{2}	1.5×10^{2}	70	90	2.3×10^{3}	3.9×10^{2}
94/1	4.9×10^{3}	7.7×10^{3}	4.0×10^{2}	7.6×10^{3}	5.0×10^{2}	1.1×10^{2}	2.7×10^{2}	1.4×10^{2}
94/2	1.7×10^{2}	<10	2.4×10^{3}	<10	2.3×10^{3}	5	2.4×10^{3}	85
94/3	<10	<10	<10	15	7.9×10^{2}	3.4×10^{3}	<10	5.8×10^{2}
94/4	<10	20	40	1.0×10^{3}	<10	<10	15	<10
94/5	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
94/6	<10	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10
94/7	400	<10	<10	<10	<10	<10	2.8×10^{2}	3.0×10^{2}
94/8	<10	<10	<10	<10	<10	<10	ND	<10
94/9	65	75	<10	55	90	1.1×10^{2}	ND	<10
94/10	3.2×10^{2}	<10	90	4.4×10^{2}	3.1×10^{3}	3.1×10^{2}	3.1×10^{2}	2.9×10^{2}
94/11	45	<10	30	2.9×10^{2}	1.5×10^{3}	2.5×10^{2}	75	85
94/12	75	80	1.4×10^{2}	1.6×10^{2}	3.3×10^{3}	6.7×10^{2}	8.7×10^{2}	1.2×10^{2}
95/1	1.3×10^{3}	3.5×10^{2}	1.3×10^{3}	7.8×10^{2}	1.9×10^{3}	1.2×10^{3}	8.2×10^{2}	3.5×10^{2}
95/2	10	6.1×10^{2}	1.5×10^{2}	15	10	95	<10	2.6×10^{2}
95/3	2.2×10^{2}	5.9×10^{2}	4.5×10^{2}	3.3×10^{2}	2.0×10^{2}	40	6.1×10^{2}	2.9×10^{2}
95/4	1.5×10^{2}	<10	<10	1.1×10^{2}	90	15	<10	5.0×10^{2}
95/5	6.5×10^{2}	2.1×10^{3}	2.2×10^{3}	1.3×10^{3}	3.0×10^{2}	7.1×10^{2}	3.2×10^{4}	4.9×10^{2}
95/6	1.0×10^{2}	1.9×10^{2}	2.4×10^{2}	3.4×10^{3}	3.9×10^{3}	4.5×10^{3}	1.2×10^{4}	1.6×10^{3}
95/7	1.9×10^{3}	75	1.2×10^{2}	2.5×10^{2}	6.9×10^{2}	1.0×10^{3}	1.4×10^{3}	9.5×10^{2}
95/8	35	<10	45	<10	1.0×10^{2}	<10	55	<10
95/9	2.5×10^{2}	3.5×10^{2}	7.2×10^{3}	30	90	4.2×10^{2}	ND	1.8×10^{2}
95/10	2.0×10^{2}	1.2×10^{2}	30	<10	2.2×10^{2}	1.8×10^{2}	25	3.1×10^{2}
95/11	15	90	20	60	20	65	3.7×10^{2}	4.1×10^{2}
95/12	15	3.3×10^{2}	<10	1.7×10^{2}	1.0×10^{3}	1.1×10^{2}	90	60
96/1	1.3×10^{3}	40	5.2×10^{2}	1.2×10^{2}	4.4×10^{2}	1.8×10^{2}	1.4×10^{3}	40
96/2	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
96/3	<10	<10	<10	25	<10	<10	<10	<10
96/4	<10	<10	<10	<10	<10	1.2×10^{2}	1.6×10^{2}	<10
96/5	470	<10	5.3×10^{2}	25	<10	<10	7.0×10^{2}	30
96/6	30	<10	2.3×10^{2}	2.1×10^{2}	160	1.1×10^{2}	<10	85
96/7	<10	40	<10	60	<10	35	<10	30
96/8	<10	25	20	50	50	85	<10	55
96/9	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
96/10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
96/11	2.1×10^{2}	2.6×10^{2}	21	2.3×10^{2}	85	1.2×10^{2}	45	1.5×10^{2}
96/12	55	1.8×10^{2}	25	2.2×10^{2}	1.2×10^{2}	1.5×10^{2}	2.1×10^{2}	25
97/1	2.4×10^{2}	ND	8.0×10^{2}	1.6×10^{2}	6.8×10^{2}	25	8.6×10^{2}	<10
97/2	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.5×10^{2}	2.5×10^{2}	2.1×10^{2}	2.4×10^{2}	2.1×10^{2}	2.2×10^{2}
97/3	1.9×10^{2}	8.6×10^{2}	2.2×10^{2}	8.5×10^{2}	1.4×10^{2}	1.3×10^{2}	1.1×10^{2}	1.1×10^{2}
97/4	90	35	6.7×10^{2}	6.8×10^{2}	1.0×10^{2}	45	<10	<10
97/5	1.1×10^{2}	40	<10	<10	20	ND	55	35
97/6	1.3×10^{2}	1.8×10^{2}	1.2×10^{2}	1.5×10^{2}	1.0×10^{2}	45	1.0×10^{2}	70
97/7	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
97/8	20	30	55	1.0×10^{2}	2.4×10^{2}	25	35	<10
97/9	20	50	25	80	50	85	6.5×10^{2}	4.6×10^{2}
97/10	20	1.3×10^{2}	1.2×10^{2}	1.1×10^{2}	45	35	1.9×10^{2}	1.6×10^{2}
97/11	9.1×10^{2}	9.2×10^{2}	8.6×10^{2}	8.7×10^{2}	9.3×10^{2}	9.4×10^{2}	9.1×10^{2}	8.4×10^{2}
97/12	20	20	90	80	2.5×10^{2}	2.6×10^{2}	8.4×10^{2}	15
98/1	20	15	1.6×10^{2}	30	20	30	<10	25
98/2	15	<10	15	<10	<10	15	<10	<10
98/3	15	25	4.1×10^{2}	4.7×10^{2}	1.3×10^{2}	1.9×10^{2}	3.2×10^{2}	3.8×10^{2}
98/4	20	15	1.6×10^{2}	30	20	30	<10	25
98/5	15	<10	15	<10	<10	15	<10	<10
98/6	15	25	4.1×10^{2}	4.7×10^{2}	1.3×10^{2}	1.9×10^{2}	3.2×10^{2}	3.8×10^{2}
98/7	4.8×10^{2}	4.0×10^{2}	8.2×10^{2}	8.2×10^{2}	8.9×10^{2}	8.8×10^{2}	3.4×10^{2}	3.3×10^{2}
98/8	40	80	<10	40	<10	<10	10	55
98/9	<10	<10	15	<10	<10	<10	<10	<10
98/10	7.2×10^{2}	3.2×10^{2}	2.6×10^{2}	3.0×10^{2}	6.3×10^{2}	7.6×10^{2}	7.2×10^{2}	7.7×10^{2}
98/11	10	<10	<10	<10	<10	<10	1.8×10^{2}	14×10^{2}
98/12	4.2×10^{2}	5.1×10^{2}	8.0×10^{2}	8.6×10^{2}	6.7×10^{2}	8.0×10^{2}	8.9×10^{2}	8.8×10^{2}

表3.1-44 核四施工環境監測歷年海域水質
大腸桿菌群監測結果(續3)

單位：CFU/100ml

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
99/1	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	15
99/2	<10	<10	<10	<10	<10	<10	1.1×10^{2}	85
99/3	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
99/4	<10	<10	<10	<10	25	<10	<10	<10
99/5	25	1.7×10^{2}	2.4×10^{2}	1.5×10^{2}	3.1×10^{2}	1.5×10^{2}	1.1×10^{2}	1.2×10^{2}
99/6	<10	10	<10	1.7×10^{2}	<10	<10	25	15
99/7	<10	15	25	<10	<10	<10	<10	<10
99/8	1.8×10^{2}	45	25	10	35	30	2.5×10^{2}	<10
99/9	<10	<10	<10	<10	<10	20	<10	25
99/10	40	35	1.6×10^{2}	1.3×10^{2}	5.2×10^{2}	4.9×10^{2}	5.7×10^{2}	6.1×10^{2}
99/11	75	1.3×10^{2}	30	25	1.9×10^{2}	2.7×10^{2}	10	15
99/12	9.2×10^{2}	6.7×10^{2}	2.4×10^{2}	1.2×10^{2}	4.0×10^{2}	4.7×10^{2}	8.4×10^{2}	6.1×10^{2}
100/1	80	20	2.3×10^{2}	2.3×10^{2}	15	25	1.7×10^{3}	1.5×10^{2}
100/2	<10	15	15	35	30	<10	50	85
100/3	<10	<10	20	60	35	30	<10	<10
100/4	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
100/5	<10	1.7×10^{2}	25	<10	<10	<10	65	40
100/6	25	25	<10	<10	10	25	10	30
100/7	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
100/8	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
100/9	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	30
100/10	10	<10	15	<10	<10	<10	<10	10
100/11	1.3×10^{3}	1.5×10^{3}	8×10^{2}	6.8×10^{2}	5.4×10^{2}	5.3×10^{2}	3.1×10^{3}	3.8×10^{3}
100/12	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
101/1	<10	<10	25	25	20	20	<10	<10
101/2	<10	<10	<10	<10	10	<10	<10	10
101/3	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
101/4	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
101/5	<10	<10	45	50	<10	30	2.3×10^{3}	2.6×10^{3}
101/6	15	25	45	50	85	1.4×10^{2}	2.7×10^{2}	5.2×10^{2}

註：1."-"表無測值。 2.陰影表超出甲類海域海洋環境品質標準。

表3.1-45 核四施工環境監測歷年海域水質濁度監測結果

單位：NTU

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
82/8	1.3	1.9	2.0	-	1.2	-	1.3	1.0
82/9	1.1	1.5	1.0	-	1.4	-	1.3	1.4
82/10	1.4	1.7	1.9	-	1.1	-	1.1	1.9
82/11	1.6	1.4	1.1	-	1.3	-	1.2	2.1
82/12	0.90	1.7	1.2	-	0.50	-	1.3	0.60
83/1	1.4	1.9	0.70	-	0.20	-	0.80	0.60
83/2	0.90	0.90	0.75	-	0.80	-	0.85	0.75
83/3	0.95	1.5	0.80	-	0.45	-	0.65	0.45
83/4	1.3	1.6	0.70	-	0.50	-	1.1	0.65
83/5	1.2	0.65	0.50	-	0.60	-	0.35	0.40
83/6	0.50	1.6	0.70	-	0.20	-	1.2	0.55
83/7	0.40	0.35	0.35	-	0.35	-	0.30	0.35
83/8	1.7	2.0	1.5	-	1.6	-	1.6	1.2
83/9	3.7	3.0	3.2	-	2.3	-	2.8	2.7
83/10	1.6	1.3	0.95	-	1.0	-	1.0	0.90
83/11	0.95	1.2	0.95	-	1.0	-	1.7	0.60
83/12	1.00	2.6	0.80	-	0.80	-	1.5	1.1
84/1	0.75	1.2	0.70	-	0.35	-	0.70	0.75
84/2	2.3	0.75	0.45	-	0.55	-	1.8	0.45
84/3	1.6	1.9	1.6	-	1.3	-	1.6	1.5
84/4	1.5	1.6	1.00	-	1.0	-	1.5	1.5
84/5	0.60	1.3	1.30	-	2.6	-	1.7	0.85
84/6	1.3	0.85	0.55	-	0.70	-	0.95	0.70
84/7	1.2	1.2	1.1	-	0.65	-	1.3	0.65
84/8	1.1	1.5	1.4	1.1	0.98	0.98	0.66	0.87
84/9	0.35	0.70	0.40	0.72	0.30	0.33	0.39	0.46
84/10	0.82	0.73	0.47	0.30	0.43	0.52	0.30	0.67
84/11	0.87	2.8	1.6	1.5	1.7	1.8	1.5	1.4
84/12	0.65	0.28	0.32	0.40	0.23	0.35	0.34	0.57
85/1	1.8	1.5	1.3	1.3	1.04	1.20	5.30	2.03
85/2	0.29	0.62	0.55	0.49	0.67	0.94	1.83	1.38
85/3	1.1	0.91	1.3	0.53	1.1	0.60	1.20	0.36
85/4	0.67	0.41	0.37	0.56	0.36	1.3	0.40	1.4
85/5	0.31	0.47	0.92	1.4	1.5	1.8	1.08	0.62
85/6	0.19	0.60	1.3	0.39	0.31	0.34	0.31	0.40
85/7	0.85	0.76	0.46	0.46	0.22	0.44	0.31	0.47
85/8	1.0	1.4	0.48	1.2	1.2	0.74	0.77	0.94
85/9	0.99	5.00	0.42	0.44	0.96	0.38	0.25	0.23
85/10	0.71	0.88	0.92	0.72	1.3	1.7	1.1	1.7
85/11	0.79	0.55	0.80	0.81	0.99	0.69	2.9	1.1
85/12	0.79	0.46	0.36	0.54	0.32	0.28	0.15	0.33
86/1	0.77	0.55	0.43	0.29	0.18	0.27	0.42	0.28
86/2	1.32	1.67	0.36	0.35	1.79	0.65	1.29	0.84
86/3	0.68	0.66	0.68	0.61	0.81	0.94	0.87	0.92
86/4	0.66	0.32	0.24	0.26	0.14	0.25	0.51	0.36
86/5	0.47	0.21	0.41	0.64	1.24	0.43	1.33	0.45
86/6	0.19	0.47	0.28	1.21	0.80	0.77	0.23	0.75
86/7	0.65	1.12	0.34	0.47	0.32	0.29	1.16	0.40
86/8	0.83	1.74	0.75	1.33	0.75	0.74	0.55	1.52
86/9	0.89	1.08	0.34	0.45	0.52	0.50	0.54	0.57
86/10	0.96	1.39	0.61	0.61	0.69	1.71	0.64	0.45
86/11	1.60	1.17	0.53	0.80	1.10	0.77	0.63	0.80
86/12	0.66	0.72	0.71	0.80	0.61	0.79	0.66	0.66
87/1	1.50	1.37	1.52	2.10	0.86	1.53	0.76	1.33
87/2	0.4	0.6	0.60	0.57	0.5	0.52	1.4	0.63
87/3	1.13	1.02	1.27	0.56	1.45	0.72	14.90	0.83
87/4	0.74	0.53	0.65	0.77	0.70	0.57	0.77	0.96
87/5	1.76	3.13	0.72	0.87	1.4	0.58	3.0	0.90
87/6	0.57	1.55	1.15	0.7	0.77	0.74	1.63	1.21
87/7	0.60	0.7	0.74	0.65	0.54	0.68	0.7	0.75
87/8	1.53	1.0	1.12	1.1	0.83	0.78	1.04	0.8
87/9	1.82	1.3	1.08	1.22	0.64	0.61	6.03	0.62
87/10	2.23	1.6	1.51	0.80	1.35	0.6	1.22	1.31
87/11	1.3	1.7	2.23	1.68	3.88	2.97	15.50	5.59
87/12	1.62	0.61	0.46	1.10	0.50	0.52	0.63	0.70

表3.1-45 核四施工環境監測歷年海域水質濁度監測結果（續1）

單位：NTU

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
87/1	1.5	1.4	1.5	2.1	0.86	1.5	0.76	1.3
87/2	0.42	0.59	0.60	0.57	0.51	0.52	1.4	0.63
87/3	1.1	1.0	1.3	0.56	1.5	0.72	14.9	0.83
87/4	0.74	0.53	0.65	0.77	0.70	0.57	0.77	0.96
87/5	1.8	3.1	0.72	0.87	1.4	0.58	3.0	0.90
87/6	0.57	1.6	1.2	0.71	0.77	0.74	1.6	1.2
87/7	0.60	0.65	0.74	0.65	0.54	0.68	0.70	0.75
87/8	1.5	1.0	1.1	1.1	0.83	0.78	1.0	0.82
87/9	1.8	1.3	1.1	1.2	0.64	0.61	6.0	0.62
87/10	2.2	1.6	1.5	0.80	1.4	0.59	1.2	1.3
87/11	1.3	1.7	2.2	1.7	3.9	3.0	15.5	5.6
87/12	1.6	0.61	0.46	1.1	0.50	0.52	0.63	0.70
88/1	1.9	1.26	0.87	1.5	1.25	1.03	1.25	0.69
88/2	1.9	2.89	1.18	1.7	2.30	1.32	2.80	1.90
88/3	1.8	1.35	1.61	1.2	1.28	1.06	1.09	1.20
88/4	0.9	2.36	1.42	1.4	2.30	1.57	2.08	1.47
88/5	0.9	1.09	0.98	0.7	0.88	0.58	0.69	0.53
88/6	1.3	1.46	1.12	0.8	0.89	0.60	3.42	0.64
88/7	4.4	4.29	2.14	3.6	2.91	2.09	1.56	0.88
88/8	1.8	0.89	0.67	0.7	0.96	0.91	0.89	1.06
88/9	1.4	1.23	0.72	1.9	1.13	1.16	0.76	0.90
88/10	2.4	2.10	2.80	2.0	1.60	2.20	1.70	1.20
88/11	1.4	2.44	2.73	1.3	2.40	1.45	2.10	2.07
88/12	2.8	1.84	1.51	1.6	2.02	1.87	1.42	1.27
89/1	1.8	2.50	1.10	2.3	1.80	2.00	1.30	1.70
89/2	1.0	1.40	2.90	1.2	4.00	1.40	4.10	1.50
89/3	1.0	0.90	1.80	1.2	2.70	1.00	1.40	1.20
89/4	1.6	1.7	3.70	3.6	1.2	2.0	1.3	2.50
89/5	2.7	1.3	1.7	1.2	1.9	0.7	1.0	ND
89/6	0.7	0.5	1.0	0.8	1.2	0.6	21.8	0.8
89/7	2.20	0.7	1.0	1.1	0.3	1.1	1.2	1.3
89/8	0.80	0.6	0.90	1.00	1.10	1.10	1.00	1.00
89/9	0.8	0.8	0.8	1.10	1.10	0.80	0.8	1.00
89/10	0.8	1.2	1.0	1.0	0.5	0.6	1.1	1.00
89/11	-	-	-	-	-	-	-	-
89/12	-	-	-	-	-	-	-	-
90/1	-	-	-	-	-	-	-	-
90/2	1.7	1.5	1.0	1.7	1.1	1.8	1.6	1.1
90/3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.8	0.7	0.6
90/4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.8	0.6
90/5	0.70	0.7	0.8	0.8	0.7	1.1	0.6	0.6
90/6	0.50	0.50	0.6	0.8	1.8	1.10	8.4	1.2
90/7	1.1	1.1	0.7	1.2	0.9	0.80	0.7	0.6
90/8	0.6	0.9	0.6	1.1	0.7	0.60	1.10	0.70
90/9	1.60	1.20	1.0	1.80	1.0	1.80	1.5	1.80
90/10	1.1	0.70	0.7	5.8	0.60	1.1	2.4	1.2
90/11	1.00	1.20	0.90	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9
90/12	1.30	1.10	1.80	1.1	1.1	2.50	1.70	1.6
91/1	1.50	1.1	1.2	1.2	1.09	1.00	2.6	3.1
91/2	2.90	2.60	8.30	5.30	4.60	2.30	4.30	4.50
91/3	2.10	1.90	2.10	1.50	2.00	1.70	2.30	1.70
91/4	0.80	2.40	0.90	1.50	0.90	1.40	0.90	0.90
91/5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	1.6	0.6
91/6	2.00	2.20	1.30	7.50	1.70	2.50	1.50	1.20
91/7	1.70	2.10	1.80	1.60	2.90	1.80	2.80	1.70
91/8	1.20	0.80	0.50	0.60	0.60	0.5	0.90	1.00
91/9	0.80	0.60	0.40	0.60	0.60	0.8	0.50	0.60
91/10	1.6	2.2	2.10	2.9	3.60	2.60	1.80	1.90
91/11	1.40	1.00	1.30	1.2	1.20	1.3	1.90	1.30
91/12	1.6	1.2	0.7	1.0	0.8	1.5	3.1	3.0
92/1	0.4	0.35	1.10	0.9	0.50	0.8	0.7	0.7
92/2	2.5	2.9	0.7	1.2	0.60	3.0	0.40	2.10
92/3	3.0	1.3	1.4	1.1	1.5	1.0	1.5	0.8
92/4	1.7	1.3	1.2	0.5	1.4	0.6	1.5	1.1
92/5	1.8	1.3	0.8	1.1	1.0	0.7	0.5	0.6
92/6	1.7	1.4	0.9	0.7	0.7	0.5	0.7	1.4

表3.1-45 核四施工環境監測歷年海域水質濁度監測結果（續2）

單位：NTU

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
92/7	2.5	0.6	2.4	0.8	0.84	0.57	0.7	0.57
92/8	1.40	1.80	2.90	2.80	1.60	5.6	0.9	1.80
92/9	1.2	0.9	0.7	0.9	1.3	0.5	0.9	0.9
92/10	0.4	0.6	1.0	1.1	0.7	0.7	0.4	0.4
92/11	1.6	1.20	1.80	1.90	1.10	1.20	1.6	1.4
92/12	0.71	0.62	0.65	1.10	0.66	0.63	1.60	0.76
93/1	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.8	0.4	0.6
93/2	3.0	2.8	2.8	2.50	2.2	4.6	6.0	1.2
93/3	0.6	1.3	0.60	0.50	1.00	1.00	0.60	0.5
93/4	0.8	0.8	1.80	1.40	1.00	2.30	1.90	1.7
93/5	1.9	1.7	2.80	2.50	1.20	1.80	5.20	3.9
93/6	1.4	1.7	0.80	2.30	1.90	2.00	1.30	1.8
93/7	1.3	1.4	1.40	0.85	1.50	ND	1.50	0.7
93/8	2.4	2.7	2.30	3.10	2.50	5.50	2.80	4.7
93/9	8.4	7.4	4.70	4.40	5.10	6.80	4.50	6.9
93/10	1.8	2.7	2.00	2.10	1.90	2.90	1.50	2.1
93/11	1.7	0.7	0.90	0.70	1.20	4.00	1.80	3.2
93/12	1.8	3.2	4.00	3.70	2.00	2.30	7.70	4.1
94/1	1.90	3.70	12.0	9.0	3.9	2.3	3.5	6.50
94/2	0.8	2.40	2.7	3.7	0.8	2.6	3.2	4.3
94/3	2.0	3.3	1.4	6.2	3.0	4.2	3.8	7.30
94/4	1.5	1.6	1.6	1.50	1.2	2.80	2.2	2.4
94/5	0.8	0.8	1.50	1.3	1.10	1.40	1.80	1.70
94/6	0.9	2.2	1.90	2.20	0.95	1.20	2.10	1.6
94/7	1.2	3.30	1.9	1.00	0.95	1.20	1.40	3.90
94/8	1.6	0.5	0.45	0.8	1.8	1.00	0.60	2.5
94/9	0.6	2.0	1.20	0.35	3.20	2.00	0.40	1.00
94/10	1.70	1.60	1.4	1.50	1.70	1.90	1.80	2.30
94/11	0.7	1.3	1.2	0.9	1.3	1.2	1.1	0.7
94/12	1.8	2.80	1.30	2.8	1.4	1.60	1.8	1.80
95/1	1.40	1.20	1.00	2.00	2.10	0.70	2.9	0.50
95/2	1.0	1.0	0.7	1.2	1.5	1.6	0.9	1.5
95/3	4.80	1.3	4.60	1.0	1.0	1.70	5.3	3.40
95/4	0.70	0.90	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
95/5	2.2	2.8	2.6	4.1	0.9	4.6	6.0	3.9
95/6	0.80	0.9	6.40	2.40	5.90	1.1	9.9	2.5
95/7	1.00	2.20	2.1	7.10	3.40	2.6	2.5	0.95
95/8	1.4	3.1	1.2	4.8	3.4	2.8	1.3	3.3
95/9	4.5	2.8	6.1	2.8	7.7	6.2	5.6	5.3
95/10	1.3	3.0	2.0	1.8	2.0	1.0	2.3	2.4
95/11	0.9	6.80	1.6	4.4	2.0	5.5	2.3	2.2
95/12	1.7	1.1	1.3	3.1	1.1	1.6	3.0	3.4
96/1	2.0	3.6	2	3.6	2.9	3.5	5.2	4.2
96/2	3.00	3.8	2.7	5.2	1.60	4.6	0.7	1.7
96/3	1.6	2.8	1.8	2.6	1.3	1.4	1.6	1.2
96/4	1.4	1.7	3.2	2.0	4.2	2.4	3.8	4.0
96/5	1.30	1.60	2.6	3.8	1.30	5.7	3.2	5.0
96/6	1.10	1.6	1.8	2.6	1.9	1.9	2.1	3.3
96/7	0.8	5.2	6.1	3.8	12.0	8.4	2.1	9.3
96/8	1.2	2.30	2.10	2.90	1.6	2.1	1.70	1.9
96/9	1.10	1.6	1.0	2.20	1.6	2.1	2.40	1.9
96/10	1.50	0.9	0.6	1.20	0.8	1.0	1.10	1.6
96/11	2.60	3.0	2.7	2.50	1.2	1.8	1.30	1.7
96/12	1.10	1.1	0.7	0.45	1.5	1.7	2.10	0.6
97/1	1.10	1.3	2.4	5.80	1.6	1.7	2.10	1.4
97/2	9.40	9.6	6.7	5.90	4.9	5.4	5.70	5.7
97/3	2.50	2.3	2.2	3.10	2.7	2.2	1.30	2.1
97/4	1.10	1.1	1.5	1.40	1.3	0.9	2.10	1.6
97/5	0.75	1.1	0.7	0.85	1.2	0.9	1.60	1.1
97/6	0.85	1.1	1.0	0.90	0.7	1.4	0.70	0.9
97/7	1.0	0.8	1.8	1.1	0.6	0.6	1.9	2.70
97/8	0.65	0.90	0.6	0.30	0.4	0.4	0.6	0.35
97/9	1.50	2.0	1.5	2.1	0.65	1.6	1.5	2.6
97/10	0.65	1.10	0.6	0.6	1.20	2.10	1.00	1.90
97/11	4.5	2.00	3.20	4.1	20.00	15.00	9.80	8.8
97/12	1.10	1.70	1.1	1.40	0.9	1.0	1.2	1.8

表3.1-45 核四施工環境監測歷年海域水質濁度監測結果（續3）

單位：NTU

	1號測站		2號測站		3號測站		4號測站	
	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
98/1	1.30	1.30	2.20	1.5	2.10	1.50	1.6	1.7
98/2	1.10	1.10	0.85	1.30	1.1	1.00	3.10	2.2
98/3	0.9	0.6	1.60	1.80	0.7	1.3	1.4	1.7
98/4	1.5	1.1	2.6	1	1.20	1.7	1.8	1.2
98/5	0.75	0.8	0.5	0.70	0.7	1	1.80	1.7
98/6	0.55	0.5	1.8	1	0.85	1.0	3.9	5.3
98/7	0.55	0.5	0.6	0.55	0.5	0.6	0.9	0.75
98/8	0.7	0.7	0.7	0.75	0.8	0.7	0.8	0.8
98/9	1.3	1.80	1.3	1.4	1.50	1.8	1.3	0.95
98/10	2.8	2.2	2.9	2.9	3.4	4.3	3.8	3.5
98/11	2.2	3.10	3.30	3.30	3.20	1.90	1.7	1.7
98/12	0.9	0.60	0.65	0.6	0.80	1.1	1.2	1
99/1	1	1.70	1.60	1.70	2.00	1.20	2.10	1.8
99/2	1.1	1.00	1.90	1.10	0.75	1.00	0.90	1.00
99/3	1.3	0.8	1.3	1.2	1.6	1.4	1	0.8
99/4	0.9	1.7	0.65	0.9	0.9	1.3	1.20	1.6
99/5	1.4	1.6	1.10	1.1	1.9	1.5	1.0	1.2
99/6	0.90	0.95	0.8	0.65	1.50	1.7	3.8	3.7
99/7	0.3	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5	0.65	0.55
99/8	0.75	0.8	0.6	0.6	0.55	1.0	1.50	1.2
99/9	1.30	1.40	1.2	1.5	1.40	1.5	3.1	4.10
99/10	0.75	0.90	1.2	1.20	2.10	1.7	1.6	1.90
99/11	1.20	1.00	1.6	1.9	1.70	1.6	1.5	1.00
99/12	1.40	0.95	0.90	1.10	1.10	0.8	0.8	0.55
100/1	0.60	0.60	0.65	1.10	0.65	0.50	0.80	0.90
100/2	0.50	0.60	0.75	0.50	0.60	0.8	0.7	0.70
100/3	1.2	1.20	1.3	2.1	1.20	1.1	1.4	1.10
100/4	0.25	0.40	0.5	0.5	0.45	0.4	0.5	0.50
100/5	0.70	1.8	0.65	0.7	1.1	0.8	0.5	1.3
100/6	1.1	0.90	1.2	1.3	1.6	1.00	1.50	1.6
100/7	0.55	0.65	1.2	1.3	0.70	0.90	0.45	0.75
100/8	0.40	0.45	0.7	0.55	0.50	0.45	0.80	0.60
100/9	0.55	1.1	0.35	0.4	2.2	2.1	1.1	2.9
100/10	1.1	0.85	0.80	0.85	0.65	0.90	0.65	0.80
100/11	0.30	0.45	0.85	0.85	1.8	2.1	4.3	2.9
100/12	1.50	1.40	1.7	1.20	1.6	1.2	1.4	1.2
101/1	1.2	0.95	0.95	0.90	0.95	1.2	0.80	1.3
101/2	0.55	0.65	1.0	0.65	1.3	0.90	0.70	0.85
101/3	0.75	0.70	0.70	0.40	0.60	0.50	0.95	0.90
101/4	1.1	0.80	1.0	1.3	0.65	1.1	1.1	1.2
101/5	0.70	0.50	1.0	1.4	0.65	0.65	11	11
101/6	2.1	1.4	1.3	2.1	1.2	1.4	3.7	3.8

註："-"表無測值。

表3.1-46 核四施工環境監測101年第2季與去年同季海域生態環境因子比較

比較類別		上季 101年2月	本季 101年5月	去年同季 100年5月	比較結果（註）
硝酸鹽 (μg/L)	範圍	25.62~108.02	4.40~79.51	13.67~34.14	互有高低
	平均	50.84	26.59	22.73	相似
亞硝酸鹽 (μg/L)	範圍	<0.42~6.09	<0.42~1.83	<0.42~1.22	相似
	平均	1.56	1.2	0.8	相似
磷酸鹽 (μg/L)	範圍	<0.93~3.59	<0.93	<0.93	相似
	平均	2.81	<0.93	<0.93	相似
矽酸鹽 (μg/L)	範圍	237.14~792.74	57.51~520.26	97.18~203.81	互有高低
	平均	295.28	158.66	114.1	較高於去年同季
葉綠素 *a* (μg/L)	範圍	0.04~0.13	0.08~0.50	0.02~0.46	較高於去年同季
	平均	0.08	0.26	0.12	較高於去年同季
總氮 (mg/L)	範圍	0.03~0.11	0.03~0.10	0.02~0.06	較高於去年同季
	平均	0.05	0.05	0.04	較高於去年同季
總磷 (mg/L)	範圍	0.01~0.20	0.02~0.12	0.02~0.19	較低於去年同季
	平均	0.02	0.03	0.05	較低於去年同季
環境因子綜合分析		海域各測站環境因子調查結果顯示，營養鹽中的硝酸鹽濃度介於4.40~79.51μg/L；亞硝酸鹽濃度介於<0.42~1.83μg/L，多數測站的垂直變化不大；磷酸鹽濃均低於方法偵測極限(<0.93μg/L)；矽酸鹽濃度介於57.51~ 520.26μg/L，多數測站並無明顯水層濃度變化；葉綠素*a* 含量介於0.08 ~ 0.50μg Chl a/L之間；總氮各測值介於0.03 ~ 0.10 mg/L，總磷各測值介於0.02 ~ 0.12 mg/L，各測站水平及垂直分布間的濃度變化不大，測值呈現較為均勻分佈的現象。			

註: 比較結果係指以本季與去年同季的結果作為比較研判標準。

表3.1-47 核四施工環境監測101年第2季與去年同季海域生態生物因子比較

生態或生物因子		比較類別	上季 101年2月	本季 101年5月	去年同季 100年5月	比較結果(註3)
基礎生產力(註1) (μgC/L/h)		平均值	0.31	0.84	0.38	較高於去年同季
浮游植物細胞含量 (cells/L)		表層水(0 m)	4,750	12,100	2,170	較高於去年同季
		中層水(3 m)	7,260	6,890	1,650	較高於去年同季
		底層水(10 m)	6,420	6,690	919	較高於去年同季
		優勢種類	旋鏈角刺藻 菱形海線藻	鐵氏束毛藻(0m) 旋鏈角刺藻(3m) 旋鏈角刺藻(底層)	鐵氏束毛藻 原甲藻 海洋原甲藻	部分相似
浮游動物含量 (ind./1,000m^3)		個體量	39,300	27,200	414,000	較低於去年同季
		生物量	41	106	390	較低於去年同季
		橈腳類比例	45.37%	23.37%	15.83%	較高於去年同季
底棲無脊椎動物(註2) 種類數		潮間帶沙質	1	1	3	略低於去年同季
		潮間帶岩礁	24	22	19	略高於去年同季
		亞潮帶沙質	2-5	1-8	3-8	相似
		亞潮帶岩礁	2-8	3-7	2-9	略低於去年同季
魚類	1.魚卵(註1)	密度含量	60	708	169	高於去年同季
	2.仔稚魚(註1)	密度含量	12	52	30	高於去年同季
	3.成魚	種類數	67	83	74	高於去年同季
		歧異指數(註4)	2.99	3.13	2.66	高於去年同季
大型海藻種類數(註2)		潮間帶(註5)	13-18	10-15	13-16	稍有減少
		亞潮帶	8-10	10-18	7-19	稍有增加
珊瑚(註2)		種類數	3-13	4-10	4-20	較低於去年同季
		覆蓋率,%	2.55-21.44	1.85-28.70	3.14-32.33	略低於去年同季
生物因子綜合分析		浮游植物細胞含量與去年同季相較為高且與上季相較為增加趨勢，在優勢種類主要以矽藻的旋鏈角刺藻為優勢種，其中0m水層以鐵氏束毛藻較為優勢，相似於去年同季的0m水層，數量上較高於去年同季與上季，可能是受到季節變動的影響仍要繼續觀察其藻種的變動及數量上的變動。浮游動物含量個體量雖較去年同季相較降低的變動，而生物量則是低於我去年同季，但相較於上季有增加，未來仍需繼續觀察。本季橈腳類比例在分佈上相較於去年同季有增加的變動，但相較上季比例降低，仍須繼續留意觀察監測。而本季底棲無脊椎動物潮間帶岩礁種類數、魚卵密度含量、仔稚魚密度含量、成魚種類數及歧異指數、大型藻類種類數皆較高於去年同季，而底棲無脊椎動物亞潮帶岩礁種類數、大型藻類種類數潮間帶、珊瑚種類數及覆蓋率皆相較略低於去年同季，其餘生物因子則變動不大。				

註1.基礎生產力的單位為μgC/L/hr，魚卵及仔稚魚密度含量的單位分別為個/1,000m^{3}及尾/1,000m^3。

註2.亞潮帶底棲無脊椎動物、大型海藻與珊瑚調查為橫截線調查法，長度為10m。

註3.比較結果係指本季與去年同季的測值比較為研判標準。

註4.歧異指數計算式採用$H'=-P_i\Sigma\log_2 P_i$。

註5.不包括水深3m以淺潮下帶。

表3.1-48 核四施工環境101年第2季海域生態指標性物種監測比對

類別	指標物種	物種比對內容	上季 101年2月	本季 101年5月	去年同季 100年5月	比對結果(註2)
1.浮游植物	矽藻細胞數 (cells/L)	表層水(0 m)	4,370	7,330	603	較高於去年同季
		中層水(3 m)	6,760	6,320	595	較高於去年同季
		底層水(10 m)	6,300	6,440	447	較高於去年同季
2.浮游動物	哲水蚤個體量	ind./10^3m^3	10,044	5,087	45,000	較低於去年同季
3.底棲動物						
潮間帶岩礁	黑瘤海蜷	鹽寮	0	1	0	相似
	個體數	澳底	158	106	344	較低於去年同季
	黑齒牡蠣	鹽寮	27	63	74	略低於去年同季
	個體數	澳底	1	113	7	較高於去年同季
亞潮帶岩礁(註4,5)	瘤菟葵	大礁	54	22	47	較低於去年同季
	覆蓋率(%)	淺礁	2	1	13	較低於去年同季
	白尖紫叢海膽	大礁	1	3	1	相似
	覆蓋率(%)	淺礁	20	15	12	略高於去年同季
4.珊瑚礁魚類	霓虹雀鯛	鹽寮	900	1,050	900	較高於去年同季
	尾數	澳底	1,000	650	800	較低於去年同季
	燕尾光鰓雀鯛	鹽寮	0	130	110	較高於去年同季
	尾數	澳底	116	0	0	相同
5.大型藻類						
潮間帶(註1)	石花菜	鹽寮	+	+++	+++	相似
		澳底	+	+++	+++	相似
亞潮帶岩礁(註3)	太平洋寬珊藻	大礁	6.66	7.66	9.45	略低於去年同季
	覆蓋率	淺礁	3.23	7.26	4.00	較高於去年同季
	貝狀耳殼藻	大礁	9.74	2.14	1.09	略高於去年同季
	覆蓋率	淺礁	7.84	5.33	1.93	較高於去年同季
6.珊瑚(註4,5)	菊珊瑚	大礁	12	8	9	略低於去年同季
	群體數	淺礁	8	14	9	較高於去年同季
	腦紋珊瑚	大礁	0	0	4	略低於去年同季
	群體數	淺礁	1	0	5	略低於去年同季
	微孔珊瑚	大礁	5	6	11	略低於去年同季
	群體數	淺礁	12	24	13	較高於去年同季
海域生態指標物種 比對綜合分析	本季指標性物種矽藻細胞數、澳底黑齒牡蠣個體數、淺礁白尖紫叢海膽覆蓋率、鹽寮霓虹雀鯛尾數、淺礁太平洋寬珊藻覆蓋率、貝狀耳殼藻覆蓋率、淺礁菊珊瑚群體數、淺礁微孔珊瑚群體相較於去年同季高，哲水蚤個體量、澳底黑瘤海蜷個體數、鹽寮黑齒牡蠣、瘤菟葵覆蓋率、澳底霓虹雀鯛尾數、大礁太平洋寬珊藻覆蓋率、大礁菊珊瑚群體數、腦紋珊瑚群體數、大礁微孔珊瑚群體數較低於去年同季，其餘指標性物種則差異不大。本季多項指標物種的生態測值與去年同季比較，雖多項測值有略為降低變動（26項測值中，有11項），但其他一些指標性物種測值仍顯示較大的季節上變動，於往後之調查仍將持續監測追蹤。					

註1:大型藻類潮間帶以水深3公尺以淺的潮下帶做比對。

註2:比對結果係指本季與去年同季的測值比較為研判標準。

註3:大礁與淺礁藻類覆蓋率係將水深5m與水深10m兩個數值平均。

註4:大礁與淺礁底棲生物個體數與珊瑚群體數係將水深5m與水深10m兩個數值合併計算。

註5:菊珊瑚包括*Favia speciosa & F. favus* 兩種, 腦紋珊瑚包括*Platygyra* spp.等種,
微孔珊瑚包括*Porites lobata & P. lichen* 兩種, 白尖紫叢海膽*Echinostrephus aciculatus* 種。

表3.1-49 環境因子施工前與施工後比較

比較類別	單位	施工前	施工後	施工前後比較
葉綠素甲	μg/L	1.40	0.41	低於施工前
基礎生產力	μgC/L/hr	0.50	0.93	高於施工前
硝酸鹽	μg/L	93.10	40.50	低於施工前
亞硝酸鹽	μg/L	10.60	6.20	低於施工前
磷酸鹽	μg/L	28.30	7.07	低於施工前
矽酸鹽	μg/L	255.00	172.94	低於施工前
總氮	mg/L	0.16	0.11	與施工前差異不大
總磷	mg/L	0.09	0.03	低於施工前

註:88年7月為海上施工, 施工前為82年8月至88年4月, 施工後為88年7月至97年8月

表3.1-50 生物因子施工前與施工後比較

比較類別	單位	施工前	施工後	施工前後比較
浮游植物細胞數	100 cells/L	474	426	低於施工前
浮游動物個體數	10^3ind./1000 m^3	95	615	高於施工前
魚卵密度含量	個/1000 m^3	1,264	1,207	略低於施工前
仔稚魚密度含量	尾/1000 m^3	81	578	高於施工前

註:88年7月為海上施工, 施工前為82年8月至88年4月, 施工後為88年7月至97年8月

表 3.1-51 核四施工環境監測遊憩區歷年遊客人次統計結果

單位：人次

地點 / 日期	鹽寮海濱公園	龍門公園	福隆海水浴場	地點 / 日期	鹽寮海濱公園	龍門公園	福隆海水浴場
83/07	17,294	未監測	23,092	87/11	關閉整修中	無門票紀錄	4,532
83/08	10,798	未監測	11,669	87/12	關閉整修中	無門票紀錄	2,274
83/09	11,065	未監測	7,525	88/01	關閉整修中	769	2,095
83/10	7,168	未監測	關閉	88/02	關閉整修中	617	3,983
83/11	4,624	未監測	關閉	88/03	關閉整修中	853	1,525
83/12	2,180	未監測	關閉	88/04	關閉整修中	1,352	5,498
84/01	3,762	未監測	關閉	88/05	關閉整修中	1,652	6,750
84/02	3,565	未監測	關閉	88/06	關閉整修中	2,106	11,631
84/03	2,246	未監測	關閉	88/07	關閉整修中	4,381	19,812
84/04	5,611	未監測	關閉	88/08	關閉整修中	9,195	15,488
84/05	6,037	未監測	關閉	88/09	關閉整修中	6,472	7,605
84/06	-	未監測	關閉	88/10	關閉整修中	3,761	4,236
84/07	566	未監測	關閉	88/11	關閉整修中	3,021	3,503
84/08	21,440	未監測	關閉	88/12	關閉整修中	4,103	2,183
84/09	14,200	未監測	關閉	89/01	3,250	1,209	2,625
84/10	14,120	未監測	關閉	89/02	2,959	983	4,046
84/11	9,800	未監測	關閉	89/03	3,654	1,208	2,414
84/12	8,578	未監測	關閉	89/04	5,360	2,051	6,186
85/01	8,028	未監測	關閉	89/05	6,284	8,415	7,118
85/02	5,548	未監測	關閉	89/06	3,572	12,152	11,373
85/03	9,832	未監測	關閉	89/07	7,350	23,582	36,816
85/04	6,906	未監測	關閉	89/08	8,200	18,577	16,977
85/05	9,594	未監測	關閉	89/09	7,300	15,837	8,912
85/06	13,138	未監測	關閉	89/10	3,500	14,954	-
85/07	18,100	未監測	關閉	89/11	2,750	無門票紀錄	暫停開放
85/08	關閉整修中	未監測	關閉	89/12	4,700	無門票紀錄	暫停開放
85/09	關閉整修中	未監測	關閉	90/01	4,300	1,006	暫停開放
85/10	關閉整修中	未監測	關閉	90/02	3,750	793	暫停開放
85/11	關閉整修中	未監測	關閉	90/03	4,300	1,319	暫停開放
85/12	關閉整修中	未監測	關閉	90/04	4,500	1,853	暫停開放
86/01	關閉整修中	未監測	關閉	90/05	7,500	6,514	3,579
86/02	關閉整修中	未監測	關閉	90/06	4,000	9,893	9,198
86/03	關閉整修中	未監測	關閉	90/07	10,988	21,529	18,515
86/04	關閉整修中	未監測	關閉	90/08	11,531	10,683	11,520
86/05	關閉整修中	未監測	關閉	90/09	23,506	5,289	841(5/16~5/31)
86/06	關閉整修中	未監測	6,773	90/10	9,399	10,274	暫停開放
86/07	關閉整修中	7,874	18,127	90/11	2,586	1,529	暫停開放
86/08	關閉整修中	3,974	9,958	90/12	7,295	2,607	暫停開放
86/09	關閉整修中	3,764	10,407	91/01	7,295	842	暫停開放
86/10	關閉整修中	4,252	5,938	91/02	3,001	1,352	暫停開放
86/11	關閉整修中	3,149	3,003	91/03	2,358	2,176	暫停開放
86/12	關閉整修中	1,836	2,028	91/04	3,245	2,538	暫停開放
87/01	關閉整修中	1,473	2,061	91/05	3,988	5,960	暫停開放
87/02	關閉整修中	1,528	2,177	91/06	5,199	6,374	5,483
87/03	關閉整修中	2,358	2,950	91/07	18,865	30,143	18,362
87/04	關閉整修中	3,542	5,928	91/08	5,612	9,938	9,693
87/05	關閉整修中	3,984	8,412	91/09	988	7,692	2,217
87/06	關閉整修中	4,153	9,247	91/10	1,713	11,970	1,108
87/07	關閉整修中	9,765	26,345	91/11	864	1,697	暫停開放
87/08	關閉整修中	14,420	28,879	91/12	1,265	474	暫停開放
87/09	關閉整修中	3,842	5,972	92/01	1,711	844	暫停開放
87/10	關閉整修中	無門票紀錄	5,096	92/02	4,907	821	暫停開放

註：1.鹽寮海濱公園於 85 年 8 月起因颱風之故，關閉整修至 89 年農曆春節後方重新開放，惟採自由入園不出售門票，故此段期間門票記錄為推估值，至 90/7 方開始售票。 2.龍門公園為 86/7 起新增之遊憩調查地點。 3.福隆海水浴場/自 83/10 暫停開放後，至 86/6/7 方重新開放售票。該海水浴場受東北季風影響，約於每年 10、11 月暫停開放至翌年 5、6 月。

資料來源：東北角海岸國家風景區管理處提供。

表 3.1-51 核四施工環境監測遊憩區歷年遊客人次統計結果（續）

單位：人次

地點 / 日期	鹽寮海濱公園	龍門公園	福隆海水浴場	地點 / 日期	鹽寮海濱公園	龍門公園	福隆海水浴場
92/03	4,057	1,790	暫停開放	96/11	334	1,788	1,460
92/04	2,370	1,243	暫停開放	96/12	561	764	3,548
92/05	5,186	902	暫停開放	97/01	146	193	4,235
92/06	7,094	5,174	4,153	97/02	161	944	2,081
92/07	8,179	21,430	168,179	97/03	600	916	7,196
92/08	5,821	9,885	9,843	97/04	784	1,970	13,807
92/09	1,983	9,164	5,739	97/05	524	3,571	7,997
92/10	2,072	10,142	1,050	97/06	741	3,453	24,478
92/11	關閉整修中	1,582	暫停開放	97/07	3,286	6,079	533,670
92/12	關閉整修中	436	暫停開放	97/08	2,893	5,505	13,596
93/01	關閉整修中	806	暫停開放	97/09	295	4,189	8,632
93/02	關閉整修中	813	暫停開放	97/10	902	9,812	6,833
93/03	關閉整修中	2,197	暫停開放	97/11	779	3,322	2,428
93/04	關閉整修中	4,857	暫停開放	97/12	293	1,077	3,509
93/05	4,493	5,475	暫停開放	98/01	1,866	1,152	15,331
93/06	7,286	4,601	4,505	98/02	447	1,467	10,397
93/07	8,326	23,168	313,518	98/03	584	2,418	3,557
93/08	21,088	11,962	11,083	98/04	1,348	2,196	6,512
93/09	5,308	8,716	暫停開放	98/05	5,355	7,267	37,176
93/10	3,570	7,539	12,600 (3)	98/06	670	3,146	29,855
93/11	2,395	8,762	15,709 (3)	98/07	1,378	7,918	525,584
93/12	1,581	1,295	18,095 (3)	98/08	1,287	4,684	30,674
94/01	1,284	1,854	17,954 (3)	98/09	450	4,399	8,419
94/02	1,940	983	5,530 (3)	98/10	229	5,130	2,996
94/03	3,008	2,352	7,018 (3)	98/11	403	1,508	1,790
94/04	4,626	4,352	9,599	98/12	223	1,493	911
94/05	4,968	5,218	9,632	99/01	316	765	2,086
94/06	8,556	4,217	6,279	99/02	216	1,518	1,175
94/07	11,659	22,106	17,826	99/03	248	725	1,343
94/08	11,309	7,836	210,169	99/04	341	1,349	1,583
94/09	3,867	9,213	776	99/05	357	3,378	19,154
94/10	6,682	7,619	14,361	99/06	720	3,719	80,906
94/11	3,462	1,745	10,048	99/07	1,808	8,180	599,473
94/12	1,322	1,352	8,749	99/08	1,333	4,776	22,771
95/01	2,718	1,625	7,139	99/09	362	4,097	9,069
95/02	1,986	1,327	10,406	99/10	204	6,019	2,161
95/03	2,564	2,347	4,543	99/11	173	1,564	603
95/04	4,592	4,229	施工未開放	99/12	105	1,223	1,556
95/05	5,124	5,011	施工未開放	100/1	12	1,082	279
95/06	4,590	3,249	9,247	100/2	338	678	4,010
95/07	4,249	17,438	307,505	100/3	107	527	1,394
95/08	3,392	9,346	20,325	100/4	335	2,311	12,726
95/09	1,044	8,303	7,196	100/5	655	3,208	138,147
95/10	1,263	12,176	8,076	100/6	1,028	4,076	167,363
95/11	1,011	2,425	3,321	100/7	1,136	8,530	805,316
95/12	322	1,822	2,360	100/8	436	3,558	11,911
96/01	344	924	2,089	100/9	730	7,389	11,232
96/02	1,044	2,790	9,838	100/10	400	8,506	3,652
96/03	345	456	3,359	100/11	255	2,304	1,914
96/04	668	2,301	6,066	100/12	105	1,334	502
96/05	818	1,667	7,243	101/1	183	1,110	1,484
96/06	2,218	4,338	12,586	101/2	88	817	1,140
96/07	6,434	6,500	432,915	101/3	233	2,348	2,564
96/08	3,348	3,840	13,596	101/4	259	3,789	11,760
96/09	3,524	7,364	8,632	101/5	462	3,502	137,621
96/10	1,047	5,478	3,059	101/6	527	4,497	106,926

註：1.鹽寮海濱公園於 85 年 8 月起因颱風之故，關閉整修至 89 年農曆春節後方重新開放，惟採自由入園不出售門票，故此段期間門票記錄為推估值，至 90/7 方開始售票。　2.龍門公園為 86/7 起新增之遊憩調查地點。

3.福隆海水浴場/自 83/10 暫停開放後，至 86/6/7 方重新開放售票。該海水浴場受東北季風影響，約於每年 10、11 月暫停開放至翌年 5、6 月。

資料來源：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供。

表 3.1-52 核四施工環境監測景觀品質調查結果評分表

月份 \ 觀景點		1 號	2 號	3 號	4 號	5 號(西向)	5 號(北向)	7 號	天氣
88 年	1 月份	32	34	26	22	28	--	--	雨
	2 月份	32	34	26	20	28	--	--	晴
	3 月份	32	34	26	20	28	--	--	晴
	4 月份	32	34	26	20	28	--	--	雨
	5 月份	32	34	26	20	28	--	--	雨
	6 月份	32	34	26	20	28	28	--	晴
	7 月份	34	34	26	20	28	28	--	晴
	8 月份	34	34	26	20	28	28	--	晴
	9 月份	34	34	26	20	28	28	--	晴
	10 月份	34	34	26	20	28	28	--	陰
	11 月份	34	34	26	20	28	28	--	陰
	12 月份	34	34	26	20	28	28	--	陰
89 年	1 月份	34	34	26	20	28	28	--	雨
	2 月份	34	34	26	20	28	28	--	雨
	3 月份	34	34	26	20	28	28	--	陰
	4 月份	34	34	26	20	28	28	--	晴
	5 月份	34	34	26	20	28	28	--	晴
	6 月份	34	34	26	20	28	28	--	晴
	7 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
	8 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
	9 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
	10 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
90 年	2 月份	34	34	26	20	28	27	24	陰
	3 月份	34	34	26	20	28	27	24	陰
	4 月份	34	34	26	20	28	27	24	陰
	5 月份	34	34	26	20	28	27	24	陰
	6 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
	7 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
	8 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
	9 月份	34	34	26	20	28	27	24	晴
	10 月份	32	34	14	20	28	27	26	陰
	11 月份	32	34	14	20	28	27	26	晴
	12 月份	32	34	14	20	28	27	26	晴
91 年	1 月份	34	34	14	20	28	27	26	晴
	2 月份	34	34	14	20	28	27	26	晴
	3 月份	34	34	14	20	28	27	26	晴
	4 月份	34	34	14	20	28	27	26	晴
	5 月份	34	34	14	20	28	27	26	陰
	6 月份	34	34	14	20	28	27	26	晴
	7 月份	32	34	14	20	28	27	26	晴
	8 月份	32	34	14	20	28	27	26	晴
	9 月份	32	34	14	20	28	27	26	晴
	10 月份	32	34	14	20	28	26	26	陰
	11 月份	32	34	14	20	28	26	26	陰
	12 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
92 年	1 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	2 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	3 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	4 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	5 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	6 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	7 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	8 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	9 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	10 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	11 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	12 月份	32	34	14	20	28	26	26	陰有雨

表 3.1-52 核四施工環境監測景觀品質調查結果評分表(續 1)

月份 \ 觀景點		1 號	2 號	3 號	4 號	5 號(西向)	5 號(北向)	7 號	天氣
93 年	1 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	2 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	3 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	4 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	5 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	6 月份	32	34	14	20	28	26	26	晴
	7 月份	20	34	16	20	28	26	26	晴
	8 月份	20	34	16	20	28	26	26	陰
	9 月份	20	34	16	20	28	26	26	晴
	10 月份	20	34	16	20	28	26	26	晴
	11 月份	20	34	16	20	28	26	26	陰
	12 月份	20	34	16	20	28	26	26	陰
94 年	1 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	2 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	3 月份	20	34	18	20	28	26	26	陰
	4 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	5 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	6 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	7 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	8 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	9 月份	20	34	18	20	28	26	26	陰
	10 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	11 月份	20	34	18	20	28	26	26	晴
	12 月份	20	34	18	20	28	26	26	陰
95 年	1 月份	20	34	20	20	28	26	26	晴
	2 月份	20	34	20	20	28	26	26	晴
	3 月份	20	34	20	20	28	26	26	晴
	4 月份	20	34	20	20	28	26	26	陰
	5 月份	20	34	20	20	28	26	26	陰
	6 月份	20	34	20	20	28	26	26	晴
	7 月份	20	34	20	20	28	26	26	陰
	8 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	9 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	10 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	11 月份	20	34	20	19	26	26	26	雨
	12 月份	20	34	20	19	26	26	26	雨
96 年	1 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	2 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	3 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	4 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	5 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	6 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	7 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	8 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	9 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	10 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	11 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	12 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
97 年	1 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	2 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	3 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	4 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	5 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	6 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	7 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	8 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	9 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	10 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	11 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	12 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴

表 3.1-52 核四施工環境監測景觀品質調查結果評分表(續 2)

月份 \ 觀景點		1 號	2 號	3 號	4 號	5 號(西向)	5 號(北向)	7 號	天氣
98 年	1 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	2 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	3 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	4 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	5 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	6 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	7 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	8 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	9 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	10 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	11 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	12 月份	20	34	20	19	26	26	26	雨
99 年	1 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	2 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	3 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	4 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	5 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	6 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	7 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	8 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	9 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	10 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	11 月份	20	34	20	19	26	26	26	雨
	12 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
100 年	1 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	2 月份	20	34	20	19	26	26	26	雨
	3 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	4 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	5 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	6 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	7 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	8 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	9 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	10 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	11 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	12 月份	20	34	20	19	26	26	26	雨
101 年	1 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	2 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	3 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴
	4 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	5 月份	20	34	20	19	26	26	26	陰
	6 月份	20	34	20	19	26	26	26	晴

註：本表係依據附錄Ⅱ表Ⅱ.13-1 之評分項目予以評定；景觀品質調查自 83 年 9 月開始執行，本表中資料統計自 88/1 迄今（87 年前之資料詳各年年報），其中 89/11 至 90/1 核四停建期間未進行調查。

表 3.1-53 核四施工環境監測海域漂砂捕砂器砂樣成分變化

點位 / 時間	S1	S2	S3	S4	S5
94年5月17~18日	細砂	細砂	細砂	-	-
94年9月14~15日	細砂	中砂	細砂	-	-
94年11月1~3日	細砂~中砂	細砂~中砂	細砂	-	-
95年2月14~15日	細砂	細砂	極細砂~細砂	-	-
95年5月3~4日	細砂	細砂~中砂	中砂	-	-
95年8月16~17日	細砂	細砂	細砂	-	-
95年10月18~19日	細砂	細砂	細砂~中砂	-	-
96年3月13~14日	細砂	細砂	細砂	-	-
96年6月7~8日	細砂	細砂	極細砂~細砂	-	-
96年8月23~24日	細砂	極細砂~細砂	極細砂~細砂	-	-
96年10月22~23日	細砂	細砂~中砂	極細砂~細砂	-	-
97年3月5~6日	細砂	細砂	極細砂~細砂	-	-
97年5月30~31日	細砂	細砂	極細砂~細砂	-	-
97年8月27~28日	細砂	細砂	細砂	-	-
97年12月9~10日	細砂	細砂	細砂	-	-
98年3月11~12日	細砂	細砂	細砂	-	-
98年5月7~8日	細砂	細砂	極細砂~細砂	-	-
98年7月14~15日	細砂	細砂	細砂	-	-
98年10月29~30日	細砂	極細砂~細砂	極細砂	-	-
99年3月17~18日	中砂	細砂~中砂	細砂	-	-
99年5月26~27日	細砂~中砂	細砂	細砂	細砂	粉砂~細砂
99年8月17~18日	細砂	中砂	細砂	細砂	細砂
99年11月05~06日	細砂~中砂	中砂	中砂	細砂	細砂
100年3月02~03日	中砂	細砂~中砂	細砂	細砂	細砂
100年4月20~21日	細砂~中砂	細砂	細砂~中砂	細砂	細砂
100年8月17~18日	細砂~中砂	中砂	中砂	細砂~中砂	粉砂~細砂
100年11月23~24日	細砂~中砂	細砂	細砂	細砂	細砂
101年3月6~7日	細砂	細砂	細砂	細砂	細砂
101年6月10~11日	細砂	細砂	細砂	細砂	細砂

註：1.捕砂器採樣成分分析自民國 94 年 5 月新增；S4 與 S5 測站為 99 年 5 月新增。
2.砂樣成分以平均粒徑區分。
3.粉砂(4~62.5μm)，極細砂(62.5~125μm)，細砂(125~250μm)，中砂(250~500μm)。

表 3.1-54 運動底質平均粒徑比較

單位：μm

測　點	94/5	94/9	94/11	95/2	95/5	95/8	95/10	96/3	96/6	96/8	96/10	97/3	97/6	97/8	97/12
S1-N	186.7	223.1	223.1	196.3	214.6	188.5	189.9	204.0	180.1	107.0	188.1	172.9	178.7	198.5	206.5
S1-NE	192.0	230.5	223.3	225.0	236.4	201.6	223.3	217.3	203.1	112.6	196.5	180.5	204.8	190.1	214.5
S1-E	200.4	220.8	240.0	228.8	238.2	205.5	205.9	220.9	192.9	109.9	214.6	193.1	201.6	199.7	206.8
S1-SE	200.1	227.0	264.9	208.4	210.5	202.3	197.6	209.6	171.7	95.62	197.3	183.8	175.1	184.3	196.8
S1-S	178.1	227.1	221.7	201.4	194.9	199.1	196.2	205.8	170.2	134.1	163.9	162.6	172.8	166.6	187.6
S1-SW	180.9	222.5	210.7	210.2	211.9	203.6	203.8	215.9	198.8	110.2	165.8	179.6	206.3	201.7	202.7
S1-W	197.8	223.3	215.0	236.4	239.7	187.5	210.6	236.3	193.6	105.2	204.2	186.4	206.6	210.1	218.4
S1-NW	191.2	219.9	230.4	211.4	236.5	204.7	200.4	217.6	188.6	108.8	196.4	156.1	208.1	181.7	205.9
S2-N	221.3	261.4	264.8	197.2	207.6	233.8	215.5	176.1	183.9	172.3	245.5	136.7	166.4	148.3	223.7
S2-NE	179.3	259.8	249.8	218.4	238.5	229.5	214.4	168.1	203.7	167.4	268.9	137.2	166.3	150.0	244.8
S2-E	195.0	263.2	226.1	197.9	232.1	210.5	201.9	181.8	194.5	168.7	278.4	136.5	163.1	149.0	230.8
S2-SE	215.0	282.3	295.1	189.4	201.1	226.7	220.5	150.2	153.1	172.8	258.9	149.7	137.7	133.5	205.6
S2-S	184.0	280.2	286.6	192.7	234.3	229.8	247.9	178.6	204.8	175.1	267.0	129.6	158.7	149.2	220.3
S2-SW	178.9	255.3	245.9	202.4	259.7	221.4	248.4	192.6	235.0	176.0	274.5	141.5	179.6	164.2	224.6
S2-W	209.3	283.6	228.4	232.0	219.8	200.8	231.6	166.3	193.4	177.5	298.6	153.3	164.0	160.9	238.1
S2-NW	213.7	274.9	265.0	188.6	204.6	238.7	188.5	153.6	205.8	168.8	287.3	140.7	134.8	135.9	215.3
S3-N	180.5	183.5	161.7	130.4	259.5	220.3	227.1	128.4	128.9	99.13	143.0	133.9	140.9	134.2	159.6
S3-NE	181.7	182.9	170.1	134.1	316.7	237.8	203.3	127.8	141.9	107.0	143.4	121.2	146.5	145.4	159.4
S3-E	180.3	157.1	147.3	131.5	299.2	238.1	177.7	123.4	121.7	111.4	129.8	129.0	144.7	146.7	156.1
S3-SE	187.2	149.2	112.3	118.4	276.2	220.0	252.5	128.4	117.0	93.53	117.1	114.0	129.7	146.0	129.1
S3-S	214.9	157.0	113.1	127.2	270.6	245.6	227.3	130.6	134.7	133.8	135.3	134.3	134.9	138.3	153.5
S3-SW	195.1	160.6	101.9	123.2	279.7	247.8	219.4	128.1	156.4	67.22	148.3	137.5	152.1	137.5	162.1
S3-W	190.9	160.3	108.6	129.9	254.8	226.9	196.1	131.3	140.7	99.84	132.2	119.2	124.7	146.6	157.6
S3-NW	212.4	162.6	108.1	138.9	237.8	210.7	193.1	129.3	124.1	100.6	124.0	135.8	125.8	141.4	150.2

表 3.1-54 運動底質平均粒徑比較（續）

單位：μm

測　點	98/3	98/5	98/7	98/10	99/3	99/5	99/8	99/11	100/3	100/4	100/8	100/11	101/3	101/6
S1-N	227.7	213.1	237.2	237.3	302.6	214.3	216.3	230.0	298.8	354.2	272.5	264.0	144.5	213.7
S1-NE	226.4	215.8	203.0	240.8	313.1	228.1	205.4	254.2	291.5	317.9	212.2	279.1	143.5	205.8
S1-E	225.8	219.4	199.9	246.9	308.1	235.2	226.6	268.3	266.6	269.1	216.2	266.9	144.8	208.2
S1-SE	211.7	217.6	221.4	217.5	279.4	263.5	249.2	253.8	287.8	291.6	226.0	255.5	134.9	208.6
S1-S	209.1	207.8	210.5	199.3	293.9	281.8	210.4	234.8	303.4	240.8	222.9	267.0	143.3	216.7
S1-SW	226.4	209.4	205.4	208.6	279.1	238.1	208.5	273.6	341.4	304.3	220.3	304.5	153.0	203.1
S1-W	241.8	223.3	204.1	227.4	346.0	284.3	205.1	260.9	294.1	309.6	213.9	236.0	144.8	202.5
S1-NW	239.3	211.5	207.2	238.9	310.9	285.0	211.7	284.5	293.4	365.0	241.7	237.3	140.6	204.2
S2-N	196.6	192.7	195.1	152.6	308.1	195.6	292.8	288.5	233.3	196.9	190.4	180.3	225.9	183.3
S2-NE	204.1	203.0	196.8	191.4	300.3	186.9	306.5	327.8	238.5	203.1	222.9	179.4	230.1	209.3
S2-E	218.1	193.0	179.4	149.0	232.4	182.8	303.8	321.1	239.0	184.1	230.3	190.7	231.7	179.9
S2-SE	166.0	159.1	192.3	141.5	231.2	177.1	275.6	308.3	219.9	180.7	199.8	188.4	195.5	172.0
S2-S	195.5	189.2	242.2	177.6	322.8	186.3	313.9	310.3	251.9	175.8	242.3	172.6	228.0	191.1
S2-SW	215.0	208.2	205.1	202.6	286.2	164.5	315.5	334.4	269.4	207.3	200.3	182.8	228.5	192.7
S2-W	204.6	216.5	128.0	155.8	236.0	182.2	291.9	323.3	259.6	193.1	202.4	185.0	202.5	178.1
S2-NW	183.8	183.3	169.5	122.8	227.6	185.7	286.5	292.9	189.0	179.4	221.0	153.9	196.0	192.3
S3-N	158.7	135.3	167.6	111.3	161.1	158.7	135.3	268.1	150.0	232.7	187.8	192.1	215.6	169.4
S3-NE	144.2	130.7	127.4	125.0	187.1	144.2	130.7	288.1	177.5	283.3	224.8	195.8	220.3	224.8
S3-E	141.5	126.0	135.0	124.3	162.6	141.5	126.0	263.8	184.0	223.7	207.3	191.0	212.8	229.5
S3-SE	131.2	119.8	125.9	118.0	171.2	131.2	119.8	315.5	163.0	208.0	184.7	180.7	208.9	249.9
S3-S	159.7	131.3	125.6	121.1	171.9	159.7	131.3	279.9	159.5	240.3	193.1	187.7	210.1	198.3
S3-SW	146.8	128.0	154.9	122.9	174.3	146.8	128.0	290.8	188.4	274.1	225.6	200.9	205.1	210.8
S3-W	154.2	139.6	140.4	123.4	177.4	154.2	139.6	292.8	191.8	239.2	213.2	193.1	197.7	227.8
S3-NW	130.6	124.1	124.6	122.7	179.0	130.6	124.1	287.3	156.5	209.5	222.8	180.9	214.7	234.2
S4-N	-	-	-	-	-	161.2	194.4	186.1	185.2	164.2	292.1	152.2	167.3	158.3
S4-NE	-	-	-	-	-	160.6	223.4	189.0	204.0	166.2	266.7	192.6	183.3	159.8
S4-E	-	-	-	-	-	159.1	200.0	215.1	204.5	157.9	290.2	178.1	188.5	160.9
S4-SE	-	-	-	-	-	163.5	213.0	199.2	168.8	146.6	221.4	172.8	161.2	164.1
S4-S	-	-	-	-	-	161.9	217.5	178.5	170.0	165.0	322.6	190.9	194.4	166.9
S4-SW	-	-	-	-	-	168.1	217.5	182.5	202.4	175.0	338.2	204.9	187.7	158.6
S4-W	-	-	-	-	-	163.3	224.1	204.4	191.7	167.8	348.1	174.5	188.7	163.1
S4-NW	-	-	-	-	-	158.9	230.9	232.0	168.6	159.2	246.1	137.8	163.4	159.1
S5-N	-	-	-	-	-	2.9	189.0	149.9	159.2	140.2	129.3	156.9	141.7	139.0
S5-NE	-	-	-	-	-	168.4	178.6	150.1	172.6	149.7	199.9	188.6	142.1	132.1
S5-E	-	-	-	-	-	114.5	214.7	150.6	155.0	144.8	163.6	146.9	148.2	142.6
S5-SE	-	-	-	-	-	8.7	205.3	140.1	153.3	140.7	7.637	143.6	136.7	137.4
S5-S	-	-	-	-	-	2.3	202.3	147.8	176.0	147.2	137.3	153.9	142.4	140.6
S5-SW	-	-	-	-	-	143.7	183.1	159.8	182.5	162.3	157.6	151.8	141.3	136.9
S5-W	-	-	-	-	-	132.6	163.4	151.0	160.1	154.5	159.1	144.8	147.5	134.7
S5-NW	-	-	-	-	-	135.1	193.1	145.2	144.1	137.8	150.3	144.8	141.0	135.8

註：捕砂器採樣成分分析自民國 94 年 5 月新增；S4 與 S5 測站為 99 年 5 月新增。

表 3.1-55 核四施工環境監測海域漂砂運動底質輸砂主要來向及最大淨輸砂方向

調查時間	點位	進砂速率範圍 ($g/cm^2/day$)	主要輸砂來向	最大淨輸砂方向	最大淨輸砂速率 ($g/cm^2/day$)	說明
94年第2季 (94/5/17～94/5/18)	S1	2.00~7.38	E,SE	W	3.38	漂砂方向受南堤及東側岩礁區阻擋影響，漂砂往岸邊堆積
	S2	7.58~20.83	NW,SE	SE	2.90	淨輸砂方向往東南側推移
	S3	7.33~15.50	NW,SE	N	1.60	淨輸砂方向往北側推移
94年第3季 (94/9/14～94/9/15)	S1	0.63~1.08	NE,E	W	0.45	漂砂方向受南堤及東側岩礁區阻擋影響，往西側岸邊堆積
	S2	0.70~1.48	SE,W	N	0.45	淨輸砂方向往北側推移
	S3	0.65~2.08	N	SE	0.68	淨輸砂方向往東南側推移
94年第4季 (94/11/1～94/11/3)	S1	3.14~18.81	E、SE	W	13.88	漂砂方向受南堤及東側岩礁區阻擋影響，往西側岸邊堆積
	S2	5.99~20.83	SE	NW	11.80	淨輸砂方向往西北側推移
	S3	3.88~10.75	NE,E	W	5.30	淨輸砂方向往西側推移
95年第1季 (95/2/14～95/2/15)	S1	2.23~9.13	W,E	SE	1.80	淨輸砂方向往東南側推移
	S2	4.1~10.78	W,SW	NE	3.10	淨輸砂方向往西北側推移
	S3	5.23~14.68	NW,W	SE	9.45	淨輸砂方向往西南側推移
95年第2季 (95/5/3～95/5/4)	S1	7.3~30.3	W,E,NE,NW	SW	12.35	漂砂方向往西南側岸邊堆積
	S2	28.28~66.88	NE,SW,S	N	14.25	淨輸砂方向往北側推移
	S3	-	-	-	-	捕砂器已滿溢，無法計算
95年第3季 (95/8/16～95/8/17)	S1	0.65~4.18	SW,E	W	3.05	漂砂方向受南堤及東側岩礁區阻擋影響，往西側岸邊堆積
	S2	2.17~7.45	N,NW	SE	2.08	淨輸砂方向往東南側推移
	S3	1.93~8.25	SW,W,NE	E	2.60	淨輸砂方向往東側推移
95年第4季 (95/10/18～95/10/19)	S1	6.83~18.43	SW,NE	N,NE	2.08	漂砂略有往外海推移之趨勢，與上季（95/8）趨勢相反
	S2	4.85~23.75	SW,NE,S	NW	11.58	漂砂運動之方向有往西北方與西方岸邊推移之現象
	S3	13.28~36.23	SW,SE	NW	19.93	漂砂運動之方向有往北方與東方外海推移之現象
96年第1季 (96/3/13～96/3/14)	S1	5.38~21.25	SE	NW	14.48	漂砂略有往南堤堆積之趨勢，與上季差異相反
	S2	8.48~31.43	SW	NE	10.18	漂砂往東北方推移之現象
	S3	8.70~27.50	NE	SW	12.55	往西南方向岸推移之現象
96年第2季 (96/6/7～96/6/8)	S1	5.33~17.45	W,NE	E	10.93	漂砂略有往外海堆積之趨勢
	S2	12.25~41.10	SW,NE	SE	9.25	漂砂略有往外海堆積之趨勢
	S3	9.40~62.30	SW	NE	29.70	漂砂略有往外海堆積之趨勢

註：海域漂砂運動底質輸砂方向及速率調查以捕砂器測定，自民國 94 年 5 月新增。

表 3.1-55 核四施工環境監測海域漂砂運動底質輸砂主要來向及最大淨輸砂方向（續 1）

調查時間	點位	進砂速率範圍 ($g/cm^2/day$)	主要輸砂來向	最大淨輸砂方向	最大淨輸砂速率 ($g/cm^2/day$)	說明
96 年第 3 季 (96/8/23 ~ 96/8/24)	S1	0.60~2.05	N,NE	SW	0.50	往岸邊推移之趨勢
	S2	1.65~2.30	SW,W	NE	0.65	往離岸方向堆移之趨勢，分別為東南向與東北向
	S3	2.03~4.13	NE,E	SW	1.98	往岸邊推移之趨勢
96 年第 4 季 (96/10/22 ~ 96/10/23)	S1	2.15~13.28	E	SW,W	14.48	往岸邊推移之趨勢
	S2	10.00~43.28	W	SE	11.48	往離岸方向堆移之趨勢
	S3	12.35~43.05	SW	NE	10.60	往離岸方向堆移之趨勢
97 年第 1 季 (97/3/5 ~ 97/3/6)	S1	3.75~36.38	E	NW,W	7.78	往岸邊推移之趨勢
	S2	4.03~17.95	SW	E	6.33	往離岸方向堆移之趨勢
	S3	25.35~110.00	N	S	27.55	往岸邊推移之趨勢
97 年第 2 季 (97/5/30 ~ 97/5/31)	S1	2.60~26.63	W	E,S	13.73	往離岸方向推移之趨勢
	S2	4.80~33.90	SW	E,NE	6.43	往離岸方向推移之趨勢
	S3	7.65~33.38	NE,SW	S	10.00	往岸邊推移之趨勢
97 年第 3 季 (97/8/27 ~ 97/8/28)	S1	2.98~16.08	E	S	6.10	向岸線方向運動之趨勢
	S2	3.50~19.70	SW,NE	E	4.07	往離岸方向運動之趨勢
	S3	4.03~9.65	SE,N,E	S,SW,NW	4.02~4.93	往南及向海岸推移之趨勢
97 年第 4 季 (97/12/9 ~ 97/12/10)	S1	8.53~36.48	E、W	SW、SE	8.85	向岸線與南堤方向運動之趨勢
	S2	25.7~69.98	SW、W	N	31.05	往南及向岸線方向運動之趨勢
	S3	11.98~35.05	E、N	S	13.425	往北平行海岸線運動之趨勢
98 年第 1 季 (98/3/11 ~ 98/3/12)	S1	7.35~34.78	W、NE	SW、SE	11.775	往西南之岸線方向運動之趨勢
	S2	7.13~34.40	SW、NE	SE	3.85	往東南之向岸線方向運動之趨勢
	S3	5.98~32.085	SW、E	N、NE	4.75	往北及東北之離岸線運動之趨勢
98 年第 2 季 (98/5/7 ~ 98/5/8)	S1	3.18~12.78	W	NW	2.00	往西北之向岸線方向運動之趨勢
	S2	5.30~21.30	SW	E	6.05	往東之離岸線方向運動之趨勢
	S3	4.23~16.58	N,NE	S	6.40	往南之平行岸線運動之趨勢

註：海域漂砂運動底質輸砂方向及速率調查以捕砂器測定，自民國 94 年 5 月新增。

表 3.1-55 核四施工環境監測海域漂砂運動底質輸砂主要來向及最大淨輸砂方向（續 2）

調查時間	點位	進砂速率範圍 ($g/cm^2/day$)	主要輸砂來向	最大淨輸砂方向	最大淨輸砂速率 ($g/cm^2/day$)	說明
98 年第 3 季 (98/7/14 ~ 98/7/15)	S1	3.20~17.68	SW、W	NE、N	6.975	往北及東北之離岸線運動之趨勢
	S2	5.35~23.98	SW、NE	NW	10.425	往西北之向岸線方向運動之趨勢
	S3	4.45~20.18	NW、SE	SE、S	4.75	往東南及南之向岸線方向運動之趨勢
98 年第 4 季 (98/10/29 ~ 98/10/30)	S1	5.75~33.20	NE、E	SW	22.50	往西南之向岸線運動之趨勢
	S2	9.83~26.03	SW、W	NE	6.60	往東北之離岸線方向運動之趨勢
	S3	11.13~33.05	NE、W	SE	9.30	往東南之向岸線方向運動之趨勢
99 年第 1 季 (99/3/17 ~ 99/3/18)	S1	14.08~46.63	NE、NW	SE	28.325	往東南及西南之向岸線運動之趨勢
	S2	42.90~59.48	NE、W	SW	6.95	往西北及西南向岸線方向運動之趨勢
	S3	18.25~55.10	SW、SE	NE	36.85	往東北及東之離岸線方向運動之趨勢
99 年第 2 季 (99/5/26 ~ 99/5/27)	S1	1.40~3.70	E、NE	W	2.17	往東及東北之離岸運動之趨勢
	S2	1.91~4.72	SE、NW	NE、N	0.77	往東南及西北垂直岸線方向運動之趨勢
	S3	3.06~6.12	SW	E	1.40	往西南向岸方向運動之趨勢
	S4	1.79~2.81	SE、E	NW、NE	0.77	往東南及東離岸方向運動之趨勢
	S5	0.13~0.640	NW	SE	0.26	往西北之向岸方向運動之趨勢
99 年第 3 季 (99/8/18 ~ 99/8/19)	S1	0.28~0.63	SE,SW	NW	0.35	往西北之向岸運動趨勢
	S2	0.75~1.90	W,NE	E	1.13	往東之離岸運動趨勢
	S3	0.5~1.60	SW	N	0.5	往北平行岸線方向之運動趨勢
	S4	0.65~2.20	W	E	1.05	往東離岸方向之運動趨勢
	S5	0.05~0.15	NE,SW	SW,S	0.03	往西南及南向岸方向運動之趨勢
99 年第 4 季 (99/11/05 ~ 99/11/06)	S1	10.63~45.93	W	SE	11.80	往東北之離岸運動趨勢
	S2	28.88~46.03	SE,E,NE	N	13.0	往北平行岸線方向之運動趨勢
	S3	37.33~53.70	SW,NE	N	9.78	往北平行岸線方向之運動趨勢
	S4	9.98~32.58	NW	SE	7.28	往東南離岸方向之運動趨勢
	S5	10.03~43.00	NE,SW	E	12.08	往東離岸方向運動之趨勢

註：海域漂砂運動底質輸砂方向及速率調查以捕砂器測定，自民國 94 年 5 月新增。

表 3.1-55 核四施工環境監測海域漂砂運動底質輸砂主要來向及最大淨輸砂方向（續 3）

調查時間	點位	進砂速率範圍 ($g/cm^2/day$)	主要輸砂來向	最大淨輸砂方向	最大淨輸砂速率 ($g/cm^2/day$)	說明
100 年第 1 季 (100/3/2 ~ 100/3/3)	S1	81.20~106.85	E	W	22.95	往西之向岸邊運動趨勢
	S2	99.40~146.80	E	W	29.05	往西之向岸邊運動趨勢
	S3	98.45~132.75	E	S	25.20	往南平行岸線方向之運動趨勢
	S4	96.55~112.20	NE	SW	11.90	往西南向岸邊方向之運動趨勢
	S5	92.15~107.90	NE,N	SW,NW	7.45	往西南.西北向岸邊方向運動之趨勢
100 年第 2 季 (100/4/20 ~ 100/4/21)	S1	20.75~52.3	W	SE	21.55	往東南之離岸運動趨勢
	S2	23.90~81.60	NE,SW	SW,E	7.10	往西南之向岸邊運動趨勢
	S3	23.40~96.75	SW,NE	N,E	20.80	往北平行岸線方向之運動趨勢
	S4	10.05~43.55	SW,NE	E	8.45	往東之離岸運動趨勢
	S5	10.60~40.20	SW,NE	E,SE	5.00	往東之離岸運動趨勢
100 年第 3 季 (100/8/17 ~ 100/8/18)	S1	0.10~0.63	N	S	0.53	往南平行岸線方向之運動趨勢
	S2	0.2~0.55	SW	NE	0.35	往東北之離岸運動趨勢
	S3	0.08~0.45	W	S,SE	0.28	往東南平行岸線方向之運動趨勢
	S4	0.15~0.85	W	S,SE	0.38	往東南平行岸線方向之運動趨勢
	S5	0.05~0.30	N	S	0.20	往南平行岸線方向之運動趨勢
100 年第 4 季 (100/11/23 ~ 100/11/24)	S1	79.35~168.10	NE, E,NW	SW	55.65	往西南向岸邊方向之運動趨勢
	S2	91.70~174.60	E, NE	SW	45.25	往西南往岸邊方向之運動趨勢
	S3	122.95~172.55	NE, SW	NW	33.35	往西北往岸線方向之運動趨勢
	S4	74.40~156.25	NW	SE	72.55	往東南平行岸線方向之運動趨勢
	S5	71.35~157.75	W, SW	S	60.30	往南平行岸線方向之運動趨勢

註：捕砂器 S4 與 S5 測站為 99 年 5 月新增。

表 3.1-55 核四施工環境監測海域漂砂運動底質輸砂主要來向及最大淨輸砂方向（續 4）

調查時間	點位	進砂速率範圍 ($g/cm^2/day$)	主要輸砂來向	最大淨輸砂方向	最大淨輸砂速率 ($g/cm^2/day$)	說明
101 年第 1 季 (101/3/06 ~ 100/3/07)	S1	76.88~147.97	NE, NW	SE, SW	65.84	往東南平行岸線方向之運動趨勢
	S2	115.17~171.25	NE, W	E	27.85	往東之離岸運動趨勢
	S3	95.95~174.02	SW, SE	NE	78.07	往東北之離岸運動趨勢
	S4	139.79~154.43	NE, N	E, SW	7.88	往東之離岸運動趨勢
	S5	124.55~152.78	NE	S	9.91	往南平行岸線方向之運動趨勢
101 年第 2 季 (101/6/10 ~ 100/6/11)	S1	4.26~11.01	W	E	6.09	往東之離岸運動趨勢
	S2	2.49~8.06	NE	SW	3.14	往西南之向岸運動趨勢
	S3	2.69~11.33	NE	E	3.14	往東之離岸運動趨勢
	S4	4.98~10.29	W	E	5.24	往東之離岸運動趨勢
	S5	4.52~7.93	NE, SW, SE, W, S	NW	2.82	往西北之離岸運動趨勢

註：輸砂速率單位原為 $g/cm^2/day$，自 101 年 6 月改為 cm^3/min。

表 3.1-56 各測站主要輸砂來向歷次調查次數統計表

測站	主要輸砂來向統計次數							
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
S1	2	11	14	4	0	4	11	4
S2	1	12	3	5	2	16	9	3
S3	5	9	5	6	0	14	5	3
累計統計	**8**	**32**	**22**	**15**	**2**	**34**	**25**	**10**

統計期間：94 年第 2 季~101 年第 2 季

表 3.1-57 各測站最大淨輸砂方向歷次調查次數統計表

測站	最大淨輸砂方向統計次數							
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
S1	2	2	3	7	3	8	8	4
S2	5	7	7	5	0	3	1	3
S3	5	5	3	5	8	3	1	3
累計統計	**12**	**14**	**13**	**17**	**11**	**14**	**10**	**10**

統計期間：94 年第 2 季~101 年第 2 季

表 3.1-58 歷年主要輸砂來向分季累計次數統計表

測站	主要輸砂來向統計次數							
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
S1 第 1 季	0	3	3	1	0	0	2	2
S2 第 1 季	0	3	1	0	0	4	3	0
S3 第 1 季	1	1	2	2	0	3	1	1
第 1 季累計統計	**1**	**7**	**6**	**3**	**0**	**7**	**6**	**3**
S1 第 2 季	0	3	3	1	0	0	6	1
S2 第 2 季	0	4	0	2	1	5	0	2
S3 第 2 季	1	4	0	1	0	4	0	1
第 2 季累計統計	**1**	**11**	**3**	**4**	**1**	**9**	**6**	**4**
S1 第 3 季	2	2	3	1	0	3	1	0
S2 第 3 季	1	3	0	1	0	4	3	1
S3 第 3 季	2	1	1	2	0	3	3	1
第 3 季累計統計	**5**	**6**	**4**	**4**	**0**	**10**	**7**	**2**
S1 第 4 季	0	3	5	1	0	1	2	1
S2 第 4 季	0	3	2	2	1	3	3	0
S3 第 4 季	1	4	2	1	0	4	1	0
第 4 季累計統計	**1**	**10**	**9**	**4**	**1**	**8**	**6**	**1**

統計期間：94 年第 2 季~101 年第 2 季

表 3.1-59 歷年最大淨輸砂方向分季累計次數統計表

測站	最大淨輸砂方向統計次數							
	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
S1 第 1 季	0	0	0	4	0	2	2	2
S2 第 1 季	0	2	2	1	0	1	1	0
S3 第 1 季	1	3	0	1	2	1	0	0
第 1 季累計統計	**1**	**5**	**2**	**6**	**2**	**4**	**3**	**2**
S1 第 2 季	0	0	3	1	1	1	2	1
S2 第 2 季	2	2	3	2	0	2	0	0
S3 第 2 季	2	1	3	0	2	0	0	0
第 2 季累計統計	**4**	**3**	**9**	**3**	**3**	**3**	**2**	**1**
S1 第 3 季	1	1	0	0	2	1	2	1
S2 第 3 季	1	2	2	1	0	0	0	1
S3 第 3 季	1	0	1	3	3	2	0	1
第 3 季累計統計	**3**	**3**	**3**	**4**	**5**	**3**	**2**	**3**
S1 第 4 季	1	1	0	2	0	4	2	0
S2 第 4 季	2	1	0	1	0	1	0	2
S3 第 4 季	1	1	0	1	1	0	1	2
第 4 季累計統計	**4**	**3**	**0**	**4**	**1**	**5**	**3**	**4**


統計期間：94 年第 2 季~101 年第 2 季

表3.1-60 歷年海岸地形砂量體積變化推估結果

時間 \ 區域	A區 (高程0~3m,大岩石以	B區 (高程0~3m,大岩石以	C區 (水深0~3m)	D區 (水深3~5m)
85/12-86/6	-4,026	-3,225	-71,683	-68,875
86/6-86/9	-14,913	-51,327	-33,142	4,328
86/9-86/12	2,475	16,869	65,595	41,496
86/12-87/6	10,127	67,575	-48,467	-168,429
87/6-87/11	-8,640	19,374	103,422	103,300
87/11-88/6	28,286	-6,638	-37,296	89,369
88/6-88/12	-19,631	46,330	67,060	-50,762
88/12-89/5	7,059	-24,218	-71,567	-45,904
89/5-90/3	-408	6,358	45,797	100,151
90/3-90/10	1,052	-694	5,577	52,594
90/10-91/2	7,564	10,263	50,290	-20,684
91/2-91/12	-16,006	-26,364	-46,169	-65,715
91/12-92/2	-214	-23,339	-68,550	-45,415
92/2-92/5	-1,586	13,782		
92/5-92/8	18,187	42,156	32,986	45,528
92/8-92/11	-20,200	-49,708		
92/11-93/3	4,086	-12,191	-25,818	48,937
93/3-93/6	24,128	3,657	-50,776	-39,177
93/6-93/8	4,652	40,762	30,410	17,570
93/8-93/9	-34,505	-94,156		
93/9-93/12	8,273	1,591	3,778	139,194
93/12-94/3	5,691	-1,057	-28,246	-73,546
94/3-94/6	8,154	24,465		
94/6-94/9	-36,287	-85,368	-127,708	-(註3)
94/9-94/11	3,187	14,099	1,954	-117,222
94/11-95/1	21,864	19,231	73,899	56,033
95/1-95/5	-11,209	-15,239		
95/5-95/8	-13,843	133,560	-12,357	-63,052
95/8-95/10	15,771	-79,590		
95/10-96/03	15,292	25,263	33,297	-43,215
96/3-96/06	-518	-816		
96/6-96/08	-3,699	20,820	118,757	237,616
96/8-96/10	-21,163	-28,483		
96/10-97/3	7,850	-24,809	-22,793	-24,993
97/3-97/6	32,162	38,508	40,765	14,514
97/6-97/8	-3,041	1,579	-141,055	-198,891
97/8-97/9	-10,474	-2,620		
97/9-97/12	-7,860	-49,852	4,011	74,831
97/12-98/3	11,552	61,451	8,081	-37,829
98/3-98/5	636	-37,336		
98/5-98/7	6,097	50,205	-129,297	3,378
98/7-98/10	-14,156	-49,254		
98/10-99/03	26,829	5,502	98,003	-16,614
99/03-99/05	14,541	5,374		
99/05-99/08	16,272	4,467	387	13,428
99/08-99/11	-13,082	-38,123		
99/11-100/3	1,558	40,501	2,998	45,495
100/3-100/4	-354	-70,590		
100/4-100/8	-7,773	8,134	48,586	102,406
100/8-100/11	10,772	26,989		
100/11-101/03	4,370	7,127	35,663	-156,815
101/03-101/06	5,124	39,445		

註：1.+為堆積 -為侵蝕,立方公尺。

3. 94/9該季未進行水深3~5m之地形量測，故無法估算。

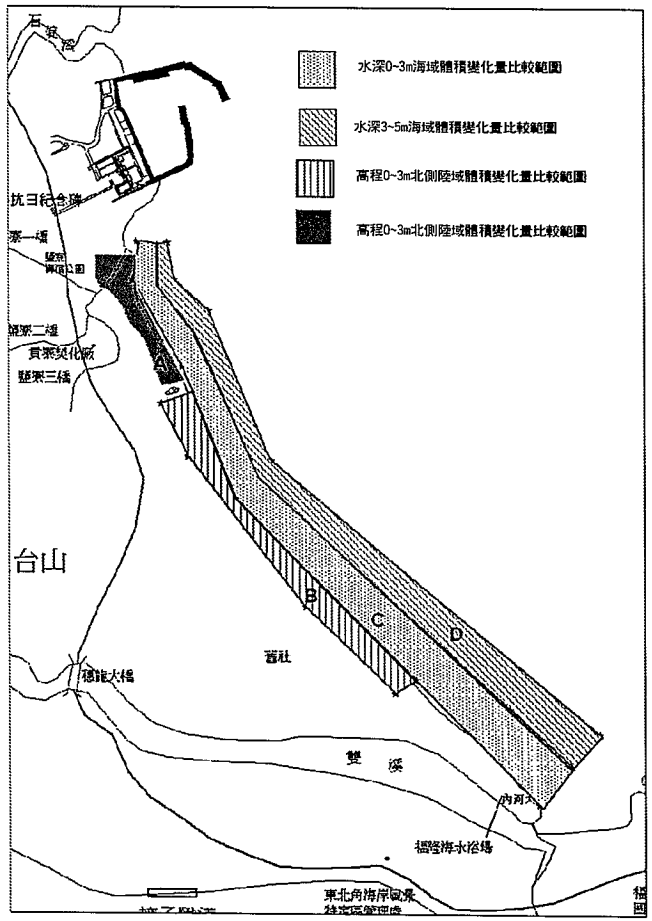

註： (+為堆積 -為侵蝕,立方公尺)

水深0-3m海域所截取試算總面積約為423,918平方公尺。

水深3-5m海域所截取試算總面積約為330,765平方公尺。

等高線0-+3陸域所截取試算總面積，大岩石以北約65,710平方公尺，大岩石以南約為145,635平方公尺。

以84年12月海事工程施工前為基準開始比較，並計算每季測量後與上季之砂量 變化情形，以確知其量測區域之沙量變化。

左表砂量體積變化係以截取試算面積內，測量數值內差所計算之結果。

表3.1-61 各定位樁相對侵淤示意表

單位：公分

定位樁位置		福隆內河大橋第1橋墩	福隆內河大橋第2橋墩	福隆南側河道救生樁	舊社1號樁(北側)	舊社2號樁(南側)	大岩石救生樁	大岩石1號樁	大岩石2號樁	大岩石3號樁	鹽寮1號樁	鹽寮2號樁	鹽寮3號樁	鹽寮4號樁	鹽寮5號樁
92年第一季 (92/3/12)	記錄高度(註1)	30	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-
92年第二季 (92/5/09)	記錄高度(註1)	40	-	-	-	-	-	60	30	30	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	-10	-	-	-	-	-	-3	-	-	-	-	-	-	-
92年第三季 (92/8/13)	記錄高度(註1)	0	-	-	-	-	-	13	20	40	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	40	-	-	-	-	-	47	10	-10	-	-	-	-	-
92年第四季 (92/11/06)	記錄高度(註1)	-20	-	-	-	-	-	40	40	30	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	20	-	-	-	-	-	-27	-20	10	-	-	-	-	-
93年第一季 (93/3/12)	記錄高度(註1)	38	-	-	-	-	-	30	50	50	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	-58	-	-	-	-	-	10	-10	-20	-	-	-	-	-
93年第二季 (93/6/4)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	-20	-30	-20	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	50	80	70	-	-	-	-	-
93年第三季 (93/8/4)	記錄高度(註1)	10	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	10	-	-	-	-	-	-50	-60	-	-	-	-	-	-
93年加測 (93/9/4)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	95	130	-	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	-65	-100	-	-	-	-	-	-
93年第四季 (93/12/14)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	115	180	-	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	-20	-50	水線以下	-	-	-	-	-
94年第一季 (94/03/09)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	50	90	-	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	65	90	水線以下	-	-	-	-	-
94年第二季 (94/05/10)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	70	80	-	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	-20	10	0	-	-	-	-	-
94年第三季 (94/09/15)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	200	248	201	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	-130	-68	21	-	-	-	-	-
94年第四季 (94/11/3)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	200	188	264	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	0	60	-63	-	-	-	-	-
95年第一季 (95/01/3)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	200	263	313	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	0	-75	-49	-	-	-	-	-
95年第二季 (95/5/3)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	100	140	160	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	100	123	153	-	-	-	-	-
95年第三季 (95/8/16)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	200	188	167	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	-100	-48	-7	-	-	-	-	-
95年第四季 (95/10/18)	記錄高度(註1)	-	-	-	-	-	-	134	139	108	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	水線以下	-	-	-	-	-	66	49	59	-	-	-	-	-
96年第一季 (96/03/14)	記錄高度(註1)	72	-	-	-	-	-	155	105	89	-	-	-	-	-
	高度變化(註2)	-	-	-	-	-	-	-21	34	19	-	-	-	-	-
96年第二季	記錄高度(註1)	62	-	-	-	-	-	152	99	86	100	100	100	-	-
96年第三季 (96/08/24)	記錄高度(註1)	67	-	-	-	-	-	47	87	105	83	118	98	-	-
	高度變化(註2)	-5	-	-	-	-	-	105	12	-19	17	-18	2	-	-
96年第四季 (96/10/23)	記錄高度(註1)	78	-	-	-	-	-	200	202	185	106	118	118	-	-
	高度變化(註2)	-11	-	-	-	-	-	-153	-115	-80	-23	0	-20	-	-

表3.1-61 各定位樁相對侵淤示意表（續）

單位：公分

定位樁位置		福隆內河大橋第1橋墩	福隆內河大橋第2橋墩	福隆南側河道救生樁	舊社1號樁(北側)	舊社2號樁(南側)	大岩石救生樁	大岩石1號樁	大岩石2號樁	大岩石3號樁	鹽寮1號樁	鹽寮2號樁	鹽寮3號樁	鹽寮4號樁	鹽寮5號樁
97年第一季 (97/3/6)	記錄高度(註1)	80	-	-	-	-	-	158	179	134	108	118	109	-	-
	高度變化(註2)	-2	-	-	-	-	-	42	23	51	-2	0	9	-	-
97年第二季 (97/5/30)	記錄高度(註1)	72	-	-	-	-	-	162	165	97	107	118	125	-	-
	高度變化(註2)	8	-	-	-	-	-	-4	14	37	1	0	-16	-	-
97年第三季 (97/8/27)	記錄高度(註1)	78	-	-	-	-	-	140	178	131	108	118	109	-	-
	高度變化(註2)	-6	-	-	-	-	-	22	-13	-34	-1	0	16	-	-
97年颱風後 (97/9/19)	記錄高度(註1)	18	-	-	-	-	-	200	218	233	108	118	131	-	-
	高度變化(註2)	60	-	-	-	-	-	-60	-40	-102	0	0	-22	-	-
97年第四季 (97/12/9)	記錄高度(註1)	68	-	-	-	-	-	178	184	153	108	118	126	-	-
	高度變化(註2)	-50	-	-	-	-	-	22	34	80	0	0	5	-	-
98年第一季 (98/3/12)	記錄高度(註1)	77	-	-	-	-	-	157	153	113	108	118	131	-	-
	高度變化(註2)	-9	-	-	-	-	-	21	31	40	0	0	-5	-	-
98年第二季 (98/5/8)	記錄高度(註1)	82	-	-	-	-	-	133	144	109	108	118	131	-	-
	高度變化(註2)	-5	-	-	-	-	-	24	9	4	0	0	0	-	-
98年第三季 (98/7/14)	記錄高度(註1)	79	-	-	-	-	-	119	118	78	108	118	111	-	-
	高度變化(註2)	3	-	-	-	-	-	14	26	31	0	0	20	-	-
98年第四季 (98/10/28)	記錄高度(註1)	27	-	-	-	-	-	200	245	235	108	118	120	-	-
	高度變化(註2)	52	-	-	-	-	-	-81	-127	-157	0	0	-9	-	-
99年第一季 (99/03/17)	記錄高度(註1)	53	100	100	67	100	120	137	126	97	108	118	95	120	100
	高度變化(註2)	-26	-	-	-	-	-	63	119	138	0	0	25	-	-
99年第二季 (99/05/27)	記錄高度(註1)	44	114	100	71	106	124	145	126	85	108	118	84	117	100
	高度變化(註2)	9	-14	0	-4	-6	-4	-8	0	12	0	0	11	3	0
99年第三季 (99/08/19)	記錄高度(註1)	34	109	100	249	102	116	143	124	80	97	118	112	115	100
	高度變化(註2)	10	5	0	-178	4	8	2	2	5	11	0	-28	2	0
99年第四季 (99/11/5)	記錄高度(註1)	42	96	102	240	113	151	170	179	155	108	118	131	114	110
	高度變化(註2)	-8	13	-2	9	-11	-35	-27	-55	-75	-11	0	-19	1	-10
100年第一季 (100/3/2)	記錄高度(註1)	65	104	100	247	69	95	132	131	88	108	118	126	110	94
	高度變化(註2)	-23	-8	2	-7	44	56	38	48	67	0	0	5	4	16
100年第二季 (100/4/21)	記錄高度(註1)	88	122	100	247	77	80	119	66	84	108	118	104	114	94
	高度變化(註2)	-23	-18	0	0	-8	15	13	65	4	0	0	22	-4	0
100年第三季 (100/8/17)	記錄高度(註1)	14	72	100	240	68	170	181	207	141	108	118	130	111	92
	高度變化(註2)	74	50	0	7	9	-90	-62	-141	-57	0	0	-26	3	2
100年第四季 (100/11/24)	記錄高度(註1)	14	156	100	227	59	105	114	127	101	158	141	108	109	97
	高度變化(註2)	0	-84	0	13	9	65	67	80	40	-50	-23	22	2	-5
101年第一季 (101/3/7)	記錄高度(註1)	25	145	100	183	55	82	87	88	93	164	118	105	108	93
	高度變化(註2)	-11	11	0	44	4	23	27	39	8	-6	23	3	1	4
101年第二季 (101/6/11)	記錄高度(註1)	-	-	100	174	51	80	80	42	51	176	142	89	108	92
	高度變化(註2)	-	-	0	9	4	2	7	46	42	-12	-24	16	0	1

註：1.記錄高度表示灘線至定位樁最低標示刻度之距離，正值(＋)表示灘線高於最低標示刻度，負值(－)表示灘線低於最低標示刻度。
2.高度變化表示該季與上一季間之灘線高度變化，刷深以"－"表示，淤積以"＋"表示。
3.N16大岩石記錄高度自94年第三季起採用灘線至定位樁最高標示刻度之距離，其與最低刻度相差100cm。
4.福隆內河大橋第2橋墩、福隆南側河道救生樁、大岩石救生樁與鹽寮4、5號樁為99年3月新設。

表 3.1-62　101 年第 1 季監測之異常狀況及處理情形

狀況說明	因應對策	執行成效	備　　註
1.澳底站 3 月 24 日之 PM10 日平均值為 132.6μg/m^3，超出空氣品質標準	持續監測	本季（101年第2季）測值均符合空氣品質標準。	上季（101 年第 1 季）澳底站 3 月 24 日之 PM_{10} 日平均值為 132.6μg/m^3，超出空氣品質標準，主要因受東亞沙塵暴影響，測值偏高
2.台 2 省道旁測站（台 2 省道與 102 甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等 3 測站）部分時段噪音值超出標準值。	台 2 省道旁之測站因多位於道路旁，易受交通流量之影響，將持續監測	本季（101年第2季）鹽寮海濱公園及過港部落非假日（施工）$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量在1.6dB(A)以內，依環保署環境影響評估技術規範之營建工程噪音評估模式技術規範之標準評估，鹽寮海濱公園及過港部落測站之噪音影響程度均屬「無影響或可忽略」程度，故核四施工對鄰近地區噪音品質影響尚屬輕微。	上季(101 年第 1 季)鹽寮海濱公園非假日(施工)$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量為 2.7 (A)，過港部落測站非假日（施工）$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量為 3.9dB(A)，依環保署環境影響評估技術規範之營建工程噪音評估模式技術規範之標準評估，鹽寮海濱公園及過港部落測站之噪音影響程度均屬「無影響或可忽略」程度，故核四施工對鄰近地區噪音品質影響尚屬輕微。
3.河川水質以雙溪貢寮國小測值之大腸桿菌群、生化需氧量，以及新社大橋站之大腸桿菌群有超出甲類陸域水體標準之情形。	持續監測	本季（101 年第 2 季）雙溪貢寮國小及新社大橋站僅大腸桿菌群測值及生化需氧量有超出甲類陸域水體標準之情形。	依公告，雙溪屬甲類陸域地面水體，標準較嚴，故核四施工前即有超出標準情形，由於目前核四廠區僅逕流水會流入雙溪，惟流入前會先經滯洪池後再排入雙溪，其逕流時間長，故對雙溪影響輕微。
4.部分地下水監測井之重金屬鐵、錳等項目超出第二類「地下水污染監測標準」。	持續監測	本季（101 年第 2 季）地下水監測井之氨氮及重金屬鐵、錳等項目超出第二類「地下水污染監測標準」，惟其於設井之初即有測值偏高之情形，主要為受環境背景影響所致。	依據歷年核四環境監測結果與環評階段背景調查結果比較，本計畫區地下水於施工前即有有機污染以及重金屬鐵、錳濃度偏高情形，核四施工至今並無惡化情形；並輔以地下水流向及工程施工內容研判，水質較差之監測井亦非受核四工程影響。
5.海域水質之澳底漁港 2、3 月生化需氧量測值有超出甲類海域海洋環境品質標準之情形	持續監測	本季（101 年第 2 季）海域水質之澳底漁港 4、6 月生化需氧量及鄰近海域 4 號測站 5 月份大腸桿菌測值有超出甲類海域海洋環境品質標準之情形。	1.澳底漁港受環境背景（漁港）之影響，核四施工前即曾發生有機污染（總磷及生化需氧量）超出甲類海域海洋環境品質標準情形。 2.核四海事工程海域施工項目已於 94 年 7 月 22 日竣工，故本季監測之各測值均屬環境背景值。

表 3.1-63　101 年第 2 季監測之異常狀況及處理情形

狀況說明	因應對策	備　　註
1.本季台 2 省道旁測站（台 2 省道與 102 甲縣道交叉口、鹽寮海濱公園及福隆街上等 3 測站）及非台 2 省道旁測站(過港部落測站)部分時段噪音值超出標準值。	台 2 省道旁之測站因多位於道路旁，易受交通流量之影響，將持續監測	本季（101年第2季）鹽寮海濱公園及過港部落非假日（施工）$L_{日}$值與假日（不施工）$L_{日}$值之最大噪音增量在1.6dB(A)以內，依環保署環境影響評估技術規範之營建工程噪音評估模式技術規範之標準評估，鹽寮海濱公園及過港部落測站之噪音影響程度均屬「無影響或可忽略」程度，故核四施工對鄰近地區噪音品質影響尚屬輕微。
2.河川水質以雙溪貢寮國小之大腸桿菌群、新社大橋之大腸桿菌群及生化需氧量有超出甲類陸域水體標準之情形。	持續監測	依公告，雙溪屬甲類陸域地面水體，標準較嚴，故核四施工前即有超出標準情形，由於目前核四廠區僅逕流水會流入雙溪，惟流入前會先經滯洪池後再排入雙溪，其逕流時間長，故對雙溪影響輕微。
3.地下水 GM3-1 監測井之氨氮及重金屬鐵、錳等項目超出第二類「地下水污染監測標準」。	持續監測	依據歷年核四環境監測結果與環評階段背景調查結果比較，本計畫區地下水於施工前即有有機污染以及重金屬鐵、錳濃度偏高情形，核四施工至今並無惡化情形；並輔以地下水流向及工程施工內容研判，水質較差之監測井應為環境背景影響。
4.海域水質之澳底漁港 4、6 月生化需氧量及鄰近海域 4 號測站 5 月份大腸桿菌測值有超出甲類海域海洋環境品質標準之情形。	持續監測	1. 澳底漁港受環境背景（漁港）之影響，核四施工前即曾發生有機污染（總磷及生化需氧量）超出甲類海域海洋環境品質標準情形。 2. 臨近海域之大腸桿菌群測值即有超出甲類海域海洋環境品質標準之情形，且海事工程海域施工項目已於 94 年 7 月 22 日竣工，故本季監測之各測值均屬環境背景值。

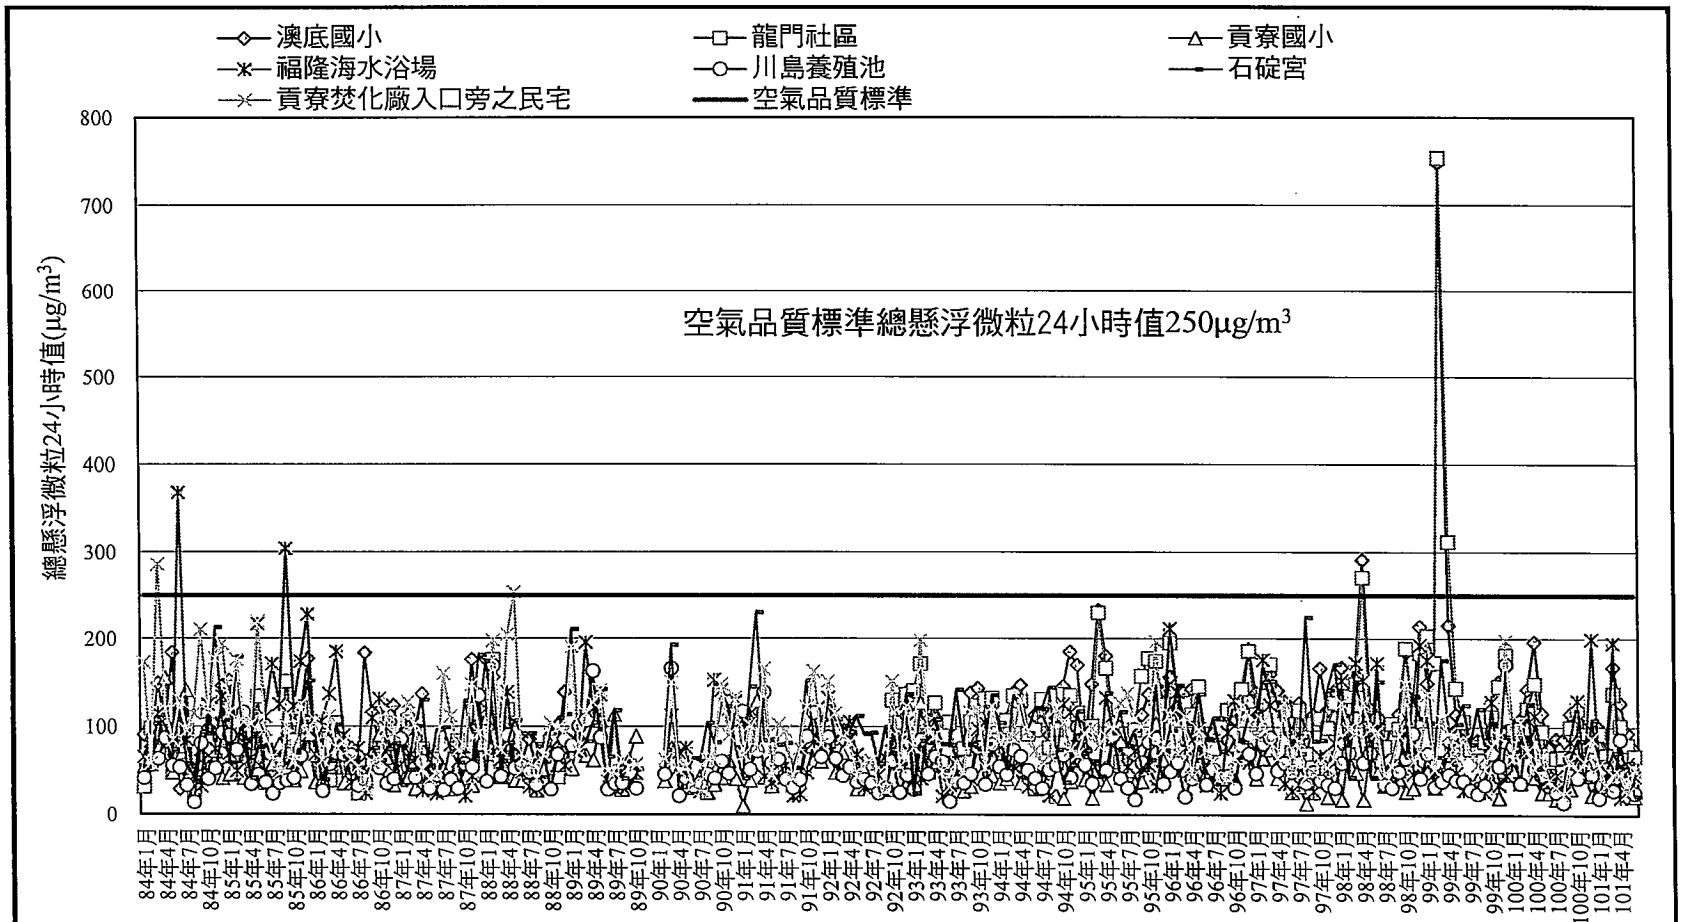


圖3.1-1 核四施工環境監測歷年空氣品質總懸浮微粒24小時值(最大值)比較分析圖

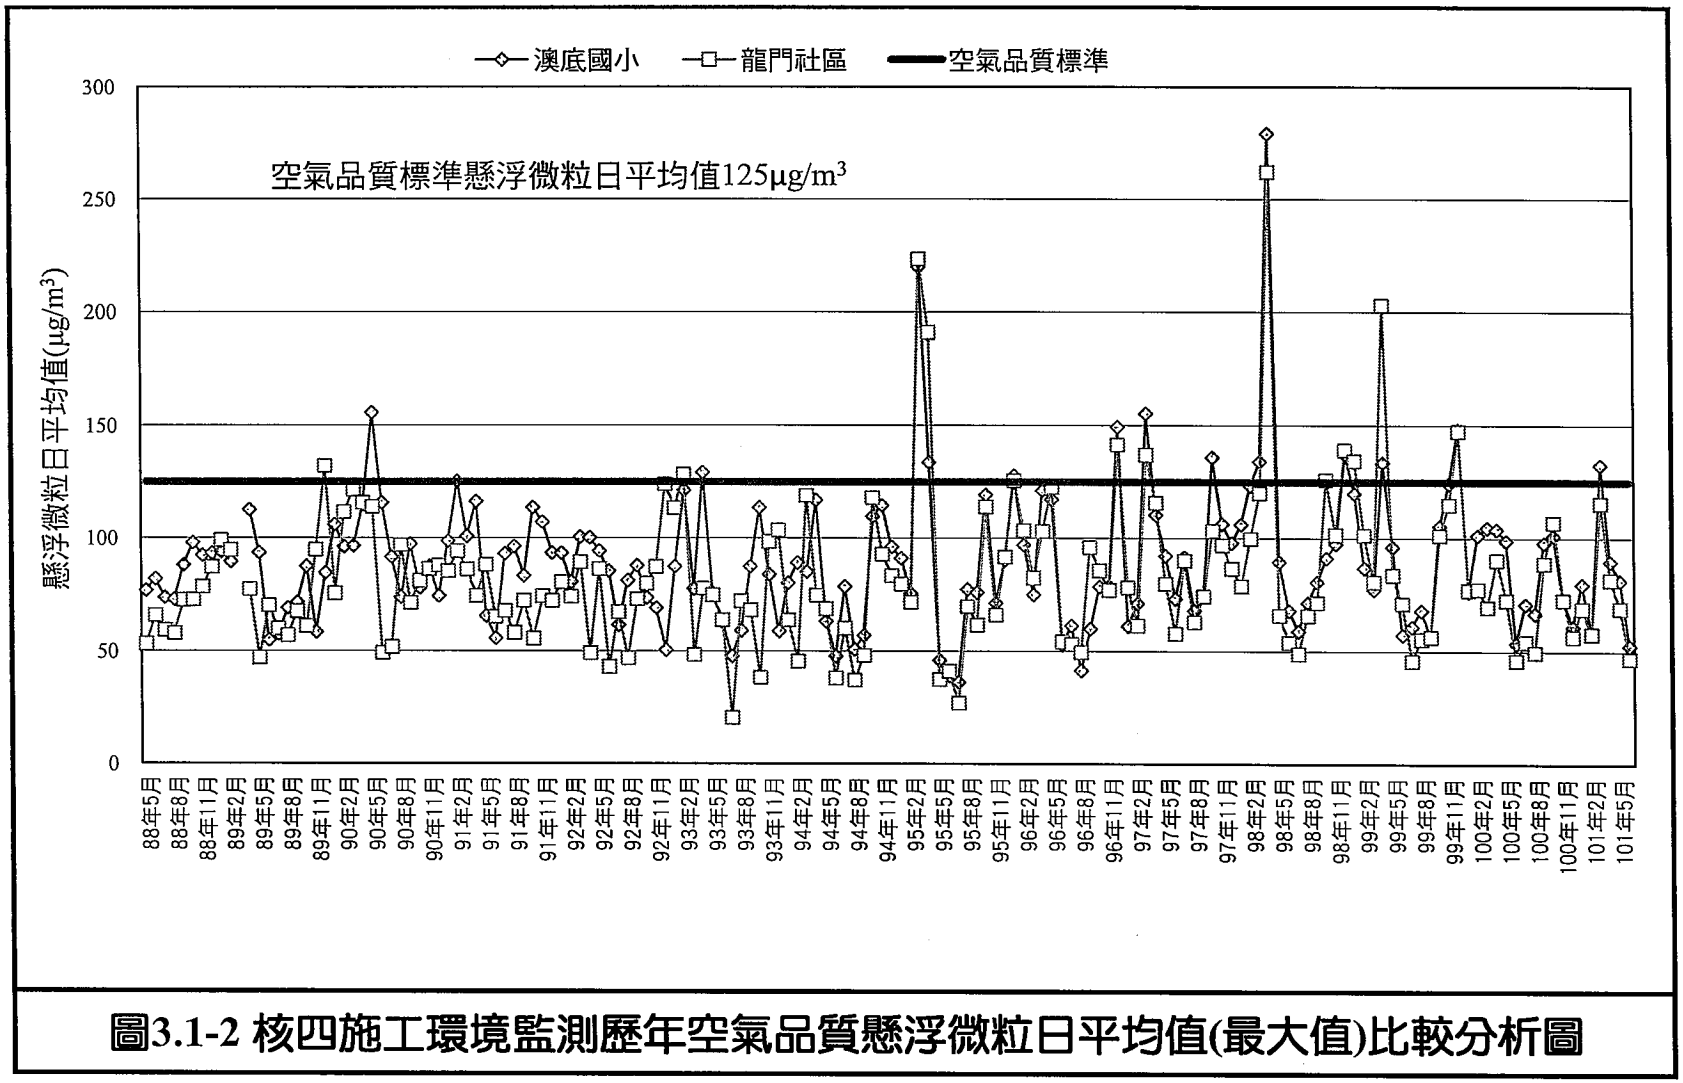


圖3.1-2 核四施工環境監測歷年空氣品質懸浮微粒日平均值(最大值)比較分析圖

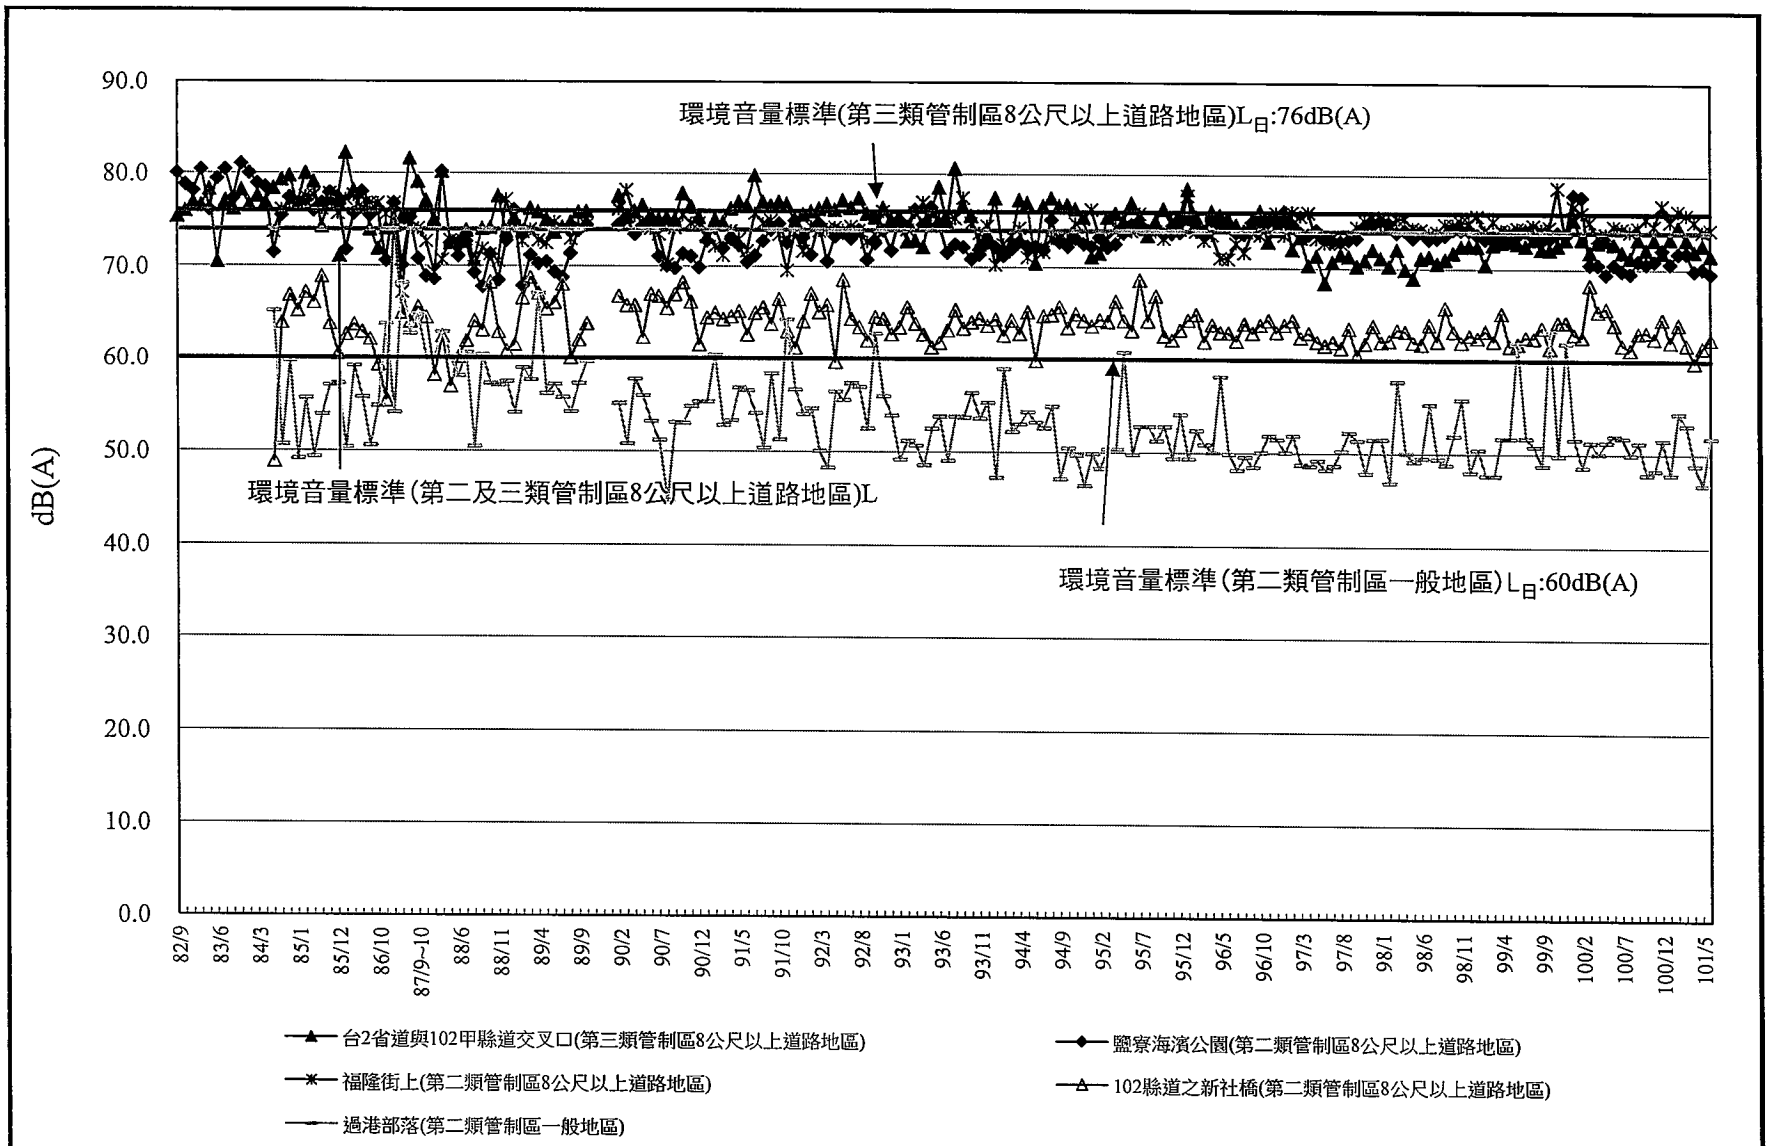


圖3.1-3 核四施工環境監測歷年噪音$L_{日}$非假日監測結果變化圖

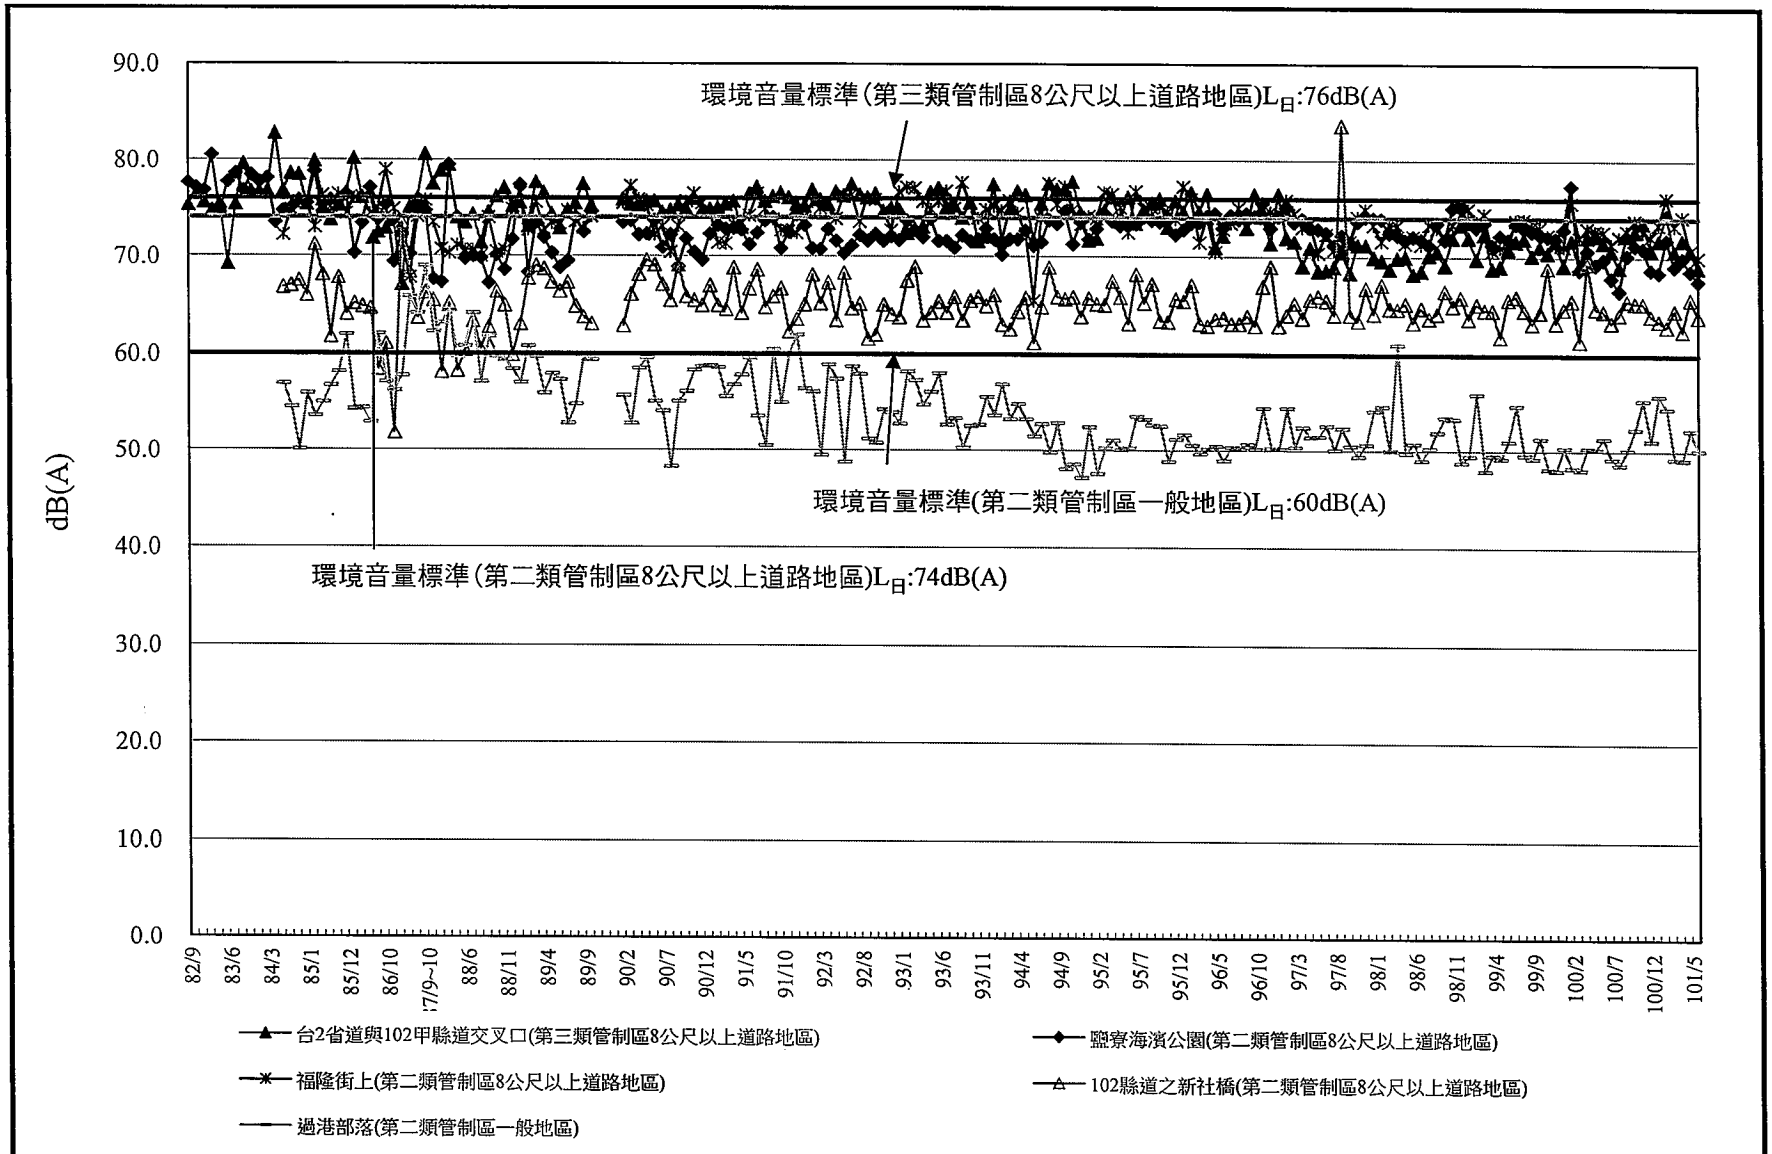


圖3.1-4 核四施工環境監測歷年噪音$L_{日}$假日監測結果變化圖

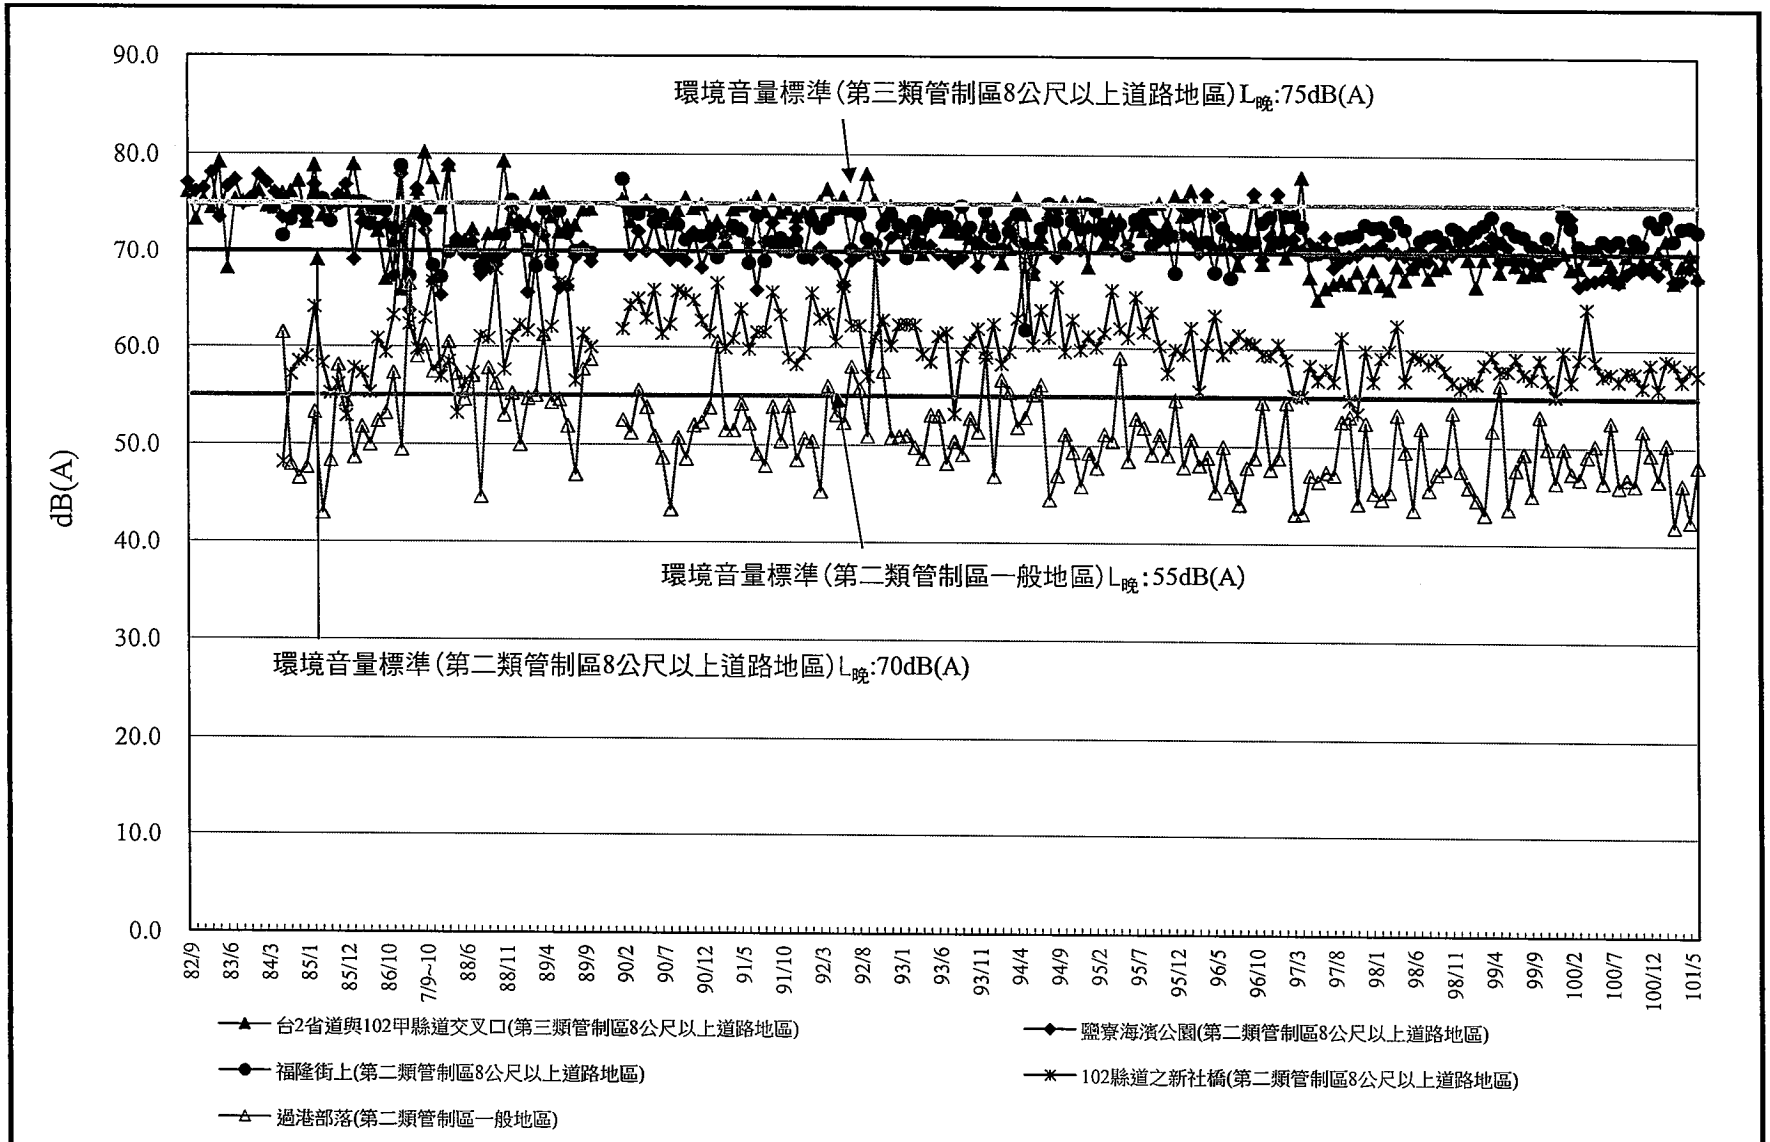


圖3.1-5 核四施工環境監測歷年噪音$L_{晚}$非假日監測結果變化圖

P:\ongojob\84101\017-15\reports\101-2\T3_噪音振動;F3.1-3~3.1-14

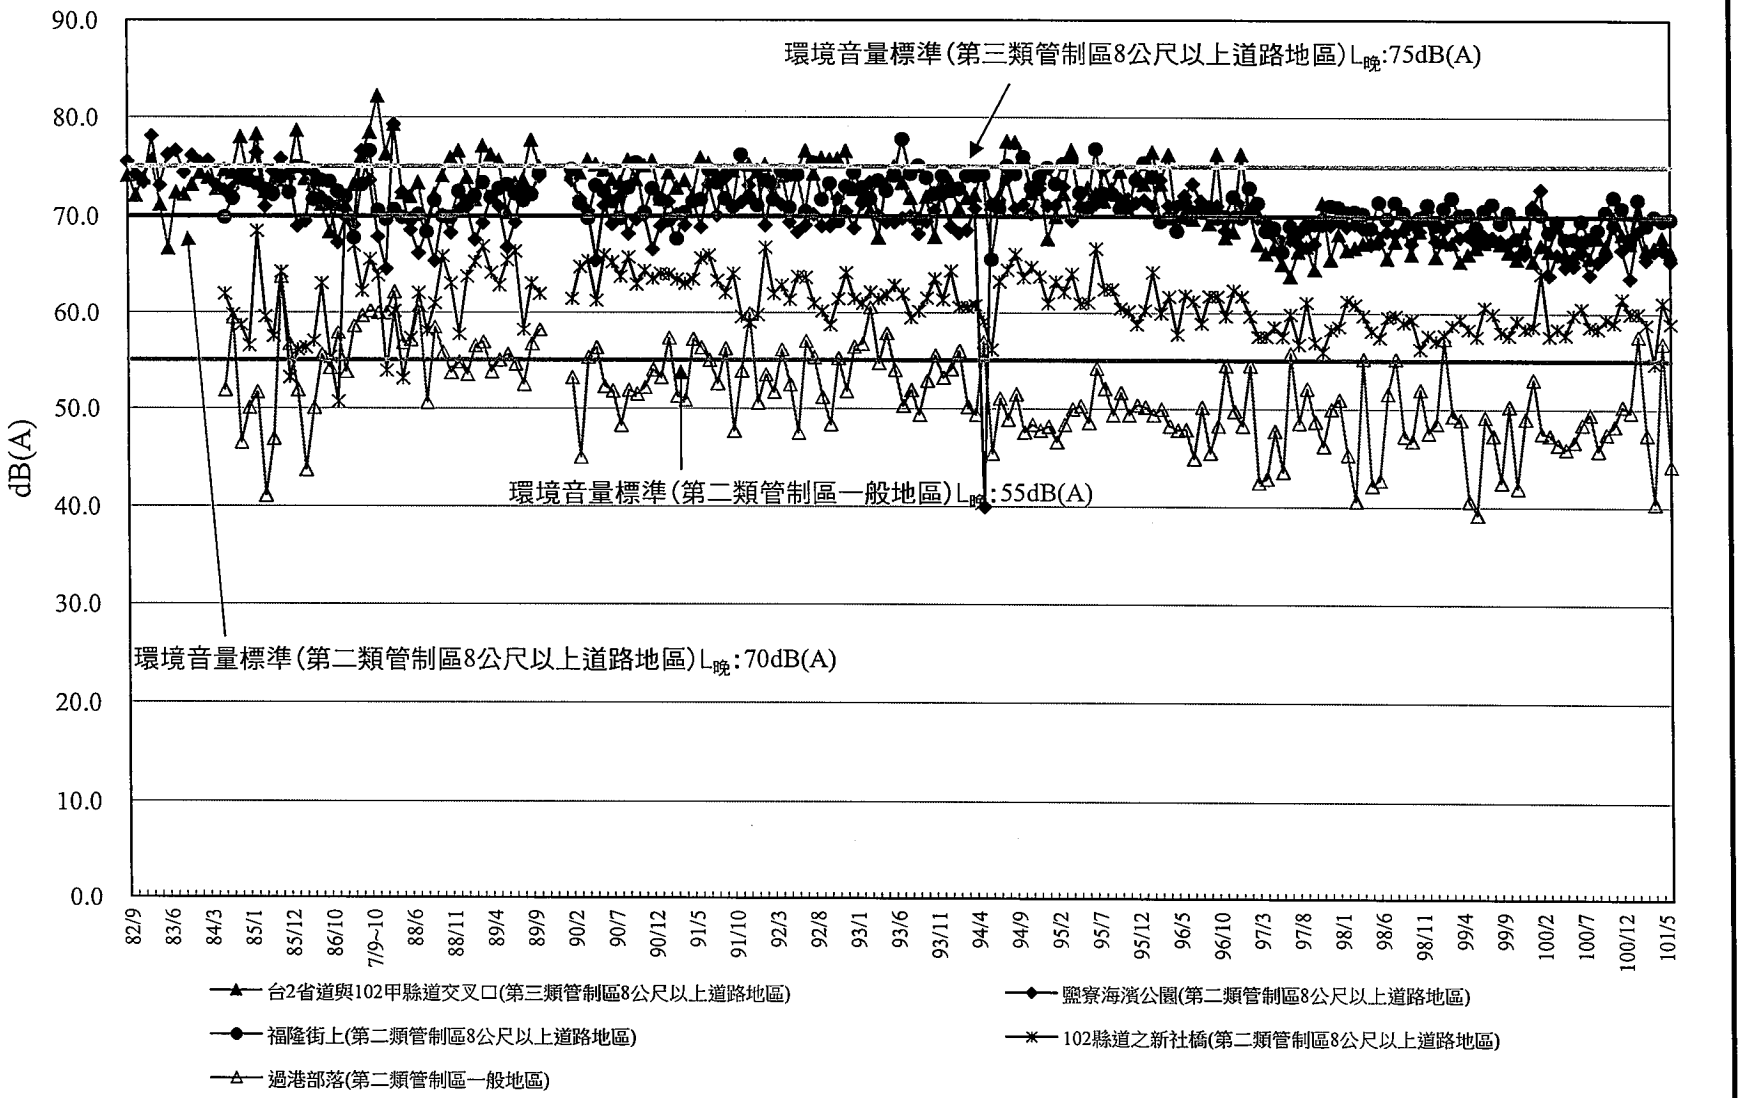


圖3.1-6 核四施工環境監測歷年噪音$L_{晚}$假日監測結果變化圖

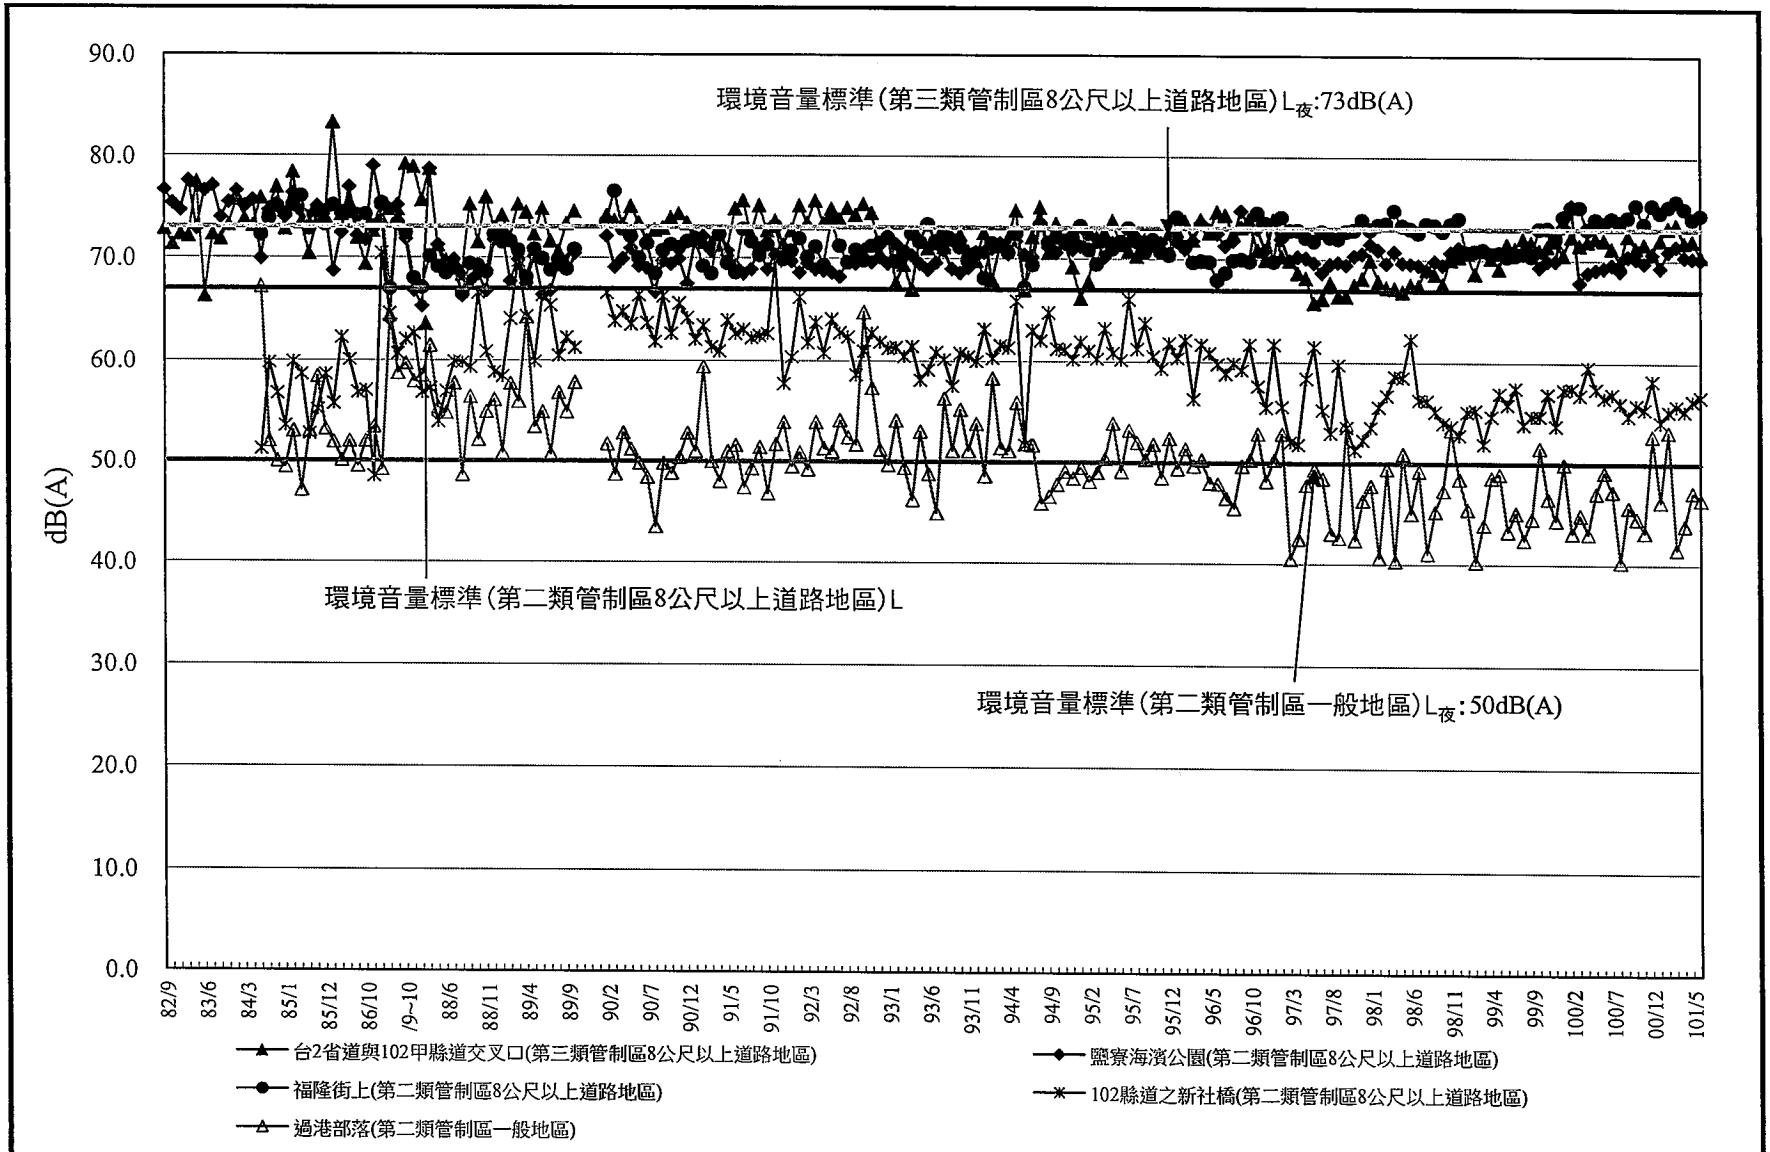


圖3.1-7 核四施工環境監測歷年噪音$L_{夜}$非假日監測結果變化圖

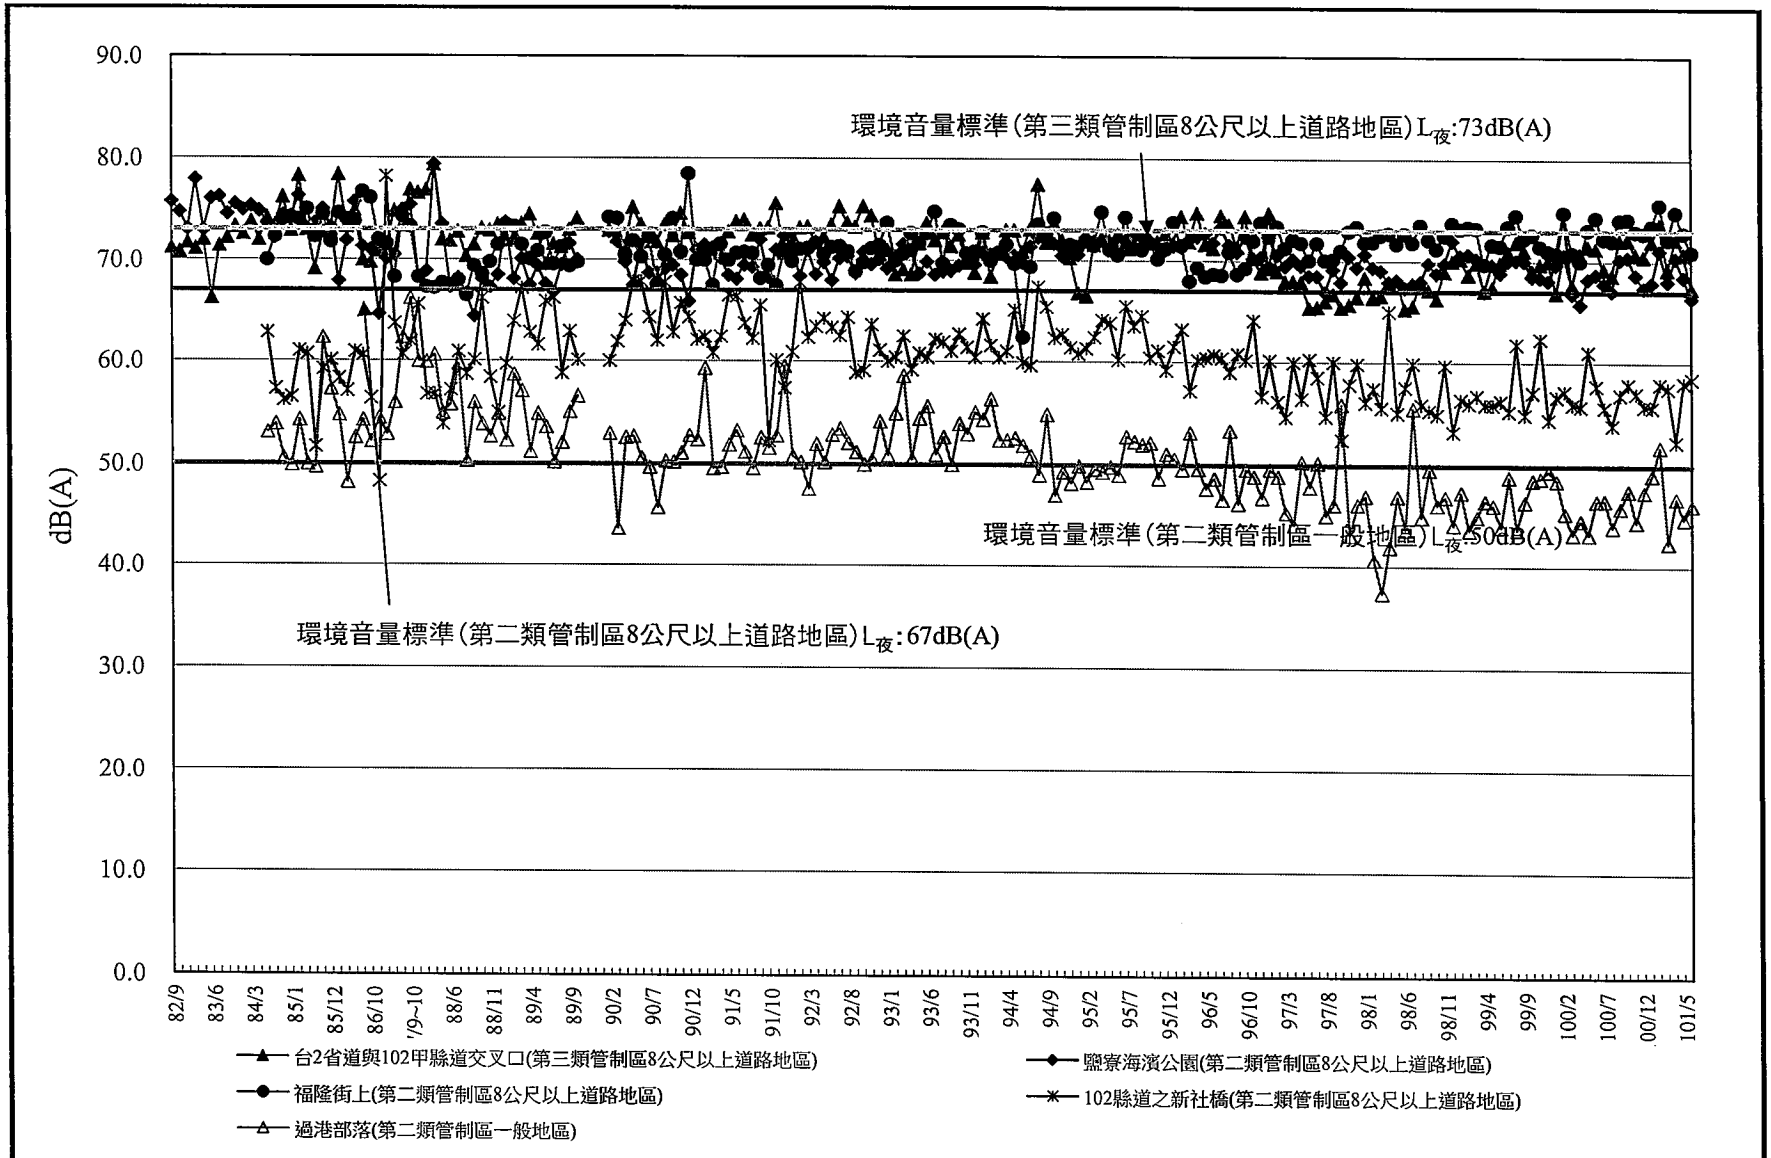


圖3.1-8 核四施工環境監測歷年噪音$L_{夜}$假日監測結果變化圖

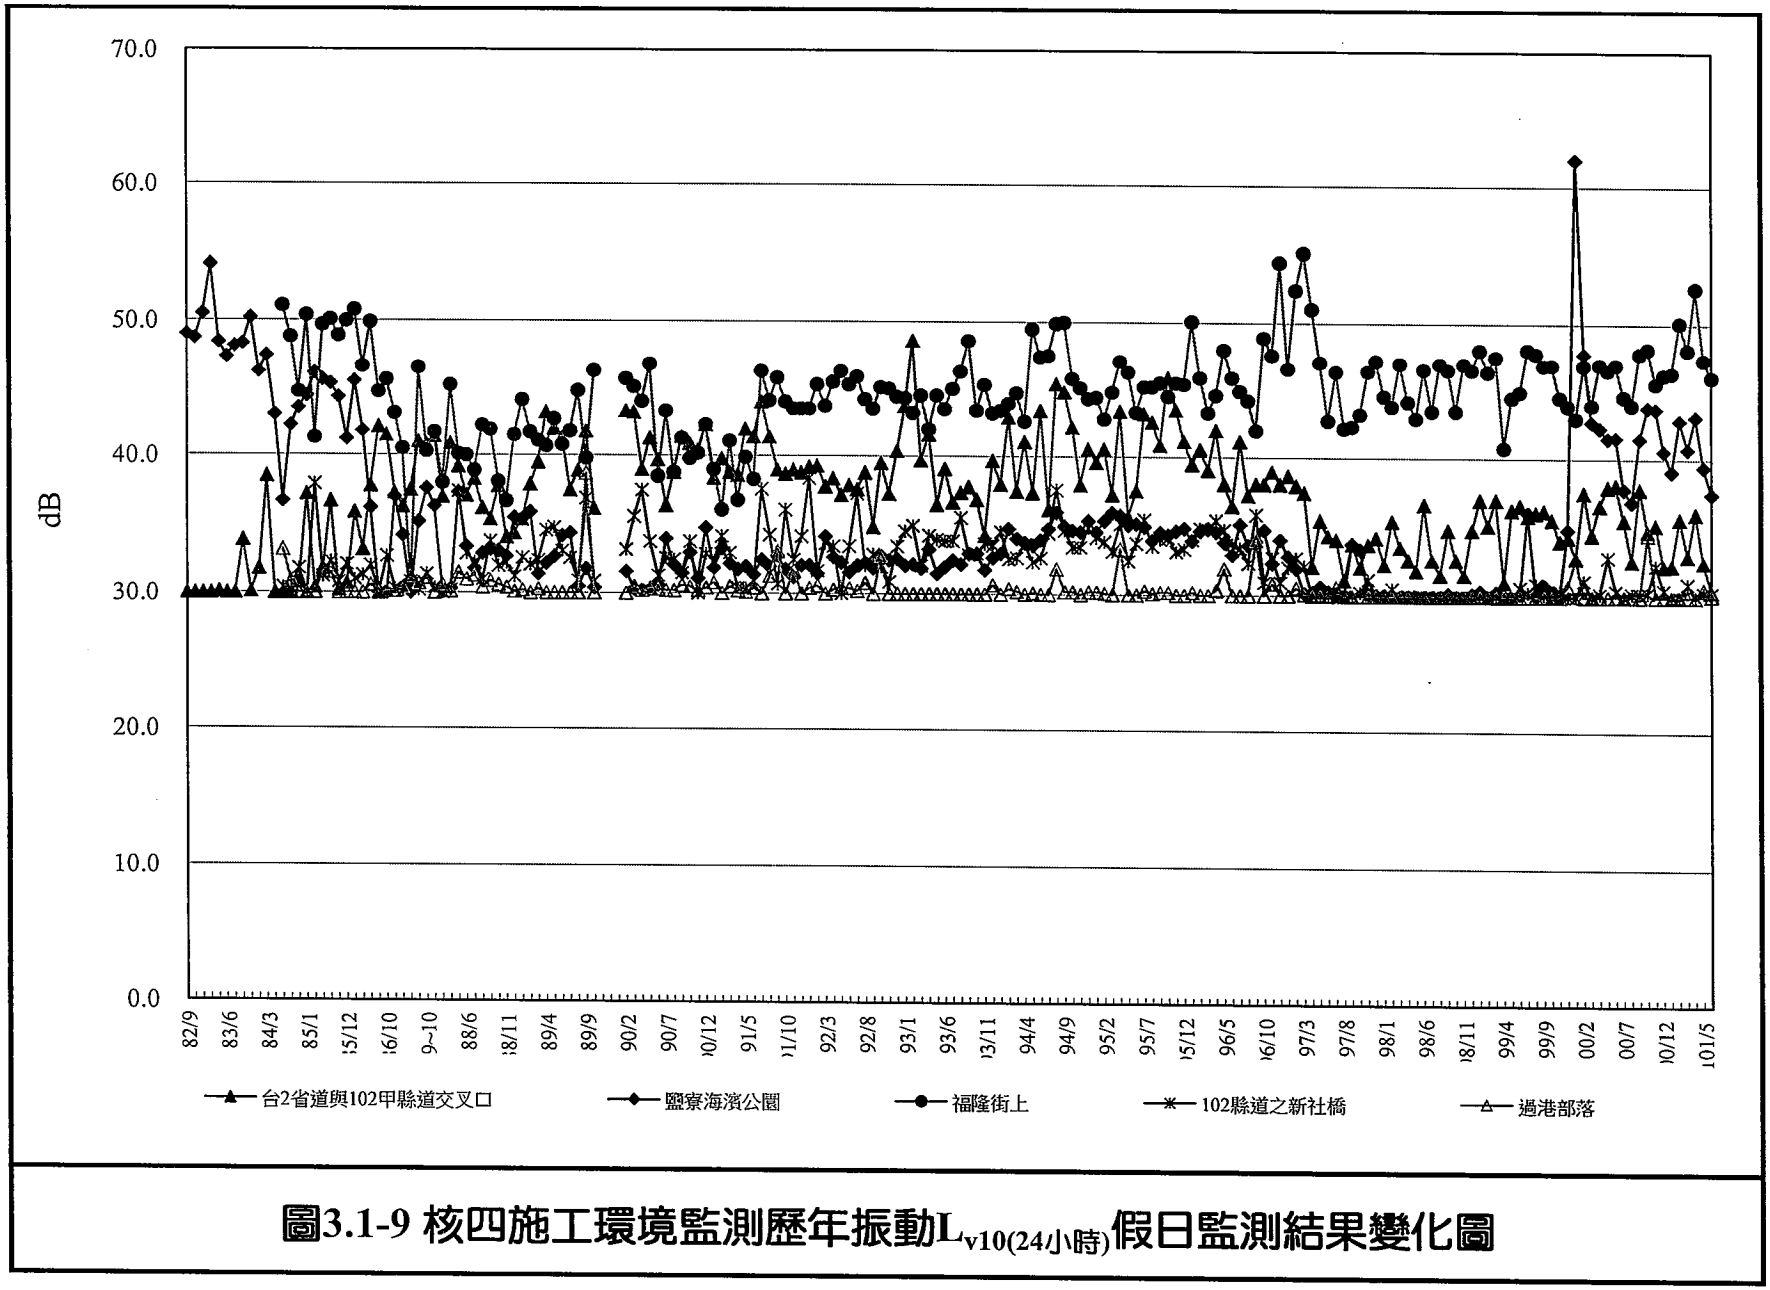


圖3.1-9 核四施工環境監測歷年振動$L_{v10(24小時)}$假日監測結果變化圖

P:\ongojob\84101\017-15\reports\101-2\T3_噪音振動;F3.1-3~3.1-14

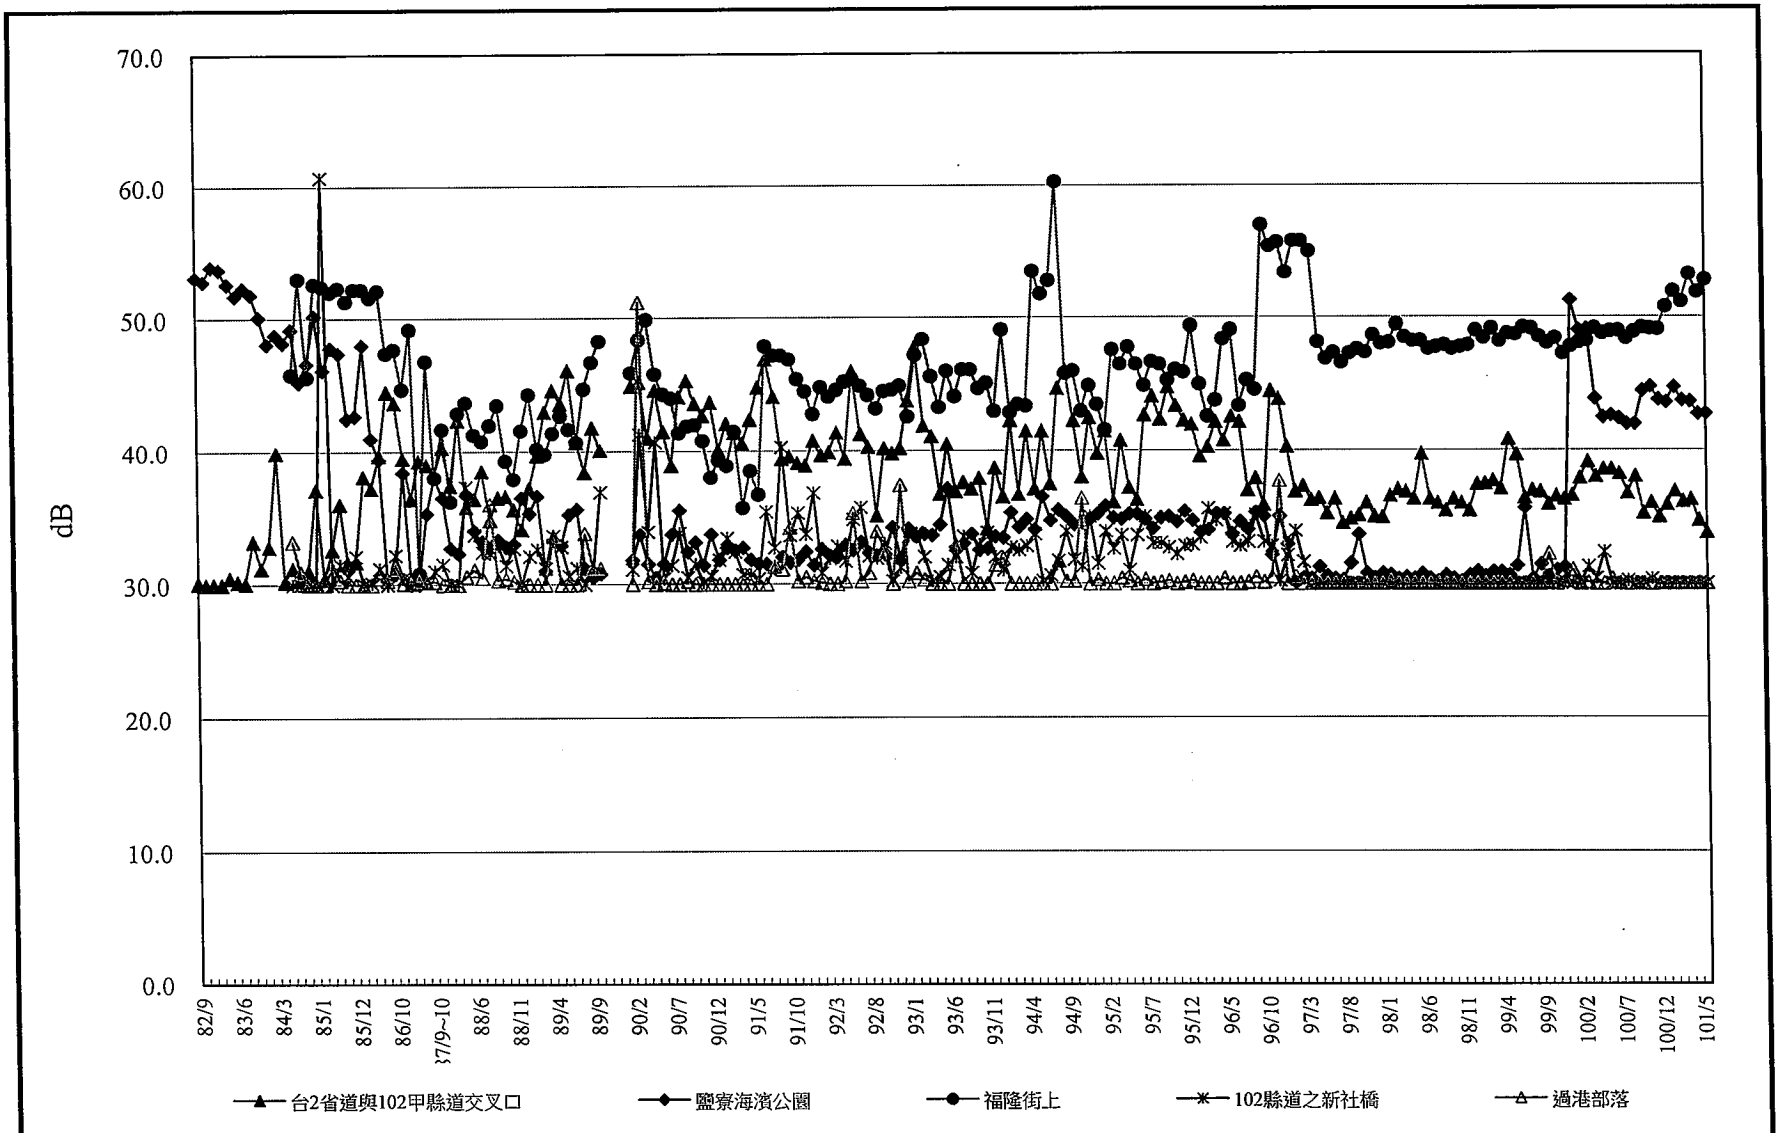


圖3.1-10 核四施工環境監測歷年振動$_{Lv10(24小時)}$非假日監測結果變化圖

P:\ongojob\84101\017-15\reports\101-2\T3_噪音振動;F3.1-3~3.1-14

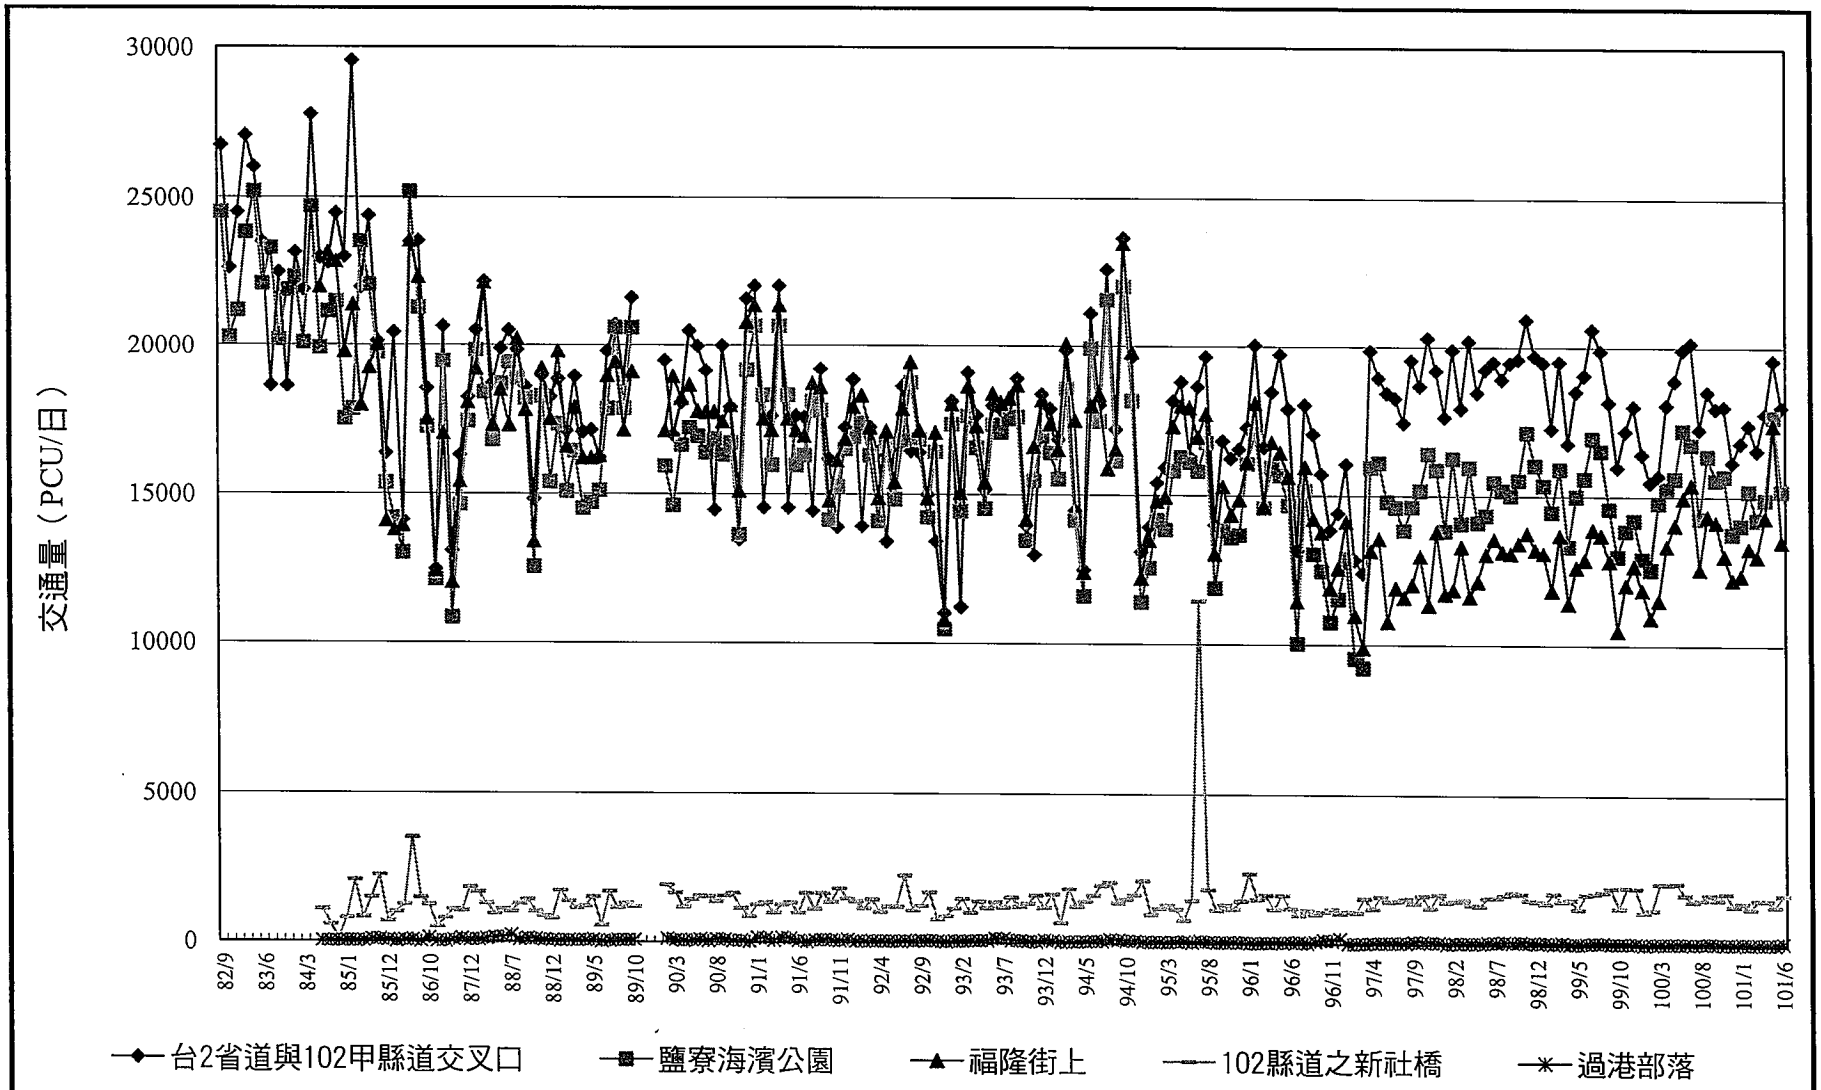


圖3.1-11 核四施工環境監測各測站歷年非假日交通量監測結果

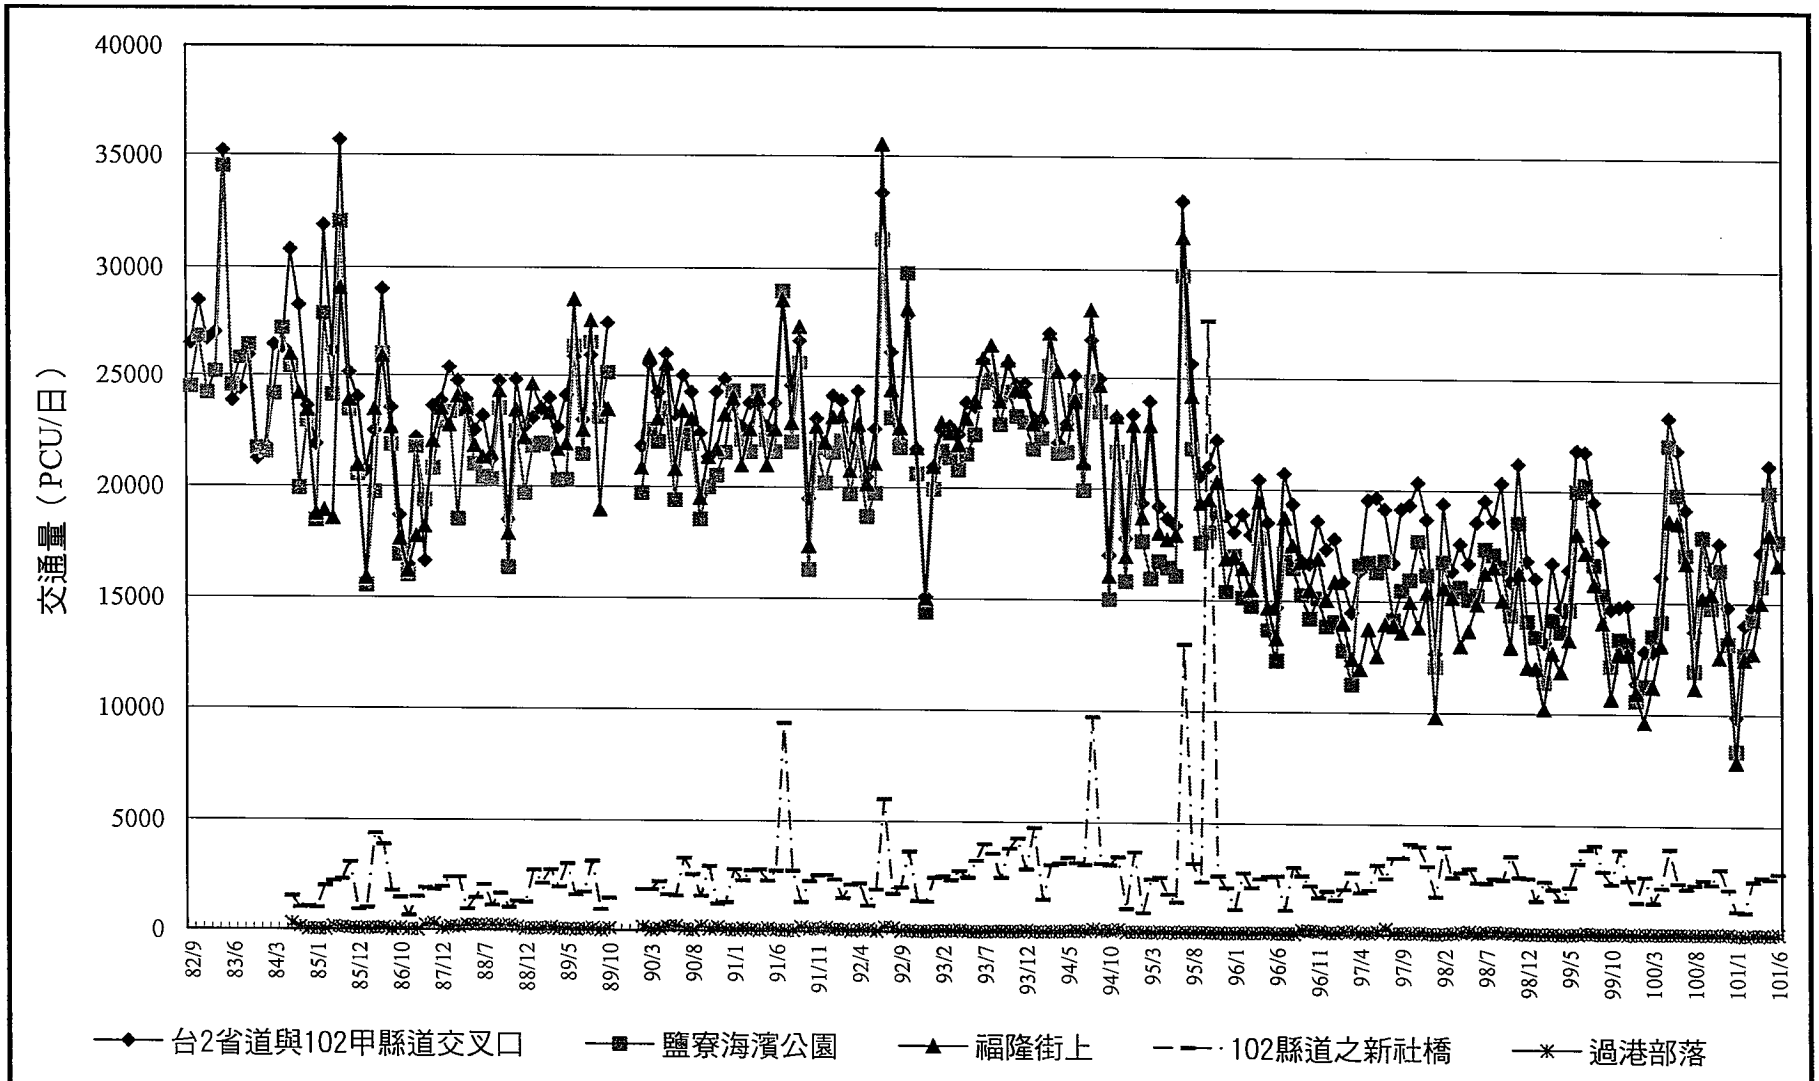


圖3.1-12 核四施工環境監測各測站歷年假日交通量監測結果

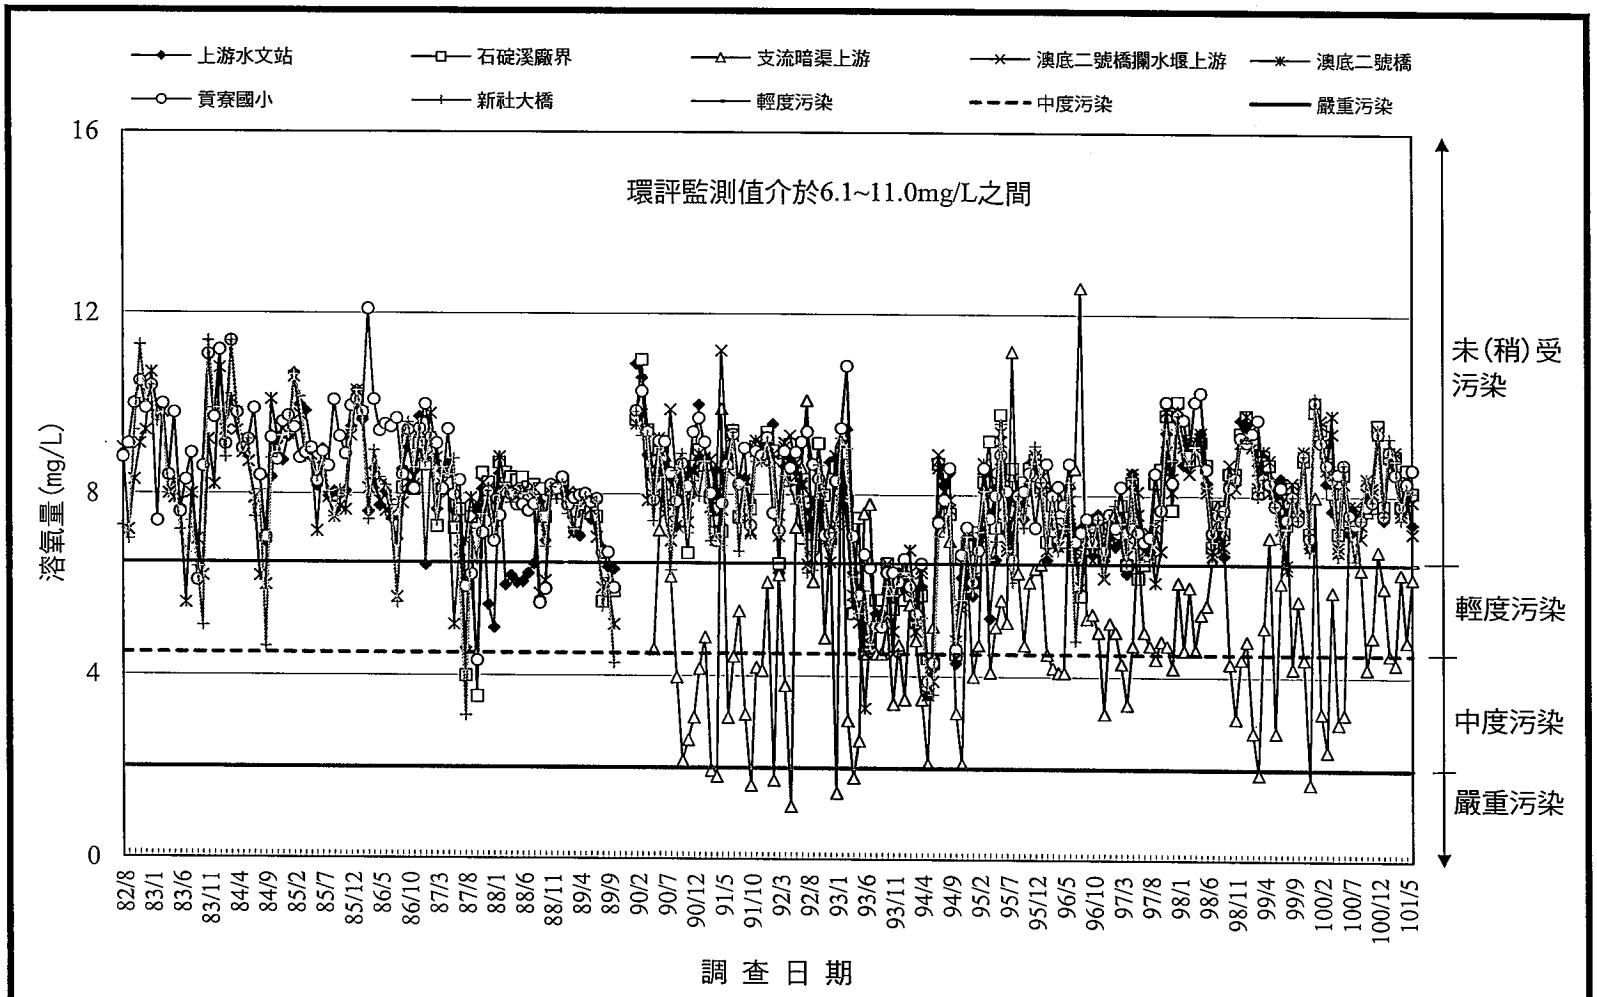


圖3.1-13 核四施工環境監測河川水質歷年調查溶氧量變化圖

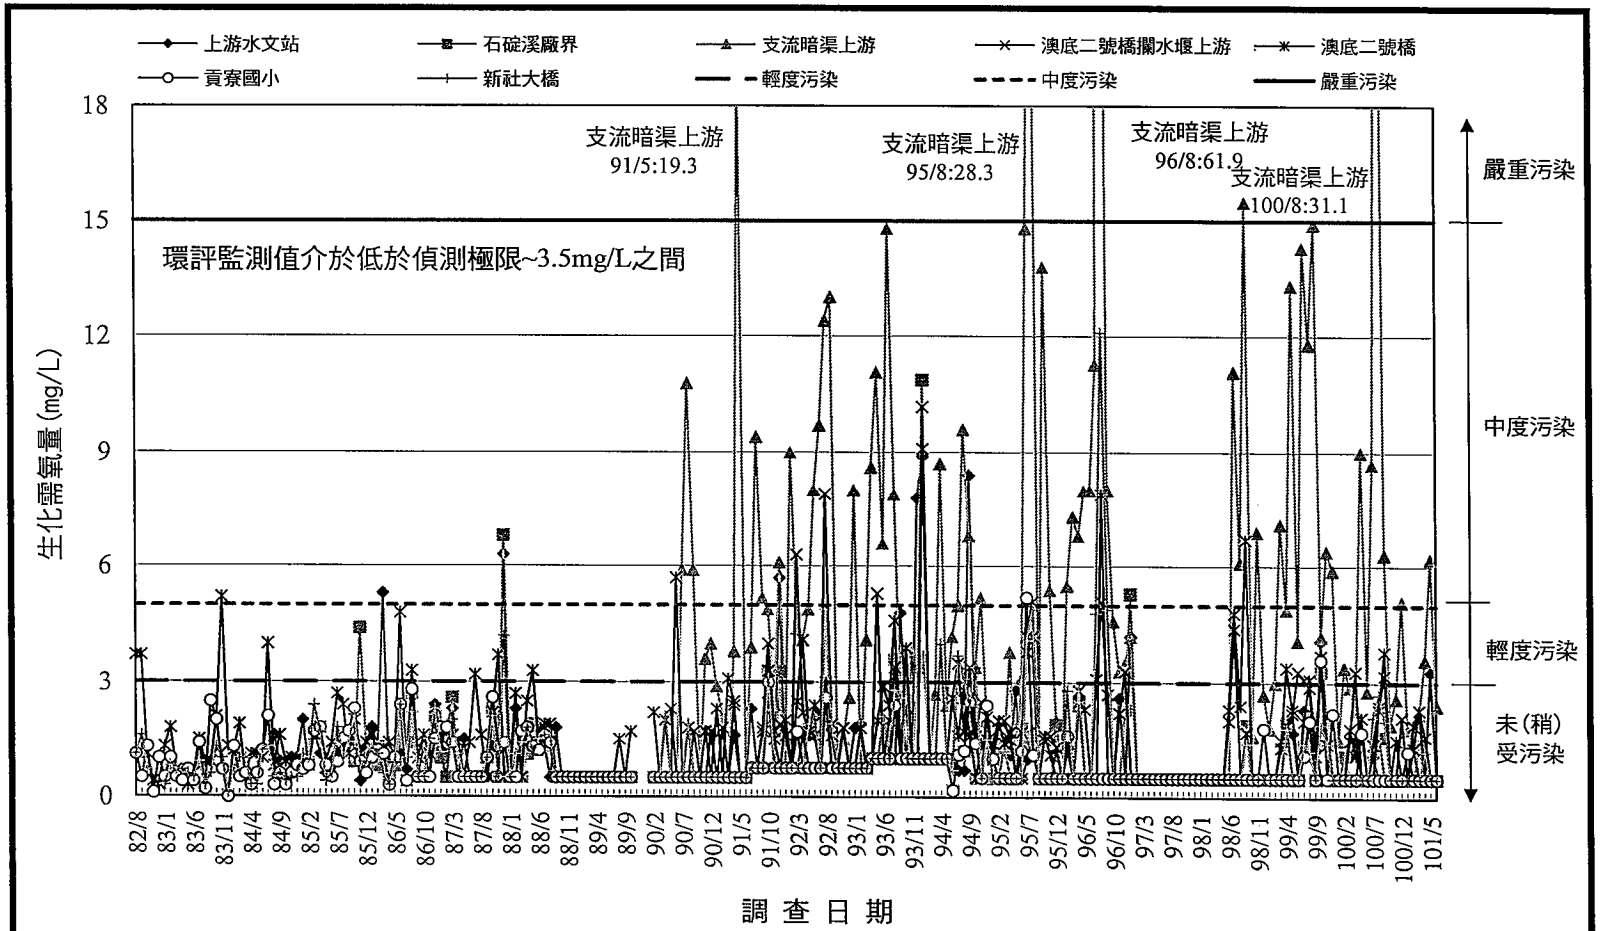


圖3.1-14 核四施工環境監測河川水質歷年調查生化需氧量變化圖

P:\ongojob\84101\017-15\reports\101-2\T3_河川水;F3.1-13~18

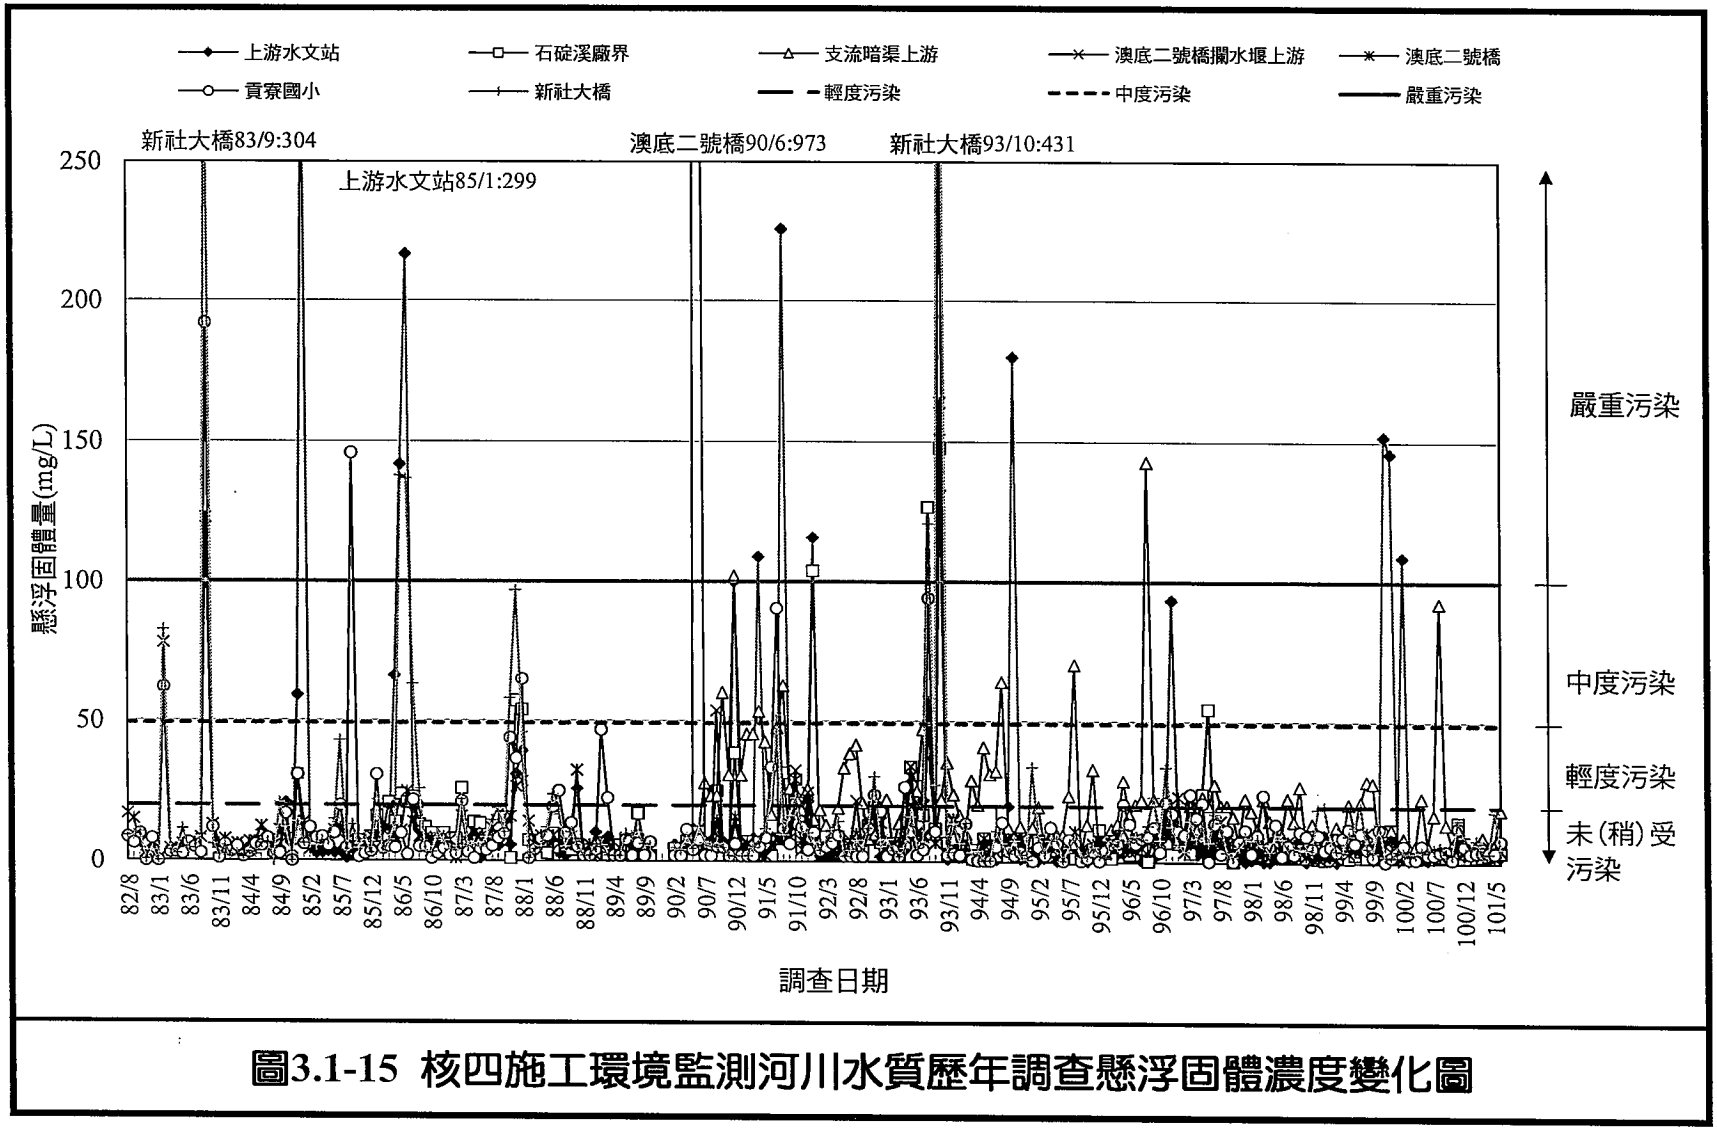


圖3.1-15 核四施工環境監測河川水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖

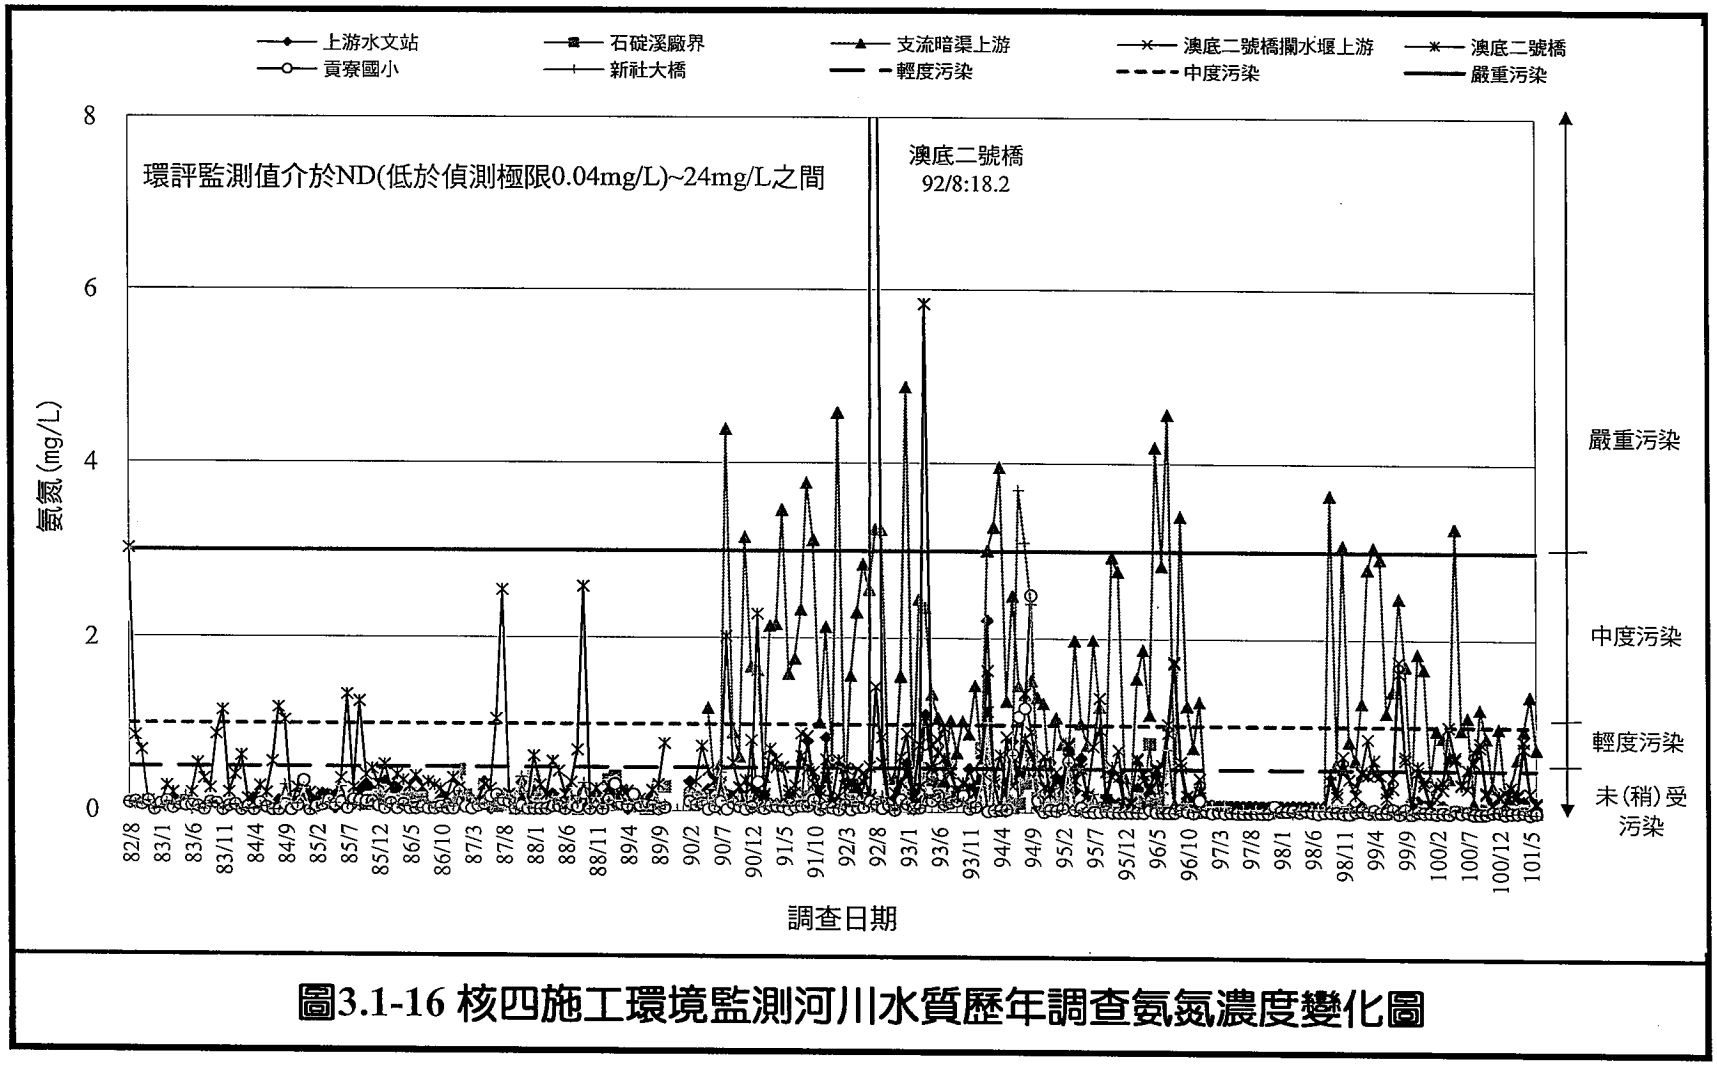


圖3.1-16 核四施工環境監測河川水質歷年調查氨氮濃度變化圖

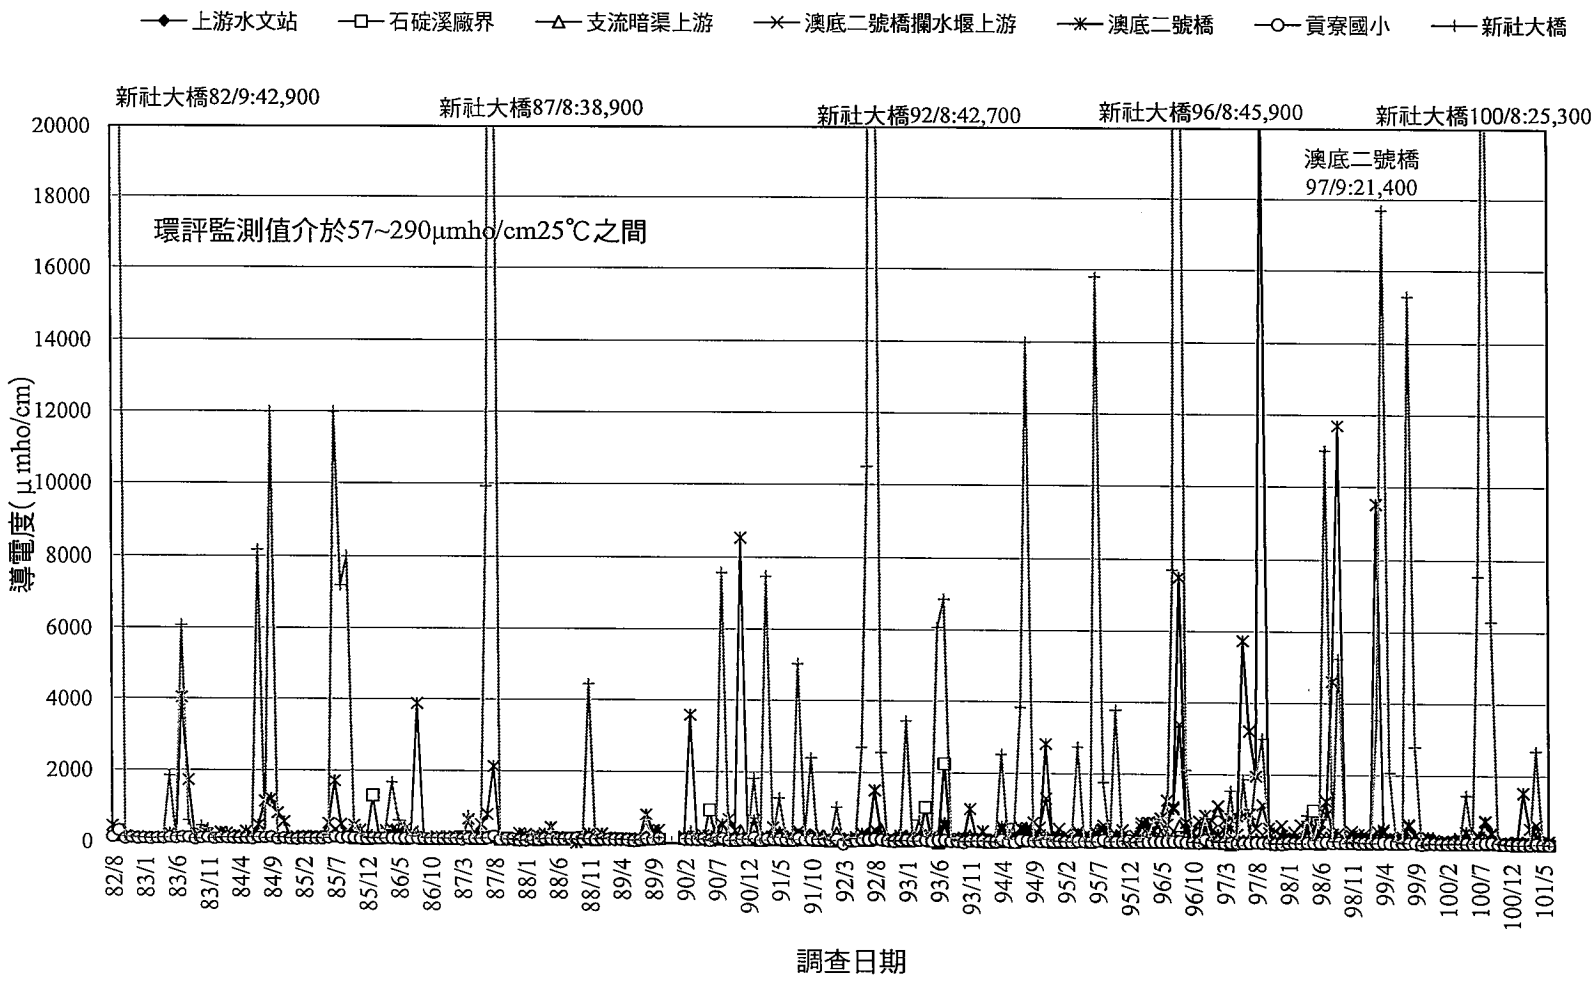


圖3.1-17 核四施工環境監測河川水質歷年調查導電度變化圖

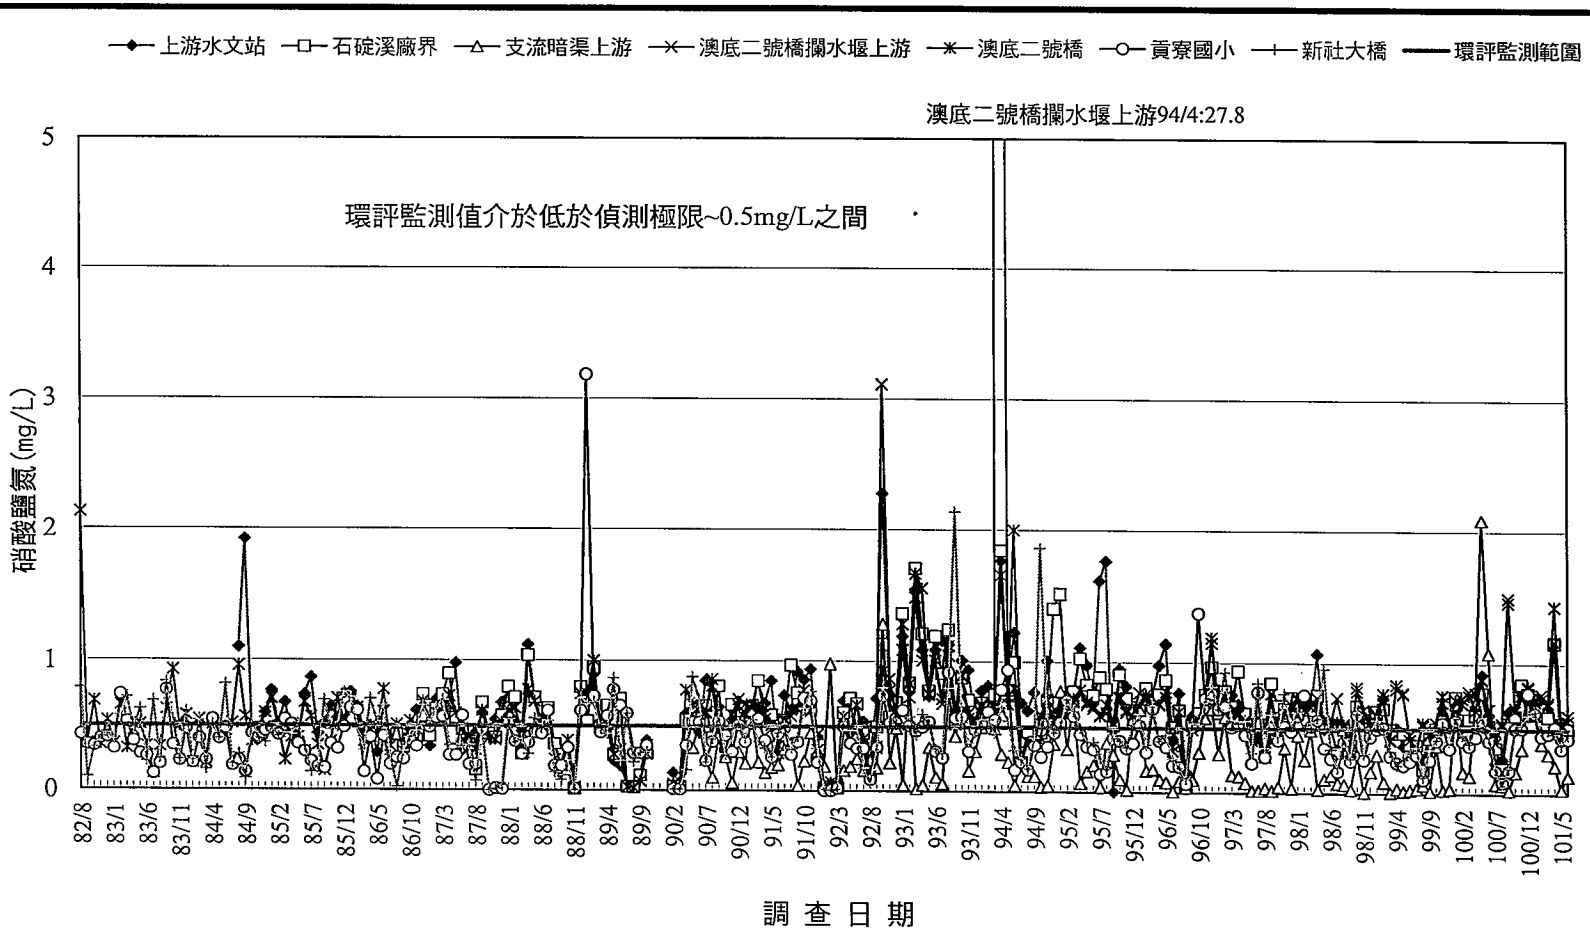


圖3.1-18 核四施工環境監測河川水質歷年調查硝酸鹽氮濃度變化圖

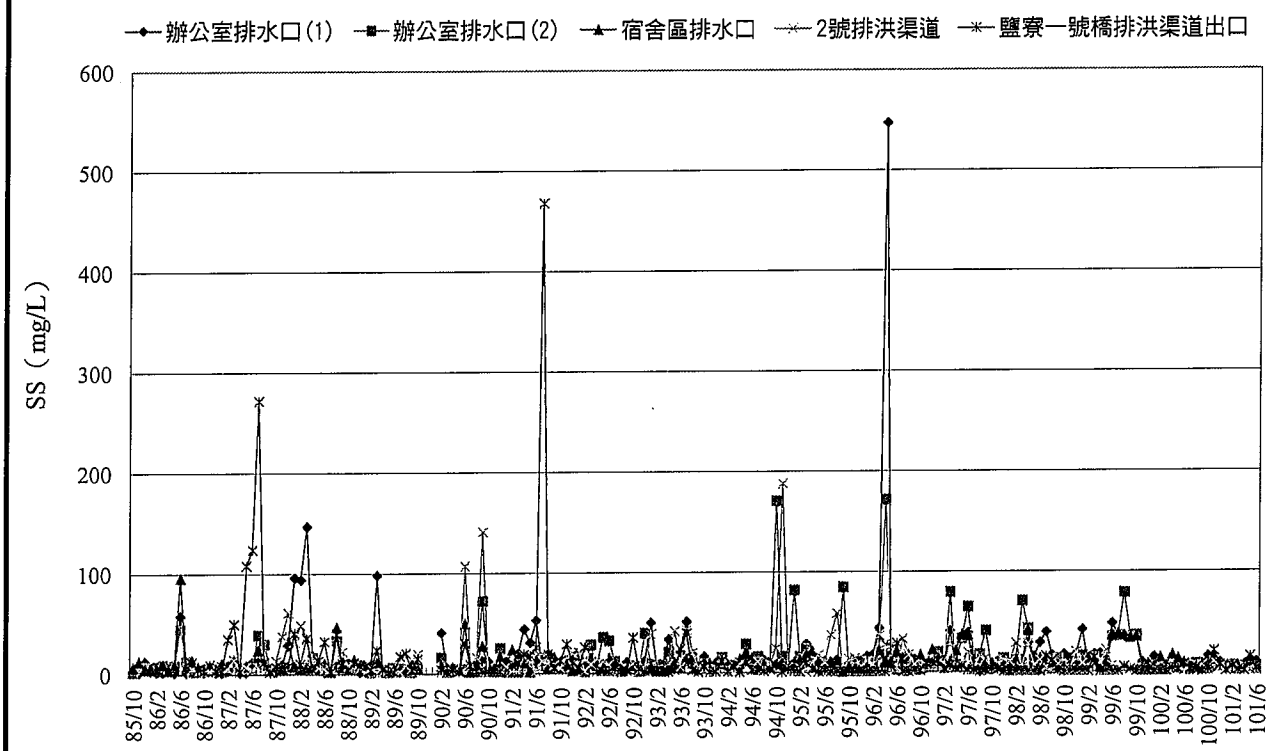


圖3.1-19 核四施工環境監測廠區水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖

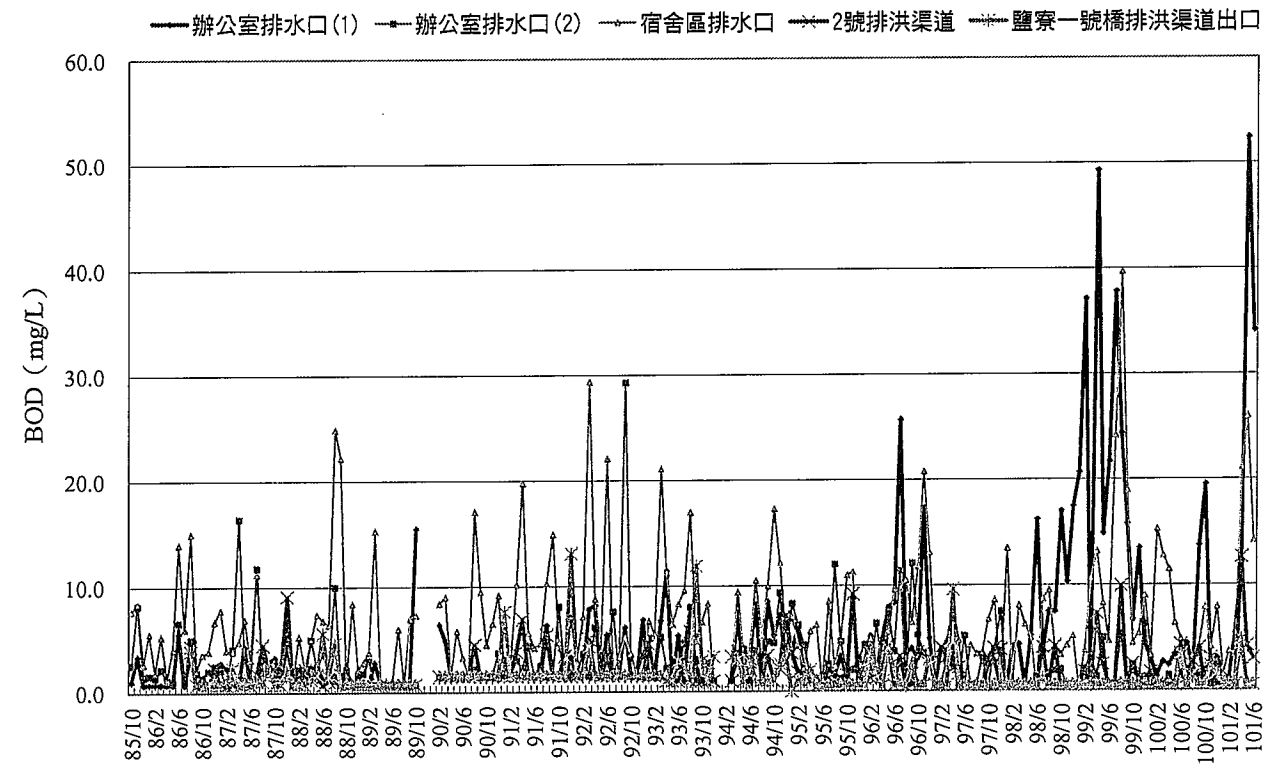


圖3.1-20 核四施工環境監測廠區水質歷年調查生化需氧量變化圖

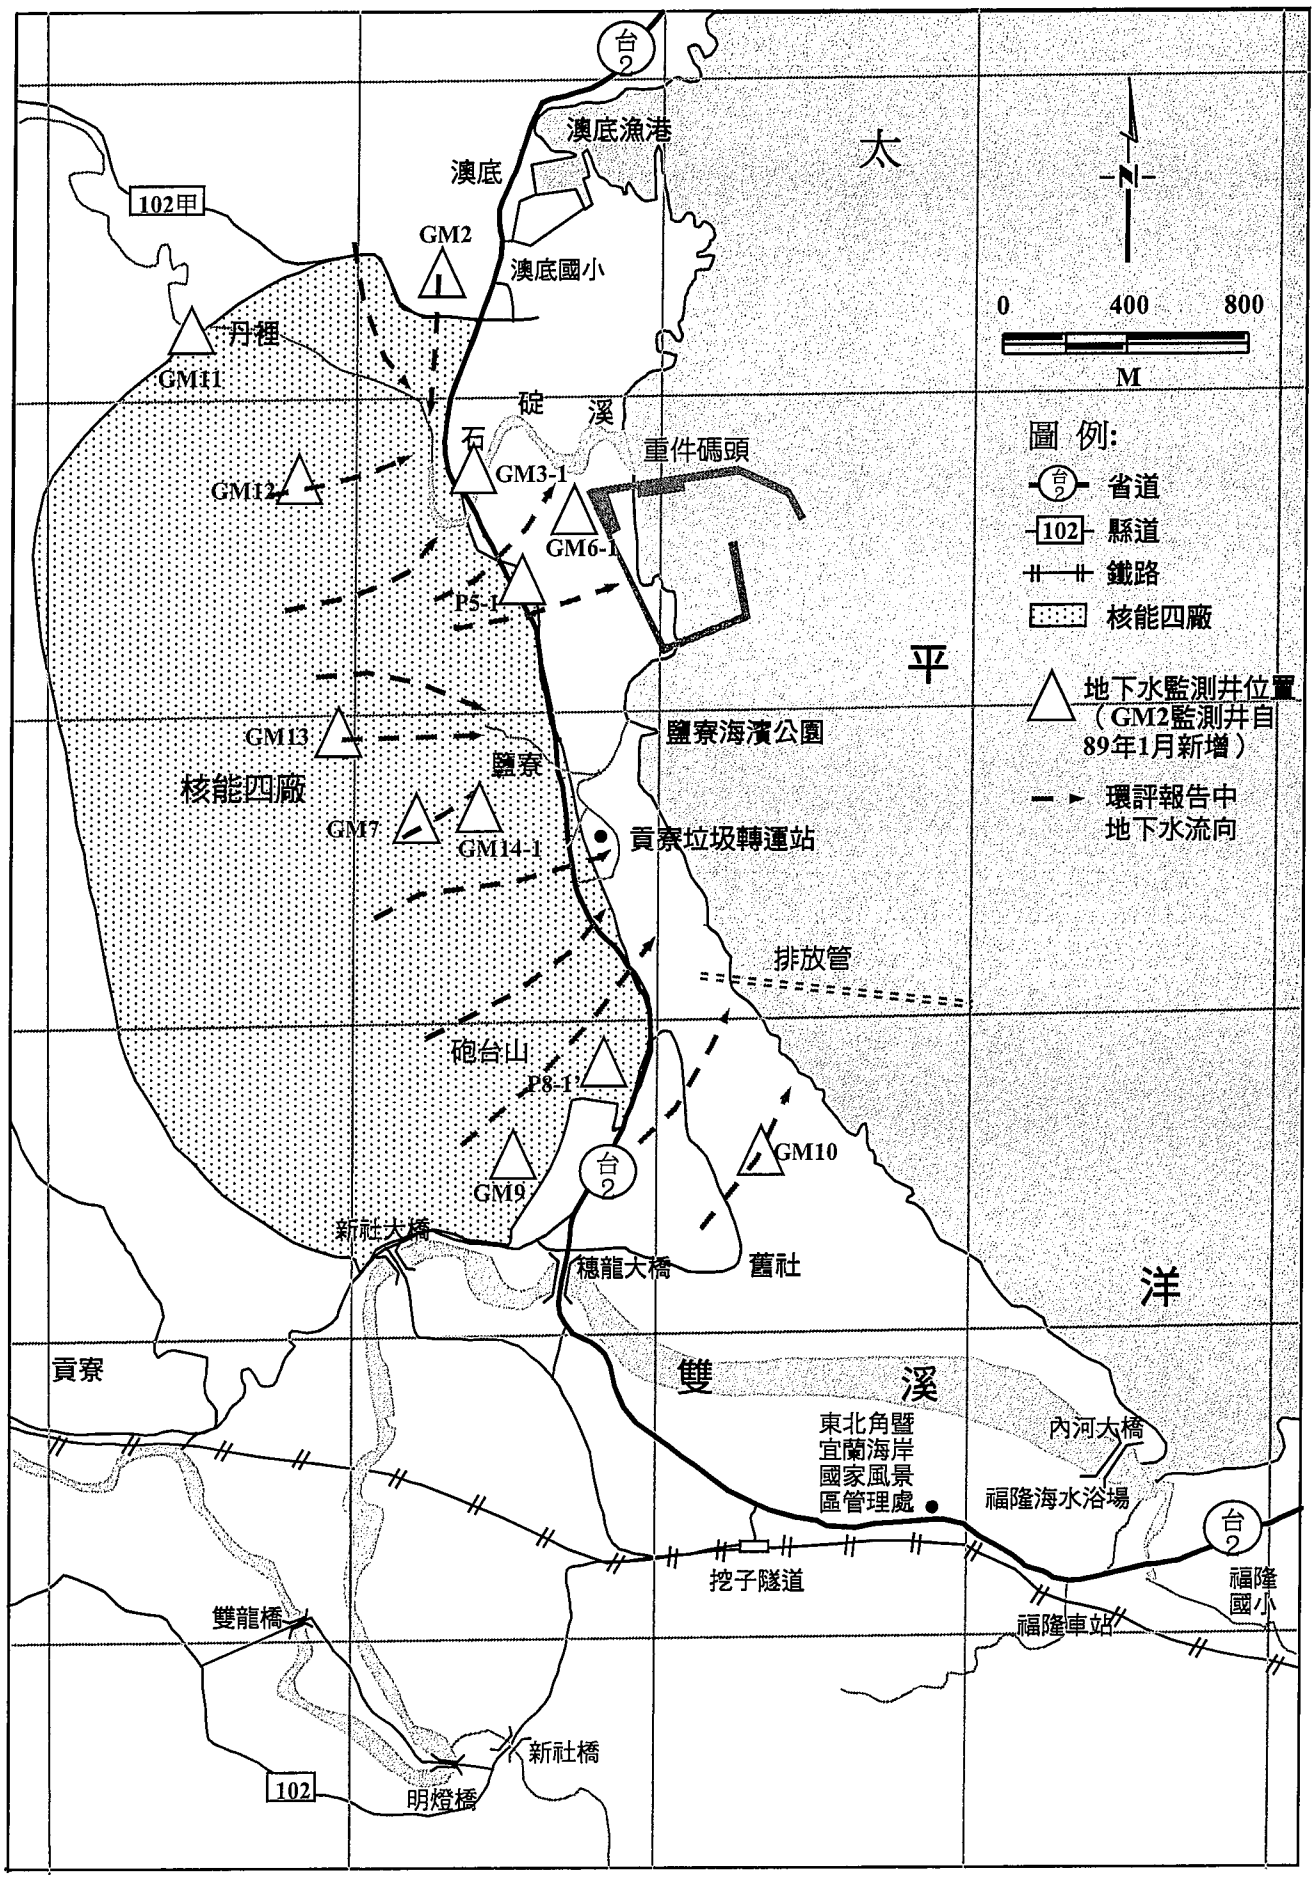


圖3.1-21 核四施工環境監測地下水流向示意圖

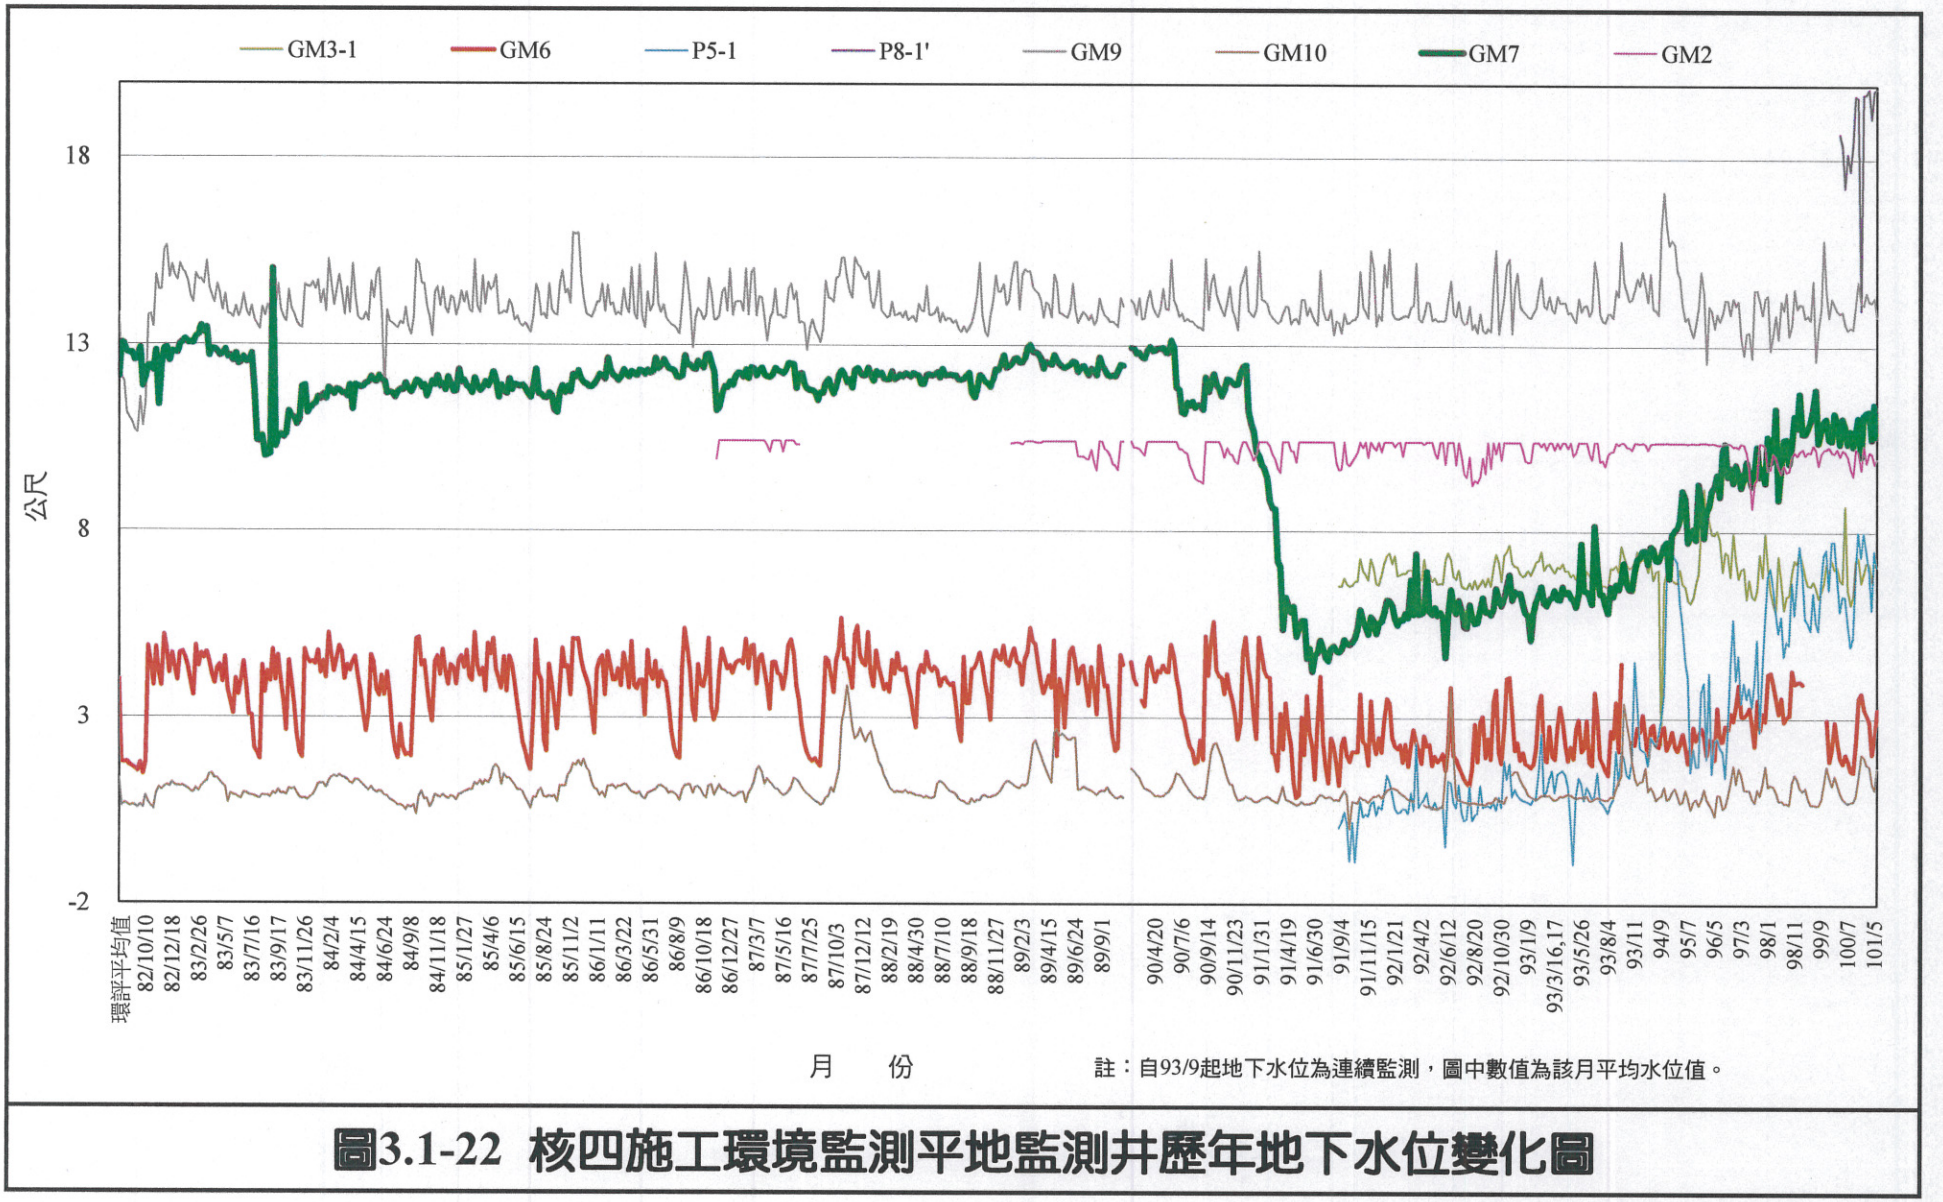


圖3.1-22 核四施工環境監測平地監測井歷年地下水位變化圖

C:\Users\sylvia lai\Documents\我已接收的檔案\T3_地下水;圖3.1-22~23

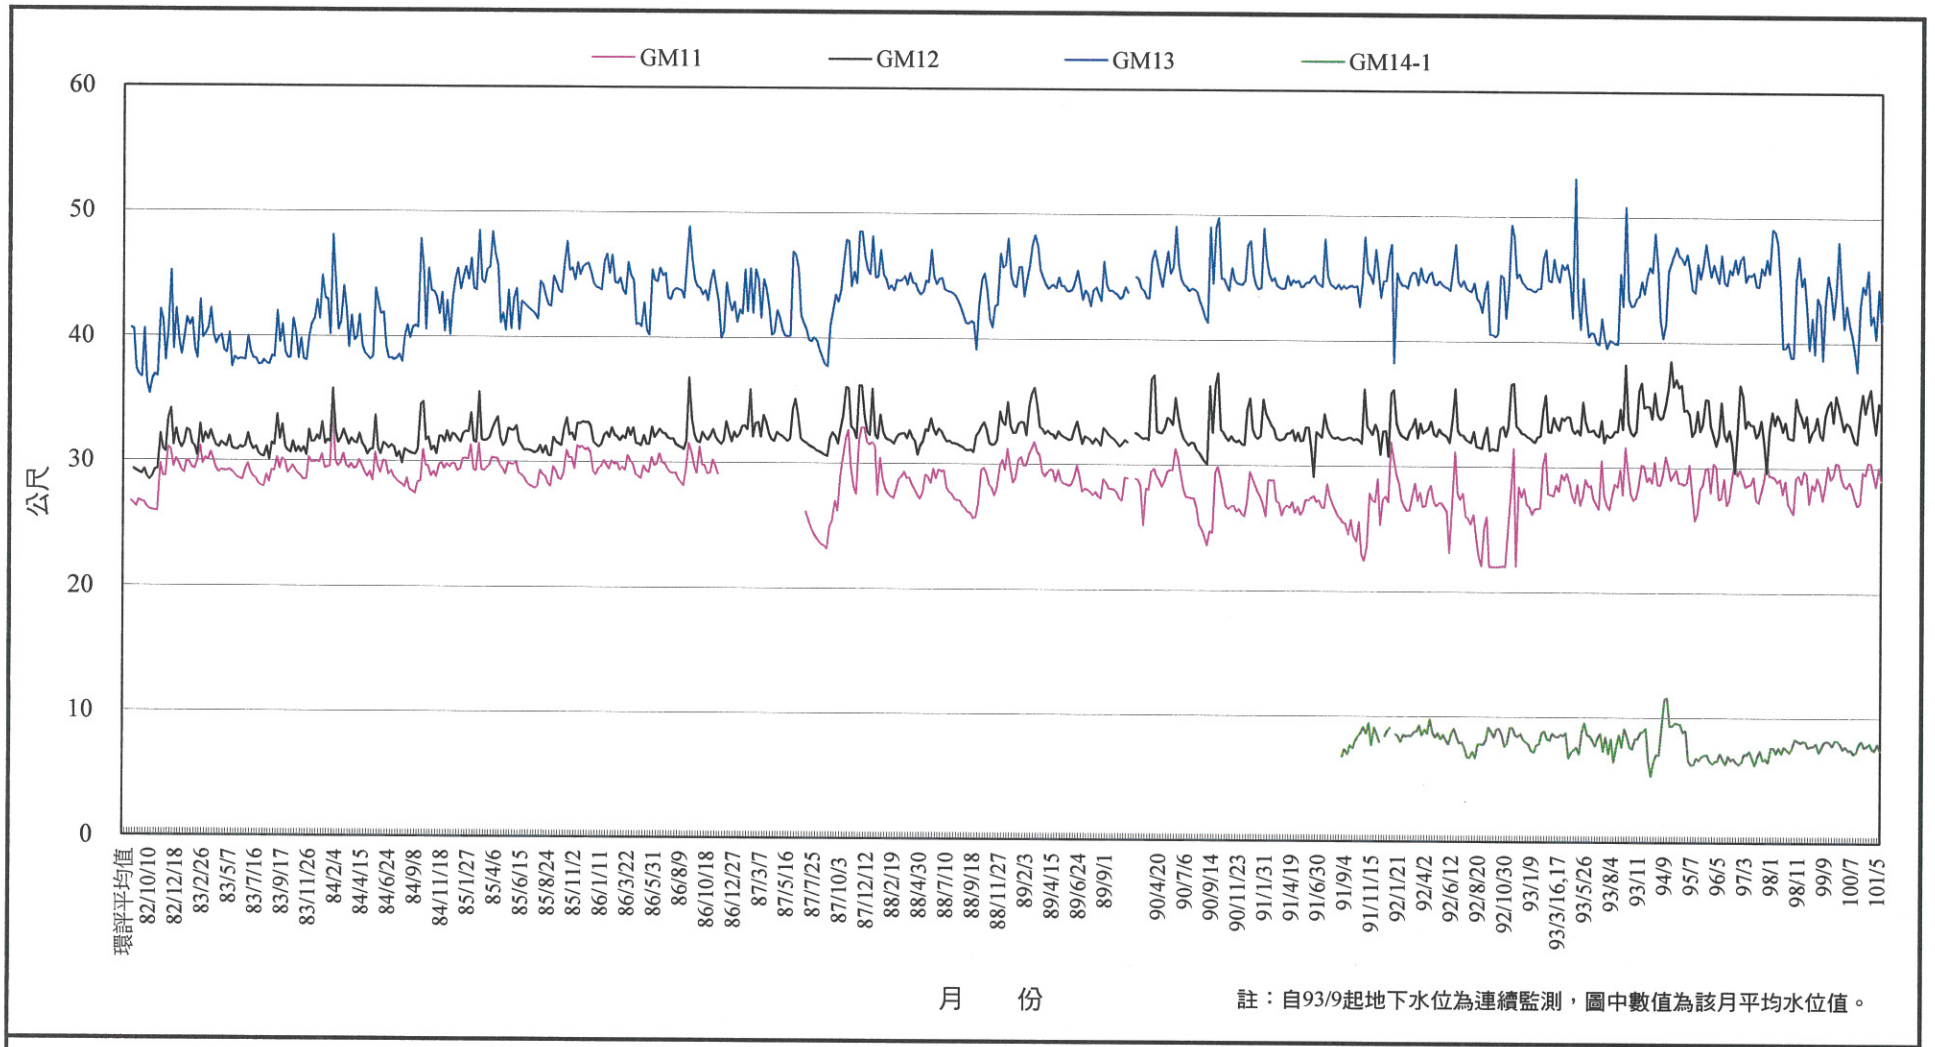


圖3.1-23 核四施工環境監測山區監測井歷年地下水位變化圖

C:\Users\sylvia lai\Documents\我已接收的檔案\T3_地下水;圖3.1-22~23

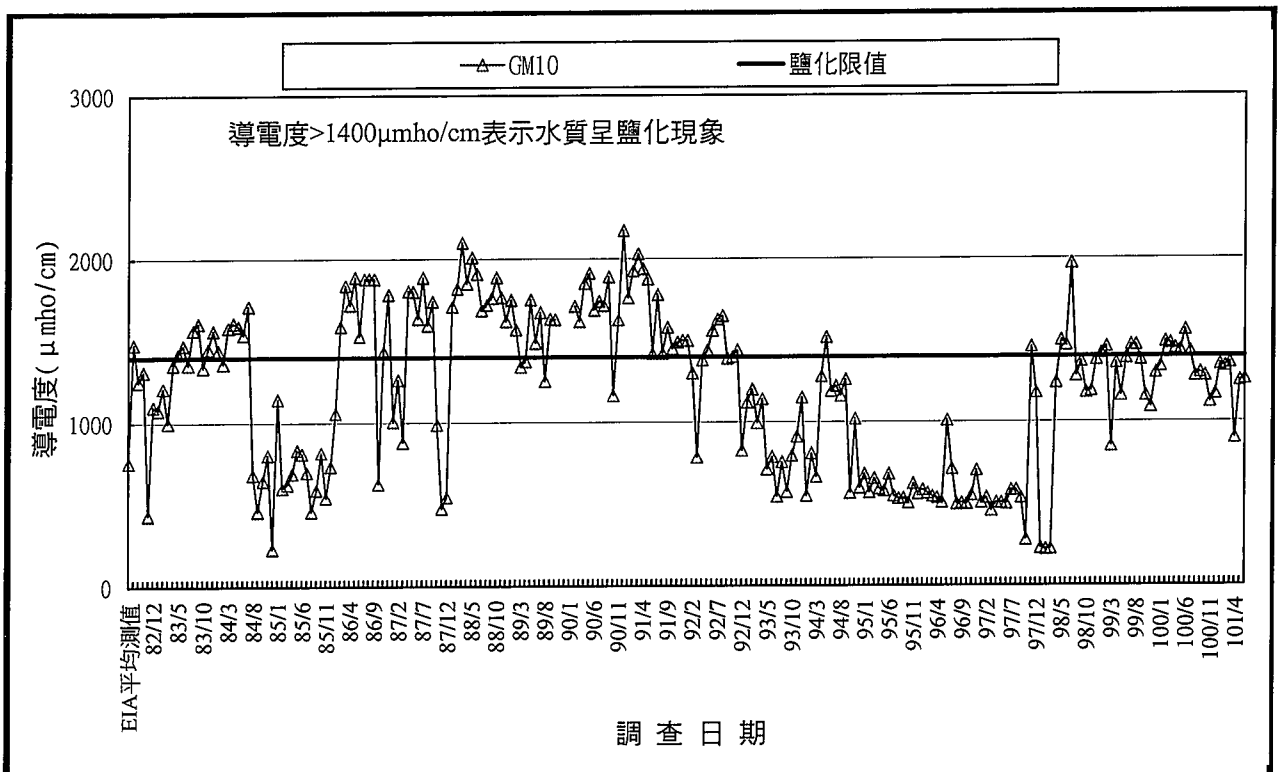


圖3.1-24 核四施工環境監測GM10監測井歷年地下水導電度監測結果

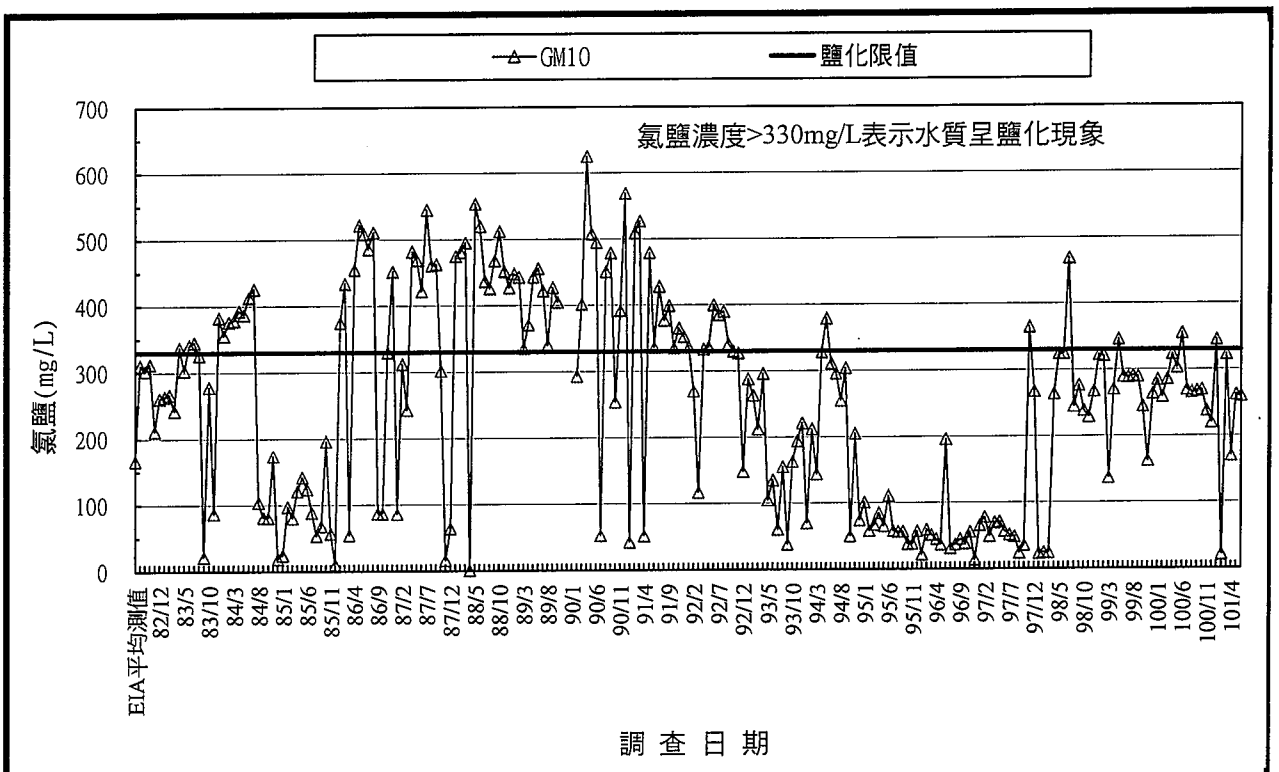


圖3.1-25 核四施工環境監測GM10監測井歷年地下水氯鹽監測結果

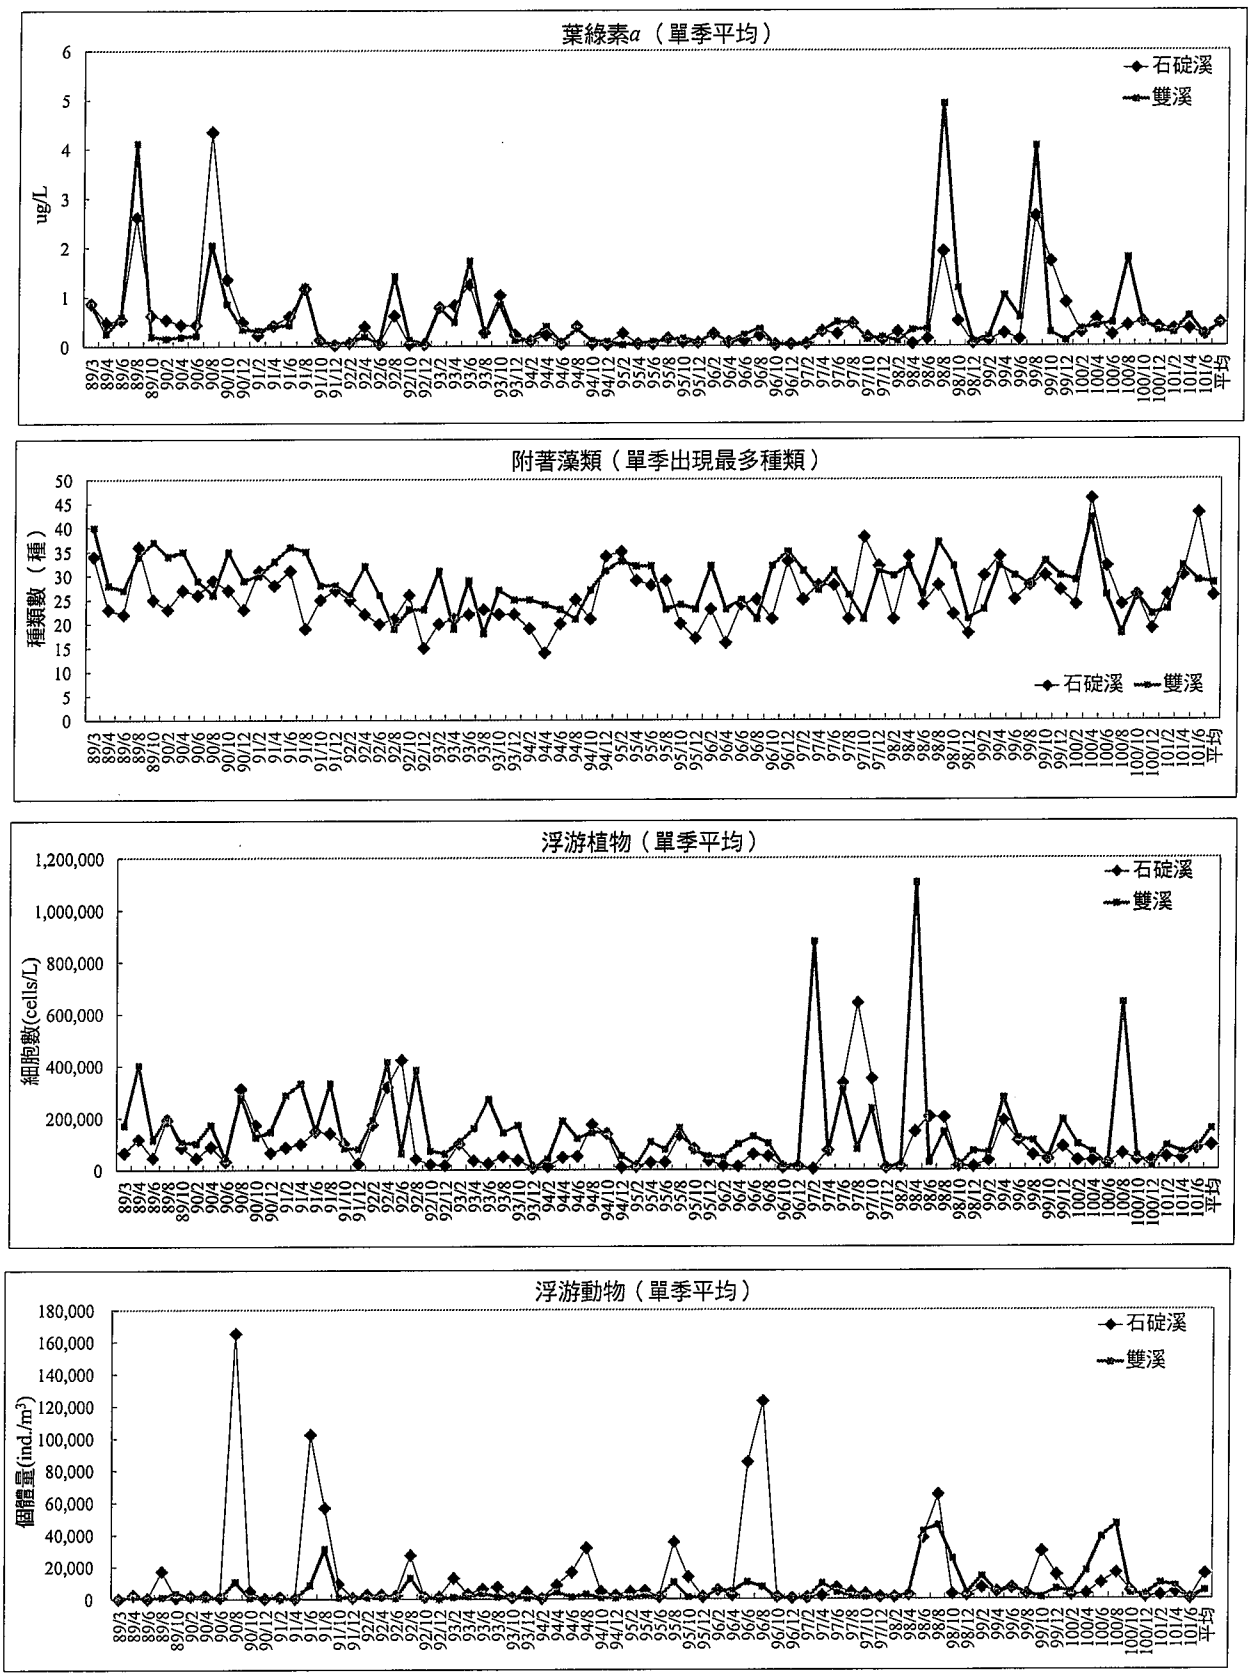


圖3.1-26 核四施工期間環境監測河域生態長期趨勢分析



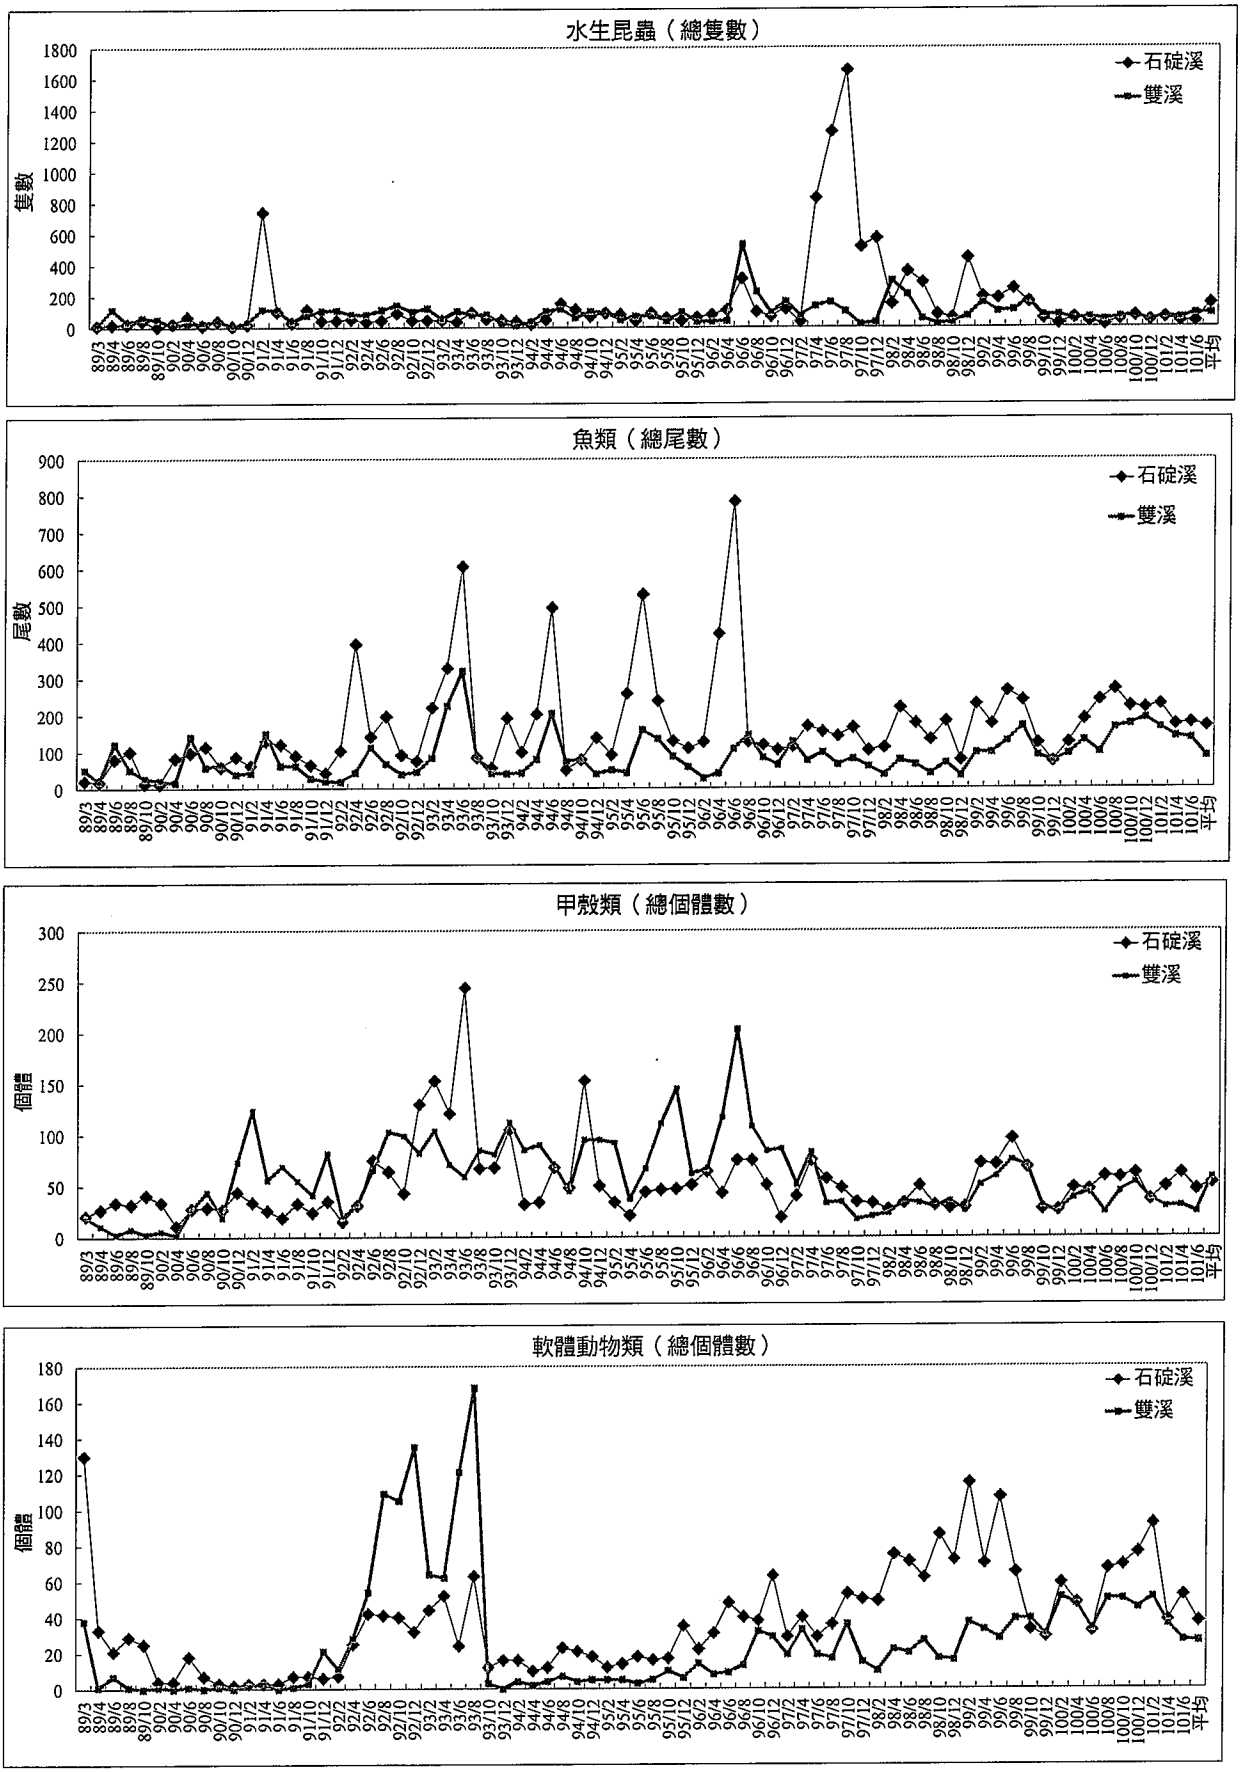


圖3.1-26 核四施工期間環境監測河域生態長期趨勢分析（續）

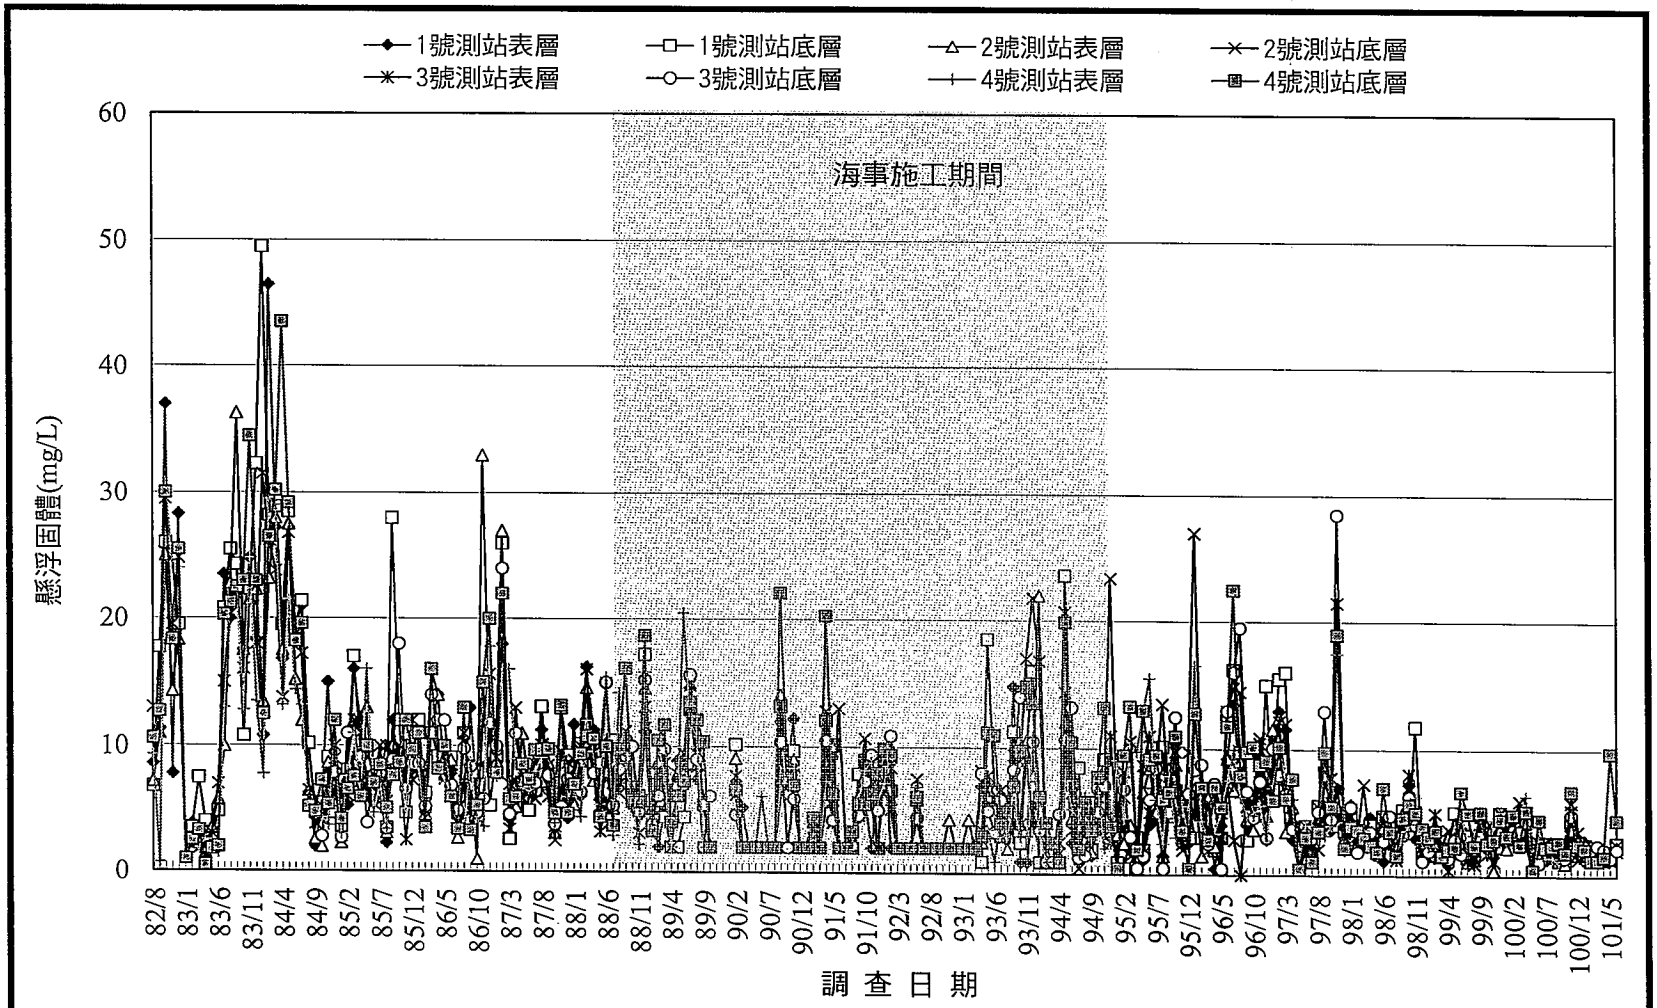


註：若測值為ND（低於儀器偵測極限）則採（儀器偵測極限值/2）表示之

圖3.1-27 核四施工環境監測海域水質歷年調查懸浮固體濃度變化圖

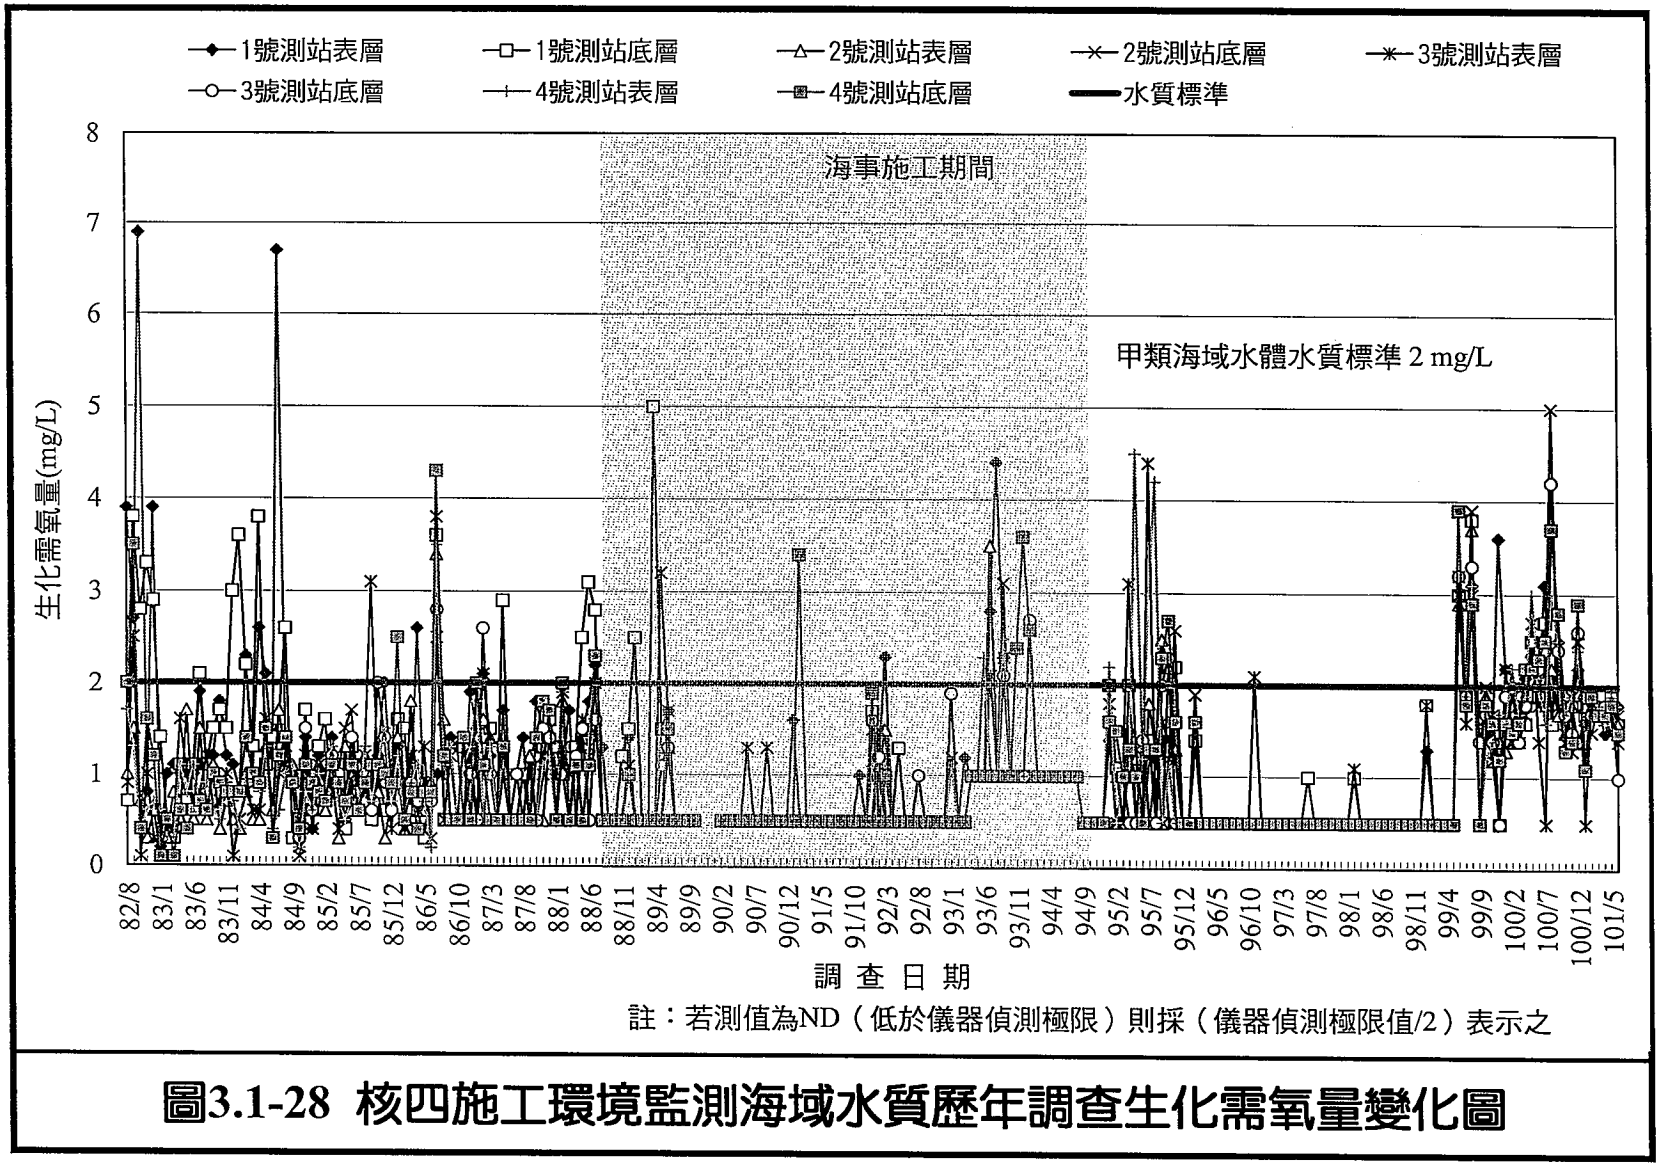

註：若測值為ND（低於儀器偵測極限）則採（儀器偵測極限值/2）表示之

圖3.1-28 核四施工環境監測海域水質歷年調查生化需氧量變化圖

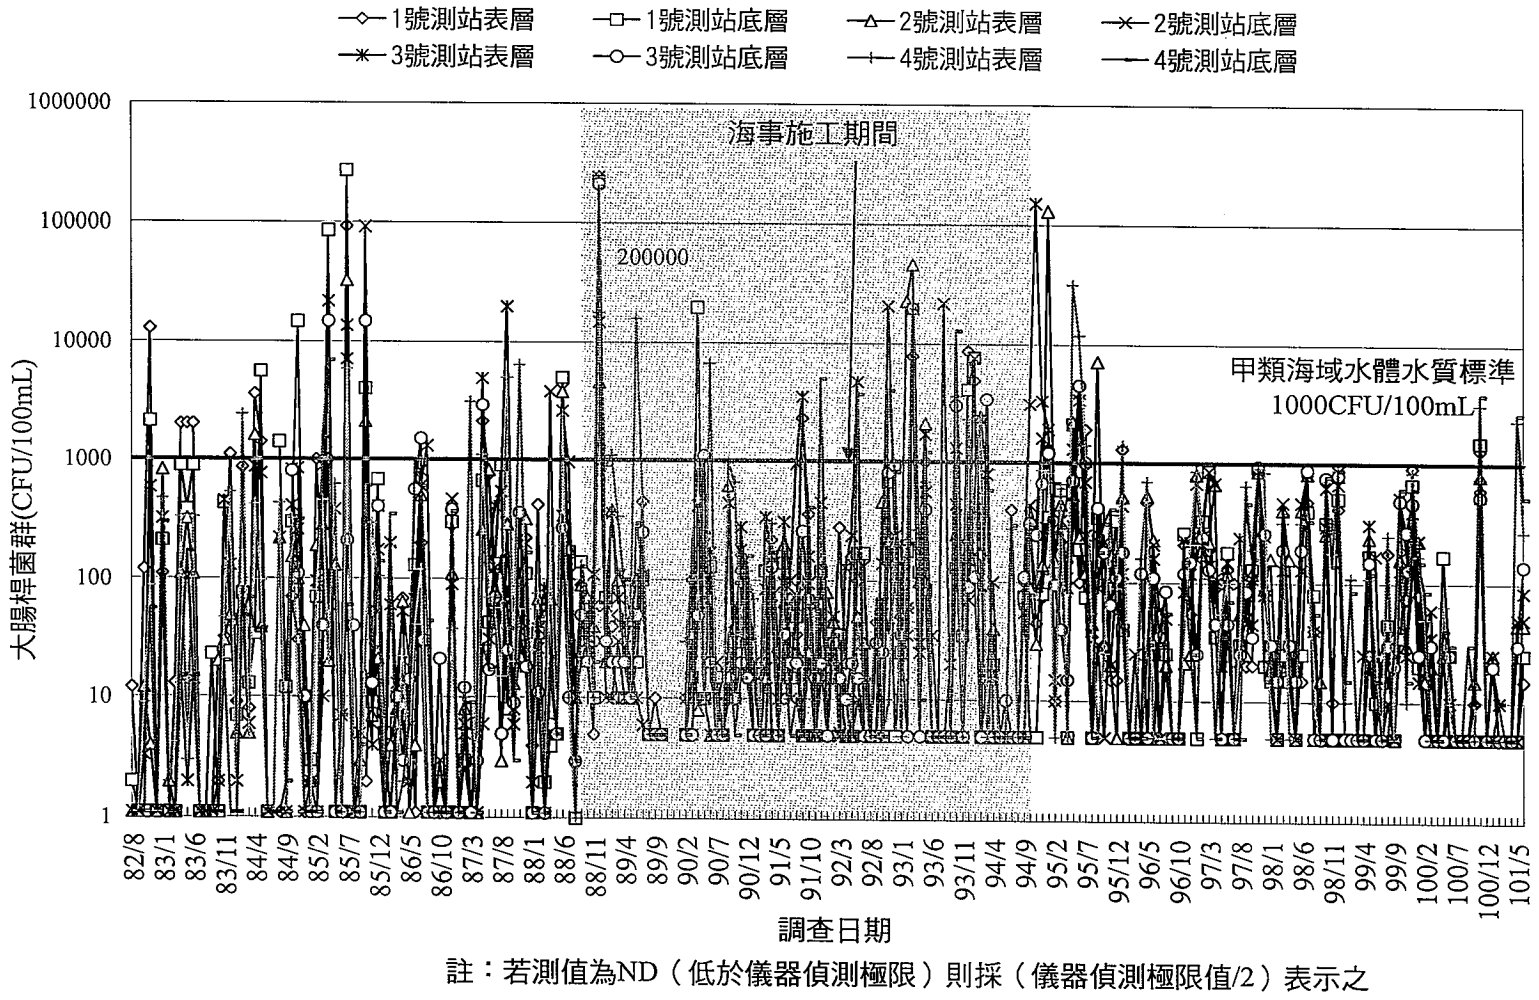

註：若測值為ND（低於儀器偵測極限）則採（儀器偵測極限值/2）表示之

圖3.1-29 核四施工環境監測海域水質歷年調查大腸桿菌群變化圖

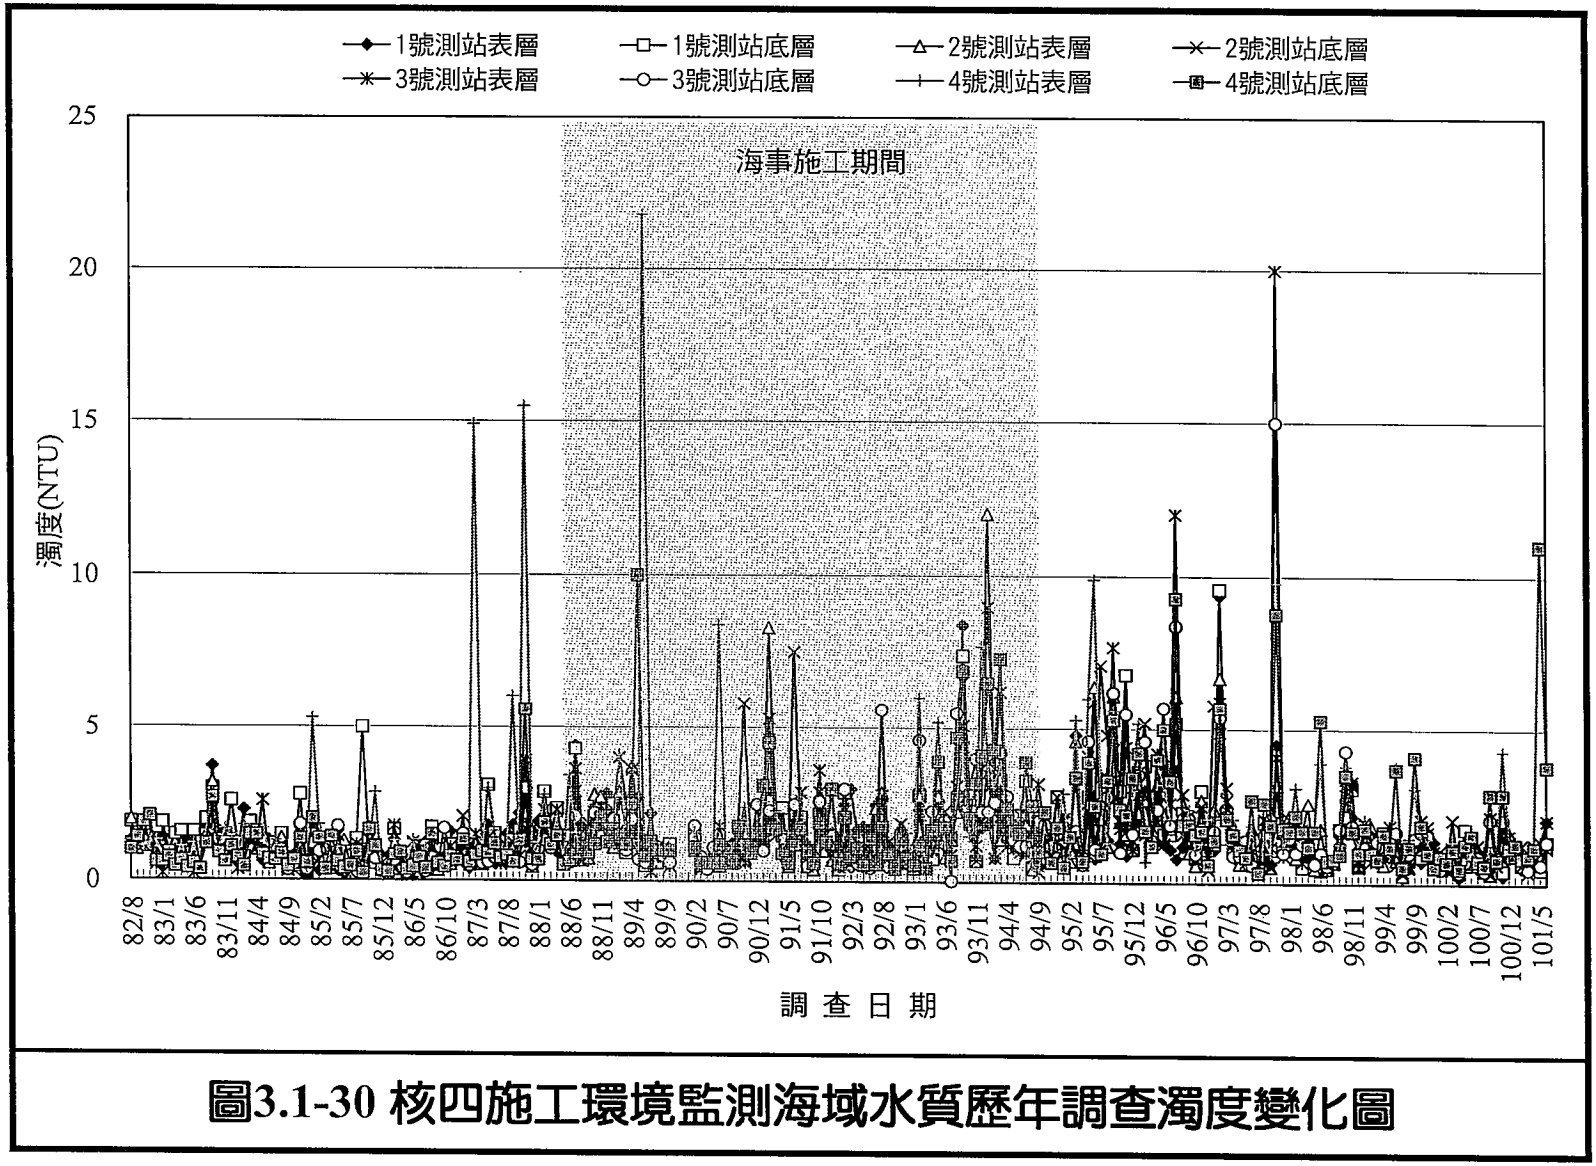


圖3.1-30 核四施工環境監測海域水質歷年調查濁度變化圖

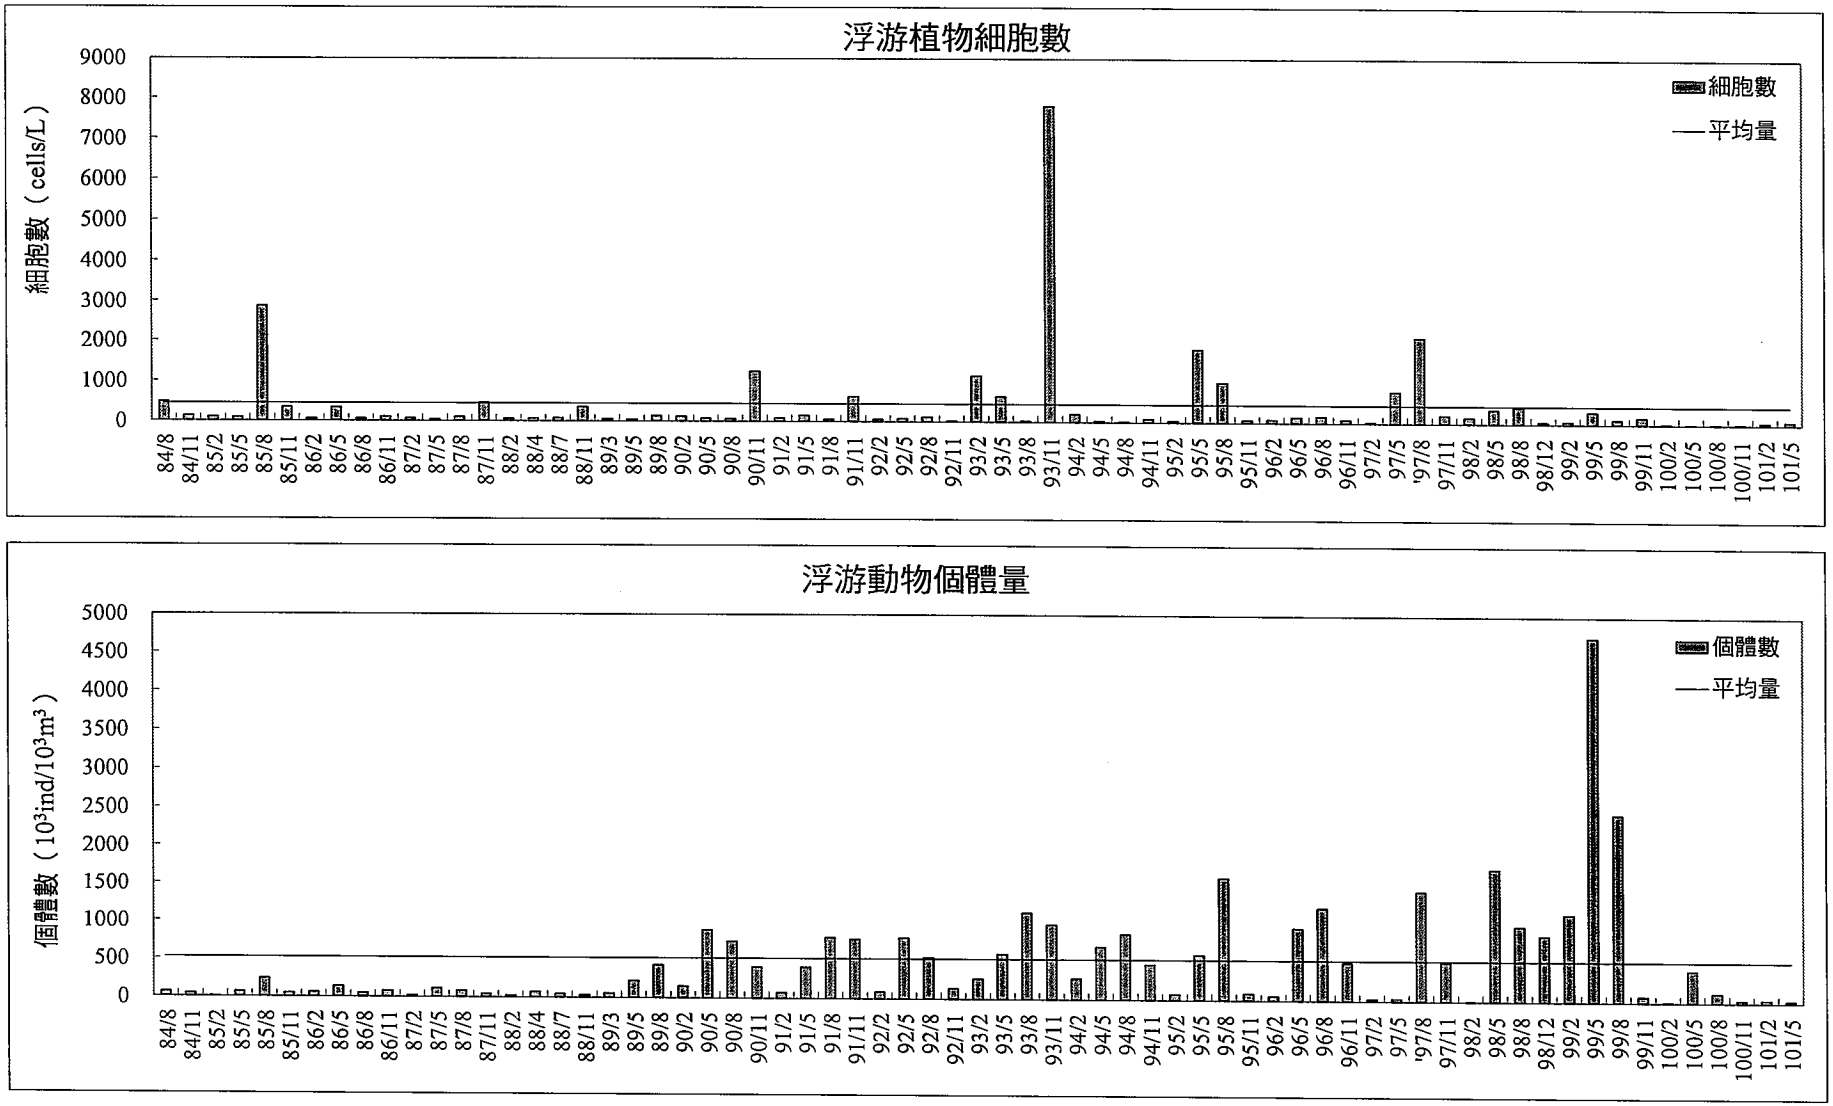


圖3.1-31 核四施工期間環境監測調查海域水體內浮游生物含量長期變動趨勢

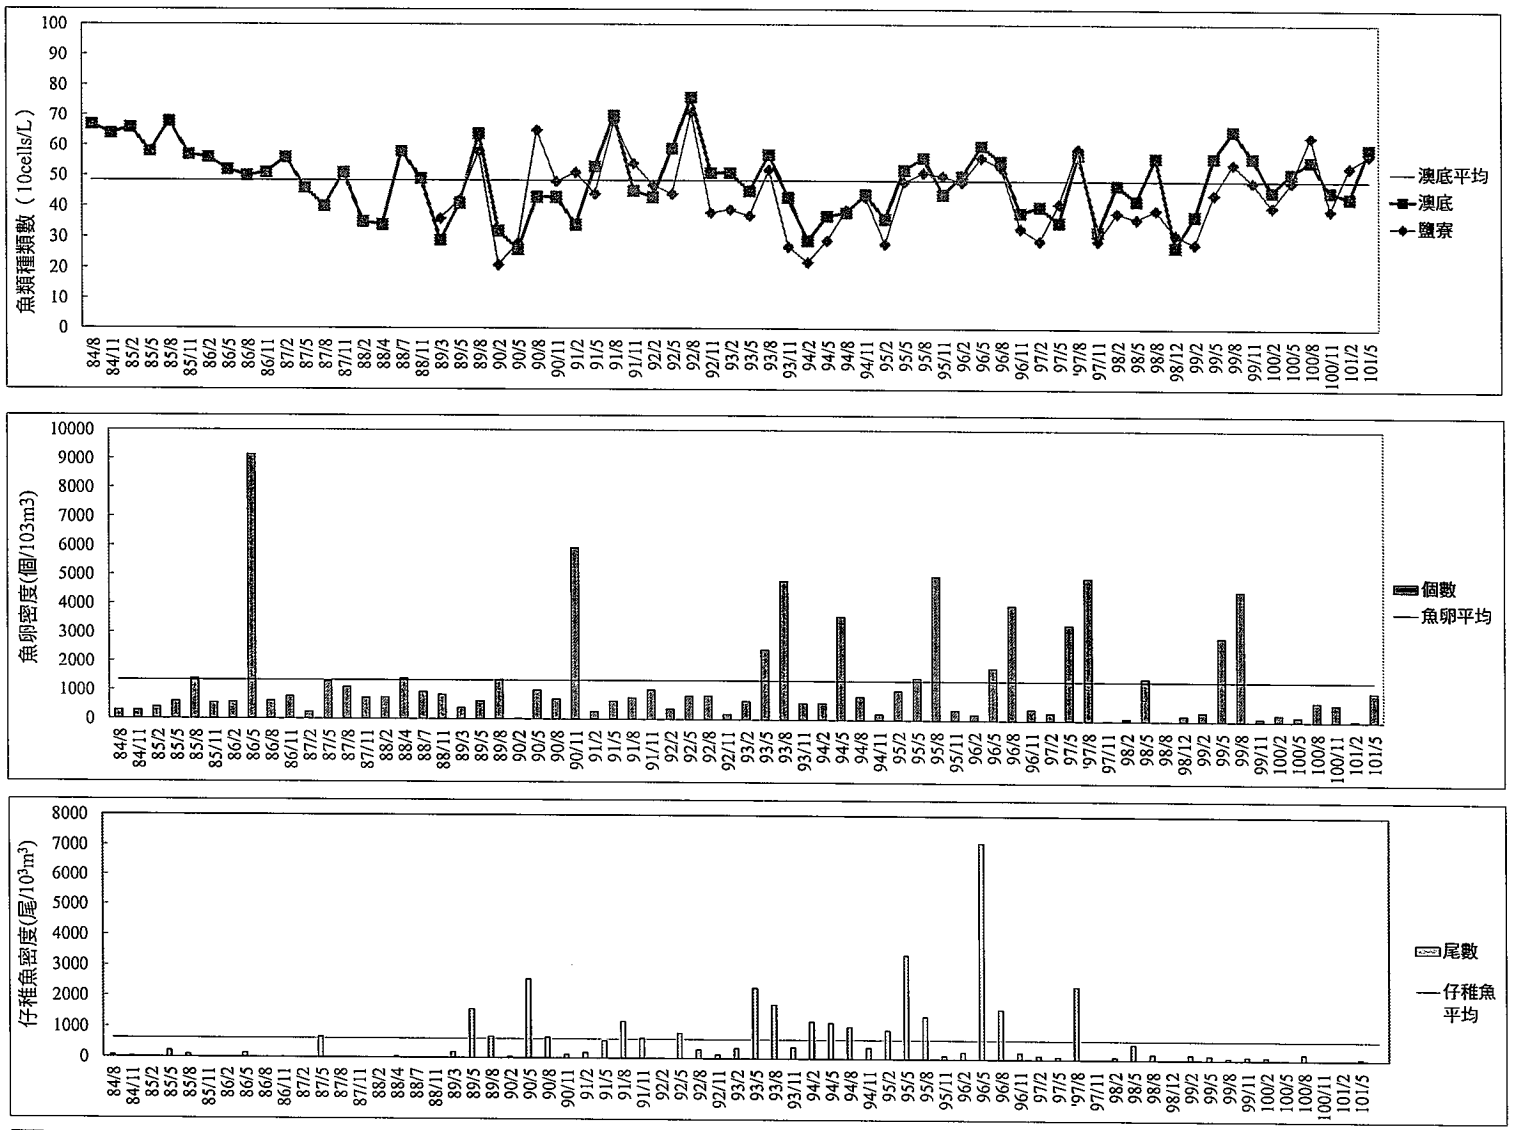


圖3.1-32 核四施工期間環境監測調查海域水體內魚類，魚卵密度及仔稚魚密度長期變動趨勢

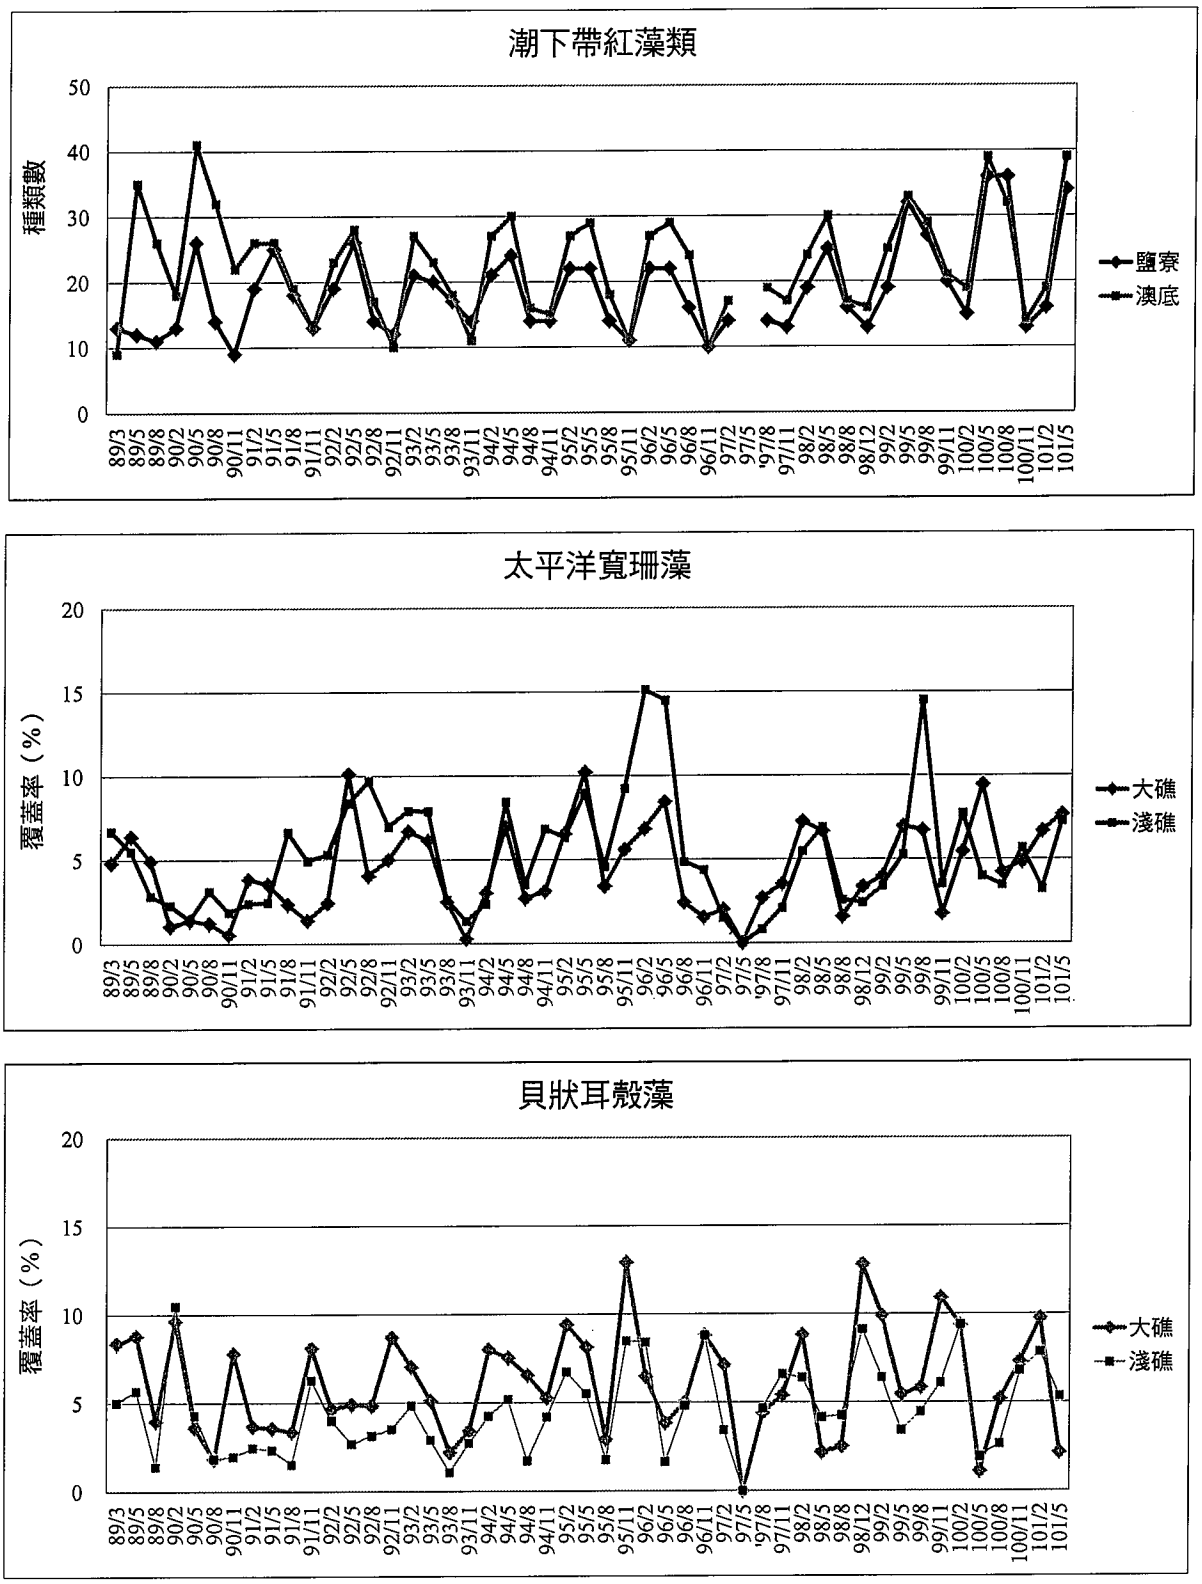


圖3.1-33 核四施工期間環境監測調查海域大型藻類指標物種長期變動趨勢

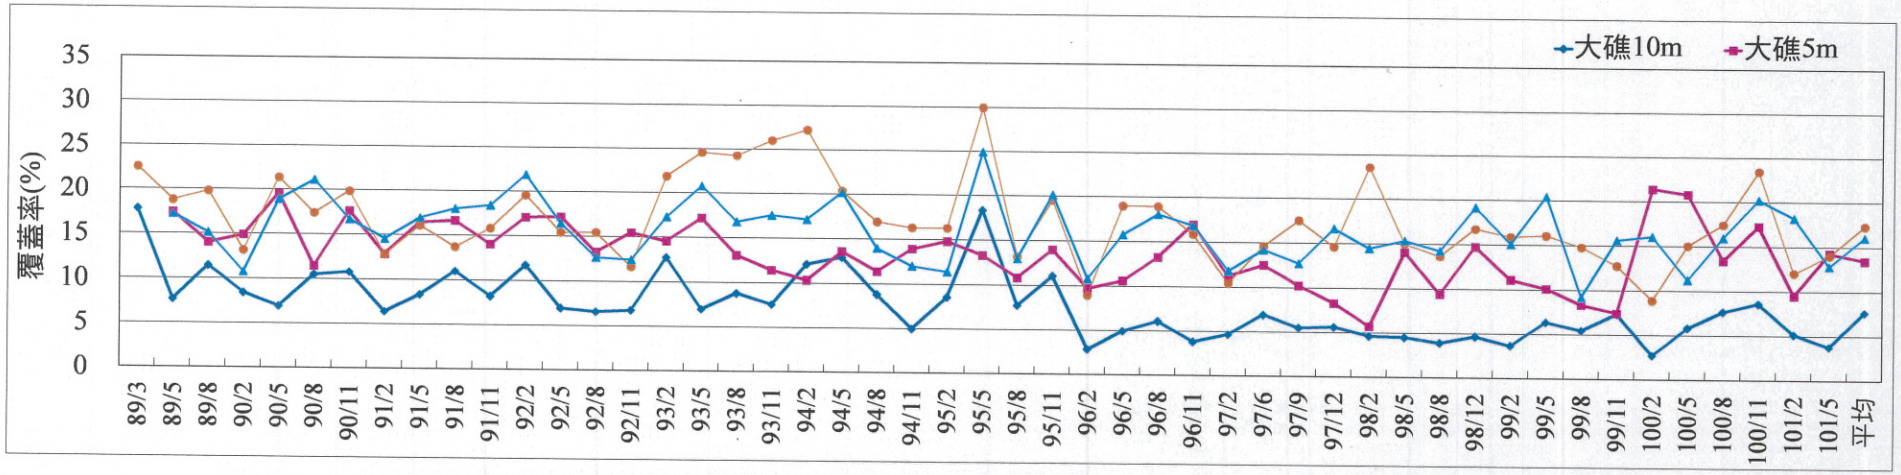


圖3.1-34 核四施工期間環境監測調查海域大礁及淺礁水深10m及5m歷年珊瑚平均覆蓋率

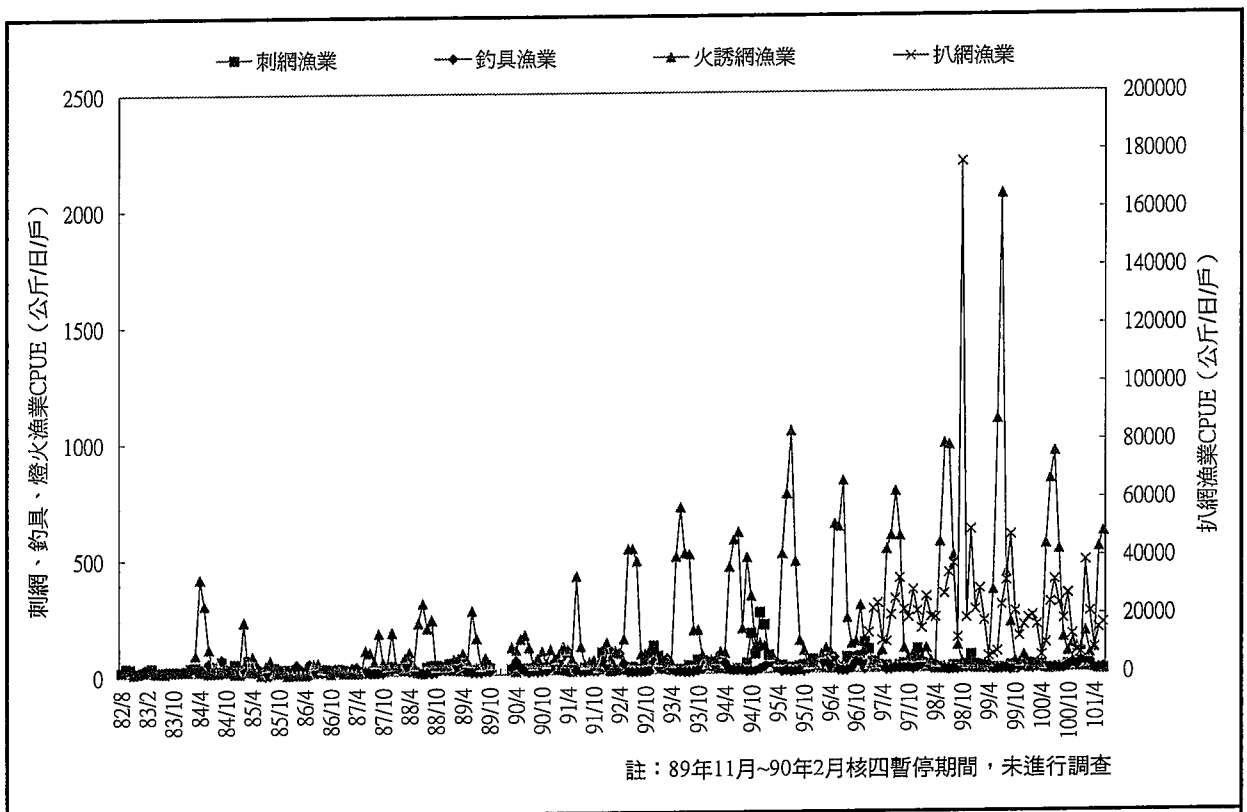


圖3.1-35 貢寮地區各類漁業標本戶之CPUE(公斤/日/戶)一覽表

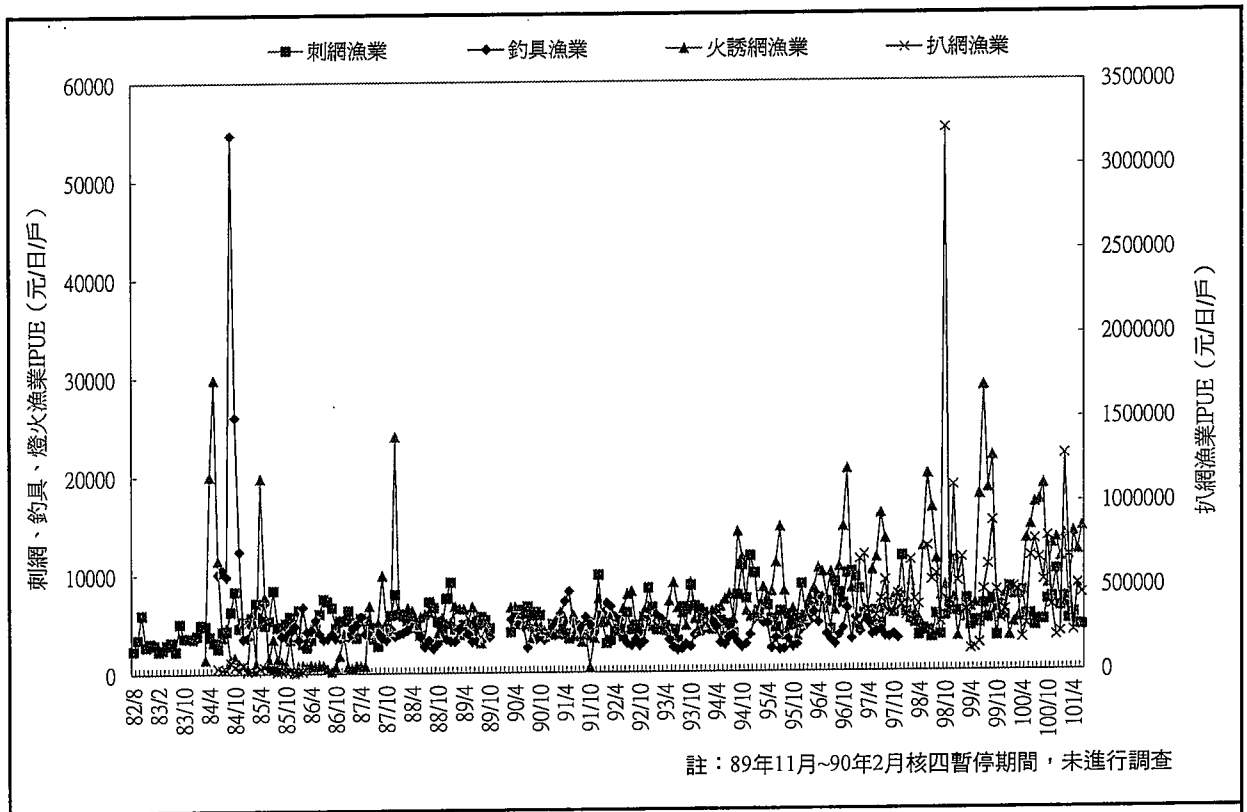


圖3.1-36 貢寮地區各類漁業標本戶之IPUE(元/日/戶)一覽表

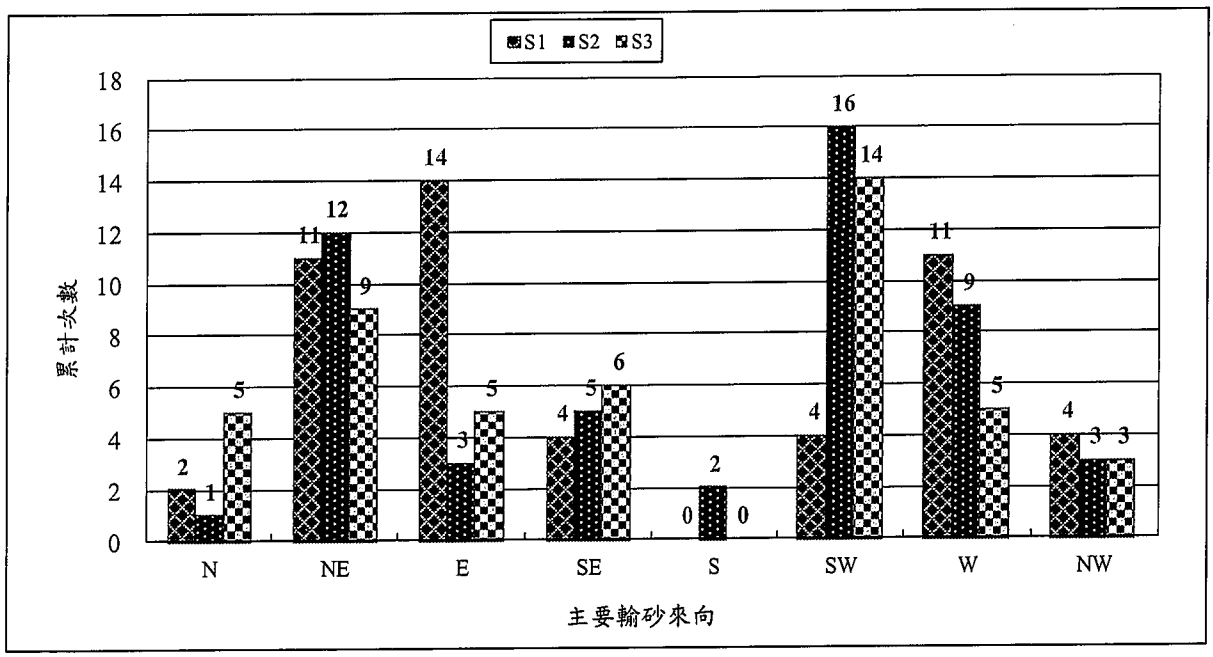


圖 3.1-37 各測站主要輸砂來向歷年累計次數比較圖

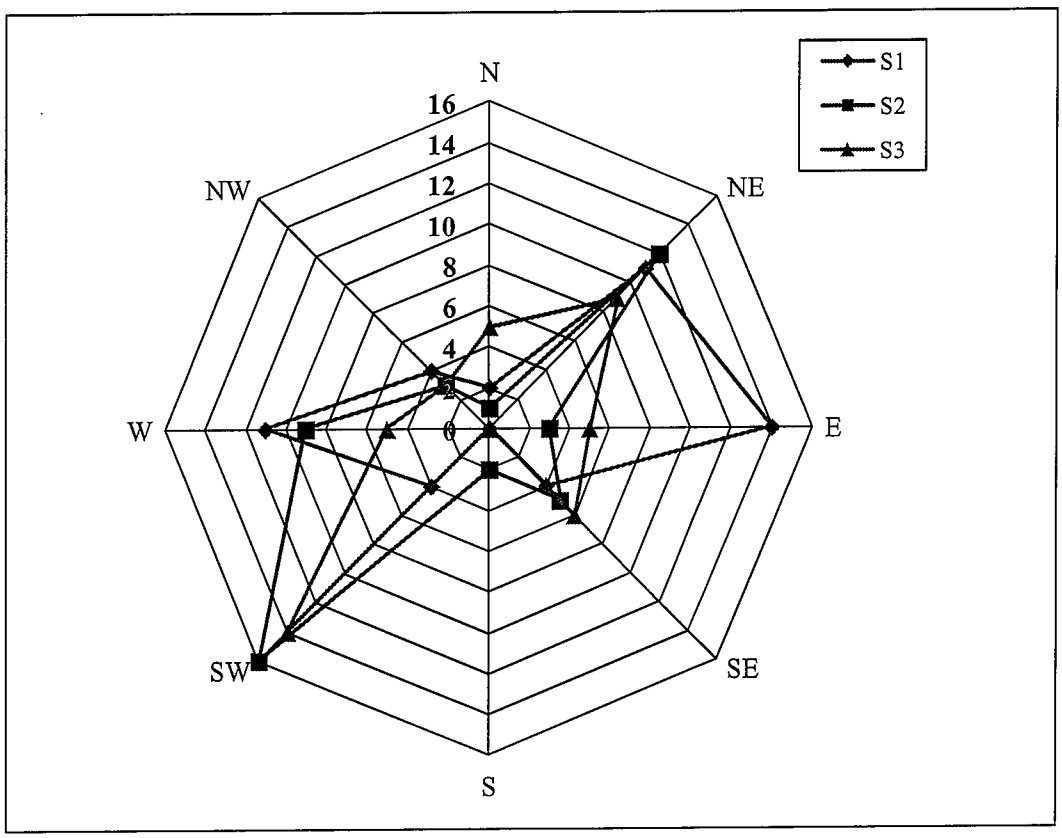


圖 3.1-38 各測站主要輸砂來向歷年累計次數雷達圖

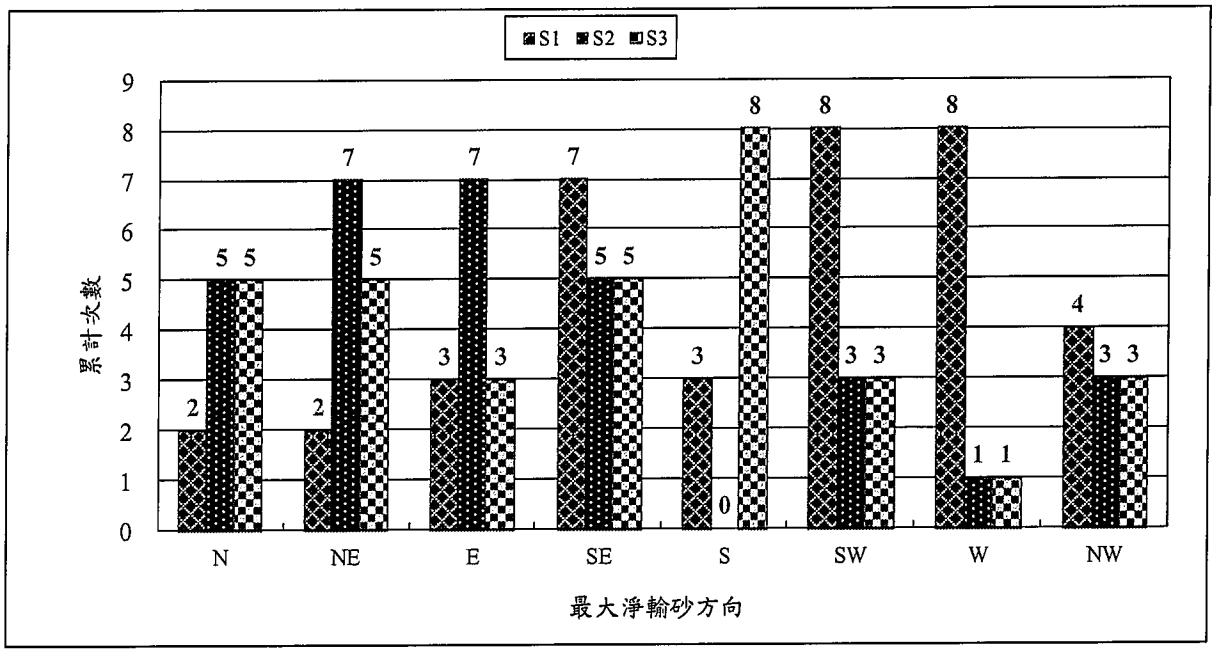


圖 3.1-39 各測站最大淨輸砂方向歷年累計次數比較圖

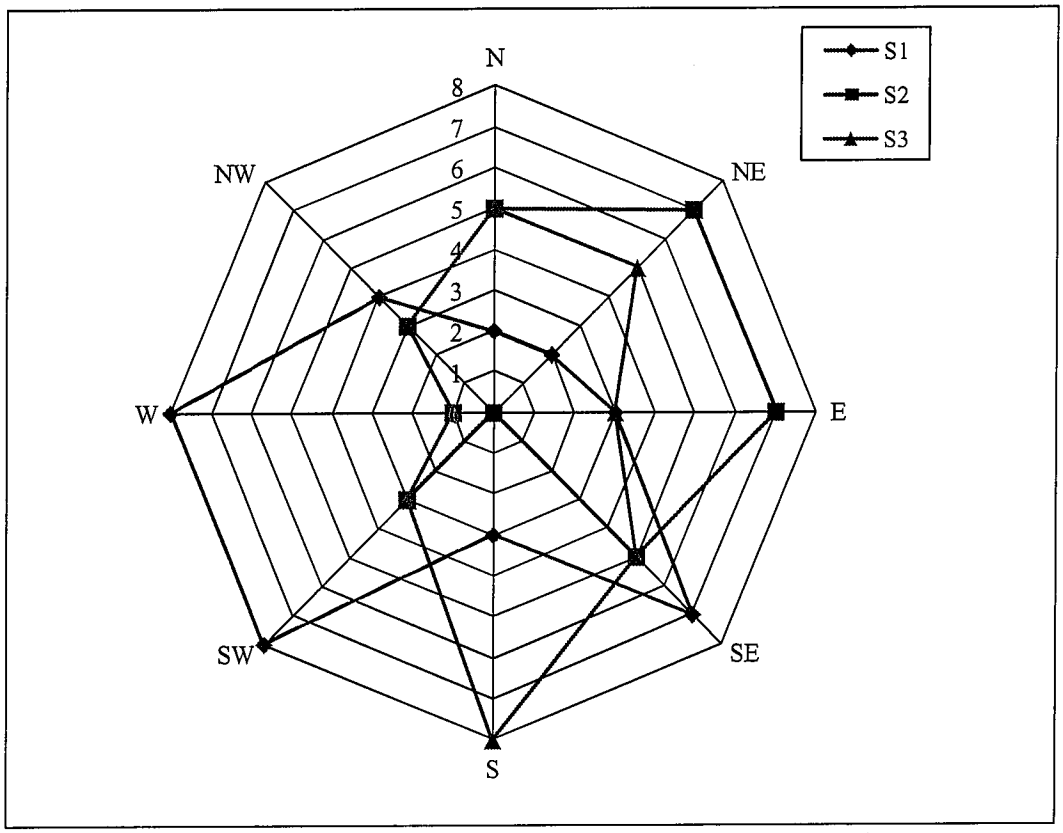


圖 3.1-40 各測站最大淨輸砂方向歷年累計次數雷達圖

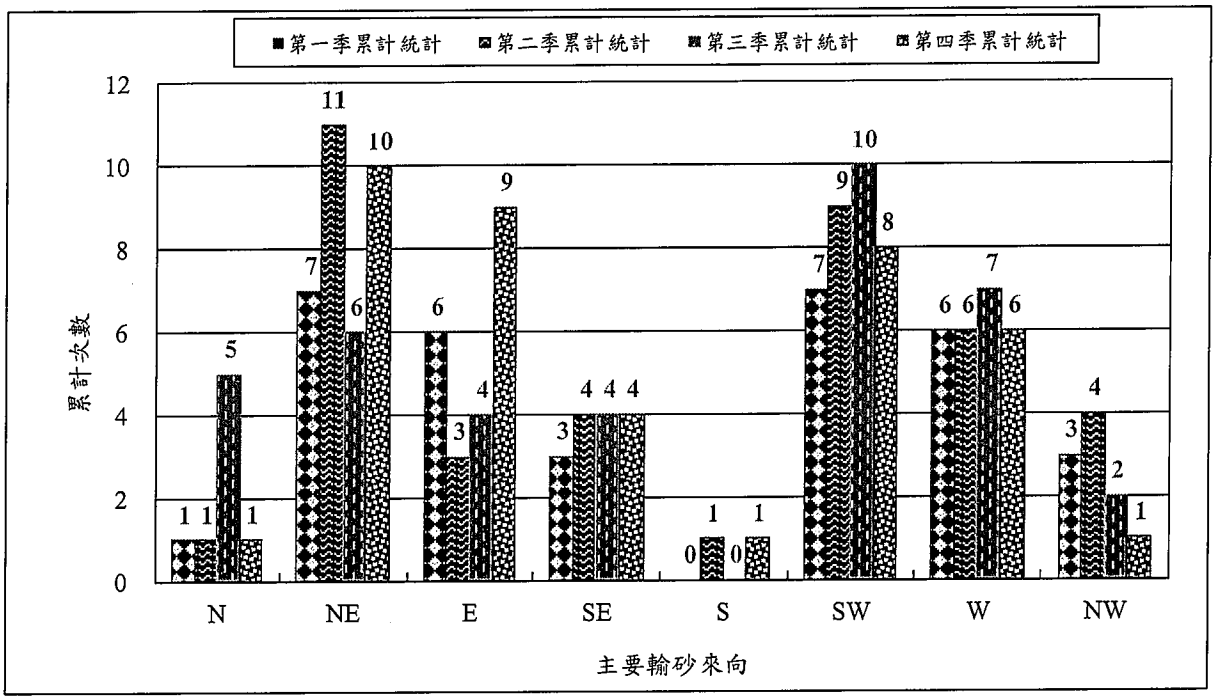


圖 3.1-41 歷年主要輸砂來向分季累計次數比較圖

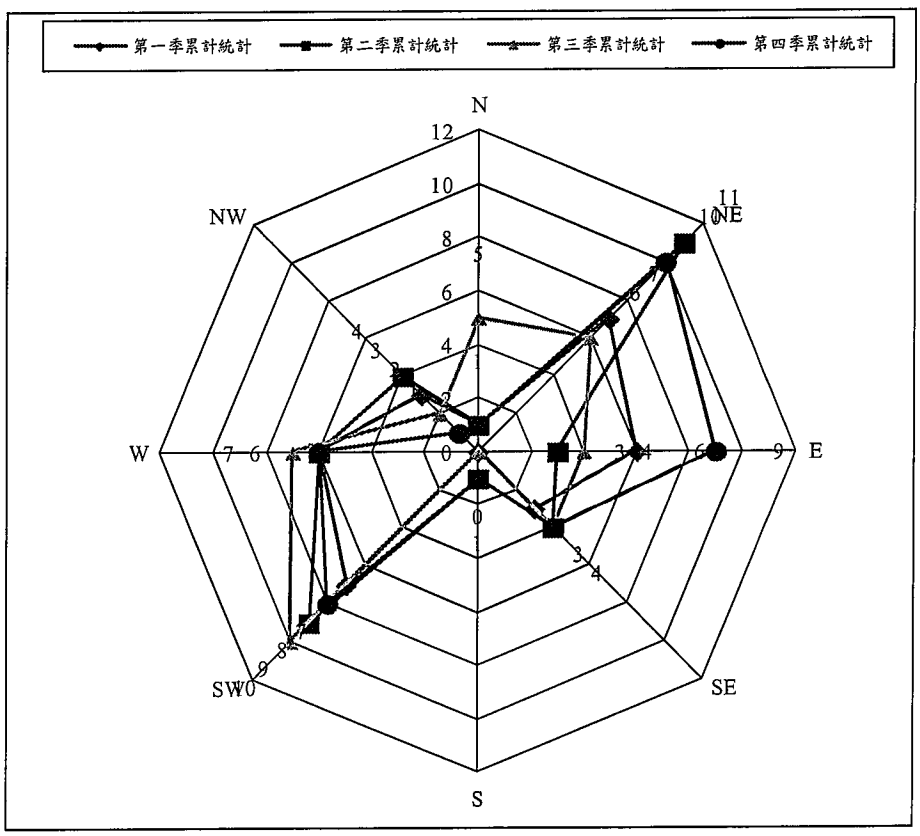


圖 3.1-42 歷年主要輸砂來向分季累計次數雷達圖

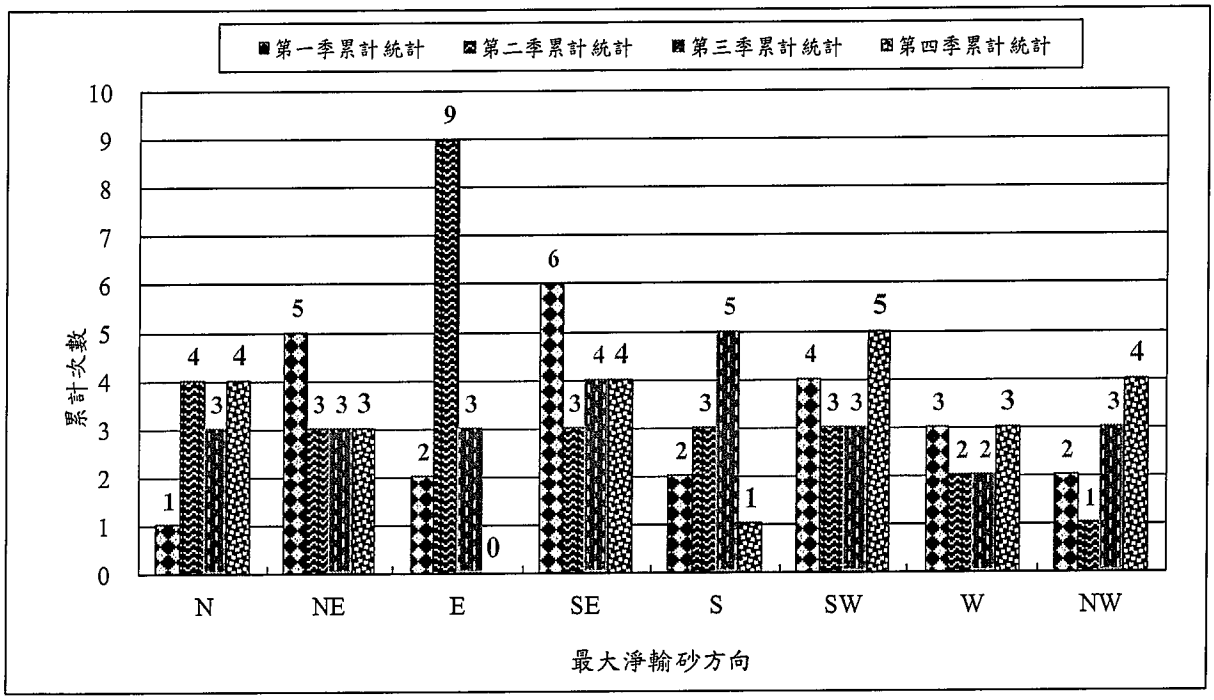


圖 3.1-43 歷年最大淨輸砂方向分季累計次數比較圖

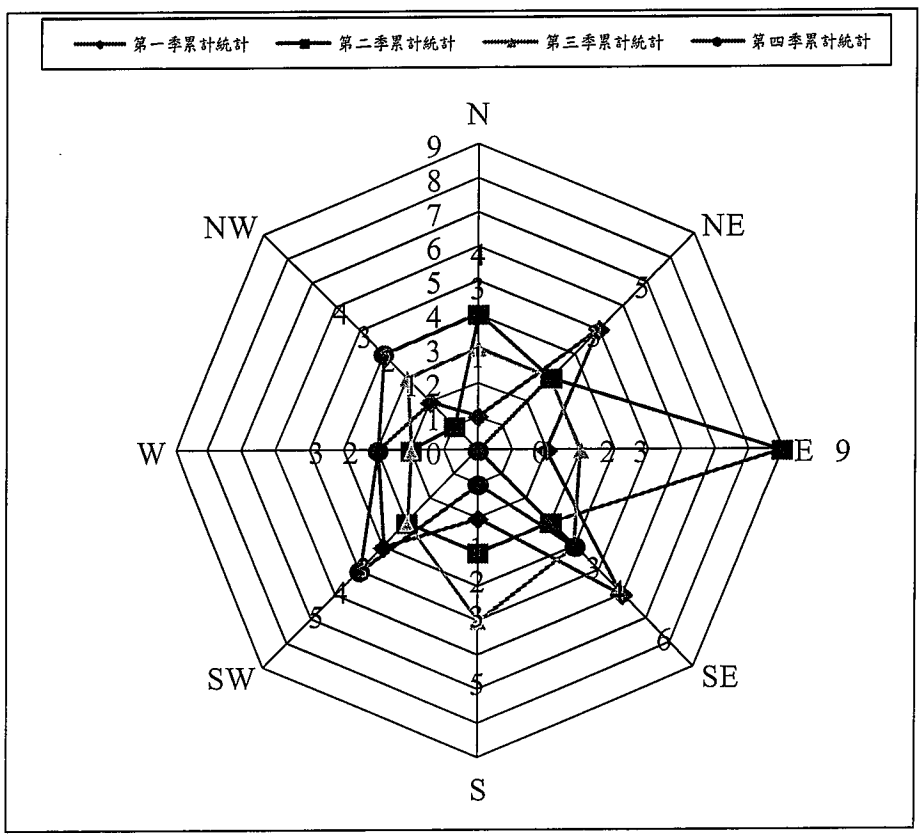


圖 3.1-44 歷年最大淨輸砂方向分季累計次數雷達圖

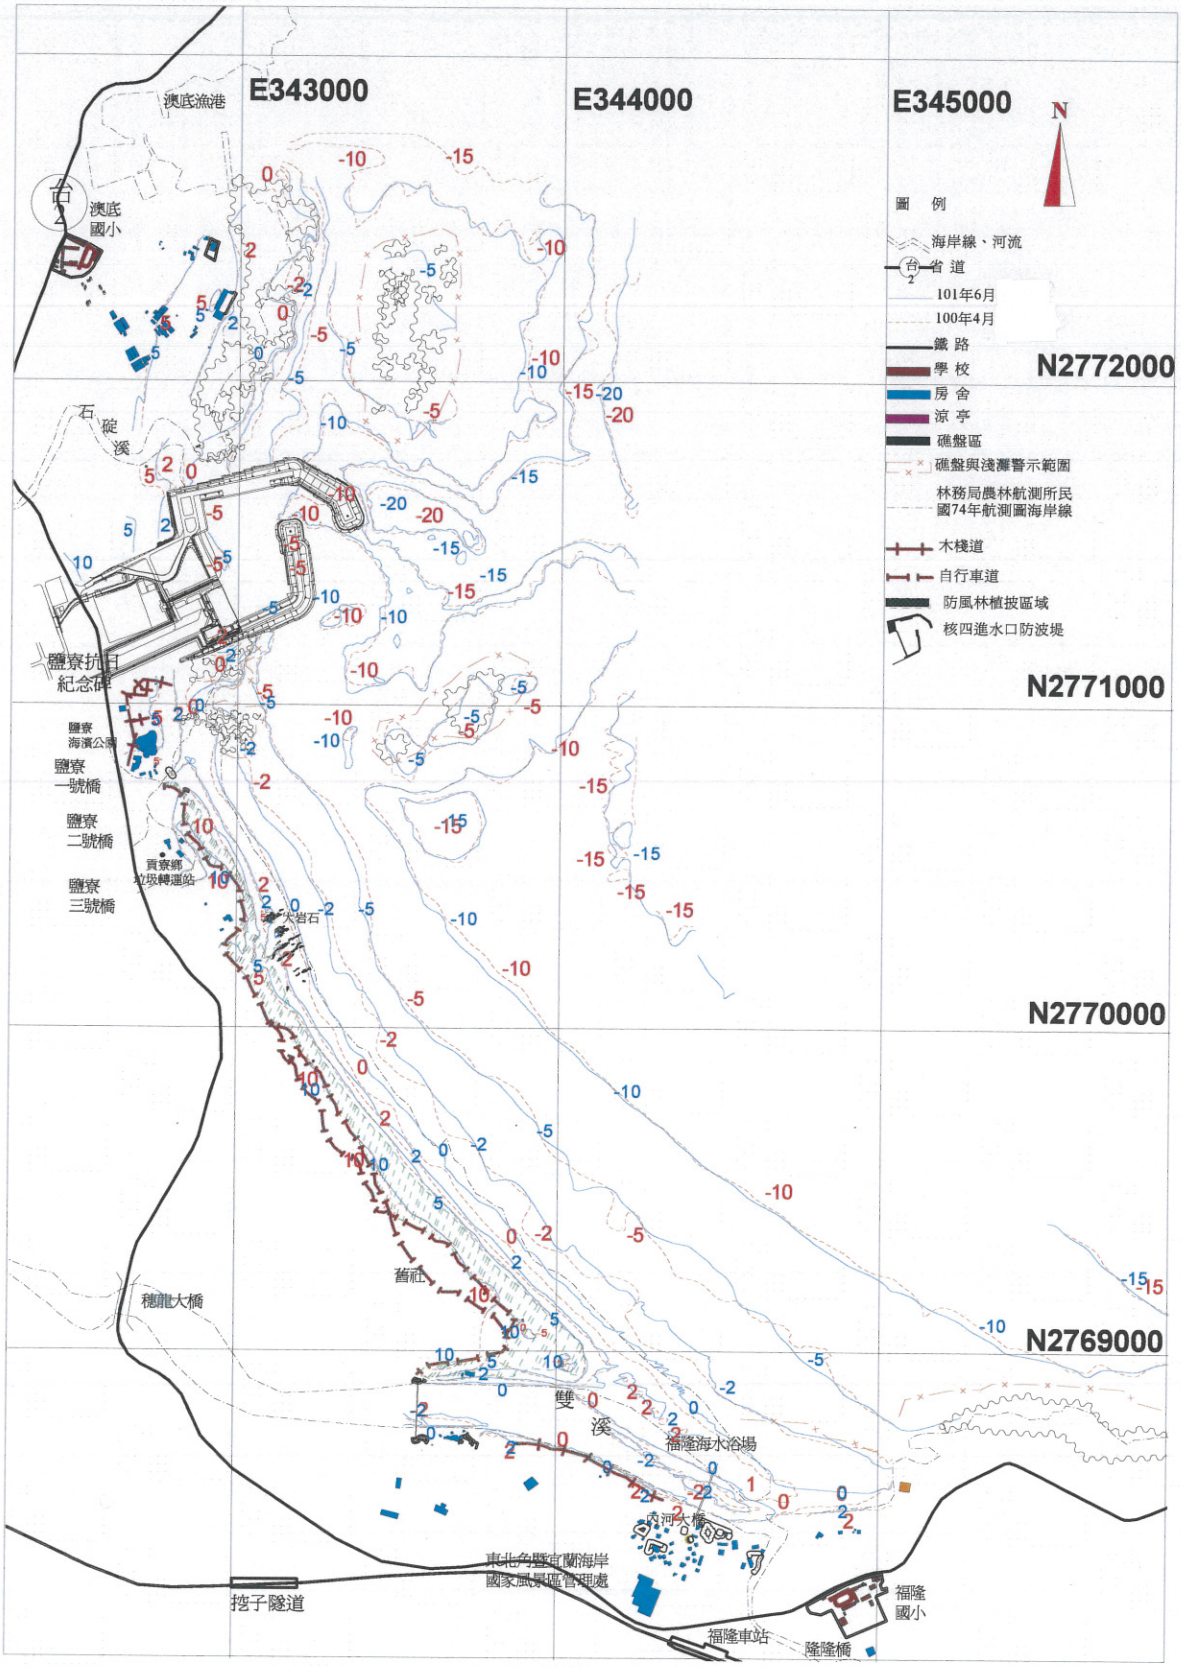


圖 3.1-45 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 100 年 4 月監測結果比較

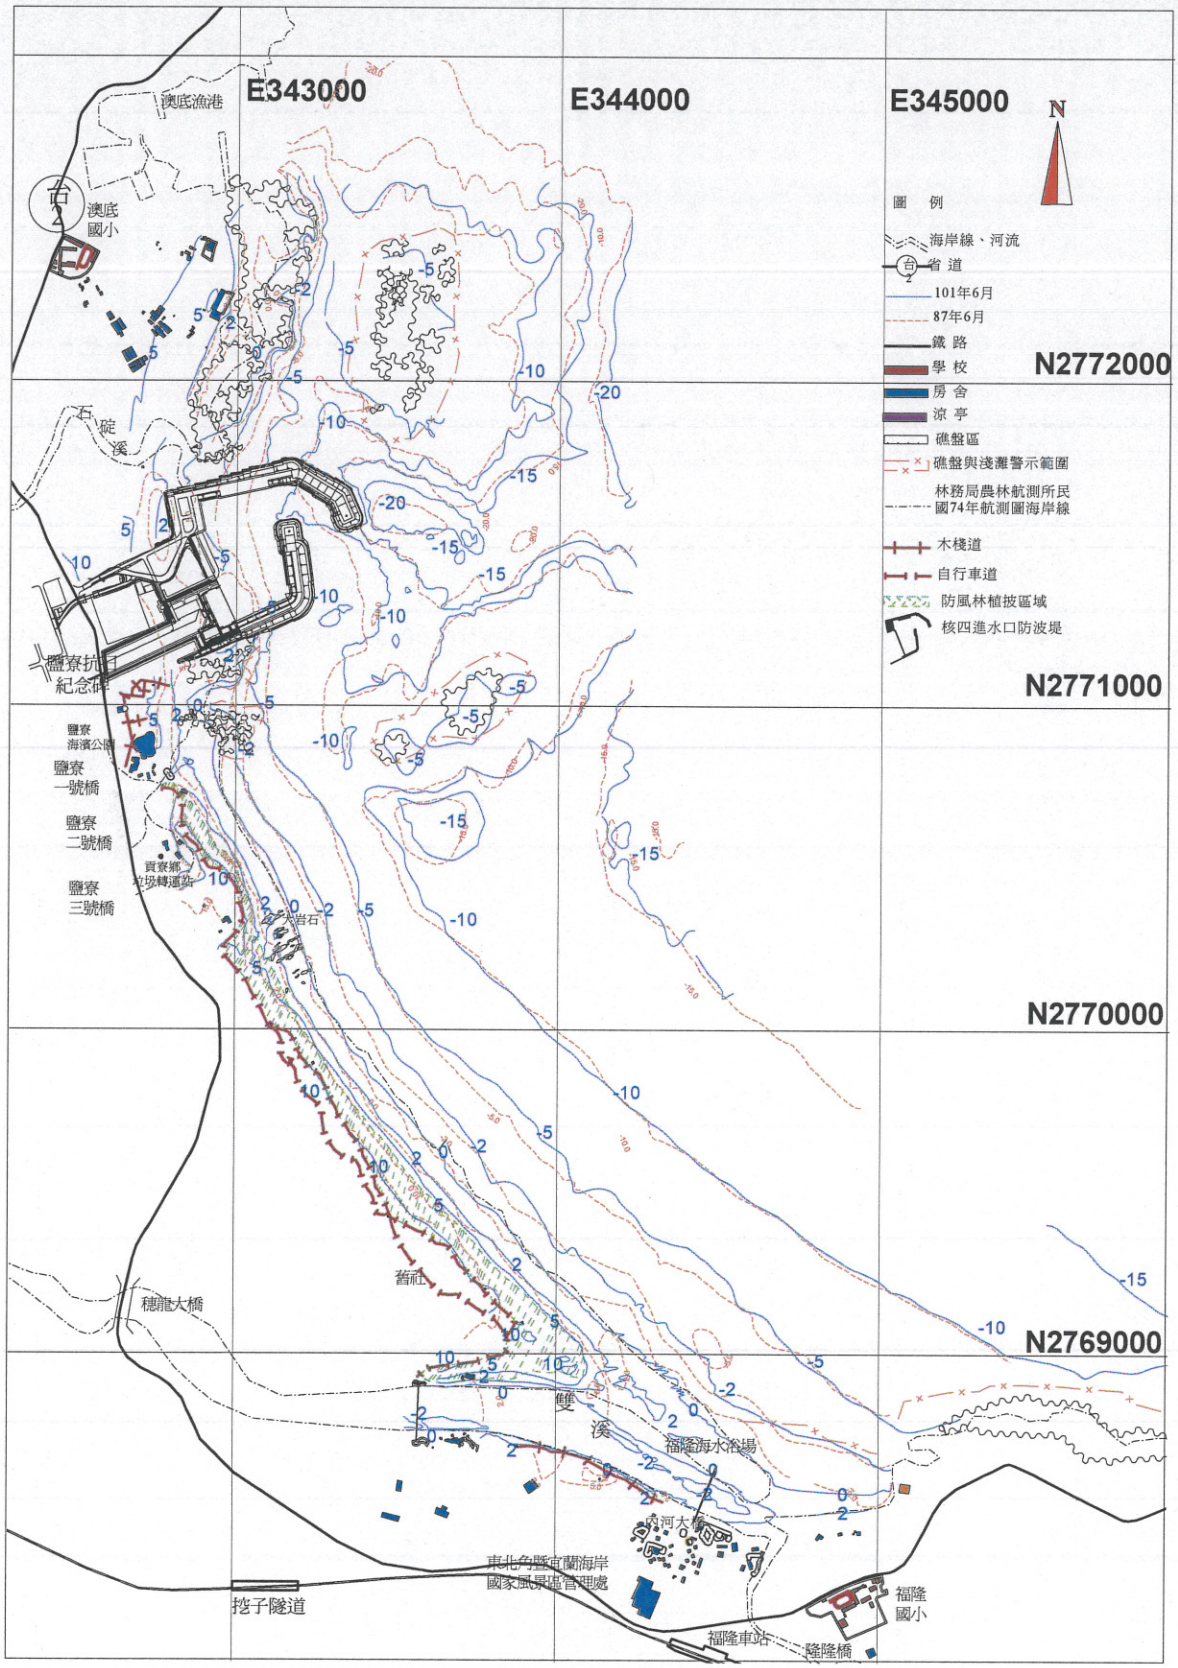


圖 3.1-46 核四施工環境監測海岸地形 101 年 6 月與 87 年 6 月監測結果比較

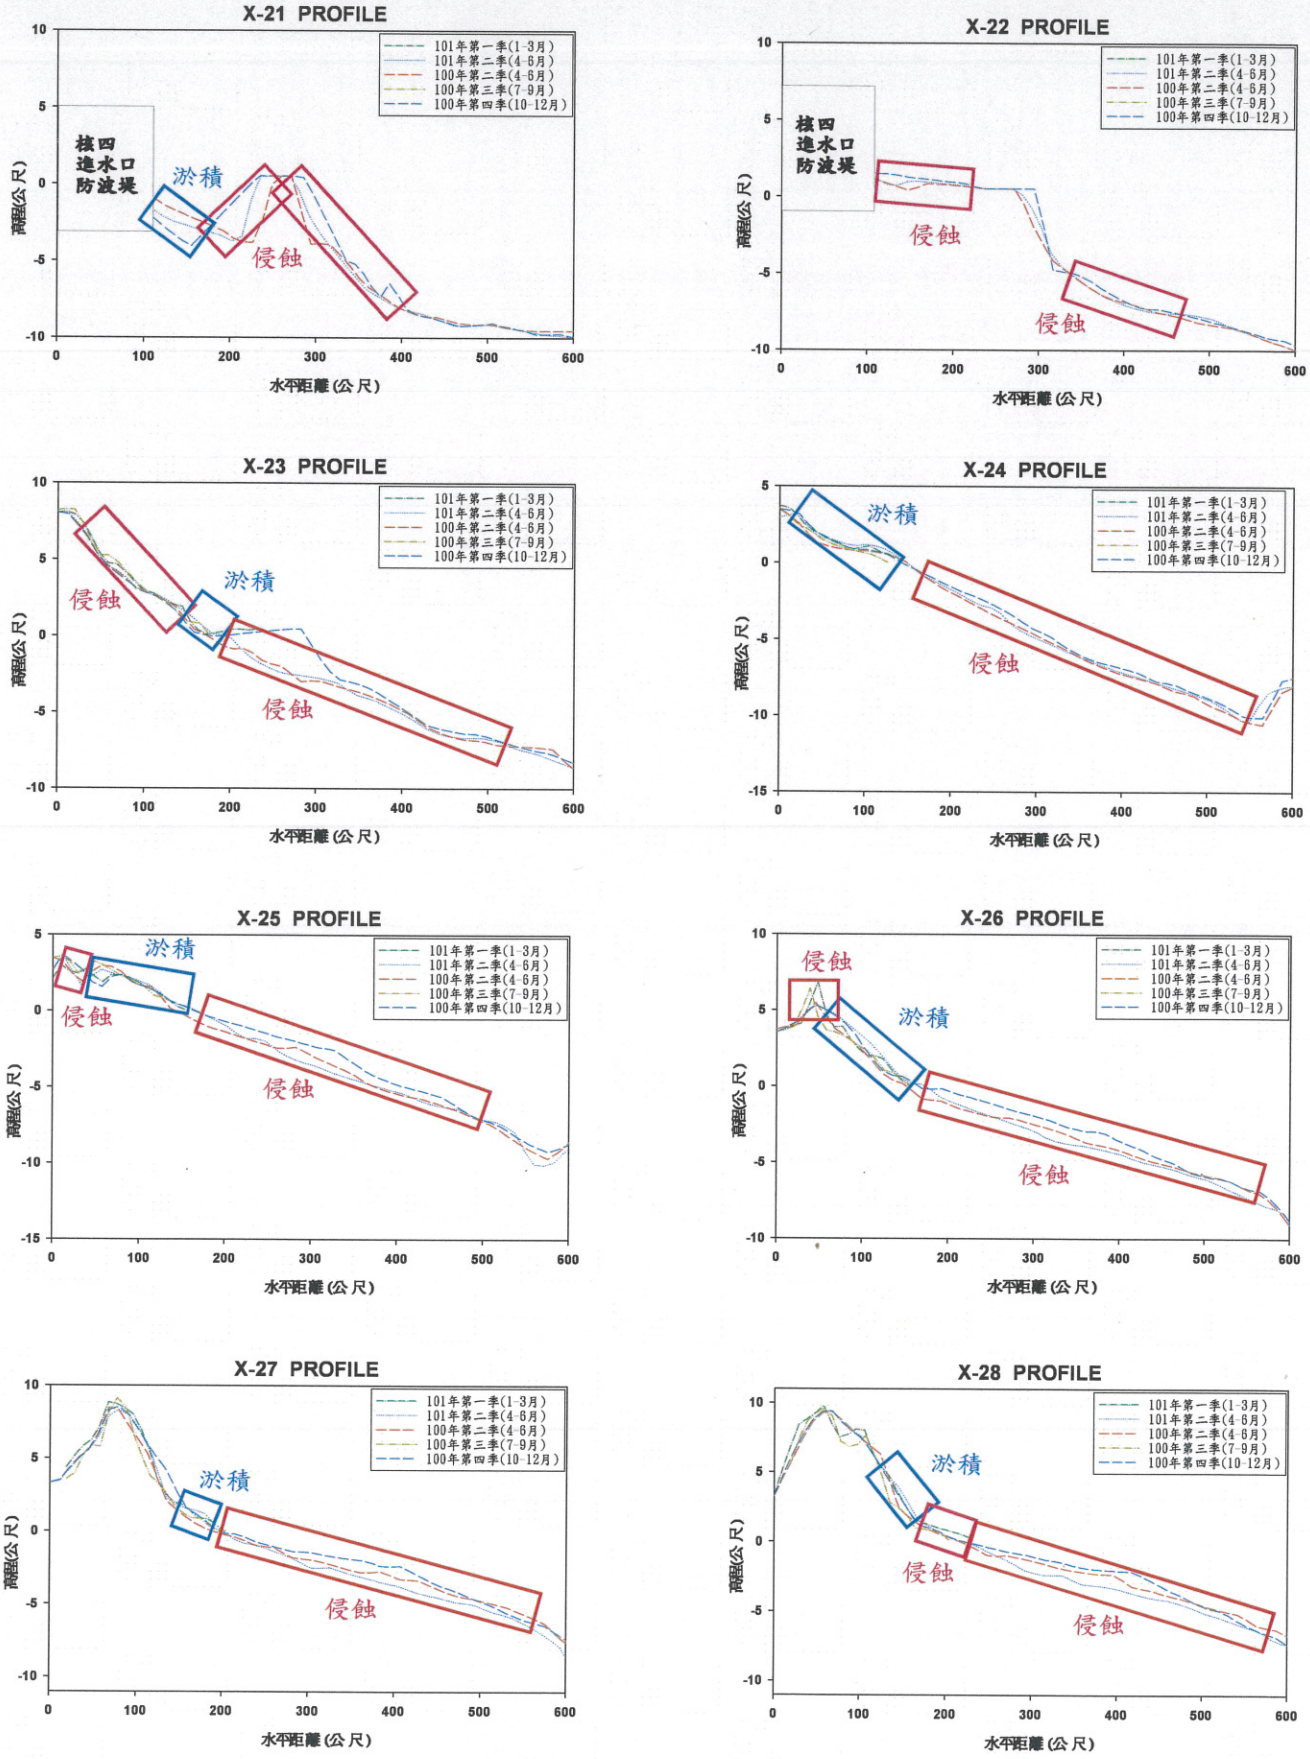


圖3.1-47 核四附近海岸地形監測各剖面水深變化比較

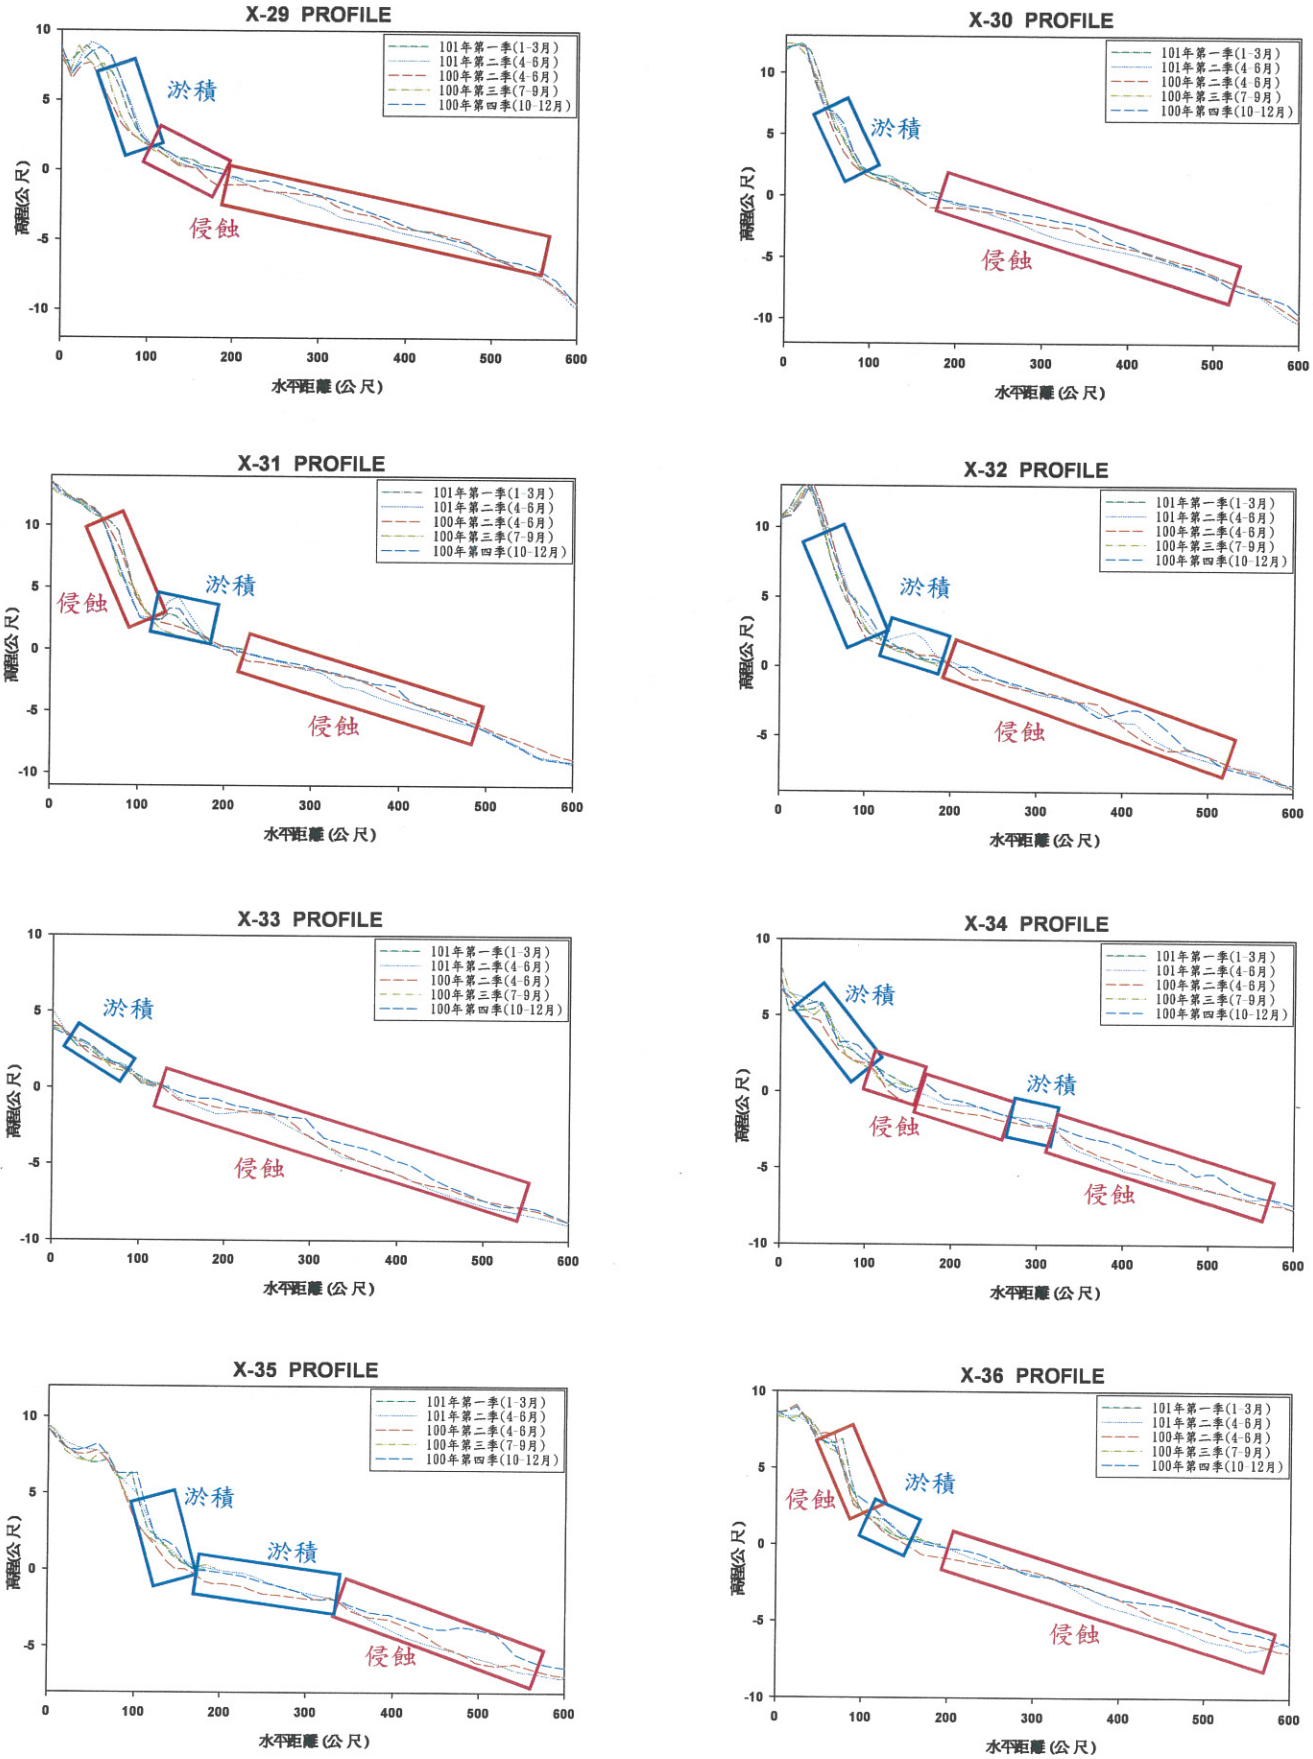


圖3.1-47 核四附近海岸地形監測各剖面水深變化比較（續1）

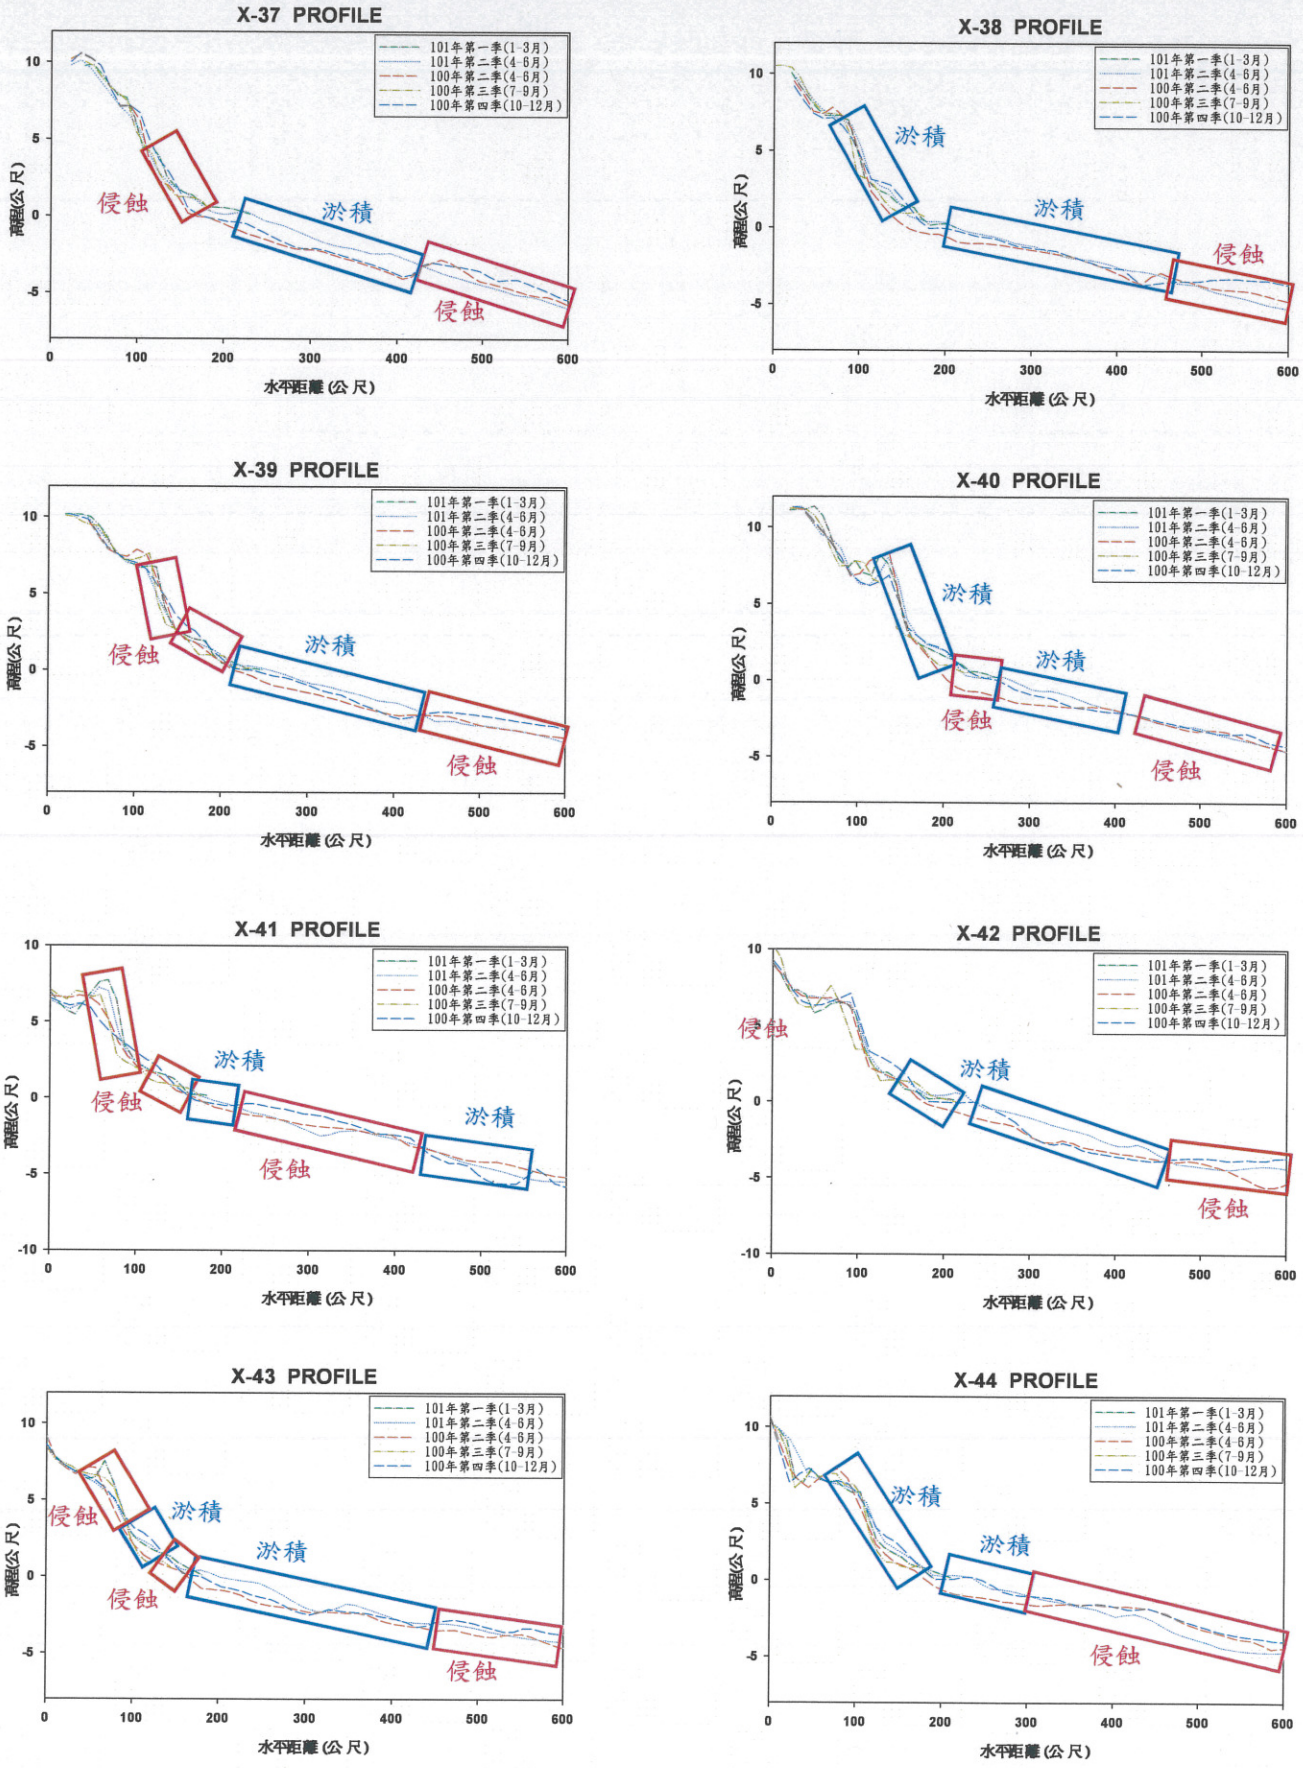
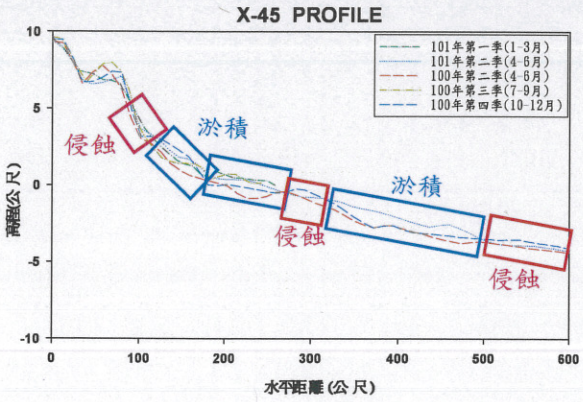
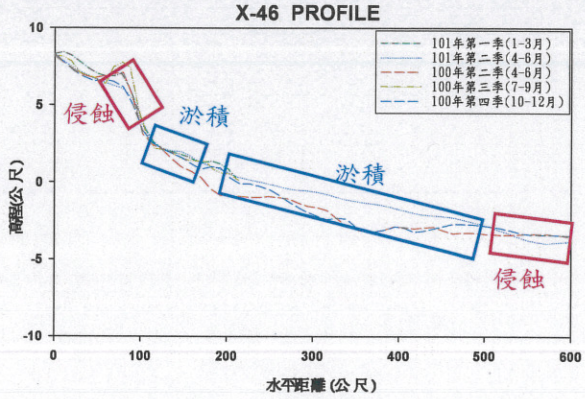
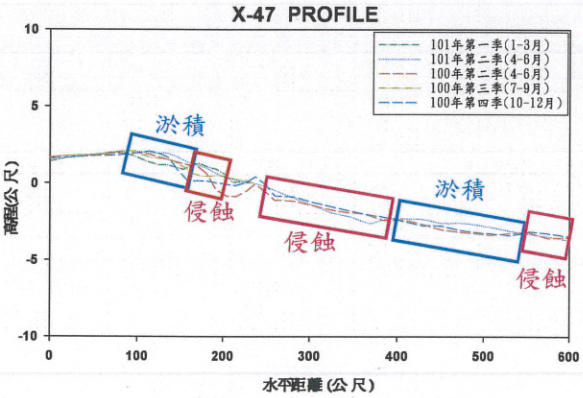
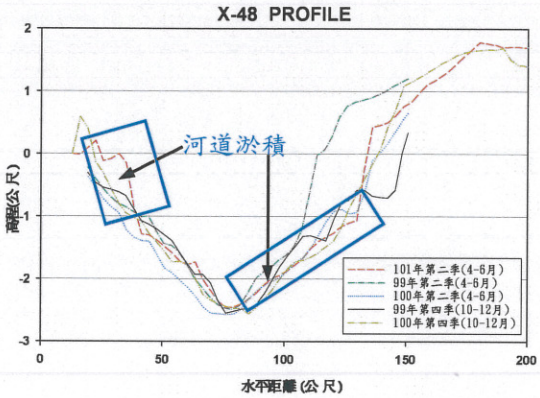



圖3.1-47 核四附近海岸地形監測各剖面水深變化比較（續2）











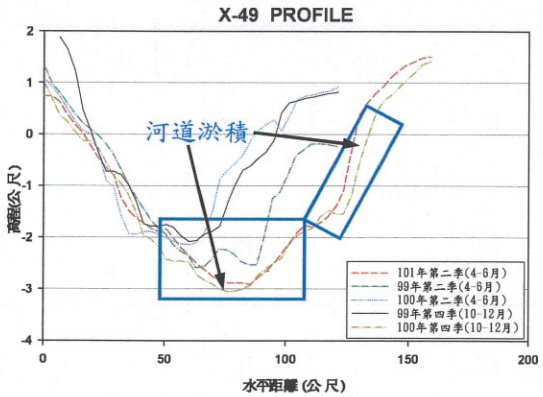

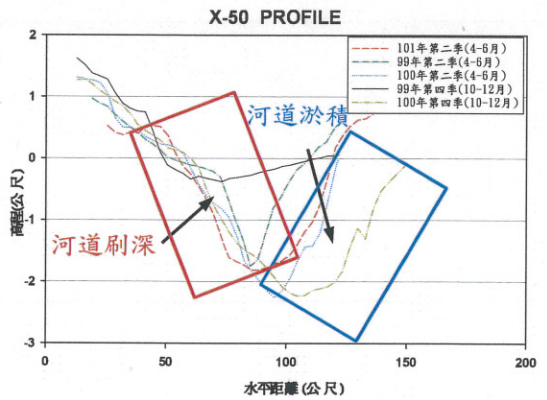

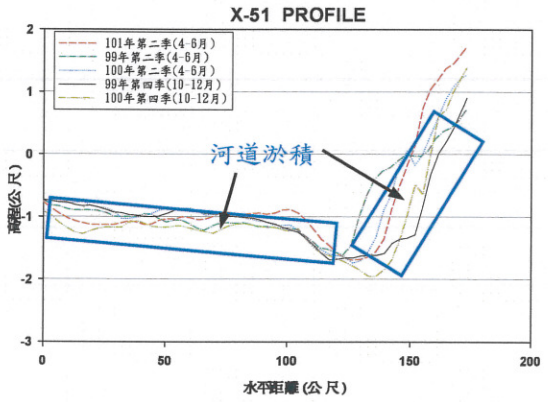

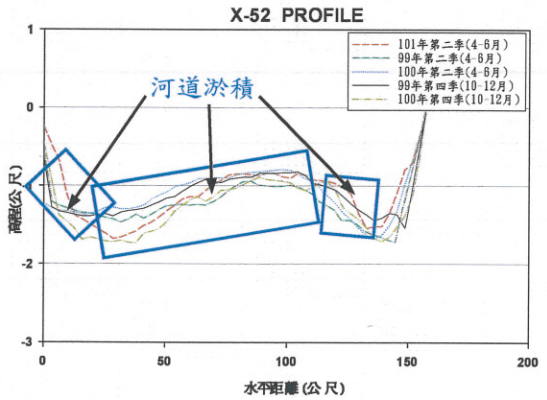


圖3.1-47 核四附近海岸地形監測各剖面水深變化比較（續3）

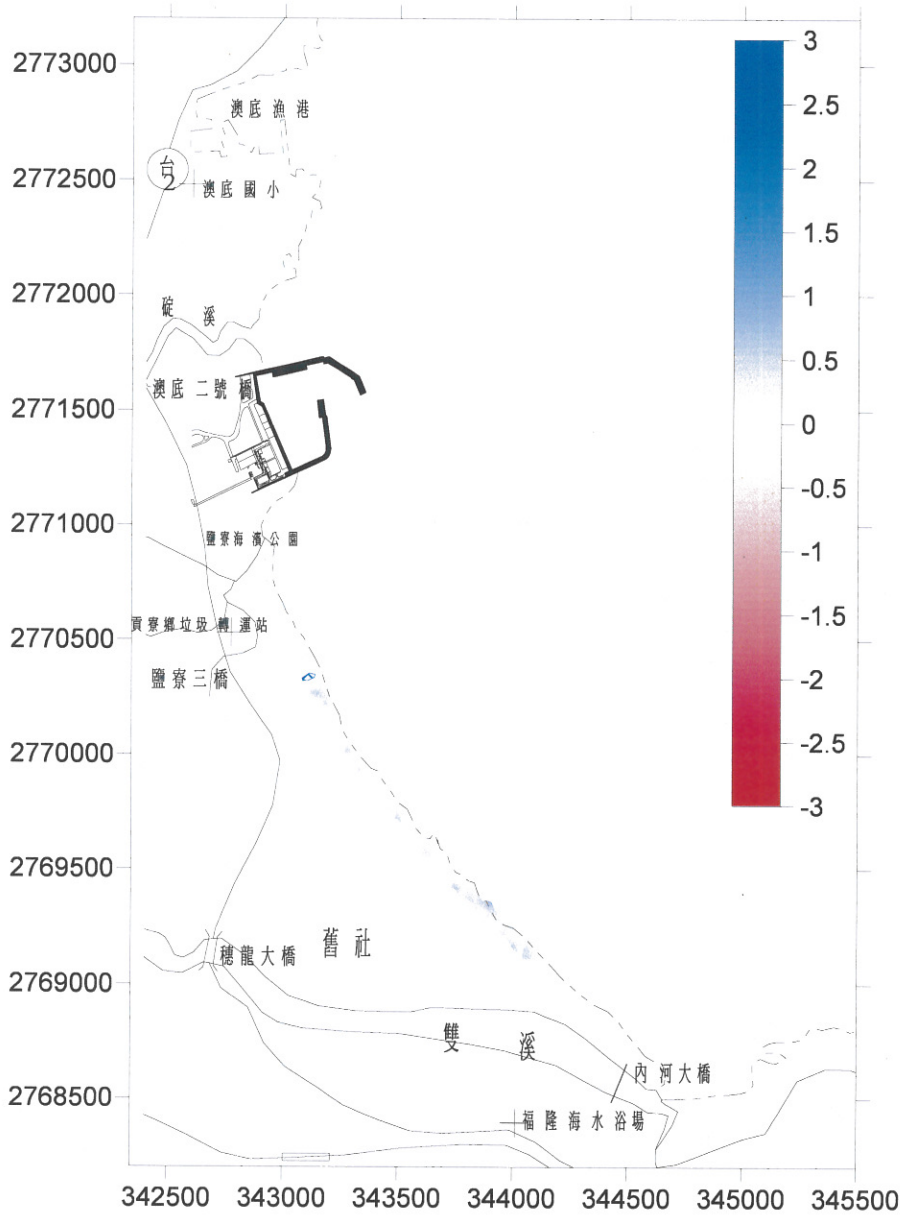


圖3.1-48 核四施工環境監測海岸地形101年6月與101年3月侵淤比較圖

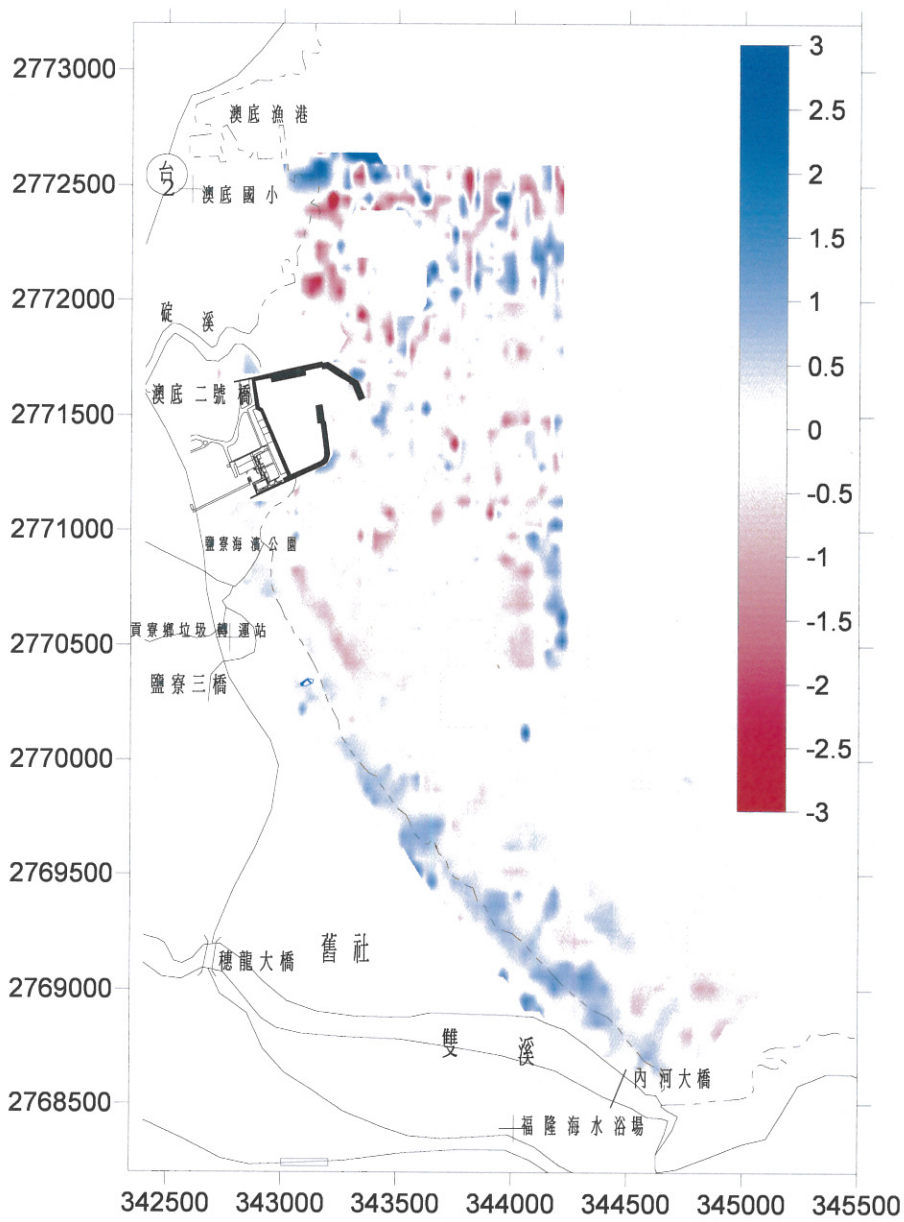


圖3.1-49 核四施工環境監測海岸地形101年6月與100年4月侵淤比較圖

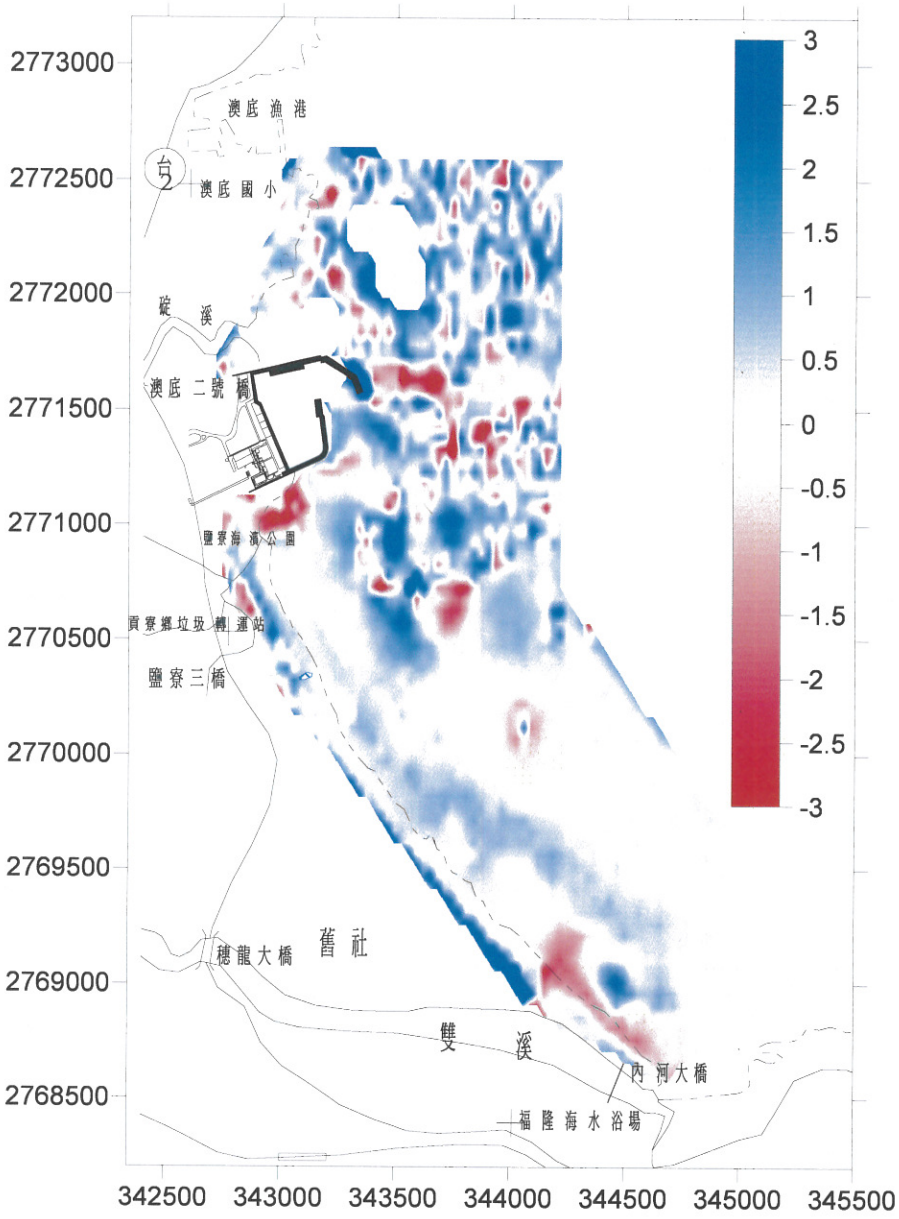


圖3.1-50 核四施工環境監測海岸地形 101年6月與87年6月侵淤比較圖



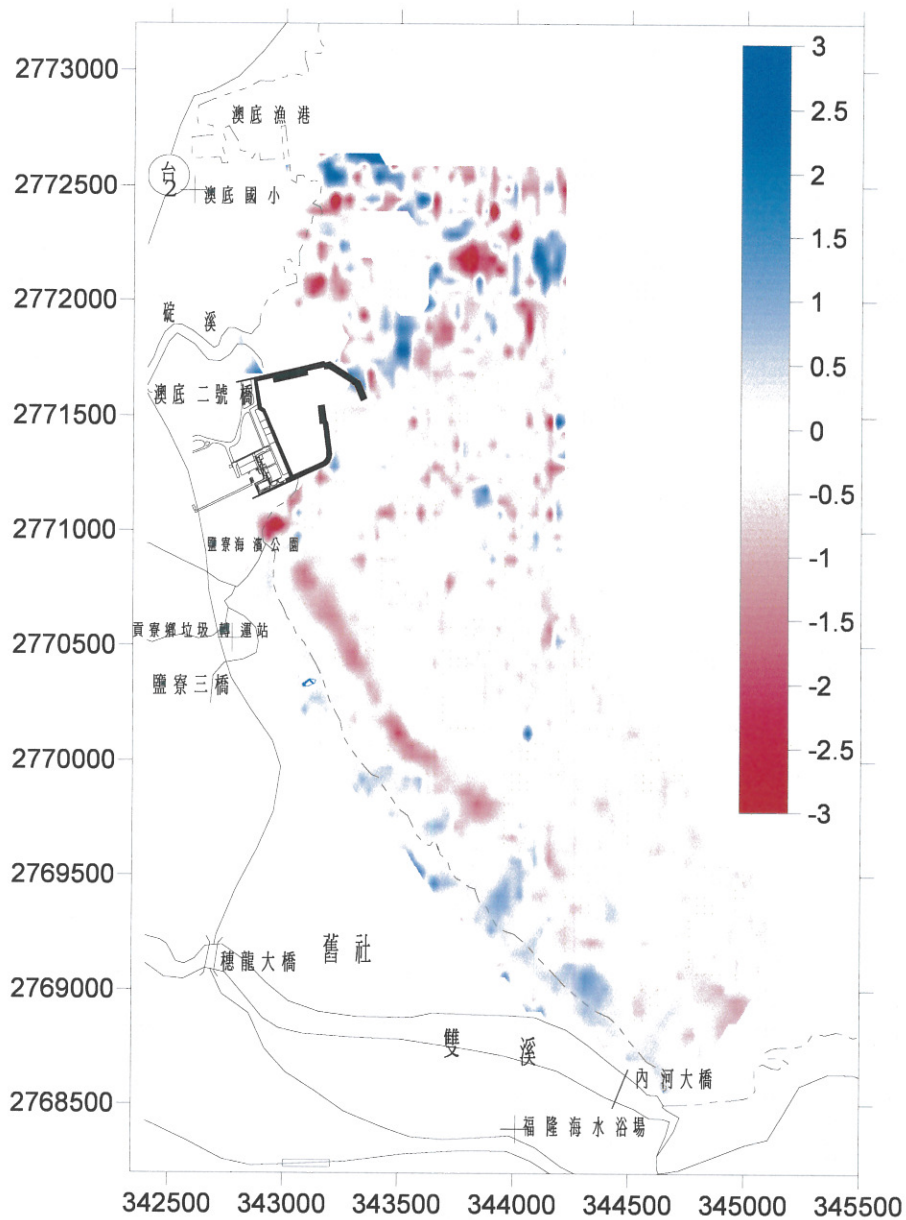



圖3.1-51 核四施工環境監測海岸地形 101年6月與100年11月侵淤比較圖

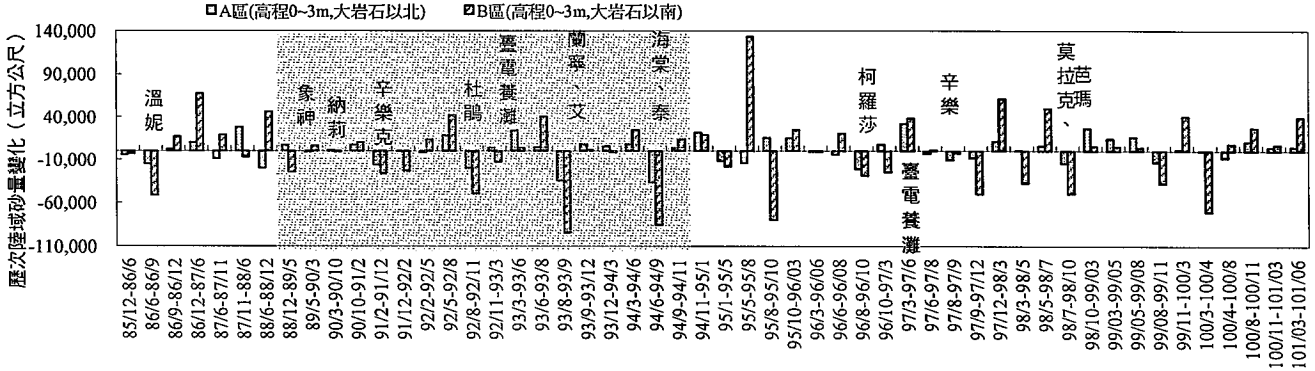


(a) 歷次陸域砂量變化

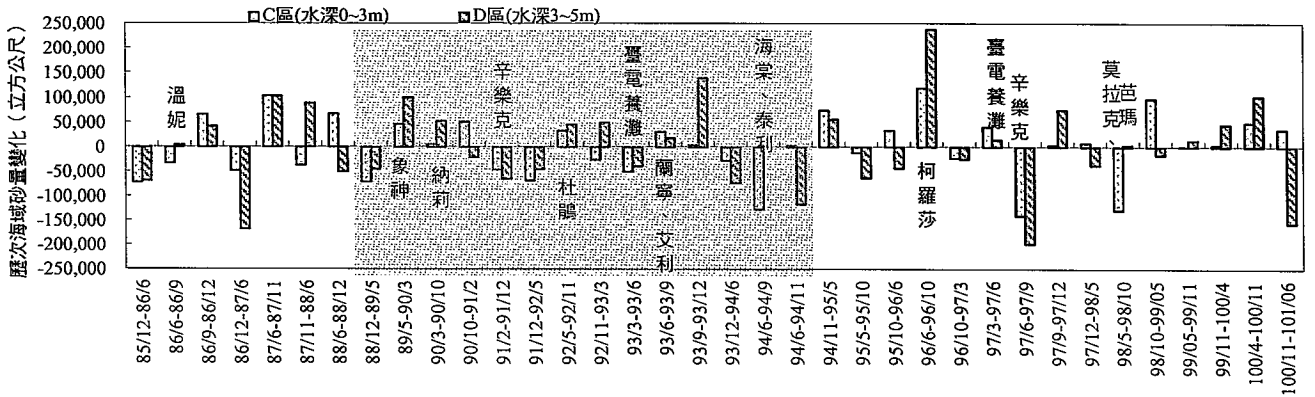

(b) 歷次海域砂量變化

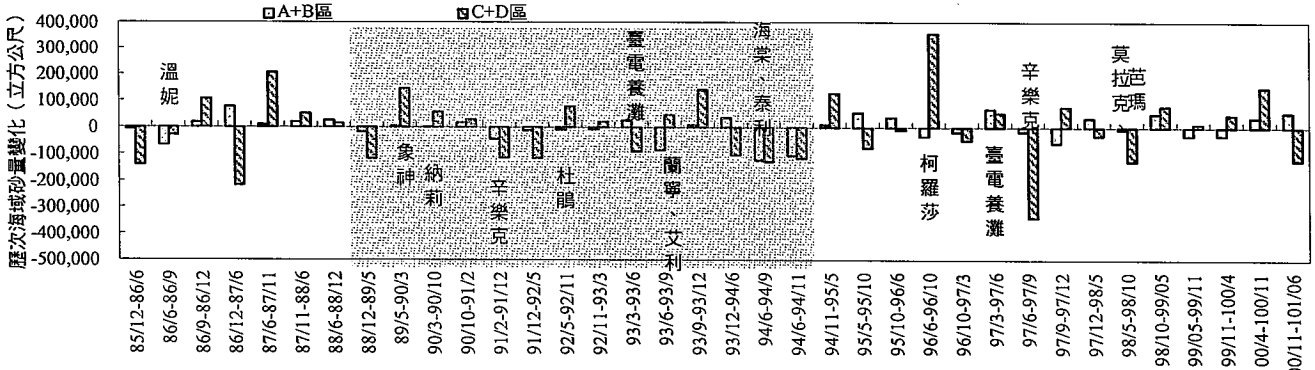

(c) 歷次陸域及海域砂量變化

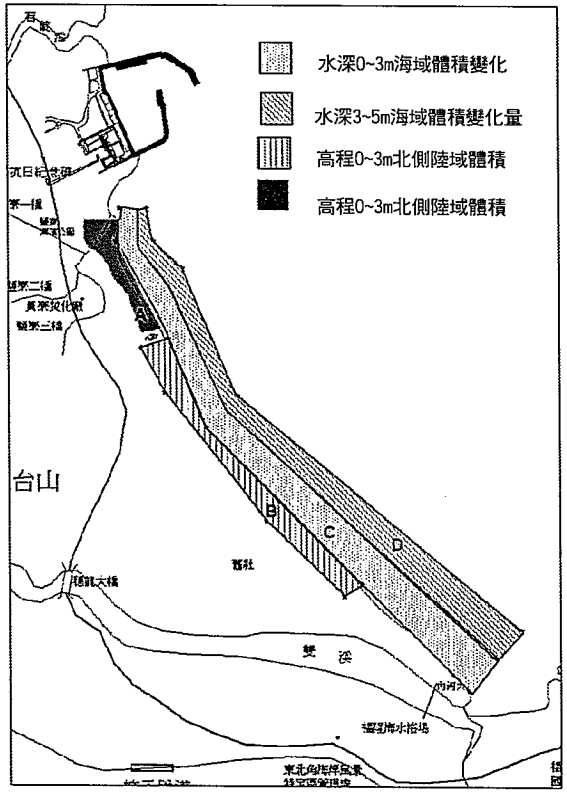

註：

1.(+為堆積 -為侵蝕,立方公尺)

2.以85年5月海事工程施工前為基準開始比較，並計算每季測量後與上季之砂量 變化情形，以確知其量測區域之沙量變化。


3.水深0-3m海域所截取試算總面積約為423,918平方公尺。

4.水深3-5m海域所截取試算總面積約為330,765平方公尺


5.等高線0-+3陸域所截取試算總面積，大岩石以北約65,710平方公尺，大岩石以南約為145,635平方公尺。

6.左圖沙量體積變化係以截取試算面積內，測量數值內差所計算之結果。


圖3.1-52 歷年海岸地形砂量體積變化圖

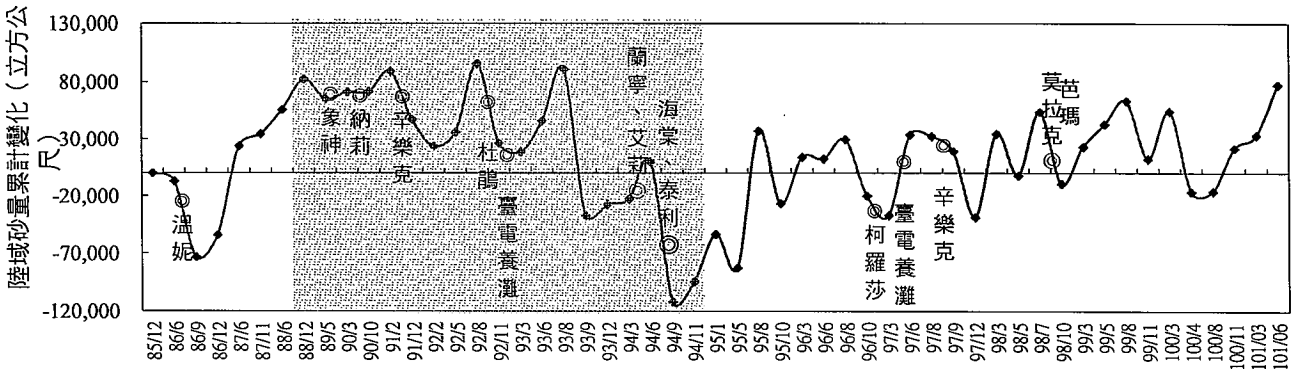

(d) 陸域砂量累計變化 （A+B區）

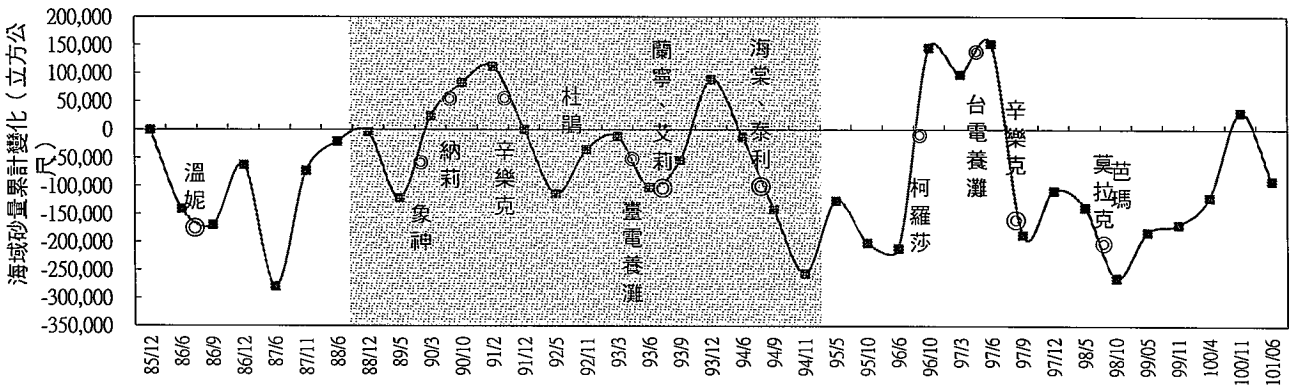


(e) 海域砂量累計變化量（C+D區）

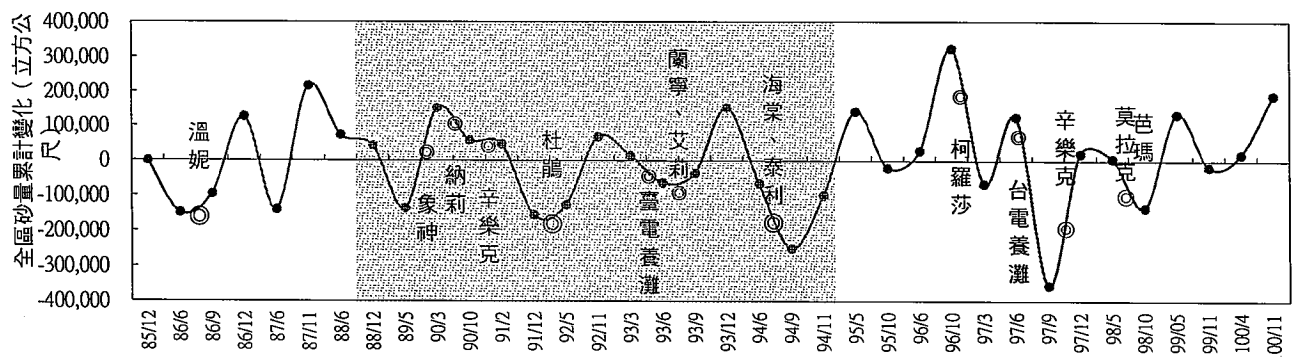

(f) 全區砂量累計變化量（A+B+C+D區）

圖3.1-52 歷年海岸地形沙量體積變化圖（續）

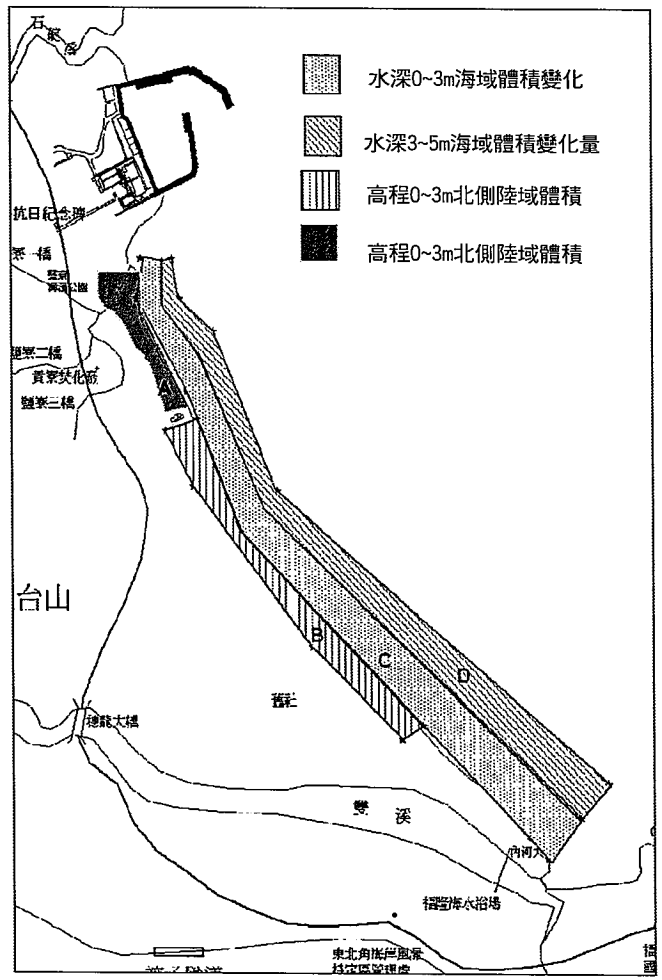

註： 1.(+為堆積 -為侵蝕,立方公尺)

2.以85年12月海事工程施工前為基準比較施工前後之砂量變化情形，故砂量為零。

3.水深0-3m海域所截取試算總面積約為423,918平方公尺。

4.水深3-5m海域所截取試算總面積約為330,765平方公尺

5.等高線0-+3陸域所截取試算總面積，鹽寮公園以北約65,710平方公尺，鹽寮公園以南約為145,635平方公尺。

6.左圖沙量體積變化係以截取試算面積內，測量數值內差所計算之結果。

圖3.1-53 各定位樁相對侵淤量示意圖

gojob\84101\017-15\reports\101-2T3_定位樁.xlsx,定位樁_圖

參考文獻

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

參 考 文 獻

監測調查方法

1. 行政院環保署，特殊工業區緩衝地帶及空氣監測設施設置標準，民國88年9月15日。
2. 行政院環保署，環境音量標準，民國85年1月31日。
3. 行政院環保署，水體水質監測站設置及監測準則，民國84年8月23日。
4. 行政院環保署檢驗所，水質檢驗法通則。
5. 行政院環保署，地下水水質監測井設置規範，民國91年12月27日。
6. 美國環保署，Test Methods for Evaluating Solid Waste, 3rd ed., 1986。
7. APHA（美國公共衛生協會）, Standard Methods for the Examination of Waste Water, 19th ed.，1995。

環境標準

1. 行政院環保署，空氣品質標準，民國93年10月13日。
2. 行政院環保署，環境音量標準，民國85年1月31日。
3. 行政院環保署，飲用水水源水質標準，民國86年9月24日。
4. 行政院環保署，地面水體分類及水質標準，民國87年6月24日。
5. 行政院環保署，放流水水質標準，民國98年7月28日。
6. 行政院環保署，地下水污染監測基準，民國90年11月21日。
7. 行政院環保署，地下水污染管制標準，民國98年1月15日。
8. 行政院環保署，海洋污染防治法，民國89年11月1日。
9. 行政院環保署，海域環境分類及海洋環境品質標準，民國90年12月26日。
10. 日本環境保護廳，日本振動法實施規則，民國79年5月。

參考資料

1. 鄭明修、詹榮桂、馮豐隆、曾晴賢，東北角海岸風景特定區自然生態資源調查與監測（三）。交通部觀光局東北角海岸國家風景區管理處。民國86年
2. 丘臺生，台灣的仔稚魚，國立海洋生物博物館籌備處出版，民國88年。
3. 行政院環保署，營建工程噪音調查及評估之研究，民國78年10月。
4. 交通部運輸研究所，「2001年台灣地區公路容量手冊」，民國90年3月。
5. 黃淑芳。2000。臺灣東北角海藻圖錄。國立臺灣博物館。
6. 李錦地等，台灣河川污染指標生物，台灣省水污染防治所，民國72年4月。
7. 胡美璜，台灣地區公路建設整體發展計畫構想芻議，71年4月再版。

8. 高肇藩，衛生工程－給水（自來水）篇。
9. 沈世傑，台灣魚類誌。台大動物系，民國82年。
10. 邵廣昭、陳正平、沈世傑，墾丁國家公園海域魚類圖鑑。內政部營建署墾丁國家公園管理處出版。民國82年。
11. 邵廣昭、陳靜怡，魚類圖鑑。遠流出版事業股份有限公司出版，民國92年。
12. 張崑雄、詹榮桂，墾丁國家公園海域珊瑚礁魚類 (圖鑑)，墾丁國家公園解說教育叢書之六。民國74年。
13. 陳朝欽、黃哲崇，台灣沿岸仔稚魚曲研究專集，農委會漁業特刊第2號，行政院農業委員會編印，民國74年。
14. 黃榮富，台灣河口域沙蟹科、方蟹及河尚蟹科之蟹類研究，台灣學院漁業研究所碩士論文，民國78年。
15. 奧谷喬司(戴昌鳳、鄭明修、張睿昇譯)，美工圖書社。民國86年。
16. 鄭明修，石碇溪水域生態之研究，中央研究院動物研究所，民國82年3月。
17. 胡忠恒、陶錫珍，台灣現生貝類彩色圖鑑，國立自然生物博物館出版，1995。
18. 施習德，招潮蟹，國立海洋生物博物館圖鑑系列3，國立海洋生物博物館籌備處出版，1994。
19. 施志均、游祥平，台灣的淡水蝦，國立海洋生物博物館圖鑑系列6，國立海洋生物博物館籌備處出版，1999。
20. 施志均、游祥平，台灣的淡水蟹，國立海洋生物博物館圖鑑系列7，國立海洋生物博物館籌備處出版，1999。
21. 李坤瑄、陳章波，台灣常見的棘皮動物，國立海洋生物博物館圖鑑系列2，國立海洋生物博物館籌備處出版，1994。
22. 陳朝欽、黃哲崇，台灣沿岸仔稚魚苗研究專集，農委會漁業特刊第2號，行政院農業委員會編印，1985。
23. 陳義雄、方力行，台灣淡水及河口魚類誌，國立海洋生物博物館籌備處出版，1999。
24. 臺電公司電源開發處，100年水文氣象年報，民國101年5月。
25. 臺灣電力公司，核能四廠第1、2號機發電計畫環境影響評估報告，民國80年11月。
26. 臺灣電力股份有限公司，新北市貢寮地區漁業之調查監測（期間: 101 年 4 月至 101 年 6 月）第 2 次中間報告，民國 101 年 8 月。
27. 臺灣電力公司，核能電廠渠式與防波堤式進水口方案研究報告，民國76年6月。
28. 臺灣電力公司，核四進水口結構對漂砂影響之研究，民國87年12月。
29. 臺灣電力公司，核能四廠最大可能海嘯及暴潮之評估，民國87年12月。

30. 劉志仁等，東港溪流域水生物調查及水質等級評估，台灣環境保護，第6期(P:1~12)，民國78年6月。
31. 賴景陽，台灣的貝類，自然科學文化事業公司出版部出版，民國70年。
32. 藍子樵，貝類的世界，南天書局出版社，民國74年。
33. 三宅貞祥，原色日本大型甲殼類圖鑑(Ⅰ,Ⅱ)，保育社出版，1982。
34. 今井龍雄，原色日本海岸動物圖鑑，保育社出版，1967。
35. 今井龍雄，原色日本貝類圖鑑，保育社出版，1970。
36. 武田正倫，原色甲殼類檢索圖鑑，北隆館出版，1982。
37. 山田幸男、瀨川宗吉，原色日本海藻圖鑑，保育社出版，1983。
38. 柳芝蓮編著。2001。臺灣海藻彩色圖鑑。行政院農業委員會印行。
39. APHA, Standard methods for the examination of water and wastewater,15th edition,1981。
40. Dai, C. F. ,The status of coral reefs in Taiwan. Workshop on the Global Coral Reef Monitoring Network in East Asia, International Coral Reef Monitoring Center, Ishigaki, Japan. ,2002。
41. Hung, T. C., R. Huang, T. H. Tan and K. L. Fan , Water quality studies around Taiwan. Spec. Publ. No. 65, National Taiwan Univ., Inst. of Oceanogr. 100pp. , 1990。
42. Hung, T. C. and C. C. H. Tsai , Chemical nutient and oxygen utilization in the sea water surrounding Taiwan. Bull. Inst. Chem. Academia Sinica, No., 27:33-43,1980。
43. Leis ,J.M. and D.S. Remmis, The larvae of Indo-Pacific coral reef fishes. University of Hawaii Press,1983。
44. Parsons,T.R, Y.Maita and C.M. Lalli , A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. Pergamon Press, Oxford. ,1984。
45 Su, J. C., T. C. Hung, and J. C. Chen , Chemical analysis of waters and sediments collected along Tanshui river. Spec. Publ. No. 34, Inst. Oceanogr. NTU, 40pp. ,1985。
46 Tseng, C. K. , Common seaweeds of China. Science Press, Beijing. China. 316 pp. ,1983。
47 English, S, C. Wilkingson, and V. Baker (2nd Edition). Survey Manual for Tropical Marine Resouces. Australian Institute of Marine Science, Townsville, Australia. 390 pp. ,1997。
Yoshida, T. Marine Algae of Japan. Uchida Rokakuho Publ. Co., LTD, Tokyo, Japan. 1222 pp. .,1998。

附　錄

Ⅰ.　檢測執行單位之認證資料

Ⅱ.　採樣與分析方法

Ⅲ.　品保/品管查核記錄

Ⅳ.　原始數據

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附　錄　I

檢測執行單位之認證資料

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

執行單位之認證資料

監測類別	執行單位	認證資料	環保署認可之檢測項目
1.氣象觀測	台電公司電源開發處	經濟部標準檢驗局國際標準品質保證制度 ISO9001/CNS12681 品質系統認可（證明書編號 3S7Y012-02）	測量資料調查分析
2.海象調查	台電公司電源開發處		測量資料調查分析
3.空氣品質監測	新紀工程顧問有限公司	環署環檢字第 053 號	周界大氣中粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳及臭氧
4.河川水文監測	台電公司電源開發處	經濟部標準檢驗局國際標準品質保證制度 ISO9001/CNS12681 品質系統認可（證明書編號 3S7Y012-02）	測量資料調查分析
5.河川水質監測	台灣檢測股份有限公司	環署環檢字第 035 號	含本計畫水質監測部分之 pH、水溫、溶氧量、金屬離子、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、導電度、氨氮、濁度及油脂等項目
6.廠區水質監測			
7.海水水質監測			
8.地下水水質監測			
9.海岸地形調查	中山大學海洋研究所 薛憲文副教授	學歷：美國西雅圖華盛頓大學 土木工程研究所博士 經歷：中山大學海洋研究所 副教授	
10.噪音與振動監測	新紀工程顧問有限公司	環署環檢字第 053 號	噪音及振動檢測
11.河域生態監測	中華民國魚類學會		
12.海域生態監測	中華民國珊瑚礁學會		
13.交通流量監測	新紀工程顧問有限公司	環署環檢字第 053 號	
14.漁業調查	台電公司委託海洋大學環境生物與漁業科學系辦理		
15.海域漂砂調查	中山大學海洋研究所 李忠潘教授	學歷：美國奧立崗州立大學 土木工程學系博士 經歷：中山大學海洋研究所教授	
16.景觀遊憩調查	傑明工程顧問股份有限公司		

附1-2

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

1、生物急毒性：生物急毒性檢測方法－水蚤靜水式法（NIEA B901）
2、生物急毒性：生物急毒性檢測方法－鯉魚靜水式法（NIEA B904）
3、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（NIEA E202）
4、水量：水量測定方法-容器法（NIEA W020）
5、水量：水量測定方法-流速計法（NIEA W022）
6、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法（NIEA W109）
7、導電度：水中導電度測定方法-導電度計法（NIEA W203）
8、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
9、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
10、水溫：水溫檢測方法（NIEA W217）
11、真色色度：水中真色色度檢測方法--分光光度計法（NIEA W223）
12、溶解性錳：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305）
13、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305）
14、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
15、銀：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
16、銅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
17、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
18、錳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
19、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
20、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
21、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
22、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）

（續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

98.07.5000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

台灣檢驗科技股份有限公司經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自100年11月25日至105年11月24日止

許可證內容詳見副頁

署長 沈世宏

中華民國100年11月9日

98.07.5000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

23、六價鉻：水中六價鉻檢測方法－比色法（NIEA W320）
24、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
25、硒：水中硒檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W341）
26、硼：水中硼檢測方法-薑黃素比色法（NIEA W404）
27、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法（NIEA W407）
28、總餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法（NIEA W408）
29、氰化物：水中氰化物檢測方法-分光光度計法（NIEA W410）
30、氟鹽：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法（NIEA W413）
31、正磷酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
32、亞硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
33、氟化物：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
34、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
35、氯鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
36、硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
37、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽檢測方法-馬錢子鹼比色法（NIEA W417）
38、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法（NIEA W418）
39、溶氧量：水中溶氧檢測方法—碘定量法（NIEA W422）
40、總氮：水中總氮檢測方法（NIEA W423）
41、氫離子濃度指數（pH值）：水中氫離子濃度指數測定方法-電極法（NIEA W424）
42、正磷酸鹽：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
43、總磷：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
44、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法（NIEA W430）
45、硫化物：水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法（NIEA W433）
46、砷：水中砷檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
47、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮之鎘選原流動注入分析法（NIEA W436）

（續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

48、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮之鎘選原流動注入分析法（NIEA W436）
49、氨氮：水中氨氮之流動注入分析法-靛酚法（NIEA W437）
50、凱氏氮：凱氏氮之消化與流動注入分析法-靛酚酞法（NIEA W438）
51、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法（NIEA W448）
52、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法（NIEA W451）
53、溶氧量：水中溶氧檢測方法－電極法（NIEA W455）
54、油脂：水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法（NIEA W505）
55、油脂：水中油脂檢測方法-萃取重量法（NIEA W506）
56、礦物性油脂：水中油脂檢測方法-萃取重量法（NIEA W506）
57、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法（NIEA W510）
58、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法--重鉻酸鉀迴流法（NIEA W514）
59、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法（NIEA W515）
60、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法（NIEA W516）
61、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法（NIEA W517）
62、酚類：水中總酚檢測方法-分光光度計法（NIEA W521）
63、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法（NIEA W525）
64、總有機碳：水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法（NIEA W532）
65、α - 安殺番：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
66、β - 安殺番
：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）

（續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

67、地特靈：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
68、安特靈：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
69、飛佈達及其衍生物-飛佈達：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
70、飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
71、滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
72、滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴滴：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
73、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴依：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
74、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
75、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴滴：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
76、靈丹：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W605）
77、總有機磷劑--大利松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法（NIEA W610）
78、總有機磷劑--巴拉松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法（NIEA W610）

（續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁）

98.07.6000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

79、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
80、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
81、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
82、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
83、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
84、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
85、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
86、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
87、總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
88、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
89、總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見末頁）

98.07.6000

附1-4

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法（NIEA W103）
2、地下水被動式擴散採樣：監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣袋採樣方法（NIEA W108）
3、總硬度：水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法（NIEA W208）
4、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
5、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
6、銅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
7、鉻：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
8、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
9、錳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
10、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
11、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
12、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
13、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
14、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法（NIEA W407）
15、氰化物：水中氰化物檢測方法-分光光度計法（NIEA W410）
16、亞硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
17、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
18、氟鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
19、硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
20、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽檢測方法-馬錢子鹼比色法（NIEA W417）
21、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法（NIEA W418）
22、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法（NIEA W430）
23、砷：水中砷檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）

（續接地下水檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

90、總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（以下空白）

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署100年11月9日環署檢字第1000097721號函辦理。

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

24、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮之鎘還原流動注入分析法（NIEA W436）
25、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮之鎘還原流動注入分析法（NIEA W436）
26、氨氮：水中氨氮之流動注入分析法-靛酚法（NIEA W437）
27、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法（NIEA W448）
28、總酚：水中總酚檢測方法-分光光度計法（NIEA W521）
29、總有機碳：水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法（NIEA W532）
30、大利松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法（NIEA W610）
31、巴拉松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法（NIEA W610）
32、達馬松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法（NIEA W610）
33、加保扶：水中胺基甲酸鹽殺蟲劑檢測方法-液相層析儀/螢光偵測器法（NIEA W635）
34、巴拉刈：水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法（NIEA W641）
35、2,4-地：水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W642）
36、毒殺芬：水中毒殺芬檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W653）
37、可氯丹：水中可氯丹檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法（NIEA W660）
38、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
39、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
40、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
41、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見本頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

42、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
43、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
44、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
45、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
46、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
47、反-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
48、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
49、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
50、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
51、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
52、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
53、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
54、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接地下水檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見本頁）

附1-7

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第105號

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自100年11月25日至
105年11月24日止

許可證內容詳見副頁

署長沈世宏

中華民國100年11月25日

98.07.5000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第035號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

55、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
56、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
57、萘：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
58、柴油總碳氫化合物：水中柴油總碳氫化合物含量檢測方法-氣相層析/火焰離子化偵測器檢測法（NIEA W802）
（以下空白）

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署100年11月9日環署檢字第1000097721號函辦理。

98.07.5000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第105號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室

檢驗室地址：高雄市楠梓加工出口區開發路61號

檢驗室主管：劉士萍（身分證統一編號：E220667080）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

1、水量：水量測定方法-容器法（NIEA W020）
2、水量：水量測定方法-流速計法（NIEA W022）
3、事業放流水採樣（不含自動混揉採水設備）：事業放流水採樣方法（NIEA W109）
4、導電度：水中導電度測定方法-導電度計法（NIEA W203）
5、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
6、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
7、水溫：水溫檢測方法（NIEA W217）
8、真色色度：水中真色色度檢測方法-分光光度計法（NIEA W223）
9、溶解性錳：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305）
10、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305）
11、海水中六價鉻：海水中鎘、鉻、銅、鐵、鎳、鉛及鋅檢測方法-APDC螯合MIBK 萃取原子吸收光譜法（NIEA W309）
12、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法 感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
13、銀：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
14、銅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
15、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
16、錳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
17、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
18、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
19、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法 感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
20、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）

（續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

本證書副本無效

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第105號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室

檢驗室地址：高雄市楠梓加工出口區開發路61號

檢驗室主管：劉士萍（身分證統一編號：E220667080）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

21、海水中鉛：海水中鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法 鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
22、海水中銅：海水中鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
23、海水中鋅：海水中鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
24、海水中錳：海水中鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
25、海水中鎘：海水中鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
26、六價鉻：水中六價鉻檢測方法－比色法（NIEA W320）
27、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
28、硒：水中硒檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W341）
29、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法（NIEA W406）
30、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法（NIEA W407）
31、總餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法（NIEA W408）
32、氰化物：水中氰化物檢測方法-分光光度計法（NIEA W410）
33、氟化物：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法（NIEA W413）
34、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽檢測方法-馬錢子鹼比色法（NIEA W417）
35、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法（NIEA W418）

（續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

本證書副本無效

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第105號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室

檢驗室地址：高雄市楠梓加工出口區開發路61號

檢驗室主管：劉士萍（身分證統一編號：E220667080）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

36、溶氧量：水中溶氧檢測方法—碘定量法（NIEA W422）
37、總氮：水中總氮檢測方法（NIEA W423）
38、氫離子濃度指數（pH值）：水中氫離子濃度指數測定方法-電極法（NIEA W424）
39、正磷酸鹽：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
40、總磷：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
41、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法（NIEA W430）
42、砷：水中砷檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
43、氨氮：水中氨氮之流動注入分析法-靛酚法（NIEA W437）
44、氰化物：水中總氰與弱酸可分解氰之流動注入分析法-比色法（NIEA W441）
45、氯氮：水中氯氮檢測方法-靛酚比色法（NIEA W448）
46、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法（NIEA W451）
47、溶氧量：水中溶氧檢測方法—電極法（NIEA W455）
48、油脂：水中油脂檢測方法-萃取重量法（NIEA W506）
49、礦物性油脂：水中油脂檢測方法-萃取重量法（NIEA W506）
50、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法（NIEA W510）
51、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法（NIEA W514）
52、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法（NIEA W515）
53、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法（NIEA W516）
54、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法（NIEA W517）
55、酚類：水中總酚檢測方法-分光光度計法（NIEA W521）

（續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第105號

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室

檢驗室地址：高雄市楠梓加工出口區開發路61號

檢驗室主管：劉士萍（身分證統一編號：E220667080）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

56、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法（NIEA W525）
（以下空白）

其他註記事項：
1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
2、許可事項依據本署100年11月7日環署檢字第1000096831號函辦理

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第053號

第1頁共1頁

檢驗室名稱：新紀工程顧問有限公司檢驗室

檢驗室地址：台北縣中和市中正路738號5樓之4

檢驗室主管：吳明信（身分證統一編號：A120700842）

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

1、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法-高量採樣法（NIEA A102.12A）
2、空氣中粒狀污染物(自動測定)：空氣中粒狀污染物自動檢測方法-貝他射線衰減法（NIEA A206.10C）
3、空氣中二氧化硫(自動測定)：空氣中二氧化硫自動檢驗方法-紫外光螢光法（NIEA A416.11C）
4、空氣中氮氧化物(自動測定)：空氣中氮氧化物自動檢驗方法－化學發光法（NIEA A417.11C）
5、空氣中臭氧(自動測定)：空氣中臭氧自動檢驗方法－紫外光吸收法（NIEA A420.11C）
6、空氣中一氧化碳(自動測定)：空氣中一氧化碳自動檢測方法－紅外線法（NIEA A421.11C）

（以下空白）

其他註記事項：

1、許可證副頁有關各項許可方法之末2碼，為核發許可證時之檢測方法版本，於許可期限內應使用本署公告最新版本（末2碼會隨公告版本而異）之檢測方法。
2、許可事項依據本署97年5月8日環署檢字第0970034141號函辦理。

94.03.5000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第053號

新紀工程顧問有限公司經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自97年5月8日至
102年5月5日止

許可證內容詳見副頁

署長 沈世宏

中華民國97年5月22日

94.03.5000

附1-10

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第053號

檢驗室名稱：新紀工程顧問有限公司檢驗室

檢驗室地址：台北縣中和市中正路738號5樓之4

檢驗室主管：吳明信（身分證統一編號：A120700842）

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

1、一般環境噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201.93C）
2、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法（NIEA P205.91C）
（以下空白）

其他註記事項：

1、許可證副頁有關各項許可方法之末2碼，為核發許可證時之檢測方法版本，於許可期限內應使用本署公告最新版本（末2碼會隨公告版本而異）之檢測方法。
2、許可事項依據本署97年5月8日環署檢字第0970034141號及97年10月20日環署檢字第0970080572號函辦理。

92.10.2000

附　錄　II

採樣與分析方法

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

Ⅱ.1 氣象觀測

高、低2座氣象塔分別設置各項氣象之觀測儀器及觀測資料轉換器(MTC)，氣象資料經換算與數據化後，分別傳送至印表機及MIDAS電腦內集中儲存與處理，再依據不同時段（如：每日逐時、每月逐日及每年逐月）進行計算及統計分析。

Ⅱ.2 空氣品質監測

1.採樣儀器、機型及分析原理

監測項目		監測之方法與使用之監測儀器
1.總懸浮微粒(TSP)		高量採樣法(NIEA A102.12A)；高量空氣採樣器
2.氮氧化物(NOx)		氮氧化物分析儀自動檢驗法（NOx ANALYZER/NIEA A417.11C「化學發光法」）
3.非甲烷碳氫化合物(NMHC)		「火焰離子燃燒檢知法」，HORIBA 360 分析儀
4.一氧化碳(CO)		一氧化碳分析儀自動檢驗法(CO ANALYZER/NIEA A421.11C「紅外光吸收光譜法」）
5.氣象	風速風向	風車式風速風向計
	溫度濕度	白金電阻電壓法

2.採樣口之設置

⑴氣狀污染物

本監測工作係採取移動測定車方式進行採樣，即各項分析儀器均設置於採樣車上，氣體樣品進口處距離地面之高度約 3 公尺。

⑵懸浮微粒

高量採樣器設置於採樣車頂上，氣體樣品進口處距離地面之高度在法規規定之 1.5 公尺以上。

3.測定步驟

氣狀及粒狀污染物之現場測定流程說明如后。

⑴氣狀污染物

①預處理工作

採樣分析前，各分析儀器需先經過暖機、零點校正及標準濃度校正等 3 項工作。

A.暖機

所有儀器需暖機 1~2 小時左右，再觀察記錄器（Recorde）之曲線是否正常，如不正常則延長暖機時間。

B.零點校正

零點校正之工作中，一氧化碳分析儀是利用零氣體產生器之零氣體進行零點校正；氮氧化物分析儀則是利用氣體校正儀所提供之零濃度氣體（zero gas）進行零點校正，利用其前儀錶板之歸零調整鈕將輸出電壓調整至零點；非甲烷碳氫化合物是利用儀器本身之零氣體產生器所提供之零濃度氣體進行零點校正。

C.標準濃度校正（span gas calibration）

標準濃度校正之工作方式，一氧化碳分析儀及非甲烷碳氫化合物分析儀是直接使用標準氣體鋼瓶，以氣體樣品之方式輸入分析儀中，直接進行校正；氮氧化物分析儀則是利用標準濃度氣體鋼瓶接通氣體校正儀，經稀釋後將之輸入分析儀中進行校正。

②採樣分析

以上 3 項步驟完成後，即可進行採樣分析工作。其分析步驟是將離地 3 公尺以上之氣體輸入各分析儀中進行分析，分析結果將顯示於記錄器上，記錄器是以連續式之 Recorder 與 CAMPBELL 之 Data

logger (21X)同時進行記錄，以利於稽核比對；Data logger 記錄是計算儲存每分鐘之平均值，再取小時平均後，即得各採樣污染物濃度之小時平均值。

⑵總懸浮微粒（TSP）

總懸浮微粒之測定方法主要是遵照環署檢字第 0950086772 號公告之高量採樣法進行採樣，其測定步驟包括濾紙準備、採樣及樣品分析等 3 個程序。

Ⅱ.3 噪音與振動監測

1.監測儀器

採用符合 NIEA P201.94C 規定之精密積分噪音計及 NIEA P204.90C 規定之振動計。

2.監測方式

⑴噪音

採用 A 加權位準 dB(A)及快動特性(FAST)之方式監測，取樣時距為 1 秒鐘，每小時取樣次數為 3,600 次，並記錄 1 次 Leq、Lx 及 Lmax，再由連續 24 小時之 Leq 測值計算 $L_{日}$、$L_{晚}$及 $L_{夜}$。

⑵振動

採用相對人體感覺之振動位準(VL)方式取垂直方向監測，取樣時距為 1 秒鐘，每小時取樣次數為 3,600 次，並記錄 1 次 Lveq、Lvx 及 Lvmax，再由連續 24 小時之 L_{V10} 測值計算 $L_{V日}$、$L_{夜}$及 $L_{V10(24hr)}$。

⑶儀器設置方式

①噪音：交通噪音係將監測儀器設置於各測站所鄰之道路邊緣 1 公尺處，如有建築物時，需距離建築物牆面線向外 1 公尺以上；環境噪

音監測在寬度八公尺以上之道路，應距離道路邊緣 30 公尺以上；在寬度 6 公尺以上未滿 8 公尺之道路，應距離道路邊緣 15 公尺以上。監測高度則距離地面約 1.2~1.5 公尺之間。

②振動：振動測量點在測量對象之周界外，拾振器設置於平坦且堅硬水平的地面；測量地點如為砂地、田（地）園等軟質地面的場所時，則需使用振動測定台。

Ⅱ.4 交通流量監測

主要參考「交通量工程師手冊」、「2011 年台灣地區公路容量手冊」之方法及準則進行交通運輸之相關各項監測工作。

1.交通量

針於選定各道路之監測點以「電子攝影記錄方式」或「以人工現場計數方式」對監測道路，進行連續 24 小時（00：00～24：00）之交通量監測。有關以電子攝影記錄之交通量監測方式，將配合人工觀看記錄之錄影帶方式統計各監測路段來向、去向之各小時的車種（機車、小型車、大型車、特種車）及其數量，並計算每小時及每日之 P.C.U.（小客車當量數，即 P.C.U.＝0.5×機車數＋1×小型車數＋2×大型車數＋3×特種車數）。

2.道路服務水準

參考交通部運輸研究所之「2011 年台灣地區公路容量手冊」，計算不同類型之道路水準劃分。

Ⅱ.5 河川水文監測

1.水位

4 處測站之河川水位量測係使用 BDR320 水壓式水位計進行自動連續

監測記錄。

2.河川橫斷面積

利用測深桿沿河川橫斷面，每隔適當距離量測水深1次，其施測斷面為流水部份之斷面（即潤濕斷面），將觀測結果繪製成橫斷面圖，即可求得河川橫斷面積。

3.含砂量

以積深採樣法施測，利用 DH-48 採樣器於河道之垂直分割斷面上選擇幾條測線（視河川橫斷面寬度、水深及流量而定）進行採樣，再以重量法求出砂重及水樣重，經計算而求得含砂量。

4.流速

利用Price式流速計於河道之垂直分割斷面上進行流速觀測，石碇溪量測斷面之測點約為2~4點，雙溪則為5~8點，視量測當時之水面寬度與深度而定。

5.流量

利用Q＝V×A之公式求得，其中Q為流量，V為河川流速，而A為河川橫斷面積。

II .6 河川水質及廠區水質監測

河川水質分析主要係依據環保署公告之「水質檢驗方法」辦理，部份低濃度金屬則參照美國公共衛生協會等編印之「水與廢水標準檢驗方法」進行分析。有關河川水質監測之水質分析方法詳如 1.5 節所示。另工區放流水流量之測定，於小流量測站採用定時計量（即收集放流水一段時間，再以 Q/T 求得），於大流量測站則採流速法，以流速(V)×排水渠道水深橫斷面積(A)求得。

Ⅱ.7 地下水監測

1.記錄及分析方法

⑴地下水水位

利用水位量測尺測出地下水水面與監測井井頂之距離，再將監測井井頂標高減去上述測出之距離，即可求得該監測井之水位標高；將各季監測之資料整理分析，繪製各監測井之水位變化圖及地下水等水位線圖。

⑵地下水水質

地下水水質分析方法列如 1.5 節所示，分析方法主要依據行政院環保署公告之「水質檢驗方法」及環保署公告之「地下水採樣方法」。

地下水水質監測工作之品保與品管，其主要內容大致與河川水質之品保與品管內容相同，僅採樣步驟及執行品管工作之內容有所差別。

⑶地下水的採集可分為下列三步驟：

①洗井：洗井之目的在清除非井內原始地下水的外來物質，以期地下水水樣的檢測分析不受外來因素影響。洗井的工具可分為汲取式、壓取式及空氣壓縮式抽水機，將依各監測井之狀況選用適當的工具。進行洗井應至少汲取3倍井水量，當每抽取固定體積的水樣，即測定其pH及導電度，一直到相鄰兩個水樣的讀數相差在10%以內，便視此時水質已達穩定狀態，即可開始進行取樣工作。

②樣品採集：取的水樣須裝滿容器，以避免瓶內有多餘的空氣。

現場分析及數據收集、記錄：洗井與取樣的過程中，採樣人員於現場以校正後的酸鹼值（pH）計與導電度計測試水樣，並

將洗井記錄連同水溫、pH及導電度等相關檢測讀數，記錄於地下水採樣記錄表上。

II.8 河域生態監測

⑴葉綠素 *a*：採 1 公升水樣後以冰藏方式攜回實驗室進行測定分析（NIEA E509.01C）。

⑵附著性藻類：現場採樣後以冰藏方式或加入固定液後，攜回實驗室進行測定分析。

⑶浮游植物：依環保署之河川水域植物性浮游生物的採樣規定進行採樣，各測站採取 1 公升水樣固定保存，攜回實驗室進行過濾濃縮法測定分析（NIEA E504.41T）。

⑷浮游動物：各測站採取 20 公升水樣，以 0.055mm 之濾網過濾浮游動物標本，加入固定液後，攜回實驗室進行測定分析

⑸水生昆蟲：以蘇伯氏水生昆蟲採集網(Suber net sampler)於每一測站，隨機方式於適當區域採取 50cm×50cm 方框內之水生昆蟲二網次，採獲之標本以 70%酒精保存後，攜回實驗室後再進行種類鑑定及數量計數（NIEA E801.30T）。

⑹魚類及無脊椎動物：以及手抄網與幼籠為主要採集方法，再配合各式其他適合之採樣器具，每 1 測站均於固定位置沿河川邊坡 30 公尺範圍內，2 人各採樣 1 小時，並於白日及夜間各進行 1 次採樣，夜間採樣時以近岸與籠具採集為主。採集所得標本，經加入固定液後，攜回實驗室後進行鑑定分析。

Ⅱ.9 海域水質監測

1.分析方法

海域水質分析係依環保署公告之「水質檢驗方法」辦理，如分析項目未列於環保署公告之方法中，則採用美國公共衛生協會等編印之「水與廢水標準檢驗方法」辦理。有關海域水質之分析方法詳見 1.5 節所示。

2.品保品管執行內容

有關海域水質監測工作之品保品管執行內容，大致與河川水質之品保與品管計畫相同，僅採樣步驟及執行品管工作之內容略有差異，茲就此兩部份說明如下：

⑴採樣：取樣前，事先瞭解漲退潮之時間以決定出海採樣時間

⑵取樣時先以欲採水樣沖洗 2、3 次，再採取海水表層或底層之水樣，並立即進行水樣處理工作，現場量測之項目（如 pH、水溫）應於量測後立即記錄在採樣監控表中。

Ⅱ.10 海域生態監測

1.環境因子

環境因子（亞硝酸鹽、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、總氮及總磷）分析係依環保署公告之「水質檢驗方法」辦理，如分析項目未列於環保署公告之方法中，則採用美國公共衛生協會等編印之「水與廢水標準檢驗方法」辦理。有關其分析方法詳見 1.5 節所示。

2.生物因子

⑴基礎生產力

利用 Niskin 採水瓶採集不同深度的海水（0m,3m,底層），裝入

1000ml 的塑膠瓶內，置放於裝有冷媒或冰塊之冰箱內冰藏，再攜回實驗室進行測定，以 C^{14} 為標定測定法或溶氧量測定法分析之。

⑵植物性浮游生物（NIEA E505.50C）

潮間帶各測站係利用採水桶採集表層海水，海域測站則利用 Niskin 採水瓶採集不同深度（0m,3m,底層）的海水，裝入 1000mL 的塑膠瓶內，以 Lugol's solution 或 1%福馬林溶液下固定後攜回實驗室處理。在實驗室中，將水樣以 0.45μm 的薄膜過濾後，置於高倍光學顯微鏡下觀察，鑑定種類組成及計量細胞數，再換算成每 1 公升海水內的浮游植物細胞密度。

⑶動物性浮游生物（NIEA E701.20C）

利用聯合國教科文組織（UNESCO）所定之北太平洋標準浮游生物網（NORPAC net，網目為 0.33mm×0.33mm，網身長 180cm，網口徑為 45cm），並於網口附流量計（Hydro-Bios,Model 438 110）測定並記錄轉數，並據以計算所過濾之水量，於網底掛上重錘後，將網下放至海底上面約 3 公尺處，再往上慢速拉升至水面之採樣方式採集動物性浮游生物標本。

⑷大型藻類

A.調查地點

潮間帶大型海藻相的調查地點共有 2 處，1 處在石碇溪出海口左側近澳底處，該處海岸遍佈礁石，另一處調查地點則位於鹽寮公園內抗日紀念碑的前方，此處為砂質海岸，僅有部分大塊礁岩零星散佈於潮下帶。亞潮帶的調查地點則自此兩潮間帶的調查地點向外海延伸，分別於水深 3~5 m 及 3~10 m 進行調查。

B.潮間帶海藻相調查

選擇大潮期間的最低潮位為起始點，向高潮位方向設置 4 條垂

直之採樣穿越線，每間隔 10 m。如遇測量地點凹凸不平，則平行向兩側延伸至適當位置，視現場地形而定。記錄每條穿越線沿線內之所有海藻種類，覆蓋率之估算主要依據 English (1997)之方法，以覆蓋百分比(%)表示。

C.亞潮帶海藻相調查

以水肺潛水進行調查，並以 10 公尺長的皮尺為取樣工具，在岩礁區平行等深線設置取樣橫截線，記錄橫截線上各種海藻及其覆蓋的比例，每一個地點重複取樣 4 次，以得到不同海藻的平均覆蓋率。覆蓋率之估算主要依據 English (1997)之方法，以覆蓋百分比(%)表示。

D.標本處理

藻種之鑑定：野外調查採集得的標本主要以 5~10% 的海水福馬林固定，做成浸泡標本且部份做成腊葉標本，以為藻種鑑定之樣品；而藻種鑑定以徒手切片方式製成臨時切片，在光學顯微鏡下來觀察內部構造。

⑸底棲無脊椎動物

A.岩礁環境之潮間帶：

選擇大潮期間的最低潮位為起始點，向高潮位方向設置 1 條橫截線（transect），每間隔 10m 以 50 公分×50 公分之鐵框採樣隨機選取 2 個樣品，計數樣區內之物種及其個體數。

B.亞潮帶：

依據底質而區分為沙底及岩礁兩種環境，分別採用不同採樣調查方式。在沙底質環境採用矩形底棲生物採樣器（Naturalist's anchor dredge，採樣器規格為 45cm 長×18cm 高，收集網網目 5mm，以船尾拖網方式採樣。採樣器收集網外層並另行加裝 1 層帆布套，以防止

收集網鉤住海底雜物或礁石而破損）。採樣深度分別為 5m 及 10m，各採樣 2 次。拖曳時船速保持約 1 浬/小時，每次拖曳時間為 10 分鐘（NIEA E103.20C）。岩礁環境採用水肺潛水方式調查，調查地點為大礁南方及淺礁南方，深度為 5m 及 10m，每站分別取樣 4 條橫截線，以直接計數或拍照紀錄橫截線內所出現之物種、數量及其覆蓋度。必要時，採集部份標本，進行種類鑑定（NIEA E104.20C）。

⑹珊瑚（NIEA E104.20C）

調查區域位於大礁和淺礁南側，其中大礁南側位於核四廠進水口預定地前方；淺礁南側則位於排水口預定地附近。調查方法係使用 10m 長的橫截線為取樣工具，於 2 地點各隨機取樣 4 次。直接記錄橫截線上的珊瑚種類、數量及其覆蓋度。必要時，採集部份標本，進行種類鑑定。

⑺魚類

A.仔稚魚及魚卵

利用附有流量計之浮游生物採集網或稚魚網於船尾，以水平方式拖網，或於船側以垂直方式採集表層之魚卵及仔稚魚標本。每一測站至少各拖曳 5~10 分鐘，所採集之標本均置於 5%中性福馬林溶液中保存。於實驗室中，以肉眼或在立體解剖顯微鏡下。取出標本進行定性種類組成分析，並經過濾水量之換算後，進行定量密度分析。

B.成魚（NIEA E102.20C）

依規定之調查方式，以具有魚類專業之人員，以水肺潛水目視調查方式，進行澳底及鹽寮礁石區的魚類調查（NIEA E102.20C）。調查時均採同一組人員，依循同一路徑進行目視觀察，觀察及記錄依據標準是於自身左右各 5 公尺範圍內出現的魚類方被記錄。目視調查的同時，並輔以水下攝影方式，進行影像拍攝，作為必要之比

對。

Ⅱ.11 漁業調查

1.漁業生產調查統計及經濟分析

配合由當地漁會所提供樣本戶資料進行實地訪查，以每月發出問卷方式進行。漁撈戶實際調查地區有龍洞、和美、美豔山、澳底、龍門、福隆、卯澳、馬崗等地區，九孔養殖戶實際調查地區有龍洞、和美、美豔山、澳底、福隆、卯澳、馬崗等地區。

2.漁業活動環境及其時空配置

調查方法包括用縣政府漁船登記執照紀錄、漁船噸數資料等全面性大樣本之漁業活動調查，並以抽樣式之標本戶實地調查檢驗，將各漁船出海之時數及漁獲魚種及量之時間序列資料，利用頻譜分析來考察漁民季節性漁業之組成。並且計算燈火漁業之漁獲量、漁獲金額、單位努力漁獲量(CPUE)及單位努力漁獲金額(IPUE)的變化。

3.刺網漁業、飛魚卵漁業、鏢旗魚漁業及釣具漁業

本項工作之調查方法包括釣具漁業活動動態的實地查訪、文獻蒐集及作業現況調查。其進行方法及步驟如下：

⑴以訪談方式調查各漁業之漁具、漁法及漁場分布。

⑵設立標本船(戶)，並定期派員蒐集下列資料

①作業漁場

②作業時間

③漁獲量及漁獲金額

⑶將標本船實際作業資料做整理分析。

4.燈火漁業（棒受網及小型巾著網漁業）

本季以調查燈火漁業作業動態為主，另外並建立本地區之燈火漁業經營現況，調查內容主要包括船位、作業漁場之海況、漁撈成本及漁獲狀況等相關資料。

5.魩仔魚漁業、休閒漁業及沿岸採捕業

本項工作主要針對龍洞至三貂角沿海地區之魩仔魚漁業、休閒漁業及沿岸採捕業之漁業生產、活動動態、資源分佈與季節變動及漁業效益等進行調查分析，其工作方法包括建立及增加各項漁業之標本戶，及各項漁業生產者基本資料的建檔工作，另一方面則針對各項漁業之漁業生產、活動動態、資源分布等進行實地訪查及文獻蒐集。

6.九孔及其他養殖漁業

問卷與實地訪查的方式，進行標本戶之九孔產量、產值的調查。同時將標本戶調查結果，以統計方法推估此時期整個貢寮地區九孔的總產量與總產值。

Ⅱ.12 海象調查

1.海域溫度與鹽度縱深剖面調查

租用有絞車（winch）之大型漁船，於選定測站利用CTD（SEACAT型號SBE 19-03）進行調查。

2.漂流浮標追蹤調查

仿製中研院環科會所設計之雙葉浮標進行觀測，其下端纜繩可調整長度以施測不同深度之流況。而浮標流跡係利用船隻及其上所安裝之全球衛星定位系統（GPS）進行追蹤定位，約每30分鐘記錄1次浮標位置。

3.潮位與水溫調查

潮位調查係採用HANDAR型號555C-1 Logger/449A/B Sensor進行自動記錄，水溫調查則採用HANDAR型號555C-1 Logger/433FN Sensor進行自動記錄。

Ⅱ.13 景觀與遊憩活動調查

1.門票數分析

分別蒐集鹽寮海濱公園、福隆海水浴場及龍門渡假中心之門票發售統計資料，以便進行相關之分析比較。

2.景觀調查

研究人員每月前往現場調查核四廠址周邊之環境景觀變化情形，並以照片記錄 7 個調查點的景觀變化，並藉由自然完整性之評分表(如表Ⅱ.13-1)進行評估。

此評分表係參考相關景觀調查評估方法，以及針對核四廠開發行為所可能對景觀所造成之影響加以歸納而建立；由於核四廠廠址原為一處自然環境，故本評估方式著重在開發過程對自然完整性之破壞程度，並將之分為景觀破壞與景觀美化兩大部份；景觀破壞方面主要之評估項目包括□對坡度的破壞程度，□開挖所裸露之土壤與周圍環境之對比，□改變景觀的類別，□開發面積佔視野面積的多寡及⑸開發場址對視覺之衝擊程度。在景觀美化方面主要與植生有關，其評估之項目有□美化所使用之材質與周圍自然環境配合的程度，□植生的土壤深度及□土壤穩定的程度。自然完整性評分值之範圍從最低分 8 分至最高分 40 分，其中得分在 30~40 分之間歸類為高自然完整性，19~29 分之間歸類為中自然完整性，8~18

分之間則屬低自然完整性。

表Ⅱ.13-1 核四施工環境監測自然完整性之評分表

自然完整性	景觀破壞	1.坡度：5%以下(5)，5-15%□，15-30%□，30-40%(2)，40%以上□
		2.土壤與環境對比程度：對比低(5)，對比中等□，對比高□。
		3.改變類別：改變植被(5)，改變地形□，改變地質□。
		4.改變面積：佔所見視野面積 5%以下(5)，6~10%□，11-20%□，21-30%□，30%以上□。
		5.距離：遠景 1200 公尺以上(5)，中景 500-1200 公尺□，近景 500 公尺以下□。
	景觀美化	1.美化材類與自然配合度：配合良好(利用植栽) (5)，配合中等□，配合差□。
		2.立地再被覆性：土壤深度 50 公分以上(5)，20-50 公分□，20 公分以下□。
		3.土壤穩定性：穩定性高(5)，穩定性中等□，穩定性低□。

註：1.總評值之範圍 8~40。2.（ ）之數字表得分數。3.總得分 8~18 分屬低自然完整性。4.總得分 19~29 分屬中自然完整性。5.總得分 30~40 分屬高自然完整性。

Ⅱ.14 海域漂砂

1.採樣分析

海域漂砂調查 99 年 5 月增設 2 個測點，共規劃 5 個捕砂施測地點，編號由北而南分別為 S1、S2、S3、S4 與 S5，其中 S1~S3 分布水深約為 5~6m 等深線處，S4 與 S5 則在水深約 10~11m 處，有關採樣位置與坐標詳前圖 1.4-12 所示。漂砂調查係於測點底床裝置 1 具 8 方向之捕砂器，其中 1 孔標示正北，孔高 10 ㎝，寬 4 ㎝，由潛水人員在海底進行正北的

校正，而儀器固定在與海床平行距離 10 ㎝處。完成調查取樣時，需進行各方向捕砂孔內之含砂量重量分析及砂樣篩分析等。捕砂時間依現地情況而異，以集砂器不滿溢為原則。完成調查取樣時，將各方向所採集之砂樣取出秤重並以 Coulter LS 100 雷射顆粒度分析儀進行粒徑分析，以得到運動底質之粒徑及調查期間的主要漂沙方向及輸砂量等資料。

在粒徑分析方面，其步驟為：選取適當數量顆粒度小於 0.85mm 之土粒樣品，加入適量乾淨水充分混合後置於雷射儀器上，經分析後可得初始結果（Raw Data），至於粒度大於 0.85mm 之土粒則進行一般篩分析（Sieve Analysis）來了解其粒度分佈情形。資料整理後可得中值粒徑（median diameter）d_{50}，平均粒徑（mean diameter）dm，有效粒徑（effective diameter）d_{10}，及 d_{25}、d_{75}、d_{90} 各粒徑值。

2.漂砂移動趨勢分析

輸砂速率之推算係以每一測點 8 個方向捕砂孔（高 10cm，寬 4cm）所攔截的漂沙底質經秤重後得到進砂量，重量除以捕砂孔截面積，再除以捕砂時間即得進砂速率。而漂砂移動方向則以兩相對方向進砂速率相減所得的淨輸砂速率得知。

3.海流調查

為配合輸砂方向分析，本計畫漂砂調查亦增加一處海流監測站，海流儀設置位置如本文圖 1.4-12，監測位置之水深為 10 公尺，海流儀則定點於水面下 5 公尺之水層進行監測，每 5 分鐘接收 1 筆流速、流向資料。佈設時以漁船作業，使用 DGPS 定位方式配合潛水人員進行。自計式海流儀以不銹鋼纜加錨鍊、重錘固定於海床之上，以防止底拖漁船之破壞，配合 DGPS 定位以確定其位置，方便潛水人員取得海流儀。

Ⅱ.15 海岸地形調查

1.陸域地形調查

⑴陸上控制點與基準點之測量

於控制點點位取得部份，乃以 GPS（Global Positioning System）衛星定位系統求得，所用之衛星定位接收儀為 Trimble 4000SSE。首先由測區中選取點號為台電 N02 做為基準點，並由中研院於台灣大學所設之永久點位引測基線至臺電 N02 以求出其 WGS84 座標。臺灣大學永久點位之 WGS84 座標為：

經度（λ）=121° 32’ 11.54226” E
緯度（ψ）= 25° 01’ 16.79464” N
高程（H）＝44.009M

目前所使用之控制點為以臺電 NO2 為基準點，再進行靜態引測求得各控制點之 WGS84 座標，目前測區內建立 3 點控制點，分別為鹽寮海濱公園萬應公廟樓頂（點號：N0）、大岩石最上端（點號：N16）與澳底九岸會館樓頂陽台（點號：N333），現階段以澳底九岸會館樓頂陽台控制點做為陸域測量之基站點，此點為民國 94 年 5 月 8 日新設點。各控制點之 WGS84 橢球座標及 TWD67 二度分帶座標詳見表 II.15-1 及表 II.15-2。然而，於進行地形測量時所需座標為二度分帶座標，因此利用轉換公式將各點位 WGS84 座標轉換為 TWD67 二度分帶座標。所得上述各點之座標由 WGS84 座標轉換成 TWD67 二度分帶座標之轉換參數詳如表 II.15-3。潮位站與 N0、N16 之水準高於民國 84 年時，乃由台電核四廠區內之核四 NO 以直接水準引測，每個作業區段水準均要求誤差在±20mm 以內；另於民國 88 年時以內政部位於貢寮鄉台 2 線仁和宮旁點名「貢寮休閒廣場」，點號為 2056，中潮系統高程為 8.39 公尺之水準點，進行潮位站與 N0、N16、N333 各控制點之水準高程檢核引測，所測量之水準高程與民國 84 年之結果相同。

自 93 年第 2 季起，每半年進行 1 次極近岸碎波帶地形（水深 0~-3 公尺）調查時，以 GPS-RTK 動態及時差分定位（88 年 12 月以後採用，88 年 11 月前採用 Pentex PTS II-05 型電子測距經緯儀）進行量測，經由固定點位 N16 與 N21 之作業高程比對，高程誤差值於 2cm 以內。

表Ⅱ.15-1 核四附近海岸地形控制點之 WGS84(P,L,H)

點　　號	緯度	經度	橢球高
核四NO	25°02’13.75165	121°55’35.10475	32.860
核四N3	25°02’20.66046	121°55’32.41905	30.927
臺電NO2	25°02’39.79378	121°55’44.37320	26.189
N0	25°02’34.61463	121°55’38.99900	31.511
N16	25°02’10.96034	121°55’51.28390	28.264
N333	25°03’11.37589	121°55’46.23419	35.838

表Ⅱ.15-2 核四附近海岸地形控制點 TWD67 之 2-TM 座標及高程

點　　號	N-COOD(M)	E-COOD(M)	高程(M)
核四NO	2770416.744	342643.420	12.020
核四N3	2770628.808	342566.679	10.039
臺電NO2	2771219.825	342897.733	5.353
N 0	2771059.432	342748.184	10.654
N16	2770333.970	343097.549	7.440
N333	2772192.547	342943.448	14.983

表Ⅱ.15-3　WGS84 與二度分帶之轉換七參數

dalta X	694.840m
dalta Y	477.905m
dalta Z	238.0m
scale coor.	-0.2329000ppm
rotation X	0.2406000sec
rotation Y	-0.3841000sec
Rotation Z	-0.2026000sec

⑵陸域地形測量

以 GPS-RTK 動態及時差分定位（88 年 12 月以後採用，88 年 11 月前採用 Pentex PTS II-05 型電子測距經緯儀）進行量測，以固定點位 N16 之作業高程比對，高程誤差值於 2cm 以內。所謂 RTK（Real Time Kinematic）GPS（亦可稱為 RTS 或 KGPS），乃是 2 部以上之 GPS 於同步接收衛星的情形下，將其中 1 部設立為參考站，並透過地面無線電將參考站所接收之衛星資訊加以廣播，而其他各部 GPS 接收儀藉此即時解算出與參考站之相對向量，提供即時公分級之測量精度。

GPS-RTK 高程定位測量測線規劃為東西向，以銜接海上之測線位置;陸域測量測線間距在核四進水口防波堤以南至N16大岩石以北間，每隔 25 公尺 1 條測線，大岩石以南陸域地區，則每 50 公尺 1 條測線；平行海岸測線則包含低潮線、沙灘中間線、植被沙丘上下稜線等，遇道路、結構物、高程變化較大處亦測量其坐標與地表高程；植被部分仍以 GPS-RTK 方式進行測量，並依所測定之周界高程，以數值內差方式計算出海灘與植被區域最接近之高程。

2.沙灘定樁觀測

在選灘定位樁觀測，主要選擇以不受地層下陷影響之數處定點，以標尺進行量測定位樁固定標高位置與沙灘之距離，以記錄該定位樁沙灘每季之高程變化量，並以接近之角度於每次測量時進行攝影，藉以目視每次地貌之大致變化；自 96-2 起，擇定鹽寮海濱公園 1~3 號救生樁、垃圾掩埋場附近大岩石 1~3 號定位樁，與福隆海水浴場以靠外海之第一橋墩為定位樁，99-1 再增設鹽寮 4~5 號救生樁、舊社 1~2 號救生樁、福隆 1 號裝與內河大橋靠外海之第二橋墩為定位樁，共 14 處定位樁進行沙灘高程變化之觀測與記錄。各定位樁之坐標如表 II .15-4。

表Ⅱ.15-4 核四附近海岸定位樁之 TWD67 之 2-TM 坐標

定　位　樁	E	N
鹽寮 1 號樁	342854	2770952
鹽寮 2 號樁	342878	2770952
鹽寮 3 號樁	342908	2770914
鹽寮 4 號樁	342855	2770766
鹽寮 5 號樁	342992	2770556
大岩石救生樁	343118	2770354
大岩石 1 號樁	343117	2770349
大岩石 2 號樁	343126	2770348
大岩石 3 號樁	343129	2770352
舊社 1 號樁	343537	2769586
舊社 2 號樁	343640	2769487
內河大橋第一橋墩	344498	2768651
內河大橋第二橋墩	344490	2768624
福隆 1 號樁	344476	2768480

附　錄　III

品保／品管查核記錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附　錄　Ⅲ.1

空氣品質品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附錄 III.1-2 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 4 月福隆海水浴場)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

校正項目：NO、CO、THC

校正日期：101.4.27　　查核日期：101.4.30

校正人員：[illegible]　　查核人員：[illegible]

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1. 一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	0	0	0	鋼瓶編號：
儀器編號：	Span 400/400	398/399	400/400	391/199	ES0008438
2. 二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero	//			氣體濃度：
儀器編號：	Span				NO：497.6 ppm SO_2：50.2 ppm CO：[illegible] ppm
3. 一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	鋼瓶壓力：
儀器編號：	Span 40.6/20.2	40.6/20.4	40.6/20.2	40.7/20.6	114 kgf/cm²
4. 臭　氧 O_3(ppb)	Zero	//			
儀器編號：	Span				
5. 總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00	0.00	鋼瓶編號：
儀器編號：	Span 8.00/4.00	8.07/4.06	8.00/4.00	8.01/4.00	ES0008439
6. 甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00	0.00	氣體濃度：
儀器編號：	Span 8.00/4.00	2.9/4.1	8.00/4.00	2.81/3.98	CH_4：1009 ppm C_3H_8：— ppm
7. 非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00	0.00	鋼瓶壓力：
儀器編號：	Span 0.00/0.00	0.15/0.05	0.00/0.00	0.27/0.02	136 kgf/cm²

品保品管組：[illegible] 101.5.2

RP-03-C-01(記錄表單第11-2(1)-980608)附表十八(9602修訂)

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8232 新北市中和區中正路739號3樓之1

附錄 III.1-1 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 4 月貢寮國小)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

校正項目：NO、CO、CH4

校正日期：101.4.5　　查核日期：101.4.8

校正人員：[illegible]　　查核人員：[illegible]

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1. 一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	0	0/4.00/200	1/4.05/205	鋼瓶編號：
儀器編號：	Span 400/200	400/200			ES0008438
2. 二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero	//			氣體濃度：
儀器編號：	Span				NO：497.6 ppm SO_2：50.2 ppm CO：503 ppm
3. 一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.0	0.0/40.5/20.2	0.0/39.5/20.0	鋼瓶壓力：
儀器編號：	Span 40.5/20.2	40.5/20.1			115 kgf/cm²
4. 臭　氧 O_3(ppb)	Zero				
儀器編號：	Span		//		
5. 總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00/8.00/4.00	0.01/8.03/4.04	鋼瓶編號：
儀器編號：	Span 8.00/4.00	7.95/4.01			ES0008439
6. 甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00/8.00/4.00	0.01/8.01/3.98	氣體濃度：
儀器編號：	Span 8.00/4.00	2.90/4.01			CH_4：1009 ppm C_3H_8：— ppm
7. 非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00/0.00/0.00	0.00/0.02/0.06	鋼瓶壓力：
儀器編號：	Span 8.00/8.00	0.05/0.00			139 kgf/cm²

品保品管組：[illegible] 101.4.12

RP-03-C-01(記錄表單第11-2(1)-980608)附表十八(9602修訂)

附錄 III.1-4 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 4 月石碇宮)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：石碇宮
校正項目：NO、CO、CH4
校正日期：101.4.5　　查核日期：101.4.8
校正人員：朱順毅　　查核人員：賴振名

項目	校正濃度	讀值	查核濃度	讀值	備註
1.一氧化氮 NO(ppb) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0	1	0	0	鋼瓶編號：JB03020
	Span 400 | 200	400 | 200	400 | 200	390 | 195	氣體濃度：
2.二氧化硫 SO_2(ppb) 儀器編號：—	Zero				NO：50.9 ppm
	Span				SO_2：51.4 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm) 儀器編號：2J3807	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	CO：5090 ppm
	Span 40.0 | 20.0	40.0 | 20.4	40.0 | 20.0	39.8 | 20.3	鋼瓶壓力：100 kgf/cm²
4.臭氧 O_3(ppb) 儀器編號：—	Zero				
	Span				
5.總碳氫化合物 THC(ppm) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0.00	0.02	0.00	0.03	鋼瓶編號：ES0008433
	Span 8.00 | 4.00	8.03 | 4.04	8.00 | 4.00	8.02 | 4.03	氣體濃度：
6.甲烷 CH_4(ppm) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0.00	0.01	0.00	0.01	CH_4：99.7 ppm
	Span 8.00 | 4.00	7.99 | 4.01	8.00 | 4.00	7.95 | 3.98	C_3H_8：— ppm
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0.00	0.01	0.00	0.02	鋼瓶壓力：85 kgf/cm²
	Span 0.00 | 0.00	0.04 | 0.03	0.00 | 0.00	0.07 | 0.05	

品保品管組：王明德 101.4.12

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版-950609附表十八(9601修訂))

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7741-6360 新北市中和區中正路788號8樓之2

附錄 III.1-3 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 4 月川島養殖池)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：川島養殖池
校正項目：NO、CO、THC
校正日期：101.4.2　　查核日期：101.4.5
校正人員：朱順毅　　查核人員：朱順毅

項目	校正濃度	讀值	查核濃度	讀值	備註
1.一氧化氮 NO(ppb) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0	1	0	1	鋼瓶編號：JB03020
	Span 400 | 200	401 | 201	400 | 200	397 | 201	氣體濃度：
2.二氧化硫 SO_2(ppb) 儀器編號：—	Zero				NO：50.9 ppm
	Span				SO_2：51.4 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm) 儀器編號：2J3807	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	CO：5090 ppm
	Span 40.0 | 20.0	40.0 | 20.2	40.0 | 20.0	39.2 | 19.8	鋼瓶壓力：100 kgf/cm²
4.臭氧 O_3(ppb) 儀器編號：—	Zero				
	Span				
5.總碳氫化合物 THC(ppm) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0.00	0.0	0.00	0.02	鋼瓶編號：ES0008433
	Span 8.00 | 4.00	8.03 | 4.02	8.00 | 4.00	8.03 | 4.02	氣體濃度：
6.甲烷 CH_4(ppm) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0.00	0.01	0.00	0.0	CH_4：99.7 ppm
	Span 8.00 | 4.00	8.00 | 4.00	8.00 | 4.00	8.02 | 4.01	C_3H_8：— ppm
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm) 儀器編號：2M3655380032	Zero 0.00	0.00	0.00	0.01	鋼瓶壓力：85 kgf/cm²
	Span 0.00 | 0.00	0.03 | 0.02	0.00 | 0.00	0.01 | 0.01	

品保品管組：王明德 101.4.10

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版-950609附表十八(9601修訂))

附錄 III.1-6 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 5 月貢寮國小)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：貢寮國小
校正項目：NO、CO、CH4.
校正日期：101.5.3.　　查核日期：101.5.6
校正人員：陽存正 林文祿)　　查核人員：賴振名

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1.一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	0	0	0	鋼瓶編號：
儀器編號：GW YTTMBB8Y	Span 400 / 200	403 / 204	400 / 200	402 / 203	ES0008438
2.二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero				氣體濃度：
儀器編號：	Span				NO：496 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	SO_2：502 ppm
儀器編號：GW WRTBGPVS	Span 40.5 / 20.2	40.6 / 20.6	40.5 / 20.2	40.4 / 20.6	CO：503 ppm
4.臭　氧 O_3(ppb)	Zero				鋼瓶壓力：
儀器編號：	Span				114 kgf/cm²
5.總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00	0.03	鋼瓶編號：
儀器編號：GW WSBSKN0T	Span 8.00 / 4.00	8.04 / 4.06	8.00 / 4.00	8.14 / 4.14	ES0008439
6.甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00	0.02	氣體濃度：
儀器編號：GW WSBSKN0T	Span 8.00 / 4.00	8.01 / 3.95	8.00 / 4.00	8.10 / 4.07	CH_4：1069 ppm
7.非甲烷類 C_nH_8(ppm)	Zero 0.00	0.00	0.00	0.01	C_nH_8：X ppm
儀器編號：GW WSBSKN0T	Span 0.00 / 0.00	0.03 / 0.11	0.00 / 0.00	0.04 / 0.07	鋼瓶壓力：
					136 kgf/cm²

品保品管組：林振輝 101.5.11

RP-03-C-01(紀錄表單第11-7版)-980508(附表十八(9602修訂))

新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3299 台中市中正路738號5樓之4

附錄 III.1-5 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 4 月貢寮焚化廠旁之民宅)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：民宅
校正項目：NO、CO、CH4.
校正日期：101.4.19　　查核日期：101.4.22
校正人員：賴振名　　查核人員：賴振名 林文祿

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1.一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	0	0	1	鋼瓶編號：
儀器編號：GW YTTMBB8Y	Span 400 / 200	401 / 205	400 / 200	398 / 202	ES0008438
2.二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero				氣體濃度：
儀器編號：GW WRTBGPVS	Span				NO：49.6 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	SO_2：50.1 ppm
儀器編號：GW WRTBGPVS	Span 40.5 / 20.3	40.6 / 20.5	40.5 / 20.3	40.6 / 20.6	CO：503 ppm
4.臭　氧 O_3(ppb)	Zero				鋼瓶壓力：
儀器編號：	Span				114 kgf/cm²
5.總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.04	0.00	0.07	鋼瓶編號：
儀器編號：GW WSBSKN0T	Span 8.00 / 4.00	8.05 / 4.09	8.00 / 4.00	8.12 / 4.13	ES0008439
6.甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.03	0.00	0.04	氣體濃度：
儀器編號：GW WSBSKN0T	Span 8.00 / 4.00	7.98 / 4.06	8.00 / 4.00	8.11 / 4.10	CH_4：1069 ppm
7.非甲烷類 C_nH_8(ppm)	Zero 0.00	0.01	0.00	0.03	C_nH_8：X ppm
儀器編號：GW WSBSKN0T	Span 0.00 / 0.00	0.01 / 0.01	0.00 / 0.00	0.01 / 0.03	鋼瓶壓力：
					139 kgf/cm²

品保品管組：林振輝 101.4.26

RP-03-C-01(紀錄表單第11-3版)-980508(附表十八(9602修訂))

附錄 III.1-8 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 5 月川島養殖池)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

校正項目：NO、CO，THC

校正日期：101.5.5　　查核日期：—

校正人員：朱柏毅　　查核人員：——

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1. 一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	1			鋼瓶編號：JA0301Z
儀器編號：5303-1143	Span 400/200	399/198			氣體濃度：
2. 二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero				NO：503 ppm
儀器編號：—	Span				SO_2：505 ppm
3. 一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.1			CO：5050 ppm
儀器編號：2J1030D	Span 40.0/20.1	40.2/20.4			鋼瓶壓力：72 kgf/cm²
4. 臭　氧 O_3(ppb)	Zero				
儀器編號：—	Span				
5. 總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.05			鋼瓶編號：ES0008433
儀器編號：2J1435538001	Span 8.00/4.00	8.05/4.04			氣體濃度：
6. 甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.03			CH_4：999 ppm
儀器編號：2J1435538001	Span 8.00/4.00	8.02/4.01			C_3H_8：— ppm
7. 非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero 0.00	0.02			鋼瓶壓力：85 kgf/cm²
儀器編號：2J1435538001	Span 0.00/0.00	0.03/0.03			

品保品管組：林振禧 101.5.11

RP-03-C-04(記錄表單第11-2版)-960608(附表十八(9602修訂))

新校工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8222 台中市中正路738號5樓之4

附錄 III.1-7 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 5 月福隆海水浴場)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

校正項目：NO. CO. 臭氧. CH4. 甲烷

校正日期：101.5.24　　查核日期：101.5.29

校正人員：賴振谷.李宗智　　查核人員：葉卓學.林振禧

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1. 一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	0	0	1	鋼瓶編號：ES0008428
儀器編號：2J1T7MBBBY	Span 400/200	399/203	400/200	398/202	氣體濃度：
2. 二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero				NO：49.6 ppm
儀器編號：—	Span				SO_2：502 ppm
3. 一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	CO：503 ppm
儀器編號：2J1435538001	Span 40.5/20.3	40.6/20.7	40.5/20.3	38.3/19.3	鋼瓶壓力：113 kgf/cm²
4. 臭　氧 O_3(ppb)	Zero				
儀器編號：—	Span				
5. 總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.01	0.00	0.00	鋼瓶編號：ES0008439
儀器編號：2J1435538001	Span 8.00/4.00	8.06/4.07	8.00/4.00	8.05/4.07	氣體濃度：
6. 甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.01	0.00	0.00	CH_4：1009 ppm
儀器編號：2J1435538001	Span 8.00/4.00	7.99/4.01	8.00/4.00	8.03/4.05	C_3H_8：— ppm
7. 非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero 0.00	0.01	0.00	0.00	鋼瓶壓力：135 kgf/cm²
儀器編號：2J1435538001	Span 0.00/0.00	0.07/0.06	0.00/0.00	0.02/0.04	

品保品管組：賴振谷 101.5.29

吳明倫 5/29

RP-03-C-04(記錄表單第11-2版)-960608(附表十八(9602修訂))

附錄 III.1-10 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 5 月貢寮焚化廠旁之民宅)

附表十八　分析儀校正記錄(1)


計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：民宅
校正項目：NO、CO、THC/CH4
校正日期：101、5、9　　查核日期：101.5.13
校正人員：朱順毅　　查核人員：范和聰、賴振宏

項目	校正濃度	讀值	查核濃度	讀值	備註
1.一氧化氮 NO(ppb) 儀器編號：5/N03-1143	Zero 0	0	0/4.00/200	0/399/193	鋼瓶編號：JA03012
	Span 400/200	400/199			氣體濃度：NO：50.3 ppm
2.二氧化硫 SO_2(ppb) 儀器編號：—	Zero				SO_2：50.5 ppm
	Span				CO：5050 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm) 儀器編號：S/N10301	Zero 0.0	0.1	0.0/40.2/20.1	0.1/40.3/20.4	鋼瓶壓力：72 kgf/cm²
	Span 40.2/20.1	40.2/20.2			
4.臭氧 O_3(ppb) 儀器編號：—	Zero				
	Span				
5.總碳氫化合物 THC(ppm) 儀器編號：S/N436553800	Zero 0.00	0.04	0.00/8.00/4.00	0.03/7.88/3.95	鋼瓶編號：ES0008433
	Span 8.00/4.00	8.03/4.03			氣體濃度：CH_4：999 ppm
6.甲烷 CH_4(ppm) 儀器編號：S/N436553800	Zero 0.00	0.0	0.00/8.00/4.00	0.02/7.87/3.93	C_3H_8：— ppm
	Span 8.00/4.00	7.99/3.99			鋼瓶壓力：84 kgf/cm²
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm) 儀器編號：S/N436553800	Zero 0.00	0.03	0.00/0.00/0.00	0.01/0.02/0.02	
	Span 0.00/0.00	0.04/0.04			

品保品管組：王根璋 101.5.16

A-26

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980608(附表十八(9602修訂))



附錄 III.1-9 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 5 月石碇宮)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：石碇宮
校正項目：NO_x/NO_2、CO、THC/NMHC、~~TSP、WS、WD、Temp、Hum~~
校正日期：101、5、2　　查核日期：101、5、5
校正人員：范和聰、林友孫　　查核人員：朱順毅

項目	校正濃度	讀值	查核濃度	讀值	備註
1.一氧化氮 NO(ppb) 儀器編號：S/N 03-1143	Zero 0	0	0	1	鋼瓶編號：JA03012
	Span 400/200	400/199	400/200	402/201	氣體濃度：NO：50.3 ppm
2.二氧化硫 SO_2(ppb) 儀器編號：—	Zero				SO_2：50.5 ppm
	Span				CO：5050 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm) 儀器編號：S/N 10301	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	鋼瓶壓力：73 kgf/cm²
	Span 40.2/20.1	40.1/20.3	40.2/20.1	39.5/19.9	
4.臭氧 O_3(ppb) 儀器編號：—	Zero				
	Span				
5.總碳氫化合物 THC(ppm) 儀器編號：S/N 436553800	Zero 0.0	0.1	0.00	0.07	鋼瓶編號：ES0008433
	Span 8.0/4.0	8.0/4.0	8.00/4.00	8.05/4.04	氣體濃度：CH_4：999 ppm
6.甲烷 CH_4(ppm) 儀器編號：S/N 436553800	Zero 0.0	0.1	0.00	0.02	C_3H_8：— ppm
	Span 8.0/4.0	8.0/4.0	8.00/4.00	7.99/3.99	鋼瓶壓力：85 kgf/cm²
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm) 儀器編號：S/N 436553800	Zero 0.0	0.0	0.00	0.05	
	Span 0.0/0.0	0.0/0.0	0.00/0.00	0.06/0.05	

品保品管組：王根璋 101.5.11

A-26

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980608(附表十八(9602修訂))

附錄 III.1-12 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 6 月福隆海水浴場)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

校正項目：NO、CO、CH4

校正日期：101.6.23　　查核日期：101.6.26.

校正人員：林旺福　　查核人員：朱柏設、科友孫

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1.一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	1	0	1	鋼瓶編號：ES0008428
儀器編號：3WYTTM8B8Y	Span 400/200	406/206	400/200	400/206	氣體濃度：NO：47.6 ppm
2.二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero				SO_2：50.2 ppm
儀器編號：	Span				CO：5031 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	鋼瓶壓力：
儀器編號：3WRT8G4PV5	Span 40.6/20.3	40.5/20.5	40.6/20.3	41.5/20.7	113 kgf/cm²
4.臭　氧 O_3(ppb)	Zero				
儀器編號：	Span				
5.總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.07	0.00	0.00	鋼瓶編號：ES0008437
儀器編號：3WSB5KNOT	Span 8.00/4.00	8.06/4.13	8.00/4.00	8.10/4.32	氣體濃度：CH_4：1007 ppm
6.甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.08	0.00	0.00	C_3H_8：— ppm
儀器編號：3WSB5KNOT	Span 8.00/4.00	7.92/4.02	8.00/4.00	8.20/4.12	鋼瓶壓力：
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero 0.00	0.01	0.00	0.00	135 kgf/cm²
儀器編號：3WSB5KNOT	Span 0.00/0.00	0.14/0.11	0.00/0.00	0.20/0.20	

品保品管組：林旺福 101.6.28

RP-03-C-01(記錄表單用11-2開)-930603(附表十八(9602修訂)

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3099 新北市中和區中正路738號5樓之1

附錄 III.1-11 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 6 月貢寮國小)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

校正項目：NO、CO、CH4.

校正日期：101.6.27.　　查核日期：101.6.30

校正人員：郭晏宗、科友孫　　查核人員：鄧景量 林友福

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1.一氧化氮 NO(ppb)	Zero 0	1	0	1	鋼瓶編號：ES0008428
儀器編號：3WYTTM8B8Y	Span 400/200	401/204	400/200	396/199	氣體濃度：NO：49.6 ppm
2.二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero				SO_2：50.2 ppm
儀器編號：	Span				CO：5031 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm)	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	鋼瓶壓力：
儀器編號：3WRT8G4PV5	Span 40.6/20.3	40.7/20.6	40.6/20.3	40.3/20.2	113 kgf/cm²
4.臭　氧 O_3(ppb)	Zero				
儀器編號：	Span				
5.總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero 0.00	0.07	0.00	0.04	鋼瓶編號：ES0008439
儀器編號：3WSB5KNOT	Span 8.00/4.00	8.07/4.10	8.00/4.00	8.05/4.05	氣體濃度：CH_4：100? ppm
6.甲　烷 CH_4(ppm)	Zero 0.00	0.04	0.00	0.01	C_3H_8：— ppm
儀器編號：3WSB5KNOT	Span 8.00/4.00	8.05/4.07	8.00/4.00	7.95/4.03	鋼瓶壓力：
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero 0.00	0.03	0.00	0.03	135 kgf/cm²
儀器編號：3WSB5KNOT	Span 0.00/0.00	0.02/0.03	0.00/0.00	0.10/0.07	

品保品管組：林旺福 101.7.5

RP-03-C-01(記錄表單用11-2開)-930603(附表十八(9602修訂)

附錄 III.1-14 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 6 月石碇宮)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：石碇宮
校正項目：NO、CO、THC/CH4
校正日期：101.6.27　　查核日期：101.6.30
校正人員：鄭景泰　　查核人員：鄭景泰

項目	校正濃度	讀值		查核濃度	讀值		備註
1.一氧化氮 NO(ppb)	Zero	0		0	0		鋼瓶編號：JB03020
儀器編號：3M 432653850002	Span	400	>00	401	>03	400	>00	401	189	氣體濃度：NO：50.9 ppm
2.二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero									SO_2：51.4 ppm
儀器編號：—	Span									CO：4090 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm)	Zero	0.0		0.0		0.0		0.0		鋼瓶壓力：
儀器編號：3M 3847	Span	40.0	>00	40.0	>0.3	40.0	>0.0	40.0	20.4	92 kgf/cm²
4.臭氧 O_3(ppb)	Zero									
儀器編號：—	Span									
5.總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero	0.00		0.07		0.00		0.10		鋼瓶編號：ES0008433
儀器編號：3M 4316553800 1	Span	8.00	4.00	8.04	4.06	8.00	4.00	8.04	4.07	氣體濃度：
6.甲烷 CH_4(ppm)	Zero	0.00		0.04 ~~0.05~~		0.00		0.04		CH_4：999 ppm
儀器編號：3M 4316553800 1	Span	8.00	4.00	8.00	4.03	8.00	4.00	7.97	4.03	C_3H_8：— ppm
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero	0.00		0.03		0.00		0.06		鋼瓶壓力：
儀器編號：3M 4316553800 1	Span	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.07	0.04	83 kgf/cm²

品保品管組：[illegible] 101.7.5

RP-03-C-01(123特安單張11-2版)-950608(附表十八(9607修訂)

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3990 臺北市中正路738號3樓之4

附錄 III.1-13 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 6 月川島養殖池)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：川島養殖池
校正項目：NO、CO、CH4
校正日期：101.6.22　　查核日期：101.6.25
校正人員：鄭景泰　　查核人員：鄭景泰

項目	校正濃度	讀值		查核濃度	讀值		備註
1.一氧化氮 NO(ppb)	Zero	0		1		0		1		鋼瓶編號：JB03020
儀器編號：3M 432653850002	Span	>00	100	>02	101	>00	100	>00	102	氣體濃度：NO：57.4 ppm
2.二氧化硫 SO_2(ppb)	Zero									SO_2：52.7 ppm
儀器編號：—	Span									CO：5090 ppm
3.一氧化碳 CO(ppm)	Zero	0.0		0.0		0.0		0.0		鋼瓶壓力：
儀器編號：3M 3847	Span	0.0	10.0	>0.1	10.1	>00	100	19.8	9.9	98 kgf/cm²
4.臭氧 O_3(ppb)	Zero									
儀器編號：—	Span									
5.總碳氫化合物 THC(ppm)	Zero	0.00		0.00		0.00		0.00		鋼瓶編號：ES0008433
儀器編號：3M 4316553800 1	Span	8.00	4.00	8.04	4.04	8.00	4.00	8.03	4.06	氣體濃度：
6.甲烷 CH_4(ppm)	Zero	0.00		0.00		0.00		0.00		CH_4：999 ppm
儀器編號：3M 4316553800 1	Span	8.00	4.00	8.00	4.01	8.00	4.00	7.96	4.02	C_3H_8：— ppm
7.非甲烷類 C_3H_8(ppm)	Zero	0.00		0.00		0.00		0.00		鋼瓶壓力：
儀器編號：3M 4316553800 1	Span	0.00	0.00	0.04	0.03	0.00	0.00	0.07	0.04	84 kgf/cm²

品保品管組：[illegible] 101.6.28

RP-03-C-01(123特安單張11-2版)-950608(附表十八(9607修訂)

附錄 III.1-16　核四施工環境監測一氧化碳分析儀規格表

項　目	說　明
儀器名稱	一氧化碳分析儀
廠　牌	Dasibi Environmental CORP.　(Dasibi 3008)
規格	・標準認可範圍 Standard Range：0～50ppm (EPA Approved) ・其他有效範圍 Other Ranges Available：0～10ppm，0～1000ppm ・精密度 Precision：± 0.1ppm ・最低偵測極限 Lower Detectable Limit：0.1ppm ・雜訊 Noise(at zero concentration)：　± 0.05ppm ・零點飄移 Zero Drift With Auto Zero：Zero < 0.2ppm/24hr ・全幅飄移 Span Drift：Span ± 1%/24hr Span ± 2%/week ・遲滯時間 Lag Time：2 seconds ・上昇時間 Rise/Fall Time to 98% full Scale：　< 120 seconds (98%) ・操作溫度 Operating Temperature：5～40℃ EPA Temperature：20～30℃ (EPA) ・採氣流速 Flow Rate：1000 cc/min.± 10% ・尺寸 Dimensions：7 in×17 in×20 in (H×W×D) ・重量 Weight：約 16kg
分　析 原　理	本系統的測定原理係利用一氧化碳(CO)吸收紅外光之特性，測定樣品氣體中一氧化碳的濃度。系統因於光源路徑上加裝一組氣體濾鏡(高濃度 CO/N_2)，故稱為氣體過濾相關紅外線法(Gas Filter Correlation Infrared)。 基本原理就是偵測 CO 氣體分子在紅外線(IR)波長約 4.7um 時的吸光度，也就是 CO 分子在這個波長的 IR 光之下會吸收多少 IR 光。在光束離開反應槽進入感測器之前，裝有一個帶通(Band-Pass)過濾器，濾除其它干擾光線。光束最後照射在一種附有電子冷卻器的固態光感測器，當感測器接收到的光線越強，輸出電壓也越高；兩個不同強度的光束被偵測器偵測出其強度變化，光束強度的變化越大，被檢測的 CO 氣體濃度也越高。

附錄 III.1-15 空氣品質監測周界採樣儀器校正監測結果
(101 年 6 月貢寮焚化廠旁之民宅)

附表十八　分析儀校正記錄(1)

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：民宅
校正項目：NO. CO. CH_4
校正日期：101.6.6　　查核日期：101.6.10
校正人員：郭景宗　　查核人員：郭景宗

項　目	校正濃度	讀　值	查核濃度	讀　值	備　註
1. 一氧化氮 NO(ppb) 儀器編號：S/N YTTMBBGY	Zero 0	0	0	1	鋼瓶編號：ES0008408
	Span 400/200	402/206	400/200	405/205	氣體濃度：NO：498 ppm
2. 二氧化硫 SO_2(ppb) 儀器編號：—	Zero				SO_2：502 ppm
	Span				CO：503 ppm
3. 一氧化碳 CO(ppm) 儀器編號：S/N WRTBGPVS	Zero 0.0	0.0	0.0	0.0	鋼瓶壓力：
	Span 40.5/20.3	40.3/20.3	40.5/20.3	41.0/20.7	113 kgf/cm²
4. 臭　氧 O_3(ppb) 儀器編號：—	Zero				
	Span				
5. 總碳氫化合物 THC(ppm) 儀器編號：S/N W5B8KNOT	Zero 0.00	0.00	0.00	0.03	鋼瓶編號：ES0008439
	Span 8.00/4.00	8.03/4.04	8.00/4.00	8.23/4.18	氣體濃度：CH_4：499 ppm
6. 甲　烷 CH_4(ppm) 儀器編號：S/N W5B8KNOT	Zero 0.00	0.00	0.00	0.00	C_3H_8：— ppm
	Span 8.00/4.00	7.96/3.99	8.00/4.00	8.00/4.04	
7. 非甲烷類 C_3H_8(ppm) 儀器編號：S/N W5B8KNOT	Zero 0.00	0.00	0.00	0.03	鋼瓶壓力：
	Span 0.00/0.00	0.07/0.05	0.00/0.00	0.23/0.14	135 kgf/cm²

品保品管組：林俊輝 101.6.14

RP-03-C-01(起造者版第11-2版)-980608附表十八(980623修訂)

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8232

附錄III.1-16 核四施工環境監測一氧化碳分析儀規格表(續1)

項　目	說　　明
儀器名稱	一氧化碳分析儀
廠　牌	Advanced Pollution Instrumentation, Inc.(MODEL 300)
規格	・儀器範圍 Range：1～1000ppm ・精密度Precision：± 0.1% of reading ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.050ppm ・雜訊Noise：zero< 0.025ppm (RMS) span< 0.5% of reading (RMS) ・零點飄移Zero Drift：Zero < 0.1ppm/24hr；Zero < 0.2ppm/7 days ・全幅飄移Span Drift：Span < 1%/24hr Span < 2%/7 days ・遲滯時間Lag Time：10 seconds ・上昇時間Rise/Fall Time to 95% full Scale：< 180 seconds (95%) ・操作溫度Operating Temperature：5～40℃ EPA Temperature：15～35℃ (EPA) ・採氣流速Flow Rate：800 cc/min.± 10% ・尺寸Dimensions：7 in×17 in×27 in (H×W×D) ・重量Weight：約25kg
分　析 原　理	本系統的測定原理係利用一氧化碳(CO)吸收紅外光之特性，測定樣品氣體中一氧化碳的濃度。系統因於光源照射路徑上加裝一組氣體濾鏡(高濃度CO/N2)，故稱為氣體過濾相關紅外線法(Gas Filter Correlation Infrared)。 基本原理就是偵測CO氣體分子在紅外線(IR)波長約4.7um時的吸光度，也就是CO分子在這個波長的IR光之下會吸收多少IR光。在光束離開反應槽進入感測器之前，裝有一個帶通(Band-Pass)過濾器，濾除其它干擾光線。光束最後照射在一種附有電子冷卻器的固態光感測器，當感測器接收到的光線越強，輸出電壓也越高；兩個不同強度的光束被偵測器偵測出其強度變化，光束強度的變化越大，被檢測的CO氣體濃度也越高。

附錄III.1-16 核四施工環境監測一氧化碳分析儀規格表(續2)

項　目	說　　明
儀器名稱	一氧化碳分析儀
廠　牌	HORIBA, Ltd. (HORIBA APMA-370)
規格	・儀器範圍 Range：0~10/20/50/100ppm ・精密度Accuracy of Graduation：± 1 % of full scale ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.05ppm RMS ・零點飄移Zero Drift：Zero <± 1 %/24hr；Zero <± 2 %/7days ・全幅飄移Span Drift：Span <± 2 %/24hr；Span <± 3 %/7days ・反應時間Response Time：60 seconds(0 To 90%) ・操作溫度Working Temperature：5～40℃ ・樣品採氣流速Sample Flow Rate：1.5 L/min.± 10% ・輸出電壓Output Volt：0～1 V ・尺寸External Dimensions：430 mm×550 mm×221 mm (W×D×H) ・重量Weight：約 16 kg
分　析 原　理	本系統的測定原理係利用一氧化碳(CO)吸收紅外光之特性，測定樣品氣體中一氧化碳的濃度。系統因於光源照射路徑上加裝一組氣體濾鏡(高濃度CO/N_2)，故稱為氣體過濾相關紅外線法(Gas Filter Correlation Infrared)。 基本原理就是偵測CO氣體分子在紅外線(IR)波長約4.7um時的吸光度，也就是CO分子在這個波長的IR光之下會吸收多少IR光。在光束離開反應槽進入感測器之前，裝有一個帶通(Band-Pass)過濾器，濾除其它干擾光線。光束最後照射在一種附有電子冷卻器的固態光感測器，當感測器接收到的光線越強，輸出電壓也越高；兩個不同強度的光束被偵測器偵測出其強度變化，光束強度的變化越大，被檢測的CO氣體濃度也越高。

新竹工業區環境檢驗有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9999 新竹市工業區中正路788號5樓之2

附錄III.1-17 核四施工環境監測氮氧化物分析儀規格表

項　目	說　　明
儀器名稱	氮氧化物分析儀
廠　牌	ECOTECH (ML 9841B)
規 格	・儀器範圍 Range：0~0.050 ppm，0～1.0 ppm，0～10 ppm，0～20 ppm 0~0.050 ppm，0～1.0 ppm (EPA designated range) ・精密度Precision：0.5 ppb or 1 % of reading ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.5 ppb or 0.2 % ・雜訊Noise at zero：0.25 ppb or 0.1 % ・零點飄移Zero Drift：Zero < 1 ppb/24hr；Zero < 1 ppb/30days ・全幅飄移Span Drift：Span < 1 %/24hr；Span < 1 %/ 30days ・遲滯時間Lag Time：25 seconds ・上昇時間Rise/Fall Time to 95% of Final Value：＜30 seconds (95%) ・操作溫度Operating Temperature：5～40℃ EPA Temperature：15～35℃ (EPA) ・樣品採氣流速Sample Flow Rate：640 cc/min.± 10% ・臭氧生成器流速Ozone Flow Rate：80 cc/min.± 10% ・尺寸Dimensions：7 in×17 in×27 in (H×W×D) ・重量Weight：26.4 kg
分　析 原　理	本分析儀是利用化學激光法(Chemiluminescence)之原理來測定 NO,NO_2,NOx之濃度。 $NO+O_3 \rightarrow NO_2+O_2+hv$ 當被激發之NO_2分子掉落回較低能量之組態時，同時會放出光子(hv)，而所放出光之強度，乃是與NO濃度成正比者。本分析儀以上述原理方法先行分析樣品中NO濃度，然後以閥門將樣品中之NO_2導入含有高溫鉬元素之轉化器，以將NO_2還原成NO，再以上述原理測定之。故分別可得NO_2、NOx及NO的濃度。

附錄III.1-16 核四施工環境監測一氧化碳分析儀規格表(續3)

項　目	說　　明
儀器名稱	一氧化碳分析儀
廠　牌	Advanced Pollution Instrumentation, Inc.(MODEL 300E)
規 格	・儀器範圍 Range：1～1000ppm ・精密度Precision：± 0.5% of reading ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.04 ppm ・雜訊Noise：zero< 0.02ppm (RMS) span< 0.5% of reading (RMS) ・零點飄移Zero Drift：Zero < 0.1ppm/24hr；Zero < 0.2ppm/7 days ・全幅飄移Span Drift：Span < 0.5%/24hr Span < 1%/7 days ・遲滯時間Lag Time：10 seconds ・上昇時間Rise/Fall Time to 95% full Scale：＜60 seconds (95%) ・操作溫度Operating Temperature：5～40℃ EPA Temperature：10～40℃ (EPA) ・採氣流速Flow Rate：800 cc/min.± 10% ・尺寸Dimensions：7 in×17 in×23.5 in (H×W×D) ・重量Weight：約22.7kg
分　析 原　理	本系統的測定原理係利用一氧化碳(CO)吸收紅外光之特性，測定樣品氣體中一氧化碳的濃度。系統因於光源照射路徑上加裝一組氣體濾鏡(高濃度CO/N_2)，故稱為氣體過濾相關紅外線法(Gas Filter Correlation Infrared)。 基本原理就是偵測CO氣體分子在紅外線(IR)波長約4.7um時的吸光度，也就是CO分子在這個波長的IR光之下會吸收多少IR光。在光束離開反應槽進入感測器之前，裝有一個帶通(Band-Pass)過濾器，濾除其它干擾光線。光束最後照射在一種附有電子冷卻器的固態光感測器，當感測器接收到的光線越強，輸出電壓也越高；兩個不同強度的光束被偵測器偵測出其強度變化，光束強度的變化越大，被檢測的CO氣體濃度也越高。

檢驗報告專用章
電話:(02)7731-3299
新北市中正路738號5樓之1

附錄III.1-17 核四施工環境監測氮氧化物分析儀規格表(續2)

項　目	說　　明
儀器名稱	氮氧化物分析儀
廠　牌	HORIBA, Ltd. (HORIBA APNA-370)
規 格	・儀器範圍 Range：0~100ppb，0～200ppb，0～500ppb，0～1000ppb ・精密度Accuracy of Graduation：± 1 % of full scale ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.5ppb RMS ・零點飄移Zero Drift：Zero <± 1 %/24hr；Zero <± 2 %/7days ・全幅飄移Span Drift：Span <± 1 %/24hr；Span <± 2 %/7days ・反應時間Response Time：120 seconds(0 To 90%) ・操作溫度Working Temperature：5～40℃ ・樣品採氣流速Sample Flow Rate：0.8 L/min.± 10% ・輸出電壓Output Volt：0～1 V，0～10 V，4～20 mA ・尺寸External Dimensions：430 mm×550 mm×221 mm (W×D×H) ・重量Weight：約21 kg
分　析 原　理	本分析儀是利用化學激光法(Chemiluminescence)之原理來測定 NO,NO_2,NOx之濃度。 $NO+O_3 \rightarrow NO_2+O_2+h\nu$ 當被激發之NO_2分子掉落回較低能量之組態時，同時會放出光子(hν)，而所放出光之強度，乃是與NO濃度成正比者。本分析儀以上述原理方法先行分析樣品中NO濃度，然後以閥門將樣品中之NO_2導入含有高溫鉬元素之轉化器，以將NO_2還原成NO，再以上述原理測定之。故分別可得NO_2、NOx及NO的濃度。

附錄III.1-17 核四施工環境監測氮氧化物分析儀規格表(續1)

項　目	說　　明
儀器名稱	氮氧化物分析儀
廠　牌	HORIBA, Ltd. (HORIBA APNA-360)
規 格	・儀器範圍 Range：0~100ppb，0～200ppb，0～500ppb，0～1000ppb ・精密度Accuracy of Graduation：± 1 % of full scale ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.5ppb RMS ・零點飄移Zero Drift：Zero <± 1 %/24hr；Zero <± 2 %/7days ・全幅飄移Span Drift：Span <± 1 %/24hr；Span <± 2 %/7days ・反應時間Response Time：120 seconds(0 To 90%) ・操作溫度Working Temperature：5～40℃ ・樣品採氣流速Sample Flow Rate：0.8 L/min.± 10% ・輸出電壓Output Volt：0～1 V，0～10 V，4～20 mA ・尺寸External Dimensions：430 mm×550 mm×221 mm (W×D×H) ・重量Weight：約26 kg
分　析 原　理	本分析儀是利用化學激光法(Chemiluminescence)之原理來測定 NO,NO_2,NOx之濃度。 $NO+O_3 \rightarrow NO_2+O_2+h\nu$ 當被激發之NO_2分子掉落回較低能量之組態時，同時會放出光子(hν)，而所放出光之強度，乃是與NO濃度成正比者。本分析儀以上述原理方法先行分析樣品中NO濃度，然後以閥門將樣品中之NO_2導入含有高溫鉬元素之轉化器，以將NO_2還原成NO，再以上述原理測定之。故分別可得NO_2、NOx及NO的濃度。

檢驗報告專用章
電話:(02)7731-8239
台北市中正路738號5樓

附錄III.1-19 核四施工環境監測高量採樣器規格表

項 目	說 明
儀器名稱	高量採樣器(Model-120F，120FT，121F，121FT)
廠 牌	KIMOTO ELECTRIC CO.,LTD.(紀本電子工業株式會社)
規格	・流速Flow rate：1.0~1.7 m^3/min (High speed ranges) 0.5~1.1 m^3/min (Low speed ranges) ・流速控制Flow Control：可任意設定流量，有自動控制定速抽引裝置 ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.25 $\mu g/m^3$ ・10 μm 遮蓋裝置(Cyclone)：有10 μm以上之粉塵除去裝置 (121F，121FT) ・濾紙網柵：8 in×10 in SUS製(包括螺絲) ・馬達Pump：整流子馬達宜結雙葉式 ・濾紙尺寸Filter Size：8 in×10 in ・電源Power Supply：交流100~110V/ 60Hz ・尺寸Dimensions：48.3 in× 22.5 in×17.5 in (H×W×D) ・重量Weight：約24公斤 ・Cyclone重量Cyclone Weight：約4公斤
分析原理	高量採樣器之馬達以1.1～1.7 m^3 / min之吸引量高流速取進空氣，經過濾紙後，在空氣中的懸浮微粒積存在濾紙上，由濾紙增加的重量和採樣空氣量，計算空氣中懸浮微粒含量。

附錄III.1-18 核四施工環境監測碳氫化合物分析儀規格表

項 目	說 明
儀器名稱	碳氫化合物分析儀
廠 牌	HORIBA, Ltd. (HORIBA APHA-360)
規格	・儀器範圍 Range：0～5ppmC，0～10ppmC，0～25ppmC，0～50ppmC ・雜訊Noise：± 0.02 ppm ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.05 ppm(0～5ppmC of full scale) ・精密度Accuracy of Graduation：：± 2.0 %m of full scale ・零點飄移Zero Drift：Zero < ± 0.1 ppmC per day or ± 2.0 % of fullscale Zero < ± 0.2 ppmC per week or ± 4.0 % of fullscale ・全幅飄移Span Drift：Span< ± 2.0 % of fullscale value per day Span< ± 4.0 % of fullscale value per week ・反應時間Response Time：60 seconds(0 To 90%) ・採氣流速Flow Rate：約 0.9 L/min. ・輸出電壓Output Volt：0～1 V，0～10 V，4～20 mA ・操作溫度Working Temperature：5～40℃ ・尺寸External Dimensions：430 mm×550 mm×221 mm (W×D×H) ・重量Weight：約 33 kg
分析原理	本儀器原理係根據氫燃燒電離原理(即火焰游離偵測法-FID方法)，由碳氫化合物自動分析儀連續測量空氣中總碳氫化合物濃度、碳氫化合物濃度與非甲烷類碳氫化合物濃度，此乃藉樣品氣體通過無分離效果之空管後進入火焰離子化偵測器（FID）測得，同時廢氣中之甲烷乃藉樣品通過會吸附非甲烷類碳氫化合物之分子篩吸附管後，進入 FID 偵測器測得。將總碳氫化合物(THC) 扣除甲烷(CH_4)後即得非甲烷類碳氫化合物(NMHC)含量(即NMHC濃度值= THC濃度值- CH_4濃度值)其中NMHC的濃度是由THC和CH_4所計算出來，然後輸出濃度電壓訊號，此結果即為空氣中碳氫化合物的濃度。

附錄III.1-20 核四施工環境監測氣體校正儀規格表

項 目	說 明
儀器名稱	稀釋氣體校正儀
廠 牌	Sabio Engineering,Inc.
規格	・正常流速：在正常溫度、壓力下±1% ・滲透管載流氣體流速：100 c.c./min±1 c.c./min ・稀釋比：大致是40：1到2001：1(儀器最小輸出流量4000C.C./min.時) **稀釋氣體Diluent Gas：** ・流量控制器範圍Mass flow controller range：0~10000 c.c./min. (SCCM) ・輸入壓力Input pressure：20~30 psi **來源氣體Source Gas：** ・流量控制器範圍Mass flow controller range：0~100 c.c./min. (SCCM) ・輸入壓力Input pressure：15~30 psi ・流量準確度Flow accuracy：±1% of full scale ・流量再現性Flow repeatability：±0.15% of full scale **臭氧產生器Ozone Generator：** ・輸出範圍Output range：0.05~1.0 ppm at 5 SLPM ・準確度Accuracy：±2% of set point or ±3 ppb at 5 SLPM **紫外線吸收光度計UV Absorption Photometer：** ・臭氧監測範圍Ozone monitoring ranes：100 ppb~20ppm full scale ・精密度Precision：± 1ppb ・最低偵測極限Lower Detectable Limit：0.8ppb ・零點飄移Zero Drift：Zero < 1ppb for 24hr and 30days ・全幅飄移Span Drift：Span < 0.5% for 24hr and 30days ・遲滯時間Lag Time：10 seconds ・上昇時間Rise/Fall Time to 95% full Scale：< 60 seconds(95%) ・尺寸Dimensions：8.75 in×17 in×20 in (H×W×D) ・重量Weight：18.1kg
分析原理	在溫度及流速控制下，利用滲透管(Permeation Tube)，或標準氣體鋼瓶產生高濃度標準氣體，藉由外接的空氣幫浦和過濾系統產生之零氣體進行濃度稀釋，對數種常見污染物提供大範圍的精確稀釋濃度，用以校正儀器，如SO_2、NO_X、CO...等。

附錄III.1-21 核四施工資料蒐集器規格表

項 目	說 明
儀器名稱	CAMPBELL 21X 資料處理器
廠 牌	CAMPBELL SCIENTIFIC,INC.
規格	中央處理單元：HITACHI 6303 CMOS 8 bits微處理機，具有有24個輸入、輸出指令，39個資料運算處理指令及11個程式控制指令。 信號輸出入頻道：單端點類比信號(Single Ended Analog)及數位信號輸入各16個與4個，類比輸出2個，數位控制輸出6個；另可接AM - 32延遲掃瞄器(Relay Scanner)擴充至192 個類比輸入。 掃瞄間期：可依收集器I/O執行時間設定，最快1秒(可調)。 內部資料容量：RAM 48K，分為輸入儲存(Input Storage)、中間儲存(Intermediate Storage)及最後儲存(Final Storage)，前二者應依I/O數量而且變為高解析記憶位址(High Resolution Memory Location, 1 Data Point = 4 bytes)，後者為低解析度記憶位址，其機定 (Default)位址分別28、64及23424個位址(Allocation)。
用途	可處理資料包括最大值、最小值、平均值、頻率分佈、標準偏差算術運算、線性處理、幾何及越超函數 (Transcental)等功能。

附錄III.1-21 核四施工資料蒐集器規格表(續1)

項 目	說 明
儀器名稱	DT12 資料處理器
廠 牌	玖廷企業股份有限公司
規格	DT12 資料處理器主要包含資料處理器主機、P12RB AC/DC兩用電源模組及戶外型防潮箱等。 資料處理器主機：包括8位元運算處理單元及接線面板，運算處理單元主要功能為儲存執行之程式，處理運算接線面板送來之感應器信號，再儲存於128K的記憶體內(另可指定1M或2M容量)。而接線面板則提供12個單端或6個差動端點，3組觸發電壓輸出端點，3個脈衝信號輸入端點，12V DC輸出端點及5V DC輸出端點等。 掃瞄期間：依系統指令、參數之設定而定，從1秒至1440分鐘。 周邊界面：D型9PIN接頭可連接儲存裝置、8digits LCD顯示鍵盤、RS232轉換界面等。 輸出值種類：Sample取樣值、最大值、最小值、平均值、累計值等。 系統工作電源：工作電壓為9.6~16V DC或任何12V DC電池做主電源或並聯多顆12V DC電池作備用電源均可。 防潮箱規格：7 in×15 in×11 in (H×W×D)
用途	可處理資料包括最大值、最小值、平均值、累計值、頻率分佈、標準偏差算術運算、線性處理、幾何及越超函數 (Transcental)等功能並提供記憶資料單元。

附錄III.1-24 核四施工環境監測風速風向計規格表

項 目	說 明
儀器名稱	風速風向計(YOUNG 05103)
廠 牌	R.M. YOUNG COMPANY (Made in U.S.A)
規格	・風速量測範圍 Range：0～60 m/s ・風速精密度Precision：± 3 m/s ・風向量測範圍 Range：0～360° ・風向精密度Precision：± 3° ・電源Power Requirement：12 V DC，5mA ・輸出電壓Output Volt：0～1 V DC， ・全長Overall lenght：21.7 in (55 cm) ・葉片尺寸：直徑7 in (18 cm) ・重量Weight：約 1 kg
用 途	用來量測風速及風向等氣象資料，作為其它環境監測條件之參考。

附錄III.1-25 核四施工環境監測溫溼度計規格表

項 目	說 明
儀器名稱	溫溼度計(ROTRONIC MP101A)
廠 牌	OHAUS CORP. (Made in U.S.A)
規格	・溫度量測範圍 Range：- 40～+ 60 ℃ ・溫度精密度Precision：± 0.3 ℃ ・溼度量測範圍 Range：0～100 % ・溼度精密度Precision：± 1.5 % (10～90%)，± 2.5 % (< 10 % or > 95 %) ・電源Power Requirement：12 V DC，5mA ・輸出電壓Output Volt：0～1 V DC， ・全長Overall lenght：21.7 in (55 cm) ・通風筒為白色塑膠材質且自然通風無需電壓 ・重量Weight：170 g(不含通風筒)
用 途	用來量測風速及風向等氣象資料，作為其它環境監測條件之參考。

附錄III.1-22 核四施工環境監測電子乾燥器規格表

項 目	說 明
儀器名稱	電子乾燥器(MODEL ED-10)
廠 牌	日本長計量製作所株式會社
規格	・外部尺寸：33 in×15 in×16 in (H×W×D) ・電源：AC 100V±10% ・溼度：無段式自動調節
用 途	乾燥冷卻用，一般置放時間24～48小時。

附錄III.1-23 核四施工環境監測電子電動天平規格表


項 目	說 明
儀器名稱	電子電動天平(MODEL:E11140)
廠 牌	OHAUS CORP.
規格	・最大稱重：110g ・最小讀值：0.1mg ・電源：AC 110V±10% 50/60HZ ・外部尺寸：15 in×9 in×14 in (H×W×D)
用途	使用於控制乾溼度之乾燥室內，可稱量任何物品其稱量不得超過110g，物品稱量前最好先置於電子乾燥器內至溼度保持於45%±5%，電子乾燥器內之矽膠需定期更換。


報告編號 Report No.: A-1988　　第2頁含內頁共2頁

一. 校正結果：

NO.	Δt(min)	Vm	ΔP		特校件 ΔH(H₂O)	標準流率 Qstd		√(ΔH[Pa/760][298/(Ta+273)])
		ft³	in-H₂O	mmHg		m³/min	ft³/min	
1	1.162	40	3.0	5.60	3.5	0.965	34.09	1.8690
2	0.904	40	5.0	9.34	5.7	1.235	43.61	2.3851
3	0.758	40	7.0	13.08	8.0	1.466	51.78	2.8257
4	0.670	40	9.0	16.81	10.2	1.650	58.28	3.1906
5	0.601	40	11.0	20.55	12.5	1.830	64.62	3.5321

項 目	迴歸分析參數	
	m³/min(CMM)	ft³/min(CFM)
斜率(m)	1.9260	0.0545
截距(b)	0.0076	0.0076
相關係數(r)	0.9999	0.9999





二. 校正說明：

1. 被校流量計之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。
2. 本校正之執行，首先步驟校校流量計與標準系統之Root Meter，並控制改變Root Meter流量，設定Root Meter標準壓差計高度，等待流率穩定後，以碼表計時通過該設定壓差下採樣40ft³ (1.13m³) 體積之時間，紀錄被校流量計之壓差計水柱高度、環境溫度與壓力，並作5點設定壓差採以換算出通過被校流量計之標準體積流率，以最小平方線性迴歸法得到斜率及截距參數。
3. 特校件壓差計水柱高換算最小平方根公式= $\sqrt{\Delta H \cdot \frac{P_a}{760} \cdot \frac{25+273}{T_a+273}}$

   其中P_a為環境大氣壓力，T_a為環境溫度，ΔH為特校件壓差計內水柱差高度。
4. 流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_{std}}{\Delta t}$　　$V_{std} = V_m \cdot \frac{(P_a - \Delta P)}{760} \cdot \frac{25+273}{(T_a+273)}$

   其中Q_{std}為標準流率，△t為採樣時間，V_{std}為標準狀態下採樣體積，V_m為現場採樣體積。
5. 本校正作業結果數據均回歸至標準狀態，25℃，760 mm-Hg。
6. 本校正結果提供之線性回歸參數X軸為標準流率，Y軸為特校件水柱壓差回歸標準狀況之平方根值。
7. 本校正結果提供兩種流率線性回歸參數，其中斜率值會依流率單位差異而顯示不同結果。

行政院環境保護署 空氣品質監測品質保證實驗室

高雄市鳳山區八德路323號2樓
TEL: (07)7761190
FAX: (07)7769881

高量採樣器孔口流量計校正報告
(CALIBRATION REPORT)

本實驗室隸屬行政院環境保護署環境監測品質認定

報告編號 Report No.: A-1988

本報告第1頁含內頁共2頁
本校正實驗室同意不得以全部複製

Applicant (Add.) 申請單位 (住址)	新紀工程顧問有限公司 新北市中和區中正路738號5樓之4		
Instrument 儀器名稱	孔口流量計		
Manufacturer 製造廠商	TISCH	No. 型號	TE-5025
Calibration Date 校正日期(年月日)	101/01/19	I.D. No. 序號	S/N 0595
Procedure Used 校正程序	空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法標準作業程序/NIEA A102.12A		
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度 24.8℃	Presure 大氣壓力	758.0mm-Hg

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正儀器及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯依據/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/0234672	轉子式氣體流量計/NML/FI10216A	流量	2011/05/20 / 1年
MENSOR/DPG 2400/650507	壓力計/NML/P110112A	壓力	2011/05/16 / 1年
CHINO/DB140BS00-G0A/DN10-JD486	溫度計/NML/T110075A	溫度	2011/05/20 / 1年
MICRONTA/Cat.63-5010/EPA-T01	計時馬錶/NTC/T110075A	時間	2011/5/20 / 1年

TQMC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NML/ROC. The calibration management and technical are in compliance Taiwan EPA.
本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯至國家度量衡標準實驗室，校正管理及技術均符合環保署公告方法(NIEA A102.12A)之要求。

Invalid for separation using.
本報告分離使用無效。

校正人員：吳仲英　　實驗室主管：

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3299 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄 III.1-26 小孔流量計校正(續 2)

行政院環境保護署 Environmental Protection Administration, Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

空氣品質監測品質保證實驗室

高雄市鳳山區八德路323號2樓
TEL: (07)7761190
FAX: (07)7769881

高量採樣器孔口流量計校正報告
(CALIBRATION REPORT)

本實驗室符合行政院環境保護署環境檢驗測定機構認證

報告編號 Report No.: A-1986

本報告第 1 頁合內頁共 2 頁

本校正報告未經本實驗室同意不得摘要複製

Applicant (Add.) 申請單位 (住址)	新紀工程顧問有限公司 新北市中和區中正路738號5F-4		
Instrument 儀器名稱	孔口流量計		
Manufacturer 製造廠商	TISCH	No. 型號	TE-5025
Calibration Date 校正日期(年月日)	101/01/18	I.D. No. 序號	S/N 0596
Procedure Used 校正程序	空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法/標準作業程序/NIEA A102.12A		
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度 22.6℃	Presure 大氣壓力	761.0mm-Hg

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/0234672	井子式氣體流量計/NML/F110216A	流量	2011/05/20 / 1年
MENSOR/DPG 2400/650507	壓力計/NML/P110112A	壓力	2011/05/16 / 1年
CHINO/DB140BS00-G0A/DN104D486	溫度計/NML/T110075A	溫度	2011/05/20 / 1年
MICRONTA/Cat.63-5010/EPA-T01	計時馬錶/NTC/T110075A	時間	2011/5/20 / 1年

TQMC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NML/ROC. The calibration management and technical are in compliance Taiwan EPA.

本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯至國家度量衡標準實驗室，校正管理及技術均符合環保署公告方法(NIEA A102.12A)之要求。

Invalid for separation using.
本報告分離使用無效。

校正人員：吳仲英　　實驗室主管：


附錄 III.1-26 小孔流量計校正(續 3)


報告編號 Report No.: A-1986　　第2頁合內頁共2頁

一. 校正結果：

NO.	Δt(min)	Vm ft³	ΔP in-H₂O	ΔP mmHg	待校件 ΔH(H₂O)	標準流率 Qstd m³/min	標準流率 Qstd ft³/min	√(ΔH[Pa/760][298/(Ta+273)])
1	1.168	40	3.0	5.60	3.3	0.971	34.31	1.8251
2	0.902	40	5.0	9.34	5.5	1.252	44.22	2.3563
3	0.757	40	7.0	13.08	7.8	1.484	52.41	2.8060
4	0.667	40	9.0	16.81	9.9	1.677	59.23	3.1613
5	0.599	40	11.0	20.55	12.2	1.857	65.57	3.5093

項 目	迴歸分析參數	
	m³/min(CMM)	ft³/min(CFM)
斜率(m)	1.9010	0.0538
截距(b)	-0.0217	-0.0217
相關係數(r)	0.9999	0.9999





二. 校正說明：

1. 被校流量計之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。
2. 本校正之執行，首先串聯被校流量計與標準系統之Root Meter，並控制改變Root Meter流量，設定Root Meter標準壓差計高度，等待流率穩定後，以碼表計時通過設定壓差下採樣40ft³ (1.13m³) 體積之時間，紀錄被校流量計之壓差計水柱高度，環境溫度與壓力，並作5點設定壓差採以換算出通過被校流量計之標準體積流率，以最小平方線性迴歸法得到斜率及截距參數。
3. 待校件壓差計水柱高換算最小平方根公式= $\sqrt{\Delta H \cdot \frac{P_a}{760} \cdot \frac{25+273}{T_a+273}}$

   其中P_a為環境大氣壓力，T_a為環境溫度，ΔH為待校件壓差計內水柱差高度。
4. 流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_{std}}{\Delta t}$　$V_{std} = V_m \cdot \frac{(P_a - \Delta P)}{760} \cdot \frac{25+273}{(T_a+273)}$

   其中Q_{std}為標準流率，△t為採樣時間，V_{std}為標準狀態下採樣體積，V_m為現場採樣體積。
5. 本校正作業結果數據均回歸至標準狀態，25℃，760 mm-Hg。
6. 本校正結果提供之線性回歸參數Y軸為標準流率，V軸為待校件水柱壓差回歸標準狀況之平方根值。
7. 本校正結果提供兩種流率線性回歸參數，其中斜率值會依流率單位差異而顯示不同結果。

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2952 新北市中和區中正路738號5樓

附錄 III.1-26 小孔流量計校正(續 4)

行政院環境保護署 Environmental Protection Administration, Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

空氣品質監測品質保證實驗室

高雄市鳳山區八德路323號2樓
TEL. (07)7761190
FAX: (07)7769881

高量採樣器孔口流量計校正報告
(CALIBRATION REPORT)

本實驗室隸屬行政院環境保護署環境監測及資訊處

報告編號 Report No. : A-1987

本報告第1頁合內頁共2頁

本校本實驗室同意不得拷貝複製

Applicant (Add.) 申請單位 (住址)	新紀工程顧問有限公司		
	新北市中和區中正路738號5F-4		
Instrument 儀器名稱	孔口流量計		
Manufacturer 製造廠商	TISCH	No. 型號	TE-5025
Calibration Date 校正日期(年月日)	101/01/18	I.D. No. 序號	S/N 0597
Procedure Used 校正程序	空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法標準作業程序/NIEA A102.12A		
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度 24.5℃	Presure 大氣壓力	761.0mm-Hg

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/0234672	椿子式氣體流量計/NML/F110216A	流量	2011/05/20 / 1年
MENSOR/DPG 2400/650507	壓力計/NML/P110112A	壓力	2011/05/16 / 1年
CHINO/DB140BS00-G0A/DN104D486	溫度計/NML/T110075A	溫度	2011/05/20 / 1年
MICRONTA/Cat.63-5010/EPA-T01	計時馬錶/NTC/T110075A	時間	2011/5/20 / 1年

TQMC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NML/ROC. The calibration management and technical are in compliance Taiwan EPA.
本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯至國家度量衡標準實驗室，校正管理及技術均符合環保署公告方法(NIEA A102.12A)之要求。

Invalid for separation using.
本報告分離使用無效。

校正人員：吳仲英　　實驗室主管：

行政院環境保護署 Environmental Protection Administration, Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

空氣品質監測品質保證實驗室

高雄市鳳山區八德路323號2樓
TEL. (07)7761190
FAX: (07)7769881

高量採樣器孔口流量計校正報告
(CALIBRATION REPORT)

本實驗室隸屬行政院環境保護署環境監測及資訊處

報告編號 Report No. : A-1987

本報告第1頁合內頁共2頁

本校本實驗室同意不得拷貝複製

Applicant (Add.) 申請單位 (住址)	新紀工程顧問有限公司		
	新北市中和區中正路738號5F-4		
Instrument 儀器名稱	孔口流量計		
Manufacturer 製造廠商	TISCH	No. 型號	TE-5025
Calibration Date 校正日期(年月日)	101/01/18	I.D. No. 序號	S/N 0597
Procedure Used 校正程序	空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法標準作業程序/NIEA A102.12A		
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度 24.5℃	Presure 大氣壓力	761.0mm-Hg

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Tracenble/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/0234672	椿子式氣體流量計/NML/F110216A	流量	2011/05/20 / 1年
MENSOR/DPG 2400/650507	壓力計/NML/P110112A	壓力	2011/05/16 / 1年
CHINO/DB140BS00-G0A/DN104D486	溫度計/NML/T110075A	溫度	2011/05/20 / 1年
MICRONTA/Cat.63-5010/EPA-T01	計時馬錶/NTC/T110075A	時間	2011/5/20 / 1年

TQMC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NML/ROC. The calibration management and technical are in compliance Taiwan EPA.
本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯至國家度量衡標準實驗室、校正管理及技術均符合環保署公告方法(NIEA A102.12A)之要求。

Invalid for separation using.
本報告分離使用無效。

校正人員：吳仲英　　實驗室主管：

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7761-9339 高雄中正路738號5樓之4

附錄 III.1-26 小孔流量計校正(續 5)

行政院環境保護署 Environmental Protection Administration, Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

空氣品質監測品質保證實驗室

高雄市鳳山區八德路323號2樓
TEL. (07)7761190
FAX: (07)7769881

高量採樣器孔口流量計校正報告
(CALIBRATION REPORT)

本實驗室隸屬行政院環境保護署環境監測及資訊處

報告編號 Report No. : A-1987

本報告第1頁合內頁共2頁

本校本實驗室同意不得拷貝複製

Applicant (Add.) 申請單位 (住址)	新紀工程顧問有限公司		
	新北市中和區中正路738號5F-4		
Instrument 儀器名稱	孔口流量計		
Manufacturer 製造廠商	TISCH	No. 型號	TE-5025
Calibration Date 校正日期(年月日)	101/01/18	I.D. No. 序號	S/N 0597
Procedure Used 校正程序	空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法標準作業程序/NIEA A102.12A		
Condition of Calibration 校正環境	Temp. 溫度 24.5℃	Presure 大氣壓力	761.0mm-Hg

Standards Employed & Certification Number
校正時使用之標準件校正機構及校正號碼

Manufacture/Model/Serial No. 廠牌/型號/序號	Standards/Traceable/Calibration No. 儀器名稱/追溯機構/追溯號碼	Traceability Parameter 追溯參數	Calibration Date/ Period 校正日期 / 週期
DRESSER/5M175/0234672	椿子式氣體流量計/NML/F110216A	流量	2011/05/20 / 1年
MENSOR/DPG 2400/650507	壓力計/NML/P110112A	壓力	2011/05/16 / 1年
CHINO/DB140BS00-G0A/DN104D486	溫度計/NML/T110075A	溫度	2011/05/20 / 1年
MICRONTA/Cat.63-5010/EPA-T01	計時馬錶/NTC/T110075A	時間	2011/5/20 / 1年

TQMC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform the calibration are traceable to NML/ROC. The calibration management and technical are in compliance Taiwan EPA.
本報告內記載之被校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準件可追溯至國家度量衡標準實驗室，校正管理及技術均符合環保署公告方法(NIEA A102.12A)之要求。

Invalid for separation using.
本報告分離使用無效。

校正人員：吳仲英　　實驗室主管：

附錄 III.1-26 小孔流量計校正(續 6)


報告編號 Report No.: A-1987


第2頁 合計 2 頁 共 2 頁

一. 校正結果：

NO.	Δt(min)	Vm	ΔP		待校件 ΔH(H_2O)	標準流率 Q_{std}		$\sqrt{(\Delta H[Pa/760][298/(Ta+273)])}$
		ft^3	in-H_2O	mmHg		m^3/min	ft^3/min	
1	1.173	40	3.0	5.60	3.4	0.961	33.95	1.8467
2	0.903	40	5.0	9.34	5.7	1.242	43.87	2.3910
3	0.759	40	7.0	13.08	8.0	1.471	51.95	2.8327
4	0.674	40	9.0	16.81	10.2	1.650	58.25	3.1985
5	0.604	40	11.0	20.55	12.5	1.829	64.59	3.5408

項 目	迴歸分析參數	
	m^3/min(CMM)	ft^3/min(CFM)
斜率(m)	1.9571	0.0554
截距(b)	-0.0380	-0.0380
相關係數(r)	0.9999	0.9999





二. 校正說明：

1. 被校流量計之校正係與本實驗室標準系統作直接比較校正。
2. 本校正之執行，首先串聯被校流量計與標準系統之Root Meter，並控制改變Root Meter流量，設定Root Meter標準壓差計高度，等待流率穩定後，以碼表計時通過設定壓差下採樣40ft^3 (1.13m^3) 體積之時間，紀錄被校流量計之壓差計水柱高度、環境溫度與壓力，並作5點設定壓差採以換算出通過被校流量計之標準體積流率，以最小平方線性迴歸法得到斜率及截距參數。
3. 待校件壓差計水柱高換算最小平方根公式= $\sqrt{\Delta H \cdot \frac{P_a}{760} \cdot \frac{25+273}{T_a+273}}$

   其中P_a為環境大氣壓力，T_a為環境溫度，ΔH為待校件壓差計內水柱差高度。
4. 流量計算公式： $Q_{std} = \frac{V_{std}}{\Delta t}$ $V_{std} = V_m \cdot \frac{(P_a - \Delta P)}{760} \cdot \frac{25+273}{(T_a+273)}$

   其中Q_{std}為標準流率，Δt為採樣時間，V_{std}為標準狀態下採樣體積，V_m為現場採樣體積。
5. 本校正作業結果數據均回歸至標準狀態，25℃，760 mm-Hg。
6. 本校正結果提供之線性回歸參數X軸為標準流率，Y軸為待校件水柱壓差回歸標準狀況之平方根值。
7. 本校正結果提供兩種流率線性回歸參數，其中斜率值會依流率單位差異而顯示不同結果。

附錄 III.1-27 高量採樣器校正紀錄

附表三十三　高量採樣器流量校正記錄(1)

高量採樣器編號：PAA-001　　校正日期(年/月/日)：101/04/30


大氣壓力：761 torr(mm-Hg)　溫度：21.5 ℃　電壓：110 V

流量校正器編號：NO.0505 (PAC-003)　流量校正器廠牌型號：TISCH TE-5025

□浮子流量計調整/更換　□電極更換

□管路清洗更換　□碳刷更換 508→0 hr(99/09/29)

□流量控制器調修/更換　■定期校正 167 hr(101/04/30)

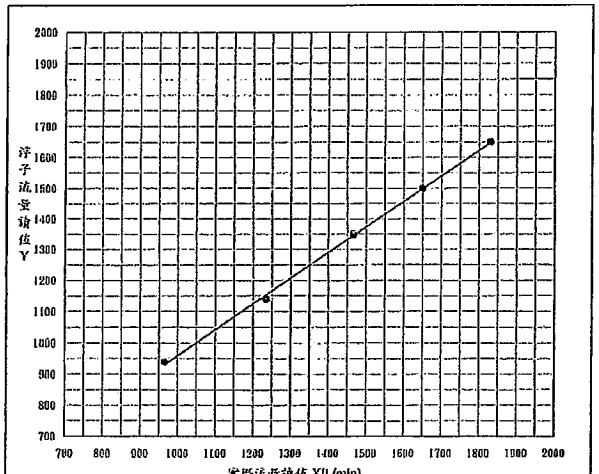


浮子流量讀值 Y	940	1140	1350	1500	1650
實際流量值 X (L/min)	065	1235	1466	1650	1830

斜率m：0.8287　截距b：131.6386　線性回歸R^2：0.9990

符合 -5<QIC<5：■是 □否

校正者：朱恒毅　品保品管組：林恒礽 101.5.2

PAA-001流量校正(101.04.30).xlsx NO.0505附表三十三 960426修正　A-41



附錄 III.1-27 高量採樣器校正紀錄(續 2)

附表三十三　高量採樣器流量校正記錄(1)

高量採樣器編號：PAA-006　　校正日期(年/月/日)：101/06/21


大氣壓力：758 torr(mm-Hg)　溫度：26.2 ℃　電壓：110 V

流量校正器編號：S/N 0597 (PAC-005)　流量校正器廠牌型號：TISCH TE-5025

□浮子流量計調整/更換　□電樞更換 98/11/18

□管路清洗更換　■碳刷更換 451→0 hr(101/06/21)

□流量控制器調修/更換　■定期校正 451→0 hr(101/06/21)

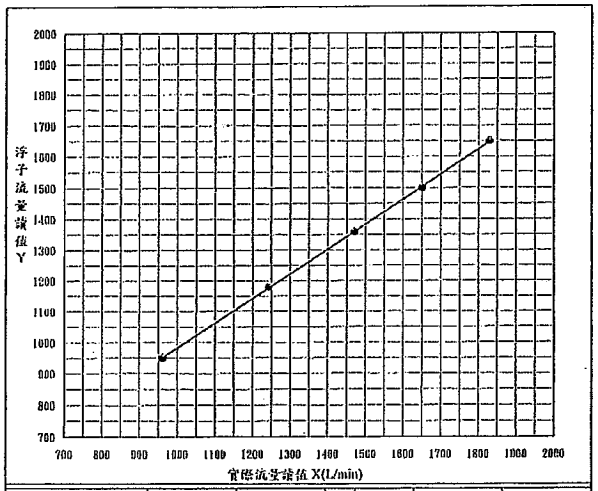

浮子流量讀值 Y	950	1180	1360	1500	1650
實際流量值 X (L/min)	961	1242	1471	1650	1829

斜率m：0.8023　截距b：180.2318　線性回歸R^2：0.9999

符合 -5<%DE<5：■是 □否

校正者：朱振毅　品保品管組：林振禄 101.6.22

PAA-006號氣校正(101.06.21)-derive KO.0597附表三十三960621校正　A-41

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3999 新北市中和區中正路738號5樓之1

附錄 III.1-27 高量採樣器校正紀錄(續 1)

附表三十三　高量採樣器流量校正記錄(1)

高量採樣器編號：PAA-006　　校正日期(年/月/日)：101/03/27


大氣壓力：762 torr(mm-Hg)　溫度：23.4 ℃　電壓：110 V

流量校正器編號：S/N 0597 (PAC-005)　流量校正器廠牌型號：TISCH TE-5025

□浮子流量計調整/更換　□電樞更換 98/11/18

□管路清洗更換　■碳刷更換 519→0 hr(101/03/27)

□流量控制器調修/更換　■定期校正 519→0 hr(101/03/27)

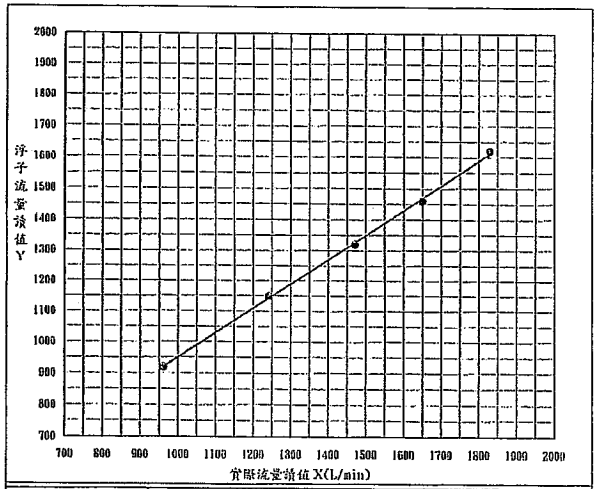

浮子流量讀值 Y	920	1150	1320	1460	1620
實際流量值 X (L/min)	961	1242	1471	1650	1829

斜率m：0.7967　截距b：154.2318　線性回歸R^2：0.9992

符合 -5<%DE<5：■是 □否

校正者：朱振毅　品保品管組：賴振名 101.3.28

PAA-006號氣校正(101.03.27)-derive KO.0597附表三十三960621校正　A-41

附錄 III.1-27 高量採樣器校正紀錄(續 3)

附表三十三　高量採樣器流量校正記錄(1)

高量採樣器編號：PAA-019　　校正日期(年/月/日)：101/04/30


大氣壓力：761 torr(mm-Hg)　溫度：21.5 ℃　電壓：110 V

流量校正器編號：NO.0505 (PAC-003)　流量校正器廠牌型號：TISCH TE-5025

□浮子流量計調整/更換　□電樞更換 98/12/08

□管路清洗更換　□碳刷更換 480→0 hr(101/01/30)

□流量控制器調修/更換　■定期校正 264 hr(101/04/30)

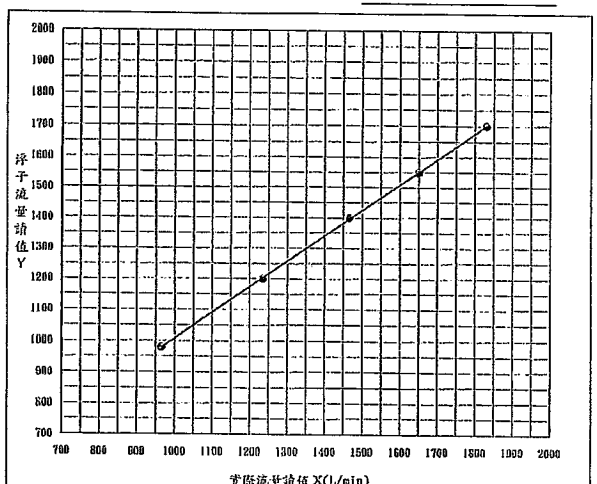

浮子流量讀值 Y	980	1200	1400	1550	1700
實際流量值 X (L/min)	965	1235	1466	1650	1830

斜率m：0.8345　截距b：173.3211　線性回歸R^2：0.9999

符合 -5<%E<5：■是 □否

校正者：朱振毅　品保品管組：[illegible] 101.5.2

PAA-019流量校正-(101.04.30)-drive NO.0505(附表三十三-950626修正　A-41

附錄 III.1-27 高量採樣器校正紀錄(續 4)

附表三十三　高量採樣器流量校正記錄(1)

高量採樣器編號：PAA-024　　校正日期(年/月/日)：101/03/27


大氣壓力：762 torr(mm-Hg)　溫度：23.4 ℃　電壓：110 V

流量校正器編號：S/N 0596 (PAC-094)　流量校正器廠牌型號：TISCH TE-5025

□浮子流量計調整/更換　□電樞更換 100/11/15

□管路清洗更換　■碳刷更換 508→0 hr(101/03/27)

□流量控制器調修/更換　■定期校正 508→0 hr(101/03/27)

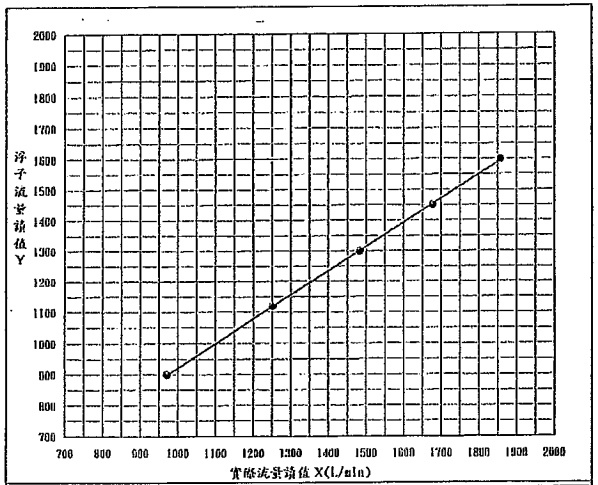

浮子流量讀值 Y	900	1120	1300	1450	1600
實際流量值 X (L/min)	971	1252	1484	1677	1857

斜率m：0.7868　截距b：134.5156　線性回歸R^2：0.9999

符合 -5<%E<5：■是 □否

校正者：朱振毅　品保品管組：賴振名 101.3.28

PAA-024流量校正-(101.03.27)-drive NO.0596(附表三十三-950626修正　A-41

新竹工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 中山區中正路738號5樓之2

附錄 III.1-27 高量採樣器校正紀錄(續 6)

附表三十三　高量採樣器流量校正記錄(1)

高量採樣器編號：PAA-025　　校正日期(年/月/日)：101/05/02


大氣壓力：758 torr(mm-Hg)　溫度：18.8 ℃　電壓：110 V

流量校正器編號：NO.0597 (PAC-005)　流量校正器廠牌型號：TISCH TE-5025

□浮子流量計調整/更換　□電擊更換 (100/08/30)

□管路清洗更換　□碳刷更換 484→0 hr(101/01/16)

□流量控制器調修/更換　■定期校正 145 hr(101/05/02)

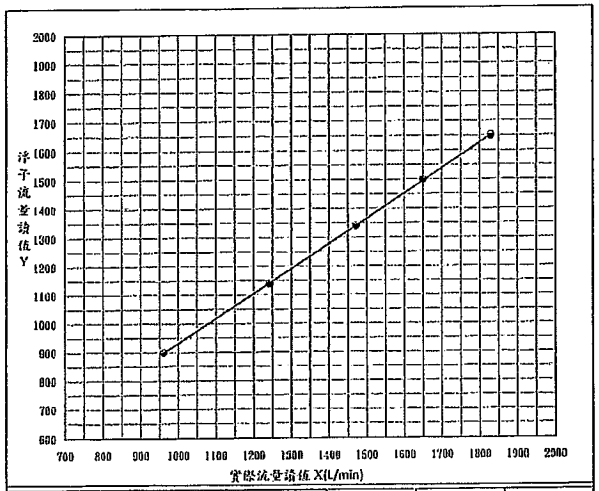

浮子流量讀值 Y	900	1140	1340	1500	1650
實際流量值 X (L/min)	961	1242	1471	1650	1829

斜率m：0.8673　截距b：65.1875　線性回歸R^2：0.9999

符合 -5<%E<5：■是 □否

校正者：朱恆毅　品保品管組：王根福 101.5.3

PAA-025流量校正(101.05.02)-derive(NO.0597)(PAC-005)E31　A-41



附錄 III.1-27 高量採樣器校正紀錄(續 5)

附表三十三　高量採樣器流量校正記錄(1)

高量採樣器編號：PAA-024　　校正日期(年/月/日)：101/06/11


大氣壓力：759 torr(mm-Hg)　溫度：26.2 ℃　電壓：110 V

流量校正器編號：S/N 0596 (PAC-004)　流量校正器廠牌型號：TISCH TE-5025

□浮子流量計調整/更換　□電極更換 100/11/15

□管路清洗更換　■碳刷更換 504→0 hr(101/06/11)

□流量控制器調修/更換　■定期校正 504→0 hr(101/06/11)

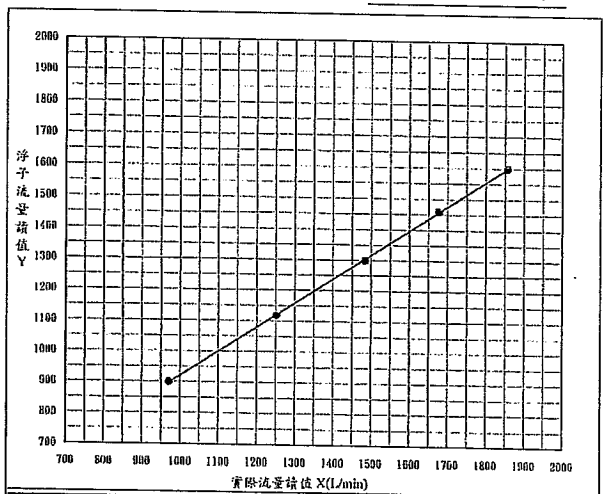

浮子流量讀值 Y	900	1120	1300	1460	1600
實際流量值 X (L/min)	971	1252	1484	1677	1857

斜率m：0.7915　截距b：129.7112　線性回歸R^2：0.9999

符合 -5<%E<5：■是 □否

校正者：朱恆毅　品保品管組：王根福 101.6.13

PAA-024流量校正(101.06.11)-derive(NO.0596)(附表三十三)E31　A-41

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105		測站名稱：貢寮國小
檢查人員：[illegible]		檢查日期：101/4/15
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	Young	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	元17406	元27680-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	□是	□否	□無此項
8. 其它：			

A-20

RP-03-C-01(紀錄表單格11-2版)-980608(附錄十四-5(9610修訂)

新紀工程顧問有限公司 環境監測 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9292 臺北市中正區中正路738號3樓之2

附錄III.1-32 101年核四廠4~6月監測輔助氣象儀器編號對照表

測站名稱	日期	風速風向計	溫濕度計
貢寮國小	101.4.5	17406	27680-010
福隆海水浴場	101.4.27	17406	27680-010
川島養殖池	101.4.2	22311	20133-018
石碇宮	101.4.5	22311	20133-018
貢寮焚化廠旁民宅	101.4.19	17406	27680-010
貢寮國小	101.5.3	17406	27680-010
福隆海水浴場	101.5.24	17406	27680-010
川島養殖池	101.5.5.	58541	18754-011
石碇宮	101.5.2	58541	18754-011
貢寮焚化廠旁民宅	101.5.9	58541	18754-011
貢寮國小	101.6.27	17406	27680-010
福隆海水浴場	101.6.23	17406	27680-010
川島養殖池	101.6.22	22311	20133-018
石碇宮	101.6.27	22311	20133-018
貢寮焚化廠旁民宅	101.6.6	17406	27680-010

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 2)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105 (01)	測站名稱：川堤橋北
檢查人員：朱柏毅	檢查日期：101/4/12

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	SN 22311	SN 20133-018

檢查項目	檢查結果
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是 ☐否 ☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是 ☐否 ☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
8. 其它：	

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗專用章 電話:(02)7731-3232 台北市中正路738號3樓之1

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 1)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105 (01)	測站名稱：福隆海水浴場
檢查人員：陳存正、林友森	檢查日期：101/4/27

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 17406	S/N 20680-010

檢查項目	檢查結果
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是 ☐否 ☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是 ☐否 ☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
8. 其它：	

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 4)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：昆宅
檢查人員：賴振岳		檢查日期：101 / 4 / 19
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	HP-101A
序號：	之19406	之37680-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2類)-980609/附表十四-3(9610修訂)

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗專用章 台中市南屯區中正路1198號5樓之4 電話:(02)7731-9292

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 3)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：石硫宮
檢查人員：賴毅		檢查日期：101 / 4 / 5
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/22311	S/N 30133-018

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2類)-980608/附表十四-3(9610修訂)

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 6)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號: X0106(01)		測站名稱: 楊隆海水浴場
檢查人員: 黃宗豐、賴振谷		檢查日期: 101 / 05 / 24
項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌:	YOUNG	ROTRONIC
型號:	05103	MP-101A
序號:	S/N 17406	S/N 27680-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好?	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常?	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常?	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好?	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確?	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求?	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常?	☑是	□否	□無此項
8. 其它:			

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 5)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號: X0105(01)		測站名稱: 貢寮國小
檢查人員: 溫存正、林友孫		檢查日期: 101 / 5 / 3
項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌:	YOUNG	ROTRONIC
型號:	05103	MP-101A
序號:	S/N 17406	S/N 27680-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好?	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常?	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常?	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好?	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確?	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求?	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常?	☑是	□否	□無此項
8. 其它:			

新竹工程顧問有限公司 環境檢驗室 檢驗用章 電話:(02)7731-8232 中市區中正路738號3樓之2

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 8)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號: X0105 (01)		測站名稱: 石碇宮
檢查人員: 范和聰、林友孫		檢查日期: 101 5 12
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌:	YOUNG	ROTRONIC
型號:	05103	MP101A
序號:	SN 58541	SN 18754-011

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好?	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常?	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常?	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好?	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確?	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求?	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常?	☑是	□否	□無此項
8. 其它:			

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3999 台北市中正路738號7樓之2

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 7)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號: X0105 (01)		測站名稱: 川崎地
檢查人員: 朱翊毅		檢查日期: 101 5 15
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌:	YOUNG	Rotronic
型號:	05103	MP-101A
序號:	SN 58541	SN 18754-011

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好?	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常?	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常?	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好?	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確?	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求?	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常?	☑是	□否	□無此項
8. 其它:			

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 10)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：貢寮國小
檢查人員：林友孫		檢查日期：101/6/27
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 17406	S/N 27680-010

檢查項目	檢查結果
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是 ☐否 ☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是 ☐否 ☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
8. 其它：	

新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-6999 臺北市中正區中正路738號5樓之2

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 9)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：民宅
檢查人員：林友孫		檢查日期：101/5/9
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 58541	S/N 18154-011

檢查項目	檢查結果
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是 ☐否 ☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是 ☐否 ☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
8. 其它：	

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)	測站名稱：[illegible]埔
檢查人員：[illegible]	檢查日期：101 / 6 / 22

項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP101A
序號：	SN 22311	SN 20133-018

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

RP-03-C-01(檢核表單第11-2版)-980608(附表十四-5(9610修訂)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)	測站名稱：福隆海水浴場
檢查人員：[illegible]福	檢查日期：101 / 6 / 23

項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	young	Rotronic
型號：	05103	MP101A
序號：	SN 19406	SN 20680-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

RP-03-C-01(檢核表單第11-2版)-980608(附表十四-5(9610修訂)

新竹工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8292 台北市中正區中正路758號5樓之1

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 14)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：民元
檢查人員：許景富		檢查日期：101/6/16
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 17406	S/N 11680-017

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

新竹工程顧問有限公司 環境檢驗所 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2222 中華民國中正路738號3樓之1

附錄 III.1-33 氣象監測儀檢查表(續 13)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：石碇宮
檢查人員：張明毅		檢查日期：101/6/27
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 22311	S/N 70133-018

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

附錄 III.1-34　空氣品質採樣工作計時器之查對紀錄

環境監測及採樣工作計時器之查對記錄

查對日期	執行期間	117標準報時台（時、分、秒）	工作計時器時間（時、分、秒）	計時器名稱（廠牌、型號）	計時器時間誤差（秒、秒）	查對人員
99.9.2	99.9.2	18:08:00	18:08:00	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-019	±0	朱炳毅
99.9.2	99.9.2	18:09:00	18:09:00	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-006	−2	朱炳毅
99.9.2	99.9.2	18:09:00	18:09:01	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-008	±0	朱炳毅
99.9.2	99.9.2	15:20:00	15:20:02	CAMPBELL 21X SN:09896	+1	朱炳毅
99.9.2	99.9.2	18:20:00	18:20:00	CAMPBELL 21X SN:12031	±0	朱炳毅
99.9.2	99.9.2	18:23:00	18:23:02	錶 DT-12 SN:11343	±0	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:00:00	12:00:01	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-001	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:00:00	12:00:00	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-002	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:02:00	12:02:02	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-003	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:02:00	12:02:01	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-004	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:03:00	12:03:00	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-005	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:03:00	12:03:01	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-006	—	朱炳毅

校正合 99.9.2.

品保品管：[illegible] 100/9/15

D:/DOCC/表格資料/Timer查對TIMER-CAL每月工作

新紀工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
台北市中和區中正路738號5樓之1

附錄 III.1-34　空氣品質採樣工作計時器之查對紀錄(續 1)

環境監測及採樣工作計時器之查對記錄

查對日期	執行期間	117標準報時台（時、分、秒）	工作計時器時間（時、分、秒）	計時器名稱（廠牌、型號）	計時器時間誤差（秒、秒）	查對人員
100.9.1	100.9.1	12:05:00	12:05:02	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-005	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:05:00	12:05:01	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-009	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:06:00	12:06:00	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-015	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:06:00	12:06:01	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-019	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:08:00	12:08:01	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-014	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	12:08:00	12:08:00	OMRON / KUMOTO UL-888 / DAA-025	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	15:05:00	15:05:01	CAMPBELL 21X SN:12030	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	15:07:00	15:07:00	CAMPBELL 21X SN:09896	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	15:09:00	15:09:01	DT-12 SN:11343	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	16:10:00	16:10:02	CAMPBELL CR-10 SN:12306	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	16:11:00	16:11:01	CAMPBELL CR-10 SN:12724	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	16:11:00	16:11:01	CAMPBELL CR-10X SN:12418	—	朱炳毅

品保品管：[illegible] 100/9/15

D:/DOCC/表格資料/Timer查對TIMER CAL每月工作

附錄 III.1-34　空氣品質採樣工作計時器之查對紀錄(續 2)

環境監測及採樣工作計時器之查對記錄

查對日期	執行期間	117標準報時台（時、分、秒）	工作計時器時間（時、分、秒）	計時器名稱（廠牌、型號）	計時器時間誤差（分、秒）	查對人員
100.9.1	1009.1	16:15:00	16:15:02	DT-12 S/N 1100	—	朱炳毅
100.9.1	100.9.1	16:15:00	16:15:00	CAMPBELL CR-10 S/N 13713	—	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:10:00	12:10:02	OMRON / KIMOTO	+1	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:10:00	12:10:00	OMRON / KIMOTO	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:12:00	12:12:02	OMRON / KIMOTO	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:12:00	12:12:02	OMRON / KIMOTO	+1	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:13:00	12:13:00	OMRON / KIMOTO	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:14:00	12:14:02	OMRON / KIMOTO	+1	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:15:00	12:15:03	OMRON / KIMOTO	+1	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:15:00	12:15:01	OMRON / KIMOTO	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:16:00	12:16:02	OMRON / KIMOTO	+2	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:16:00	12:16:01	OMRON / KIMOTO	±0	朱炳毅

品保品管：耳柱穎 1001 9 1 5

D:/QAQC/查核資料/Timer查對/TIMER CAL.每月工作

新綠工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
臺北市中和區中正路738號5樓之4

附錄 III.1-34　空氣品質採樣工作計時器之查對紀錄(續 3)

環境監測及採樣工作計時器之查對記錄

查對日期	執行期間	117標準報時台（時、分、秒）	工作計時器時間（時、分、秒）	計時器名稱（廠牌、型號）	計時器時間誤差（分、秒）	查對人員
100.9.2	100.9.2	12:18:00	12:18:01	OMRON / KIMOTO	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	12:18:00	12:18:01	OMRON / KIMOTO	+1	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:00:00	16:00:01	CAMPBELL 21X S/N 12030	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:02:00	16:02:02	CAMPBELL 21X S/N 9876	+2	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:03:00	16:03:03	DT-12 S/N 1343	+2	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:05:00	16:05:03	CAMPBELL CR-10 S/N 12806	+1	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:07:00	16:07:01	CAMPBELL CR-10 S/N 12714	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:15:00	16:15:01	CAMPBELL CR-10X S/N 13478	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:17:00	16:17:02	DT-12 S/N 100	±0	朱炳毅
100.9.2	100.9.2	16:20:00	16:20:00	CAMPBELL CR-10 S/N 3713	±0	朱炳毅

耳柱穎 100.9.5

品保品管：　/　/

D:/QAQC/查核資料/Timer查對/TIMER CAL.每月工作

附　錄　Ⅲ.2

噪音與振動品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附錄 III.2-1 聲音校正器校正報告(續 1)

校正報告

台灣電子檢驗中心　　工　服NO. 12-03-BAC-515-01

CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN　　Page 2 of 2

1.Sound Pressure Level Check:

Nominal(dB)	Actual(dB)
94.0	94.1

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual(Hz)
1000	1001.7

3. Second Harmonic Distortion Check : 0.60 %

說明:

1.Uncertainty：SPL = 0.3 dB re 20 μPa

Frequency = 5.0×10^{-10}

上述校正能力係以約95 %信賴水準，k=2之擴充不確定度表示。

2.環境管制條件：溫度：(23±2) ℃；相對濕度：(50±10) %R.H.。

3.報告內之建議再校日期為應申請者要求列入。

附3.2-1

附錄 III.2-1 聲音校正器校正報告

☑ 校正實驗室
33383 桃園縣龜山鄉
文明路20巷8號
TEL:+886-3-3280026

財團法人台灣電子檢驗中心

校正報告

CALIBRATION REPORT

☐ 新竹校正實驗室
30075 新竹市科學園區
園區二路47號205室
TEL:+886-3-5798806

工服 NO. 12-03-BAC-515-01　　ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN　　Page 1 of 2

申請者(Applicant): 新紀工程顧問有限公司

地址(Address): 新北市中和區中正路738號5樓之4

供校儀器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Nomenclature	Sound Level Calibrator	製造商: Mfg.	RION
型別: Model No.	NC-74	識別號碼: ID. No.	34251562(NAA-002-07)
校正依據: Cal. Procedure Used	B00-CD-061 1st edition	收件日期: Receipt Date	Mar. 23, 2012
校正資料: Cal. Info.	☑ 僅量測 Cal. Only ☐ 調整 Adjusted	校正日期: Cal. Date	Mar. 28, 2012
實際環境: Real Condition	溫度: Temperature 22 ℃ 相對濕度: Relative Humidity 50 %	建議再校日期: Recommended Recal. Date	Mar. 27, 2013

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱 Nomenclature	廠牌/型號 Mfg. / Model No.	識別號碼 ID. No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Microphone	B&K 4134	13041405-001	2011/08/31	2012/08/30
Pist./Mic. Calibration System	B&K 9604	13044801-001	2011/11/08	2012/05/07
Pistonphone	B&K 4220	13041501-002	2011/06/07	2012/06/06
True RMS Multimeter	FLUKE 87	13043404-002	2011/10/28	2012/04/27

追溯源 CALIBRATION SOURCE

儀器名稱 Nomenclature	校正單位 Cal. Source	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Microphone	N.M.L.	A110254A-256A	2011/11/22	2013/05/21
Pistonphone	N.M.L.	A110270A-271A	2011/11/18	2013/05/17
Rubidium Atomic Frequency Standard	N.M.L.	FTC-2011-04-14	2011/04/28	2012/10/27

ETC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from ETC are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

台灣電子檢驗中心特此證明報告內記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合 ISO/IEC 17025 之規定。

校正地點: 財團法人台灣電子檢驗中心校正實驗室

財團法人台灣電子檢驗中心
ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

實驗室主管 Laboratory Head

報告發署人 Signature

附錄 III.2-1 聲音校正器校正報告(續 2)

☑ 校正實驗室
33383 桃園縣龜山鄉
文明路29巷8號
TEL:+886-3-3280026

財團法人台灣電子檢驗中心

校正報告
CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

☐ 新竹校正實驗室
30075 新竹市科學園區
園區二路47號205室
TEL:+886-3-5798806

工服 NO. 11-05-BAC-392-01
申請者(Applicant): 新紀工程顧問有限公司
地址(Address): 新北市中和區中正路738號5樓之4

供 校 儀 器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Nomenclature	Sound Level Calibrator	製造商: Mfg.	RION
型別: Model No.	NC-74	識別號碼: ID. No.	35105067
校正依據: Cal. Procedure Used	B00-CD-061 1st edition	收件日期: Receipt Date	May. 19, 2011
校正資料: Cal. Info.	☑ 僅量測 Cal. Only ☐ 調整 Adjusted	校正日期: Cal. Date	May. 20, 2011
實際環境: Real Condition	溫度: 23 ℃ Temperature 相對濕度: 53 % Relative Humidity	建議再校日期: Recommended Recal. Date	May. 19, 2012

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱 Nomenclature	廠牌/型號 Mfg. / Model No.	識別號碼 ID. No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Microphone	B&K 4134	13041405-001	2010/09/01	2011/08/31
Pist./Mic. Calibration System	B&K 9604	13044801-001	2011/05/09	2011/11/08
Pistonphone	B&K 4220	13041501-002	2010/06/08	2011/06/07
True RMS Multimeter	FLUKE 87	13043404-002	2011/04/29	2011/10/28

追 溯 源 CALIBRATION SOURCE

儀器名稱 Nomenclature	校正單位 Cal. Source	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Microphone	N.M.L.	C091182-84	2010/09/24	2012/03/23
Pistonphone	N.M.L.	C091185-86	2010/09/24	2012/03/23
Rubidium Atomic Frequency Standard	N.M.L.	FTC-2011-04-14	2011/04/28	2012/10/27

ETC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from ETC are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

台灣電子檢驗中心特此證明報告內記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室，美國標準及技術研究院，或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合 ISO/IEC 17025 之規定。

校正地點: 財團法人台灣電子檢驗中心校正實驗室

財團法人台灣電子檢驗中心
ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

實驗室主管 Laboratory Head

報告簽署人 Signature

附錄 III.2-1 聲音校正器校正報告(續 3)

台灣電子檢驗中心
ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

校正報告
CALIBRATION REPORT

工服NO. 11-05-BAC-392-01

1.Sound Pressure Level Check :

Nominal (dB)	Actual (dB)
94.0	93.9

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual (Hz)
1000	1003.1

3.Second Harmonic Distortion Check : 0.76 %

說明：1.Uncertainty：SPL = 0.3 dB re 20 μPa
Frequency = 5.0×10^{-10}
上述校正能力係以約 95 %信賴區間，k=2 之擴充不確定度表示。
2.環境管制條件：溫度：(23±2) ℃；相對濕度：(50±10) %。
3.報告內之建議再校日期為應申請者要求列入。

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3333 新北市中和區中正路738號5樓之4

附3.2-2

附錄 III.2-1 聲音校正器校正報告(續 4)

☑ 校正實驗室
33383 桃園縣龜山鄉
文明路29巷8號
TEL:+886-3-3280026

財 團 法 人 台 灣 電 子 檢 驗 中 心

校 正 報 告

CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

☐ 新竹校正實驗室
30075 新竹市科學園區
園區二路47號205室
TEL:+886-3-5708806

工報 NO. 12-05-BAC-051-01
申請者(Applicant): 新紀工程顧問有限公司
地址(Address): 新北市中和區中正路738號5樓之4

供 校 儀 器 ITEM CALIBRATED

儀器名稱: Nomenclature	Sound Level Calibrator	製造商: Mfg.	RION
型別: Model No.	NC-74	識別號碼: ID. No.	35105067
校正依據: Cal. Procedure Used	B00-CD-061 1st edition	收件日期: Receipt Date	May. 03, 2012
校正資料: Cal. Info.	☑ 僅量測 Cal. Only ☐ 調整 Adjusted	校正日期: Cal. Date	May. 07, 2012
實際環境: Real Condition	溫度: 23 ℃ Temperature 相對濕度: 50 % Relative Humidity	建議再校日期: Recommended Recal. Date	May. 06, 2013

使用標準器及附配件 STANDARD AND ACCESSORIES USED

儀器名稱 Nomenclature	廠牌/型號 Mfg. / Model No.	識別號碼 ID. No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Microphone	B&K 4134	13041405-001	2011/08/31	2012/08/30
Pist./Mic. Calibration System	B&K 9604	13044801-001	2012/05/07	2012/11/
Pistonphone	B&K 4220	13041501-002	2011/06/07	2012/06/
True RMS Multimeter	FLUKE 87	13043404-002	2012/04/27	2012/10/26

追 溯 源 CALIBRATION SOURCE

儀器名稱 Nomenclature	校正單位 Cal. Source	報告號碼 Cal. Report No.	校正日期 Date Cal.	有效日期 Due Date
Microphone	N.M.L.	A110254A-256A	2011/11/22	2013/05/21
Pistonphone	N.M.L.	A110270A-271A	2011/11/18	2013/05/17
Rubidium Atomic Frequency Standard	N.M.L.	FTC-2011-04-14	2011/04/28	2012/10/27

ETC hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The Standards used to perform this calibration are traceable to NML/ROC, NIST/USA or other countries. The calibration services from ETC are capable of performing services in compliance with the requirements of ISO/IEC 17025.

台灣電子檢驗中心特此證明報告內記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正,用以校正之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室,美國標準及技術研究院, 或其它國家之度量衡國家標準。本中心的校正服務均符合 ISO/IEC 17025 之規定。

校正地點: 財團法人台灣電子檢驗中心校正實驗室

財團法人台灣電子檢驗中心 ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

實 驗 室 主 管 Laboratory Head

報 告 發 署 人 Signature

附錄 III.2-1 聲音校正器校正報告(續 5)

校正報告

台灣電子檢驗中心

CALIBRATION REPORT

ELECTRONICS TESTING CENTER, TAIWAN

工 服NO. 12-05-BAC-051-01

1.Sound Pressure Level Check :

Nominal (dB)	Actual (dB)
94.0	94.0

2.Frequency Check:

Nominal(Hz)	Actual (Hz)
1000	1003.2

3.Second Harmonic Distortion Check : 0.77 %

說明：1.Uncertainty：SPL = 0.3 dB re 20 μPa
Frequency = 5.0×10^{-10}
上述校正能力係以約 95 %信賴區間，k=2 之擴充不確定度表示。
2.環境管制條件：溫度：(23±2) ℃；相對濕度：(50±10) %。
3.報告內之建議再校日期為應申請者要求列入。

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-5239 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄 III.2-3 噪音計檢定報告

MO 0025324

經濟部標準檢驗局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪音計檢定合格證書

一、申　　請　者：新紀工程顧問有限公司
二、地　　址　址：台北縣中和市中正路738號5樓之4
三、規　　格　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌　牌：RION
五、型　　號　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥克風：UC-53A
六、器　　號　號：(一)主　機：00241450
　　：(二)麥克風：311901
七、檢定合格單號碼：M0PA0000001
八、檢　定　日　期：100年 1 月 3 日
九、有　效　期　限：102年 1 月 31 日

中　華　民　國 100 年 1 月 5 日

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9292 台北縣中和市中正路738號5樓之4

附錄III.2-2 各測站噪音振動、風速風向及溫溼度計之儀器編號

測站名稱	日期	噪音計	振動計	風速風向計	溫濕度計
台2省道與102甲縣道交叉口	101.4.19 101.4.22	00451248	00190878	29862	14147-012
鹽寮海濱公園	101.4.19 101.4.22	00241450	00791002	15116	29186-010
福隆街上	101.4.19 101.4.22	00621062	00621651	27169	24341-007
102縣道之新社橋	101.4.2 101.4.5	00451248	00140756	15116	22572-016
過港部落	101.4.2 101.4.5	00240663	00830356	29862	38186-020
台2省道與102甲縣道交叉口	101.5.5 101.5.8	00620162	00621651	58543	14147-012
鹽寮海濱公園	101.5.5 101.5.8	00240663	00830356	46081	29186-010
福隆街上	101.5.5 101.5.8	00241450	00140756	27169	22572-016
102縣道之新社橋	101.5.10 101.5.13	00620162	00830356	62072	22572-016
過港部落	101.5.10 101.5.13	01020281	00140756	58543	14147-012
台2省道與102甲縣道交叉口	101.6.23 101.6.26	01020281	00621651	62072	22572-016
鹽寮海濱公園	101.6.23 101.6.26	00451248	00140756	29862	29186-010
福隆街上	101.6.23 101.6.26	00620162	00830356	27169	24341-007
102縣道之新社橋	101.6.7 101.6.10	00451248	00190878	62072	24341-007
過港部落	101.6.7 101.6.10	01020281	00830356	46081	14147-012

附錄 III.2-3 噪音計檢定報告(續 2)

M0 0027296

經濟部標準檢驗局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪音計檢定合格證書

一、申　　請　者：新紀工程顧問有限公司
二、地　　址：新北市中和區中正路738號5樓之4
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥克風：UC-53A
六、器　　號：(一)主　機：01020281
　　：(二)麥克風：103391
七、檢定合格單號碼：M0PA0000176
八、檢　定　日　期：100 年 6 月 27 日
九、有　效　期　限：102 年 6 月 30 日

中　華　民　國 100 年 6 月 29 日

附錄 III.2-3 噪音計檢定報告(續 1)

M0 0023751

經濟部標準檢驗局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪音計檢定合格證書

一、申　　請　者：新紀工程顧問有限公司
二、地　　址：台北縣中和市中正路738號5樓之4
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥克風：UC-53A
六、器　　號：(一)主　機：00240663
　　：(二)麥克風：306531
七、檢定合格單號碼：M0PA9900274
八、檢　定　日　期：99 年 8 月 17 日
九、有　效　期　限：101 年 8 月 31 日

中　華　民　國 99 年 8 月 23 日

新紀工程顧問有限公司 新北市中和區中正路738號5樓之4 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3282

附錄 III.2-3 噪音計檢定報告(續 3)

MO 0027662

經濟部標準檢驗局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪音計檢定合格證書

一、申　　請　者：新紀工程顧問有限公司
二、地　　址：新北市中和區中正路738號5樓之4
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥克風：UC-53A
六、器　　號：(一)主　機：00451248
　　：(二)麥克風：311856
七、檢定合格單號碼：M0PA0000226
八、檢　定　日　期：100 年 7 月 26 日
九、有　效　期　限：102 年 7 月 31 日

中　華　民　國 100 年 7 月 27 日



附錄 III.2-3 噪音計檢定報告(續 4)

MO 0027297

經濟部標準檢驗局
THE BUREAU OF STANDARDS, METROLOGY AND INSPECTION
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

噪音計檢定合格證書

一、申　　請　者：新紀工程顧問有限公司
二、地　　址：新北市中和區中正路738號5樓之4
三、規　　格：CNS 7129 1型
四、廠　　牌：RION
五、型　　號：(一)主　機：NL-32
　　：(二)麥克風：UC-53A
六、器　　號：(一)主　機：00620162
　　：(二)麥克風：102858
七、檢定合格單號碼：M0PA0000177
八、檢　定　日　期：100 年 6 月 27 日
九、有　效　期　限：102 年 6 月 30 日

中　華　民　國 100 年 6 月 29 日

附錄 III.2-4 風速風向校正報告(續 1)

報告編號: W9903049　　第二頁共三頁

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 新紀工程顧問有限公司

地　址: 台北縣中和市中正路738號5F之4　　收件日期: 99年3月3日

電　話: (02)-77313232　　校正日期: 99年3月4日

校正程序: 中央氣象局風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)

校正環境: 測風儀校正實驗室　溫度26.4~28.1℃　相對濕度69.1~74.3%

校正儀器: 中央氣象局　測風儀校正系統

校　正　項　目　與　結　果

風　速　部　分

標準件標準值 (m/s)	被校件指示平均值 (m/s)	器差 (指示值-標準值) (m/s)	器差 (%)	擴充不確定度 k=2.04 (95% 信賴水準) (m/s)	(%)
5.01	4.97	− 0.04	− 0.80	± 0.25	± 5.00
10.01	10.04	+ 0.03	+ 0.30	± 0.16	± 1.60
19.99	20.28	+ 0.29	+ 1.45	± 0.29	± 1.46
30.00	30.56	+ 0.56	+ 1.87	± 0.44	± 1.47

風　向　部　分　(單位：度)

標準值	5.0	45.0	90.0	135.0	180.0
指示平均值	6.5	47.3	91.3	135.0	180.6
器差	+ 1.5	+ 2.3	+ 1.3	+ 0.0	+ 0.6
標準值	225.0	270.0	315.0	355.0	360.0
指示平均值	225.7	270.1	315.0	354.6	-------
器差	+ 0.7	+ 0.1	+ 0.0	- 0.4	-------

校正　　審核　　簽署

技士陳明欽　　課長葉瑞元　　課長葉瑞元

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9239 台北縣中和市中正路738號5樓之4

附錄 III.2-4 風速風向校正報告

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau

校正報告

台北縣新店市莒光路29號　電話:(02)22122251　傳真:(02)22122254

報告日期: 99年3月4日
報告編號: W9903049

儀器名稱: 風向風速計
廠牌型號: Young - CAT. NO.05103
儀器序號: 29862
送校單位: 新紀工程顧問有限公司

使　用　說　明

一、本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。

三、為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

副主任廖述宏

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau

校正報告

新北市新店區莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

報告日期: 100年7月25日
報告編號: W100318

儀器名稱:風向風速計

廠牌型號:Young CAT. NO.05103

儀器序號:46081

送校單位:新紀工程顧問有限公司

使 用 說 明

一、 本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、 上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。

三、 為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

副主任廖建宏

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之2

報告編號: W9903049

校 正 說 明

一、 校正方法:

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由本實驗室VAISALA QLI50 Sensor Collector (sn.R381059)量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次一分鐘平均值，計算器差及不確定度。
2. 風向校正係將待校風向感應器置於風向轉盤，調整被校風向感應器(風標)指向各風向校正點，分別記錄風向轉盤指示度(標準值)及被校件風向指示值，比較被校件指示值與風向轉盤標準值，求得器差。本校正僅顯示被校件風向感應器(風標)線性偏離誤差程度，儀器實際運用時風向誤差則與安裝架設有關，請送校單位注意。儀器收存風標拆裝若無法準確回復原始定位時，請勿任意拆卸風標否則本風向校正失效。
3. 被校件轉換方程式:
   WS(m/s)=o/pF(Hz)＊0.098
   WD(度)=o/pV(V)＊27.473 EXC=12.922V

二、 系統不確定度:

本實驗室系統不確定度為：風速10 m/s以下，不確定度為4.65% ，風速10 m/s(含)以上，不確定度為1.37% ；信賴水準95% ，涵蓋因子 k=2.04；有效自由度ν=33。

三、 校正標準件及參考資料:

1. 校正標準件：DRUCK DPI 150 sn.2021818
2. 國家度量衡標準實驗室校正報告：98/5/21 (C980471)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)
4. 風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)
5. 氣象儀器校正技術規範(09089790040)

附錄 III.2-4 風速風向校正報告(續 4)

報告編號：WI00318　　第二頁共三頁

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位：新紀工程顧問有限公司

地　址：新北市中和區中正路738號5F-4　　收件日期：100年7月21日

電　話：(02)-77313232　　校正日期：100年7月22日

校正程序：中央氣象局風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)

校正環境：測風儀校正實驗室　溫度34.2～35.3℃　相對溫度55.9～60.7%

校正儀器：中央氣象局　測風儀校正系統

校　正　項　目　與　結　果

風　速　部　分　(單位：m/s)

標準件標準值	被校件指示平均值	器差(指示值-標準值)	擴充不確定度
5.01	5.00	－ 0.01	0.11
10.01	10.13	＋ 0.12	0.21
20.01	20.41	＋ 0.40	0.21
30.01	30.81	＋ 0.80	0.21

風　向　部　分　(單位：度)

標準值	5	45	90	135	180
指示平均值	4.3	43.4	89.3	133.5	177.8
器差	－ 0.7	－ 1.6	－ 0.7	－ 1.5	－ 2.2
標準值	225	270	315	355	360
指示平均值	222.5	267.7	312.6	353.3	------
器差	－ 2.5	－ 2.3	－ 2.4	－ 1.7	------

校正　　審核　　簽署

技士陳明欽　　[illegible]瑞元　　[illegible]瑞元

附錄 III.2-4 風速風向校正報告(續 5)

報告編號：WI00318　　第三頁共三頁

校　正　說　明

一、校正方法：

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由本實驗室VAISALA QLI50 Sensor Collector (sn.R381059)量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次一分鐘平均值，計算器差及不確定度。
2. 風向校正係將待校風向感應器置於風向轉盤，調整被校風向感應器(風標)指向各風向校正點，分別記錄風向轉盤指示度(標準值)及被校件風向指示值，比較被校件指示值與風向轉盤標準值，求得器差。本校正僅顯示被校件風向感應器(風標)線性偏離誤差程度，儀器實際運用時風向誤差則與安裝架設有關，請送校單位注意。儀器收存風標拆裝若無法準確回復原始定位時，請勿任意拆卸風標否則本風向校正失效。
3. 被校件轉換方程式：
   WS(m/s)=o/pF(Hz)＊0.098
   WD(度)=o/pV(V)＊72.813　EXC=4.876V

二、擴充不確定度：

擴充不確定度 $U = k \times u_c$

u_c：組合標準不確定度。

k　：涵蓋因子，於 95% 信賴水準涵蓋因子約等於 2。

三、校正標準件及參考資料：

1. 校正標準件：YOKOGAWA　MT210　sn.91H615309
2. 國家度量衡標準實驗室校正報告：99/12/31 (C991616)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)
4. 風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)
5. 氣象儀器校正技術規範(09089790040)
6. 校正標準件校正週期為1年。

新紀工程顧問有限公司 校驗報告專用章 電話:(02)77313232 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄 III.2-4 風速風向校正報告(續 6)

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau

校正報告

台北縣新店市莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

報告日期：99年3月26日
報告編號：W9903084

儀器名稱：風向風速計
廠牌型號：Young CAT. NO.05103
儀器序號：62072
送校單位：新紀工程顧問有限公司

使 用 說 明

一、本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。

二、上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。

三、為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

附錄 III.2-4 風速風向校正報告(續 7)

報告編號：W9903084　　第二頁共三頁

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位：新紀工程顧問有限公司

地　址：台北縣中和市中正路738號5F之4　　收件日期：99年3月25日

電　話：(02)-77313232　　校正日期：99年3月26日

校正程序：中央氣象局風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)

校正環境：測風儀校正實驗室　溫度14.7～16.2℃　相對濕度62.6～67.0%

校正儀器：中央氣象局　測風儀校正系統

校 正 項 目 與 結 果

風　速　部　分

標準件標準值 (m／s)	被校件指示平均值 (m／s)	器差 (指示值-標準值) (m／s)	器差 (指示值-標準值) (%)	擴充不確定度 k=2.04 (95% 信賴水準) (m／s)	擴充不確定度 k=2.04 (95% 信賴水準) (%)
5.00	4.96	－ 0.04	－ 0.80	± 0.26	± 5.20
10.00	10.04	＋ 0.04	＋ 0.40	± 0.16	± 1.60
20.00	20.32	＋ 0.32	＋ 1.60	± 0.30	± 1.50
30.00	30.62	＋ 0.62	＋ 2.07	± 0.43	± 1.44

風向部分					(單位：度)
標準值	5.0	45.0	90.0	135.0	180.0
指示平均值	5.5	45.5	89.9	133.0	177.8
器差	＋0.5	＋0.5	－0.1	－2.0	－2.2
標準值	225.0	270.0	315.0	355.0	360.0
指示平均值	222.5	267.7	313.2	352.9	--------
器差	－2.5	－2.3	－1.8	－2.1	--------

校正　　審核　　簽署

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 台北縣中和市中正路738號5樓之4

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心
Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau
台北縣新店市莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

校正報告

報告日期: 99年10月27日
報告編號: W9910448

儀器名稱: 風向風速計
廠牌型號: Young CAT. NO.05103
儀器序號: 15116
送校單位: 新紀工程顧問有限公司

使 用 說 明

一、 本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。
二、 上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。
三、 為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管
副主任詹連宏

報告編號: W9903084

校 正 說 明

一、 校正方法:
1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由本實驗室VAISALA QLI50 Sensor Collector (sn.R381059)量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次一分鐘平均值，計算器差及不確定度。
2. 風向校正係將待校風向感應器置於風向轉盤，調整被校風向感應器(風標)指向各風向校正點，分別記錄風向轉盤指示度(標準值)及被校件風向指示值，比較被校件指示值與風向轉盤標準值，求得器差。本校正僅顯示被校件風向感應器(風標)線性偏離誤差程度，儀器實際運用時風向誤差則與安裝架設有關，請送校單位注意。儀器收存風標拆裝若無法準確回復原始定位時，請勿任意拆卸風標否則本風向校正失效。
3. 被校件轉換方程式:
WS(m/s)=o/pF(Hz)＊0.098
WD(度)=o/pV(V)＊27.449 EXC=12.933V

二、 系統不確定度:
本實驗室系統不確定度為：風速10 m/s以下，不確定度為4.65% ，風速10 m/s(含)以上，不確定度為1.37% ；信賴水準95% ，涵蓋因子 k=2.04；有效自由度 ν=33。

三、 校正標準件及參考資料:
1. 校正標準件：DRUCK DPI 150 sn.2021818
2. 國家度量衡標準實驗室校正報告：98/5/21 (C980471)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)
4. 風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)
5. 氣象儀器校正技術規範(09089790040)

報告編號：W9910448　　第二頁共三頁

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位：新紀工程顧問有限公司

地　址：台北縣中和市中正路738號5F之4　　收件日期：99年10月26日

電　話：(02)-77313232　　校正日期：99年10月27日

校正程序：中央氣象局風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)

校正環境：測風儀校正實驗室　溫度17.3～20.3℃　相對溫度78.7～91.3%

校正儀器：中央氣象局　測風儀校正系統

校　正　項　目　與　結　果

風　速　部　分

標準件標準值 (m/s)	被校件指示平均值 (m/s)	器差(指示值-標準值) (m/s)	器差(指示值-標準值) (%)	擴充不確定度 k=2.07 (95% 信賴水準) (m/s)	擴充不確定度 k=2.07 (95% 信賴水準) (%)
5.00	5.00	+ 0.00	+ 0.00	± 0.13	± 2.60
10.00	10.09	+ 0.09	+ 0.90	± 0.10	± 1.00
19.99	20.34	+ 0.35	+ 1.75	± 0.17	± 0.86
30.00	30.72	+ 0.72	+ 2.40	± 0.26	± 0.87

風　向　部　分　(單位：度)

標準值	5.0	45.0	90.0	135.0	180.0
指示平均值	5.6	46.0	91.0	135.2	180.4
器差	+ 0.6	+ 1.0	+ 1.0	+ 0.2	+ 0.4
標準值	225.0	270.0	315.0	355.0	360.0
指示平均值	224.8	270.3	314.6	354.6	--------
器差	- 0.2	+ 0.3	- 0.4	- 0.4	--------

校正　技士陳明欽　　審核　課長葉瑞元　　簽署　課長葉瑞元

報告編號：W9910448　　第三頁共三頁

校　正　說　明

一、校正方法：

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由本實驗室VAISALA QLI50 Sensor Collector (sn.R381059)量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次一分鐘平均值，計算器差及不確定度。
2. 風向校正係將待校風向感應器置於風向轉盤，調整風向轉盤使被校件指示值為 0 度，以此為相對定點，再調整風向轉盤測試其他風向值，比較被校件指示值與風向轉盤標準值，求得器差。本校正僅顯示被校件風向線性偏離誤差程度，儀器實際運用時風向誤差則與安裝架設有關，請送校單位注意。儀器收存風標拆裝若無法準確回復原始定位時，請勿任意拆卸風標否則本風向校正失效。
3. 被校件轉換方程式：
   WS(m/s)=o/pF(Hz)＊0.098
   WD(度)=o/pV(V)＊72.875　EXC=4.871V

二、系統不確定度：

本實驗室系統不確定度為：風速10 m/s以下，不確定度為2.06% ，風速10 m/s(含)以上，不確定度為0.74% ；信賴水準95% ，涵蓋因子 k=2.07；有效自由度ν=24。

三、校正標準件及參考資料：

1. 校正標準件：YOKOGAWA MT210 sn.91MG15309
2. 國家度量衡標準實驗室校正報告：98/12/16 (C981578)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)
4. 風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)
5. 氣象儀器校正技術規範(09089790040)
6. 校正標準件追溯校正有效期限1年。

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄 III.2-4 風速風向校正報告(續 12)

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心

Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau

校正報告

台北縣新店市莒光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

報告日期: 99年10月27日
報告編號: W9910449

儀器名稱: 風向風速計
廠牌型號: Young CAT NO.05103
儀器序號: 58543
送校單位: 新紀工程顧問有限公司

使用說明

一、本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。
二、上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。
三、為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管

副主任廖謙宏

附錄 III.2-4 風速風向校正報告(續 13)

報告編號: W9910449　　第二頁共三頁

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位: 新紀工程顧問有限公司

地　址: 台北縣中和市中正路738號5F之4　　收件日期: 99年10月26日

電　話: (02)-77313232　　校正日期: 99年10月27日

校正程序: 中央氣象局風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)

校正環境: 測風儀校正實驗室　溫度17.0～19.6℃　相對濕度82.4～89.8%

校正儀器: 中央氣象局　測風儀校正系統

校正項目與結果

風速部分

標準件標準值 (m/s)	被校件指示平均值 (m/s)	器差 (指示值-標準值) (m/s)	器差 (指示值-標準值) (%)	擴充不確定度 k=2.07 (95% 信賴水準) (m/s)	擴充不確定度 k=2.07 (95% 信賴水準) (%)
5.00	4.95	− 0.05	− 1.00	± 0.13	± 2.60
10.00	9.99	− 0.01	− 0.10	± 0.10	± 1.00
20.00	20.14	+ 0.14	+ 0.70	± 0.18	± 0.90
30.00	30.32	+ 0.32	+ 1.07	± 0.25	± 0.84

風向部分 (單位：度)

標準值	5.0	45.0	90.0	135.0	180.0
指示平均值	5.7	44.5	88.3	133.6	177.6
器差	+ 0.7	- 0.5	- 1.7	- 1.4	- 2.4
標準值	225.0	270.0	315.0	355.0	360.0
指示平均值	222.8	267.5	313.1	353.3	-------
器差	- 2.2	- 2.5	- 1.9	- 1.7	-------

校正　　審核　　簽署

校士陳明欽　　課長葉瑞元　　課長葉瑞元

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 台北市中正路738號5樓之4 電話:(02)7731-3232

交通部中央氣象局氣象儀器檢校中心
Meteorological Instruments Center
Central Weather Bureau
新北市新店區北光路29號 電話:(02)22122251 傳真:(02)22122254

校正報告

報告日期: 101年2月1日
報告編號: W101053

儀器名稱: 風向風速計
廠牌型號: Young CAT. NO. 05103
儀器序號: 27169
送校單位: 新紀工程顧問有限公司

使 用 說 明

一、 本報告校正數據為實驗室環境下執行校正所得結果。往後量測儀器之準確度，則依使用時之小心程度及使用頻率而定。
二、 上項量測儀器經本實驗室校正，結果如后。本報告含附頁共三頁分離使用無效。
三、 為確保量測儀器之準確，請送校單位依儀器使用狀況訂定適當校正週期按時送校。

實驗室主管
副主任廖建宏

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3999 新北市中和區中正路738號5樓之4

報告編號: W9910449 第三頁共三頁

校 正 說 明

一、 校正方法:
1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由本實驗室VAISALA QLI50 Sensor Collector (sn.R381059)量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次一分鐘平均值，計算器差及不確定度。
2. 風向校正係將待校風向感應器置於風向轉盤，調整風向轉盤使被校件指示值為 0 度，以此為相對定點，再調整風向轉盤測試其他風向值，比較被校件指示值與風向轉盤標準值，求得器差。本校正僅顯示被校件風向線性偏離誤差程度，儀器實際運用時風向誤差則與安裝架設有關，請送校單位注意。儀器收存風標拆裝若無法準確回復原始定位時，請勿任意拆卸風標否則本風向校正失效。
3. 被校件轉換方程式:
WS(m/s)=o/pF(Hz)＊0.098
WD(度)=o/pV(V)＊72.849 EXC=4.873V

二、 系統不確定度:
本實驗室系統不確定度為：風速10 m/s以下，不確定度為2.06% ，風速10 m/s(含)以上，不確定度為0.74% ；信賴水準95% ，涵蓋因子 k=2.07；有效自由度ν=24。

三、 校正標準件及參考資料:
1. 校正標準件：YOKOGAWA MT210 sn.91H615309
2. 國家度量衡標準實驗室校正報告：98/12/16 (C981578)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)
4. 風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)
5. 氣象儀器校正技術規範(09089790040)
6. 校正標準件追溯校正有效期限1年。

報告編號：WI01053　　第二頁共三頁

交通部中央氣象局氣象儀器校正報告

送校單位：新紀工程顧問有限公司

地　址：新北市中和區中正路738號5F-4　　收件日期：101年1月31日

電　話：(02)-77313232　　校正日期：101年2月1日

校正程序：中央氣象局風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)

校正環境：測風儀校正實驗室　溫度16.3～17.5℃　相對濕度88.5～91.5%

校正儀器：中央氣象局　測風儀校正系統

校　正　項　目　與　結　果

風　速　部　分　(單位：m/s)

標準件標準值	被校件指示平均值	器差（指示值-標準值）	擴充不確定度
5.01	4.99	－ 0.02	0.11
10.00	10.00	＋ 0.09	0.20
20.04	20.37	＋ 0.33	0.21
30.01	30.67	＋ 0.66	0.20

風　向　部　分　(單位：度)

標準值	10	45	90	135	180
指示平均值	10.3	45.4	90.7	134.4	177.6
器差	＋0.3	＋0.4	＋0.7	－0.6	－2.4
標準值	225	270	315	350	360
指示平均值	221.2	264.8	309.5	345.1	------
器差	－3.8	－5.2	－5.5	－4.9	------

校正　技士陳明欽　　審核　課長葉瑞元　　簽署　經理葉瑞元

報告編號：WI01053　　第三頁共三頁

校　正　說　明

一、校正方法：

1. 本風速校正係將被校件安裝於風洞測試區，以皮托管量測測試區流體動壓換算為風速標準值；被校件指示值由本實驗室VAISALA　QLI50　Sensor　Collector (sn.R381059)量測被校件輸出信號計算而得，標準值與指示值各記錄五次一分鐘平均值，計算器差及不確定度。
2. 風向校正係將待校風向感應器置於風向轉盤，調整被校風向感應器(風標)指向各風向校正點，分別記錄風向轉盤指示度(標準值)及被校件風向指示值，比較被校件指示值與風向轉盤標準值，求得器差。本校正僅顯示被校件風向感應器(風標)線性偏離誤差程度，儀器實際運用時風向誤差則與安裝架設有關，請送校單位注意。儀器收存風標拆裝若無法準確回復原始定位時，請勿任意拆卸風標否則本風向校正失效。
3. 被校件轉換方程式：
   WS(m/s)=o/pF(Hz)＊0.098
   WD(度)=o/pV(V)＊72.744　EXC＝4.880V

二、擴充不確定度：

擴充不確定度 $U = k \times u_c$

u_c：組合標準不確定度。

k　：涵蓋因子，於 95% 信賴水準涵蓋因子約等於 2。

三、校正標準件及參考資料：

1. 校正標準件：YOKOGAWA　MT210　sn.91L537938
2. 國家度量衡標準實驗室校正報告：100/6/16 (P110139A)
3. 測風儀校正實驗室風洞系統評估報告(MIC-W01-01)
4. 風向風速儀器校正程序(MIC-W02-01)
5. 氣象儀器校正技術規範(09089790040)
6. 校正標準件校正週期為1年。

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範(101 年 5 月台 2 省道與 102 甲縣道交叉口)(續 1)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口

校正人員：[illegible]　校正日期：101.5.5 / 101.5.8

☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SN00620162

☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN34251562

內部電子式查核頻率：(1000) Hz

測量前內部電子式查核(dB)C		測量後內部電子式查核(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000) Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	93.9	94.1	93.8

聲音校正器校正日期：16.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-52A　序號：SN00621651

☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SNU1121606194

量測前內部電子式查核(dB)		量測後內部電子式查核(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	96.8	97.1	96.8

取樣時距/次數：☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：

品保品管：[illegible] 101.5.15

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表二十二(9708修訂)

新航工程顧問有限公司 環境檢驗測定中心 檢驗用章 電話:(02)7731-3239 臺中市中正路738號5樓之4

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範(101 年 4 月台 2 省道與 102 甲縣道交叉口)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口

校正人員：[illegible]　校正日期：101.4.19 / 101.4.22

☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SN00451248

☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN34251562

內部電子式查核頻率：(1000) Hz

測量前內部電子式查核(dB)C		測量後內部電子式查核(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000) Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	94 ~~94~~ 94.1	94.1	94 ~~93.9~~

聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-52A　序號：SN00190878

☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SNU1121606194

量測前內部電子式查核(dB)		量測後內部電子式查核(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	97.0	97.1	97.0

取樣時距/次數：☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：

品保品管：[illegible] 101.4.27

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表二十二(9708修訂)

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範 (101 年 4 月鹽寮海濱公園) (續 3)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105			計畫期數：01		
測站名稱：鹽寮海濱公園					
校正人員：楊振谷、范和聰、林友森			校正日期：101.4.19 / 101.4.22		
☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SN 00247450					
☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN 34251562					
內部電子式查核頻率：(1000)Hz					
測量前內部電子式查校(dB)C			測量後內部電子式查校(dB)C		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
114.0	114.0		114.0	114.0	
外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz					
測量前外部(標準音壓)校正(dB)A			測量後外部(標準音壓)校正(dB)A		
設定值	讀取值 94.0		設定值	讀取值	
94.1	94.0 93.9		94.1	93.9 94.0	
聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。					
量測規範	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：			
	取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：			
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：			
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：			
☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-52A　序號：SN 00791002					
☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SN XU1121606694					
量測前內部電子式查校(dB)			量測後內部電子式查校(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
70.0	70.0		70.0	70.0	
測量前外部(標準振源)校正(dB)			測量後外部(標準振源)校正(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
基數 70 97.1	96.9		97.1	96.9	
取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：				

品保品管：林振輝 101.4.27

RP-03-C-01(紀錄表草第11-2版)-980608(附表二十二(9708修訂)

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗測定中心 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 臺北市中正路738號5樓之2

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範(101 年 6 月台 2 省道與 102 甲縣道交叉口)(續 2)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105			計畫期數：01		
測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口					
校正人員：郭昱宗、林友森			校正日期：101.6.23 / 101.6.26		
☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SN 01002081					
☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN 34251562					
內部電子式查核頻率：(1000)Hz					
測量前內部電子式查校(dB)C			測量後內部電子式查校(dB)C		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
114.0	114.0		114.0	114.1	
外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz					
測量前外部(標準音壓)校正(dB)A			測量後外部(標準音壓)校正(dB)A		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
94.1	93.9		94.1	93.8	
聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。					
量測規範	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：			
	取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：			
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：			
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：			
☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-52A　序號：SN 00621671					
☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SN XU1121606694					
量測前內部電子式查校(dB)			量測後內部電子式查校(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
70.0	70.0		70.0	70.0	
測量前外部(標準振源)校正(dB)			測量後外部(標準振源)校正(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
97.1	96.7		97.1	96.7	
取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：				

品保品管：林振輝 101.9.4

RP-03-C-01(紀錄表草第11-2版)-980608(附表二十二(9708修訂)

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範

(101 年 6 月鹽寮海濱公園) (續 5)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園

校正人員：郭穎穀、趙振名　　校正日期：101.6.23 / 101.6.26

☑噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SX00240663

☑聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SX34251562

內部電子式查校頻率：(1000) Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000) Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	94.2	94.1	94.0

聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑振動計　廠牌：RION　型號：VM-53A　序號：SX00140156

☑振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SXX0111660694

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	97.0	97.1	97.0

取樣時距/次數　☑1次/sec，60次/min；☐其它：

品保品管：林佩穎 101.7.4

A-30

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980603附表二十二(9708修訂)

新校工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3292 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範

(101 年 5 月鹽寮海濱公園) (續 4)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園

校正人員：郭穎穀、趙振名　　校正日期：101.5.5 / 101.5.8

☑噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SX00240663

☑聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SX34251562

內部電子式查校頻率：(1000) Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000) Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	93.8	94.1	94.1

聲音校正器校正日期：101.3.28 聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑振動計　廠牌：RION　型號：VM-53A　序號：SX00830556

☑振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SXX0111660694

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	96.9	97.1	96.9

取樣時距/次數　☑1次/sec，60次/min；☐其它：

品保品管：林佩穎 101.5.18

A-30

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980603附表二十二(9708修訂)

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 5 月福隆街上)(續 7)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上

校正人員：林毅、趙振岳　　校正日期：101.5.7 / 101.5.8

☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SN 00241450

☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN 34251562

內部電子式查校頻率：(1000)Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	93.8	94.1	93.9

聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-53A　序號：SN 00140156

☐ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SN XU11216694

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	97.0	97.1	97.0

取樣時距/次數　☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：

品保品管：林昭瑾 101.5.15

新光工程顧問有限公司 環境科學部 檢驗報告專用章 台中市中正路738號5樓之4 電話:(04)7731-3232

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 4 月福隆街上)(續 6)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上

校正人員：趙振岳、范和聰、林毅孫　　校正日期：101.4.19 / 101.4.22

☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：~~SN 00241450~~ 00620162

☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN 34251562

內部電子式查校頻率：(1000)Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值 ~~93.9~~ 93.8	設定值	讀取值
94.1	~~93.9~~ 93.8	94.1	93.8

聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-52A　序號：SN 00621651

☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SN XU11216694

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	96.8	97.1	96.8

取樣時距/次數　☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：

品保品管：林昭瑾 101.4.27

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 4 月 102 縣道之新社橋)(續 9)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋

校正人員：朱振毅、范姜鴻　　校正日期：101.4.2/101.4.5

☑噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SX00452148

☑聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SX35705067

內部電子式查校頻率：(1000)Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
93.9	94.0	93.9	93.9

聲音校正器校正日期：100.5.20；聲音校正器校正值：93.9 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑振動計　廠牌：RION　型號：VM-54　序號：SX00140156

☑振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SXU1121606P4

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	96.9	97.1	96.9

取樣時距/次數：☑1次/sec，60次/min；☐其它：

品保品管：林恩隆 101.4.10

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 6 月福隆街上) (續 8)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福連街上

校正人員：郭昱宏、林俊緯　　校正日期：101.6.23/101.6.26

☑噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SX00620162

☑聲音校正器　廠牌：RION　型號：NL-74　序號：SX34251562

內部電子式查校頻率：(1001)Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	94.1	94.1	94.0

聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑振動計　廠牌：RION　型號：VM-54　序號：SX00830356

☑振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SXU1121606P4

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	97.0	97.1	97.0

取樣時距/次數：☑1次/sec，60次/min；☐其它：

品保品管：林恩隆 101.7.4

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3229 台中市中正路738號5樓之4

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 5 月 102 縣道之新社橋)(續 10)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋

校正人員：莫秉聰　　校正日期：101.5.10/101.5.13

☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：S/N 00620162

☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：S/N 34705067

內部電子式查校頻率：(1000)Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.0	93.8	94.0	93.9

聲音校正器校正日期：101.5.7；聲音校正器校正值：94.0 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-53A　序號：S/N 00830956

☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：S/N XU1121/0698

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	97.2	97.1	97.2

取樣時距/次數：☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：

品保品管：林俊傑 101.5.17

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 6 月 102 縣道之新社橋)(續 11)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋

校正人員：鄧學霖、施郁聰　　校正日期：101.6.7/101.6.10

☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：S/N 00457268

☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：S/N 34251562

內部電子式查校頻率：(1000)Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	94.0	94.1	94.0

聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；☐slow；☐其它：
	取樣時距/次數	☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：
	頻率權衡	☑A權衡；☐C權衡；☐其它：
	量測目的	☑環境調查；☐營建工程；☐其它：

☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-53A　序號：S/N 00190878

☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：S/N XU1121/0694

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	96.8	97.1	96.8

取樣時距/次數：☑1次/sec，60次/min；☐ 其它：

品保品管：林俊傑 101.6.14

新光工程顧問有限公司環境檢驗所
檢驗報告專用章
台中市中正路738號5樓之4
電話:(02)7731-8299

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 4 月過港部落)(續 12)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105			計畫期數：01		
測站名稱：過港部落					
校正人員：朱柏毅、范振鴻			校正日期：101.4.2 / 101.4.5		
☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SN 00044033					
☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN 35105067					
內部電子式查核頻率：(1000) Hz					
測量前內部電子式查核(dB)C			測量後內部電子式查核(dB)C		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
114.0	114.0		114.0	114.0	
外部(標準音壓)校正頻率：(1000) Hz					
測量前外部(標準音壓)校正(dB)A			測量後外部(標準音壓)校正(dB)A		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
93.9	93.8		93.9	93.9	
聲音校正器校正日期：100.5.20；聲音校正器校正值：93.9 dB。					
量測規範	動態特性	☑ fast；☐ slow；☐ 其它：			
	取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：			
	頻率權衡	☑ A權衡；☐ C權衡；☐ 其它：			
	量測目的	☑ 環境調查；☐ 營建工程；☐ 其它：			
☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-53A　序號：SN 00830556					
☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SN XU112160694					
量測前內部電子式查核(dB)			量測後內部電子式查核(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
70.0	70.0		70.0	70.0	
測量前外部(標準振源)校正(dB)			測量後外部(標準振源)校正(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
97.1	96.9		97.1	96.9	
取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：				

品保品管：林昆穎 101.4.10

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 5 月過港部落)(續 13)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105			計畫期數：01		
測站名稱：過港部落					
校正人員：范振鴻			校正日期：101.5.10 / 101.5.13		
☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：SN 01020281					
☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：SN 35105067					
內部電子式查核頻率：(1000) Hz					
測量前內部電子式查核(dB)C			測量後內部電子式查核(dB)C		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
114.0	114.0		114.0	114.0	
外部(標準音壓)校正頻率：(1000) Hz					
測量前外部(標準音壓)校正(dB)A			測量後外部(標準音壓)校正(dB)A		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
94.0	93.9		94.0	94.0	
聲音校正器校正日期：101.5.7；聲音校正器校正值：94.0 dB。					
量測規範	動態特性	☑ fast；☐ slow；☐ 其它：			
	取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：			
	頻率權衡	☑ A權衡；☐ C權衡；☐ 其它：			
	量測目的	☑ 環境調查；☐ 營建工程；☐ 其它：			
☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VM-53A　序號：SN 00140756					
☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：SN XU112160694					
量測前內部電子式查核(dB)			量測後內部電子式查核(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
70.0	70.0		70.0	70.0	
測量前外部(標準振源)校正(dB)			測量後外部(標準振源)校正(dB)		
設定值	讀取值		設定值	讀取值	
97.1	97.2		97.1	97.2	
取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；☐ 其它：				

品保品管：林昆穎 101.5.17

新北市中和區中正路738號5樓之4　新北工程顧問有限公司環境檢驗室　檢驗報告專用章　電話:(02)7731-3299

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)　　測站名稱：台二特道-T102(聯勤廠)

檢查人員：振振名、范和聰、林友榮　檢查日期：101/4/19

項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 29862	S/N 14147-012

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

新竹工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2222 臺北市中正區羅斯福路一段138號5樓之4

附錄 III.2-5 噪音計與振動計校正紀錄及量測規範
(101 年 6 月過港部落)(續 14)

附表二十二　噪音計與振動計校正記錄及量測規範

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落

校正人員：鄧景泰、范和聰　　校正日期：101.6.7/101.6.10

☑ 噪音計　廠牌：RION　型號：NL-32　序號：S/N 01002081

☑ 聲音校正器　廠牌：RION　型號：NC-74　序號：S/N 34251562

內部電子式查校頻率：(1000)Hz

測量前內部電子式查校(dB)C		測量後內部電子式查校(dB)C	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
114.0	114.0	114.0	114.0

外部(標準音壓)校正頻率：(1000)Hz

測量前外部(標準音壓)校正(dB)A		測量後外部(標準音壓)校正(dB)A	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
94.1	94.1	94.1	93.9

聲音校正器校正日期：101.3.28；聲音校正器校正值：94.1 dB。

量測規範		
	動態特性	☑fast；□slow；□其它：
	取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；□ 其它：
	頻率權衡	☑A權衡；□C權衡；□其它：
	量測目的	☑環境調查；□營建工程；□其它：

☑ 振動計　廠牌：RION　型號：VH-53A　序號：S/N 00783035

☑ 振動校正器　廠牌：RING-IN　型號：VP-303　序號：S/N XH1116079

量測前內部電子式查校(dB)		量測後內部電子式查校(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
70.0	70.0	70.0	70.0

測量前外部(標準振源)校正(dB)		測量後外部(標準振源)校正(dB)	
設定值	讀取值	設定值	讀取值
97.1	96.9	97.1	96.9

取樣時距/次數	☑ 1次/sec，60次/min；□ 其它：

品保品管：[illegible] 101.6.14

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105 (01)		測站名稱：福隆海上
檢查人員：賴振谷、范和聰、林友孫		檢查日期：101 / 4 / 19
項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 27169	S/N 24341-007

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105 (01)		測站名稱：鹽寮海濱公園
檢查人員：賴振谷、范和聰、林友孫		檢查日期：101 / 4 / 19
項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 15116	S/N 29186-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

新北市中和區中正路788號5樓之1 新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3999

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 4)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號:	X0105(01)	測站名稱:	國姓氣象
檢查人員:	朱炳毅	檢查日期:	101/4/12

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌:	YOUNG	Rotronic
型號:	05103	MP-101A
序號:	S/N 29862	S/N 38186-020

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好?	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常?	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常?	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好?	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確?	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求?	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常?	☑是	□否	□無此項
8. 其它:			

新光工程顧問有限公司 檢驗專用章 電話:(02)7731-3229 臺中市中正路738號5樓之4

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 3)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號:	X0105(01)	測站名稱:	102縣道2氣往橋
檢查人員:	朱炳毅	檢查日期:	101/4/12

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌:	YOUNG	Rotronic
型號:	05103	MP-101A
序號:	S/N 15116	S/N 21572-016

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好?	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常?	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常?	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好?	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確?	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求?	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常?	☑是	□否	□無此項
8. 其它:			

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)	測站名稱：苗栗海邊公園
檢查人員：朱柏翰	檢查日期：101/5/5

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Ilum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 46081	S/N 29186-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

新安工程顧問有限公司 環安衛部 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3222 新北市中和區中正路738號5樓之1

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)	測站名稱：台電通霄加甲測站(新設)
檢查人員：朱柏翰	檢查日期：101/5/5

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Ilum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 58543	S/N 14447-012

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 8)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105	測站名稱：102聚通之新社橋
檢查人員：莊承聰	檢查日期：101/5/10

項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	rotronic
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 62072	S/N 22572-016

檢查項目	檢查結果
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是 ☐否 ☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是 ☐否 ☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
8. 其它：	

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8232 新北市中和區中正路738號5樓之1

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 7)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105 (01)	測站名稱：福壽街上
檢查人員：莊承聰	檢查日期：101.5.5

項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 27167	S/N 22572-016

檢查項目	檢查結果
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是 ☐否 ☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是 ☐否 ☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是 ☐否 ☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是 ☐否 ☐無此項
8. 其它：	

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 10)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：烏=者區昂仙門縣風文2D
檢查人員：郭旻家 林友孫		檢查日期：101 6 123
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP-101A
序號：	S/N 60072	S/N 22572-016

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗實驗室 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3932 臺北市中正路788號6樓之1

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 9)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105		測站名稱：過港鄧落
檢查人員：范和聰		檢查日期：101 15 110
項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	rotronic
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 58343	S/N 14147-012

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 12)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105 (01)　　測站名稱：福隆衛上

檢查人員：郭昱宋　　檢查日期：101 / 6 / 23

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	SN27169	SN24541-007

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗所 檢驗報告專用章 電話：(02)7731-9229 臺北市中正區羅斯福路一段138號5樓之1

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 11)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105 (01)　　測站名稱：福隆海水浴場

檢查人員：朱明毅 郭昱宋　　檢查日期：101 / 6 / 23

項目	☑風速風向計 (Ws/Wd)	☑溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	Rotronic
型號：	05103	MP-101A
序號：	SN27862	SN29186-010

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	□否	□無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	□否	□無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	□否	□無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	□否	□無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	□否	□無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	□否	□無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	□否	□無此項
8. 其它：			

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 13)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：101道之新社橋
檢查人員：許景雲		檢查日期：101 / 6 / 17
項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 62072	S/N 14341-007

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	☐否	☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	☐否	☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	☐否	☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	☐否	☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	☐否	☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	☐否	☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	☐否	☐無此項
8. 其它：			

附錄 III.2-6 氣象監測儀檢查表(續 14)

附表十四　儀器狀況檢查表(5 氣象監測儀)

計畫編號：X0105(01)		測站名稱：過港部落
檢查人員：許景雲		檢查日期：101 / 6 / 17
項目	☑ 風速風向計 (Ws/Wd)	☑ 溫濕度計 (Temp/Hum)
廠牌：	YOUNG	ROTRONIC
型號：	05103	MP101A
序號：	S/N 46681	S/N 14147-012

檢查項目	檢查結果		
1. 氣象監測儀外觀及連接線是否良好？	☑是	☐否	☐無此項
2. 風向、風速計之定位、轉動是否正常？	☑是	☐否	☐無此項
3. 溫濕度計之感測元件是否正常？	☑是	☐否	☐無此項
4. 氣象監測儀之固定支座是否完整良好？	☑是	☐否	☐無此項
5. 氣象監測儀安裝方向、位置是否正確？	☑是	☐否	☐無此項
6. 氣象監測儀安裝高度是否符合要求？	☑是	☐否	☐無此項
7. 氣象監測儀輸出訊號是否正常？	☑是	☐否	☐無此項
8. 其它：			

新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8252 新北市中和區中正路738號5樓之2

附　錄　Ⅲ.3

河川水質及廠區水質品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-1　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW4020201~07 (4月份河川水(河川部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	3.65	3.85	5.3	0~20%
*	2	硝酸鹽氮	NIEA W436.50C	0.452	101.6	85~115%	5.50	5.52	100.4	85~115%	1.14	1.09	4.3	0~10%
*	3	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.130	97.9	85~115%	1.00	0.955	95.5	80~120%	0.00641	0.00610	5.0	0~15%
*	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-1.5 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	196	199	1.3	0~15%
*	5	化學需氧量	NIEA W517.52B	50.0	96.5	85~115%	-	-	-	-	48.2	50.9	5.3	0~20%
*	6	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	101.9	85~115%	5.00	5.45	109.0	85~115%	0.136	0.137	1.1	0~15%
*	7	鎳	NIEA W311.52C	0.300	103.4	80~120%	50.0	49.3	98.6	80~120%	0.479	0.474	1.0	0~20%
*	8	鍍	NIEA W311.52C	0.800	103.0	80~120%	100	101	100.7	80~120%	0.472	0.469	0.6	0~20%
*	9	鋅	NIEA W311.52C	0.300	102.9	80~120%	50.0	51.7	103.3	80~120%	0.465	0.462	0.7	0~20%
*	10	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	103.4	80~120%	1.00	0.951	95.1	80~120%	0.0483	0.0479	0.9	0~20%
*	11	銅	NIEA W311.52C	0.300	104.4	80~120%	50.0	50.0	100.0	80~120%	0.490	0.488	0.4	0~20%
*	12	總鉻	NIEA W311.52C	0.300	103.3	80~120%	50.0	49.2	98.3	80~120%	0.484	0.480	0.8	0~20%
*	13	汞	NIEA W330.52A	0.00500	94.8	80~120%	0.200	0.199	99.6	75~125%	0.00199	0.00202	1.5	0~20%
		以下空白												
備註														

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956896

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-2　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW5006801~07 (5月份河川水(河川部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	3.95	4.00	1.3	0~20%
*	2	硝酸鹽氮	NIEA W436.50C	0.452	103.2	85~115%	5.50	5.40	98.3	85~115%	0.421	0.428	1.7	0~10%
*	3	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.0450	97.9	85~115%	1.00	0.933	93.3	80~120%	0.0326	0.0338	3.7	0~15%
*	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-3.5(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	194	203	4.1	0~15%
*	5	化學需氧量	NIEA W517.52B	50.0	97.8	85~115%	-	-	-	-	48.9	49.1	0.4	0~20%
*	6	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	97.3	85~115%	5.00	4.47	89.5	85~115%	1.362	1.360	0.2	0~15%
*	7	鎳	NIEA W311.52C	0.300	95.4	80~120%	50.0	51.1	102.2	80~120%	0.511	0.510	0.2	0~20%
*	8	鍍	NIEA W311.52C	0.800	99.6	80~120%	100	101	101.1	80~120%	0.294	0.303	3.0	0~20%
*	9	鋅	NIEA W311.52C	0.300	95.9	80~120%	50.0	51.7	103.3	80~120%	0.545	0.544	0.1	0~20%
*	10	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	92.0	80~120%	1.00	1.08	108.2	80~120%	0.01082	0.01084	0.2	0~20%
*	11	銅	NIEA W311.52C	0.300	101.0	80~120%	50.0	54.4	108.7	80~120%	0.544	0.544	0.0	0~20%
*	12	總鉻	NIEA W311.52C	0.300	100.3	80~120%	50.0	53.9	107.9	80~120%	0.539	0.538	0.2	0~20%
*	13	汞	NIEA W330.52A	0.00500	105.9	80~120%	0.200	0.189	94.6	75~125%	0.00190	0.00193	1.6	0~20%
		以下空白												
備註														

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958839

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-3　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW6000901~07 (6月份河川水(河川部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	2.60	2.90	10.9	0~20%
*	2	硝酸鹽氮	NIEA W436.50C	0.452	101.2	85~115%	5.50	5.18	94.1	85~115%	0.461	0.472	2.3	0~10%
*	3	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.0450	94.8	85~115%	1.00	1.03	103.1	80~120%	0.0300	0.0287	4.3	0~15%
*	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-7.8 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	190	199	4.6	0~15%
*	5	化學需氧量	NIEA W517.52B	50.0	104.8	85~115%	-	-	-	-	52.4	49.6	5.4	0~20%
*	6	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	101.1	85~115%	5.00	5.36	107.3	85~115%	0.442	0.445	0.6	0~15%
*	7	錳	NIEA W311.52C	0.300	102.7	80~120%	50.0	47.6	95.2	80~120%	0.477	0.479	0.5	0~20%
*	8	鐵	NIEA W311.52C	0.800	102.5	80~120%	100	96.5	96.5	80~120%	0.298	0.296	0.8	0~20%
*	9	鋅	NIEA W311.52C	0.300	102.9	80~120%	50.0	48.7	97.3	80~120%	0.495	0.493	0.6	0~20%
*	10	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	103.6	80~120%	1.00	1.02	101.8	80~120%	0.0102	0.0100	1.5	0~20%
*	11	銅	NIEA W311.52C	0.300	103.4	80~120%	50.0	50.2	100.4	80~120%	0.502	0.505	0.6	0~20%
*	12	總鉻	NIEA W311.52C	0.300	102.4	80~120%	50.0	50.4	100.7	80~120%	0.504	0.503	0.2	0~20%
*	13	汞	NIEA W330.52A	0.00500	98.3	80~120%	0.200	0.199	99.4	75~125%	0.002	0.002	4.3	0~20%
		以下空白												
備註														

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室
實驗報告章
TEL:22993939
FAX:22993230
新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 | t (886-2) 2299-3939 | f (886-2) 2299-3230 | www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

TWA 6959540

1002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-4　**水質採樣各式儀器使用及校正記錄表**

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析

使用/校正日期：2012.4.12

使用人員：劉小亮

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☑PH 330i ☐PH 3210	ESPC-PH-T09	☑良好 ☐異常:_____	校正點	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
				溫度	27.9	27.9	27.9	溫度：28.0	-10	-57.9	
				編號	110818-6-05	110818-6-05	111118-6-07	測值：7.01			
				分裝日期	2012.4.9	2012.4.9	2012.4.9	編號：111223-6-03			
								分裝日期：2012.4.9			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T07	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液							NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)	電極常數(cm^{-1})			
				27.9	1417	編號：110501-6-05	1413	0.484			
						分裝日期：2012.4.9		0.450~0.500			
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合 <0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV~25mV

校正	允收範圍
斜率	-61~-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：4/12

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-5 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☑DO計	WTW ☐ OXI 330i ☑ OXI 3210	ESPC-DO-T1	☑良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
				27.6	7.88	7.83	101.8	0.84	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV					-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)		合格參考值±5%		
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN-SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是☑否-電極內是否有氣泡。

☐是☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):1018 標準件(mbar):1010

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員:

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-6 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點:核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期:2012.5.23

使用人員:

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點							
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認(pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
				溫度	26.7	26.7	26.6	溫度:26.7	-12.1	-52.9	
				編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-01	測值:7.01			
				分裝日期	2012.5.21	2012.5.21	2012.5.21	編號:111227-6-03			
								分裝日期:2012.5.21			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm⁻¹)		NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				26.7	1416	編號:120229-6-03		1412	0.487		
						分裝日期:2012.5.21					
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號					NIEA W408
						HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____					
						保存期限:					
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況,並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope),電極允收範圍如下:

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV~25mV

校正	允收範圍
斜率	-61~-56mV/pH

2.確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員:

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-7 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☑DO計	WTW ☐ OXI 330i ☑ OXI 3210	ESPC-DO-T10	☑良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
				>7.0	7.77	8.04	101.3	0.84	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV		合格參考值±5%			-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若爲感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無surface痕。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):1010 標準件(mbar):1010

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員:[illegible]

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-8 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點:核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期:2012.6.5

使用人員:[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
				pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)			
				溫度	25.2	25.2	25.2	溫度:25.1	-11.5	-58.7	
				編號	110818-6-13	110818-6-05	110818-6-07	測值:7.01			
				分裝日期	2012.6.4	2012.6.4	2012.6.4	編號:111223-6-03			
								分裝日期:2012.6.4			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm^{-1})			NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500			
				25.2	1416	編號:120229-6-03	1413	0.487			
						分裝日期:2012.6.4					
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.:_____ 保存期限:_____					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否				
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否				
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %	是否符合±20% ☐是 ☐否				
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況,並顯示零點偏移(Asymmetry)及斜率(Slope),電極允收範圍如下:

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV~25mV

校正	允收範圍
斜率	-61~-56mV/pH

2.確認作業時,需記錄確認buffer液之溫度及測值,此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員:[illegible]

附錄Ⅲ.3-9 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☑DO計	WTW ☐OXI 330i ☑OXI 3210	ESPC-DO-T(P	☑良好 ☐異常:_____	25.4	8.20	8.24	101.3	0.82	NIEA W455
				標準校正液_____mV					
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	儀器讀值(mV)		合格參考值±5%		-
☐水位計	☐SOLINST ☐IN-SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無綑痕。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):1010 標準件(mbar):1010

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

FORM-TESP-PW-101-02 版次:7.6 發行日期:2012.03.15

審核人員:謝志遠

附錄Ⅲ.3-10 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號: PW4003901~03 (4月份河川水(河口部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值(mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量(μg)	分析值(μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1(mg/L)	分析濃度2(mg/L)	差異百分比率(%)	重複管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+9.8(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	208	198	4.8	0~15%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	3.70	4.00	7.8	0~20%
	3	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.0	85~115%	-	-	-	-	2.84†	2.75†	3.2	0~25%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	107.7	85~115%	1.00	1.05	105.4	80~120%	0.0690	0.0671	2.8	0~15%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位為NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group
TWA 6956890

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-11 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW5006301~03 (5月份河川水(河口部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-5.9(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	192	213	10.5	0~15%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	8.20	8.30	1.2	0~20%
	3	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	105.5	85~115%	-	-	-	-	7.41†	7.15†	3.6	0~25%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	94.0	85~115%	1.00	1.06	105.7	80~120%	4.53	4.74	4.6	0~15%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6957357

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-12 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW6000401~03 (6月份河川水(河口部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-2.2 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	497	466	6.5	0~15%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	4.90	4.60	6.3	0~20%
	3	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.0	85~115%	-	-	-	-	4.74†	4.68†	1.3	0~25%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	91.0	85~115%	1.00	0.968	96.8	80~120%	0.0846	0.0806	4.9	0~15%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959532

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-13 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析(2)　使用/校正日期：2012.4.3

使用人員：富川優智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☐ PH 3210	ESPC-PH-T	☐良好 ☐異常:_____	校正點	pH	☐ pH=7	☐ pH=4	☐ pH=10	校正後確認 (pH=)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
					溫度				溫度：			
					編號				測值：			
									編號：			
					分裝日期				分裝日期：			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液						電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				27.3		1417	編號：1108f10-6-08 分裝日期：2012.4.2		1413	0.482		
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合 <0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15　　審核人員 蔡承甫 2012.04.03

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-14 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☑DO計	WTW ☐ OXI 330i ☑ OXI 3210	ESPC-DO-T10	☑良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
				22.0	8.74	8.79	101.3	0.84	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV					-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)		合格參考值±5%		
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絮狀。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：1016　標準件(mbar)：1016

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15　　審核人員 蔡承甫 2012.04.03

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-15 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.05.03

使用人員：周慶翔

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☐溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☐ PH 3210	ESPC-PH-T	☐良好 ☐異常:_____	pH	☐ pH=7	☐ pH=4	☐ pH=10	(pH=)			NIEA W217 W424
				溫度				溫度：			
				讀值				測值：			
				編號				編號：			
				分裝日期				分裝日期：			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T 06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)		0.450~0.500		NIEA W203
				28.3	1416	編號：11081006-08 分裝日期：2012.4.30	1413		0.887		
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：					
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			NIEA W408
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV~25mV

校正	允收範圍
斜率	-61~-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：蔡孟甫 2012.05.

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-16 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☑DO計	WTW ☐ OXI 330i ☑ OXI 3210	ESPC-DO-T 10	☑良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
				28.1	7.81	7.90	101.2	0.82	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無縐痕。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：1011 標準件(mbar)：1011

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：蔡孟甫 2012.05.

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-17 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用/校正日期：2012.6.4

使用人員：劉儀智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☐ PH 3210	ESPC-PH-T	☐良好 ☐異常:_____	pH	☐ pH=7	☐ pH=4	☐ pH=10	(pH=)			NIEA W217 W424
				溫度				溫度：			
				編號				測值：			
				分裝日期				編號： 分裝日期：			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液							
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	電極常數(cm^{-1})			NIEA W203
				25.6	1416	編號：(20229-6-03 分裝日期：2012.6.4	1413	0.481			
☐鹽氣計	HACH 57800-00	ESPC-鹽氣計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15　　審核人員：謝志嘉

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-18 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☑DO計	WTW ☐ OXI 330i ☑ OXI 3210	ESPC-DO-T10	☑良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
				25.8			101.3	0.84	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV					
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)		合格參考值±5%		-
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：1010 標準件(mbar)：1010

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15　　審核人員：謝志嘉

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-19　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW4020401~05 (4月份放流水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	真色色度	NIEA W223.52B	100Δ	98.5	80~120%	-	-	-	-	26.0Δ	26.0Δ	0.0	0~20%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	2.35	2.25	4.3	0~20%
*	3	化學需氧量	NIEA W517.52B	50.0	98.9	85~115%	-	-	-	-	49.4	51.7	4.4	0~20%
*	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-1.5 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	196	199	1.3	0~15%
*	5	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	96.8	85~115%	5.00	4.87	97.5	85~115%	1.06	1.04	2.1	0~15%
		以下空白												

備註 1."Δ"表示真色色度的分析值沒有單位。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第3頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956899

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-20　**水質採樣各式儀器使用及校正記錄表**

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(E)　使用/校正日期：2012.4.12

使用人員：劉小榮智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正								檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☑PH 330i ☐PH 3210	ESPC-PH-T09	☑良好 ☐異常:_____	校正點	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	不對稱(mV)	斜率(mV/pH)		NIEA W217 W424
				pH								
				溫度	27.9	27.9	27.9	溫度：28.0	-10	-57.9		
				編號	110818-6-13	110813-6-05	111118-6-07	測值：7.01				
				分裝日期	2012.4.9	2012.4.9	2012.4.9	編號：111223-6-03				
								分裝日期：2012.4.9				
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T07	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})			NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液		標準讀值 (μmho/cm)	0.450~0.500			
				27.9	1417	編號：110810-6-08		1413	0.484			
						分裝日期：2012.4.9						
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____						
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否				NIEA W408
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否				
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否				
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合 <0.02(mg/L) ☐是 ☐否						

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV~25mV

校正	允收範圍
斜率	-61~-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-21 **水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)**

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若爲感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無綑痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):　　標準件(mbar):

FORM-TESP-PW-101-02 版次:7.6 發行日期:2012.03.15

審核人員:

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-22 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號: PW5007001~05 (5月份放流水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值(mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量(μg)	分析值(μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1(mg/L)	分析濃度2(mg/L)	差異百分比率(%)	重複管制標準
*	1	眞色色度	NIEA W223.52B	100Δ	100.3	80~120%	-	-	-	-	67.0Δ	66.0Δ	0.5	0~20%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	11.4	11.0	3.6	0~20%
*	3	化學需氧量	NIEA W517.52B	50.0	97.8	85~115%	-	-	-	-	48.9	49.1	0.4	0~20%
*	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-0.5 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	197	193	2.2	0~15%
*	5	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	97.3	85~115%	5.00	4.47	89.5	85~115%	1.362	1.360	0.2	0~15%
		以下空白												
備註		1."Δ"表示眞色色度的分析值沒有單位。												

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

(第3頁,共3頁)

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可,不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group
TWA 6958598

1002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-23 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.5.23

使用人員：劉小姐

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正						檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐ pH 330i ☑ pH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
					溫度	26.7	26.7	26.6	溫度：26.7	-1.1	-57.7	
					編號	110818-6-13	110818-6-09	111118-6-07	測值：7.01			
					分裝日期	2012.5.21	2012.5.21	2012.5.21	編號：111223-6-03			
									分裝日期：2012.5.21			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液						電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				26.7		1416	編號：170229-6-03 分裝日期：2012.5.21		1413	0.847(第4次)		
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-24 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV					-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)		合格參考值±5%		
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絮狀。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

審核人員：

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-25　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW6001101~05 (6月份放流水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	眞色色度	NIEA W223.52B	100Δ	99.4	80~120%	-	-	-	-	45.0Δ	46.0Δ	0.6	0~20%
*	2	懸浮固體	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	9.10	9.00	1.1	0~20%
*	3	化學需氧量	NIEA W517.52B	50.0	104.8	85~115%	-	-	-	-	52.4	49.6	5.4	0~20%
*	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-7.8 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	190	199	4.6	0~15%
*	5	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	101.1	85~115%	5.00	5.36	107.3	85~115%	0.442	0.445	0.6	0~15%
		以下空白												

備註 1."Δ"表示眞色色度的分析值沒有單位。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 台北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959535

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.3-26 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期： 2012.6.5

使用人員： 翟曉智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點 pH / ☑pH=7 / ☑pH=4 / ☑pH=10			校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)		NIEA W217 W424
				溫度	25.2	25.2	25.2	溫度： 25.1	-11.5	-58.7	
				編號	111018-6-13	111018-6-05	111018-6-07	測值： 7.01			
				分裝日期	2012.6.4	2012.6.4	2012.6.4	編號：111223-6-03			
								分裝日期：2012.6.4			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm^{-1})			NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值 (μmho/cm)	標準溶液	標準讀值 (μmho/cm)	0.450~0.500			
				25.2	1416	編號：120229-6-03 分裝日期：2012.6.4	1413	0.489			
☐鹼氣計	HACH 57800-00	ESPC-鹼氣計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否				
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否				
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %	是否符合±20% ☐是 ☐否				
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV~25mV

校正	允收範圍
斜率	-61~-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

附錄Ⅲ.3-27 **水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)**

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☐ SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若爲感潮河段或海域,需輸入鹽度,進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態,並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完,需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):　　標準件(mbar):

審核人員:謝志遠

附　錄　Ⅲ.4

地下水水質品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-1 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG4004401~02 (4月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.0	85~115%	-	-	-	-	5.02†	4.81†	4.3	0~25%
*	2	氟鹽	NIEA W415.52B	20.0	105.2	85~115%	1000	1058	105.8	80~120%	21.6	21.2	1.5	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	106.2	85~115%	1000	954	95.4	80~120%	10.3	10.2	1.4	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+11.3(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	209	200	4.6	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	102.7	85~115%	50.0	45.6	91.3	75~125%	3.06	3.03	0.8	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	92.1	85~115%	-	-	-	-	18.4	18.0	2.2	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	99.8	85~115%	5.00	5.39	107.8	85~115%	23.60	23.59	0.1	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.374	108.6	80~120%	18.5	18.4	99.6	75~125%	0.191	0.185	3.2	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	100.0	85~115%	1000	1035	103.5	80~120%	140	134	4.1	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	106.9	80~120%	100	102	101.8	80~120%	1.0445	1.0438	0.1	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	107.1	80~120%	10.0	11.4	113.7	80~120%	0.356	0.354	0.5	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	106.5	80~120%	10.0	9.64	96.4	80~120%	0.0992	0.100	1.1	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	103.9	80~120%	10.00	10.07	100.7	80~120%	0.103	0.101	1.9	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	106.8	80~120%	1.00	1.07	106.9	80~120%	0.01086	0.01094	0.8	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	107.3	80~120%	10.0	9.32	93.2	80~120%	0.0948	0.0956	0.9	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	106.5	80~120%	10.0	9.75	97.5	80~120%	0.107	0.106	0.3	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	106.0	80~120%	10.0	10.8	108.1	80~120%	0.142	0.141	1.2	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	99.4	85~115%	0.250	0.264	105.4	80~120%	0.00527	0.00508	3.6	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	94.3	80~120%	0.200	0.196	98.2	75~125%	0.00202	0.00193	4.4	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956908

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-2 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG4016001~02 (4月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	100.5	85~115%	-	-	-	-	1.06†	1.02†	3.8	0~25%
*	2	氟鹽	NIEA W415.52B	20.0	100.3	85~115%	1000	902	90.2	80~120%	573	565	1.3	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	100.3	85~115%	1000	1077	107.7	80~120%	296	293	0.7	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+5.5 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	203	200	1.7	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	110.9	85~115%	50.0	45.9	91.7	75~125%	0.298	0.322	7.7	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	98.3	85~115%	-	-	-	-	2.74	2.94	7.1	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	97.8	85~115%	5.00	5.35	107.0	85~115%	1.52	1.51	1.1	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.379	99.3	80~120%	18.3	19.4	105.7	75~125%	0.194	0.192	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.0	85~115%	1000	1097	109.7	80~120%	89.7	88.5	1.4	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	99.7	80~120%	100.0	100.1	100.1	80~120%	1.00	0.987	1.5	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	99.3	80~120%	10.0	9.66	96.6	80~120%	0.114	0.117	2.2	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	99.8	80~120%	10.0	10.3	102.7	80~120%	0.110	0.109	0.4	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	96.5	80~120%	10.0	9.06	90.6	80~120%	0.0962	0.103	7.2	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	97.5	80~120%	1.00	0.975	97.5	80~120%	0.00977	0.00991	1.4	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	98.9	80~120%	10.0	9.88	98.8	80~120%	0.104	0.105	0.9	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	98.4	80~120%	10.0	9.81	98.1	80~120%	0.102	0.103	0.3	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	98.8	80~120%	10.0	8.40	84.0	80~120%	0.0306	0.0307	0.6	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	102.6	85~115%	0.250	0.260	103.8	80~120%	0.00519	0.00518	0.2	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	96.9	80~120%	0.200	0.188	93.9	75~125%	0.00196	0.00199	1.5	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956909

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-3　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG4016101~02 (4月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	92.5	85~115%	-	-	-	-	7.92†	7.55†	4.0	0~25%
*	2	氟鹽	NIEA W415.52B	20.0	94.0	85~115%	1000	1062	106.2	80~120%	1002	1025	2.3	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	94.4	85~115%	1000	1115	111.5	80~120%	1123	1150	2.5	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+14.4(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	212	200	6.2	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	102.2	85~115%	50.0	50.9	101.8	75~125%	0.889	0.887	0.2	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	98.3	85~115%	-	-	-	-	2.74	2.94	7.1	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	97.8	85~115%	5.00	5.35	107.0	85~115%	1.52	1.51	1.1	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.379	99.3	80~120%	18.3	19.4	105.7	75~125%	0.194	0.192	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.0	85~115%	1000	1097	109.7	80~120%	89.7	88.5	1.4	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	105.9	80~120%	100	104	103.7	80~120%	1.082	1.079	0.3	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	105.9	80~120%	10.0	9.72	97.2	80~120%	0.107	0.109	1.4	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	105.3	80~120%	10.0	9.60	96.0	80~120%	0.0990	0.101	1.9	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	106.7	80~120%	10.0	9.41	94.1	80~120%	0.0994	0.0993	0.2	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	106.8	80~120%	1.000	1.001	100.1	80~120%	0.0101	0.0102	0.9	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	105.0	80~120%	10.0	9.73	97.3	80~120%	0.101	0.103	2.2	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	104.3	80~120%	10.0	9.80	98.0	80~120%	0.101	0.102	1.1	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	106.0	80~120%	10.0	9.83	98.3	80~120%	0.110	0.112	2.0	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	100.9	85~115%	0.250	0.255	101.8	80~120%	0.00509	0.00505	0.8	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	96.9	80~120%	0.200	0.188	93.9	75~125%	0.00196	0.00199	1.5	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956910

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-4　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG4016201,03 (4月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	92.5	85~115%	-	-	-	-	7.92†	7.55†	4.0	0~25%
*	2	氟鹽	NIEA W415.52B	20.0	94.0	85~115%	1000	1062	106.2	80~120%	1002	1025	2.3	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	94.4	85~115%	1000	1115	111.5	80~120%	1123	1150	2.5	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+14.4(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	212	200	6.2	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	102.2	85~115%	50.0	50.9	101.8	75~125%	0.889	0.887	0.2	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	98.3	85~115%	-	-	-	-	2.74	2.94	7.1	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	97.8	85~115%	5.00	5.35	107.0	85~115%	1.52	1.51	1.1	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.379	99.3	80~120%	18.3	19.4	105.7	75~125%	0.194	0.192	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.0	85~115%	1000	1097	109.7	80~120%	89.7	88.5	1.4	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	101.0	80~120%	100	106	106.4	80~120%	0.877	0.875	0.3	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	99.9	80~120%	10.00	10.03	100.3	80~120%	0.133	0.135	1.3	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	100.2	80~120%	10.0	10.5	105.1	80~120%	0.108	0.107	1.0	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	98.9	80~120%	10.00	10.08	100.8	80~120%	0.104	0.102	1.6	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	99.5	80~120%	1.00	1.07	106.9	80~120%	0.01073	0.01072	0.1	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	99.8	80~120%	10.0	10.8	108.1	80~120%	0.111	0.112	0.6	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	98.7	80~120%	10.0	10.7	106.6	80~120%	0.110	0.112	1.2	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	99.1	80~120%	10.0	10.5	104.8	80~120%	0.1173	0.1172	0.1	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	100.4	85~115%	0.250	0.261	104.2	80~120%	0.00521	0.00523	0.4	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	97.5	80~120%	0.200	0.207	103.4	75~125%	0.00209	0.00201	4.0	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956911

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-5 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG4016301~02 (4月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	103.5	85~115%	-	-	-	-	4.78†	4.52†	5.6	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	96.5	85~115%	1000	959	95.9	80~120%	22.8	22.7	0.3	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	97.4	85~115%	1000	1133	113.3	80~120%	53.5	53.6	0.3	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+2.4(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	200	201	0.5	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	96.0	85~115%	50.0	48.3	96.7	75~125%	0.300	0.305	1.7	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	92.5	85~115%	-	-	-	-	18.5	19.1	3.2	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	99.4	85~115%	5.00	5.01	100.2	85~115%	0.102	0.103	0.8	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.382	96.6	80~120%	18.8	18.6	99.0	75~125%	0.188	0.195	3.8	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	99.2	85~115%	1000	966	96.6	80~120%	158	159	0.5	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	101.0	80~120%	100	106	106.4	80~120%	0.877	0.875	0.3	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	99.9	80~120%	10.00	10.03	100.3	80~120%	0.133	0.135	1.3	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	100.2	80~120%	10.0	10.5	105.1	80~120%	0.108	0.107	1.0	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	98.9	80~120%	10.00	10.08	100.8	80~120%	0.104	0.102	1.6	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	99.5	80~120%	1.00	1.07	106.9	80~120%	0.01073	0.01072	0.1	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	99.8	80~120%	10.0	10.8	108.1	80~120%	0.111	0.112	0.6	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	98.7	80~120%	10.0	10.7	106.6	80~120%	0.110	0.112	1.2	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	99.1	80~120%	10.0	10.5	104.8	80~120%	0.1173	0.1172	0.1	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	91.1	85~115%	0.250	0.241	96.2	80~120%	0.004811	0.004806	0.1	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	97.5	80~120%	0.200	0.207	103.4	75~125%	0.00209	0.00201	4.0	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956912

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-6 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG4016401~02 (4月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	106.0	85~115%	-	-	-	-	8.15†	8.02†	1.6	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	96.5	85~115%	1000	959	95.9	80~120%	22.8	22.7	0.3	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	97.4	85~115%	1000	1133	113.3	80~120%	53.5	53.6	0.3	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+2.4(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	200	201	0.5	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	96.0	85~115%	50.0	48.3	96.7	75~125%	0.300	0.305	1.7	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	92.5	85~115%	-	-	-	-	18.5	19.1	3.2	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.785	99.4	85~115%	5.00	5.01	100.2	85~115%	0.102	0.103	0.8	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.382	96.6	80~120%	18.8	18.6	99.0	75~125%	0.188	0.195	3.8	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.2	85~115%	1000	1089	108.9	80~120%	72.6	76.2	4.9	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	101.0	80~120%	100	106	106.4	80~120%	0.877	0.875	0.3	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	99.9	80~120%	10.00	10.03	100.3	80~120%	0.133	0.135	1.3	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	100.2	80~120%	10.0	10.5	105.1	80~120%	0.108	0.107	1.0	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	98.9	80~120%	10.00	10.08	100.8	80~120%	0.104	0.102	1.6	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	99.5	80~120%	1.00	1.07	106.9	80~120%	0.01073	0.01072	0.1	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	99.8	80~120%	10.0	10.8	108.1	80~120%	0.111	0.112	0.6	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	98.7	80~120%	10.0	10.7	106.6	80~120%	0.110	0.112	1.2	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	99.1	80~120%	10.0	10.5	104.8	80~120%	0.1173	0.1172	0.1	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	91.1	85~115%	0.250	0.241	96.2	80~120%	0.004811	0.004806	0.1	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	98.5	80~120%	0.200	0.205	102.3	75~125%	0.00205	0.00203	1.1	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956913

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-7 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(四)　使用/校正日期：2012.4.2

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)	-11.2	-59.7	NIEA W217 W424
				溫度	24.3	24.3	24.1	溫度：24.2			
				編號	110818-b-13	110818-b-08	111118-b-07	測值：7.01			
				分裝日期	2012.4.2	2012.4.2	2012.4.2	編號：111225-b-03			
								分裝日期：2012.4.2			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				24.3	1417	編號：110810-b-08		1413	0.486		
						分裝日期：2012.4.2					
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[signature]

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-8 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

審核人員：[signature]

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-9 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(3)

使用/校正日期：2012.4.13

使用人員：劉振宏

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☑PH 330i ☐PH 3210	ESPC-PH-T09	☑良好 ☐異常:_____	校正點	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
					溫度	27.0	26.9	26.9	溫度：26.9	-4.	-57.8	
					編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-01	測值：7.01 編號：111223-6-03			
					分裝日期	2012.4.9	2012.4.9	2012.4.9	分裝日期：2012.4.9			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T07	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液						電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				27.0		1417	編號：111810-6-08 分裝日期：2012.4.9		1417	0.482		
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：葉2成 4/13

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-10 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☐SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L):

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：葉2成 4/17

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-11 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(2)

使用/校正日期：2012.4.14

使用人員：劉懷福

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
				pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)			
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	溫度	>5.1	>5.1	>5.0	溫度：>5.0	-10.9	-58.4	NIEA W217 W424
				編號	110918-6-13	110818-6-05	111118-6-07	測值：7.01			
								編號：111227-6-07			
				分裝日期	2012.4.9	2012.4.9	2012.4.9	分裝日期：2012.4.9			
				標準溶液 0.01N KCl溶液							
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				>5.1		1413	編號：110810-6-08 分裝日期：2012.4.9	1413	0.483		
☐鹼氣計	HACH 57800-00	ESPC-鹼氣計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.:_____ 保存期限：				NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %	是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[illegible] 2012.04.14

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-12 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無綑痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：[illegible] 2012.04.14

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-13 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(四)　　使用/校正日期：2012.4.16

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正						檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點				校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
				pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10				
				溫度	23.2	23.1	23.2	溫度：23.2			
				編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-07	測值：7.01	-114	-58.7	
								編號：111223-6-03			
				分裝日期	2012.4.16	2012.4.16	2012.4.16	分裝日期：2012.4.16			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液				電極常數(cm^{-1})			NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500			
				23.2	1417	編號：110818-6-08 分裝日期：2012.4.16	1413	0.482			
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[signature] 2012.4.16

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-14 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☑SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極膜充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：[signature] 2012.4.16

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-15 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(2)

使用/校正日期：2012.4.17

使用人員：周緊智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)	-12.4	-59.1	NIEA W217 W424
				溫度	24.7	24.6	24.6	溫度：24.7			
				編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-07	測值：7.0			
				分裝日期	2012.4.16	2012.4.16	2012.4.16	編號：111223-6-03 分裝日期：2016.4.16			

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	標準溶液 0.01N KCl溶液				檢驗方法
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	電極常數(cm^{-1}) 0.450~0.500
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	24.7	1416	編號：110810-6-08 分裝日期：2012.4.16	1413	0.484 NIEA W203

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	標準品編號				檢驗方法
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 低存期限：_____		NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否	
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否	
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %	是否符合±20% ☐是 ☐否	
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合 <0.02(mg/L)	☐是 ☐否	

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：2012.4.17

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-16 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	標準校正液_____mV			檢驗方法
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)		
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____			合格參考值±5%	-

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況		檢驗方法
☐水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---	-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

審核人員：2012.4.17

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-17 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG5004201~02 (5月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	93.0	85~115%	-	-	-	-	2.48†	2.38†	4.1	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	107.2	85~115%	1000	1046	104.6	80~120%	25.67	25.65	0.1	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	106.5	85~115%	1000	963	96.3	80~120%	11.8	11.9	0.4	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+4.6(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	203	198	2.4	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	98.3	85~115%	50.0	43.1	86.2	75~125%	0.561	0.600	6.7	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	97.7	85~115%	-	-	-	-	19.5	20.5	4.6	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	100.0	85~115%	5.00	4.97	99.4	85~115%	0.121	0.120	0.6	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.370	101.8	80~120%	18.9	19.3	101.8	75~125%	0.199	0.198	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.0	85~115%	1000	885	88.5	80~120%	62.8	59.2	5.9	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	93.2	80~120%	100	98.1	98.1	80~120%	1.00	1.01	1.0	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	91.9	80~120%	10.0	9.45	94.5	80~120%	0.0945	0.0946	0.1	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	93.6	80~120%	10.0	9.92	99.2	80~120%	0.102	0.101	1.4	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	92.5	80~120%	10.0	9.66	96.6	80~120%	0.0969	0.101	4.1	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	94.0	80~120%	1.00	1.02	102.1	80~120%	0.01021	0.01019	0.2	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	92.5	80~120%	10.0	9.79	97.9	80~120%	0.0986	0.100	1.6	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	91.0	80~120%	10.0	9.82	98.2	80~120%	0.1014	0.1011	0.3	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	92.3	80~120%	10.0	9.95	99.5	80~120%	0.114	0.116	1.8	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	109.8	85~115%	0.250	0.237	94.9	80~120%	0.00478	0.00477	0.2	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	100.1	80~120%	0.200	0.206	102.8	75~125%	0.00207	0.00212	2.7	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958450

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-18 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG5004101~02 (5月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	93.0	85~115%	-	-	-	-	2.48†	2.38†	4.1	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	107.2	85~115%	1000	1046	104.6	80~120%	25.67	25.65	0.1	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	106.5	85~115%	1000	963	96.3	80~120%	11.8	11.9	0.4	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-1.7(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	196	197	0.3	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	98.3	85~115%	50.0	43.1	86.2	75~125%	0.561	0.600	6.7	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	97.7	85~115%	-	-	-	-	19.5	20.5	4.6	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	100.0	85~115%	5.00	4.97	99.4	85~115%	0.121	0.120	0.6	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.370	101.8	80~120%	18.9	19.3	101.8	75~125%	0.199	0.198	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.0	85~115%	1000	885	88.5	80~120%	62.8	59.2	5.9	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	93.2	80~120%	100	98.1	98.1	80~120%	1.00	1.01	1.0	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	91.9	80~120%	10.0	9.45	94.5	80~120%	0.0945	0.0946	0.1	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	93.6	80~120%	10.0	9.92	99.2	80~120%	0.102	0.101	1.4	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	92.5	80~120%	10.0	9.66	96.6	80~120%	0.0969	0.101	4.1	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	94.0	80~120%	1.00	1.02	102.1	80~120%	0.01021	0.01019	0.2	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	92.5	80~120%	10.0	9.79	97.9	80~120%	0.0986	0.100	1.6	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	91.0	80~120%	10.0	9.82	98.2	80~120%	0.1014	0.1011	0.3	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	92.3	80~120%	10.0	9.95	99.5	80~120%	0.114	0.116	1.8	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	107.2	85~115%	0.250	0.259	103.5	80~120%	0.00517	0.00518	0.2	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	98.1	80~120%	0.200	0.200	100.0	75~125%	0.00203	0.00206	1.5	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958451

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-19　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG5007501~02 (5月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	99.0	85~115%	-	-	-	-	9.57†	9.38†	2.0	0~25%
*	2	氟鹽	NIEA W415.52B	20.0	107.2	85~115%	1000	1046	104.6	80~120%	25.67	25.65	0.1	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	106.5	85~115%	1000	963	96.3	80~120%	11.8	11.9	0.4	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-1.7(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	196	197	0.3	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	99.2	85~115%	50.0	51.1	102.2	75~125%	27.1	27.9	2.9	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	97.7	85~115%	-	-	-	-	19.5	20.5	4.6	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	98.8	85~115%	5.00	5.09	101.7	85~115%	0.106	0.107	0.9	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.370	101.8	80~120%	18.9	19.3	101.8	75~125%	0.199	0.198	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	99.9	85~115%	1000	954	95.4	80~120%	68.8	67.6	1.7	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	108.7	80~120%	100	102	102.4	80~120%	1.056	1.064	0.8	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	107.4	80~120%	10.0	10.5	104.6	80~120%	0.114	0.111	2.5	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	107.0	80~120%	10.0	10.5	104.6	80~120%	0.105	0.106	1.2	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	107.0	80~120%	10.0	10.7	107.4	80~120%	0.110	0.107	3.4	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	107.7	80~120%	1.00	1.02	102.0	80~120%	0.0105	0.0103	1.8	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	107.2	80~120%	10.00	10.03	100.3	80~120%	0.103	0.102	1.3	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	107.2	80~120%	10.00	10.01	100.1	80~120%	0.103	0.102	0.6	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	106.9	80~120%	10.0	10.9	109.0	80~120%	0.126	0.121	4.0	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	94.1	85~115%	0.250	0.245	97.8	80~120%	0.00489	0.00493	0.7	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	100.1	80~120%	0.200	0.206	102.8	75~125%	0.00207	0.00212	2.7	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958452

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-20　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG5007601~02 (5月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	99.0	85~115%	-	-	-	-	9.57†	9.38†	2.0	0~25%
*	2	氟鹽	NIEA W415.52B	20.0	94.0	85~115%	1000	1187	118.7	80~120%	27.4	27.8	1.2	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	95.1	85~115%	1000	1107	110.7	80~120%	20.0	20.2	1.4	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-10.4(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	188	190	1.4	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	103.8	85~115%	50.0	50.9	101.9	75~125%	0.642	0.686	6.7	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	95.6	85~115%	-	-	-	-	40.0	38.5	3.9	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	98.8	85~115%	5.00	5.09	101.7	85~115%	0.106	0.107	0.9	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.371	99.0	80~120%	18.9	19.2	101.2	75~125%	0.197	0.193	1.9	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	101.0	85~115%	1000	883	88.3	80~120%	48.0	43.7	9.5	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	105.6	80~120%	100	93.6	93.6	80~120%	0.973	0.973	0.0	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	105.4	80~120%	10.0	9.57	95.7	80~120%	0.0392	0.0392	0.0	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	107.0	80~120%	10.0	10.5	104.6	80~120%	0.105	0.106	1.2	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	107.0	80~120%	10.0	10.7	107.4	80~120%	0.110	0.107	3.4	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	107.7	80~120%	1.00	1.02	102.0	80~120%	0.0105	0.0103	1.8	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	107.2	80~120%	10.00	10.03	100.3	80~120%	0.103	0.102	1.3	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	107.2	80~120%	10.00	10.01	100.1	80~120%	0.103	0.102	0.6	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	106.9	80~120%	10.0	10.9	109.0	80~120%	0.126	0.121	4.0	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	100.1	85~115%	0.250	0.251	100.4	80~120%	0.00502	0.00516	2.7	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	101.1	80~120%	0.200	0.203	101.5	75~125%	0.00206	0.00200	3.1	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958453

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-21 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PG5007701~02 (5月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	97.5	85~115%	-	-	-	-	0.681†	0.663†	2.7	0~25%
*	2	氨鹽	NIEA W415.52B	20.0	96.0	85~115%	1000	927	92.7	80~120%	13.2	12.8	2.9	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	97.3	85~115%	1000	906	90.6	80~120%	7.77	7.66	1.5	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+1.6(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	200	207	3.5	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	96.4	85~115%	50.0	46.9	93.8	75~125%	0.212	0.211	0.3	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	95.6	85~115%	-	-	-	-	40.0	38.5	3.9	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	99.0	85~115%	5.00	5.18	103.7	85~115%	0.450	0.465	3.2	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.371	99.0	80~120%	18.9	19.2	101.2	75~125%	0.197	0.193	1.9	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	101.0	85~115%	1000	883	88.3	80~120%	48.0	43.7	9.5	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	108.7	80~120%	100	102	102.4	80~120%	1.056	1.064	0.8	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	107.4	80~120%	10.0	10.5	104.6	80~120%	0.114	0.111	2.5	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	107.0	80~120%	10.0	10.5	104.6	80~120%	0.105	0.106	1.2	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	107.0	80~120%	10.0	10.7	107.4	80~120%	0.110	0.107	3.4	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	107.7	80~120%	1.00	1.02	102.0	80~120%	0.0105	0.0103	1.8	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	107.2	80~120%	10.00	10.03	100.3	80~120%	0.103	0.102	1.3	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	107.2	80~120%	10.00	10.01	100.1	80~120%	0.103	0.102	0.6	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	106.9	80~120%	10.0	10.9	109.0	80~120%	0.126	0.121	4.0	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	94.1	85~115%	0.250	0.245	97.8	80~120%	0.00489	0.00493	0.7	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	101.1	80~120%	0.200	0.203	101.5	75~125%	0.00206	0.00200	3.1	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958454

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-22 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PG5007801~02 (5月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	97.5	85~115%	-	-	-	-	4.61†	4.52†	2.0	0~25%
*	2	氨鹽	NIEA W415.52B	20.0	95.7	85~115%	1000	930	93.0	80~120%	21.8	20.8	5.0	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	97.2	85~115%	1000	887	88.7	80~120%	8.71	8.20	6.0	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-3.1(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	195	199	1.9	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	96.4	85~115%	50.0	46.9	93.8	75~125%	0.212	0.211	0.3	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	103.6	85~115%	-	-	-	-	18.9	17.4	8.3	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	99.0	85~115%	5.00	5.18	103.7	85~115%	0.450	0.465	3.2	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.371	99.0	80~120%	18.9	19.2	101.2	75~125%	0.197	0.193	1.9	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	101.0	85~115%	1000	883	88.3	80~120%	48.0	43.7	9.5	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	94.7	80~120%	100	97.0	97.0	80~120%	1.021	1.022	0.2	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	96.6	80~120%	10.0	9.51	95.1	80~120%	0.111	0.112	0.5	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	95.9	80~120%	10.0	9.35	93.5	80~120%	0.0952	0.0969	1.7	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	95.7	80~120%	10.0	9.59	95.9	80~120%	0.0964	0.0998	3.5	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	96.8	80~120%	1.00	0.971	97.1	80~120%	0.00984	0.00990	0.6	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	95.8	80~120%	10.0	9.77	97.7	80~120%	0.0993	0.0995	0.2	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	95.0	80~120%	10.0	9.86	98.6	80~120%	0.100	0.101	0.8	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	97.6	80~120%	10.0	9.89	98.9	80~120%	0.107	0.108	0.5	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	100.6	85~115%	0.250	0.234	93.7	80~120%	0.00838	0.00825	1.5	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	97.3	80~120%	0.200	0.198	98.8	75~125%	0.00198	0.00199	1.0	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958455

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-23 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.5.5

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正						檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T/2	☑良好 ☐異常:_____	校正點	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV) -12.4 / 斜率(mV/pH) -58.7	NIEA W217 W424
				pH						
				溫度	26.4	26.4	26.4	溫度：26.5		
				編號	110818-6-13	110818-6-07	111118-6-07	測值：7.01		
								編號：111223-6-03		
				分裝日期	2012.4.30	2012.4.30	2012.4.30	分裝日期：2012.4.30		
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1}) 0.450~0.500	NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)		
				26.4	1416	編號：110810-6-08		1413	0.484	
						分裝日期：2012.4.30				
☐鹽氣計	HACH 57800-00	ESPC-鹽氣計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____				NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否		
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[illegible] 2012.05.09

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-24 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：[illegible] 2012.05.05

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-25 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用/校正日期：2012.5.6

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.10)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
				pH							
				溫度	26.3	26.4	26.4	溫度：26.4			
				編號	110818-6-17	110818-6-05	110818-6-17	測值：7.01	-12.9	-57.4	
								編號：111223-6-03			
				分裝日期	2012.4.30	2012.4.30	2012.4.30	分裝日期：2012.4.20			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				26.3		1415	編號：110818(10810-6-08	1413	0.485		
							分裝日期：2012.4.20				
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. 保存期限：				NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否		
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：2012.05.06

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-26 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

審核人員：2012.05.06

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-27 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期：2012.5.7

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正						檢驗方法
☐溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T 12	☑良好 ☐異常:_____	校正點	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV) -11.7 / 斜率(mV/pH) -58.9	NIEA W217 W424
				pH						
				溫度	27.9	27.9	27.9	溫度：27.9		
				編號	110818-b-13	110818-b-05	111118-b-01	測值：9.01		
								編號：111223-b-03		
				分裝日期	2012.5.7	2012.5.7	2012.5.7	分裝日期：2012.5.7		
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})	NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500	
				27.8	1417	編號：110810-b-08 分裝日期：2012.5.7		1413	0.487	
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號		標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____		NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否		
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合 <0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[illegible] 2012.05.07

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-28 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☑ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：[illegible] 2012.05

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-29 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.5.3

使用人員：張小豪智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
				溫度	27.4	27.4	27.3	溫度：27.4	-13.1	-59.2		
				編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-07	測值：7.07				
				分裝日期	2012.5.7	2012.5.7	2012.5.7	編號：111213-6-03				
								分裝日期：2012.5.7				
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液						電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)		0.450~0.500		
				27.4	1417	編號：110810-6-08		1413		0.483		
						分裝日期：2012.5.7						
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____						NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否				
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否				
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否				
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否						

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-30 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若爲感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-31 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期：2012.5.9

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10		-12.7	-59.1	NIEA W217 W424
				溫度	26.8	26.7	26.7	溫度：26.7			
				編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-07	測值：7.01			
								編號：111123-6-03			
				分裝日期	2012.5.7	2012.5.7	2012.5.7	分裝日期：2012.5.7			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				26.7	1416	編號：110810-6-08		1413	0.683		
						分裝日期：2012.5.7					
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號		標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.			NIEA W408
								保存期限：			
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %	是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：王志義 5/9

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-32 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T01	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無縐痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：王志義

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-33 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期：2012.5.10

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用人員：陳小榮

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正						檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	校正後確認(pH=7.0)	零點偏移(mV) -12.7 / 斜率(mV/pH) -58.5	NIEA W217 W424
				pH						
				溫度	25.4	25.2	25.3	溫度：25.4		
				編號	(10818-6-13	(10818-6-05	11118-6-07	測值：7.01 編號：(11223-6-03		
				分裝日期	2012.5.7	2012.5.7	2012.5.7	分裝日期：2012.5.7		
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})	NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500	
				25.4	1417	編號：(10810-6-08 分裝日期：2012.5.7		1413	0.488	
☐鹽氣計	HACH 57800-00	ESPC-鹽氣計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號		標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.: 保存期限：		NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否		
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：5/10

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-34 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV					-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)		合格參考值±5%		
☑水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無縐痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：5/10

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-35 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG6000201~02 (6月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.0	85~115%	-	-	-	-	9.21†	9.11†	1.1	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	97.9	85~115%	1000	963	96.3	80~120%	18.5	18.2	1.6	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	98.8	85~115%	1000	896	89.6	80~120%	8.27	8.20	0.9	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-1.5 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	197	192	2.1	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	101.4	85~115%	50.0	49.8	99.6	75~125%	0.335	0.314	6.4	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	94.0	85~115%	-	-	-	-	3.38	3.68	8.6	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	99.0	85~115%	5.00	5.24	104.8	85~115%	0.838	0.840	0.2	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.361	99.4	80~120%	19.5	19.1	98.0	75~125%	0.220	0.219	0.7	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.8	85~115%	1000	1008	100.8	80~120%	154	162	4.5	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	107.1	80~120%	100	99.0	99.0	80~120%	1.05	1.04	0.2	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	104.5	80~120%	10.0	9.77	97.7	80~120%	0.100	0.104	3.3	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	104.6	80~120%	10.0	9.88	98.8	80~120%	0.0988	0.101	2.1	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	103.1	80~120%	10.0	10.3	103.2	80~120%	0.103	0.102	1.4	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	106.9	80~120%	1.00	1.07	106.6	80~120%	0.0107	0.0102	4.5	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	104.6	80~120%	10.0	10.5	104.8	80~120%	0.107	0.104	2.4	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	104.0	80~120%	10.0	10.4	104.1	80~120%	0.109	0.107	1.4	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	104.9	80~120%	10.0	10.3	103.4	80~120%	0.110	0.106	3.6	0~15%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	101.5	85~115%	0.250	0.257	102.8	80~120%	0.00514	0.00498	3.2	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	97.3	80~120%	0.2000	0.2003	100.1	75~125%	0.00203	0.00206	1.5	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959523

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-36 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PG6000301~02 (6月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.0	85~115%	-	-	-	-	9.21†	9.11†	1.1	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	97.9	85~115%	1000	963	96.3	80~120%	18.5	18.2	1.6	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	98.8	85~115%	1000	896	89.6	80~120%	8.27	8.20	0.9	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-1.5 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	197	192	2.1	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	101.4	85~115%	50.0	49.8	99.6	75~125%	0.335	0.314	6.4	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	94.0	85~115%	-	-	-	-	3.38	3.68	8.6	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	99.0	85~115%	5.00	5.24	104.8	85~115%	0.838	0.840	0.2	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.361	99.4	80~120%	19.5	19.1	98.0	75~125%	0.220	0.219	0.7	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	104.8	85~115%	1000	1008	100.8	80~120%	154	162	4.5	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	107.1	80~120%	100	99.0	99.0	80~120%	1.05	1.04	0.2	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	104.5	80~120%	10.0	9.77	97.7	80~120%	0.100	0.104	3.3	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	104.6	80~120%	10.0	9.88	98.8	80~120%	0.0988	0.101	2.1	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	103.1	80~120%	10.0	10.3	103.2	80~120%	0.103	0.102	1.4	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	106.9	80~120%	1.00	1.07	106.6	80~120%	0.0107	0.0102	4.5	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	104.6	80~120%	10.0	10.5	104.8	80~120%	0.107	0.104	2.4	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	104.0	80~120%	10.0	10.4	104.1	80~120%	0.109	0.107	1.4	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	104.9	80~120%	10.0	10.3	103.4	80~120%	0.110	0.106	3.6	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	101.5	85~115%	0.250	0.257	102.8	80~120%	0.00514	0.00498	3.2	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	97.3	80~120%	0.2000	0.2003	100.1	75~125%	0.00203	0.00206	1.5	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959524

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

品保品管報告

樣品編號： PG6000401~02 (6月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	108.0	85~115%	-	-	-	-	7.82†	7.41†	5.4	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	101.2	85~115%	1000	1083	108.3	80~120%	24.5	24.0	2.0	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	102.7	85~115%	1000	1049	104.9	80~120%	17.2	16.7	3.0	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+12.1 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	24.0	23.0	4.3	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	103.9	85~115%	50.0	53.1	106.2	75~125%	0.961	0.964	0.3	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	93.3	85~115%	-	-	-	-	7.14	6.32	12.1	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	101.8	85~115%	5.00	5.28	105.7	85~115%	0.1117	0.1120	0.2	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.377	98.7	80~120%	19.5	20.0	102.4	75~125%	0.209	0.207	1.2	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	97.9	85~115%	1000	927	92.7	80~120%	102	96.9	4.8	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	99.9	80~120%	100	98.4	98.4	80~120%	0.996	1.00	0.6	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	97.1	80~120%	10.0	9.51	95.1	80~120%	0.0534	0.0528	1.0	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	97.4	80~120%	10.0	9.78	97.8	80~120%	0.0989	0.0981	0.8	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	93.9	80~120%	10.0	9.97	99.7	80~120%	0.101	0.0972	3.3	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	100.0	80~120%	1.00	1.01	100.9	80~120%	0.0101	0.00996	1.3	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	97.1	80~120%	10.0	9.75	97.5	80~120%	0.0363	0.0360	0.8	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	99.1	80~120%	10.0	9.76	97.6	80~120%	0.101	0.102	0.6	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	97.2	80~120%	10.0	9.64	96.4	80~120%	0.0263	0.0259	1.6	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	101.5	85~115%	0.250	0.257	102.8	80~120%	0.00514	0.00498	3.2	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	99.9	80~120%	0.200	0.196	97.9	75~125%	0.00196	0.00197	0.8	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959525

品保品管報告

樣品編號： PG6000501~02 (6月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	107.0	85~115%	-	-	-	-	2.71†	2.61†	3.8	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	101.2	85~115%	1000	1083	108.3	80~120%	24.5	24.0	2.0	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	102.7	85~115%	1000	1049	104.9	80~120%	17.2	16.7	3.0	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+12.1(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	24.0	23.0	4.3	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	101.1	85~115%	50.0	50.2	100.5	75~125%	0.282	0.301	6.5	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	93.3	85~115%	-	-	-	-	7.14	6.32	12.1	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	101.8	85~115%	5.00	5.28	105.7	85~115%	0.1117	0.1120	0.2	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.377	98.7	80~120%	19.5	20.0	102.4	75~125%	0.209	0.207	1.2	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125.0	103.2	85~115%	1000	985	98.5	80~120%	66.9	68.9	2.9	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	93.9	80~120%	100	99.2	99.2	80~120%	1.02	1.03	1.2	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	93.1	80~120%	10.0	10.4	103.7	80~120%	0.195	0.198	1.6	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	93.9	80~120%	10.0	10.2	101.9	80~120%	0.105	0.106	0.8	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	93.8	80~120%	10.0	9.62	96.2	80~120%	0.0986	0.101	2.6	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	93.0	80~120%	1.00	1.03	103.3	80~120%	0.0103	0.0100	3.1	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	93.0	80~120%	10.0	9.76	97.6	80~120%	0.101	0.100	0.3	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	93.1	80~120%	10.0	9.64	96.4	80~120%	0.0994	0.0991	0.3	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	93.1	80~120%	10.0	9.09	90.9	80~120%	0.108	0.105	2.7	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	91.6	85~115%	0.250	0.254	101.7	80~120%	0.00508	0.00504	0.9	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	99.9	80~120%	0.200	0.196	97.9	75~125%	0.00196	0.00197	0.8	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959526

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-39　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PG6000601~02 (6月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	107.0	85~115%	-	-	-	-	2.71†	2.61†	3.8	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	102.8	85~115%	1000	994	99.4	80~120%	8.40	7.90	6.2	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	104.1	85~115%	1000	1025	102.5	80~120%	19.5	18.0	7.8	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-7.1 (mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	191	194	1.6	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	101.1	85~115%	50.0	50.2	100.5	75~125%	0.282	0.301	6.5	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	93.3	85~115%	-	-	-	-	7.14	6.32	12.1	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	100.3	85~115%	5.00	5.03	100.7	85~115%	0.220	0.219	0.1	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.375	99.0	80~120%	19.5	19.6	100.7	75~125%	0.204	0.203	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	103.2	85~115%	1000	985	98.5	80~120%	66.9	68.9	2.9	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	106.6	80~120%	100	95.4	95.4	80~120%	0.984	0.975	0.8	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	106.8	80~120%	10.0	10.1	100.6	80~120%	0.107	0.108	0.9	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	106.5	80~120%	10.0	10.1	101.5	80~120%	0.103	0.101	1.4	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	106.3	80~120%	10.0	9.10	91.0	80~120%	0.0946	0.100	5.9	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	108.6	80~120%	1.00	1.02	102.1	80~120%	0.0102	0.0100	2.1	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	106.4	80~120%	10.0	9.90	99.0	80~120%	0.100	0.101	0.8	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	105.5	80~120%	10.0	9.77	97.7	80~120%	0.0995	0.0997	0.2	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	107.1	80~120%	10.0	9.67	96.7	80~120%	0.106	0.107	0.6	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	91.6	85~115%	0.250	0.254	101.7	80~120%	0.00508	0.00504	0.9	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	99.9	80~120%	0.200	0.196	97.9	75~125%	0.00196	0.00197	0.8	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959600

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-40　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號：PG6000701~02 (6月份地下水)

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	94.5	85~115%	-	-	-	-	2.93†	2.84†	3.1	0~25%
*	2	氯鹽	NIEA W415.52B	20.0	94.7	85~115%	1000	1139	113.9	80~120%	19.1	19.2	0.9	0~20%
*	3	硫酸鹽	NIEA W415.52B	20.0	94.7	85~115%	1000	1138	113.8	80~120%	8.46	8.54	0.9	0~20%
	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+2.5(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	200	199	0.8	0~15%
*	5	總有機碳	NIEA W532.52C	3.00	101.1	85~115%	50.0	50.2	100.5	75~125%	0.282	0.301	6.5	0~15%
	6	化學需氧量	NIEA W515.54A	20.0	93.3	85~115%	-	-	-	-	7.14	6.32	12.1	0~20%
*	7	氨氮	NIEA W437.51C	0.835	100.3	85~115%	5.00	5.03	100.7	85~115%	0.220	0.219	0.1	0~15%
	8	硫化物	NIEA W433.51A	0.375	99.0	80~120%	19.5	19.6	100.7	75~125%	0.204	0.203	0.6	0~20%
*	9	總硬度	NIEA W208.51A	125	103.2	85~115%	1000	985	98.5	80~120%	66.9	68.9	2.9	0~15%
*	10	鐵	NIEA W311.52C	0.800	93.9	80~120%	100	99.2	99.2	80~120%	1.02	1.03	1.2	0~20%
*	11	錳	NIEA W311.52C	0.100	93.1	80~120%	10.0	10.4	103.7	80~120%	0.195	0.198	1.6	0~20%
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.100	93.9	80~120%	10.0	10.2	101.9	80~120%	0.105	0.106	0.8	0~20%
*	13	鉛	NIEA W311.52C	0.100	105.5	80~120%	10.0	10.6	106.1	80~120%	0.106	0.111	4.4	0~20%
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.0100	107.9	80~120%	1.00	1.008	100.8	80~120%	0.01008	0.01009	0.1	0~20%
*	15	鉻	NIEA W311.52C	0.100	106.5	80~120%	10.0	10.4	104.3	80~120%	0.105	0.106	0.5	0~20%
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.100	105.3	80~120%	10.0	10.3	103.1	80~120%	0.120	0.119	0.6	0~20%
*	17	鋅	NIEA W311.52C	0.100	106.8	80~120%	10.0	10.5	104.6	80~120%	0.1138	0.1137	0.1	0~20%
*	18	砷	NIEA W434.53B	0.0100	91.6	85~115%	0.250	0.254	101.7	80~120%	0.00508	0.00504	0.9	0~15%
*	19	汞	NIEA W330.52A	0.00500	102.2	80~120%	0.200	0.199	99.6	75~125%	0.00200	0.0020†	0.5	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959528

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-41 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.6.2

使用人員：劉[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☐pH=7	☐pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)	-11.2	-58.9	NIEA W217 W424
				溫度	25.1	25.1	25.1	溫度：25.2			
				編號	110818-b-13	110818-b-05	111118-b-01	測值：7.01			
								編號：111223-L-03			
				分裝日期	2012.5.28	2012.5.28	2012.5.28	分裝日期：2012.5.28			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				25.1		1417	編號：122229-b-03 分裝日期：2012.5.28	1413	0.487		
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：				NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %	是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合 <0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：謝志遠

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-42 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T、6	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：謝志遠

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-43 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用/校正日期：2012.6.3

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	本點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)	-10.8	-57.1	NIEA W217 W424
				溫度	25.4	25.4	25.4	溫度：25.5			
				編號	110818-b-13	110818-b-05	1108-b-01	測值：7.01			
				分裝日期	2012.5.28	2012.5.28	2012.5.28	編號：111023-b-03			
								分裝日期：2012.5.28			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				25.4	1416	編號：120229-b-03		1413	0.484		
						分裝日期：2012.5.28					
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____					NIEA W408
						保存期限：					
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：謝志遠 6/7

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-44 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☐OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☑WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液 _____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	---					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：謝志遠 6/7

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-45 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用/校正日期：2012.6.6

使用人員：劉偉智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☐ pH=10	(pH= 7.0)	-12.1	-59.3	NIEA W217 W424
				溫度	25.5	25.5	25.5	溫度：25.4			
				編號	110818-6-13	110818-6-05	110818-6-07	測值：7.01			
				分裝日期	2012.6.4	2012.6.4	2012.6.4	編號：111223-6-03			
								分裝日期：2012.6.4			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				25.5	1415	編號：120229-6-03		1413	0.482		
						分裝日期：2012.6.4					
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否					

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：2012.6.6

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-46 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：2012.6.06

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-47 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.6.7

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點	pH	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10	校正後確認 (pH=7.0)	零點偏移(mV) / 斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
					溫度	25.6	25.6	25.6	溫度：25.5	-13.2 / -59.4	
					編號	110818-6-13	110818-6-05	110818-6-07	測值：7.01		
					分裝日期	2012.6.4	2012.6.4	2012.6.4	編號：111223-6-03		
									分裝日期：2012.6.4		
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液						電極常數(cm^{-1})	NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500	
				25.5		1416	編號：120229-6-03		1413	0.488	
							分裝日期：2012.6.4				
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No.:_____				NIEA W408
							保存期限：				
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):			相對誤差值: %		是否符合±15% ☐是 ☐否		
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):			相對差異百分比: %		是否符合±20% ☐是 ☐否		
	空白樣品分析	測值(mg/L):					是否符合 <0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[illegible] 2012.06.07

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-48 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液 _____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T07	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若爲感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：[illegible] 2012.06.07

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-49 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　使用/校正日期：2012.1.8

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正						檢驗方法
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	校正點	☑ pH=7	☑ pH=4	☑ pH=10	校正後確認 (pH= 7.00)	本點偏移(mV) / 斜率(mV/pH)	NIEA W217 W424
				pH				溫度：25.2		
				溫度	25.3	25.3	25.3	測值：7.01	-13.2 / -58.7	
				編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-07	編號：111223-6-03		
				分裝日期	2012.06.04	2012.06.04	2012.06.04	分裝日期 2012.06.04		
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液						
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				25.2	1416	編號：120229-6-03 分裝日期：2012.06.04	1413	0.450~0.500 0.487		
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：_____				NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值: %	是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比: %	是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L) ☐是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：[illegible]

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-50 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	飽和溶氧確認					NIEA W455
				溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T06	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否光滑且無綢痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：　　標準件(mbar)：

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：[illegible]

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-51 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.6.9

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐ PH 330i ☑ PH 3210	ESPC-PH-T1~	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)	-10.9	-57.4	NIEA W217 W424
				溫度	25.0	25.0	25.1	溫度：25.0			
				編號	110818-6-13	110818-6-5	111118-6-07	測值：9.01			
				分裝日期	2012.6.4	2012.6.4	2012.6.4	編號：111227-6-03 分裝日期：2012.6.4			
☑導電度計	WTW ☐ COND 330i ☑ COND 3210	ESPC-COND-T6	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)	儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液		標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				25.1	1416	編號：120229-6-03 分裝日期：2012.6.4		1413	0.483		
☐餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T	☐良好 ☐異常:_____	波長(nm)	添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No._____ 保存期限：					NIEA W408
	查核分析	標準品濃度1(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值:	%	是否符合±15% ☐是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L):		測定值(mg/L):		相對誤差值:	%	是否符合±15% ☐是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L):		第二次測值(mg/L):		相對差異百分比:	%	是否符合±20% ☐是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L):				是否符合<0.02(mg/L)		☐是 ☐否			

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[signature] 2012.06.09

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.4-52 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐ OXI 330i ☐ OXI 3210	ESPC-DO-T	☐良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
☐ORP計	☐ Thermo 3STAR ☐ WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☑水位計	☑SOLINST ☐ IN SITU	ESPC-水位尺-T0	☑良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☐否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☐是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無綱痕。

☐是 ☐否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☐是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)： 標準件(mbar)：

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：[signature] 2012.06.09

附　錄　Ⅲ.5

海域水質品保品管記錄

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-1　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW4004101~08 (4月份海水(沿岸海域))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.0	85~115%	-	-	-	-	2.84†	2.75†	3.2	0~25%
*	2	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	1.20	1.20	0.0	0~20%
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+9.8(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	208	198	4.8	0~15%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	107.7	85~115%	1.00	1.05	105.4	80~120%	0.0690	0.0671	2.8	0~15%
*	5	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	99.6	80~120%	5.00	4.73	94.7	80~120%	0.492	0.497	1.0	0~20%
*	6	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	94.8	80~120%	5.00	4.39	87.8	80~120%	0.442	0.442	0.0	0~20%
*	7	海水中鎘	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0020	97.2	80~120%	2.00	2.27	113.3	80~120%	0.228	0.226	0.4	0~20%
*	8	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0100	100.0	80~120%	8.00	7.35	91.9	80~120%	0.901	0.899	0.2	0~20%
	9	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	95.0	80~120%	5.00	4.29	85.9	80~120%	0.442	0.439	0.6	0~20%
	10	海水中鉻	NIEA W309.22A	0.0200	95.7	80~120%	20.0	19.0	95.2	75~125%	0.0190	0.0201	5.3	0~20%
*	11	汞	NIEA W330.52A	0.0060	104.8	80~120%	0.200	0.216	107.8	75~125%	0.00228	0.00217	4.6	0~20%
	12	鎂	NIEA W311.52C	2.50	104.0	80~120%	250	285	114.0	80~120%	1323	1326	0.2	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956893

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-2　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW5006501~08 (5月份海水(沿岸海域))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	105.5	85~115%	-	-	-	-	7.41†	7.15†	3.6	0~25%
*	2	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	9.25	9.50	2.7	0~20%
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-5.9(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	192	213	10.5	0~15%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	94.0	85~115%	1.00	1.06	105.7	80~120%	4.53	4.74	4.6	0~15%
*	5	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	99.7	80~120%	5.00	5.53	110.6	80~120%	0.587	0.580	1.1	0~20%
*	6	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	100.1	80~120%	5.00	5.67	113.3	80~120%	0.575	0.568	1.3	0~20%
*	7	海水中鎘	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0020	114.0	80~120%	2.00	1.77	88.4	80~120%	0.180	0.179	0.5	0~20%
*	8	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0100	106.2	80~120%	8.00	7.68	96.0	80~120%	1.06	1.05	0.7	0~20%
	9	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	96.1	80~120%	5.00	5.50	110.1	80~120%	0.575	0.572	0.5	0~20%
	10	海水中鉻	NIEA W309.22A	0.0200	96.1	80~120%	20.0	19.7	98.3	75~125%	0.0197	0.0208	5.8	0~20%
*	11	汞	NIEA W330.52A	0.0060	101.7	80~120%	0.200	0.219	109.7	75~125%	0.00255	0.00240	6.1	0~20%
	12	鎂	NIEA W311.52C	2.50	103.3	80~120%	250	220	88.1	80~120%	71.1	71.2	0.1	0~20%
		以下空白												
備註	1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。													

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6957988

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-3 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW6000601~08 (6月份海水(沿岸海域))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	1	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	98.0	85~115%	-	-	-	-	4.74†	4.68†	1.3	0~25%
*	2	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	4.80	5.15	7.0	0~20%
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-8.7(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	128	116	9.9	0~15%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	91.0	85~115%	1.00	0.968	96.8	80~120%	0.0846	0.0806	4.9	0~15%
*	5	海水中銅	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	102.2	80~120%	5.00	5.42	108.4	80~120%	0.552	0.537	2.8	0~20%
*	6	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	101.0	80~120%	5.00	5.16	103.2	80~120%	0.519	0.500	3.6	0~20%
*	7	海水中鎘	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0020	115.3	80~120%	2.00	1.87	93.7	80~120%	0.189	0.184	2.4	0~20%
*	8	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0100	107.5	80~120%	8.00	9.10	113.8	80~120%	1.07	1.05	2.2	0~20%
	9	海水中鎳	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0050	97.8	80~120%	5.00	5.16	103.2	80~120%	0.523	0.506	3.3	0~20%
	10	海水中鉻	NIEA W309.22A	0.0200	106.3	80~120%	20.0	20.9	104.5	75~125%	0.0213	0.0215	0.6	0~20%
*	11	汞	NIEA W330.52A	0.0060	101.0	80~120%	0.200	0.182	90.9	75~125%	0.00193	0.00200	3.2	0~20%
	12	鎂	NIEA W311.52C	2.50	101.2	80~120%	250	255	102.0	80~120%	949	943	0.6	0~20%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 7882564

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.sgs.tw
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-4 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW4004301 (4月份海水(漁港部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-11.4(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	93.7	92.2	1.6	0~15%
*	2	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	2.50	2.65	5.8	0~20%
	3	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	99.5	85~115%	-	-	-	-	0.802†	0.782†	2.5	0~25%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	105.5	85~115%	1.00	1.03	103.3	80~120%	0.0116	0.0110	5.6	0~15%
		以下空白												

備註 1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956904

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-5　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW5006701 (5月份海水(漁港部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	+12.7(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	453	467	2.9	0~15%
*	2	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	3.90	3.90	0.0	0~20%
	3	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	104.5	85~115%	-	-	-	-	0.484†	0.468†	3.4	0~25%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	92.5	85~115%	1.00	1.08	108.3	80~120%	0.0132	0.0125	5.1	0~15%
		以下空白												
備註		1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。												

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6957991

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com

1002

Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-6　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號： PW6000801 (6月份海水(漁港部分))

認證	序號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
		檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
*	1	生化需氧量	NIEA W510.55B	198	-2.2(mg/L)	±30.5mg/L	-	-	-	-	497	466	6.5	0~15%
*	2	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	-	-	-	-	-	-	-	4.65	4.55	2.2	0~20%
	3	濁度	NIEA W219.52C	20.0†	97.0	85~115%	-	-	-	-	1.36†	1.31†	3.7	0~25%
*	4	總磷	NIEA W427.53B	0.0424	93.2	85~115%	1.00	0.958	95.8	80~120%	0.0170	0.0164	3.8	0~15%
		以下空白												
備註		1."†"表示濁度的分析值單位爲NTU。												

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 7882568

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.sgs.tw

1002

Member of SGS Group

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-7 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(四)

使用/校正日期：2012.4.3

使用人員：蔡小惠智

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)			NIEA W217 W424
				溫度	22.4	22.3	22.3	溫度：22.3			
				編號	110826-13	110818-1-08	111118-6-07	測值：7.01	-12.3	-58.4	
								編號：111223-6-03			
				分裝日期	2012.4.2	2012.4.2	2012.4.2	分裝日期：2012.4.2			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☐良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				22.3		1417	編號：110810-6-08	1413	0.682		
							分裝日期：2012.4.2				
☑餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T02	☑良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. A133918				NIEA W408
				528		21057-69	保存期限：2013.12				
	查核分析	標準品濃度1(mg/L): 0.23		測定值(mg/L): 0.25			相對誤差值: 8.7 %	是否符合±15% ☑是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L): 1.64		測定值(mg/L): 1.67			相對誤差值: 1.83 %	是否符合±15% ☑是 ☐否			
	重覆分析	第一次測值(mg/L): 0.04		第二次測值(mg/L): 0.04			相對差異百分比: 0 %	是否符合±20% ☑是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L): 0.0					是否符合<0.02(mg/L) ☑是 ☐否				

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：蔡承甫 2012.04.03

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-8 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☑DO計	WTW ☐OXI 330i ☑OXI 3210	ESPC-DO-T10	☑良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
				22.0	8.74	8.79	101.3	0.89	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☐SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無刮痕。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：1016 標準件(mbar)：1016

FORM-TESP-PW-101-02 版次：7.6 發行日期：2012.03.15

審核人員：蔡承甫 2012.04.03

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-9 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.5.3

使用人員：[illegible]

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	本點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☐pH=4	☐pH=10	(pH=7.0)	-13.2	-59.2	NIEA W217 W424
				溫度	28.2	28.2	28.2	溫度：28.3			
				編號	110818-6-13	110818-6-05	111118-6-07	測值：7.01			
				分裝日期	2012.4.30	2012.4.30	2012.4.30	編號：111223-6-03			
								分裝日期：2012.4.30			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)		標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500	
				28.3		1416		編號：110810-6-08	1413	0.487	
								分裝日期：2012.4.30			
☑餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T02	☑良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號		標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. A13393			NIEA W408
				528		21056-69		保存期限：2013.12			
	查核分析	標準品濃度1(mg/L): 0.73		測定值(mg/L): 0.75				相對誤差值: 8.7 %	是否符合±15% ☑是 ☐否		
		標準品濃度2(mg/L): 1.64		測定值(mg/L): 1.67				相對誤差值: 1.83 %	是否符合±15% ☑是 ☐否		
	重覆分析	第一次測值(mg/L): 0.91		第二次測值(mg/L): 0.92				相對差異百分比:1.09%	是否符合±20% ☑是 ☐否		
	空白樣品分析	測值(mg/L):<0.02						是否符合<0.02(mg/L) ☑是 ☐否			

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：[illegible] 2012.05.03

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-10 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☐DO計	WTW ☐OXI 330i ☑OXI 3210	ESPC-DO-T10	☑良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
				28.1	7.81	7.90	101.2	0.82	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☐SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7~1.25	OK
0.6~0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：1011 標準件(mbar)：1011

審核人員：[illegible] 2012.05.03

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-11 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱或地點：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

使用/校正日期：2012.6.4

使用人員：劉小豪郎

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正							檢驗方法
				校正點				校正後確認	零點偏移(mV)	斜率(mV/pH)	
☑溫度計/pH計	WTW ☐PH 330i ☑PH 3210	ESPC-PH-T12	☑良好 ☐異常:_____	pH	☑pH=7	☑pH=4	☑pH=10	(pH=7.0)	-11.4	-58.9	NIEA W217 W424
				溫度	25.6	25.6	25.4	溫度：25.5			
				編號	110818-6-13	110818-6-07	111118-6-07	測值：7.01 編號：111223-6-03			
				分裝日期	2012.6.4	2012.6.4	2012.6.4	分裝日期：2012.6.4			
☑導電度計	WTW ☐COND 330i ☑COND 3210	ESPC-COND-T06	☑良好 ☐異常:_____	標準溶液 0.01N KCl溶液					電極常數(cm^{-1})		NIEA W203
				溫度(℃)		儀器讀值(μmho/cm)	標準溶液	標準讀值(μmho/cm)	0.450~0.500		
				25.6		1416	編號：120229-6-03 分裝日期：2012.6.4	1413	0.481		
☑餘氯計	HACH 57800-00	ESPC-餘氯計-T02	☑良好 ☐異常:_____	波長(nm)		添加試劑及種類/代號	標準品編號 HACH CAT NO. 26353-00 Lot No. A133913				NIEA W408
				528		21056-69	保存期限：2013.12				
	查核分析	標準品濃度1(mg/L): 0.23		測定值(mg/L): 0.25			相對誤差值: 8.7 %	是否符合±15% ☑是 ☐否			
		標準品濃度2(mg/L): 1.64		測定值(mg/L): 1.65			相對誤差值: 0.61 %	是否符合±15% ☑是 ☐否			
	重複分析	第一次測值(mg/L): 0.91		第二次測值(mg/L): 0.92			相對差異百分比: 1.09%	是否符合±20% ☑是 ☐否			
	空白樣品分析	測值(mg/L): <0.02					是否符合<0.02(mg/L)	☑是 ☐否			

※pH使用注意事項:

1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點偏移（Asymmetry）及斜率（Slope），電極允收範圍如下：

校正	允收範圍
零點偏移	-25mV～25mV

校正	允收範圍
斜率	-61～-56mV/pH

2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

審核人員：謝志遠 6/4

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄Ⅲ.5-12 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表(續)

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	儀器校正					檢驗方法
				飽和溶氧確認					
☑DO計	WTW ☐OXI 330i ☑OXI 3210	ESPC-DO-T10	☑良好 ☐異常:_____	溫度(℃)	飽和溶氧值	讀值	溶氧百分比(%)	斜率	NIEA W455
				25.8	8.14	8.11	101.3	0.84	
☐ORP計	☐Thermo 3STAR ☐WTW PH 3210	ESPC-ORP-T	☐良好 ☐異常:_____	標準校正液_____mV			合格參考值±5%		-
				溫度(℃)	儀器讀值(mV)				
☐水位計	☐SOLINST ☐IN SITU	ESPC-水位尺-T	☐良好 ☐異常:_____	—					-

※DO使用注意事項:

1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。

2.量測時若爲感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。

3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	電極狀況
0.7～1.25	OK
0.6～0.7	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極
<0.6或>1.25	電極校正無效

5.電極檢查:

☐是 ☑否-電極內是否有氣泡。

☐是 ☑否-電極薄膜是否污損或因氧化而嚴重變黑。

☐是 ☑否-電極薄膜表面是否有氣泡。

☑是 ☐否-電極薄膜表面是否光滑且無絹痕。

☐是 ☑否-電極是否破損。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

☑是 ☐否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar)：1010 標準件(mbar)：1010

※不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(℃)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

審核人員：謝志遠

附 錄 Ⅳ

原 始 數 據

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附　錄　Ⅳ.1

氣象監測成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附錄Ⅳ.1-2 101年4月低塔63公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 63.0 M MONTHLY REPORT

Apr. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO
LOCATION : 25?3'N、121?5'E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (Low Tower)
INST. Ht. : 63.0m
Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN	
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	ENE	4.5	E	4.4	E	4.6	ENE	5.2	ENE	6.2	ENE	6.4	ENE	6.3	ENE	6.2	E	6.1	E	5.6	ESE	5.5	SE	3.8				
	SE	2.1	SE	3.6	SE	3.4	SE	5.4	SE	6.1	SSE	5.5	SSE	7.1	SE	6.1	SSE	4.1	SSE	1.6	SSE	4.9	SSW	2.2	116.9	SE	4.9	
2	S	3.8	SSW	4.0	S	4.2	S	4.2	SSE	5.4	SW	3.9	SSE	2.5	ESE	0.5	SE	1.8	ESE	1.2	SE	5.0	E	1.5				
	ENE	1.9	NE	2.3	NNE	2.6	NE	1.7	NNE	1.2	SSE	1.0	WSW	1.4	NW	2.2	SSW	1.1	SW	1.0	NW	1.1	SW	0.4	55.9	SSE	2.3	
3	S	1.3	W	2.3	ESE	0.7	WNW	4.1	WNW	3.6	W	4.5	W	5.9	W	7.4	W	8.4	WNW	7.5	N	11.1	N	8.4				
	N	8.6	N	8.6	NNE	8.0	NNE	7.0	NNE	6.3	NE	6.7	NE	5.8	ENE	4.8	ENE	5.0	ENE	4.8	NE	5.1	ESE	2.3	138.2	W	5.8	
4	SE	2.6	SE	3.4	SE	3.1	SE	2.6	SE	3.3	SSE	3.5	SE	3.7	SE	6.3	SE	5.7	SE	7.3	SE	6.7	SSE	6.3				
	SSE	8.0	SSE	8.0	SSE	8.4	SSE	7.2	S	6.6	S	5.5	S	5.6	SSW	4.3	S	4.5	S	5.5	SSW	6.9	SSW	3.3	128.3	SE	5.3	
5	SSW	4.5	NW	2.1	W	0.5	SSW	0.7	W	2.1	WNW	3.9	W	0.9	WNW	2.6	WNW	2.3	WNW	0.9	SSE	0.5	WSW	1.5				
	N	2.5	N	2.8	N	2.6	N	4.0	N	4.4	N	4.3	NNW	1.9	WNW	1.4	WNW	2.6	NW	1.1	NW	1.8	WNW	2.2	54.1	WNW	2.3	
6	NW	3.0	NNE	2.8	N	2.1	NE	3.4	N	2.5	NE	5.5	NE	8.4	NE	7.0	NE	6.0	ENE	4.0	ENE	5.3	NE	7.0				
	NE	7.5	NE	5.9	NNW	3.2	W	1.6	WSW	1.4	S	3.2	S	4.7	W	1.8	SSW	2.4	S	2.8	S	1.0	SSW	2.1	94.6	NE	3.9	
7	SE	1.6	SSW	0.6	S	3.7	SW	2.2	SW	2.1	S	5.5	S	1.8	S	3.0	SSE	3.5	S	5.6	SSE	5.2	SSE	4.5				
	SE	4.4	SE	4.7	SE	4.6	SE	4.1	SE	4.0	SE	7.6	S	5.7	SSE	6.2	SSE	5.8	S	5.5	S	6.3	SSE	4.2	102.4	S	4.3	
8	SSE	4.6	SSE	4.6	SSE	3.8	SSE	3.3	SSE	4.8	S	5.2	SSE	2.6	SSE	4.4	SSE	6.9	SSE	6.3	SSE	5.0	S	6.5				
	SSE	5.2	S	4.6	S	2.8	SSE	3.0	SSE	4.2	SSW	2.1	S	3.4	S	3.7	SSW	2.7	WSW	1.0	S	4.8	SSE	2.9	98.4	SSE	4.1	
9	S	3.2	SSE	5.0	SSE	6.0	SE	3.0	SSE	3.9	S	3.3	SSE	4.2	SSE	4.1	SSE	4.5	SSE	5.4	SSE	5.0	SSE	4.7				
	SSE	4.5	SSE	4.6	SSE	3.0	SE	2.1	NNE	1.0	ENE	0.9	ENE	1.8	E	1.8	SE	4.3	SSE	3.6	SSE	3.7	SSE	5.4	89.0	SSE	3.7	
10	SSE	5.6	SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	4.2	NW	2.0	S	2.6	SSW	2.2	SSE	3.2	SSE	2.6	SSE	4.0	E	1.6	NNE	2.6				
	SE	2.2	E	0.9	SE	3.4	SSE	5.3	S	6.1	S	5.6	S	6.5	SSE	8.3	SSE	7.1	SSE	5.8	S	8.3	S	5.6	107.3	SSE	4.5	
11	S	3.6	S	1.3	S	0.8	E	0.6	WNW	2.1	W	1.1	NNW	0.8	E	1.1	ESE	1.6	E	1.6	ENE	2.6	E	1.5				
	SE	2.8	E	1.9	SE	2.6	SE	2.1	SSE	3.3	SW	2.3	NNE	2.2	NNE	1.0	W	1.5	NNE	3.4	NE	5.9	NE	4.1	51.8	E	2.2	
12	NNE	1.8	SSE	0.4	S	1.3	W	0.7	C	0.0	NW	1.9	WNW	0.9	NW	1.8	NNE	0.3	NE	2.0	NE	3.2	ENE	2.6				
	NE	2.7	ENE	1.5	ENE	2.1	NNE	2.9	NNE	1.9	NW	1.0	WNW	0.5	SE	0.9	SSE	0.4	NW	2.3	C	0.0	WSW	1.8	34.9	NNE	1.5	
13	W	2.8	S	1.2	W	1.1	NW	1.3	W	5.7	WSW	1.7	WSW	2.1	W	1.1	WNW	4.1	W	4.3	NE	3.6	E	3.1				
	NE	2.3	ENE	1.8	ENE	2.4	ENE	1.8	NE	1.1	ENE	0.6	NNW	0.8	NW	1.1	SW	0.7	W	0.4	SSW	1.0	NNE	4.7	50.8	W	2.1	
14	NNE	5.3	NNE	5.8	NNE	3.8	NE	5.8	NE	6.1	NE	4.3	NE	4.6	NE	3.5	NE	4.6	NNE	4.8	NNE	5.9	NE	3.9				
	NNE	4.1	NNE	3.8	NNE	4.1	NE	3.9	NNE	3.5	NE	2.8	NNW	1.2	SSW	0.5	WSW	0.9	SSW	0.9	W	1.0	WNW	0.8	85.9	NNE	3.6	
15	W	1.4	WSW	1.1	WNW	1.2	SSW	1.2	S	1.2	WSW	0.8	SW	0.9	W	1.5	WNW	2.4	NW	2.4	NNE	2.0	W	1.6				
	WSW	3.1	ESE	1.4	N	3.5	N	3.2	ENE	0.5	NNE	1.7	S	0.6	WSW	0.5	SSW	1.2	NW	3.2	SW	1.9	WNW	4.2	42.7	WSW	1.8	
16	ANW	2.0	NW	3.9	NNW	4.3	N	7.4	N	5.5	N	5.5	NNW	5.3	N	4.2	NNW	3.9	N	5.1	N	5.6	N	5.8				
	N	5.2	N	4.2	N	5.4	N	4.1	NNE	4.1	N	3.4	NW	3.4	NW	3.3	NW	2.8	NW	2.2	NW	2.4	NW	2.5	101.5	N	4.2	
17	NNW	2.3	NNW	1.6	NW	2.1	NW	1.9	NNW	2.2	NNE	3.4	NE	4.6	NE	2.8	NE	2.9	ENE	2.6	ENE	2.0	ENE	2.2				
	E	2.0	E	2.3	E	2.5	ENE	3.7	NE	4.8	NE	5.7	NNE	3.9	NE	4.4	S	1.2	WNW	0.8	WSW	1.6	SSW	0.9	64.4	NE	2.7	
18	S	2.5	SSW	1.1	WSW	1.5	SW	1.7	W	3.7	SSW	1.2	WNW	1.1	WNW	0.9	ESE	0.4	SE	0.9	E	1.5	ESE	3.1				
	SE	4.9	S	4.5	S	2.8	SW	1.3	WSW	2.4	WSW	1.5	S	0.6	SW	2.4	SW	3.5	WNW	2.4	SW	0.3	W	1.2	47.4	SW	2.0	
19	WSW	1.7	S	0.7	N	0.9	WSW	1.3	W	1.1	SSW	0.7	W	0.8	WNW	0.9	NE	0.7	ENE	1.3	NE	2.0	NE	2.3				
	NE	1.7	NE	2.2	NE	2.6	NNE	2.0	NNE	4.0	NE	1.0	NE	2.1	NE	1.1	E	2.7	ENE	0.8	C	0.0	NW	0.5	35.1	NE	1.5	
20	NW	1.0	NW	0.9	NNE	1.5	NNE	2.0	NE	2.4	NNE	0.9	SE	1.4	E	2.8	E	2.0	ENE	3.6	E	3.3	E	3.5				
	ENE	3.5	NE	2.5	E	2.4	E	2.1	E	3.0	E	1.9	ESE	1.5	NW	0.8	SSW	1.5	SE	0.7	S	2.8	SSE	1.1	49.1	E	2.0	
21	W	3.8	SE	0.7	WNW	0.8	W	1.1	ENE	0.3	NW	1.9	WNW	1.4	SE	0.9	ESE	1.3	NE	2.3	NE	2.3	ENE	2.0				
	NNE	3.6	NNE	2.8	NNE	1.9	W	1.7	W	4.1	WNW	6.4	W	6.2	W	3.4	W	2.2	WNW	3.8	N	1.5	NNE	5.0	61.4	W	2.6	
22	NNE	8.6	N	6.5	N	5.8	NNW	1.3	NW	1.4	NW	1.4	ENE	3.7	ENE	3.6	NE	4.6	ENE	3.7	ENE	3.0	ENE	3.2				
	ENE	2.3	E	3.2	E	3.4	E	3.0	ESE	2.3	SE	2.1	SSE	2.1	SSE	1.6	SSE	2.7	SE	0.8	S	1.4	S	0.9	72.6	ENE	3.0	
23	S	1.4	SSE	3.0	S	2.0	WNW	1.8	SW	1.9	W	1.4	SSE	0.5	SSE	3.9	SSE	2.6	SSE	6.2	SE	4.8	SE	6.1				
	SE	4.9	SSE	5.3	SSE	6.0	SSE	3.6	SSE	4.0	S	2.6	SSE	2.9	S	2.2	SSE	4.7	S	5.2	S	5.3	W	1.5	83.8	SSE	3.5	
24	S	1.0	WSW	1.6	SW	2.0	WSW	1.8	SSE	0.3	NW	0.9	SE	1.3	SSW	4.9	SSW	4.8	S	3.6	SSE	3.4	SSE	3.6				
	S	4.2	SSE	6.0	S	6.1	WSW	3.3	N	1.1	W	1.3	NE	0.6	WNW	0.6	S	0.8	W	0.6	SSW	1.3	WSW	3.6	58.7	S	2.4	
25	W	5.9	W	4.5	NNW	1.4	S	0.8	SW	0.8	NW	1.3	SSE	1.1	NW	1.9	N	0.9	ENE	1.5	N	0.8	NNE	1.9				
	NE	1.1	NE	1.0	SE	0.7	NNW	1.0	WSW	3.8	W	8.2	WSW	4.7	WSW	2.8	SSW	3.1	WNW	5.3	WNW	4.2	WSW	4.0	62.7	WSW	2.6	
26	W	4.2	NNE	10.8	NNE	9.8	NE	10.8	NNE	11.0	N	6.7	NNE	9.2	NNE	11.0	NE	6.0	NE	5.6	NE	4.6	NE	7.3				
	NE	4.3	ESE	1.7	ENE	3.0	ENE	1.5	WSW	2.5	W	1.1	SSW	2.1	S	3.3	E	3.6	ESE	2.4	SE	2.6	SSE	2.6	127.7	NE	5.3	
27	SSE	1.7	S	1.3	SSE	1.0	SSE	1.6	N	0.6	SSW	1.6	S	2.8	S	3.5	SSE	1.6	SSE	2.3	WSW	1.2	SSW	1.7				
	S	0.7	SSW	1.6	ESE	1.2	S	3.6	SW	2.1	W	1.0	SW	1.5	SSW	4.3	WSW	2.1	W	2.0	SW	4.1	S	3.2	48.3	S	2.0	
28	SSW	2.6	WSW	1.4	WSW	2.2	S	0.7	S	1.3	NW	2.1	WNW	1.5	SSE	5.6	SSE	4.5	SSE	4.0	SSE	5.3	SSE	4.7				
	SSE	4.5	SSW	1.5	SW	1.9	S	0.4	C	0.0	C	0.0	SW	0.7	WSW	2.5	W	0.7	SW	0.6	SSE	1.5	WSW	1.4	51.6	SSE	2.2	
29	W	0.3	W	0.6	SW	1.4	WSW	2.7	WSW	1.3	WNW	0.9	W	0.4	ESE	0.7	SE	3.4	SSE	3.1	S	5.9	S	1.3				
	WNW	0.9	NE	0.9	NNE	1.7	C	0.0	NE	1.5	NW	2.9	NNE	0.9	SSW	1.5	WNW	2.8	NW	1.2	SW	0.7	SW	1.4	38.4	SW	1.6	
30	WSW	1.7	W	2.2	WNW	0.5	NW	1.8	W	7.1	W	6.9	W	5.9	S	1.7	ENE	1.4	NNE	1.5	NE	1.6	SE	4.3				
	SE	3.2	SE	3.4	SSE	3.8	WSW	4.1	NNE	0.5	NW	1.5	SSE	1.2	NW	0.6	S	0.3	WSW	2.0	W	0.7	W	1.2	59.1	W	2.5	

PVL.	S		SSE		S		NE		W		NW		SSE		SSE		SSE		SSE		NE		SSE					
W/D	NE		NE		NNE		SE		NNE		NE		S		NW		SSE		NW		S		SSE				SSE	
SUM.		90.3		85.4		80.1		81.2		91.9		90.9		88.8		103.0		101.8		110.2		115.5		112.5				
W/S		108.9		99.5		102.1		90.7		91.8		91.4		83.6		79.4		79.0		73.7		84.1		77.2	2213.0		92.2	
MEAN		3.0		2.8		2.7		2.7		3.1		3.0		3.0		3.4		3.4		3.7		3.9		3.7				
W/S		3.6		3.3		3.4		3.0		3.1		3.0		2.8		2.6		2.6		2.5		2.8		2.6	73.8		3.1	

附錄Ⅳ.1-1 101年4月低塔21公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 21.0 M MONTHLY REPORT

Apr. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO
LOCATION : 25?3'N、121?5'E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (Low Tower)
INST. Ht. : 21.0m
Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN	
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	ENE	2.4	ESE	1.6	E	2.1	ENE	2.4	ENE	3.0	ENE	2.7	ENE	2.5	ENE	2.7	E	2.3	E	1.8	ESE	2.6	SE	2.2				
	SE	1.5	SE	2.0	SE	2.7	SSE	3.3	SSE	2.9	SSE	4.1	SSE	3.5	SSE	2.0	SSE	0.7	S	2.6	SSW	1.2	56.8	ENE	2.4			
2	S	2.4	S	2.4	S	2.6	S	2.6	S	3.7	SW	2.0	SSE	1.1	C	0.0	SE	1.0	E	0.7	SE	2.7	ENE	1.3				
	NNE	1.2	NNE	1.7	NNE	2.3	ENE	1.3	NE	0.8	SSW	0.6	NW	0.3	NW	1.2	WNW	0.6	WSW	0.4	NW	0.7	WNW	0.5	34.1	S	1.4	
3	S	0.9	NW	0.9	C	0.0	W	1.2	W	1.8	W	2.5	W	2.9	W	4.3	W	6.3	WNW	4.6	N	6.1	N	5.0				
	N	4.9	NNE	4.7	NNE	4.2	NNE	4.2	NNE	3.3	NE	3.2	NE	2.2	NE	2.4	ENE	2.4	ENE	2.0	ENE	2.2	SE	1.0	73.2	W	3.1	
4	S	1.6	SSE	1.5	SSE	1.0	WSW	0.5	S	0.9	SSW	1.1	SE	1.2	SE	3.7	SSE	3.4	SSE	3.3	SE	4.1	S	3.8				
	SSE	5.1	S	5.0	SSE	5.0	S	5.5	S	4.0	S	3.3	S	3.6	SSW	2.1	S	2.4	SSW	3.1	SSW	3.4	SSW	1.2	69.8	S	2.9	
5	SSW	1.8	NNW	1.2	NW	1.0	NW	0.4	WNW	0.6	NW	1.8	NE	0.4	W	0.7	NW	0.6	C	0.0	S	0.3	WSW	0.8				
	NNE	1.5	N	1.5	N	1.1	NNE	2.5	N	2.5	N	2.0	NNW	0.7	WNW	0.5	NW	0.9	NW	0.4	NNW	0.4	NW	1.0	24.1	NW	1.0	
6	NW	1.1	NNW	0.4	NW	0.5	NW	0.5	NNW	1.0	NE	1.5	NE	3.6	NE	2.9	ENE	2.4	ENE	1.8	ENE	1.8	NE	2.4				
	NNE	3.3	NE	2.2	NNW	1.5	SSW	0.9	WSW	0.7	SW	0.7	SSW	2.1	WNW	0.8	NW	0.7	WSW	0.8	C	0.0	WNW	0.4	34.0	NE	1.4	
7	SW	0.6	NNW	0.7	SW	1.4	WNW	1.2	NW	1.3	SSW	1.5	NW	0.7	S	1.0	S	1.7	S	4.1	S	3.3	SE	2.4				
	SSE	2.4	SSE	2.7	SE	2.7	SSE	2.5	SSE	2.1	SSE	4.1	S	3.7	S	4.0	SSE	3.5	S	2.5	SSE	3.3	SSE	1.9	55.3	SSE	2.3	
8	SSE	2.6	SSE	2.4	SSE	1.9	SSE	1.9	S	2.7	S	3.2	SSW	1.7	S	3.1	SSE	4.2	S	3.7	SSE	3.5	S	4.9				
	S	3.2	S	2.9	S	2.0	SSE	1.4	SSE	2.2	WSW	1.1	SSW	1.9	S	2.2	SSW	1.3	NW	0.6	S	2.9	S	1.6	59.1	S	2.5	
9	S	1.8	S	2.7	SSE	3.4	SSE	1.3	SSE	2.4	SSE	2.1	SSE	2.3	SSE	3.5	SSE	2.9	S	3.0	SSE	2.9	S	2.7				
	SSE	2.6	SSE	2.7	SSE	1.5	SE	0.7	NNE	0.7	NNE	0.5	ENE	0.5	ENE	0.8	SE	1.4	SSE	1.6	SSE	1.4	SSE	2.8	48.2	SSE	2.0	
10	S	3.4	SSE	2.3	SSE	2.9	SSE	2.4	WNW	0.7	SSW	1.3	SSW	1.5	SSE	2.3	S	1.8	SE	2.0	ENE	1.4	NNE	1.9				
	NE	1.3	ENE	0.9	SSE	2.5	S	4.2	S	3.8	S	3.6	S	3.9	S	4.3	SSE	4.3	SSE	3.5	S	4.5	S	3.2	63.9	S	2.7	
11	S	1.9	W	0.4	S	0.3	SSE	0.4	NW	0.9	SSE	0.7	NNE	0.3	E	0.6	E	0.7	ENE	1.1	NE	1.7	NE	1.2				
	E	1.1	ENE	1.5	SE	2.0	SE	1.3	SSE	2.4	SW	0.9	NE	0.8	NNE	0.6	WSW	0.6	NNE	1.8	NE	2.1	NE	1.5	26.8	NE	1.1	
12	N	1.0	SW	0.6	SSW	0.4	NW	0.7	NNW	0.6	WNW	0.4	NNW	1.2	NNW	0.9	C	0.0	NE	1.5	NE	2.0	ENE	1.6				
	NE	1.6	ENE	1.2	ENE	1.7	NNE	1.7	NNE	1.2	NNW	0.6	C	0.0	C	0.0	C	0.0	NNW	1.0	NW	0.7	C	0.0	20.6	NNW	0.9	
13	S	0.8	S	1.1	NW	0.8	NW	1.0	W	2.7	NW	0.7	SW	0.7	WNW	0.5	W	2.2	W	1.6	ENE	2.1	E	1.5				
	NE	1.6	ENE	1.4	NE	1.5	E	1.2	NNE	0.8	C	0.0	C	0.0	C	0.0	NW	1.0	NW	0.9	NW	0.8	NNE	2.5	27.4	NW	1.1	
14	NNE	3.1	NNE	3.5	N	1.9	NNE	2.5	NE	2.6	NE	1.9	NE	1.9	NNE	2.0	NNE	2.4	NNE	2.6	NNE	3.3	NE	1.9				
	NNE	2.2	NNE	2.4	NNE	2.2	NNE	2.0	NNE	1.9	NNE	1.1	W	0.3	C	0.0	C	0.0	C	0.0	W	0.3	NNW	0.7	42.7	NNE	1.8	
15	C	0.0	NNW	0.4	NNW	0.6	SSW	0.6	C	0.0	WNW	0.8	C	0.0	W	0.6	NW	1.3	NW	1.1	NNE	1.4	SW	0.8				
	WSW	1.8	ESE	0.8	N	1.7	N	1.3	C	0.0	NNE	0.6	C	0.0	SSW	0.3	C	0.0	NW	1.3	SSW	1.2	WNW	1.4	18.0	SSW	0.8	
16	NNE	0.4	NNW	1.7	N	2.2	N	4.5	N	3.0	N	3.2	NNW	2.2	NNW	2.0	NNW	1.7	N	2.6	N	3.2	N	3.1				
	N	2.8	N	2.3	N	3.3	N	2.2	N	1.6	NNW	1.5	NNW	1.4	WNW	1.0	NW	0.4	NNW	0.8	NW	0.4	NNW	1.1	48.6	N	2.0	
17	NNW	1.2	NNW	0.8	WNW	1.0	NW	1.2	NNW	1.1	N	1.0	NE	1.8	NNE	0.8	NE	1.5	ENE	1.5	E	1.0	ENE	1.4				
	ENE	0.9	E	1.0	ENE	1.2	ENE	1.6	NE	1.8	NNE	2.9	NNE	1.6	ENE	1.9	SSW	0.6	NW	0.7	NNW	0.4	NW	0.3	29.2	ENE	1.2	
18	WSW	0.3	NNW	0.5	WNW	0.4	NW	0.5	WSW	1.2	SSW	0.4	NW	0.6	NW	0.6	C	0.0	ENE	1.0	E	0.8	ESE	1.6				
	SSE	2.6	SSE	2.4	S	1.5	WSW	0.6	SW	1.1	SW	0.3	S	0.4	SW	0.9	SW	1.3	WNW	0.6	C	0.0	SSW	0.6	20.2	SW	0.8	
19	W	0.3	C	0.0	NNW	0.6	WSW	0.7	W	0.5	C	0.0	C	0.0	NNW	1.0	C	0.0	ENE	1.0	NE	1.3	NE	1.8				
	NE	1.1	NE	1.5	ENE	1.3	NE	1.0	NNE	2.2	C	0.0	NE	0.5	C	0.0	E	0.7	C	0.0	NW	0.5	NW	0.7	16.7	NE	0.7	
20	C	0.0	NW	0.4	NNW	0.9	NNW	0.4	NE	0.7	NW	0.5	S	0.5	E	0.9	E	0.6	E	1.6	E	1.4	ENE	1.7				
	ENE	1.3	NE	1.4	ENE	1.3	ENE	0.8	E	0.8	ESE	0.4	SE	0.4	C	0.0	WNW	0.3	W	0.4	S	1.1	WNW	0.6	18.4	E	0.8	
21	WSW	1.7	W	0.4	C	0.0	W	0.4	C	0.0	NW	0.7	NW	0.9	ENE	0.3	ESE	0.6	NE	1.4	ENE	1.6	ENE	1.4				
	NNE	2.4	NNE	1.8	NNE	1.2	W	0.9	W	2.2	WNW	3.7	W	3.8	W	1.3	SW	1.2	WSW	1.7	NNE	0.5	NNE	3.2	33.3	W	1.4	
22	NNE	3.9	N	3.1	NW	0.5	NW	0.9	WNW	0.6	ENE	1.4	ENE	1.7	ENE	2.1	ENE	1.7	ENE	1.6	E	1.6						
	E	1.1	E	1.6	E	1.5	E	1.4	E	0.8	SSE	0.9	W	0.4	SW	0.5	C	0.0	NW	1.1	W	1.0	NW	0.9	34.2	E	1.4	
23	ANW	0.8	WSW	1.0	WNW	0.6	WNW	0.6	NW	0.5	NW	0.6	NW	0.4	SSE	2.3	SSE	1.8	SSE	3.7	SE	2.6	SSE	3.9				
	SE	3.1	SSE	2.9	SSE	3.5	SSE	2.6	SSE	2.3	S	1.8	S	1.9	S	1.0	SSE	2.4	S	3.1	S	2.9	NW	0.7	47.0	SSE	2.0	
24	ANW	0.5	NNW	0.9	NW	0.8	NW	0.7	WNW	0.5	NW	1.1	ENE	0.4	SSW	2.3	SSW	2.9	SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	2.0				
	S	2.5	SSE	4.1	S	3.9	WSW	1.4	SW	0.3	NNW	0.5	N	0.5	NW	0.9	C	0.0	NW	0.7	C	0.0	WSW	1.3	32.6	NW	1.4	
25	W	3.4	WSW	1.8	NNW	0.4	WNW	0.4	W	1.0	NW	1.0	SE	0.5	N	1.4	N	0.7	ENE	0.9	NNE	0.4	NNE	1.4				
	NNE	0.7	NE	0.5	SE	0.4	WNW	0.5	SW	1.7	W	5.2	WSW	2.5	SW	1.7	SSW	1.6	W	2.7	WNW	2.1	WSW	2.4	35.3	W	1.5	
26	W	1.8	NNE	5.4	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	5.8	NNE	3.5	NNE	4.4	N	6.2	NE	2.6	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.9				
	NE	1.8	SSE	0.7	E	1.3	ENE	0.6	WSW	1.6	NW	0.5	W	0.7	SSW	1.5	ESE	1.1	SE	1.3	SSE	1.0	C	0.0	59.0	NNE	2.5	
27	W	0.5	NW	0.3	C	0.0	W	0.8	NW	0.6	WNW	0.9	SSW	1.0	S	2.5	S	0.9	SSE	1.2	W	0.7	S	0.6				
	C	0.0	S	1.1	ESE	0.5	S	2.0	SSW	0.6	C	0.0	WNW	0.3	SSW	1.6	W	1.4	NW	0.4	WSW	1.7	S	1.1	20.7	S	0.9	
28	WSW	0.9	N	0.9	WNW	0.5	NW	0.5	C	0.0	WNW	0.9	NW	0.7	SSE	3.1	S	2.7	SSE	2.7	SSE	2.8	SSE	2.8				
	SSE	2.8	SSW	0.6	SSW	1.0	C	0.0	C	0.0	C	0.0	W	0.9	NW	0.7	NW	0.4	NW	0.5	WNW	0.8	26

附錄Ⅳ.1-4 101年4月高塔93公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 93.0 M MONTHLY REPORT

Apr. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO
LOCATION : 2572N、12175E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (High Tower)
INST. Ht. : 93.0m
Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN	
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	ESE	3.1	ESE	3.5	ESE	3.6	E	4.4	ENE	7.3	ENE	6.7	ENE	7.1	E	4.8	E	4.7	ESE	6.0	SE	5.5	SE	4.6				
	SSE	3.7	SE	2.7	SE	4.8	SE	6.7	SSE	5.5	SSE	6.9	SSE	7.1	SSE	9.5	S	7.6	SSE	4.5	S	7.2	S	5.6	133.1	SSE	5.5	
2	S	5.7	SSW	1.7	SW	2.7	WSW	2.7	N	1.3	W	2.8	SSW	1.5	SSE	0.8	ESE	1.5	SSE	2.8	SSE	6.7	SSE	3.8				
	NE	1.8	NE	2.5	NNE	3.5	NE	2.1	NNE	1.2	SSE	2.1	SW	2.0	W	1.0	SW	3.9	SW	4.1	WSW	4.3	WSW	3.0	65.5	SSE	2.7	
3	SSW	1.9	W	4.5	NE	1.1	NNE	1.4	W	5.0	W	7.0	W	7.0	W	9.4	W	10.2	WNW	4.1	N	12.4	NNE	12.8				
	NNE	11.1	NNE	11.7	NNE	10.8	NNE	8.5	NE	7.7	NE	6.7	ENE	5.1	ENE	5.9	ENE	5.8	ENE	4.7	SE	2.0	SE	2.7	159.5	NNE	6.6	
4	SE	3.7	SE	4.3	ESE	4.5	ESE	4.6	SE	3.8	SSE	4.4	SE	4.6	SE	7.5	SSE	5.7	SSE	7.4	SSE	7.0	S	8.6				
	S	9.8	S	9.1	S	10.7	S	8.3	S	6.7	S	5.2	S	8.4	S	6.3	S	6.9	SSW	6.1	S	8.1	SW	4.6	156.3	S	6.5	
5	SSW	4.6	SW	3.6	SW	3.5	SW	1.7	W	1.1	WNW	3.6	W	1.2	W	1.0	NW	2.9	W	0.6	SSW	1.2	WSW	1.7				
	NNE	3.0	N	4.0	N	4.1	N	5.4	N	6.2	N	5.2	NNW	2.6	WSW	3.1	NW	2.5	NW	1.3	WNW	1.4	WNW	1.2	66.7	N	2.8	
6	NNW	4.1	NE	4.6	NE	4.2	NE	4.5	NNE	1.3	ENE	1.9	NE	8.4	NE	8.0	ENE	6.5	ENE	4.9	E	4.4	ENE	6.4				
	NE	7.2	NE	7.0	N	3.8	SW	4.0	WSW	3.0	S	4.0	S	5.6	S	3.3	SSW	4.6	SSW	3.7	SSW	3.9	S	3.6	112.9	NE	4.7	
7	S	3.8	SSW	3.5	SSE	5.0	SW	1.9	SSW	3.9	SSW	5.2	SSW	4.0	S	2.4	S	7.0	S	6.9	SSE	5.3	SSE	4.8				
	SE	5.1	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE	4.4	SE	5.1	SE	9.7	S	5.6	S	6.8	S	5.2	S	4.5	S	7.2	S	5.1	122.2	S	5.1	
8	S	6.8	S	5.6	SSE	5.2	SSE	5.4	SSE	9.6	S	8.5	S	7.7	S	7.9	SSE	9.6	SSE	8.5	S	7.2	S	7.7				
	S	7.9	S	5.0	S	2.6	S	3.8	S	6.2	S	3.6	SSW	3.1	SSW	3.3	S	2.1	SSW	2.0	SSW	3.9	S	2.5	135.7	S	5.7	
9	SSW	1.2	SW	2.3	SSW	2.8	SSE	1.0	SSW	0.6	SW	3.2	S	2.6	SW	2.1	SSE	2.1	SSE	4.8	SSW	1.3	SE	2.6				
	SSE	3.8	S	2.6	S	3.2	ESE	1.9	NE	1.2	SE	1.0	ENE	1.4	SE	2.2	SE	5.1	SSE	4.0	S	3.2	S	3.4	59.6	SSE	2.5	
10	SSW	3.9	S	3.7	S	2.6	SSW	1.5	S	3.0	SSW	4.0	WSW	2.7	S	5.1	S	2.4	SSE	4.3	SSE	6.0	S	5.3				
	S	4.4	S	3.7	SSE	5.4	S	6.5	S	7.5	S	9.0	S	7.1	S	8.9	S	6.9	S	8.5	S	6.9	SSW	7.5	126.8	S	5.3	
11	SW	3.1	SW	2.2	WSW	3.6	SW	2.4	W	2.0	N	0.7	WSW	2.9	SSW	1.7	ESE	2.0	ENE	2.1	E	3.1	ESE	3.5				
	SSE	4.0	ESE	2.5	S	4.4	S	4.3	S	4.1	SW	2.7	NNE	0.8	WNW	1.2	WSW	2.9	NNE	3.5	ENE	7.9	NE	4.7	72.3	SW	3.0	
12	NNE	2.3	E	1.0	S	1.5	SE	0.5	SSE	1.2	WNW	1.2	W	1.3	NW	0.9	NW	0.4	NE	2.3	NNE	3.2	NE	2.9				
	NE	2.6	ENE	1.7	NE	2.5	NNE	3.6	NNE	2.5	NNW	1.2	C	0.0	SW	2.2	SSW	0.9	NNW	1.7	WSW	3.1	WSW	2.7	43.4	NNE	1.8	
13	WSW	3.1	SW	2.1	SW	3.0	WSW	3.5	W	4.2	WSW	2.6	WSW	3.2	W	2.7	W	3.5	W	3.7	ENE	3.6	ENE	4.0				
	NE	2.7	ENE	2.1	ENE	2.8	E	2.5	NE	1.9	NE	2.0	NNE	1.9	NNE	0.9	SSW	1.2	SW	0.3	SSW	1.4	NE	5.0	63.9	NE	2.7	
14	NE	7.3	NE	7.6	NE	7.3	NE	7.2	NE	5.9	ENE	3.5	NE	4.0	NE	4.0	NE	5.5	NE	6.6	NNE	6.7	ENE	4.1				
	NNE	4.9	NNE	4.8	NE	4.4	NE	4.5	NE	4.1	NE	3.3	SW	1.5	SW	2.1	SW	2.1	SSW	1.8	SW	1.6	WSW	1.0	105.8	NE	4.4	
15	W	1.9	SW	3.2	WSW	3.8	W	0.7	SW	1.7	SW	3.3	WSW	1.1	WSW	2.1	NW	1.1	E	1.9	NE	2.6	WSW	1.7				
	W	3.1	SSE	1.3	NNE	4.1	N	2.2	SSE	0.8	NNE	2.0	S	1.2	WSW	0.8	SW	2.0	NW	2.5	W	0.9	NW	5.0	51.0	WSW	2.1	
16	NW	4.6	NW	6.0	NW	3.0	N	8.4	N	7.1	N	7.4	N	6.0	N	5.1	N	3.5	NNE	7.9	N	7.7	NNE	8.9				
	N	7.1	NNE	7.1	N	8.0	N	6.2	NNE	3.6	NNE	5.0	NNW	3.5	NNW	3.8	NNW	3.5	NNW	2.9	NNW	2.1	NNW	2.5	130.9	N	5.5	
17	NNW	2.4	WNW	0.8	W	1.3	NW	1.4	NNW	1.8	NNE	1.4	NE	5.1	NE	2.5	NE	3.2	ENE	3.5	E	2.4	ENE	3.0				
	E	2.2	ESE	2.2	E	3.0	ENE	4.0	ENE	4.7	NE	5.7	NE	5.5	ENE	3.8	SE	2.1	SSW	0.5	SW	3.5	SSW	2.4	68.4	NE	2.9	
18	SSW	2.7	S	3.3	S	1.9	SSW	2.4	W	1.9	SSW	1.5	WSW	2.2	WSW	2.4	SW	1.1	SSE	1.2	SE	3.3	SSE	4.7				
	S	4.4	S	3.8	S	4.1	S	2.5	WSW	3.0	WSW	4.4	W	1.6	SW	3.4	SW	4.3	W	2.1	WSW	2.0	WNW	1.3	65.5	S	2.7	
19	WSW	3.1	SW	3.7	WSW	2.1	WNW	1.3	WNW	1.9	SSW	2.6	WSW	2.3	NNW	0.8	ENE	1.1	ENE	1.7	NE	2.1	NE	2.8				
	NE	1.7	NE	2.8	ENE	2.0	ENE	2.5	NNE	4.6	ENE	1.4	SE	1.0	NE	2.2	ESE	3.2	ENE	0.8	E	0.3	C	0.0	48.1	ENE	2.0	
20	NW	0.3	S	1.2	NNE	1.9	C	0.0	NNE	1.8	ENE	1.1	ESE	1.8	ESE	2.3	ESE	2.8	E	2.8	E	3.4	E	3.1				
	ENE	4.2	ENE	2.5	E	2.6	E	2.2	ESE	3.0	ESE	1.3	E	1.0	NW	0.9	S	2.5	SE	3.0	S	3.9	SSE	3.6	53.2	E	2.2	
21	W	3.9	SE	1.3	S	1.3	SW	1.5	W	1.4	WSW	1.0	SW	1.3	SW	2.1	ESE	1.7	NNE	2.5	NE	2.3	ENE	2.2				
	NE	4.3	NE	3.8	NNE	2.6	WNW	2.0	WNW	4.8	W	7.0	W	5.4	WNW	4.2	W	4.1	WNW	3.8	NW	2.1	NNE	5.7	72.3	W	3.0	
22	NE	10.5	N	9.4	NNE	6.8	NNE	2.5	NE	2.8	NW	1.5	ENE	4.0	E	3.9	ENE	4.9	ENE	4.0	E	3.2	E	3.9				
	E	3.0	E	2.5	E	3.1	ESE	2.8	SSE	3.4	SE	2.4	S	2.6	S	2.9	S	2.4	SSW	1.3	SSW	4.0	S	4.6	92.4	E	3.9	
23	SSE	4.5	S	3.7	S	5.4	S	3.2	S	3.5	S	1.9	S	4.1	S	5.7	SSE	3.4	SSE	7.9	S	7.4	SSE	7.7				
	SSE	6.8	S	5.4	S	7.6	S	3.7	SSW	4.1	SSW	2.8	S	2.7	S	3.7	SSW	4.6	SSW	4.1	SSW	6.0	SSW	3.5	113.4	S	4.7	
24	S	2.3	WSW	2.8	SSW	4.3	WSW	3.9	WSW	2.1	SSE	0.6	WNW	1.0	SW	4.6	SW	3.4	SW	2.2	SSW	3.1	S	3.6				
	SSW	4.4	S	8.6	S	7.5	WSW	3.4	NW	1.7	WSW	3.7	WSW	3.8	WSW	2.2	WSW	1.0	WSW	2.0	SW	3.0	SW	3.9	79.1	WSW	3.3	
25	WSW	5.1	W	3.7	W	2.4	W	2.3	WSW	2.1	W	1.2	SW	2.6	NNW	1.3	N	1.4	ENE	1.5	N	1.4	NNE	2.4				
	NNE	1.4	NNE	1.3	SE	0.9	NE	1.9	WSW	2.5	W	9.4	SW	4.1	W	3.3	SW	3.1	W	4.7	WNW	4.0	WSW	3.5	67.5	W	2.8	
26	ANW	4.7	NNE	12.2	NE	14.2	NE	12.7	NNE	13.3	NNE	10.7	NNE	12.0	NNE	12.1	ENE	7.2	NE	6.7	ENE	5.1	ENE	7.1				
	ENE	5.0	E	2.0	ENE	4.4	ENE	2.2	WSW	4.0	SW	1.8	S	3.3	SSW	2.9	E	3.2	ESE	2.9	SSE	3.3	SE	3.4	156.4	ENE	6.5	
27	SSE	2.2	SSE	1.9	SE	1.9	SE	1.7	SE	2.3	S	3.3	S	3.8	S	3.3	SSE	3.6	SSE	2.3	E	1.2	WSW	0.8				
	SSW	1.7	SW	0.7	SE	2.3	S	4.5	SSW	2.9	SSW	2.7	SW	3.4	WSW	4.8	SSW	2.6	WSW	2.8	SW	4.8	SSW	3.0	64.5	SSW	2.7	
28	SSW	6.6	SW	3.3	SW	2.2	SW	1.9	S	1.3	NW	3.4	SSW	3.6	S	2.2	SSW	2.8	SSW	2.3	SSW	2.9	SSW	4.9				
	S	2.5	SW	1.8	SW	2.6	SSW	3.1	S	0.4	C	0.0	SW	1.6	SW	3.9	SW	2.9	SW	3.1	SSE	2.4	WSW	2.5	64.2	SW	2.7	
29	W	1.3	SSW	1.7	SW	2.6	WSW	3.5	SW	2.3	W	0.8	W	1.3	SSE	1.8	SSE	4.7	S	5.7	S	6.6	SSW	5.2				
	WSW	1.4	E	1.3	N	1.3	SSE	2.0	NE	2.1	NNW	3.4	NE	1.6	SW	4.5	NNW	2.1	N	1.7	SE	0.8	WSW	4.0	63.7	SSE	2.7	
30	WSW	2.4	W	2.7	WSW	4.5	W	3.1	W	8.2	W	6.0	W	6.1	ENE	0.4	S	1.5	E	1.6	ENE	1.5	SSE	5.6				
	SSE	5.6	SE	3.9	SSE	6.7	SW	4.6	NE	0.8	SW	0.7	SW	1.8	WNW	0.3	WSW	1.3	WSW	4.0	WNW	2.2	WNW	0.5	76.0	W	3.2	

PVL.	SSW		SW		S		SW		W		W		WSW		S		SSE		SSE		E		ENE					
W/D	NE		S		S		NE		N		NE		S		S		S		SSW		S		S		S			
SUM.		113.1		111.1		110.2		93.2		105.7		103.0		116.5		110.9		111.4		120.7		129.8		140.4				
W/S		130.8		115.3		130.7		116.3		109.3		116.3		96.3		104.3		102.6		92.9		107.5		102.0	2690.3		112.1	
MEAN		3.8		3.7		3.7		3.1		3.5		3.4		3.9		3.7		3.7		4.0		4.3		4.7				
W/S		4.4		3.8		4.4		3.9		3.6		3.9		3.2		3.5		3.4		3.1		3.6		3.4	89.7		3.7	

附錄Ⅳ.1-3 101年4月高塔63公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 63.0 M MONTHLY REPORT

Apr. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO
LOCATION : 2572N、12175E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (High Tower)
INST. Ht. : 63.0m
Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN	
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	SSE	2.0	SE	2.2	SE	2.2	E	2.1	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.6	E	2.3	E	2.1	ESE	3.6	SE	3.8	SE	3.0				
	SSE	2.2	SE	2.1	SE	3.0	SE	4.2	SSE	3.2	SSE	3.8	SSE	4.0	SSE	5.2	SSE	3.7	SSE	2.3	S	3.7	S	2.4	73.7	SSE	3.1	
2	S	3.0	SW	1.0	WSW	1.5	W	1.8	N	1.1	WNW	1.9	S	1.3	SSE	0.8	ESE	1.2	SE	1.7	SSE	4.2	SE	2.5				
	NNE	1.6	NE	2.3	NNE	2.6	NE	1.7	NNE	0.9	SE	1.4	WSW	1.7	WNW	0.9	SW	3.0	SSW	3.0	WSW	2.4	SW	2.9	46.4	NNE	1.9	
3	SW	3.1	WNW	2.7	E	1.1	ENE	1.0	W	3.3	WNW	4.5	W	4.4	WNW	5.9	W	6.5	WNW	2.8	N	7.9	N	8.4				
	N	7.7	NNE	8.2	NNE	7.3	NNE	5.5	NNE	4.4	NE	4.1	NE	3.1	ENE	3.1	ENE	3.3	ENE	2.7	SSE	1.3	SSW	1.7	104.0	NNE	4.3	
4	SSE	2.2	SSE	2.7	SE	2.8	SE	2.8	S	2.3	SSE	2.3	SSE	2.6	SE	5.2	SSE	3.4	SSE	5.1	SSE	4.2	SSE	4.9				
	SSE	5.6	SSE	5.2	SSE	6.2	SSE	4.6	S	3.9	S	2.8	S	4.1	S	3.0	S	3.5	SSW	3.0	SSW	3.9	SW	2.7	89.0	SSE	3.7	
5	SW	2.6	WSW	1.7	SW	1.8	SW	2.2	S	1.6	NW	2.4	SSW	1.1	SW	0.8	NW	2.1	W	0.3	S	0.8	SW	1.1				
	NNE	1.9	N	2.7	N	2.7	N	3.4	N	4.0	N	3.2	NNW	1.8	SW	1.9	WNW	1.6	SW	1.4	WSW	2.0	SW	2.1	47.2	SW	2.0	
6	NW	2.3	NE	2.0	NNE	1.8	ENE	1.7	SW	1.6	S	1.6	NE	4.5	NE	4.7	ENE	3.5	ENE	2.6	E	2.4	ENE	3.1				
	NE	4.3	NE	4.4	N	2.6	SW	2.9	WSW	1.8	SSW	2.7	SSW	3.3	SW	2.3	SSW	3.0	SW	2.2	SSW	2.5	SSW	2.6	66.4	NE	2.8	
7	S	2.0	S	1.7	SSE	3.6	SW	1.6	SW	2.6	SW	3.2	SW	1.9	SSW	1.1	S	3.5	S	4.0	SSE	3.3	SE	3.2				
	SE	3.2	SSE	3.2	SE	3.0	SE	2.8	SSE	2.9	SE	6.0	S	3.1	S	3.7	S	2.9	SSW	2.5	S	3.6	S	2.6	71.2	S	3.0	
8	S	3.5	S	3.0	SSE	2.6	SSE	2.7	SSE	4.7	S	4.1	S	3.6	SSE	4.0	SSE	5.2	SSE	4.8	SSE	4.1	SSE	4.2				
	SSE	4.2	S	3.0	S	1.5	SSE	1.9	SSE	3.0	S	2.1	SW	1.9	SSW	1.7	SSW	1.1	SSW	1.7	S	2.4	S	1.2	72.2	SSE	3.0	
9	W	0.8	SW	1.3	SSW	1.9	NNW	0.5	W	0.3	SW	2.0	S	1.9	SW	1.4	SSE	1.8	SSE	3.5	S	0.6	SE	1.8				
	SSE	2.6	SSE	1.8	S	1.9	ESE	1.1	N	0.9	N	0.4	NE	0.8	SE	0.8	SE	3.0	SE	2.7	S	2.2	S	2.3	38.3	S	1.6	
10	S	2.8	SSE	2.5	SSE	1.8	SW	1.0	SSE	2.0	SSW	3.1	WSW	1.6	SSE	3.6	SSE	1.5	SSE	2.7	SSE	4.0	S	3.1				
	SSE	2.3	S	2.0	SSE	3.5	S	3.7	S	4.2	S	4.7	S	3.3	SSE	4.7	S	4.1	SSE	4.8	S	3.8	SSW	3.8	74.6	SSE	3.1	
11	SSW	1.6	SW	1.4	SW	2.3	SSW	2.8	S	1.9	SW	1.0	SW	1.3	S	1.7	E	1.6	NE	1.6	ENE	2.0	ESE	2.2				
	SSE	2.6	E	1.8	SSE	2.4	S	2.6	S	2.3	SW	2.0	N	0.7	WNW	0.8	WSW	1.5	NNE	2.4	ENE	4.0	NNE	2.5	47.0	SW	2.0	
12	N	1.3	C	0.0	SW	1.5	SW	0.6	SSW	0.9	SW	1.4	WSW	1.1	WSW	0.4	C	0.0	NE	1.8	NNE	2.4	NE	2.5				
	NE	2.4	ENE	1.4	NNE	1.8	N	2.7	NNE	1.8	N	0.6	S	0.6	SSW	1.8	SSW	1.7	WNW	0.9	SW	2.3	SW	2.0	33.9	SW	1.4	
13	SW	1.7	SW	2.5	SW	1.5	WSW	1.8	WSW	1.9	SW	1.5	SSW	2.4	W	1.6	W	2.2	W	2.8	ENE	2.2	ENE	2.0				
	NE	2.0	NE	1.8	ENE	1.8	ENE	1.6	NE	1.4	NE	1.3	NNE	1.3	N	0.6	SW	2.4	SW	2.1	SW	2.8	NE	3.1	46.3	SW	1.9	
14	NE	4.5	NE	4.3	NE	4.6	NE	4.5	NE	3.5	NE	2.1	NE	2.7	NE	2.4	NE	3.5	NNE	3.6	NNE	4.0	NE	2.6				
	NNE	3.2	NNE	3.0	NE	2.6	NE	2.9	NE	2.3	NE	1.5	SW	1.3	SW	1.8	SW	1.5	SW	1.4	WSW	1.3	SW	1.3	66.4	NE	2.8	
15	SW	2.2	SSW	2.6	SW	2.4	SSW	1.4	SW	1.8	SW	2.6	SW	2.4	SSW	1.8	NNW	1.0	ENE	1.3	NE	2.0	WSW	1.3				
	W	1.7	SE	1.0	N	2.9	NNW	1.3	SSE	0.4	NNE	1.2	SSW	1.4	SW	1.2	SSW	1.5	NW	1.5	WSW	0.9	NW	3.1	40.9	SW	1.7	
16	ANW	3.0	NW	4.0	NW	2.0	N	5.3	N	4.5	N	4.7	NNW	4.0	N	3.8	NNW	2.4	NNE	5.1	N	4.8	N	5.6				
	N	4.5	N	4.3	N	5.2	N	4.1	N	1.6	N	2.5	NNW	2.3	NW	2.3	NW	2.3	NNW	1.7	WSW	1.1	WNW	1.6	82.7	N	3.4	
17	W	1.2	SW	1.7	WSW	2.0	SW	1.8	WSW	0.9	SW	0.8	NE	2.6	ENE	1.2	NE	2.1	ENE	2.2	E	1.7	ENE	1.6				
	E	1.4	E	1.4	E	1.7	ENE	2.3	ENE	2.6	NE	3.1	NNE	3.1	E	1.6	S	1.6	WSW	1.4	SW	2.0	SW	1.9	43.9	ENE	1.8	
18	SW	1.7	S	2.4	SW	0.9	SSW	1.8	W	1.1	SSW	2.3	WSW	1.2	SW	1.9	SSW	0.7	SE	1.0	SE	2.5	SE	3.0				
	S	3.0	S	2.4	S	2.3	S	1.6	WSW	1.9	WSW	2.2	SW	2.1	SSW	2.3	SW	2.5	WNW	1.5	SW	2.2	W	1.4	45.9	SW	1.9	
19	SW	2.6	SW	2.9	SSW	1.5	WSW	1.3	SW	1.9	SW	2.0	W	1.2	NNW	0.6	ENE	1.0	ENE	1.4	NE	1.8	NE	2.5				
	NE	1.4	NE	2.2	ENE	1.5	ENE	1.5	NNE	2.3	ENE	0.9	SSE	0.7	NE	1.2	ESE	1.6	NNW	0.3	WSW	0.4	SW	1.5	36.2	NE	1.5	
20	ANW	0.6	SW	2.1	NNW	0.8	SW	0.9	N	0.8	S	0.7	SE	0.9	ESE	1.3	ESE	1.3	ENE	1.7	E	1.5	E	1.3				
	ENE	2.1	ENE	1.5	ENE	1.7	E	1.0	ESE	1.3	ESE	0.6	NE	0.4	WNW	1.4	SSW	1.8	SE	1.9	S	1.6	SSE	2.0	31.2	ENE	1.3	
21	W	2.2	SSE	1.0	SW	1.3	WSW	0.9	SW	1.0	SW	1.6	SSW	1.5	SSW	1.2	ESE	1.5	NNE	1.9	NE	1.9	ENE	1.9				
	NNE	3.1	NE	2.8	NE	1.7	W	1.3	WNW	3.0	W	4.1	W	3.5	W	2.6	W	2.3	WNW	2.4	NNW	1.4	N	3.8	49.9	W	2.1	
22	NNE	6.0	N	6.2	N	4.1	NNW	1.1	NNE	1.3	W	1.2	ENE	2.0	ENE	2.2	ENE	2.7	ENE	2.5	ENE	2.2	ENE	2.4				
	ENE	1.4	E	2.1	E	1.5	ESE	1.9	SSE	2.1	SSE	1.5	S	1.6	S	1.9	SSW	1.6	W	0.7	SSW	2.5	S	2.3	55.0	ENE	2.3	
23	SSE	3.0	SSE	2.6	SSE	3.5	SSE	2.0	S	2.3	S	1.4	S	2.6	SSE	3.2	SSE	2.6	SSE	4.7	SSE	4.6	SSE	4.6				
	SSE	4.1	SSE	3.4	S	4.1	S	2.2	S	2.4	S	1.7	S	1.5	S	1.6	S	2.7	SSW	2.9	SSW	3.6	S	1.9	69.2	S	2.9	
24	S	1.3	WSW	1.5	SW	2.5	WSW	1.5	SW	2.4	E	0.6	NNW	0.9	SW	2.3	SW	1.7	SSW	1.4	S	2.1	SSE	2.3				
	SSW	2.8	SSE	4.7	S	4.3	WSW	1.9	SW	1.0	SW	2.1	SW	2.2	WSW	2.2	SW	2.8	SW	2.0	SW	3.5	SW	2.3	52.3	SW	2.2	
25	W	2.6	W	2.1	SW	2.2	SW	2.4	SW	2.7	WSW	1.5	SSW	1.7	N	1.2	NNE	1.3	ENE	1.4	N	1.3	NNW	2.0				
	NNE	1.2	NNE	0.9	S	0.7	NNE	1.4	SW	1.8	W	5.9	SW	2.5	WSW	2.0	SSW	2.1	W	2.9	WNW	2.5	WSW	1.9	48.2	NNE	2.0	
26	W	3.1	NNE	6.7	NE	8.3	NE	7.4	NNE	7.7	N	7.9	NNE	6.9	NNE	6.9	NE	4.3	NE	4.3	ENE	3.0	NE	4.1				
	NE	2.9	E	0.8	ENE	2.5	ENE	1.3	WSW	2.1	SW	2.2	SSW	2.8	SW	1.4	E	1.7	ESE	1.3	SSE	1.1	SSE	1.8	91.6	NE	3.8	
27	SSE	0.8	SSE	0.8	ESE	0.6	SE	0.7	ESE	1.5	S	1.7	SSW	2.4	S	2.3	SSE	2.2	SSE	1.2	NNW	1.2	ENE	0.4				
	SSW	0.6	SSW	0.4	SE	1.9	S	2.3	SSW	1.8	SW	1.6	SW	1.2	WSW	2.5	SSW	2.1	W	1.3	SW	2.3	SW	1.7	35.5	SSW	1.5	
28	S	4.2	WSW	1.7	SW	0.7	SW	1.7	SW	2.6	NW	2.6	SW	2.5	SSE	1.5	S	1.8	S	1.4	SSW	1.5	SSW	2.6				
	S	1.8	SSW	0.9	SSW	1.8	SSW	2.4	SSW	0.3	C	0.0	SW	1.9	SSW	2.4	SW	1.8	SW	2.5	SSW	1.7	WS

附錄Ⅳ.1-6 101年5月低塔63公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 63.0 M MONTHLY REPORT

May. 2012

STATION NO. : 40A48 LOCATION : 25?3'N - 121?5'E INST. Ht. : 63.0m Unit : m/s

STATION : YENLIAO STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (Low Tower)

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.	
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S			
1	NNW	0.4	S	0.5	SE	0.3	NW	0.9	S	0.7	SSW	1.0	NW	1.0	ESE	0.3	SE	0.7	SE	2.1	SE	2.4	ESE	1.6			
	SE	3.8	SE	3.7	ESE	0.7	E	1.9	N	2.0	N	1.5	N	1.1	NW	1.2	S	1.0	NW	1.1	S	1.0	WSW	2.2	33.1	SE	1.4
2	WSW	3.0	SW	3.3	WSW	2.9	W	7.0	WSW	7.2	WSW	4.8	SW	3.7	SSW	4.3	WSW	5.0	S	3.1	ESE	2.4	E	1.8			
	SE	4.7	SSE	4.5	SSE	3.2	S	2.5	NE	5.3	NNE	4.7	NE	7.6	NE	7.1	NE	6.7	N	5.6	NW	1.4	WNW	2.3	104.1	WSW	4.3
3	NW	2.1	NW	2.4	NNW	2.6	N	2.8	N	2.9	N	2.8	NNW	1.4	NNE	3.4	NE	3.4	NNE	3.8	NNE	3.1	NE	3.0			
	NE	2.8	NE	3.4	ENE	1.6	ENE	2.4	ENE	2.7	E	2.1	SE	1.7	ENE	1.0	NE	1.4	ENE	2.0	S	1.7	SSE	2.5	59.0	NE	2.5
4	W	0.8	SSW	1.6	NW	3.1	NNE	6.0	NNE	4.4	E	2.8	NE	1.6	NE	5.7	NE	4.0	NE	7.6	NNE	6.3	NE	6.9			
	NE	5.3	NNE	5.0	NNE	3.6	NNE	5.5	NE	3.4	NNE	1.2	W	1.3	WNW	1.5	W	1.2	SSW	0.4	WSW	0.6	WNW	2.0	81.8	NNE	3.4
5	NW	2.0	W	0.6	WNW	1.4	WNW	1.5	NW	2.1	NW	3.0	NW	2.4	NNW	3.1	N	4.0	NNE	5.6	NNE	5.9	N	6.1			
	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	4.5	NNE	4.3	N	3.8	N	3.4	NW	2.1	NW	2.3	WNW	0.8	SW	1.0	WNW	0.4	SSW	0.7	71.5	NNE	3.0
6	W	0.6	SSW	0.4	WNW	1.7	W	0.8	WSW	0.7	WNW	1.2	WNW	1.4	N	1.4	NNE	3.2	NNE	4.0	NE	3.2	NE	3.6			
	NE	4.0	NE	3.7	NE	2.5	NE	2.7	ENE	2.0	ESE	2.1	SE	1.0	SSE	1.2	S	1.0	WSW	0.9	WSW	1.3	WSW	2.0	46.6	NE	1.9
7	WSW	1.1	W	0.5	SW	1.6	WSW	1.8	WSW	1.5	SW	1.0	SSW	0.7	S	2.3	SSE	3.7	SSE	4.4	SSE	4.5	SE	3.9			
	SSE	7.0	SSE	5.9	SSE	5.7	S	5.3	S	5.5	S	3.7	S	3.3	WSW	1.5	WSW	1.5	SW	2.2	SSW	2.1	SW	1.3	72.0	SSE	3.0
8	W	2.4	WSW	2.9	W	0.8	WSW	2.5	WSW	1.8	S	1.3	S	1.4	NNW	0.7	SSE	1.5	SSE	5.4	S	5.8	SSE	7.3			
	SSE	5.8	S	6.2	SSE	7.1	S	6.5	S	6.5	S	6.1	SSW	1.5	E	0.5	S	2.4	SW	1.5	SSW	2.6	S	2.8	83.3	S	3.5
9	S	1.7	SSW	1.3	NW	1.7	C	0.0	NW	0.7	NW	1.1	N	1.8	E	0.5	SSW	1.5	SSW	0.3	NNE	4.2	N	6.6			
	N	8.3	NNE	6.9	N	5.7	NNE	4.8	NNE	5.6	NNW	2.9	NNW	2.4	NW	2.3	NW	2.5	NW	2.1	NNW	2.0	N	3.0	69.9	NW	2.9
10	NNW	2.5	N	3.4	N	3.1	NNW	2.3	N	4.8	NE	4.7	NNE	3.5	NNE	2.7	N	2.7	NNE	5.5	NNE	5.1	NNE	5.9			
	NNE	5.3	NNE	6.3	NNE	5.7	NNE	5.4	NNE	4.9	NNE	6.4	NNE	5.8	NNE	5.4	NE	5.5	NE	5.0	NE	1.8	NE	2.6	106.3	NNE	4.4
11	NNE	1.0	NE	3.4	NW	2.1	WNW	1.4	NNW	0.8	WSW	0.6	WSW	0.9	SE	0.4	N	1.0	SW	1.2	SE	1.7	SSW	1.0			
	ENE	1.6	NE	1.5	E	2.8	SE	1.9	SE	2.6	SE	2.5	S	4.9	SSE	2.6	SE	1.2	SE	2.3	SSE	3.5	SSE	2.6	45.5	SE	1.9
12	SSE	2.9	SSE	3.2	SSE	1.9	S	1.4	SSE	3.3	SSE	3.3	SSE	4.6	SE	3.6	SE	1.2	SSE	3.6	SE	2.2	E	1.2			
	SE	2.6	SE	4.1	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.1	SE	3.7	SSE	4.6	SE	3.3	SE	5.3	SSE	6.7	SSE	6.6	SSE	7.0	85.4	SE	3.6
13	SSE	5.8	S	3.5	SSW	4.5	SSE	3.9	S	2.8	WSW	2.3	SSW	1.4	SSE	2.4	S	2.0	ESE	2.9	NNE	3.6	ENE	2.5			
	E	2.2	ENE	1.7	NE	2.2	NE	2.1	NE	1.2	NNE	0.9	S	0.6	WNW	0.8	SW	1.1	W	1.5	WSW	1.5	SW	2.3	55.7	S	2.3
14	SW	1.2	W	2.1	W	2.5	WNW	0.9	N	0.4	NW	1.1	W	3.0	W	3.8	E	1.0	SE	3.1	SE	5.1	SE	4.4			
	ESE	4.3	ESE	4.9	SE	5.2	SSE	3.7	SSE	3.9	SW	1.3	SSW	3.0	WSW	1.9	SSW	1.2	S	1.1	S	0.9	SSW	4.8	64.8	SE	2.7
15	W	2.4	SW	2.2	WNW	2.3	WSW	0.6	WNW	2.5	SE	0.3	SSE	0.6	ESE	0.7	NNE	3.8	ESE	1.9	E	2.0	ENE	2.1			
	NE	2.2	SE	1.9	WNW	1.3	WNW	3.1	W	4.7	WNW	3.6	WNW	2.1	N	0.5	N	2.3	NNW	2.2	NNW	2.0	NW	2.3	49.6	NNW	2.1
16	NNW	1.8	NW	1.3	N	2.4	NW	1.3	NW	2.2	NW	1.4	NNW	1.3	ENE	1.2	NE	0.3	NE	1.5	N	1.9	NNE	3.2			
	NNE	3.6	NE	2.3	NNE	3.2	NE	3.0	NNE	2.4	NW	1.4	NNW	1.0	NW	0.8	NNW	1.5	N	2.9	N	2.4	N	1.2	45.5	NW	1.9
17	NW	1.9	NW	1.6	NNW	2.1	NNW	0.7	NNW	1.4	NNW	1.0	N	1.1	NNW	0.8	N	1.8	N	3.9	N	7.0	N	7.1			
	NNE	4.6	NNE	1.0	WSW	1.7	S	2.4	SSE	1.5	SW	1.7	WSW	2.5	WSW	0.9	S	2.3	S	1.0	S	2.7	SW	3.3	56.0	N	2.3
18	WSW	2.3	W	1.9	WSW	1.0	NW	1.9	SW	1.2	NW	1.1	NW	0.6	ENE	0.6	NE	1.8	ENE	4.1	ENE	3.0	NE	3.3			
	NE	4.5	NE	6.1	ENE	4.0	ENE	2.6	ESE	2.6	SE	3.1	SSE	2.5	SSE	1.2	SSE	0.5	SE	0.7	SE	0.7	SSW	1.6	52.9	ENE	2.2
19	SW	2.4	WSW	0.6	WNW	0.6	WNW	0.8	W	2.2	WSW	1.3	NW	0.8	S	1.5	ESE	1.0	SE	1.9	SE	4.4	SE	4.9			
	SSE	3.1	SE	4.2	SSE	4.0	S	3.0	W	3.4	SW	1.7	S	1.8	S	2.5	SW	3.3	W	0.9	NW	2.2	SSW	1.4	53.9	SE	2.2
20	WSW	3.0	SW	3.3	WSW	2.9	W	7.0	WSW	7.2	WSW	4.8	SW	3.7	SSW	4.3	WSW	5.0	S	3.1	ESE	2.4	E	1.8			
	SE	4.7	SSE	4.5	SSE	3.2	S	2.5	NE	5.3	NNE	4.7	NE	7.6	NE	7.1	NE	6.7	N	5.6	NW	1.4	WNW	2.3	104.1	WSW	4.3
21	SSE	0.5	SE	0.7	SE	0.7	W	0.8	SSW	1.6	NW	3.1	NNE	6.0	NNE	4.4	NNE	7.4	NNE	6.6	NNE	6.7	NNE	7.1			
	NNE	7.5	NNE	7.8	NNE	6.4	NNE	5.9	NNE	6.9	NNE	6.7	NNE	6.9	N	4.3	N	5.8	N	5.0	N	5.5	NNE	5.4	119.7	NNE	5.0
22	N	3.4	NNE	3.7	NNW	3.3	N	4.4	N	4.1	NNE	5.0	NNE	5.2	NNE	4.4	NNE	5.1	NNE	4.3	NE	4.1	NE	4.4			
	NE	4.0	NNE	3.9	NNE	4.9	NNE	4.0	NNE	3.6	NNE	3.3	NNW	2.1	NW	2.0	NW	2.2	WNW	2.3	WSW	1.2	WSW	1.1	86.0	NNE	3.6
23	WSW	1.4	SW	1.1	C	0.0	NW	1.0	SSW	0.8	WNW	0.7	WNW	0.9	NE	0.7	NNE	3.0	NNE	3.5	NE	3.9	ENE	2.8			
	ENE	3.1	ENE	2.9	ENE	3.1	E	2.7	ENE	3.3	NE	2.3	NW	1.7	NNW	1.8	NNW	1.7	NW	1.8	SW	0.9	S	1.3	46.4	ENE	1.9
24	SSE	2.5	SSE	2.2	S	3.0	S	2.8	SSE	3.3	SSW	1.6	SSE	2.4	S	2.4	S	4.8	SSE	4.8	SSE	5.8	SSE	6.6			
	S	5.7	SSE	5.8	SSE	6.0	SSE	5.0	S	5.0	S	3.0	S	2.0	S	1.9	SSW	2.0	S	2.7	SSW	3.9	SSW	5.0	90.2	SSE	3.8
25	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	3.6	W	1.8	SSW	0.4	SW	0.7	WNW	1.5	NNE	2.1	NNE	3.6	ENE	2.6	ENE	1.4	NNE	3.0			
	NNE	5.5	NNE	4.6	NNE	5.7	N	4.2	N	3.3	N	3.6	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	3.9	N	3.2	N	3.1	N	2.0	75.0	N	3.1
26	N	2.5	NNE	2.2	NNE	2.3	NNW	1.0	W	0.7	SW	0.5	NE	1.5	NE	2.8	NNE	2.9	NE	3.3	ENE	3.0	NE	2.7			
	NE	2.8	NNE	2.6	NNE	3.1	NE	2.4	NNE	3.7	N	3.5	NNE	2.5	E	0.9	NNE	0.9	N	1.5	NW	1.3	NW	1.7	52.3	NNE	2.2
27	NW	1.6	WNW	0.9	SSW	2.1	WNW	0.6	WSW	1.3	WNW	1.1	NNW	2.6	N	3.5	N	4.0	N	4.5	NNE	4.3	N	4.0			
	N	4.2	N	3.8	NNE	4.2	N	4.3	N	5.3	N	4.7	NNE	5.4	NNE	5.6	NE	6.7	NNE	4.1	NE	5.6	NE	3.8	88.2	N	3.7
28	NE	5.0	NNE	2.6	NNE	3.1	NNE	6.4	NNE	6.1	NE	5.0	NE	4.5	NNE	4.6	N	3.8	NNE	5.3	N	4.3	NNE	4.5			
	NNE	3.6	N	5.3	N	5.1	N	4.5	N	3.8	NNW	2.1	NNE	6.0	NE	4.9	ENE	5.0	NE	3.7	E	2.1	WNW	1.2	102.5	NNE	4.3
29	C	0.0	WSW	0.5	NNE	2.6	NE	3.9	NE	3.7	ENE	3.0	E	5.3	E	2.6	E	3.6	ESE	3.4	ESE	5.0	ESE	4.3			
	ESE	6.6	ESE	5.0	ESE	6.4	ESE	5.5	ESE	4.7	ESE	5.2	ESE	6.4	SE	7.1	SE	5.8	SE	6.8	SE	5.0	SSE	5.9	108.3	ESE	4.5
30	SE	5.7	SSE	6.4	S	5.6	WSW	0.5	WNW	0.6	NW	1.6	SE	0.9	SSE	2.1	S	3.3	SSE	5.8	SSE	5.4	SSE	4.2			
	SSE	4.6	SSE	5.8	SSE	4.3	S	2.7	S	0.8	NW	0.4	NNW	0.5	W	3.7	SE	0.6	WNW	1.7	E	0.6	WNW	2.3	70.1	SSE	2.9
31	SSE	1.2	NNW	4.0	N	7.2	NNW	5.9	NNW	4.3	NW	3.2	NNW	5.9	NNW	6.2	NNW	*6.0	NNW	5.5	N	7.8	NNE	8.2			
	N	7.6	N	7.0	N	7.7	N	5.4	N	7.2	N	5.7	NNW	4.2	N	5.4	N	6.2	N	7.6	N	6.6	N	6.2	142.2	N	5.9

PVL.	SSE		SSW		WNW		W		WSW		NW		WNW		NNE		NNE		NNE		NNE		NNE			
W/D	NNE		NNE		NNE		S		N		NNE		NNW		NW		NE		N		N		SSW		NNE	
SUM.		69.4		68.6		75.0		74.6		77.7		66.4		73.6		79.5		96.1		118.6		127.9		130.0			
W/S		141.0		137.4		127.6		115.4		120.0		99.2		99.4		86.5		90.2		87.1		74.6		86.1	2321.9		96.7
MEAN		2.2		2.2		2.4		2.4		2.5		2.1		2.4		2.6		3.1		3.8		4.1		4.2			
W/S		4.5		4.4		4.1		3.7		3.9		3.2		3.2		2.8		2.9		2.8		2.4		2.8	74.9		3.1

附錄Ⅳ.1-5 101年5月低塔21公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 21.0 M MONTHLY REPORT

May. 2012

STATION NO. : 40A48 LOCATION : 25?3'N - 121?5'E INST. Ht. : 21.0m Unit : m/s

STATION : YENLIAO STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (Low Tower)

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.	
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S			
1	C	0.0	WNW	0.6	C	0.0	C	0.0	NW	0.3	C	0.0	NNW	1.0	SE	0.4	C	0.0	ESE	0.9	ESE	0.9	ESE	1.0			
	SE	2.1	SE	2.2	E	0.4	NE	1.2	NNE	1.8	N	1.1	NNW	0.3	WNW	0.5	C	0.0	NW	0.7	C	0.0	NW	0.5	15.9	ESE	0.7
2	SW	0.4	SW	0.9	SSW	1.6	WSW	4.4	WSW	4.2	WSW	2.5	SW	1.6	SSW	2.3	WSW	2.6	SSW	1.8	E	1.4	E	1.0			
	SE	3.1	SSE	2.7	SSE	1.8	S	1.0	ENE	2.3	NNE	2.5	NE	3.3	NE	3.0	NNE	2.7	N	2.6	C	0.0	W	0.3	50.0	WSW	2.1
3	NW	0.9	NW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.2	N	1.6	NNW	1.2	NNW	0.3	NNE	1.9	NNE	2.0	NNE	2.1	NNE	2.0	NE	1.6			
	NE	1.7	NE	1.5	ENE	0.7	ENE	1.2	ENE	0.9	ENE	1.0	SSE	0.3	WNW	0.3	C	0.0	ENE	0.4	SSW	1.0	S	0.8	26.6	ENE	1.1
4	NNW	0.7	NW	0.3	NW	1.5	NNE	3.3	NNE	1.7	ENE	1.0	N	0.7	NE	2.8	NE	1.4	NE	3.4	NNE	3.3	NE	2.6			
	NNE	2.4	NNE	2.7	NNE	2.2	NNE	2.9	NNE	1.2	C	0.0	C	0.0	C	0.0	NW	0.5	C	0.0	C	0.0	NW	0.6	35.2	NNE	1.5
5	NNW	0.4	NW	0.7	NW	0.9	NW	1.0	NNW	1.1	NW	1.1	NW	1.0	N	1.9	NNE	2.8	NE	3.9	NNE	3.8	NNE	4.8			
	NNE	3.9	NNE	3.4	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.6	N	1.7	NW	0.5	NNW	1.0	NW	0.9	NNW	0.5	WNW	0.9	WNW	0.5	45.1	NNE	1.9
6	NW	1.3	NW	1.1	NW	0.8	NW	0.8	NW	1.1	NW	1.0	NNW	1.3	NNW	0.8	NNE	2.3	NNE	2.8	NE	2.2	NE	2.6			
	NNE	2.3	NE	2.0	NE	1.8	NE	1.5	ENE	1.0	E	1.0	SW	0.3	NW	0.9	NNW	1.0	NW	1.3	NW	1.2	N	0.7	33.1	NW	1.4
7	NNW	0.8	NW	1.2	NW	1.6	NNW	2.1	NW	1.2	NW	1.6	NNW	0.5	S	1.4	SE	2.3	SSE	2.9	SSE	2.6	SSE	2.5			
	SSE	4.3	S	4.0	SSE	3.2	S	3.8	S	4.2	S	2.4	SSW	1.5	WNW	0.5	NW	0.8	C	0.0	NW	0.8	NW	0.7	46.9	NW	2.0
8	NNW	0.8	WNW	0.6	NNW	0.3	C	0.0	NNW	0.7	NW	0.4	NNW	0.8	N	0.9	SSE	0.8	SSE	3.6	S	3.6	S	4.2			
	SSE	3.5	S	3.8	S	4.3	S	4.2	S	4.2	S	3.7	SSW	1.0	C	0.0	SSW	1.1	C	0.0	C	0.0	SSW	0.6	43.1	S	1.8
9	S	0.8	NNW	0.8	WNW	0.9	C	0.0	WNW	0.6	C	0.0	NNW	0.7	C	0.0	S	0.8	C	0.0	NNE	2.8	N	4.6			
	N	5.2	NNE	3.6	N	3.1	NNE	2.4	NNE	2.9	NNW	1.4	NNW	0.8	NW	0.9	NNW	0.8	NNW	0.8	NNW	0.7	NNW	1.2	35.8	NNW	1.5
10	NNW	0.9	N	1.4	NNW	1.5	NNW	1.0	N	2.0	NE	1.8	NNE	1.6	NNE	1.5	N	1.6	NNE	2.8	NNE	3.0	NNE	3.2			
	NNE	3.0	NNE	3.2	NNE	2.6	NNE	2.8	NNE	3.0	N	3.0	NNE	3.2	NNE	3.0	NNE	2.8	NE	1.7	NW	0.4	N	0.5	51.5	NNE	2.1
11	W	0.3	NNE	1.3	NW	0.8	C	0.0	C	0.0	C	0.0	NNW	0.7	C	0.0	N	0.6	SW	0.8	SE	0.8	S	0.8			
	NE	1.3	NE	0.9	E	0.9	SE	0.8	SE	1.1	SSE	1.0	S	2.5	S	0.8	C	0.0	SE	1.1	SSE	1.5	SSW	0.7	18.7	SE	0.8
12	S	1.0	SSE	1.3	SW	0.7	W	0.3	S	1.2	SSE	1.6	SSE	2.1	SE	2.2	E	0.3	SSE	2.3	SE	1.3	ENE	0.5			
	SE	1.2	SE	2.2	SSE	1.3	SE	2.0	SSE	1.5	SSE	1.7	S	1.9	SSE	1.7	SSE	2.6	SSE	3.6	SSE	3.1	SSE	3.7	41.3	SSE	1.7
13	SSE	2.9	S	2.1	SSW	2.1	SSE	2.1	SSW	1.0	WSW	0.9	S	0.5	SE	1.1	S	1.6	ESE	1.6	NNE	2.7	NE	2.0			
	ENE	1.4	E	1.1	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.1	NE	0.5	SSW	0.5	NW	0.4	NW	0.6	NW	1.2	NW	1.0	NNW	1.0	32.2	NE	1.3
14	NW	1.2	C	0.0	NNW	0.5	NW	0.3	NW	0.8	NW	0.7	W	1.5	W	2.5	E	0.9	SE	1.8	SE	2.6	SE	3.1			
	ESE	2.2	ESE	2.6	SE	2.4	SE	2.2	S	2.5	SW	0.7	SSW	1.2	NW	0.7	NW	0.6	WSW	0.3	NW	0.7	SSW	2.2	34.2	NW	1.4
15	NW	0.9	NW	0.8	WNW	1.2	WNW	0.4	NW	0.9	NW	0.4	SE	0.4	NE	0.8	NNE	2.2	SE	1.3	E	1.4	ENE	1.4			
	ENE	0.8	SE	1.7	NW	0.6	NW	1.7	W	2.0	NNW	1.5	WNW	0.7	NW	0.6	NNW	0.7	NW	0.8	NNW	1.1	NNW	1.2	25.5	NW	1.1
16	NNW	0.7	NNW	0.8	NNW	0.8	NW	0.5	NNW	1.0	NW	1.0	NNW	0.7	E	0.3	C	0.0	NE	0.9	N	1.1	NNE	2.1			
	NE	1.7	NE	1.2	NNE	1.6	NNE	1.0	NNE	0.8	NW	0.6	C	0.0	SW	0.4	C	0.0	N	1.3	NNW	0.9	C	0.0	19.4	NNW	0.8
17	NNW	0.4	NW	0.9	NW	0.6	C	0.0	WNW	0.7	W	0.6	WNW	0.4	C	0.0	NNW	1.1	N	2.3	N	4.7	N	4.4			
	NNE	2.1	NNE	0.7	SW	0.7	S	1.4	S	0.7	SSW	0.3	C	0.0	NW	0.5	WSW	0.5	W	0.6	WSW	0.6	SW	0.4	24.6	N	1.0
18	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.5	WNW	1.5	WNW	0.4	NW	1.2	NW	1.1	NE	0.3	NE	1.3	ENE	2.1	ENE	2.7	ENE	1.8			
	NE	3.0	NE	2.8	ENE	2.3	E	1.2	ESE	1.3	SSE	1.6	SSE	1.1	W	0.5	WNW	0.6	NW	0.7	NW	0.7	W	0.5	32.8	NW	1.4
19	NNW	0.5	NNW	0.5	WNW	0.3	WNW	0.5	W	0.3	NW	0.3	NW	1.0	WSW	0.5	ENE	0.6	SSE	1.4	SE	2.5	SE	2.7			
	SSE	1.9	SSE	2.3	SSE	2.6	SSW	1.8	W	1.6	SW	0.6	S	0.7	SSW	0.7	WSW	1.5	C	0.0	NW	1.2	SW	0.8	26.8	SSE	1.1
20	SW	0.4	SW	0.9	SSW	1.6	WSW	4.4	WSW	4.2	WSW	2.5	SW	1.6	SSW	2.3	WSW	2.6	SSW	1.8	E	1.4	E	1.0			
	SE	3.1	SSE	2.7	SSE	1.8	S	1.0	ENE	2.3	NNE	2.5	NE	3.3	NE	3.0	NNE	2.7	N	2.6	C	0.0	W	0.3	50.0	WSW	2.1
21	NNW	0.6	NW	0.7	NW	0.7	NNW	0.7	NW	0.3	NW	1.5	NNE	3.3	NNE	1.7	NNE	3.2	NNE	4.0	NNE	4.4	NNE	4.6			
	NNE	5.0	NNE	5.8	NNE	3.8	NNE	4.4	NNE	3.6	NNE	4.0	NNE	3.8	NNE	2.7	N	2.5	N	2.6	N	2.7	NNE	3.3	69.9	NNE	2.9
22	N	1.4	N	1.6	NNW	1.7	NNE	2.3	NNE	1.8	NNE	2.6	NNE	2.8	NNE	2.9	NE	3.2	NNE	3.0	NE	2.7	NNE	3.2			
	NNE	2.5	NE	2.2	NE	2.9	NNE	2.8	NNE	2.3	NNE	1.8	NW	1.0	NNW	1.2	NNW	1.3	NW	1.2	NW	0.7	NW	0.4	49.5	NNE	2.1
23	NW	0.9	NW	0.8	NW	0.9	NW	0.8	NW	0.3	NW	0.3	NNW	0.3	NNE	0.4	N	2.0	NNE	2.3	NE	2.6	ENE	1.6			
	ENE	2.1	E	1.8	E	1.7	ENE	1.7	NE	1.6	NNE	1.4	NW	0.7	NW	1.1	NW	0.9	NW	0.8	NW	0.4	WNW	0.5	27.9	NW	1.2
24	SSE	1.3	SW	0.6	SW	0.9	WSW	0.6	S	1.7	WNW	0.7	SSE	1.6	SE	1.4	SSE	3.3	S	3.6	SSE	3.9	S	4.2			
	S	4.4	S	4.0	SSE	4.0	S	3.1	S	3.1	SSW	2.0	SSW	0.9	SW	0.7	NW	0.7	SW	0.7	SSW	1.6	SSE	1.8	50.8	S	2.1
25	SSW	2.0	SW	1.6	WSW	1.5	NW	0.9	WNW	0.7	NW	0.8	NNW	1.4	NE	1.8	NE	2.3	ENE	1.5	ENE	1.2	NNE	2.4			
	NNE	4.3	NNE	3.8	NNE	3.4	NNE	2.9	N	2.0	NNE	2.1	NNW	1.4	NNW	2.1	NNW	1.8	N	1.8	N	1.5	NNW	1.2	46.4	NNE	1.9
26	N	1.1	NNE	1.3	N	0.9	WNW	0.3	SSW	0.3	C	0.0	NE	0.7	NNE	2.2	NNE	1.9	NE	2.2	ENE	1.7	NE	1.8			
	NE	1.5	NE	1.5	NNE	1.9	NE	1.4	NNE	2.8	NNW	1.9	NE	1.1	ESE	0.4	C	0.0	NW	0.7	NW	0.5	NW	0.8	28.9	NE	1.2
27	W	0.7	WSW	0.3	SSW	1.2	NW	0.4	WNW	0.4	NW	0.6	NW	0.7	N	1.8	NNE	2.4	N	2.3	N	2.0	N	2.0			
	N	2.2	NNW	2.1	N	2.6	NNE	2.6	N	3.0	N	2.7	NNE	2.8	NNE	3.1	NNE	3.2	NNE	1.5	NE	2.5	NE	1

附錄Ⅳ.1-8 101年5月高塔93公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 93.0 M MONTHLY REPORT

May. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO

LOCATION : 2572N、12175E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (High Tower)

INST. Ht. : 93.0m

Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.	
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S			
1	NW	0.6	S	0.5	SW	3.8	WSW	2.5	SSW	3.1	NW	0.9	WSW	3.4	WSW	2.3	ESE	0.9	S	3.5	SSE	3.5	SE	1.3			
	SE	3.7	SSE	3.1	S	0.9	SSW	1.1	NNE	1.6	NNW	1.4	N	1.1	SW	1.4	SSW	0.8	SW	3.7	WSW	1.8	W	2.5	49.4	WSW	2.1
2	WSW	4.2	WSW	3.7	WSW	3.9	W	6.7	WSW	4.8	SW	5.2	WSW	5.5	WSW	4.6	SW	4.4	SSW	3.5	ESE	3.5	SE	5.7			
	SSE	6.8	S	3.7	S	4.3	S	4.9	ENE	5.9	NE	6.2	NE	8.0	ENE	7.6	NE	8.7	NNE	7.3	NNW	1.8	NW	2.0	122.9	WSW	5.1
3	NNW	3.0	NNW	3.3	N	3.3	N	2.8	NNE	5.4	NNE	5.3	NNE	3.7	NE	4.4	NE	4.3	NE	4.7	NE	3.9	NE	3.9			
	NE	3.0	NE	3.7	ENE	2.6	ENE	2.3	ENE	2.8	ESE	2.1	SE	2.8	ESE	1.3	ESE	1.3	ESE	2.6	SSE	2.4	S	2.6	77.5	NE	3.2
4	S	2.1	S	2.9	NNW	2.2	NNE	7.0	NNE	5.0	E	2.7	S	1.0	NE	7.4	ENE	4.2	NE	7.4	NE	7.8	NE	6.6			
	NE	6.2	NE	5.7	NE	5.4	NE	6.5	NE	4.7	SSE	1.1	WSW	2.4	WSW	3.1	WSW	3.4	WSW	3.4	SW	3.0	W	2.3	103.5	NE	4.3
5	W	1.2	WSW	2.5	WSW	2.2	WSW	3.3	WNW	1.7	NW	3.2	NNW	3.2	N	3.9	NNE	5.6	NNE	6.2	NNE	6.7	NNE	7.1			
	NNE	6.2	NNE	6.1	NNE	5.7	NNE	5.1	NNE	5.7	N	4.5	NW	2.8	WNW	1.9	SW	3.3	SW	3.3	SSW	2.8	SW	1.9	96.1	NNE	4.0
6	SSW	1.2	SW	1.5	WSW	1.1	WSW	3.3	W	3.0	WSW	3.8	W	2.5	SSW	1.1	NE	3.3	NE	4.4	NE	3.3	NE	3.5			
	NE	4.0	NE	3.9	NE	3.5	NE	2.8	ENE	2.1	ESE	3.1	SE	2.9	SSE	1.0	SSE	2.7	SW	0.6	SW	2.0	WSW	3.3	63.9	NE	2.7
7	WSW	3.1	WSW	2.7	SW	2.3	WSW	1.9	WSW	2.0	SW	3.3	SW	2.8	S	3.5	SSE	5.3	SSE	5.9	SSE	6.8	SSE	6.6			
	SSE	8.8	SSE	6.9	SSE	7.2	SSE	7.4	S	6.8	S	4.9	S	3.7	SSW	3.4	SSW	4.0	SW	3.1	SSW	4.6	SSW	3.9	110.9	SSE	4.6
8	SW	2.1	WSW	4.2	SW	3.4	SW	4.2	SSW	3.2	S	4.4	SSW	3.1	W	0.5	S	2.0	S	7.4	S	6.4	SSE	8.7			
	SSE	8.9	SSE	7.5	SSE	7.3	S	8.2	S	7.6	S	9.0	SW	3.1	SW	2.4	SSW	3.9	SSW	4.2	SSW	4.7	SSW	5.5	121.9	S	5.1
9	SSW	1.8	S	4.8	SW	2.5	SSW	2.3	WSW	2.5	WSW	0.9	N	2.4	NNE	1.1	SSW	2.3	NNE	0.7	NNE	4.1	N	5.3			
	NNE	10.7	NNE	7.7	NNE	9.4	NNE	7.7	NNE	6.6	N	3.3	N	3.0	NNW	3.3	NNW	2.8	N	2.7	NNE	4.6		95.8	NNE	4.0	
10	N	2.5	N	4.7	N	3.7	N	3.1	NNE	5.7	ENE	4.3	NE	3.9	NNE	3.6	N	4.5	NNE	6.8	NNE	7.1	NE	8.1			
	NNE	7.9	NNE	7.2	NE	6.7	NE	6.8	NNE	6.2	NNE	7.5	NE	8.1	NE	7.5	NE	6.7	ENE	5.1	E	2.7	ENE	3.0	133.4	NNE	5.6
11	ENE	1.1	NNE	2.9	NNW	1.6	W	1.3	WSW	1.5	WSW	0.9	SW	2.8	ESE	1.9	ENE	0.6	SW	1.2	SE	2.6	SW	0.8			
	ENE	1.8	ENE	2.4	ESE	3.7	SSE	2.4	SE	3.2	SSE	2.7	SSW	4.7	SSE	4.4	SSE	2.2	SSE	2.7	SSE	5.5	S	2.8	57.7	SSE	2.4
12	SSE	4.0	SSE	4.7	SSE	2.5	SSE	3.4	SSE	2.7	SSE	3.4	SSE	3.8	SE	2.8	SSE	3.4	SSE	2.2	SSE	3.3	E	1.1			
	SE	1.6	SSE	5.5	SE	4.8	SE	4.0	SSE	4.0	SSE	6.3	SSE	6.3	SE	4.9	SSE	6.4	SSE	6.3	SSE	6.7	SSE	3.7	97.8	SSE	4.1
13	SSE	4.6	SW	1.5	SW	1.6	S	3.3	SSE	2.9	SW	3.8	S	3.1	S	2.5	S	2.1	SSE	3.3	NNE	4.8	ENE	2.1			
	SE	4.2	E	2.3	NE	2.9	NNE	2.4	NE	2.0	NNE	1.4	SSW	1.6	SW	0.3	SW	2.5	SW	2.5	SW	3.4	SW	4.0	65.1	SW	2.7
14	WSW	1.8	WSW	3.2	W	3.3	WSW	5.3	WSW	3.7	WSW	4.1	W	2.6	WSW	3.0	W	1.4	SSE	5.8	SSE	6.6	SSE	6.1			
	SE	5.5	SE	4.7	SE	5.0	SSE	4.6	S	5.0	SSW	2.1	SSW	2.5	WSW	3.0	WSW	1.9	SW	1.7	WSW	2.6	W	2.2	87.7	WSW	3.7
15	WSW	3.0	WSW	3.2	WSW	3.0	WSW	4.5	WNW	1.2	W	0.6	NNE	0.3	SE	1.2	SE	1.9	E	2.8	ENE	2.8	ENE	2.7			
	ENE	2.1	SE	2.5	SW	2.2	NW	3.2	WNW	5.3	WNW	2.9	NW	1.5	NNW	1.2	N	2.6	NNW	2.1	NNW	2.7	NNW	2.6	58.1	WSW	2.4
16	NNW	2.5	NNW	1.2	NNW	3.2	NNW	2.2	NNW	2.7	NNW	0.8	NNE	0.6	SW	2.0	NNE	0.8	NE	1.8	N	1.9	NNE	3.4			
	NNE	4.4	ENE	1.7	NNE	4.1	NE	3.3	NNE	3.2	NNW	2.2	NNW	1.8	NNE	1.9	N	2.7	N	3.6	N	3.0	N	2.3	57.3	NNE	2.4
17	NNW	2.3	NNW	2.2	N	2.6	NNE	2.4	N	1.6	NNW	1.2	N	1.0	N	1.3	N	3.0	NNE	5.1	NNE	9.7	N	7.5			
	NE	6.8	NNE	1.7	WSW	3.2	S	1.9	SSW	2.6	SW	2.9	WSW	3.9	SSW	3.8	SSW	3.1	SSW	3.0	SSW	4.1	SW	5.1	82.0	N	3.4
18	SW	4.9	SW	4.0	SSW	2.5	SSW	1.4	SSW	1.5	S	1.2	SW	0.5	E	0.9	NNE	1.8	ENE	4.1	ENE	4.3	ENE	3.4			
	NE	5.8	ENE	5.6	ENE	4.2	E	2.6	SE	3.6	SSE	3.7	SSE	3.0	S	1.7	SE	0.5	SSE	1.6	S	2.7	S	2.4	67.9	ENE	2.8
19	SW	3.3	SW	2.1	W	1.2	WNW	1.3	W	2.9	WSW	2.4	SSW	1.1	S	1.4	S	1.1	SSE	2.7	SSE	4.6	SSE	4.9			
	SSE	3.1	SSE	4.6	S	4.5	SW	2.6	WSW	4.6	SSW	3.1	SSW	3.2	SSW	5.7	W	3.3	W	3.4	NW	1.9	SSW	1.2	70.2	SSE	2.9
20	W	1.5	S	0.4	W	2.4	WSW	3.4	W	0.8	NW	1.8	N	2.1	N	3.2	ESE	1.3	NNW	2.1	NW	4.6	NW	4.7			
	N	5.8	N	9.1	N	9.5	NNE	8.8	N	9.0	N	9.0	NNE	9.9	NNE	9.2	N	6.9	NNE	8.7	NNE	7.6	NNE	8.0	129.8	N	5.4
21	N	3.5	NNE	7.0	N	7.3	N	6.6	NNE	7.1	NNE	8.3	NNE	8.9	NE	8.9	NNE	9.0	NNE	9.3	NNE	8.4	NNE	9.0			
	NNE	8.8	NNE	8.7	NNE	8.1	NNE	8.1	NNE	8.5	NNE	9.5	NNE	8.8	NNE	7.2	N	8.4	NNE	8.3	NNE	7.2	NNE	7.0	191.9	NNE	8.0
22	NNE	5.2	N	4.2	N	3.9	NNE	6.4	NNE	6.1	NNE	7.0	NNE	6.5	NNE	5.6	NE	5.9	NNE	5.9	NE	5.2	NE	5.5			
	NE	4.5	NE	4.8	NE	5.3	NNE	5.0	NNE	5.0	NNE	4.4	NNE	3.6	NNW	2.2	NNW	1.9	WSW	2.9	SW	3.3	WSW	3.3	113.6	NNE	4.7
23	SW	3.0	SSW	2.0	SW	1.0	WSW	0.4	C	0.0	SW	0.7	WSW	1.0	SW	1.5	NNE	2.5	NNE	3.5	NE	5.0	ENE	3.1			
	ENE	2.8	E	3.2	E	2.7	E	2.3	ENE	3.5	NE	1.8	N	1.9	NNW	2.1	NNE	0.8	NNW	1.4	S	1.9	SE	0.8	48.9	SW	2.0
24	SSE	1.7	S	4.3	S	3.2	SSW	4.0	SW	1.5	SW	3.2	S	1.3	SSW	2.5	SSW	5.3	S	5.7	S	7.2	S	7.4			
	S	7.5	S	7.8	S	8.0	S	8.3	S	6.0	S	3.1	SSW	1.7	SSW	2.3	SSW	2.0	SSW	3.3	WSW	3.3	SSW	4.4	105.0	S	4.4
25	WSW	2.1	SW	3.1	WSW	3.1	WSW	1.8	WSW	2.7	W	1.2	W	1.2	NE	2.9	NNE	3.8	ENE	2.5	ENE	2.0	NNE	2.0			
	NNE	6.3	NNE	5.6	NNE	7.1	NNE	6.6	N	4.7	N	4.6	NNW	2.5	N	4.5	NNW	3.3	NNE	5.1	NNE	4.2	NNE	3.9	86.8	NNE	3.6
26	NNE	4.3	NNE	4.0	NNE	3.4	N	1.7	SSW	0.9	SSW	1.0	NE	1.6	NE	2.5	NE	3.4	NE	3.4	NE	2.7	NE	3.1			
	NE	2.8	NE	3.1	NE	3.7	ENE	2.1	NNE	5.4	NNE	5.3	NE	3.9	ENE	1.3	NNE	0.9	NNE	2.1	NNW	1.3	W	1.1	65.0	NE	2.7
27	W	2.8	WSW	1.1	SSW	2.5	SW	0.9	SW	2.0	WNW	1.5	NW	0.8	N	3.4	NNE	4.9	NNE	6.4	NNE	5.2	NNE	6.4			
	N	5.6	N	5.7	N	5.6	N	5.7	NNE	6.9	NNE	7.3	NNE	7.4	NNE	7.6	NE	7.9	NE	5.1	NE	6.1	NE	4.9	113.7	NNE	4.7
28	NE	5.6	NE	3.9	NE	3.5	NNE	8.7	NNE	7.5	NE	6.9	NE	6.0	NE	6.1	N	4.9	NNE	6.6	NNE	6.6	NNE	5.2			
	NNE	5.5	N	6.3	N	6.4	N	5.4	N	5.3	NNW	2.1	NE	1.8	ENE	5.5	ENE	5.5	NE	4.9	E	1.6	E	0.6	128.4	NE	5.4
29	NNE	0.7	S	0.3	NNE	1.4	NE	4.0	NE	1.2	ENE	2.5	ESE	5.5	E	2.3	ESE	2.4	SE	6.0	SE	4.8	ESE	6.0			
	ESE	6.9	ESE	6.5	ESE	6.6	ESE	7.6	SE	4.9	ESE	6.8	ESE	6.5	SSE	8.9	SE	7.6	SE	8.9	SSE	7.8	SSE	7.5	123.6	ESE	5.2
30	SSE	7.1	SSE	8.4	S	8.1	SSW	1.4	WNW	1.4	NW	1.5	S	2.2	S	3.2	S	4.7	S	4.7	S	5.4	S	4.7			
	S	5.2	S	5.0	SSW	4.0	SSW	2.0	WSW	0.8	SSE	1.4	NNW	1.5	W	4.2	WSW	3.2	E	1.0	N	0.3	N	2.7	84.1	S	3.5
31	S	0.8	NNW	3.5	N	8.3	N	5.8	NNW	4.4	NW	3.9	NW	2.9	NNW	5.5	NNW	6.1	NNW	6.3	NNE	11.1	NNE	12.5			
	NNE	10.8	N	9.5	N	9.5	N	7.0	NNE	8.9	N	8.0	N	5.8	NNE	7.7	NNE	8.7	NNE	9.0	NNE	8.1	NNE	8.7	172.8	NNE	7.2

PVL.	WSW		WSW		N		WSW		NNE		SW		NNE		NE		NNE		NNE		NNE		NNE			
W/D	NNE		NNE		NE		NNE		NNE		NNE		SSW		NNE		SSW		NNE		NNE		NNE			
SUM.		87.6		98.0		98.0		107.3		92.7		91.9		87.3		97.0		107.1		141.9		161.9		158.4		NNE
W/S		174.0		161.8		164.1		148.7		152.4		133.7		127.7		122.5		120.4		123.7		113.8		110.8	2982.7		124.3
MEAN		2.8		3.2		3.2		3.5		3.0		3.0		2.8		3.1		3.5		4.6		5.2		5.1			
W/S		5.6		5.2		5.3		4.8		4.9		4.3		4.1		4.0		3.9		4.0		3.7		3.6	96.2		4.0

附錄Ⅳ.1-7 101年5月高塔63公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 63.0 M MONTHLY REPORT

May. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO

LOCATION : 2572N、12175E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (High Tower)

INST. Ht. : 63.0m

Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.	
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S			
1	WSW	2.2	SW	2.3	SW	2.7	SW	3.3	SW	2.9	SW	2.7	WSW	1.8	SW	1.1	ESE	0.7	SSE	2.2	SE	2.2	ESE	1.0			
	SE	3.1	SSE	2.2	SSE	0.7	WSW	0.8	NNE	1.5	N	1.5	WNW	0.7	SW	2.4	SW	3.1	SW	2.1	SW	2.7	SW	2.3	48.2	SW	2.0
2	W	2.5	WSW	2.0	WSW	2.0	W	3.4	SW	2.7	SW	2.8	WSW	2.5	WSW	2.3	SW	2.5	SSW	2.0	ESE	2.4	SE	4.1			
	SSE	3.7	S	2.2	S	2.5	S	2.8	ENE	2.5	NE	3.7	NE	5.0	ENE	4.1	NE	5.8	NNE	4.7	NW	1.2	WSW	1.5	70.9	WSW	3.0
3	NNW	2.2	NW	2.0	NNW	2.0	NNW	1.6	NNE	3.1	NNE	3.5	NNE	1.8	NE	2.7	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.7			
	NE	2.1	NE	2.5	ENE	1.5	ENE	1.6	ENE	1.8	ESE	1.1	SSE	1.9	SE	0.3	SSE	0.9	ESE	1.1	SSW	2.0	SSW	1.9	48.5	NE	2.0
4	SSW	1.4	SSW	2.4	NNW	1.4	N	4.4	NNE	2.5	E	1.8	SW	1.3	NE	4.4	ENE	2.4	NE	4.9	NE	4.4	NE	3.9			
	NE	4.0	NE	3.4	NNE	3.1	NNE	3.4	NE	2.9	SSW	1.5	WSW	1.8	WSW	2.0	WSW	2.1	SW	2.2	SW	2.3	SW	2.3	65.7	NE	2.7
5	SW	2.2	SW	2.0	WSW	2.3	SW	2.3	SW	1.8	NW	1.9	NNW	1.9	N	2.5	NNE	3.8	NNE	4.2	NNE	4.2	NNE	4.6			
	NNE	4.2	NNE	4.3	NNE	3.8	NNE	3.7	NNE	4.3	N	3.1	NW	2.2	SW	2.6	SW	2.8	SW	2.3	NW	3.3	NE	3.0	73.1	NNE	3.0
6	SW	2.7	SW	3.5	SW	3.0	WSW	2.5	SW	2.6	SW	2.4	WSW	1.4	SW	1.3	NE	2.7	NE	3.3	NE	2.7	NE	3.0			
	NE	3.2	NNE	3.0	NE	2.8	NE	2.5	ENE	1.6	SE	1.7	SE	1.8	SSW	0.5	S	1.7	NNW	0.6	WSW	1.4	WSW	1.6	53.5	NE	2.2
7	WSW	1.7	WSW	1.6	SW	1.5	WNW	0.9	WNW	0.5	W	1.0	WSW	1.2	SSW	1.9	SSE	3.2	SSE	3.2	S	4.1	SSE	4.2			
	SSE	5.1	SSE	4.1	SSE	4.3	SSE	4.1	S	3.5	S	2.9	S	2.7	SSW	2.2	SSW	2.6	SSW	2.0	SW	2.5	SW	2.2	63.5	SSE	2.6
8	WSW	1.4	SW	1.7	WSW	2.0	WSW	2.6	SW	2.8	SW	2.4	SSW	1.5	WNW	0.4	S	1.3	S	4.1	S	3.3	S	5.0			
	SSE	5.2	SSE	4.1	S	4.1	S	4.2	S	4.1	SSW	4.9	SW	2.0	WSW	1.3	SSW	2.6	SSW	2.7	SSW	3.0	SSW	2.9	69.6	S	2.9
9	SSW	1.1	SSW	3.1	SW	3.0	SW	2.1	WSW	1.5	WSW	0.6	N	1.6	NNE	0.7	SSW	1.1	NNE	0.4	NNE	2.4	N	3.4			
	NNE	7.6	NNE	4.0	NNE	6.2	NNE	5.1	N	4.4	NNW	2.0	NNW	1.9	NW	2.2	NW	2.1	NW	1.7	N	1.8	N	2.7	62.7	NNE	2.6
10	NNW	1.6	N	3.0	N	2.2	NNW	1.7	NNE	3.2	NE	2.5	NNE	2.2	N	2.5	N	3.2	NNE	3.7	NNE	4.1	NNE	4.5			
	NNE	4.9	NNE	3.7	NE	3.7	NE	4.2	NNE	3.9	NNE	4.5	NNE	4.1	NNE	4.3	NE	4.2	NE	2.9	ENE	1.6	ENE	1.3	77.7	NNE	3.2
11	C	0.0	NNE	1.7	WNW	1.2	WSW	1.4	SW	1.8	SW	2.1	SW	1.8	ESE	1.0	ENE	0.4	SW	0.8	SE	1.6	SSW	0.5			
	ENE	1.5	ENE	1.7	E	1.3	SSE	1.4	SE	1.8	SSE	1.7	SSW	2.7	SSE	2.5	SSE	1.3	SE	1.4	SSE	3.2	S	1.7	36.5	SSE	1.5
12	SSE	2.5	SSE	2.7	S	1.4	S	2.0	S	1.6	SE	2.1	SSE	2.4	SE	1.7	SSE	1.8	SSE	1.5	SE	1.8	ENE	0.6			
	ESE	1.0	SSE	3.5	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.2	SE	3.7	SSE	3.7	SE	3.2	SE	4.0	SSE	4.2	SSE	4.2	SE	2.4	60.0	SE	2.5
13	SSE	2.6	WSW	1.1	WSW	1.1	S	2.1	SSE	2.2	SSW	2.2	S	1.7	S	1.6	S	1.4	SSE	2.2	NNE	3.6	ENE	1.7			
	SE	3.0	E	2.1	NNE	2.1	NNE	1.8	NE	1.9	N	0.9	SSW	1.6	SW	2.3	SW	2.5	WSW	1.8	SW	1.6	SW	1.9	47.0	S	2.0
14	SSW	1.6	WSW	1.8	WSW	2.3	WSW	2.2	SW	2.5	SW	2.9	WSW	1.3	WSW	1.9	WSW	1.2	SSE	3.5	SSE	4.1	SSE	3.8			
	SE	4.1	SE	3.1	SE	3.3	SSE	2.6	S	2.5	SSW	1.7	SW	2.4	SW	1.5	SSW	2.1	SW	2.4	WSW	1.9	WSW	1.5	58.2	WSW	2.4
15	WSW	1.6	WSW	1.4	W	1.0	SW	2.7	WSW	1.8	SW	2.7	SW	0.6	ESE	1.1	SE	1.6	E	2.1	ENE	1.7	ENE	1.6			
	ENE	1.0	SE	1.8	SW	1.9	WNW	2.4	W	2.8	WNW	1.6	WSW	1.5	WNW	0.8	NW	1.6	NW	1.2	NW	1.8	NW	1.5	39.8	SW	1.7
16	NNW	1.9	NNW	0.9	NNW	2.1	NW	1.4	NW	1.6	SW	1.8	SSW	0.3	SSW	1.5	N	0.7	NE	1.7	N	1.5	NNE	2.2			
	NNE	2.8	E	1.1	NNE	2.5	NE	2.0	N	2.3	NW	1.4	NNW	0.9	NNE	1.2	N	1.7	NNW	2.4	NNW	2.0	N	1.6	39.5	NNW	1.6
17	NW	1.6	NW	1.5	NNW	1.5	N	1.3	NW	0.5	WSW	0.8	WNW	0.7	NW	0.7	N	2.3	NNE	3.4	NNE	6.4	N	4.9			
	NE	3.9	NNE	1.1	SW	1.9	SSW	1.7	S	1.5	SW	1.6	SW	2.4	SW	3.2	S	2.6	SSW	2.6	S	2.7	SW	3.0	53.8	SW	2.2
18	SW	3.0	SW	2.6	SW	2.8	SW	3.5	SW	3.0	SW	2.5	SW	1.7	ESE	0.7	NNE	1.4	ENE	2.6	ENE	2.7	ENE	2.3			
	NE	4.5	ENE	3.1	ENE	2.4	ENE	1.8	SE	2.2	SE	2.4	SE	1.7	SSE	0.5	NNE	0.3	S	0.6	SSW	1.3	SSW	1.6	51.2	SW	2.1
19	SW	2.4	SW	1.5	SW	1.1	SW	1.2	WSW	1.9	WSW	1.4	SW	1.0	SSE	0.8	SSE	0.9	SE	2.0	SSE	3.3	SSE	2.7			
	SSE	1.7	SSE	2.9	SSE	2.6	SSW	1.5	W	2.4	SW	2.0	SSW	2.1	SSW	3.0	WSW	1.6	WSW	1.8	W	1.6	SW	2.3	45.7	SSE	1.9
20	ANW	1.0	S	0.8	WSW	1.5	SW	2.0	SSW	2.0	WNW	1.4	N	1.4	NNW	2.1	ESE	1.0	NW	1.6	WNW	3.2	NW	3.1			
	NNW	3.9	N	5.6	N	6.8	N	6.3	N	5.9	N	5.8	N	6.4	NNE	6.0	N	4.3	N	5.8	N	4.9	N	5.2	88.0	N	3.7
21	NNW	2.4	N	4.5	N	4.8	N	4.2	N	4.5	N	5.5	NNE	5.4	NNE	4.9	NNE	5.3	NNE	6.0	NNE	5.6	NNE	5.9			
	NNE	5.7	NNE	5.7	NNE	5.4	NNE	5.2	NNE	5.1	NNE	5.8	NNE	5.2	NNE	4.6	N	5.6	N	5.3	N	4.7	NNE	4.6	121.9	NNE	5.1
22	NNE	3.0	N	2.4	N	2.4	N	4.2	N	3.9	NNE	4.0	NNE	4.1	NNE	3.8	NNE	3.5	NNE	3.8	NE	3.8	NE	3.9			
	NE	3.1	NE	3.4	NE	3.6	NNE	3.4	NNE	3.6	NNE	2.7	N	2.2	WNW	1.3	WSW	1.3	SW	2.3	SW	2.5	SW	2.2	74.4	NNE	3.1
23	SW	2.2	SW	2.2	W	0.8	SW	1.3	SW	2.7	SW	2.7	SW	1.6	SSW	1.6	NNE	1.7	NNE	2.6	NE	3.4	ENE	2.0			
	ENE	1.8	ENE	1.8	NE	2.1	E	1.6	ENE	1.8	NE	1.1	NNW	1.5	NW	1.4	SW	0.5	W	1.1	SSW	0.9	ENE	0.4	40.8	SW	1.7
24	SSE	0.9	S	2.5	S	2.2	SSW	2.7	SW	0.9	SW	2.0	SSE	1.0	SSW	1.4	S	3.3	S	3.1	S	4.2	S	4.4			
	SSE	4.4	SSE	4.3	SSE	4.7	SE	4.4	S	3.3	SSW	1.6	SSW	0.6	SSW	1.3	SW	0.9	SSW	1.8	WSW	1.5	SW	2.0	59.4	S	2.5
25	W	1.5	WSW	1.5	WSW	2.0	WSW	1.1	WSW	1.5	C	0.0	W	0.5	NE	1.8	NNE	2.8	ENE	2.0	ENE	1.8	NNE	2.3			
	NNE	4.6	NNE	4.0	NNE	4.6	NNE	4.8	N	3.6	N	3.4	NW	1.4	NNW	3.2	NNW	2.1	N	3.4	N	3.0	NNE	2.7	59.6	NNE	2.5
26	N	3.0	NNE	3.0	NNE	2.4	N	1.0	SW	1.7	SW	1.7	NNE	1.3	NE	1.9	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.8			
	NE	2.4	NNE	2.1	NNE	2.4	ENE	1.4	NNE	3.6	N	3.7	NNE	2.1	E	0.8	W	0.4	NNE	1.0	WNW	1.0	SW	1.7	49.2	NNE	2.0
27	WSW	1.9	SW	1.4	SW	1.9	SW	1.7	WSW	1.7	W	1.1	WNW	0.5	N	2.1	N	3.2	N	4.2	N	3.5	N	4.1			
	N

附錄Ⅳ.1-10 101年6月低塔63公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 63.0 M MONTHLY REPORT

Jun. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO

LOCATION : 2573'N、12175'E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (Low Tower)

INST. Ht. : 63.0m

Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN	
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	N	5.6	N	5.9	N	4.0	N	3.4	N	5.1	N	5.4	N	5.9	N	4.9	NNE	5.5	NNE	5.4	N	4.5	NNE	4.4				
	NNE	5.2	N	4.5	NNE	4.8	N	5.0	N	3.6	N	3.2	N	2.6	N	2.1	NW	1.4	NNW	2.0	NW	2.0	NW	0.6	97.0	N	4.0	
2	NNW	1.0	NW	1.2	WNW	0.9	SW	0.7	WSW	0.8	WNW	1.8	ENE	0.3	N	4.6	N	4.0	N	4.2	N	4.7	N	2.8				
	NNW	3.3	NNW	4.2	N	4.3	N	4.5	N	4.4	N	4.8	NNW	3.5	NNW	3.5	N	3.2	N	3.6	N	3.7	N	6.3	76.3	N	3.2	
3	N	6.5	N	7.6	NNE	7.4	NNE	8.0	NNE	7.8	NNE	8.9	NNE	7.2	NNE	6.6	NE	9.3	NNE	9.0	NNE	9.3	NNE	8.8				
	NNE	7.5	NNE	7.4	NNE	8.8	N	7.5	NNE	7.8	NNE	7.9	NNE	5.8	N	5.3	NNE	5.9	N	5.8	NNE	6.5			178.4	NNE	7.4	
4	NNE	6.4	N	6.1	N	6.2	N	5.3	N	4.4	N	4.9	N	4.8	N	4.4	N	4.4	N	4.7	N	5.9	N	5.6				
	N	6.1	N	5.9	N	4.7	N	4.4	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	5.0	NNW	4.7	NNW	4.5	NNW	4.4	NNW	3.5	NNW	3.7	119.4	N	5.0	
5	NNW	2.4	NNW	0.8	WNW	3.3	NNW	3.5	NNW	2.0	NNW	3.0	NNW	5.1	NNW	4.3	NNW	4.6	N	5.5	N	4.9	N	5.0				
	N	4.7	N	5.1	N	4.9	NNW	4.3	N	4.1	N	4.8	NNW	3.1	NW	2.4	NW	2.4	NW	2.3	S	0.8	NW	0.5	83.8	NNW	3.5	
6	NNW	1.0	NW	1.4	NW	0.9	C	0.0	NW	1.3	NW	0.9	SSW	0.8	WNW	0.9	E	0.8	ENE	1.9	ENE	1.7	E	2.7				
	ENE	2.9	NE	2.3	NE	2.7	E	3.1	ESE	1.3	ESE	1.0	SE	2.0	SE	2.1	S	1.9	S	1.6	SSE	1.7	S	3.0	39.9	NW	1.7	
7	SSW	1.8	SW	5.6	WNW	1.6	NNW	0.8	W	0.8	S	0.6	S	0.7	SE	0.6	SE	2.1	E	1.4	NNE	4.0	E	2.1				
	SSE	2.0	SSE	5.3	SSE	4.7	SSE	5.5	S	3.4	SSW	1.6	S	2.5	C	0.0	SW	0.4	SW	0.6	SSW	0.4	WNW	2.0	50.5	SSE	2.1	
8	WSW	0.8	W	0.6	WNW	0.9	WNW	0.9	SSW	1.2	NW	0.6	NE	0.4	E	1.4	ENE	1.3	NE	1.8	NE	3.3	NNE	2.4				
	NNE	1.5	NE	2.0	SE	0.5	SSE	2.4	W	4.6	WSW	3.4	SSW	1.4	WNW	0.6	WNW	0.6	WNW	1.1	WNW	1.6	WNW	1.6	36.9	WNW	1.5	
9	NW	1.2	SSE	0.5	W	1.3	NNW	0.4	W	0.5	W	5.4	W	3.4	WSW	1.2	W	1.7	ENE	1.6	ENE	1.5	E	2.0				
	NE	2.9	NE	1.8	NE	1.0	SSW	0.7	SW	0.9	NNW	0.7	W	1.1	SSW	1.0	SW	1.9	W	0.6	SW	1.2	WNW	1.0	35.5	W	1.5	
10	W	4.1	WSW	3.5	SW	3.7	WSW	3.2	N	0.6	W	2.7	W	2.9	SE	0.5	ESE	1.6	SE	4.3	S	1.0	E	2.3				
	SW	1.1	SE	2.1	ENE	1.3	S	3.2	S	3.4	SSE	2.6	E	0.5	SSW	1.9	SW	3.2	SW	0.9	NW	1.4	SSE	0.5	52.5	SW	2.2	
11	SSW	0.4	NW	0.7	N	1.3	SE	0.6	WNW	0.5	SSW	0.6	ESE	0.3	SE	1.0	ESE	0.4	ENE	2.2	NE	0.9	SE	1.7				
	SSE	1.8	WSW	3.8	SSW	6.4	SSW	3.7	S	4.5	SSW	1.0	SSE	3.1	SSE	2.4	WNW	1.2	NNW	5.3	SSW	3.5	WSW	2.7	50.0	SSW	2.1	
12	WSW	1.7	S	1.1	WNW	4.8	SE	0.9	WNW	0.9	WNW	1.5	C	0.0	SSE	1.6	SSE	1.0	S	2.9	W	1.1	ESE	0.3				
	NNE	0.8	NE	1.7	NE	4.1	N	2.1	NNE	2.8	N	4.4	NNW	3.5	NW	2.8	NNW	1.3	NW	2.9	W	2.4	WNW	1.1	47.7	WNW	2.0	
13	NW	2.8	NW	4.0	WNW	2.3	NW	2.1	NW	2.3	NW	2.2	NW	2.0	N	2.8	NNE	4.4	NNE	3.8	NNE	3.3	NNE	4.0				
	N	3.7	NE	2.2	ENE	1.3	E	1.0	SE	1.0	SSW	1.3	S	0.3	WNW	1.1	SW	0.8	WNW	1.0	W	0.8	SW	0.3	50.8	NW	2.1	
14	SSW	0.9	W	0.5	WNW	1.1	W	0.3	SSE	1.1	NW	1.6	WNW	2.5	NW	2.3	N	0.8	N	2.9	N	2.2	NNE	1.1				
	NE	0.8	NE	1.3	SSE	3.0	SSE	3.4	SSE	2.7	S	1.2	S	1.6	S	1.6	SSE	1.5	E	0.3	S	2.5	S	6.7	43.9	SSE	1.8	
15	SSE	3.5	SSE	7.2	S	9.3	SSE	10.0	SSE	4.4	SSE	5.1	S	8.7	S	6.0	S	6.7	S	6.9	SSE	5.9	SSE	8.7				
	SSE	9.0	S	8.0	SSE	6.2	S	6.1	S	2.8	NNW	0.4	NW	1.2	WNW	0.5	W	1.2	W	1.5	W	1.4	SW	1.0	121.7	SSE	5.1	
16	NNW	0.7	WNW	0.9	NW	0.9	SW	1.1	W	1.1	NW	0.7	SE	0.9	NNE	1.8	NE	1.9	NE	1.6	NNE	3.2	NNE	1.8				
	NNE	3.4	NNE	3.8	N	4.1	NNE	3.4	NNE	2.7	ENE	1.3	ESE	4.0	SE	4.3	SE	8.1	SSE	6.9	SSE	6.9	SSE	8.3	73.8	NNE	3.1	
17	S	5.8	SSW	2.5	SSE	2.9	SSE	5.8	SSE	5.3	SSE	6.3	SSE	4.8	SSE	6.0	SSE	6.1	SSE	6.9	SSE	4.5	SSE	7.4				
	SSE	8.5	SSE	7.3	SSE	4.6	S	2.9	S	1.4	SE	7.5	SSE	7.0	SE	7.4	SE	7.3	SSE	7.1	SSE	4.3	SSE	3.1	132.7	SSE	5.5	
18	SE	6.0	SSE	5.3	SSW	1.8	SW	1.3	SSW	0.9	W	1.1	NE	0.9	ENE	1.1	NNE	2.1	NE	2.6	NNE	5.0	NNE	6.4				
	NE	5.6	NNE	7.4	N	5.4	N	4.6	NNE	4.7	N	4.3	ESE	2.4	S	0.9	SSW	4.2	SE	0.3	WNW	0.8	N	0.4	75.5	NNE	3.1	
19	W	0.9	N	0.8	SW	1.3	NNW	1.0	N	0.4	W	0.5	WSW	1.2	SSE	0.6	NNE	0.9	SSE	0.5	E	1.3	ENE	1.3				
	NE	1.5	NNE	1.5	E	2.8	ESE	1.7	WNW	1.1	WNW	0.5	WNW	1.3	NNW	1.2	NNE	2.3	NNW	0.6	NE	3.2	NNW	0.5	28.9	NNW	1.2	
20	N	2.0	NE	4.4	NNW	2.6	NNW	2.0	SW	0.9	NW	2.5	SSE	2.3	NW	1.0	NE	1.8	ENE	1.9	SE	3.6	SSW	3.0				
	SSW	2.3	SSW	2.6	SW	1.4	W	1.1	NE	0.3	E	0.8	NW	2.3	N	10.6	NNE	10.2	NW	4.4	NW	3.4	WNW	3.5	70.9	NW	3.0	
21	WNW	5.0	WNW	6.1	WNW	4.1	WNW	5.5	NW	2.3	WNW	8.9	WNW	3.5	WNW	1.8	WNW	2.0	WNW	0.8	ENE	1.1	N	4.5				
	N	2.7	NNW	3.3	SE	1.1	NNW	2.8	WNW	1.2	SW	0.9	SW	1.8	SSW	2.1	WSW	1.1	SW	3.1	W	1.1	S	0.5	67.3	WNW	2.8	
22	SW	0.7	SW	0.9	N	0.4	SSW	1.0	WNW	1.2	W	1.9	SSW	0.6	N	0.7	E	0.9	E	1.4	E	2.0	E	3.3				
	SE	4.6	SSE	3.2	SSE	2.5	S	2.3	WSW	1.7	SSW	1.2	W	1.0	SW	0.9	SW	1.2	W	1.1	N	0.8	W	0.3	35.8	E	1.5	
23	WNW	2.1	SW	1.2	W	1.0	WNW	1.5	C	0.0	WNW	1.1	C	0.0	NW	0.6	E	1.0	NNE	2.9	NE	2.2	NE	2.6				
	NNE	3.2	NNE	3.1	NE	1.7	NNE	2.2	ENE	1.2	N	1.0	NNW	0.3	ESE	1.6	WNW	1.2	WSW	1.2	WNW	0.5	W	0.6	34.0	WNW	1.4	
24	SSW	0.3	WNW	0.4	NW	0.4	WNW	1.8	SSW	1.4	WSW	0.8	WNW	0.7	W	1.5	NE	2.4	E	2.7	NE	4.1	N	5.3				
	NNW	4.7	NNE	4.5	NE	3.4	NE	2.9	ENE	2.9	ESE	1.7	S	0.9	WSW	0.7	C	0.0	SW	0.6	WNW	0.7	NW	0.4	45.2	NE	1.9	
25	NW	1.4	WNW	1.2	WNW	0.4	W	1.7	NW	1.3	C	0.0	NW	1.0	ENE	1.5	E	1.6	E	1.5	E	2.2	ENE	2.6				
	E	3.5	ENE	2.5	E	2.3	WNW	1.5	WNW	2.6	SW	1.0	NW	0.6	SW	1.1	NW	1.2	WNW	0.8	W	0.9	WNW	0.5	34.9	WNW	1.5	
26	C	0.0	WNW	1.2	WNW	1.6	ESE	0.3	WNW	0.9	WNW	0.5	W	0.8	SE	1.0	NE	1.5	NE	1.4	NE	2.5	NE	3.8				
	NNE	3.3	NE	3.2	NNE	2.8	NE	1.5	W	1.4	W	1.2	W	0.4	SSW	0.6	SSW	0.3	SW	0.9	SSW	0.4	WSW	0.5	32.0	NE	1.3	
27	WNW	1.0	W	1.1	NW	1.8	WSW	0.7	NW	1.0	WNW	1.0	NNE	0.3	ENE	0.7	ENE	1.8	ENE	2.0	ESE	2.7	SE	4.6				
	SE	4.9	SE	3.5	ESE	4.3	SE	5.1	SE	3.8	SE	3.2	SSE	4.3	SSE	2.4	SSE	4.9	SSE	5.2	SSE	7.2	SSE	6.0	73.5	SE	3.1	
28	SSE	5.2	SSE	5.7	S	3.7	S	2.3	WSW	0.6	WNW	1.4	SE	1.8	SE	4.6	SE	4.5	SE	5.3	SE	6.0	SE	5.2				
	SE	5.2	ESE	5.8	ESE	5.2	ESE	6.5	ESE	5.8	SE	4.4	SE	6.1	ESE	6.5	SE	6.7	SE	8.5	SE	9.1	SE	10.6	126.7	SE	5.3	
29	SSE	10.3	SE	10.6	SSE	10.3	SSE	10.0	SSE	10.3	SSE	7.1	SSE	3.5	SSE	7.7	SSE	10.2	SSE	10.2	SSE	9.8	SSE	9.3				
	S	9.3	SSE	10.2	SSE	10.0	SSE	8.2	SSE	5.1	S	3.1	SSE	5.9	SSE	6.1	SSE	6.2	S	4.3	SSE	4.5	SSE	4.0	186.2	SSE	7.8	
30	S	4.8	SSW	2.7	WNW	0.6	WSW	0.8	ENE	0.4	NW	1.2	SSE	1.4	SSE	4.8	SSE	5.7	SSE	7.1	SSE	6.2	S	9.8				
	S	10.5	S	8.7	SSW	7.8	SSW	1.7	NE	3.7	NNE	3.0	NNE	2.4	NNW	1.2	SSE	1.8	S	1.6	S	1.5	WSW	0.6	90.0	SSE	3.7	

PVL.	WNW		WNW		WNW		NNW		NW		WNW		SSE		N		NE		ENE		N		NNE					
W/D	NNE		NE		SSE		N		S		N		NNW		SSW		SW		SW		SSE		WNW				SSE	
SUM.		86.3		91.7		82.8		76.9		61.7		80.2		68.7		78.5		93.0		107.3		110.6		124.8					
W/S		126.5		128.2		118.1		105.3		92.2		77.5		77.9		79.6		88.1		80.5		78.0		77.3	2191.7		91.3	
MEAN		2.9		3.1		2.8		2.6		2.1		2.7		2.3		2.6		3.1		3.6		3.7		4.2				
W/S		4.2		4.3		3.9		3.5		3.1		2.6		2.6		2.7		2.9		2.7		2.6		2.6	73.1		3.0	

附錄Ⅳ.1-9 101年6月低塔21公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 21.0 M MONTHLY REPORT

Jun. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO

LOCATION : 2573'N、12175'E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (Low Tower)

INST. Ht. : 21.0m

Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D	MEAN	
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	N	2.6	NNE	3.9	N	2.1	N	1.7	N	3.1	N	2.7	N	3.2	N	2.7	NNE	3.5	NNE	2.9	NNE	3.0	NNE	2.7				
	NNE	3.0	NNE	2.9	NNE	3.1	N	3.0	N	2.1	N	1.9	N	1.5	NNW	0.8	NW	0.4	NNW	0.7	NNW	0.9	C	0.0	54.4	N	2.3	
2	NNW	0.3	NW	0.6	NW	0.8	WNW	0.3	C	0.0	NW	0.9	C	0.0	NNE	2.6	N	2.2	N	2.3	N	2.1	N	1.5				
	N	1.4	NNW	2.4	N	2.4	N	2.5	N	2.6	N	2.6	NNW	2.2	NNW	1.5	N	1.5	N	1.9	N	1.7	N	3.5	39.8	N	1.7	
3	N	3.6	NNE	3.6	NNE	4.2	NNE	3.8	NNE	4.1	NNE	4.0	NNE	4.2	NNE	3.3	NE	4.1	NNE	4.5	N	4.7	NNE	4.6				
	N	4.7	N	4.8	NNE	4.7	N	3.9	NNE	5.0	NNE	3.9	NNE	2.9	N	2.6	NNE	3.2	N	3.1	N	3.1	NNE	3.5	94.1	NNE	3.9	
4	NNE	3.2	N	3.3	N	3.1	N	2.6	N	2.2	N	2.7	N	2.4	N	2.2	N	2.5	N	2.5	N	3.8	N	3.4				
	N	4.3	N	3.6	N	3.1	N	2.6	N	2.8	NNW	2.2	N	2.7	N	2.1	NNW	2.1	NNW	2.2	N	1.8	NNW	1.6	65.0	N	2.7	
5	NNW	1.1	C	0.0	WNW	0.8	NNW	1.5	NW	0.4	NNW	1.1	N	2.5	N	2.1	N	2.7	N	3.3	N	3.0	N	2.8				
	N	2.8	NNE	3.1	N	2.9	NNW	2.3	N	2.4	N	2.6	NNW	1.3	NW	0.8	NW	0.7	NNW	1.0	NW	0.3	NW	0.6	42.1	N	1.8	
6	NW	0.3	C	0.0	C	0.0	C	0.0	C	0.0	C	0.0	SSW	0.5	C	0.0	ENE	0.6	ENE	1.3	NE	1.3	ENE	1.3				
	ENE	1.7	NE	1.4	NNE	1.6	ENE	1.1	E	0.5	ESE	0.4	SE	0.9	SSE	0.9	SSW	0.8	SSW	0.9	ESE	0.6	S	0.9	17.0	ENE	0.7	
7	WSW	0.8	SSW	3.5	NW	1.2	NNW	0.3	WNW	0.6	C	0.0	C	0.0	E	0.4	ESE	1.4	E	0.9	NNE	3.2	ENE	1.3				
	E	1.0	SSE	3.6	SSE	3.0	SSE	3.2	S	2.6	SW	1.0	S	1.3	C	0.0	C	0.0	NNW	0.4	NW	0.6	NW	1.4	31.7	E	1.3	
8	NW	0.6	NW	0.4	NNW	0.7	NNW	1.2	W	0.5	C	0.0	C	0.0	NE	1.1	ENE	1.1	ENE	1.3	ENE	1.6	NNE	1.6				
	NNE	1.0	NNE	1.5	S	0.3	SSE	1.7	W	2.7	WSW	1.8	S	1.0	NNW	0.4	W	0.4	NW	0.8	NW	0.8	NW	1.2	23.7	NW	1.0	
9	NW	0.7	SSE	0.7	W	0.6	NW	0.4	C	0.0	WSW	2.6	W	1.7	SW	0.5	NW	1.0	NE	0.9	ENE	1.1	ENE	1.3				
	NE	1.6	NE	1.0	SE	0.4	S	0.5	SW	1.0	C	0.0	W	1.0	C	0.0	SSW	0.4	WNW	0.7	SSW	0.5	NW	0.5	19.1	NW	0.8	
10	W	1.6	WSW	1.4	SW	1.4	W	1.3	NNW	0.4	SW	0.5	W	1.2	SE	0.4	ESE	1.2	SE	2.5	SSE	0.7	E	1.2				
	SSW	0.7	ESE	0.7	ENE	1.1	S	2.1	SSW	1.8	SSE	1.8	C	0.0	WSW	0.7	SW	1.0	WSW	0.9	NW	0.3	SW	0.4	25.3	SW	1.1	
11	NNW	0.5	NW	0.5	NW	0.6	C	0.0	NW	0.8	NNW	0.4	C	0.0	SE	0.5	ENE	0.5	ENE	1.4	NNE	1.0	ESE	0.9				
	SE	0.9	SSW	2.2	S	3.8	SSW	2.4	S	2.8	NNE	0.3	SSE	1.7	SSE	1.3	WNW	0.8	NNW	2.7	SSW	2.0	SW	1.5	29.5	SSW	1.2	
12	SW	0.4	SSE	0.7	W	1.5	ENE	0.5	C	0.0	NNW	0.5	C	0.0	SSE	0.7	S	0.4	SSW	1.5	C	0.0	C	0.0				
	C	0.0	NE	0.8	NE	1.7	NNW	0.8	NNE	1.4	NNW	1.5	NNW	1.3	NW	0.9	C	0.0	NW	1.0	SW	1.4	NE	0.3	17.3	NNW	0.7	
13	NNW	1.0	NW	1.4	WNW	0.5	NW	1.2	NNW	1.2	NNW	1.1	NNW	0.6	N	1.5	NNE	3.0	NNE	2.5	NE	1.8	NNE	2.4				
	NNE	1.8	NE	1.2	ENE	0.9	C	0.0	C	0.0	C	0.0	C	0.0	C	0.0	C	0.0	NW	0.5	NW	0.9	NW	0.7	24.2	NW	1.0	
14	NW	0.5	NW	0.7	NW	0.7	C	0.0	C	0.0	NNW	0.8	NNW	0.9	NNW	0.6	NE	0.4	N	1.4	NNW	1.0	N	0.6				
	NE	0.6	NE	1.0	SSE	1.3	S	2.1	SSE	1.3	C	0.0	SW	0.7	SW	0.7	SSW	0.3	C	0.0	S	1.0	S	3.4	20.0	NNW	0.8	
15	S	1.9	SSE	3.5	S	5.0	SSE	5.7	S	2.0	S	2.6	S	5.5	S	3.3	S	4.0	S	4.4	SSE	3.5	SSE	4.7				
	SSE	5.0	S	4.9	SSE	3.5	SSE	2.6	S	1.3	C	0.0	NW	0.7	WSW	0.4	C	0.0	W	0.9	WSW	0.6	WNW	0.3	66.3	S	2.8	
16	C	0.0	NW	0.8	C	0.0	WSW	0.6	WNW	0.6	WNW	0.3	E	0.5	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.0	NNE	2.4	NNE	1.3				
	NNE	2.6	NNE	2.9	NNE	2.3	NNE	1.1	NE	0.3	ESE	2.0	SE	2.0	SSE	4.3	SSE	3.2	SSE	3.9	SSE	4.4			40.9	NNE	1.7	
17	S	3.1	WSW	1.2	SSE	1.3	SSE	2.7	S	3.3	S	3.2	SSE	2.5	SSE	3.1	SSE	3.7	SSE	4.2	SSE	2.6	SSE	4.4				
	SSE	5.0	SSE	4.0	SSE	2.2	S	1.5	SSW	0.8	SSE	3.9	SSE	3.6	SE	4.1	SE	4.1	SSE	3.6	SSE	2.0	S	1.3	71.4	SSE	3.0	
18	SE	2.7	SSE	2.7	W	0.8	NW	0.7	NNW	0.5	NW	0.6	NE	0.8	NE	1.0	NNE	1.5	NE	1.5	NNE	3.7	NNE	3.4				
	NE	3.1	NNE	4.4	NNE	3.4	NNE	3.2	NNE	2.8	NNE	2.5	SE	1.2	S	0.5	SSW	1.9	NW	0.5	NW	0.7	C	0.0	44.1	NNE	1.8	
19	WSW	0.3	NE	0.5	SSW	0.5	NNW	0.6	NW	0.5	N	0.5	W	0.6	C	0.0	NNE	0.9	C	0.0	ENE	0.8	E	0.8				
	NNE	1.3	NNE	1.3	ENE	1.4	SE	1.0	W	0.6	W	0.3	WSW	0.6	NNW	0.5	N	1.1	WSW	0.4	NNE	1.1	C	0.0	15.6	NNE	0.7	
20	NNW	0.5	NNE	1.8	NNW	1.0	NW	0.6	SSW	0.6	NW	0.8	S	1.5	C	0.0	NE	1.2	ENE	0.8	SSE	1.9	SSW	1.4				
	S	1.2	SSW	1.0	S	0.7	WNW	0.7	C	0.0	C	0.0	WNW	0.9	N	6.2	NNE	5.4	NNW	1.4	NW	1.7	NW	1.4	32.7	NW	1.4	
21	NNW	2.5	WNW	2.9	NW	1.7	WNW	2.7	NNW	0.9	W	4.8	WNW	2.1	WNW	0.8	W	1.1	S	0.3	NE	0.3	NW	2.7				
	N	1.2	NNW	1.8	SSE	0.8	NNW	1.1	W	1.0	S	0.5	SW	0.8	SW	0.5	C	0.0	WSW	1.2	C	0.0	C	0.0	31.7	WNW	1.3	
22	NW	0.3	NW	0.6	NW	0.4	C	0.0	NNW	1.0	NW	0.5	NW	0.9	NNW	0.3	C	0.0	E	0.9	E	1.2	E	1.5				
	SE	2.7	SE	2.2	SSE	1.8	S	1.4	SW	1.0	SSW	0.8	NNW	0.3	WSW	0.7	SSW	0.6	NW	0.9	NW	0.6	NW	0.7	21.3	NW	0.9	
23	NW	1.0	C	0.0	C	0.0	NW	0.8	C	0.0	NW	0.8	C	0.0	C	0.0	ESE	0.8	NNW	0.8	NNE	2.1	NE	1.4				
	NNE	2.7	NNE	2.5	NE	1.0	NNE	1.4	NE	0.5	NNW	0.4	C	0.0	E	0.8	NW	0.6	NW	0.5	C	0.0	WNW	0.6	19.4	NW	0.8	
24	C	0.0	C	0.0	NW	0.6	WNW	0.6	SW	0.6	WSW	0.9	N	0.4	W	1.1	ENE	1.7	E	1.8	ENE	2.0	NNE	3.4				
	NNE	3.4	NNE	3.0	NE	1.8	ENE	1.5	ENE	1.4	ESE	0.8	SW	0.7	NW	0.5	C	0.0	C	0.0	NW	0.6	NW	0.9	27.7	ENE	1.2	
25	NW	1.1	NW	1.3	NW	0.7	NW	1.0	NNW	0.8	WNW	0.6	NNW	0.7	ENE	0.8	E	0.9	E	0.8	E	1.4	ENE	1.9				
	ENE	2.0	ENE	1.8	ENE	1.5	W	1.2	NW	1.4	SW	0.9	C	0.0	NW	0.4	NW	0.4	NW	0.7	WNW	0.4	NW	0.5	23.2	NW	1.0	
26	NW	0.4	NW	0.7	NW	0.8	C	0.0	C	0.0	NW	0.5	C	0.0	SE	0.7	NE	1.2	NNE	1.2	NE	1.5	NNE	2.5				
	NNE	2.5	NE	1.9	NNE	2.3	ENE	0.7	WSW	1.0	WNW	0.3	NNW	0.5	NNW	0.8	NNW	0.7	NW	0.4	WNW	0.3	NW	1.0	21.9	NW	0.9	
27	NW	1.1	WNW	0.6	NW	1.0	WNW	0.6	NW	1.2	WNW	0.6	C	0.0	C	0.0	ENE	1.2	E	1.3	ESE	1.7	ESE	2.5				
	SE	3.0	SSE	2.8	SE	1.8	SE	2.5	SE	1.9	SSE	1.7	SSE	2.0	SSE	1.3	SSE	2.0	SSE	2.4	SSE	3.8	SSE	3.3	40.3	SSE	1.7	
28	SSE	2.6	SSE	2.9	S	1.9	SW	0.6	NW	0.6	NW	0.7	SE	0.8	SE	2.9	SE	2.8	SE	2.8	SE	3.5	SE	2.8				
	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	1.9	ESE	3.0	ESE	2.5	SSE	2.1	SE	3.0	ESE	3.3	SE	3.3	SE

附錄Ⅳ.1-12 101年6月高塔93公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 93.0 M MONTHLY REPORT

Jun. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO

LOCATION : 25?2?N 、 121?5?E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (High Tower)

INST. Ht. : 93.0m

Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D		MEAN
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	NNE	6.9	NNE	7.1	N	5.1	N	4.6	NNE	6.7	N	6.0	N	6.4	N	6.1	NNE	8.7	NNE	7.0	NNE	6.0	NNE	6.3				
	NNE	7.3	NNE	6.4	NNE	6.1	NNE	5.7	NNE	4.4	NNE	4.3	N	3.7	N	2.4	NNW	2.5	N	2.7	N	2.2	WSW	0.8	125.4	NNE	5.2	
2	W	0.7	W	1.7	W	2.5	WSW	2.6	WSW	2.8	W	2.4	WSW	2.0	N	5.3	N	4.6	N	4.6	N	4.0	N	3.7				
	N	3.4	NNW	3.4	N	5.8	N	6.8	N	5.8	N	5.7	N	4.3	NNW	3.1	N	4.2	N	5.5	N	5.2	N	6.8	96.9	N	4.0	
3	NNE	9.5	NNE	10.4	NNE	9.2	NNE	10.0	NNE	10.3	NNE	11.1	NNE	10.2	NNE	8.6	NE	9.9	NNE	10.8	NNE	12.5	NNE	11.4				
	NNE	10.2	NNE	10.5	NNE	10.5	NNE	10.2	NNE	10.8	NNE	10.4	NNE	8.0	NNE	8.1	NNE	7.6	NNE	8.3	NNE	7.7	NNE	8.5	234.7	NNE	9.8	
4	NNE	8.3	NNE	8.6	N	8.4	N	6.4	N	4.8	N	6.3	N	5.3	N	6.0	N	6.6	N	6.5	N	7.2	N	7.5				
	N	7.8	N	7.5	N	6.8	N	6.3	N	7.4	NNW	4.3	N	6.0	N	6.7	NNW	4.9	NNW	4.0	N	4.0	NNW	3.6	151.2	N	6.3	
5	NNW	1.7	WNW	3.2	NW	3.0	NW	2.9	NNW	2.9	NNW	2.7	NNW	3.8	N	3.6	N	4.4	N	6.9	N	5.9	N	6.0				
	N	6.1	N	6.0	NNE	6.6	N	5.2	N	5.2	N	6.2	N	4.1	NNW	2.9	NNW	2.8	NNW	2.3	SW	2.4	WSW	0.6	97.4	N	4.1	
6	N	0.6	NW	1.3	W	0.9	SW	1.0	NW	0.8	SW	1.2	SSW	1.0	W	0.5	E	1.1	E	1.5	SE	2.9	SE	4.7				
	E	3.0	E	2.8	NE	2.2	ESE	1.9	SSE	3.2	SE	2.6	SE	2.8	SE	2.6	S	1.4	SSE	2.2	S	2.7	S	8.8	53.7	SE	2.2	
7	SSW	5.3	SW	2.8	SSW	2.9	WSW	3.0	W	1.6	W	2.6	S	2.5	ESE	1.7	ESE	2.0	E	2.1	NNE	4.2	E	1.6				
	S	5.9	S	5.8	S	5.2	SSW	3.6	S	4.2	SSW	2.8	SSW	2.8	NE	1.7	S	0.9	SW	1.9	SW	1.5	NNW	0.9	69.5	S	2.9	
8	WSW	3.2	WSW	2.1	WNW	1.2	WSW	2.5	W	2.6	SW	1.4	WSW	1.5	ESE	1.5	NE	1.6	NE	1.9	ENE	2.5	NNE	2.5				
	NNE	1.9	ENE	1.7	E	1.0	SSE	2.5	WSW	5.4	W	2.9	W	2.0	WSW	5.0	WSW	2.7	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	3.4	60.8	WSW	2.5	
9	WSW	3.8	SSE	1.2	WSW	2.9	WSW	3.4	WSW	3.6	W	4.6	WSW	3.1	W	2.6	ESE	0.8	ENE	2.7	ENE	2.0	ENE	2.3				
	NE	3.2	NE	2.8	ENE	1.0	WSW	1.5	WSW	2.0	W	0.6	SW	2.5	SSW	2.4	SW	3.7	W	1.5	WSW	2.9	SW	3.8	60.9	WSW	2.5	
10	WSW	4.9	W	2.9	WSW	3.6	SW	3.4	SW	2.3	W	3.3	W	3.0	SSW	1.8	SSE	2.6	SE	6.0	S	1.5	ESE	2.5				
	NE	2.7	SSE	2.5	ENE	0.9	S	4.3	SSW	6.4	SSW	5.5	SSW	3.7	SSW	5.9	WSW	4.0	WSW	1.7	NNW	0.8	SW	2.6	78.8	SSW	3.3	
11	WSW	1.8	WNW	0.8	WSW	1.4	WSW	1.6	SW	0.4	SW	1.7	SW	1.6	S	1.2	ESE	0.7	NE	2.2	SSE	1.1	S	2.5				
	S	3.6	S	3.3	S	5.3	SSW	6.1	SSW	4.8	S	2.1	S	4.7	S	3.9	NW	1.7	N	4.7	SW	2.8	WSW	3.7	63.7	S	2.7	
12	WSW	3.0	SW	3.1	WNW	4.6	W	2.3	WSW	2.9	WSW	2.1	ENE	0.8	S	2.1	SE	1.0	S	2.6	W	2.1	SW	1.6				
	N	0.7	NE	2.1	NE	4.8	NNE	4.0	NE	4.3	N	4.8	NNW	3.7	NW	2.3	NW	1.1	WNW	2.1	W	2.9	WSW	3.9	64.9	WSW	2.7	
13	NNW	2.9	NW	4.0	W	3.3	NW	2.6	NNW	2.6	NW	2.5	N	3.0	NNE	4.6	NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	4.2	NNE	4.4				
	NNE	5.0	ENE	2.1	ESE	1.8	E	1.0	SSE	1.1	SSW	2.2	S	0.9	SW	2.4	SW	2.0	WSW	1.8	WSW	2.8	W	1.6	68.1	NNE	2.8	
14	WSW	1.8	WNW	0.8	WSW	1.4	WSW	1.6	SW	0.4	SW	1.7	NNW	2.9	NNW	2.7	NNW	3.8	N	4.0	N	2.6	ENE	1.3				
	ESE	0.5	NE	1.4	S	4.1	S	4.2	S	2.4	S	2.9	SSW	3.1	SSW	3.1	S	2.8	SSW	3.0	S	6.2	S	11.5	70.2	S	2.9	
15	S	7.6	S	9.9	S	11.3	S	11.2	S	6.5	SSE	9.8	S	9.9	S	8.8	S	10.1	S	9.8	S	7.5	S	11.3				
	S	9.2	S	9.3	S	7.2	S	7.3	SSW	3.7	SW	1.8	NNW	1.1	SW	1.3	WSW	2.4	SW	2.0	WSW	2.6	SSW	1.7	163.3	S	6.8	
16	W	1.8	SW	0.4	WSW	3.0	WSW	2.7	NW	0.4	WSW	1.8	SW	1.6	NNE	1.8	NE	1.7	NNE	1.7	NNE	3.3	NNE	2.6				
	NE	3.8	NNE	4.1	NNE	4.7	NNE	4.2	NNE	3.2	ENE	2.4	ESE	4.7	SSE	8.1	SSE	11.1	SSE	10.4	SSE	8.7	SSE	9.7	97.9	NNE	4.1	
17	SSW	8.3	SSW	3.0	S	3.5	S	6.8	S	7.3	S	7.9	S	6.2	S	7.6	S	9.9	S	10.1	SSE	8.5	SSE	8.9				
	S	9.8	SSE	8.3	SSE	9.7	S	3.1	S	4.0	SSE	8.5	SSE	8.6	SSE	9.7	SSE	9.8	SSE	8.7	SSE	8.3	SSE	5.9	182.4	SSE	7.6	
18	SSE	6.1	S	5.1	S	2.8	SSW	1.3	SSW	2.2	SW	1.7	E	0.7	ENE	1.1	NE	2.4	NE	1.6	NNE	5.4	NNE	6.3				
	NE	5.1	NE	7.4	NNE	6.3	NNE	5.7	NNE	5.4	NNE	3.1	SE	2.7	S	3.0	SW	4.0	WSW	2.0	WSW	1.5	NNW	0.9	83.6	NNE	3.5	
19	SW	2.7	WSW	3.1	W	1.6	W	4.0	W	3.8	W	3.6	WSW	1.8	WSW	1.7	WSW	1.0	S	1.4	E	1.2	E	1.5				
	E	1.4	NNE	2.4	E	2.7	SE	2.3	NNW	1.2	C	0.0	SW	1.5	N	1.1	NNE	0.8	N	1.4	NE	3.1	ENE	2.2	47.5	E	2.0	
20	NNW	1.2	NE	4.7	N	3.1	NW	1.6	SW	1.6	NNW	2.8	S	2.1	NW	0.7	NE	2.1	E	1.5	S	2.8	SW	3.4				
	SSW	2.7	SW	2.5	S	0.9	NNW	1.8	NE	1.0	ESE	2.4	NW	2.7	N	12.4	NNE	11.4	NNW	4.7	NNW	3.8	NW	3.7	77.6	NNW	3.2	
21	ANW	5.0	WNW	4.5	WNW	5.8	WNW	1.3	WNW	3.2	WNW	7.6	NW	4.3	WNW	3.0	WNW	3.1	WSW	2.4	NNE	0.8	N	4.7				
	NNW	3.5	NNW	2.1	SE	1.2	NNE	2.6	WNW	0.8	SW	1.5	SW	2.8	SSW	2.4	S	1.8	WSW	3.5	WSW	2.4	WSW	3.4	73.7	ANW	3.1	
22	SW	2.7	WSW	2.2	N	0.8	SSW	2.1	SW	1.8	SW	1.1	S	2.4	NE	0.6	S	1.0	SSE	3.4	ESE	2.9	ESE	4.2				
	SSE	6.3	S	3.4	S	3.9	S	3.0	SSW	2.7	SW	2.6	W	1.7	SW	2.6	SW	1.5	WSW	1.4	SW	1.1	SSW	1.9	57.3	SW	2.4	
23	WSW	2.5	WSW	3.2	WSW	2.4	WSW	1.4	WSW	3.5	WSW	1.7	SW	1.1	E	0.7	NNE	2.9	NE	2.0	NE	2.7				
	NNE	3.3	NNE	3.9	NNE	2.6	NNE	2.8	ENE	1.1	N	1.4	ENE	0.6	SSE	1.8	SW	2.4	SSW	2.3	W	1.6	WSW	1.2	51.5	WSW	2.1	
24	SW	2.8	SW	1.4	WSW	2.7	W	2.8	SW	1.1	SSW	2.1	WSW	2.7	WNW	1.0	ENE	2.0	ENE	3.6	ENE	3.8	NNE	6.7				
	NNE	6.0	NNE	5.4	NE	3.1	ENE	3.4	ENE	4.1	ESE	3.1	SSE	0.9	SW	2.6	WSW	1.5	WSW	0.8	WSW	3.0	WSW	1.9	68.5	WSW	2.9	
25	W	2.9	WSW	2.8	W	2.7	W	4.7	W	3.2	E	0.6	WNW	0.4	SE	1.2	E	1.7	E	1.4	E	1.9	ENE	3.3				
	SE	4.5	ENE	2.4	ESE	2.2	S	2.9	WSW	2.7	W	1.7	N	0.5	WSW	2.3	NW	1.0	WNW	1.0	W	1.3	SW	3.5	52.8	W	2.2	
26	SW	2.6	WSW	2.2	WNW	1.0	WSW	0.8	WNW	1.2	WNW	1.0	W	0.6	SSW	1.3	ENE	1.5	ENE	1.6	NE	3.0	NE	3.7				
	NE	3.7	NNE	4.1	NE	3.7	NE	1.9	W	0.8	SW	2.8	NNE	0.4	S	1.8	SW	1.5	SSW	1.9	WSW	3.3	WNW	0.8	47.2	NE	2.0	
27	NNW	0.6	WSW	3.2	SW	2.3	SW	1.9	NNW	1.1	W	1.7	W	1.5	ESE	0.7	ENE	1.8	ENE	1.7	SSE	3.9	SSE	6.2				
	SSE	5.9	SSE	5.9	SSE	4.9	SSE	5.2	SE	3.9	SSE	3.8	SSE	3.9	S	3.5	SSE	6.1	S	5.5	S	6.5	S	7.2	88.9	SSE	3.7	
28	S	6.6	S	6.9	S	5.4	SSW	4.1	W	0.9	SW	2.9	S	1.9	SE	5.3	SE	5.4	SE	6.3	SE	7.1	SSE	8.1				
	SE	8.3	ESE	6.7	SE	6.2	SE	5.8	SE	7.8	SSE	6.2	SE	7.6	SE	8.4	SSE	8.2	SE	11.6	SE	11.6	SSE	11.5	160.8	SE	6.7	
29	SSE	11.6	SSE	14.8	SSE	11.7	SSE	11.2	SSE	13.2	SSE	11.9	S	6.3	S	10.7	S	9.4	SSE	10.2	SSE	13.0	S	8.7				
	S	9.4	S	8.2	SSE	12.5	S	10.6	S	4.0	S	5.2	S	6.5	S	7.5	S	6.3	SSW	1.2	SSW	3.3	S	5.0	212.4	S	8.8	
30	S	7.0	SW	3.2	SSW	1.2	W	1.7	WSW	1.1	WNW	0.9	SW	2.6	S	4.3	S	8.6	S	7.2	S	8.0	S	10.4				
	S	10.6	S	11.0	SSE	8.4	WSW	2.5	NE	2.2	NNE	4.1	NNE	4.4	N	2.6	SSE	1.3	SW	2.8	SW	3.2	WSW	0.6	109.9	S	4.6	
PVL.	WSW		WSW		WSW		WSW		SW		SW		S		S		NE		NNE		NNE		NNE				
W/D	NNE		NNE		NNE		NNE		NNE		N		N		N		SW		WSW		WSW		WSW			S	
SUM.		126.4		120.6		111.7		108.5		94.7		110.5		93.8		99.2		115.1		130.0		133.8		151.0				
W/S		154.8		145.4		142.3		128.4		116.0		107.9		102.9		123.6		113.4		106.8		113.1		121.6	2871.5		119.6	
MEAN		4.2		4.0		3.7		3.6		3.2		3.7		3.1		3.3		3.8		4.3		4.5		5.0				
W/S		5.2		4.8		4.7		4.3		3.9		3.6		3.4		4.1		3.8		3.6		3.8		4.1	95.7		4.0	

附錄Ⅳ.1-11 101年6月高塔63公尺逐時風向與風速月報表

HOURLY LOW THRESHOLD W/S & W/D 63.0 M MONTHLY REPORT

Jun. 2012

STATION NO. : 40A48
STATION : YENLIAO

LOCATION : 25?2?N 、 121?5?E
STATION SITE : Kung-Liao, Taipei County (High Tower)

INST. Ht. : 63.0m

Unit : m/s

TIME	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		D.	PVL.		
	13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		TTL.	W/D		MEAN
DATE	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S	W/D	W/S				
1	N	4.7	N	5.0	N	3.2	N	3.0	NNE	4.5	N	3.9	N	4.4	N	4.6	NNE	5.7	NNE	4.6	NNE	4.2	NNE	4.2				
	NNE	4.9	NNE	4.4	NNE	4.2	NNE	3.8	N	2.8	NNE	3.3	N	2.4	N	1.4	NNW	1.7	NNW	1.6	NNW	1.3	SW	1.5	85.3	N	5.6	
2	SW	1.6	WSW	1.5	W	1.0	SW	1.8	SW	1.6	W	1.4	SW	1.3	N	3.7	N	3.3	N	3.2	N	2.8	N	2.6				
	N	2.3	NW	2.2	N	4.0	N	4.9	N	4.0	N	3.8	NNW	3.2	NNW	2.1	N	2.7	N	3.6	N	3.3	N	4.6	66.5	N	2.8	
3	N	6.4	N	6.7	NNE	5.7	NNE	6.4	NNE	6.9	NNE	7.3	NNE	6.7	NNE	5.8	NE	6.4	NNE	6.1	NNE	7.5	NNE	7.4				
	NNE	6.7	N	7.1	NNE	6.9	N	6.7	NNE	7.1	NNE	7.1	NNE	4.4	N	5.3	NNE	5.0	N	5.5	N	5.0	NNE	5.6	151.7	NNE	6.3	
4	NNE	5.6	N	5.9	N	5.3	N	4.2	N	3.1	N	4.4	N	3.4	N	3.9	N	4.1	N	4.3	N	5.2	N	4.7				
	N	5.2	N	5.3	N	4.6	N	4.4	N	5.2	NNW	3.1	N	4.2	N	4.9	NNW	3.4	NNW	2.9	N	2.6	NNW	2.2	102.1	N	4.3	
5	NW	0.9	WNW	1.8	WNW	1.4	NW	1.9	NNW	1.7	NNW	1.9	NNW	2.5	N	2.7	N	3.1	N	4.6	N	3.7	N	4.1				
	N	4.1	N	4.2	N	4.8	N	3.2	N	3.6	N	4.2	N	2.7	NW	1.8	NW	1.9	NW	1.4	SW	2.0	SW	1.7	65.9	N	2.7	
6	SW	1.1	W	0.9	SW	1.7	SW	1.6	WSW	1.0	SW	1.6	SW	1.3	NW	0.6	ENE	0.9	ENE	1.0	SE	1.9	SE	3.3				
	ENE	1.6	ENE	1.7	NNE	1.1	ESE	1.1	SSE	1.9	SE	1.8	SE	1.7	SE	1.4	SSW	1.2	SSE	1.2	S	1.7	S	5.1	38.4	SE	1.6	
7	S	3.5	WSW	1.0	SSW	2.2	W	1.2	WSW	1.0	WSW	2.2	S	1.8	E	0.8	E	1.5	ENE	1.6	NNE	3.2	ENE	1.6				
	SSE	3.7	SSE	3.8	S	3.2	S	2.4	SSE	3.0	S	1.6	S	1.8	NE	0.5	SW	1.7	SW	2.2	SW	2.3	WSW	0.8	48.6	S	2.0	
8	SW	2.2	SW	2.0	WNW	0.9	SSW	1.4	WSW	2.2	SW	2.7	SW	1.5	E	1.3	NNE	1.4	NE	1.4	NE	1.8	NNE	1.9				
	NNE	1.5	ENE	1.2	E	0.5	SE	1.9	WSW	2.6	WSW	1.8	SW	1.6	SW	2.4	WSW	2.2	SW	2.3	SW	2.5	WSW	2.3	43.5	SW	1.8	
9	SW	2.1	SSW	2.0	SW	3.1	SW	2.0	WSW	2.1	WSW	2.6	SW	1.6	WSW	1.5	E	0.9	ENE	1.3	ENE	1.7	E	2.0				
	NE	2.6	NE	1.6	E	0.6	SW	1.1	SW	1.9	SW	1.7	WSW	1.5	SW	1.8	SW	2.4	W	0.6	SW	1.9	SW	2.5	43.1	SW	1.8	
10	WSW	2.3	WSW	1.4	SW	2.1	SW	2.2	SW	2.5	WSW	1.8	WSW	1.5	S	1.7	SE	1.8	SE	4.1	S	1.0	E	1.5				
	NNE	1.8	SE	1.6	NE	1.1	S	2.4	S	3.4	S	3.0	SSW	2.0	SSW	3.6	SW	2.1	WSW	1.4	SW	1.2	SSW	2.7	50.2	S	2.1	
11	SW	2.0	SW	2.6	WSW	1.7	SW	1.2	SW	1.5	SSW	2.2	SSW	1.2	S	0.8	ENE	0.5	NE	2.1	SE	0.8	SSE	1.6				
	SSE	2.5	SSE	2.0	S	2.7	S	3.4	S	2.7	SSE	1.5	SSE	2.7	S	1.9	NW	1.4	N	2.9	SSW	1.7	WSW	2.3	45.9	SSE	1.9	
12	SW	1.6	SSW	1.7	W	2.4	W	1.3	WSW	1.4	SW	1.2	S	0.6	S	1.5	SSE	0.5	S	2.0	WSW	1.1	SSW	0.7				
	C	0.0	NE	1.6	NNE	2.5	NNE	2.3	NE	2.4	N	3.1	NNW	2.6	WNW	1.4	WNW	0.6	W	1.4	SW	2.1	WSW	2.0	38.0	S	1.6	
13	ANW	2.0	NW	2.6	WSW	2.3	WNW	1.7	WNW	1.3	WNW	1.7	NNW	1.6	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	2.9				
	NNE	3.6	NE	1.3	ESE	1.5	ESE	0.6	SSE	0.6	SSW	1.4	S	0.8	WSW	2.1	SW	2.6	SW	2.7	WSW	2.1	SW	2.3	49.3	NNE	2.1	
14	SW	2.0	SW	2.6	WSW	1.7	SW	1.2	SW	1.5	SSW	2.2	NNW	1.7	NNW	1.9	NNW	2.5	NNW	2.8	NNW	1.8	NE	0.9				
	E	0.7	NE	1.5	SSE	2.4	S	2.1	S	1.3	S	1.4	SSW	1.8	S	1.5	S	0.9	SW	1.3	S	2.7	S	5.8	46.2	S	1.9	
15	SSE	4.0	SSE	5.3	S	6.0	SSE	5.8	SSE	3.2	SSE	5.3	S	5.5	S	4.8	S	5.4	S	4.8	S	3.8	S	6.3				
	SSE	5.3	S	4.9	SSE	3.7	S	3.9	SSW	1.8	SW	1.2	NW	1.3	SW	1.4	SW	1.7	WSW	1.4	SW	1.9	SSW	1.4	90.1	S	3.8	
16	WSW	1.3	SW	1.6	SSW	2.0	SW	2.2	NNE	0.3	SW	2.1	S	1.7	NNE	1.4	NE	1.6	NE	1.8	NNE	2.7	NNE	1.8				
	NE	3.2	NNE	2.4	NNE	3.4	NNE	2.8	NNE	2.2	NE	1.1	ESE	2.6	SE	5.1	SE	6.3	SSE	6.0	SSE	5.1	SSE	5.5	66.2	NNE	2.8	
17	S	4.5	SSW	1.9	SSE	1.5	S	3.4	S	3.7	S	4.0	SSE	3.4	SSE	4.3	SSE	5.2	SSE	5.7	SSE	4.8	SSE	5.0				
	S	5.8	SSE	4.8	SSE	5.0	S	1.4	S	1.9	SSE	5.2	SSE	4.5	SE	6.0	SE	5.7	SSE	4.9	SSE	4.2	SSE	3.0	99.8	SSE	4.2	
18	SSE	3.5	S	2.9	SSW	1.0	SW	1.2	WSW	1.9	SW	1.5	NE	0.9	ENE	1.1	NNE	1.7	NE	1.5	NNE	3.5	NNE	3.7				
	NE	3.0	NE	4.7	NNE	4.3	NNE	3.8	N	3.5	NNE	1.8	ESE	1.7	S	1.7	SSW	2.5	SW	1.2	SW	0.5	SW	0.5	54.3	NNE	2.3	
19	SSW	2.0	WSW	1.5	W	1.0	SW	2.0	WSW	1.4	SW	2.2	SW	1.6	SW	1.2	SW	0.7	SSE	0.9	E	1.2	E	1.0				
	E	1.0	NNE	1.9	E	1.9	SE	1.4	NW	1.0	C	0.0	SSW	1.3	NW	0.6	ENE	0.3	NW	0.7	NE	1.3	NE	1.3	29.4	SW	1.2	
20	NW	0.8	NNE	2.5	N	1.8	WNW	1.2	SW	1.5	NW	1.7	SSW	1.8	WNW	0.9	NE	1.7	E	0.9	SSE	1.7	SW	1.6				
	S	1.7	SW	1.6	SSE	0.6	NW	1.3	NE	0.5	SE	0.9	WNW	2.0	N	8.0	N	7.3	NW	3.0	NW	2.7	NW	2.3	50.0	NW	2.1	
21	ANW	3.1	WNW	3.2	WNW	3.6	SW	0.7	WNW	2.1	WNW	4.7	WNW	3.2	WNW	2.2	WNW	2.0	SW	1.6	N	0.5	N	3.2				
	NNW	2.6	NNW	1.8	SSE	0.6	N	1.8	WSW	0.5	SSW	1.0	WSW	1.7	SW	2.1	SW	1.8	WSW	2.0	WSW	1.8	SW	2.1	49.9	ANW	2.1	
22	SSW	1.3	SW	1.9	WSW	0.8	SW	2.4	WSW	1.6	WSW	1.5	WSW	0.7	ESE	0.6	S	0.5	SSE	2.2	ESE	1.9	ESE	2.6				
	SSE	3.5	SSE	2.1	SSE	2.4	S	1.8	SSW	2.1	SW	1.9	W	1.6	SW	1.9	SSW	1.6	WSW	1.5	SW	1.1	SW	2.4	41.9	SW	1.7	
23	WSW	2.0	SW	1.8	SSW	1.4	SW	1.5	SW	2.6	WSW	2.3	SSW	1.8	SSW	0.8	NE	0.7	NNE	2.4	NE	2.1	NNE	2.3				
	NNE	2.3	NNE	2.9	NNE	1.7	NNE	1.9	ENE	0.9	NNE	0.8	SW	0.5	SSE	1.7	SW	1.9	SW	1.7	WSW	1.4	SW	2.0	41.4	NNE	1.7	
24	SW	2.1	S	2.5	SSW	1.9	W	1.7	SW	2.2	SW	3.0	WSW	1.6	NW	0.8	ENE	1.7	ENE	2.3	ENE	2.5	NNE	4.5				
	NNE	4.2	NNE	3.6	NE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.0	ESE	1.7	SSW	0.7	SW	2.2	SW	1.6	SW	2.7	SW	2.1	SW	2.4	54.5	SW	2.3	
25	WSW	1.4	SW	2.8	SW	1.8	W	2.5	WSW	2.1	SW	1.2	SW	0.7	SE	0.8	E	1.4	ENE	1.4	ENE	1.9	ENE	2.3				
	SE	3.9	ENE	2.0	E	1.5	SSW	1.8	WSW	1.5	W	1.1	SW	0.3	WSW	1.7	WSW	0.8	WSW	1.4	WSW	1.8	SW	2.0	40.1	WSW	1.7	
26	SW	1.9	WSW	2.1	SW	2.0	SW	2.1	WSW	1.4	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.3	ENE	1.5	ENE	1.4	NE	2.7	NE	3.3				
	NE	2.9	NNE	2.9	NE	2.6	NE	1.5	SW	0.9	SW	1.5	C	0.0	SW	1.8	SW	1.7	WSW	1.4	SW	2.1	SW	0.7	43.1	SW	1.8	
27	SW	0.8	WSW	2.2	SW	2.2	SW	2.7	WNW	1.1	SW	2.6	SW	1.8	ESE	0.7	ENE	1.9	ENE	1.9	SSE	2.8	SE	3.9				
	SSE	3.8	SSE	3.2	SSE	3.0	SSE	3.2	SE	2.9	SSE	2.1	SSE	2.3	S	2.1	SSE	3.6	SSE	3.0	SSE	3.8	SSE	4.0	61.6	SSE	2.6	
28	S	3.7	S	3.8	S	2.9	SSW	2.1	NNW	0.6	SW	2.3	S	1.0	SE	3.9	SE	3.8	SE	4.2	SE	4.7	SE	5.2				
	SE	5.9	ESE	4.5	ESE	4.2	SE	3.8	SE	5.2	SSE	3.5	SE	5.5	SE	5.6	SE	5.2	SE	7.1	SE	7.3	SE	7.2	103.2	SE	4.3

附錄 Ⅳ.1-15 核四施工環境監測氣象高塔(93公尺)101年4月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	0.42	0.56	0.83	1.25	0.28	0.14	3.47
北北東	0.00	0.69	1.94	1.39	0.69	0.42	1.11	6.25
東北	0.00	0.42	3.06	2.08	2.08	0.28	0.28	8.19
東北東	0.00	0.56	2.22	2.50	1.39	0.00	0.00	6.67
東	0.00	0.69	2.08	1.25	0.00	0.00	0.00	4.03
東南東	0.00	0.14	1.81	0.83	0.14	0.00	0.00	2.92
東南	0.00	0.83	1.67	1.67	0.42	0.14	0.00	4.72
南南東	0.00	0.97	1.25	3.33	2.22	0.56	0.00	8.33
南	0.00	0.69	3.06	5.56	4.72	1.67	0.00	15.69
南南西	0.00	1.11	3.89	3.06	0.56	0.00	0.00	8.61
西南	0.00	0.69	5.00	3.19	0.00	0.00	0.00	8.89
西南西	0.00	0.97	4.31	2.50	0.00	0.00	0.00	7.78
西	0.00	1.81	1.81	1.39	0.83	0.56	0.00	6.39
西北西	0.00	1.25	0.56	0.97	0.00	0.00	0.00	2.78
西北	0.00	0.83	1.11	0.42	0.14	0.00	0.00	2.50
北北西	0.00	0.42	1.11	0.69	0.00	0.00	0.00	2.22
—	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
小計	0.56	12.50	35.42	31.67	14.44	3.89	1.53	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-13 核四施工環境監測氣象低塔(63公尺)101年4月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	0.69	0.83	1.53	1.25	0.42	0.14	4.86
北北東	0.00	0.97	2.36	2.08	0.69	0.42	0.42	6.94
東北	0.00	1.11	2.92	2.36	2.08	0.14	0.14	8.75
東北東	0.00	0.83	2.64	1.94	0.56	0.00	0.00	5.97
東	0.00	0.42	2.64	0.97	0.28	0.00	0.00	4.31
東南東	0.00	0.97	1.11	0.00	0.14	0.00	0.00	2.22
東南	0.00	1.11	1.94	2.92	1.25	0.00	0.00	7.22
南南東	0.00	1.39	2.78	6.25	3.19	0.28	0.00	13.89
南	0.00	3.06	2.08	3.33	2.22	0.14	0.00	10.83
南南西	0.00	1.81	2.08	0.97	0.14	0.00	0.00	5.00
西南	0.00	1.39	1.81	0.42	0.00	0.00	0.00	3.61
西南西	0.00	1.11	3.33	0.83	0.00	0.00	0.00	5.28
西	0.00	3.06	2.08	1.11	1.11	0.28	0.00	7.64
西北西	0.00	1.94	1.81	1.11	0.28	0.00	0.00	5.14
西北	0.00	1.81	3.19	0.56	0.00	0.00	0.00	5.56
北北西	0.00	0.69	0.69	0.56	0.00	0.00	0.00	1.94
—	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
小計	0.83	22.36	34.31	26.94	13.19	1.67	0.69	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-16 核四施工環境監測氣象高塔(63公尺)101年4月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	1.39	1.25	1.94	0.69	0.14	0.00	5.42
北北東	0.00	1.25	2.22	0.69	0.97	0.14	0.00	5.28
東北	0.00	0.69	4.44	1.94	0.14	0.14	0.00	7.36
東北東	0.00	1.25	4.72	0.83	0.00	0.00	0.00	6.81
東	0.00	0.69	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
東南東	0.00	1.11	0.69	0.14	0.00	0.00	0.00	1.94
東南	0.00	0.83	2.64	0.83	0.14	0.00	0.00	4.44
南南東	0.00	1.67	5.00	5.42	0.28	0.00	0.00	12.36
南	0.00	1.25	7.64	3.06	0.00	0.00	0.00	11.94
南南西	0.00	1.39	6.53	0.56	0.00	0.00	0.00	8.47
西南	0.00	3.19	12.64	0.42	0.00	0.00	0.00	16.25
西南西	0.00	1.81	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
西	0.00	1.53	1.81	0.97	0.28	0.00	0.00	4.58
西北西	0.00	0.69	1.53	0.14	0.14	0.00	0.00	2.50
西北	0.00	0.28	1.25	0.14	0.00	0.00	0.00	1.67
北北西	0.00	1.11	0.83	0.14	0.00	0.00	0.00	2.08
—	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
小計	0.42	20.14	59.17	17.22	2.64	0.42	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-14 核四施工環境監測氣象低塔(21公尺)101年4月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	1.11	2.08	0.97	0.28	0.00	0.00	4.44
北北東	0.00	2.64	3.47	1.67	0.42	0.00	0.00	8.19
東北	0.00	1.94	4.17	0.28	0.00	0.00	0.00	6.39
東北東	0.00	2.64	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
東	0.00	2.22	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
東南東	0.00	0.83	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
東南	0.00	1.39	2.22	0.28	0.00	0.00	0.00	3.89
南南東	0.00	1.53	6.67	2.78	0.00	0.00	0.00	10.97
南	0.00	2.08	4.31	3.33	0.14	0.00	0.00	9.86
南南西	0.00	2.64	1.81	0.14	0.00	0.00	0.00	4.58
西南	0.00	1.81	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
西南西	0.00	1.94	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
西	0.00	3.19	1.53	0.97	0.14	0.00	0.00	5.83
西北西	0.00	4.58	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	5.14
西北	0.00	10.42	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69
北北西	0.00	4.31	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
—	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22
小計	7.22	45.28	35.83	10.69	0.97	0.00	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-19 核四施工環境監測氣象高塔(93公尺)101年5月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	0.54	2.42	2.55	2.15	1.08	0.00	8.74
北北東	0.00	1.08	1.61	4.03	6.72	3.63	0.40	17.47
東北	0.00	0.13	1.75	4.17	3.36	0.54	0.00	9.95
東北東	0.00	0.40	2.42	1.08	0.67	0.00	0.00	4.57
東	0.00	0.54	1.21	0.13	0.00	0.00	0.00	1.88
東南東	0.00	0.54	0.67	0.27	1.08	0.00	0.00	2.55
東南	0.00	0.54	0.94	1.48	0.54	0.13	0.00	3.63
南南東	0.00	0.27	2.28	2.55	2.96	0.67	0.00	8.74
南	0.00	1.21	2.15	2.69	1.61	0.54	0.00	8.20
南南西	0.00	1.08	3.23	2.42	0.27	0.00	0.00	6.99
西南	0.00	1.08	3.76	2.42	0.00	0.00	0.00	7.26
西南西	0.00	0.94	3.49	3.49	0.13	0.00	0.00	8.06
西	0.00	1.21	1.48	0.54	0.13	0.00	0.00	3.36
西北西	0.00	0.40	0.67	0.13	0.00	0.00	0.00	1.21
西北	0.00	0.40	0.94	0.67	0.00	0.00	0.00	2.02
北北西	0.00	0.54	3.23	1.08	0.40	0.00	0.00	5.24
—	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
小計	0.13	10.89	32.26	29.70	20.03	6.59	0.40	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-17 核四施工環境監測氣象低塔(63公尺)101年5月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	0.81	2.69	4.17	2.96	0.13	0.00	10.75
北北東	0.00	0.67	2.02	6.32	4.84	0.13	0.00	13.98
東北	0.00	0.40	2.96	3.90	1.75	0.00	0.00	9.01
東北東	0.00	0.40	2.55	0.54	0.00	0.00	0.00	3.49
東	0.00	0.81	1.48	0.27	0.00	0.00	0.00	2.55
東南東	0.00	0.54	0.94	1.08	0.54	0.00	0.00	3.09
東南	0.00	1.75	2.28	2.42	0.54	0.00	0.00	6.99
南南東	0.00	0.81	1.88	3.23	2.69	0.00	0.00	8.60
南	0.00	1.61	3.63	1.08	1.08	0.00	0.00	7.39
南南西	0.00	1.48	1.75	1.21	0.00	0.00	0.00	4.44
西南	0.00	1.61	1.08	0.81	0.00	0.00	0.00	3.49
西南西	0.00	2.28	2.69	0.54	0.27	0.00	0.00	5.78
西	0.00	1.48	1.21	0.54	0.27	0.00	0.00	3.49
西北西	0.00	2.15	2.55	0.13	0.00	0.00	0.00	4.84
西北	0.00	2.15	4.03	0.13	0.00	0.00	0.00	6.32
北北西	0.00	1.21	2.55	0.94	0.67	0.00	0.00	5.38
—	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
小計	0.40	20.16	36.29	27.28	15.59	0.27	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-20 核四施工環境監測氣象高塔(63公尺)101年5月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	0.67	2.82	5.11	2.15	0.13	0.00	10.89
北北東	0.00	1.08	3.90	7.53	1.88	0.00	0.00	14.38
東北	0.00	0.13	3.90	3.49	0.13	0.00	0.00	7.66
東北東	0.00	0.81	3.76	0.13	0.00	0.00	0.00	4.70
東	0.00	0.54	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
東南東	0.00	1.34	0.27	1.08	0.00	0.00	0.00	2.69
東南	0.00	0.13	3.23	1.21	0.27	0.00	0.00	4.84
南南東	0.00	1.08	2.69	3.63	0.00	0.00	0.00	7.39
南	0.00	0.40	3.63	1.75	0.00	0.00	0.00	5.78
南南西	0.00	1.48	4.84	0.13	0.00	0.00	0.00	6.45
西南	0.00	1.88	11.16	0.54	0.00	0.00	0.00	13.58
西南西	0.00	1.61	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
西	0.00	1.08	0.81	0.13	0.00	0.00	0.00	2.02
西北西	0.00	1.48	0.94	0.13	0.00	0.00	0.00	2.55
西北	0.00	0.81	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
北北西	0.00	0.67	2.55	0.94	0.00	0.00	0.00	4.17
—	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
小計	0.27	15.19	54.17	25.81	4.44	0.13	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-18 核四施工環境監測氣象低塔(21公尺)101年5月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風	1級	2級	3級	4級	5級	6級	小計
	<0.22	0.22-1.34	1.34-3.13	3.13-5.36	5.36-8.05	8.05-10.73	>10.73	
北	0.00	1.75	4.57	1.75	0.00	0.00	0.00	8.06
北北東	0.00	1.48	10.08	4.30	0.13	0.00	0.00	15.99
東北	0.00	1.88	4.84	0.67	0.00	0.00	0.00	7.39
東北東	0.00	1.61	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
東	0.00	1.61	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
東南東	0.00	0.67	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
東南	0.00	1.48	2.69	0.13	0.00	0.00	0.00	4.30
南南東	0.00	0.94	4.57	1.34	0.00	0.00	0.00	6.85
南	0.00	1.88	1.75	2.02	0.00	0.00	0.00	5.65
南南西	0.00	1.75	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
西南	0.00	2.42	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
西南西	0.00	0.94	0.81	0.54	0.00	0.00	0.00	2.28
西	0.00	1.48	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
西北西	0.00	3.63	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
西北	0.00	12.50	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
北北西	0.00	6.72	2.28	0.13	0.00	0.00	0.00	9.14
—	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
小計	6.18	42.74	40.05	10.89	0.13	0.00	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-23 核四施工環境監測氣象高塔(93公尺)101年6月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風 <0.22	1級 0.22-1.34	2級 1.34-3.13	3級 3.13-5.36	4級 5.36-8.05	5級 8.05-10.73	6級 >10.73	小計
北	0.00	0.69	1.25	3.33	4.03	0.14	0.14	9.58
北北東	0.00	0.42	1.53	2.78	3.06	2.50	0.83	11.11
東北	0.00	0.28	2.78	1.25	0.14	0.14	0.00	4.58
東北東	0.00	0.97	1.94	0.69	0.00	0.00	0.00	3.61
東	0.00	0.97	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
東南東	0.00	0.56	1.39	0.28	0.14	0.00	0.00	2.36
東南	0.00	0.42	0.83	0.56	1.11	0.28	0.28	3.47
南南東	0.00	0.69	0.69	0.97	1.11	2.64	1.39	7.50
南	0.00	0.69	3.19	2.78	3.61	2.78	0.69	13.75
南南西	0.00	0.69	2.78	0.97	0.56	0.14	0.00	5.14
西南	0.00	1.39	5.97	1.11	0.00	0.00	0.00	8.47
西南西	0.00	1.25	7.36	2.64	0.14	0.00	0.00	11.39
西	0.00	1.11	3.75	1.11	0.00	0.00	0.00	5.97
西北西	0.00	1.81	0.42	0.69	0.28	0.00	0.00	3.19
西北	0.00	0.83	1.11	0.42	0.00	0.00	0.00	2.36
北北西	0.00	1.11	2.08	1.53	0.00	0.00	0.00	4.72
—	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
小計	0.14	13.89	38.75	21.11	14.17	8.61	3.33	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-21 核四施工環境監測氣象低塔(63公尺)101年6月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風 <0.22	1級 0.22-1.34	2級 1.34-3.13	3級 3.13-5.36	4級 5.36-8.05	5級 8.05-10.73	6級 >10.73	小計
北	0.00	1.39	1.25	6.11	2.50	0.14	0.00	11.39
北北東	0.00	0.56	2.08	2.50	2.36	0.83	0.00	8.33
東北	0.00	0.97	3.06	1.25	0.14	0.14	0.00	5.56
東北東	0.00	1.53	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33
東	0.00	1.11	2.08	0.28	0.00	0.00	0.00	3.47
東南東	0.00	0.83	0.83	0.42	0.56	0.00	0.00	2.64
東南	0.00	1.53	0.83	2.22	0.97	0.69	0.00	6.25
南南東	0.00	0.83	2.50	3.06	3.61	2.22	0.00	12.22
南	0.00	1.39	2.22	0.97	0.97	0.83	0.00	6.39
南南西	0.00	2.50	1.81	0.42	0.28	0.00	0.00	5.00
西南	0.00	3.33	0.56	0.28	0.14	0.00	0.00	4.31
西南西	0.00	1.81	0.42	0.56	0.00	0.00	0.00	2.78
西	0.00	3.75	1.39	0.42	0.14	0.00	0.00	5.69
西北西	0.00	5.83	2.36	0.83	0.28	0.14	0.00	9.44
西北	0.00	3.06	2.92	0.42	0.00	0.00	0.00	6.39
北北西	0.00	1.81	1.11	2.78	0.00	0.00	0.00	5.69
—	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
小計	1.11	32.22	27.22	22.50	11.94	5.00	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-24 核四施工環境監測氣象高塔(63公尺)101年6月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風 <0.22	1級 0.22-1.34	2級 1.34-3.13	3級 3.13-5.36	4級 5.36-8.05	5級 8.05-10.73	6級 >10.73	小計
北	0.00	0.14	2.36	6.25	1.11	0.00	0.00	9.86
北北東	0.00	0.42	4.17	2.92	2.22	0.00	0.00	9.72
東北	0.00	1.39	2.78	0.42	0.14	0.00	0.00	4.72
東北東	0.00	1.11	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
東	0.00	1.39	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
東南東	0.00	0.56	0.83	0.28	0.00	0.00	0.00	1.67
東南	0.00	0.42	1.25	1.81	1.25	0.14	0.00	4.86
南南東	0.00	0.83	3.06	5.14	1.94	0.00	0.00	10.97
南	0.00	1.25	4.17	3.06	1.11	0.00	0.00	9.58
南南西	0.00	1.39	3.89	0.14	0.00	0.00	0.00	5.42
西南	0.00	3.75	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.78
西南西	0.00	1.39	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
西	0.00	1.11	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
西北西	0.00	0.97	1.53	0.56	0.00	0.00	0.00	3.06
西北	0.00	1.25	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
北北西	0.00	0.28	2.64	0.28	0.00	0.00	0.00	3.19
—	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
小計	0.42	17.64	53.19	20.83	7.78	0.14	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附錄 Ⅳ.1-22 核四施工環境監測氣象低塔(21公尺)101年6月風速風向聯合頻率分佈

風速 / 風向	靜風 <0.22	1級 0.22-1.34	2級 1.34-3.13	3級 3.13-5.36	4級 5.36-8.05	5級 8.05-10.73	6級 >10.73	小計
北	0.00	0.69	6.94	1.81	0.14	0.00	0.00	9.58
北北東	0.00	1.39	4.86	3.47	0.14	0.00	0.00	9.86
東北	0.00	3.19	1.81	0.14	0.00	0.00	0.00	5.14
東北東	0.00	2.50	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
東	0.00	1.81	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
東南東	0.00	0.97	1.25	0.14	0.00	0.00	0.00	2.36
東南	0.00	1.39	1.94	0.69	0.42	0.00	0.00	4.44
南南東	0.00	1.53	3.75	4.44	0.83	0.00	0.00	10.56
南	0.00	2.36	2.36	1.53	0.56	0.00	0.00	6.81
南南西	0.00	2.08	0.97	0.28	0.00	0.00	0.00	3.33
西南	0.00	2.22	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
西南西	0.00	1.94	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
西	0.00	2.08	0.56	0.14	0.00	0.00	0.00	2.78
西北西	0.00	3.06	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
西北	0.00	11.11	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94
北北西	0.00	5.97	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
—	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
小計	10.42	44.31	30.56	12.64	2.08	0.00	0.00	100.00

註：各風速風向頻率分佈以%表示，而風速之單位為公尺/秒

附　錄　Ⅳ.2

空氣品質監測成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附錄 IV.2-2 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年4月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月6日（陰）至101年4月7日（陰）	15 ～ 16	17.3	96	SW	0.4	0.024	0.011	0.26	0.6	
	16 ～ 17	17.1	98	SW	0.5	0.008	0.005	0.23	0.5	
	17 ～ 18	16.9	98	SSW	0.5	0.009	0.006	0.22	0.5	
	18 ～ 19	16.5	98	NNE	0.3	0.006	0.004	0.19	0.4	
	19 ～ 20	16.5	98	SSW	0.2	0.007	0.005	0.18	0.4	
	20 ～ 21	16.5	98	SSW	0.5	0.005	0.004	0.19	0.4	
	21 ～ 22	16.5	98	SW	0.3	0.006	0.004	0.18	0.4	
	22 ～ 23	16.5	98	SSW	0.6	0.004	0.003	0.18	0.4	
	23 ～ 24	16.5	98	SSW	0.6	0.005	0.004	0.18	0.4	
	00 ～ 01	16.4	98	SSW	0.7	0.005	0.004	0.17	0.3	
	01 ～ 02	16.3	98	SSW	0.8	0.005	0.004	0.17	0.3	
	02 ～ 03	16.2	98	S	0.4	0.005	0.004	0.17	0.3	
	03 ～ 04	16.2	98	SSW	0.6	0.005	0.004	0.17	0.3	
	04 ～ 05	16.2	98	SSW	0.6	0.005	0.004	0.17	0.3	
	05 ～ 06	16.2	98	SSW	0.8	0.005	0.004	0.17	0.3	
	06 ～ 07	16.3	98	S	0.3	0.006	0.004	0.17	0.3	
	07 ～ 08	17.0	98	SSW	0.4	0.005	0.003	0.18	0.3	
	08 ～ 09	18.3	98	SW	0.3	0.006	0.004	0.19	0.3	
	09 ～ 10	20.4	83	SW	1.1	0.007	0.005	0.18	0.2	
	10 ～ 11	21.6	70	SW	1.7	0.006	0.004	0.17	0.2	
	11 ～ 12	22.4	65	SW	1.7	0.005	0.003	0.16	0.2	
	12 ～ 13	21.7	68	SW	1.3	0.005	0.004	0.15	0.2	
	13 ～ 14	21.8	69	SW	1.5	0.006	0.004	0.15	0.2	
	14 ～ 15	22.2	69	SW	1.3	0.005	0.004	0.17	0.2	
最小值		16.2	65	----	0.2	0.004	0.003	0.15	0.2	
最大值		22.4	98	SSW	1.7	0.024	0.011	0.26	0.6	
平均值		17.9	91	----	0.7	0.006	0.004	0.18	0.3	
標準偏差		2.3	12	----	0.5	0.004	0.002	0.02	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-2

附錄 IV.2-1 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年4月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月5日（晴）至101年4月6日（陰）	15 ～ 16	18.8	98	NE	1.2	0.005	0.004	0.15	0.3	
	16 ～ 17	18.5	98	NE	1.4	0.005	0.003	0.15	0.3	
	17 ～ 18	18.4	98	NE	0.7	0.005	0.003	0.16	0.3	
	18 ～ 19	18.2	98	NE	0.4	0.004	0.003	0.16	0.3	
	19 ～ 20	18.3	98	SW	0.2	0.006	0.004	0.16	0.3	
	20 ～ 21	18.0	98	SW	0.4	0.007	0.005	0.16	0.3	
	21 ～ 22	18.0	98	SW	0.5	0.005	0.003	0.16	0.3	
	22 ～ 23	18.0	98	SW	0.3	0.005	0.004	0.16	0.3	
	23 ～ 24	18.0	98	SW	0.3	0.006	0.004	0.16	0.3	
	00 ～ 01	17.9	98	SW	0.6	0.005	0.004	0.16	0.3	
	01 ～ 02	17.9	98	SSW	0.5	0.005	0.004	0.16	0.3	
	02 ～ 03	17.8	98	SW	0.4	0.005	0.004	0.16	0.3	
	03 ～ 04	17.8	98	SSW	0.6	0.005	0.004	0.16	0.3	
	04 ～ 05	17.8	98	SSW	0.6	0.006	0.004	0.16	0.3	
	05 ～ 06	17.7	98	SSW	0.6	0.005	0.004	0.16	0.3	
	06 ～ 07	17.6	98	SW	0.7	0.005	0.004	0.16	0.3	
	07 ～ 08	17.5	98	S	0.6	0.008	0.005	0.21	0.4	
	08 ～ 09	17.5	98	SSW	0.5	0.008	0.005	0.20	0.3	
	09 ～ 10	18.0	97	SSW	0.4	0.007	0.005	0.20	0.3	
	10 ～ 11	18.2	94	SSW	0.4	0.006	0.004	0.21	0.3	
	11 ～ 12	18.2	95	SSW	0.4	0.007	0.006	0.19	0.3	
	12 ～ 13	18.3	96	SSW	0.6	0.005	0.003	0.18	0.3	
	13 ～ 14	19.0	85	ENE	0.4	0.007	0.006	0.19	0.4	
	14 ～ 15	17.8	88	NE	0.3	0.006	0.004	0.19	0.4	
最小值		17.5	85	----	0.2	0.004	0.003	0.15	0.3	
最大值		19.0	98	SSW	1.4	0.008	0.006	0.21	0.4	
平均值		18.1	97	----	0.5	0.006	0.004	0.17	0.3	
標準偏差		0.4	3	----	0.3	0.001	0.001	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-1

附4.2-1

附錄 IV.2-4 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年5月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月3日（陰）至101年5月4日（陰）	15 ～ 16	23.9	77	NE	0.2	0.004	0.003	0.13	0.3	
	16 ～ 17	23.6	79	NNE	0.2	0.007	0.005	0.14	0.3	
	17 ～ 18	23.5	81	S	0.2	0.010	0.008	0.17	0.4	
	18 ～ 19	22.5	90	NNE	0.3	0.010	0.008	0.12	0.3	
	19 ～ 20	22.0	94	NE	0.2	0.007	0.005	0.12	0.3	
	20 ～ 21	21.9	96	SSW	0.2	0.007	0.005	0.14	0.3	
	21 ～ 22	21.7	98	NNE	0.2	0.007	0.006	0.13	0.3	
	22 ～ 23	21.6	98	NNE	0.2	0.007	0.006	0.12	0.3	
	23 ～ 24	21.2	98	S	0.2	0.006	0.004	0.12	0.3	
	00 ～ 01	21.1	98	S	0.2	0.007	0.005	0.12	0.3	
	01 ～ 02	21.2	98	ENE	0.2	0.005	0.003	0.11	0.3	
	02 ～ 03	21.2	98	NNE	0.2	0.008	0.006	0.12	0.3	
	03 ～ 04	20.5	98	NE	1.7	0.005	0.003	0.11	0.3	
	04 ～ 05	19.8	98	ENE	0.3	0.005	0.003	0.12	0.2	
	05 ～ 06	20.1	98	S	0.2	0.004	0.002	0.12	0.3	
	06 ～ 07	20.4	98	SSW	0.2	0.005	0.003	0.12	0.3	
	07 ～ 08	20.3	98	NE	0.3	0.008	0.005	0.15	0.4	
	08 ～ 09	20.2	98	NNE	0.2	0.010	0.008	0.15	0.3	
	09 ～ 10	20.6	98	NE	0.5	0.008	0.007	0.13	0.3	
	10 ～ 11	20.3	98	NE	1.2	0.005	0.003	0.12	0.3	
	11 ～ 12	20.0	98	NE	0.6	0.004	0.003	0.12	0.3	
	12 ～ 13	19.9	98	NE	0.5	0.004	0.003	0.12	0.3	
	13 ～ 14	19.8	98	NE	0.3	0.005	0.004	0.13	0.4	
	14 ～ 15	19.8	98	NE	0.5	0.005	0.003	0.13	0.4	
最小值		19.8	77	----	0.2	0.004	0.002	0.11	0.2	
最大值		23.9	98	NE	1.7	0.010	0.008	0.17	0.4	
平均值		21.1	95	----	0.4	0.006	0.005	0.13	0.3	
標準偏差		1.2	6	----	0.4	0.002	0.002	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-4

附錄 IV.2-3 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年4月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月7日（陰）至101年4月8日（陰）	15 ～ 16	22.0	71	SW	1.6	0.005	0.004	0.15	0.2	
	16 ～ 17	21.5	76	SW	1.0	0.005	0.004	0.15	0.2	
	17 ～ 18	19.7	90	SW	1.4	0.005	0.004	0.15	0.2	
	18 ～ 19	18.5	95	SSW	1.8	0.006	0.004	0.14	0.2	
	19 ～ 20	18.9	94	SW	1.4	0.005	0.004	0.14	0.2	
	20 ～ 21	18.8	95	SSW	0.8	0.005	0.003	0.14	0.2	
	21 ～ 22	18.8	94	SSW	0.5	0.005	0.004	0.15	0.2	
	22 ～ 23	19.2	90	SW	1.0	0.005	0.003	0.15	0.2	
	23 ～ 24	19.0	88	E	0.2	0.005	0.004	0.14	0.2	
	00 ～ 01	19.3	87	SSE	0.4	0.005	0.003	0.14	0.2	
	01 ～ 02	20.2	83	SW	1.2	0.005	0.003	0.15	0.2	
	02 ～ 03	20.0	83	SSW	0.5	0.005	0.004	0.15	0.2	
	03 ～ 04	20.3	82	SW	1.6	0.005	0.004	0.15	0.2	
	04 ～ 05	20.6	81	SW	2.3	0.005	0.003	0.14	0.2	
	05 ～ 06	20.3	85	SW	2.5	0.005	0.003	0.14	0.2	
	06 ～ 07	20.3	84	SW	2.2	0.005	0.004	0.14	0.2	
	07 ～ 08	21.0	80	SW	2.2	0.005	0.004	0.15	0.2	
	08 ～ 09	22.1	74	SW	2.4	0.005	0.004	0.15	0.2	
	09 ～ 10	23.0	71	SW	2.5	0.005	0.003	0.15	0.2	
	10 ～ 11	23.3	72	SW	2.6	0.005	0.003	0.15	0.3	
	11 ～ 12	23.7	70	SW	2.5	0.005	0.003	0.15	0.3	
	12 ～ 13	23.2	73	SW	2.4	0.005	0.003	0.14	0.2	
	13 ～ 14	22.6	75	SW	1.9	0.005	0.003	0.15	0.2	
	14 ～ 15	22.1	76	SW	1.2	0.005	0.003	0.15	0.3	
最小值		18.5	70	----	0.2	0.005	0.003	0.14	0.2	
最大值		23.7	95	SW	2.6	0.006	0.004	0.15	0.3	
平均值		20.8	82	----	1.6	0.005	0.004	0.15	0.2	
標準偏差		1.6	8	----	0.8	0.000	0.001	0.00	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-3

附4.2.2

附錄 IV.2-6 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年5月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月5日（晴）至101年5月6日（晴）	15 ～ 16	25.2	62	NE	2.3	0.005	0.003	0.14	0.4	
	16 ～ 17	24.9	64	NE	1.7	0.005	0.003	0.14	0.4	
	17 ～ 18	23.8	69	NE	1.4	0.005	0.003	0.13	0.4	
	18 ～ 19	21.5	84	NE	0.5	0.005	0.003	0.13	0.4	
	19 ～ 20	19.8	93	SSW	0.2	0.007	0.005	0.13	0.4	
	20 ～ 21	19.7	94	SW	0.4	0.007	0.005	0.14	0.4	
	21 ～ 22	19.3	95	SW	0.7	0.006	0.004	0.15	0.4	
	22 ～ 23	18.8	96	SW	0.8	0.006	0.003	0.15	0.4	
	23 ～ 24	18.3	97	SW	1.0	0.006	0.004	0.14	0.4	
	00 ～ 01	17.9	98	SSW	1.3	0.005	0.003	0.14	0.4	
	01 ～ 02	17.6	98	SW	1.0	0.005	0.003	0.14	0.4	
	02 ～ 03	17.5	98	SW	0.8	0.005	0.003	0.14	0.4	
	03 ～ 04	17.3	98	SW	0.9	0.005	0.003	0.14	0.4	
	04 ～ 05	17.1	98	SSW	1.1	0.005	0.003	0.14	0.4	
	05 ～ 06	17.0	98	SSW	1.1	0.005	0.003	0.14	0.4	
	06 ～ 07	17.8	98	SW	1.3	0.005	0.003	0.14	0.4	
	07 ～ 08	20.2	93	SW	0.8	0.006	0.003	0.16	0.4	
	08 ～ 09	25.2	70	NE	0.2	0.006	0.004	0.14	0.4	
	09 ～ 10	25.2	67	NE	1.6	0.006	0.003	0.12	0.4	
	10 ～ 11	25.4	67	NE	1.6	0.006	0.003	0.13	0.4	
	11 ～ 12	25.8	66	ENE	1.0	0.005	0.003	0.13	0.4	
	12 ～ 13	25.8	63	ENE	1.2	0.005	0.003	0.12	0.4	
	13 ～ 14	25.8	62	NE	1.7	0.005	0.003	0.12	0.4	
	14 ～ 15	25.8	63	NE	1.7	0.006	0.004	0.12	0.4	
最小值		17.0	62	----	0.2	0.005	0.003	0.12	0.4	
最大值		25.8	98	NE	2.3	0.007	0.005	0.16	0.4	
平均值		21.4	83	----	1.1	0.006	0.003	0.14	0.4	
標準偏差		3.6	16	----	0.5	0.001	0.001	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-6

附錄 IV.2-5 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年5月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月4日（陰）至101年5月5日（晴）	15 ～ 16	20.0	98	NE	0.3	0.008	0.005	0.13	0.4	
	16 ～ 17	19.8	98	ENE	0.2	0.005	0.004	0.14	0.4	
	17 ～ 18	20.0	98	SW	0.2	0.006	0.004	0.17	0.5	
	18 ～ 19	20.0	98	WSW	0.2	0.008	0.006	0.15	0.4	
	19 ～ 20	20.0	98	SW	0.3	0.005	0.004	0.14	0.4	
	20 ～ 21	19.9	98	SW	0.2	0.006	0.004	0.15	0.4	
	21 ～ 22	19.9	98	SW	0.2	0.005	0.003	0.14	0.4	
	22 ～ 23	19.9	98	SW	0.3	0.004	0.002	0.13	0.4	
	23 ～ 24	19.9	98	SW	0.4	0.004	0.003	0.13	0.4	
	00 ～ 01	19.9	98	SW	0.3	0.004	0.002	0.13	0.4	
	01 ～ 02	19.9	98	SW	0.3	0.003	0.002	0.13	0.4	
	02 ～ 03	20.0	98	SW	0.4	0.004	0.002	0.13	0.4	
	03 ～ 04	20.0	98	SSW	0.3	0.004	0.002	0.12	0.4	
	04 ～ 05	20.0	98	SW	0.5	0.004	0.002	0.13	0.4	
	05 ～ 06	20.1	98	SSW	0.7	0.004	0.002	0.13	0.4	
	06 ～ 07	20.6	98	SW	0.8	0.004	0.002	0.13	0.4	
	07 ～ 08	22.1	96	SW	0.7	0.004	0.002	0.14	0.4	
	08 ～ 09	24.2	71	NE	0.9	0.004	0.003	0.14	0.4	
	09 ～ 10	25.0	63	NE	1.5	0.004	0.002	0.13	0.3	
	10 ～ 11	25.2	63	NE	2.8	0.004	0.002	0.13	0.4	
	11 ～ 12	25.4	62	NE	3.3	0.004	0.002	0.13	0.4	
	12 ～ 13	25.5	61	NE	3.4	0.004	0.002	0.13	0.3	
	13 ～ 14	25.3	57	NE	3.6	0.003	0.002	0.13	0.3	
	14 ～ 15	25.3	58	NE	3.2	0.004	0.002	0.14	0.4	
最小值		19.8	57	----	0.2	0.003	0.002	0.12	0.3	
最大值		25.5	98	SW	3.6	0.008	0.006	0.17	0.5	
平均值		21.6	87	----	1.0	0.005	0.003	0.14	0.4	
標準偏差		2.4	17	----	1.2	0.001	0.001	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-5

附4.2-3

新北市環境保護局 檢驗報告專用章 (02)7731-2232 新北市中和區中正路738號5樓之1

附錄 IV.2-8 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年6月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月28日（晴）至101年6月29日（晴）	17 ～ 18	27.1	98	WSW	2.2	0.006	0.004	0.18	0.2	
	18 ～ 19	27.3	98	WSW	0.9	0.006	0.005	0.17	0.2	
	19 ～ 20	27.8	98	WSW	0.9	0.008	0.005	0.17	0.2	
	20 ～ 21	28.1	97	WSW	2.4	0.006	0.004	0.16	0.2	
	21 ～ 22	28.1	95	WSW	1.7	0.006	0.004	0.16	0.2	
	22 ～ 23	28.4	93	WSW	2.1	0.006	0.004	0.16	0.2	
	23 ～ 24	27.9	96	WSW	2.9	0.006	0.004	0.16	0.2	
	00 ～ 01	27.2	95	WSW	4.0	0.006	0.004	0.17	0.2	
	01 ～ 02	27.6	95	WSW	3.2	0.006	0.005	0.17	0.2	
	02 ～ 03	27.6	95	WSW	3.3	0.006	0.004	0.17	0.2	
	03 ～ 04	27.1	93	WSW	3.3	0.006	0.004	0.17	0.2	
	04 ～ 05	27.5	91	WSW	3.3	0.006	0.004	0.17	0.2	
	05 ～ 06	28.0	87	WSW	3.7	0.006	0.004	0.17	0.2	
	06 ～ 07	28.3	84	WSW	1.7	0.006	0.004	0.17	0.2	
	07 ～ 08	29.5	78	WSW	1.8	0.007	0.004	0.19	0.3	
	08 ～ 09	29.7	78	WSW	2.5	0.006	0.004	0.18	0.2	
	09 ～ 10	30.0	76	WSW	2.3	0.005	0.004	0.18	0.2	
	10 ～ 11	30.9	73	WSW	3.2	0.006	0.004	0.20	0.3	
	11 ～ 12	30.9	75	WSW	2.9	0.007	0.004	0.19	0.3	
	12 ～ 13	30.5	76	WSW	2.9	0.006	0.004	0.19	0.3	
	13 ～ 14	30.0	80	WSW	2.2	0.005	0.004	0.17	0.2	
	14 ～ 15	29.4	85	W	3.3	0.006	0.005	0.17	0.2	
	15 ～ 16	29.3	86	NW	6.0	0.006	0.004	0.16	0.2	
	16 ～ 17	29.1	87	NW	6.0	0.006	0.004	0.18	0.2	
最小值		27.1	73	----	0.9	0.005	0.004	0.16	0.2	
最大值		30.9	98	WSW	6.0	0.008	0.005	0.20	0.3	
平均值		28.6	88	----	2.9	0.006	0.004	0.17	0.2	
標準偏差		1.2	9	----	1.3	0.001	0.000	0.01	0.0	

1. "表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-8

附錄 IV.2-7 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年6月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月27日（晴）至101年6月28日（晴）	17 ～ 18	30.3	79	WSW	1.4	0.005	0.004	0.21	0.2	
	18 ～ 19	29.5	83	WSW	0.8	0.006	0.005	0.20	0.2	
	19 ～ 20	29.1	85	NNE	0.2	0.005	0.004	0.20	0.2	
	20 ～ 21	28.5	87	WSW	1.4	0.005	0.004	0.20	0.2	
	21 ～ 22	28.5	88	WSW	0.8	0.005	0.004	0.20	0.2	
	22 ～ 23	28.3	88	WSW	1.5	0.005	0.004	0.20	0.2	
	23 ～ 24	28.4	88	WSW	1.0	0.006	0.004	0.20	0.2	
	00 ～ 01	28.3	88	WSW	1.8	0.005	0.004	0.20	0.2	
	01 ～ 02	28.1	88	WSW	1.6	0.005	0.004	0.20	0.2	
	02 ～ 03	28.1	87	SW	1.0	0.005	0.004	0.20	0.2	
	03 ～ 04	27.5	89	NNW	0.2	0.006	0.005	0.20	0.2	
	04 ～ 05	26.1	95	SW	0.2	0.006	0.005	0.21	0.2	
	05 ～ 06	25.7	96	SW	0.3	0.007	0.005	0.22	0.2	
	06 ～ 07	25.9	95	SW	0.8	0.007	0.005	0.23	0.3	
	07 ～ 08	29.1	84	WSW	0.4	0.011	0.006	0.26	0.4	
	08 ～ 09	29.8	81	WSW	1.2	0.007	0.005	0.23	0.2	
	09 ～ 10	30.4	76	WSW	1.9	0.007	0.005	0.23	0.3	
	10 ～ 11	30.9	76	WSW	2.1	0.007	0.004	0.23	0.2	
	11 ～ 12	30.8	78	WSW	2.2	0.006	0.004	0.23	0.2	
	12 ～ 13	31.6	75	WSW	1.6	0.008	0.005	0.26	0.2	
	13 ～ 14	31.8	75	W	1.0	0.007	0.005	0.21	0.2	
	14 ～ 15	32.3	74	W	1.0	0.006	0.004	0.25	0.2	
	15 ～ 16	31.0	80	WSW	1.5	0.010	0.005	0.19	0.2	
	16 ～ 17	28.1	97	WSW	2.0	0.006	0.004	0.18	0.2	
最小值		25.7	74	----	0.2	0.005	0.004	0.18	0.2	
最大值		32.3	97	SSW	2.2	0.011	0.006	0.26	0.4	
平均值		29.1	85	-----	1.2	0.006	0.005	0.21	0.2	
標準偏差		1.8	7	----	0.6	0.002	0.001	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-7

附4.2-4

附錄 IV.2-10 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年4月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月27日（陰）至101年4月28日（晴）	15 ～ 16	21.2	97	SE	1.1	0.016	0.011	0.14	0.5	
	16 ～ 17	21.5	93	S	0.3	0.009	0.007	0.12	0.5	
	17 ～ 18	21.3	92	S	0.2	0.006	0.005	0.14	0.4	
	18 ～ 19	21.9	88	S	0.6	0.005	0.003	0.13	0.4	
	19 ～ 20	22.4	83	S	1.7	0.005	0.004	0.13	0.4	
	20 ～ 21	22.0	88	S	0.6	0.006	0.004	0.13	0.4	
	21 ～ 22	21.5	93	W	0.2	0.009	0.008	0.12	0.4	
	22 ～ 23	20.8	97	WSW	0.2	0.009	0.007	0.12	0.4	
	23 ～ 24	21.1	97	SSW	0.4	0.005	0.003	0.13	0.4	
	00 ～ 01	22.6	88	SSW	0.6	0.004	0.003	0.13	0.4	
	01 ～ 02	22.0	91	WNW	0.2	0.005	0.003	0.13	0.4	
	02 ～ 03	21.2	94	WNW	0.2	0.008	0.006	0.13	0.4	
	03 ～ 04	20.8	96	SW	0.2	0.020	0.014	0.13	0.4	
	04 ～ 05	20.6	97	S	0.2	0.017	0.013	0.12	0.4	
	05 ～ 06	20.8	96	WSW	0.2	0.022	0.014	0.13	0.4	
	06 ～ 07	21.8	93	SW	0.2	0.018	0.010	0.13	0.4	
	07 ～ 08	23.6	87	SSW	0.6	0.012	0.009	0.12	0.4	
	08 ～ 09	24.5	80	S	1.6	0.007	0.005	0.13	0.4	
	09 ～ 10	25.7	74	S	2.2	0.011	0.007	0.13	0.4	
	10 ～ 11	26.7	74	SSE	3.4	0.007	0.004	0.14	0.4	
	11 ～ 12	27.4	71	SSE	3.6	0.007	0.004	0.13	0.4	
	12 ～ 13	26.7	74	S	1.8	0.005	0.003	0.13	0.4	
	13 ～ 14	26.9	74	SW	0.3	0.005	0.004	0.14	0.4	
	14 ～ 15	25.9	73	SSW	0.5	0.008	0.006	0.12	0.4	
最小值		20.6	71	----	0.2	0.004	0.003	0.12	0.4	
最大值		27.4	97	S	3.6	0.022	0.014	0.14	0.5	
平均值		23.0	87	----	0.9	0.009	0.007	0.13	0.4	
標準偏差		2.3	9	----	1.0	0.005	0.004	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-10

附錄 IV.2-9 貢寮國小空氣品質逐時監測結果

(101年6月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月29日（晴）至101年6月30日（晴）	17 ～ 18	29.6	77	NW	5.9	0.006	0.004	0.19	0.2	
	18 ～ 19	28.6	85	NW	5.7	0.006	0.005	0.17	0.2	
	19 ～ 20	28.3	89	NW	6.0	0.006	0.005	0.17	0.2	
	20 ～ 21	28.4	89	NW	6.0	0.006	0.004	0.17	0.2	
	21 ～ 22	28.3	88	NW	5.8	0.006	0.004	0.17	0.2	
	22 ～ 23	28.3	87	WNW	5.4	0.006	0.004	0.17	0.2	
	23 ～ 24	28.3	87	NW	5.9	0.006	0.005	0.17	0.2	
	00 ～ 01	28.2	89	NW	6.0	0.006	0.004	0.17	0.2	
	01 ～ 02	28.1	91	NW	5.9	0.006	0.005	0.17	0.2	
	02 ～ 03	27.6	93	NW	6.0	0.007	0.005	0.18	0.2	
	03 ～ 04	26.8	96	NW	6.0	0.006	0.005	0.18	0.2	
	04 ～ 05	26.1	98	NW	6.0	0.007	0.005	0.18	0.2	
	05 ～ 06	26.0	98	NW	5.8	0.007	0.005	0.19	0.2	
	06 ～ 07	26.8	97	NW	6.0	0.008	0.005	0.20	0.2	
	07 ～ 08	29.6	83	NW	5.9	0.009	0.006	0.23	0.3	
	08 ～ 09	30.5	75	NW	6.0	0.009	0.006	0.22	0.3	
	09 ～ 10	30.7	74	NW	6.0	0.007	0.005	0.18	0.2	
	10 ～ 11	30.7	79	NW	6.0	0.006	0.005	0.17	0.2	
	11 ～ 12	30.6	81	NW	6.0	0.006	0.004	0.17	0.2	
	12 ～ 13	31.3	75	NW	6.0	0.005	0.004	0.18	0.2	
	13 ～ 14	31.9	69	NW	6.0	0.005	0.004	0.18	0.2	
	14 ～ 15	31.4	69	NNW	6.0	0.006	0.004	0.18	0.2	
	15 ～ 16	30.6	75	NW	5.9	0.006	0.004	0.18	0.2	
	16 ～ 17	30.4	78	WNW	5.5	0.006	0.005	0.17	0.2	
最小值		26.0	69	----	5.4	0.005	0.004	0.17	0.2	
最大值		31.9	98	NW	6.0	0.009	0.006	0.23	0.3	
平均值		29.0	84	----	5.9	0.006	0.005	0.18	0.2	
標準偏差		1.7	9	----	0.2	0.001	0.001	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-9

附錄 IV.2-12 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年4月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月29日（晴）至101年4月30日（晴）	15 ～ 16	28.7	76	NW	0.3	0.006	0.004	0.11	0.4	
	16 ～ 17	28.2	79	SE	0.7	0.012	0.006	0.12	0.4	
	17 ～ 18	25.0	91	W	0.3	0.009	0.007	0.16	0.4	
	18 ～ 19	23.7	98	SSE	0.2	0.012	0.010	0.14	0.4	
	19 ～ 20	23.3	98	S	0.2	0.011	0.009	0.13	0.4	
	20 ～ 21	23.3	98	NNW	0.2	0.007	0.006	0.12	0.3	
	21 ～ 22	23.6	98	SW	0.2	0.007	0.005	0.11	0.3	
	22 ～ 23	23.2	98	S	0.2	0.005	0.004	0.12	0.3	
	23 ～ 24	23.0	98	SW	0.2	0.006	0.004	0.11	0.3	
	00 ～ 01	22.8	98	SSW	0.2	0.005	0.003	0.11	0.3	
	01 ～ 02	22.6	98	SSW	0.3	0.007	0.004	0.11	0.3	
	02 ～ 03	22.8	98	SSW	0.5	0.008	0.004	0.12	0.3	
	03 ～ 04	22.8	98	SSW	0.6	0.007	0.003	0.12	0.3	
	04 ～ 05	23.4	97	SW	0.7	0.006	0.003	0.12	0.3	
	05 ～ 06	24.8	87	SW	0.7	0.009	0.006	0.12	0.3	
	06 ～ 07	24.7	89	WSW	0.5	0.009	0.005	0.11	0.3	
	07 ～ 08	25.9	85	S	0.2	0.008	0.004	0.12	0.3	
	08 ～ 09	28.6	74	S	0.2	0.010	0.003	0.15	0.3	
	09 ～ 10	30.4	65	ESE	0.6	0.007	0.003	0.13	0.3	
	10 ～ 11	31.2	63	S	0.2	0.005	0.002	0.13	0.3	
	11 ～ 12	31.2	60	SE	2.2	0.011	0.005	0.14	0.3	
	12 ～ 13	33.5	47	SE	2.1	0.009	0.004	0.15	0.3	
	13 ～ 14	33.4	49	SE	2.6	0.016	0.007	0.14	0.3	
	14 ～ 15	31.6	60	SE	2.2	0.014	0.008	0.15	0.3	
最小值		22.6	47	----	0.2	0.005	0.002	0.11	0.3	
最大值		33.5	98	SW	2.6	0.016	0.010	0.16	0.4	
平均值		26.3	83	-----	0.7	0.009	0.005	0.13	0.3	
標準偏差		3.8	17	----	0.8	0.003	0.002	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-12

附錄 IV.2-11 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年4月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月28日（晴）至101年4月29日（晴）	15 ～ 16	25.4	82	SSE	0.7	0.014	0.009	0.14	0.5	
	16 ～ 17	25.2	84	N	0.2	0.004	0.003	0.12	0.4	
	17 ～ 18	25.2	87	S	0.2	0.010	0.008	0.14	0.5	
	18 ～ 19	24.0	92	S	0.2	0.014	0.008	0.14	0.5	
	19 ～ 20	23.2	94	S	0.3	0.009	0.006	0.13	0.5	
	20 ～ 21	22.8	96	S	0.4	0.008	0.006	0.12	0.4	
	21 ～ 22	22.2	97	S	0.2	0.007	0.005	0.12	0.4	
	22 ～ 23	21.6	98	SSW	0.2	0.006	0.004	0.12	0.4	
	23 ～ 24	21.6	98	SW	0.3	0.007	0.004	0.12	0.4	
	00 ～ 01	21.3	98	SSW	0.3	0.005	0.003	0.12	0.4	
	01 ～ 02	21.2	98	WSW	0.4	0.005	0.003	0.12	0.4	
	02 ～ 03	21.0	98	NW	0.5	0.005	0.003	0.11	0.4	
	03 ～ 04	21.3	98	WNW	1.0	0.007	0.005	0.12	0.3	
	04 ～ 05	21.1	97	WNW	0.6	0.010	0.007	0.12	0.3	
	05 ～ 06	21.2	95	WNW	0.2	0.013	0.008	0.13	0.3	
	06 ～ 07	22.4	93	NW	0.2	0.016	0.008	0.12	0.3	
	07 ～ 08	25.5	79	S	0.4	0.009	0.005	0.13	0.3	
	08 ～ 09	28.9	65	S	1.2	0.009	0.005	0.13	0.3	
	09 ～ 10	29.6	60	S	1.9	0.015	0.008	0.13	0.3	
	10 ～ 11	28.9	65	S	2.3	0.010	0.005	0.13	0.3	
	11 ～ 12	27.4	76	S	2.3	0.008	0.004	0.14	0.3	
	12 ～ 13	27.1	81	S	2.0	0.007	0.004	0.13	0.3	
	13 ～ 14	28.7	73	S	1.3	0.011	0.006	0.12	0.4	
	14 ～ 15	30.0	67	S	0.3	0.007	0.005	0.12	0.4	
最小值		21.0	60	----	0.2	0.004	0.003	0.11	0.3	
最大值		30.0	98	S	2.3	0.016	0.009	0.14	0.5	
平均值		24.5	86	----	0.7	0.009	0.006	0.13	0.4	
標準偏差		3.1	13	-----	0.7	0.003	0.002	0.01	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-11

附4.2-6

附錄 IV.2-14 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年5月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月25日（晴）至101年5月26日（晴）	14 ～ 15	28.6	79	W	5.8	0.007	0.006	0.16	0.4	
	15 ～ 16	27.4	83	W	5.7	0.006	0.005	0.12	0.2	
	16 ～ 17	27.3	80	W	5.8	0.005	0.003	0.09	0.2	
	17 ～ 18	27.1	81	W	6.0	0.005	0.004	0.10	0.2	
	18 ～ 19	26.7	83	WNW	5.6	0.005	0.004	0.09	0.2	
	19 ～ 20	26.0	88	W	5.5	0.005	0.004	0.12	0.3	
	20 ～ 21	25.4	92	W	5.8	0.007	0.006	0.13	0.3	
	21 ～ 22	25.3	92	W	5.7	0.006	0.005	0.14	0.3	
	22 ～ 23	25.1	93	W	6.0	0.005	0.004	0.14	0.3	
	23 ～ 24	25.1	92	W	6.0	0.005	0.004	0.13	0.3	
	00 ～ 01	25.1	91	W	5.8	0.005	0.004	0.12	0.3	
	01 ～ 02	25.0	90	WSW	6.1	0.005	0.004	0.11	0.2	
	02 ～ 03	24.9	89	W	6.1	0.004	0.003	0.10	0.2	
	03 ～ 04	25.0	88	W	5.6	0.004	0.003	0.10	0.2	
	04 ～ 05	24.7	89	NW	6.1	0.021	0.018	0.11	0.2	
	05 ～ 06	24.0	93	NW	6.1	0.017	0.013	0.11	0.2	
	06 ～ 07	25.2	90	WNW	6.0	0.007	0.006	0.12	0.2	
	07 ～ 08	26.1	84	W	6.4	0.007	0.006	0.11	0.2	
	08 ～ 09	26.6	81	WSW	6.1	0.005	0.004	0.13	0.2	
	09 ～ 10	27.3	77	W	6.1	0.004	0.003	0.14	0.2	
	10 ～ 11	28.2	74	W	6.1	0.003	0.002	0.14	0.2	
	11 ～ 12	28.9	72	W	5.8	0.003	0.002	0.11	0.2	
	12 ～ 13	28.1	75	W	5.8	0.003	0.002	0.11	0.2	
	13 ～ 14	27.8	78	W	6.0	0.005	0.003	0.12	0.2	
最小值		24.0	72	----	5.5	0.003	0.002	0.09	0.2	
最大值		28.9	93	W	6.4	0.021	0.018	0.16	0.4	
平均值		26.3	85	----	5.9	0.006	0.005	0.12	0.2	
標準偏差		1.4	7	----	0.2	0.004	0.004	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-14

附錄 IV.2-13 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年5月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月24日（晴）至101年5月25日（晴）	14 ～ 15	30.4	65	WNW	5.5	0.013	0.010	0.14	0.2	
	15 ～ 16	29.9	67	SW	2.4	0.011	0.008	0.13	0.2	
	16 ～ 17	29.9	67	S	3.0	0.011	0.008	0.12	0.2	
	17 ～ 18	28.4	73	S	3.0	0.013	0.008	0.11	0.2	
	18 ～ 19	27.5	75	S	2.2	0.009	0.007	0.11	0.2	
	19 ～ 20	27.1	77	S	2.1	0.007	0.005	0.09	0.2	
	20 ～ 21	27.0	79	S	2.1	0.007	0.006	0.09	0.2	
	21 ～ 22	27.0	80	S	2.5	0.005	0.004	0.09	0.2	
	22 ～ 23	27.0	80	S	3.0	0.005	0.004	0.09	0.1	
	23 ～ 24	26.9	80	S	3.8	0.005	0.004	0.08	0.2	
	00 ～ 01	26.8	80	S	3.7	0.006	0.005	0.09	0.2	
	01 ～ 02	26.6	81	S	3.1	0.006	0.005	0.10	0.2	
	02 ～ 03	26.6	81	SSW	2.9	0.006	0.004	0.09	0.2	
	03 ～ 04	25.6	84	W	0.7	0.010	0.009	0.10	0.2	
	04 ～ 05	23.9	91	WSW	0.7	0.015	0.011	0.10	0.2	
	05 ～ 06	23.8	93	WNW	1.4	0.015	0.012	0.11	0.2	
	06 ～ 07	25.0	87	W	2.1	0.010	0.007	0.11	0.2	
	07 ～ 08	27.4	78	NW	0.8	0.008	0.006	0.12	0.2	
	08 ～ 09	29.4	71	NE	2.5	0.009	0.007	0.16	0.3	
	09 ～ 10	29.7	72	NE	2.9	0.009	0.007	0.17	0.3	
	10 ～ 11	29.9	72	NE	3.1	0.009	0.008	0.20	0.4	
	11 ～ 12	31.3	61	SSE	2.0	0.009	0.007	0.16	0.2	
	12 ～ 13	32.2	61	SE	1.9	0.007	0.006	0.14	0.2	
	13 ～ 14	29.0	78	NE	3.1	0.006	0.005	0.16	0.4	
最小值		23.8	61	----	0.7	0.005	0.004	0.08	0.1	
最大值		32.2	93	S	5.5	0.015	0.012	0.20	0.4	
平均值		27.8	76	----	2.5	0.009	0.007	0.12	0.2	
標準偏差		2.2	8	----	1.1	0.003	0.002	0.03	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-13

附錄 IV.2-16 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年6月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月23日（晴）至101年6月24日（晴）	14 ～ 15	31.4	71	NE	0.6	0.013	0.012	0.11	0.2	
	15 ～ 16	30.9	74	NE	1.2	0.013	0.012	0.11	0.2	
	16 ～ 17	30.7	74	NE	0.9	0.016	0.015	0.17	0.2	
	17 ～ 18	30.8	74	NNE	0.6	0.016	0.015	0.21	0.2	
	18 ～ 19	29.2	83	ESE	0.3	0.021	0.020	0.20	0.3	
	19 ～ 20	27.8	90	SSW	0.4	0.024	0.023	0.21	0.3	
	20 ～ 21	27.2	91	W	0.6	0.023	0.022	0.17	0.3	
	21 ～ 22	26.9	93	W	0.7	0.022	0.020	0.18	0.3	
	22 ～ 23	26.5	95	W	1.2	0.018	0.017	0.19	0.3	
	23 ～ 24	26.4	95	WSW	0.8	0.018	0.016	0.19	0.2	
	00 ～ 01	26.3	94	WSW	1.0	0.016	0.014	0.17	0.2	
	01 ～ 02	26.1	95	W	1.3	0.016	0.014	0.18	0.2	
	02 ～ 03	25.8	96	WSW	1.2	0.015	0.014	0.18	0.2	
	03 ～ 04	25.5	97	WSW	1.3	0.015	0.013	0.18	0.2	
	04 ～ 05	25.4	97	WSW	1.4	0.015	0.014	0.18	0.2	
	05 ～ 06	25.4	98	SW	0.6	0.017	0.015	0.19	0.2	
	06 ～ 07	26.7	94	W	1.2	0.015	0.013	0.20	0.2	
	07 ～ 08	28.9	83	W	1.3	0.018	0.017	0.22	0.3	
	08 ～ 09	30.9	74	NE	1.1	0.013	0.011	0.20	0.2	
	09 ～ 10	30.7	76	ENE	2.8	0.009	0.008	0.15	0.2	
	10 ～ 11	30.7	79	ENE	2.8	0.010	0.008	0.15	0.2	
	11 ～ 12	30.0	86	ENE	3.0	0.008	0.006	0.17	0.1	
	12 ～ 13	30.5	82	NE	2.9	0.005	0.004	0.15	0.1	
	13 ～ 14	30.4	81	NE	2.6	0.005	0.004	0.14	0.1	
最小值		25.4	71	----	0.3	0.005	0.004	0.11	0.1	
最大值		31.4	98	NE	3.0	0.024	0.023	0.22	0.3	
平均值		28.4	86	----	1.3	0.015	0.014	0.17	0.2	
標準偏差		2.2	9	----	0.8	0.005	0.005	0.03	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-16

附錄 IV.2-15 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年5月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月26日（晴）至101年5月27日（陰）	14 ～ 15	27.0	81	W	3.9	0.004	0.003	0.12	0.2	
	15 ～ 16	26.5	81	NE	1.9	0.004	0.003	0.16	0.3	
	16 ～ 17	26.5	83	NNE	2.1	0.004	0.003	0.11	0.2	
	17 ～ 18	25.8	86	NNE	2.9	0.004	0.003	0.09	0.2	
	18 ～ 19	25.1	89	NE	2.7	0.004	0.002	0.10	0.2	
	19 ～ 20	24.3	96	NE	1.5	0.005	0.004	0.10	0.2	
	20 ～ 21	24.5	97	SW	0.2	0.009	0.008	0.11	0.2	
	21 ～ 22	24.7	96	W	0.3	0.007	0.005	0.12	0.2	
	22 ～ 23	24.9	93	WNW	0.2	0.007	0.006	0.11	0.2	
	23 ～ 24	24.6	94	WSW	0.9	0.007	0.005	0.11	0.2	
	00 ～ 01	24.3	96	WSW	1.5	0.005	0.004	0.10	0.2	
	01 ～ 02	23.9	98	SW	0.3	0.006	0.005	0.11	0.2	
	02 ～ 03	23.8	98	SSW	0.2	0.006	0.005	0.10	0.2	
	03 ～ 04	23.8	98	WSW	0.7	0.008	0.007	0.10	0.2	
	04 ～ 05	23.8	98	SW	0.4	0.011	0.009	0.10	0.2	
	05 ～ 06	23.8	98	WSW	0.9	0.008	0.006	0.10	0.2	
	06 ～ 07	23.9	98	SW	1.2	0.009	0.007	0.11	0.2	
	07 ～ 08	24.3	98	WSW	1.2	0.007	0.005	0.13	0.3	
	08 ～ 09	24.9	98	ENE	0.7	0.007	0.005	0.12	0.2	
	09 ～ 10	25.2	98	NE	1.8	0.004	0.003	0.09	0.2	
	10 ～ 11	25.0	98	NE	3.3	0.004	0.003	0.09	0.2	
	11 ～ 12	24.9	98	NE	4.5	0.004	0.003	0.09	0.2	
	12 ～ 13	24.8	98	NE	1.9	0.004	0.003	0.09	0.2	
	13 ～ 14	24.4	98	NE	2.3	0.005	0.003	0.10	0.2	
最小值		23.8	81	----	0.2	0.004	0.002	0.09	0.2	
最大值		27.0	98	NE	4.5	0.011	0.009	0.16	0.3	
平均值		24.8	94	----	1.6	0.006	0.005	0.11	0.2	
標準偏差		0.9	6	----	1.2	0.002	0.002	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-15

附錄 IV.2-18 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年6月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月25日（晴）至101年6月26日（晴）	14 ～ 15	32.8	67	SE	2.0	0.006	0.004	0.22	0.2	
	15 ～ 16	30.4	75	SSE	1.5	0.006	0.004	0.17	0.2	
	16 ～ 17	29.7	78	WSW	0.8	0.009	0.007	0.18	0.2	
	17 ～ 18	29.0	85	W	1.2	0.013	0.010	0.17	0.2	
	18 ～ 19	28.9	87	W	0.7	0.011	0.009	0.18	0.2	
	19 ～ 20	27.6	92	SSW	0.3	0.010	0.007	0.18	0.2	
	20 ～ 21	26.7	95	SSW	0.5	0.011	0.008	0.17	0.2	
	21 ～ 22	26.5	96	WSW	1.1	0.008	0.006	0.16	0.2	
	22 ～ 23	26.1	96	WSW	0.7	0.008	0.006	0.15	0.2	
	23 ～ 24	26.0	97	WSW	0.7	0.009	0.006	0.16	0.2	
	00 ～ 01	26.0	97	WSW	0.7	0.009	0.006	0.15	0.2	
	01 ～ 02	26.0	96	WSW	1.2	0.009	0.006	0.15	0.2	
	02 ～ 03	26.0	96	WSW	1.2	0.010	0.006	0.15	0.2	
	03 ～ 04	26.3	96	WSW	0.8	0.012	0.006	0.16	0.2	
	04 ～ 05	26.2	96	WSW	1.1	0.014	0.006	0.15	0.2	
	05 ～ 06	26.2	96	WSW	1.0	0.012	0.006	0.15	0.2	
	06 ～ 07	27.2	92	WSW	1.2	0.009	0.005	0.16	0.2	
	07 ～ 08	30.0	80	W	0.6	0.005	0.004	0.16	0.2	
	08 ～ 09	31.8	72	ENE	1.0	0.004	0.003	0.15	0.2	
	09 ～ 10	31.5	74	ENE	1.8	0.004	0.002	0.21	0.2	
	10 ～ 11	31.1	79	ENE	2.7	0.005	0.003	0.16	0.2	
	11 ～ 12	30.8	83	ENE	3.0	0.006	0.005	0.19	0.2	
	12 ～ 13	30.9	82	ENE	3.0	0.006	0.004	0.21	0.2	
	13 ～ 14	30.3	82	NE	2.5	0.010	0.006	0.19	0.2	
最小值		26.0	67	----	0.3	0.004	0.002	0.15	0.2	
最大值		32.8	97	WSW	3.0	0.014	0.010	0.22	0.2	
平均值		28.5	87	----	1.3	0.009	0.006	0.17	0.2	
標準偏差		2.3	10	----	0.8	0.003	0.002	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-18

附錄 IV.2-17 福隆海水浴場空氣品質逐時監測結果

(101年6月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月24日（晴）至101年6月25日（晴）	14 ～ 15	29.7	86	ENE	2.7	0.006	0.004	0.17	0.2	
	15 ～ 16	28.9	90	ENE	2.5	0.004	0.003	0.15	0.2	
	16 ～ 17	29.0	88	ENE	2.5	0.004	0.003	0.15	0.2	
	17 ～ 18	29.0	85	E	1.2	0.005	0.004	0.15	0.2	
	18 ～ 19	28.6	83	SSW	0.4	0.010	0.008	0.20	0.3	
	19 ～ 20	27.4	90	WSW	0.5	0.018	0.013	0.18	0.3	
	20 ～ 21	26.7	93	WSW	0.4	0.011	0.008	0.16	0.2	
	21 ～ 22	26.5	94	SW	0.9	0.008	0.006	0.16	0.2	
	22 ～ 23	26.1	95	WSW	0.4	0.008	0.006	0.15	0.2	
	23 ～ 24	25.7	97	WSW	0.9	0.007	0.005	0.15	0.2	
	00 ～ 01	25.5	97	WSW	1.0	0.007	0.005	0.15	0.2	
	01 ～ 02	25.4	97	SW	1.1	0.009	0.006	0.15	0.2	
	02 ～ 03	25.2	97	WSW	1.0	0.009	0.006	0.15	0.2	
	03 ～ 04	25.1	97	WSW	1.4	0.010	0.006	0.15	0.2	
	04 ～ 05	25.3	96	WSW	1.3	0.011	0.007	0.15	0.2	
	05 ～ 06	25.2	97	SSW	0.7	0.026	0.008	0.18	0.2	
	06 ～ 07	27.0	94	WSW	0.6	0.016	0.008	0.18	0.2	
	07 ～ 08	29.6	81	NNW	0.3	0.010	0.006	0.18	0.2	
	08 ～ 09	30.2	77	ENE	1.9	0.007	0.005	0.16	0.2	
	09 ～ 10	29.9	78	ENE	2.2	0.005	0.004	0.15	0.2	
	10 ～ 11	30.1	77	ENE	3.0	0.005	0.004	0.15	0.2	
	11 ～ 12	31.7	71	E	1.4	0.006	0.004	0.17	0.2	
	12 ～ 13	32.8	68	S	2.2	0.009	0.006	0.20	0.2	
	13 ～ 14	32.4	69	SSE	1.9	0.006	0.004	0.18	0.2	
最小值		25.1	68	----	0.3	0.004	0.003	0.15	0.2	
最大值		32.8	97	WSW	3.0	0.026	0.013	0.20	0.3	
平均值		28.0	87	----	1.4	0.009	0.006	0.16	0.2	
標準偏差		2.4	10	----	0.8	0.005	0.002	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-17

附錄 IV.2-19 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年4月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月2日（晴）	11 ～ 12	24.7	58	SSE	2.1	0.007	0.005	0.14	0.2	
	12 ～ 13	24.5	64	ENE	0.9	0.007	0.005	0.19	0.1	
	13 ～ 14	25.5	62	E	0.9	0.007	0.005	0.19	0.2	
	14 ～ 15	25.7	61	ENE	0.9	0.005	0.003	0.18	0.2	
	15 ～ 16	25.0	66	E	1.2	0.004	0.002	0.18	0.1	
	16 ～ 17	24.1	68	ENE	0.7	0.006	0.004	0.18	0.1	
	17 ～ 18	23.3	74	NW	0.4	0.007	0.005	0.15	0.1	
	18 ～ 19	21.2	84	NW	0.6	0.008	0.006	0.13	0.2	
	19 ～ 20	20.5	87	NW	0.9	0.005	0.003	0.13	0.2	
	20 ～ 21	20.2	87	NW	1.3	0.004	0.003	0.13	0.1	
	21 ～ 22	20.0	86	NNW	1.3	0.004	0.002	0.12	0.1	
至101年4月3日（陰）	22 ～ 23	19.7	85	NNE	0.6	0.004	0.002	0.10	0.1	
	23 ～ 24	19.9	84	NNW	0.9	0.004	0.002	0.10	0.1	
	00 ～ 01	19.9	83	NNW	0.9	0.004	0.003	0.12	0.1	
	01 ～ 02	19.8	85	NW	1.0	0.005	0.003	0.14	0.2	
	02 ～ 03	19.4	86	N	0.2	0.006	0.004	0.16	0.1	
	03 ～ 04	19.9	90	WNW	1.0	0.008	0.006	0.18	0.1	
	04 ～ 05	23.6	79	WNW	3.4	0.009	0.008	0.18	0.1	
	05 ～ 06	24.0	78	WNW	2.8	0.006	0.005	0.14	0.1	
	06 ～ 07	24.7	73	WNW	4.1	0.005	0.003	0.11	0.1	
	07 ～ 08	25.5	67	WNW	4.2	0.005	0.003	0.11	0.1	
	08 ～ 09	26.8	60	WNW	5.1	0.005	0.003	0.11	0.1	
	09 ～ 10	27.8	57	WNW	5.1	0.009	0.007	0.13	0.2	
	10 ～ 11	26.3	61	NW	3.8	0.010	0.008	0.13	0.2	
最小值		19.4	57	----	0.2	0.004	0.002	0.10	0.1	
最大值		27.8	90	WNW	5.1	0.010	0.008	0.19	0.2	
平均值		23.0	74	----	1.8	0.006	0.004	0.14	0.1	
標準偏差		2.7	11	----	1.6	0.002	0.002	0.03	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附錄 IV.2-20 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年4月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月3日（陰）	11 ～ 12	20.5	68	NNW	2.6	0.005	0.003	0.12	0.1	
	12 ～ 13	20.5	58	NNW	2.2	0.005	0.003	0.11	0.1	
	13 ～ 14	20.0	60	NNW	1.6	0.005	0.003	0.11	0.2	
	14 ～ 15	18.9	62	NNW	1.8	0.006	0.004	0.11	0.3	
	15 ～ 16	18.3	62	N	1.2	0.006	0.004	0.11	0.2	
	16 ～ 17	18.0	59	NW	0.8	0.009	0.006	0.11	0.2	
	17 ～ 18	17.8	56	WNW	0.6	0.006	0.004	0.10	0.1	
	18 ～ 19	17.2	57	S	1.0	0.005	0.003	0.10	0.1	
	19 ～ 20	17.3	58	SSE	1.9	0.004	0.003	0.11	0.1	
	20 ～ 21	17.3	56	SSE	1.8	0.004	0.003	0.11	0.1	
	21 ～ 22	17.4	56	SSE	1.8	0.004	0.003	0.12	0.1	
至101年4月4日（晴）	22 ～ 23	17.5	56	SSE	1.8	0.004	0.002	0.12	0.1	
	23 ～ 24	17.5	58	SSE	1.8	0.004	0.002	0.12	0.1	
	00 ～ 01	15.9	68	WSW	0.5	0.004	0.003	0.11	0.1	
	01 ～ 02	14.3	79	WNW	0.4	0.004	0.002	0.10	0.1	
	02 ～ 03	13.3	85	NW	0.8	0.004	0.002	0.11	0.1	
	03 ～ 04	12.8	89	WNW	1.1	0.004	0.002	0.11	0.1	
	04 ～ 05	12.7	91	WNW	0.8	0.005	0.003	0.11	0.1	
	05 ～ 06	13.1	92	WNW	0.6	0.005	0.003	0.11	0.1	
	06 ～ 07	14.3	92	NW	0.3	0.008	0.005	0.15	0.2	
	07 ～ 08	19.2	65	SSE	4.0	0.006	0.004	0.12	0.1	
	08 ～ 09	20.5	56	SSE	5.0	0.005	0.003	0.11	0.1	
	09 ～ 10	21.5	55	SSE	5.1	0.004	0.003	0.11	0.1	
	10 ～ 11	22.2	55	SSE	4.8	0.005	0.003	0.11	0.1	
最小值		12.7	55	----	0.3	0.004	0.002	0.10	0.1	
最大值		22.2	92	SSE	5.1	0.009	0.006	0.15	0.3	
平均值		17.4	66	----	1.8	0.005	0.003	0.11	0.1	
標準偏差		2.8	13	----	1.5	0.001	0.001	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附錄 IV.2-22 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年5月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月6日（晴）至101年5月7日（晴）	10 ～ 11	25.9	62	ENE	0.6	0.006	0.003	0.12	0.2	
	11 ～ 12	26.1	61	E	0.9	0.007	0.004	0.12	0.2	
	12 ～ 13	26.1	60	E	0.8	0.006	0.004	0.11	0.2	
	13 ～ 14	26.4	58	ENE	0.7	0.006	0.004	0.11	0.2	
	14 ～ 15	25.9	60	E	1.0	0.005	0.004	0.11	0.2	
	15 ～ 16	25.5	63	E	0.9	0.005	0.003	0.11	0.2	
	16 ～ 17	25.3	65	ESE	0.7	0.006	0.004	0.11	0.2	
	17 ～ 18	24.7	70	SE	1.0	0.007	0.005	0.12	0.2	
	18 ～ 19	22.9	81	SSE	0.2	0.008	0.006	0.13	0.2	
	19 ～ 20	21.2	89	W	0.7	0.007	0.005	0.12	0.2	
	20 ～ 21	20.5	92	W	1.4	0.007	0.005	0.11	0.2	
	21 ～ 22	20.3	92	WNW	1.5	0.006	0.004	0.11	0.2	
	22 ～ 23	20.2	91	NW	1.2	0.006	0.004	0.11	0.2	
	23 ～ 24	20.0	90	NW	1.5	0.005	0.004	0.11	0.2	
	00 ～ 01	19.8	90	NW	1.2	0.006	0.004	0.11	0.2	
	01 ～ 02	19.4	88	NW	1.6	0.005	0.003	0.11	0.2	
	02 ～ 03	19.3	82	WNW	2.1	0.005	0.003	0.11	0.2	
	03 ～ 04	18.8	81	WNW	2.5	0.005	0.003	0.11	0.2	
	04 ～ 05	18.6	79	WNW	2.6	0.005	0.003	0.11	0.2	
	05 ～ 06	18.7	79	WNW	2.5	0.005	0.003	0.11	0.2	
	06 ～ 07	20.5	75	WNW	1.9	0.006	0.003	0.12	0.2	
	07 ～ 08	24.1	66	WNW	1.6	0.006	0.004	0.12	0.2	
	08 ～ 09	27.8	59	SSE	1.5	0.007	0.005	0.12	0.2	
	09 ～ 10	29.2	55	SSE	2.9	0.009	0.006	0.12	0.1	
最小值		18.6	55	----	0.2	0.005	0.003	0.11	0.1	
最大值		29.2	92	WNW	2.9	0.009	0.006	0.13	0.2	
平均值		22.8	75	----	1.4	0.006	0.004	0.11	0.2	
標準偏差		3.3	13	----	0.7	0.001	0.001	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-22

附錄 IV.2-21 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年4月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月4日（晴）至101年4月5日（陰）	11 ～ 12	22.8	53	S	3.4	0.005	0.003	0.10	0.1	
	12 ～ 13	23.0	53	S	3.4	0.004	0.003	0.11	0.1	
	13 ～ 14	22.9	55	S	3.9	0.004	0.002	0.11	0.1	
	14 ～ 15	22.7	57	S	2.9	0.004	0.002	0.12	0.1	
	15 ～ 16	22.4	60	S	2.9	0.004	0.002	0.12	0.1	
	16 ～ 17	21.7	63	S	2.1	0.004	0.003	0.12	0.1	
	17 ～ 18	21.1	65	S	1.7	0.004	0.003	0.12	0.1	
	18 ～ 19	20.8	68	SW	0.5	0.004	0.003	0.12	0.2	
	19 ～ 20	20.8	69	SW	0.4	0.004	0.003	0.12	0.1	
	20 ～ 21	20.3	74	WNW	0.7	0.004	0.002	0.11	0.1	
	21 ～ 22	19.6	78	WNW	1.1	0.005	0.003	0.10	0.1	
	22 ～ 23	19.7	76	WNW	1.5	0.005	0.003	0.11	0.1	
	23 ～ 24	18.9	79	WNW	1.5	0.005	0.004	0.10	0.1	
	00 ～ 01	18.4	81	NW	1.3	0.005	0.004	0.10	0.1	
	01 ～ 02	18.6	81	NW	1.4	0.005	0.004	0.11	0.1	
	02 ～ 03	18.5	82	NW	1.3	0.005	0.003	0.10	0.1	
	03 ～ 04	18.2	85	NW	1.1	0.004	0.003	0.10	0.1	
	04 ～ 05	18.1	88	NNW	0.3	0.004	0.003	0.10	0.1	
	05 ～ 06	18.1	90	NW	0.7	0.004	0.002	0.11	0.1	
	06 ～ 07	18.4	90	WNW	1.4	0.005	0.003	0.12	0.2	
	07 ～ 08	19.3	86	WNW	1.6	0.005	0.004	0.13	0.2	
	08 ～ 09	19.9	83	NNW	0.6	0.006	0.004	0.13	0.2	
	09 ～ 10	19.7	86	NNW	0.4	0.006	0.004	0.12	0.2	
	10 ～ 11	19.4	90	NNW	0.2	0.005	0.003	0.11	0.2	
最小值		18.1	53	----	0.2	0.004	0.002	0.10	0.1	
最大值		23.0	90	S	3.9	0.006	0.004	0.13	0.2	
平均值		20.1	75	----	1.5	0.005	0.003	0.11	0.1	
標準偏差		1.7	13	----	1.1	0.001	0.001	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-21

報告書 公司 (07)7731-3229 台南市中正路788號5樓之4

附錄 IV.2-24 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年5月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月8日（晴）至101年5月9日（陰）	10 ～ 11	29.9	58	SSE	2.1	0.008	0.005	0.13	0.2	
	11 ～ 12	31.0	55	SSE	3.2	0.007	0.004	0.13	0.1	
	12 ～ 13	30.8	58	SSE	3.3	0.007	0.004	0.13	0.1	
	13 ～ 14	30.1	63	S	2.2	0.007	0.004	0.13	0.1	
	14 ～ 15	29.8	66	SSE	2.4	0.007	0.005	0.13	0.1	
	15 ～ 16	29.4	67	S	1.6	0.006	0.004	0.12	0.1	
	16 ～ 17	29.2	68	S	1.8	0.007	0.005	0.13	0.1	
	17 ～ 18	28.6	71	S	0.9	0.007	0.005	0.12	0.1	
	18 ～ 19	27.3	77	WNW	0.2	0.009	0.006	0.13	0.2	
	19 ～ 20	25.3	88	N	0.3	0.011	0.008	0.14	0.2	
	20 ～ 21	25.4	88	WNW	0.3	0.011	0.008	0.14	0.2	
	21 ～ 22	25.8	86	WNW	1.1	0.008	0.006	0.14	0.2	
	22 ～ 23	25.4	87	NNW	0.2	0.009	0.006	0.14	0.2	
	23 ～ 24	24.7	91	NW	0.2	0.009	0.006	0.14	0.2	
	00 ～ 01	24.6	92	WNW	0.5	0.008	0.006	0.15	0.2	
	01 ～ 02	24.4	93	NW	0.3	0.009	0.006	0.14	0.2	
	02 ～ 03	24.1	94	WNW	0.5	0.009	0.006	0.15	0.2	
	03 ～ 04	23.8	94	WNW	0.4	0.008	0.006	0.15	0.2	
	04 ～ 05	23.9	94	WNW	0.4	0.009	0.006	0.16	0.2	
	05 ～ 06	23.8	94	NW	0.2	0.011	0.007	0.17	0.2	
	06 ～ 07	24.6	94	NW	0.3	0.015	0.008	0.21	0.3	
	07 ～ 08	26.4	88	S	0.2	0.014	0.010	0.17	0.2	
	08 ～ 09	27.1	86	ESE	0.9	0.014	0.010	0.17	0.2	
	09 ～ 10	27.4	82	ENE	0.6	0.016	0.011	0.23	0.2	
最小值		23.8	55	----	0.2	0.006	0.004	0.12	0.1	
最大值		31.0	94	WNW	3.3	0.016	0.011	0.23	0.3	
平均值		26.8	81	----	1.0	0.009	0.006	0.15	0.2	
標準偏差		2.5	14	----	1.0	0.003	0.002	0.03	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-24

附錄 IV.2-23 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年5月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月7日（晴）至101年5月8日（晴）	10 ～ 11	30.0	52	SSE	3.2	0.008	0.005	0.13	0.2	
	11 ～ 12	29.6	56	SE	4.0	0.008	0.006	0.13	0.2	
	12 ～ 13	29.8	55	SSE	4.1	0.008	0.005	0.12	0.2	
	13 ～ 14	29.6	57	SSE	2.8	0.007	0.004	0.12	0.2	
	14 ～ 15	29.4	58	SSE	2.7	0.007	0.004	0.12	0.2	
	15 ～ 16	28.8	60	SSE	2.2	0.007	0.005	0.13	0.2	
	16 ～ 17	28.0	63	S	1.8	0.006	0.004	0.12	0.2	
	17 ～ 18	27.2	66	SW	0.7	0.006	0.004	0.12	0.2	
	18 ～ 19	25.7	72	WNW	0.8	0.007	0.004	0.11	0.2	
	19 ～ 20	23.4	85	WNW	0.8	0.008	0.005	0.13	0.2	
	20 ～ 21	23.0	88	WNW	1.4	0.008	0.005	0.13	0.2	
	21 ～ 22	22.9	87	WNW	1.4	0.008	0.005	0.12	0.2	
	22 ～ 23	22.5	86	WNW	1.6	0.007	0.005	0.12	0.2	
	23 ～ 24	22.4	86	WNW	1.4	0.008	0.005	0.12	0.2	
	00 ～ 01	22.3	86	WNW	1.6	0.007	0.005	0.11	0.2	
	01 ～ 02	21.9	87	WNW	1.5	0.007	0.005	0.12	0.2	
	02 ～ 03	21.6	87	NW	0.9	0.007	0.005	0.12	0.2	
	03 ～ 04	21.2	90	WNW	0.4	0.008	0.005	0.13	0.2	
	04 ～ 05	21.5	89	WNW	0.8	0.008	0.006	0.18	0.3	
	05 ～ 06	21.6	89	WNW	1.3	0.008	0.006	0.19	0.3	
	06 ～ 07	22.7	86	WNW	1.6	0.008	0.006	0.18	0.3	
	07 ～ 08	25.0	78	WNW	1.4	0.009	0.006	0.18	0.2	
	08 ～ 09	27.1	69	SE	0.7	0.012	0.009	0.17	0.2	
	09 ～ 10	29.3	60	SSE	2.4	0.013	0.009	0.14	0.2	
最小值		21.2	52	----	0.4	0.006	0.004	0.11	0.2	
最大值		30.0	90	WNW	4.1	0.013	0.009	0.19	0.3	
平均值		25.3	75	----	1.7	0.008	0.005	0.13	0.2	
標準偏差		3.3	14	----	1.0	0.002	0.001	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-23

附錄 IV.2-26 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年6月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月23日（晴）至101年6月24日（晴）	15 ～ 16	29.3	77	NE	0.5	0.005	0.003	0.17	0.2	
	16 ～ 17	29.1	77	NE	0.5	0.005	0.003	0.17	0.2	
	17 ～ 18	29.4	74	NNE	0.2	0.005	0.004	0.18	0.2	
	18 ～ 19	27.8	82	NW	0.3	0.005	0.004	0.18	0.2	
	19 ～ 20	26.7	87	WNW	0.6	0.005	0.004	0.18	0.2	
	20 ～ 21	26.1	89	WNW	0.7	0.006	0.004	0.20	0.2	
	21 ～ 22	25.9	90	WNW	0.6	0.005	0.004	0.18	0.2	
	22 ～ 23	25.6	91	WNW	1.0	0.005	0.004	0.18	0.2	
	23 ～ 24	25.5	91	NW	0.8	0.005	0.003	0.17	0.2	
	00 ～ 01	25.4	91	WNW	0.7	0.005	0.003	0.17	0.2	
	01 ～ 02	25.2	91	WNW	0.9	0.004	0.003	0.17	0.2	
	02 ～ 03	25.0	91	WNW	0.7	0.004	0.003	0.17	0.2	
	03 ～ 04	24.8	92	WNW	1.4	0.005	0.003	0.17	0.2	
	04 ～ 05	24.6	91	NW	0.7	0.005	0.003	0.17	0.2	
	05 ～ 06	24.5	92	W	0.7	0.005	0.003	0.17	0.2	
	06 ～ 07	25.8	89	WNW	1.4	0.005	0.004	0.18	0.2	
	07 ～ 08	28.0	79	W	1.1	0.005	0.004	0.19	0.2	
	08 ～ 09	30.1	71	ENE	0.7	0.006	0.004	0.18	0.2	
	09 ～ 10	30.2	73	ESE	2.1	0.006	0.004	0.19	0.2	
	10 ～ 11	30.1	77	E	1.6	0.007	0.005	0.19	0.2	
	11 ～ 12	30.2	71	NNW	1.1	0.005	0.004	0.18	0.2	
	12 ～ 13	29.9	72	N	1.1	0.005	0.003	0.18	0.2	
	13 ～ 14	29.3	76	NE	1.4	0.005	0.003	0.17	0.2	
	14 ～ 15	28.6	83	NNE	1.1	0.005	0.003	0.16	0.2	
最小值		24.5	71	----	0.2	0.004	0.003	0.16	0.2	
最大值		30.2	92	WNW	2.1	0.007	0.005	0.20	0.2	
平均值		27.4	83	----	0.9	0.005	0.004	0.18	0.2	
標準偏差		2.1	8	----	0.4	0.001	0.001	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-26

附錄 IV.2-25 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年6月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月22日（晴）至101年6月23日（晴）	15 ～ 16	29.1	73	SE	1.7	0.006	0.004	0.18	0.2	
	16 ～ 17	27.6	82	WNW	0.5	0.005	0.004	0.18	0.2	
	17 ～ 18	26.3	89	WNW	0.3	0.005	0.003	0.17	0.2	
	18 ～ 19	25.9	93	WNW	0.7	0.005	0.004	0.18	0.2	
	19 ～ 20	25.6	94	WNW	0.4	0.005	0.003	0.17	0.3	
	20 ～ 21	25.3	95	WNW	0.7	0.005	0.003	0.17	0.3	
	21 ～ 22	25.0	95	WNW	0.4	0.005	0.003	0.16	0.3	
	22 ～ 23	24.9	95	NW	0.7	0.004	0.003	0.16	0.4	
	23 ～ 24	24.8	95	WNW	0.7	0.005	0.003	0.16	0.4	
	00 ～ 01	24.5	95	WNW	0.8	0.004	0.003	0.16	0.4	
	01 ～ 02	24.3	96	NW	0.9	0.004	0.003	0.16	0.4	
	02 ～ 03	24.3	95	WNW	0.7	0.004	0.003	0.16	0.4	
	03 ～ 04	24.2	94	WNW	0.8	0.005	0.003	0.16	0.4	
	04 ～ 05	24.0	94	WNW	1.1	0.004	0.003	0.16	0.4	
	05 ～ 06	23.9	94	WNW	1.0	0.005	0.003	0.16	0.4	
	06 ～ 07	24.6	93	WNW	1.5	0.005	0.003	0.16	0.4	
	07 ～ 08	26.0	87	WNW	1.0	0.004	0.003	0.18	0.4	
	08 ～ 09	27.5	81	W	1.0	0.004	0.003	0.19	0.4	
	09 ～ 10	28.8	76	E	1.2	0.005	0.003	0.20	0.4	
	10 ～ 11	28.6	77	ENE	1.0	0.005	0.004	0.19	0.3	
	11 ～ 12	29.1	74	E	1.1	0.005	0.003	0.19	0.2	
	12 ～ 13	29.4	72	NNE	0.8	0.004	0.003	0.18	0.2	
	13 ～ 14	30.3	70	NNE	1.1	0.004	0.003	0.17	0.3	
	14 ～ 15	29.7	74	E	1.0	0.004	0.003	0.18	0.3	
最小值		23.9	70	----	0.3	0.004	0.003	0.16	0.2	
最大值		30.3	96	WNW	1.7	0.006	0.004	0.20	0.4	
平均值		26.4	87	----	0.9	0.005	0.003	0.17	0.3	
標準偏差		2.1	9	----	0.3	0.001	0.000	0.01	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-25

附錄 IV.2-28 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年4月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月5日（陰）至101年4月6日（陰）	17 ～ 18	18.1	95	NNW	3.8	0.021	0.018	0.15	0.4	
	18 ～ 19	18.0	95	N	1.1	0.011	0.009	0.12	0.3	
	19 ～ 20	17.7	95	WNW	0.5	0.004	0.002	0.14	0.2	
	20 ～ 21	17.6	95	NNW	0.6	0.016	0.014	0.13	0.3	
	21 ～ 22	17.6	96	NNW	0.5	0.015	0.013	0.12	0.3	
	22 ～ 23	17.6	96	NW	0.5	0.007	0.006	0.12	0.2	
	23 ～ 24	17.5	97	NW	0.6	0.005	0.003	0.14	0.2	
	00 ～ 01	17.4	97	NNW	1.1	0.008	0.006	0.13	0.2	
	01 ～ 02	17.4	97	NNW	0.7	0.006	0.005	0.13	0.2	
	02 ～ 03	17.4	97	NW	0.4	0.008	0.007	0.13	0.2	
	03 ～ 04	17.4	97	NNW	0.8	0.013	0.011	0.13	0.2	
	04 ～ 05	17.4	97	NW	0.8	0.011	0.009	0.13	0.2	
	05 ～ 06	16.8	95	N	0.5	0.012	0.010	0.13	0.1	
	06 ～ 07	19.1	71	NE	2.2	0.021	0.015	0.14	0.2	
	07 ～ 08	19.9	57	NE	2.6	0.018	0.013	0.13	0.3	
	08 ～ 09	20.2	57	ENE	2.5	0.021	0.015	0.13	0.3	
	09 ～ 10	20.4	57	ENE	2.4	0.020	0.014	0.13	0.3	
	10 ～ 11	20.2	63	E	2.1	0.024	0.018	0.13	0.3	
	11 ～ 12	20.3	65	ENE	2.3	0.031	0.024	0.13	0.4	
	12 ～ 13	20.0	73	NE	2.6	0.026	0.019	0.13	0.4	
	13 ～ 14	19.9	64	NE	2.2	0.029	0.023	0.14	0.4	
	14 ～ 15	19.1	69	NE	1.5	0.024	0.020	0.12	0.4	
	15 ～ 16	17.2	85	W	0.7	0.009	0.008	0.13	0.4	
	16 ～ 17	17.1	90	WNW	0.5	0.012	0.010	0.14	0.4	
最小值		16.8	57	----	0.4	0.004	0.002	0.12	0.1	
最大值		20.4	97	NNW	3.8	0.031	0.024	0.15	0.4	
平均值		18.4	83	----	1.4	0.016	0.012	0.13	0.3	
標準偏差		1.3	16	----	1.0	0.008	0.006	0.01	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-28

附錄 IV.2-27 川島養殖池空氣品質逐時監測結果

(101年6月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月24日（晴）至101年6月25日（晴）	15 ～ 16	28.3	85	E	0.3	0.005	0.004	0.17	0.2	
	16 ～ 17	28.4	83	ESE	0.9	0.006	0.004	0.17	0.2	
	17 ～ 18	28.2	83	SE	1.3	0.007	0.005	0.18	0.2	
	18 ～ 19	27.6	85	SE	0.2	0.007	0.005	0.18	0.2	
	19 ～ 20	26.7	89	WNW	0.8	0.006	0.004	0.17	0.2	
	20 ～ 21	26.0	91	NW	0.5	0.005	0.003	0.17	0.2	
	21 ～ 22	25.6	92	NNW	0.7	0.005	0.004	0.17	0.2	
	22 ～ 23	25.3	93	WNW	1.0	0.005	0.004	0.17	0.2	
	23 ～ 24	25.1	93	WNW	1.1	0.005	0.003	0.17	0.2	
	00 ～ 01	24.9	92	WNW	1.1	0.004	0.003	0.16	0.2	
	01 ～ 02	24.6	92	NW	0.9	0.004	0.003	0.17	0.2	
	02 ～ 03	24.6	92	WNW	1.3	0.004	0.003	0.16	0.2	
	03 ～ 04	24.7	91	NW	1.2	0.005	0.004	0.17	0.2	
	04 ～ 05	24.8	91	NW	0.6	0.006	0.005	0.18	0.2	
	05 ～ 06	24.9	91	NW	0.7	0.007	0.005	0.19	0.2	
	06 ～ 07	26.0	89	WNW	1.1	0.007	0.004	0.20	0.2	
	07 ～ 08	28.2	80	NW	0.3	0.008	0.005	0.21	0.2	
	08 ～ 09	29.1	76	ESE	1.4	0.007	0.005	0.20	0.2	
	09 ～ 10	29.3	74	ESE	1.3	0.007	0.005	0.20	0.2	
	10 ～ 11	29.5	74	ESE	2.0	0.006	0.005	0.19	0.2	
	11 ～ 12	30.4	70	ESE	1.8	0.005	0.004	0.18	0.3	
	12 ～ 13	30.2	73	SE	2.3	0.006	0.004	0.19	0.4	
	13 ～ 14	30.7	70	SE	2.1	0.006	0.004	0.19	0.4	
	14 ～ 15	30.8	70	ESE	1.3	0.005	0.004	0.19	0.4	
最小值		24.6	70	----	0.2	0.004	0.003	0.16	0.2	
最大值		30.8	93	ESE	2.3	0.008	0.005	0.21	0.4	
平均值		27.2	84	----	1.1	0.006	0.004	0.18	0.2	
標準偏差		2.2	8	----	0.6	0.001	0.001	0.01	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-27

附錄 IV.2-30 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年4月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月7日（陰）至101年4月8日（陰）	17 ～ 18	20.0	80	NNW	4.5	0.011	0.008	0.18	0.2	
	18 ～ 19	18.5	85	NNW	4.7	0.005	0.003	0.17	0.2	
	19 ～ 20	18.6	87	NNW	5.0	0.005	0.002	0.18	0.2	
	20 ～ 21	18.8	87	NNW	5.2	0.005	0.003	0.17	0.2	
	21 ～ 22	19.3	80	NNW	5.1	0.005	0.003	0.18	0.2	
	22 ～ 23	19.5	79	NNW	4.9	0.005	0.002	0.17	0.2	
	23 ～ 24	19.4	78	NNW	5.2	0.005	0.003	0.17	0.2	
	00 ～ 01	19.5	78	NNW	5.1	0.006	0.004	0.17	0.2	
	01 ～ 02	19.8	78	NNW	5.2	0.005	0.003	0.18	0.2	
	02 ～ 03	19.9	78	NNW	5.4	0.006	0.004	0.18	0.1	
	03 ～ 04	20.0	78	NNW	5.1	0.006	0.003	0.18	0.2	
	04 ～ 05	20.1	77	NNW	5.1	0.005	0.003	0.17	0.1	
	05 ～ 06	20.1	79	NNW	5.0	0.005	0.003	0.17	0.1	
	06 ～ 07	19.8	83	NNW	5.2	0.006	0.004	0.17	0.1	
	07 ～ 08	20.4	79	NNW	5.5	0.006	0.004	0.18	0.1	
	08 ～ 09	21.7	73	NNW	5.0	0.006	0.004	0.18	0.1	
	09 ～ 10	22.7	69	NNW	5.0	0.006	0.004	0.18	0.1	
	10 ～ 11	22.6	70	NNW	4.9	0.006	0.003	0.18	0.1	
	11 ～ 12	22.3	72	NNW	4.8	0.005	0.003	0.17	0.1	
	12 ～ 13	22.0	74	NNW	4.6	0.005	0.003	0.17	0.1	
	13 ～ 14	21.6	76	NNW	4.5	0.005	0.003	0.17	0.1	
	14 ～ 15	21.2	76	NNW	4.7	0.005	0.003	0.17	0.1	
	15 ～ 16	21.1	76	NNW	5.2	0.007	0.004	0.17	0.1	
	16 ～ 17	20.7	83	NNW	5.1	0.008	0.005	0.18	0.2	
最小值		18.5	69	----	4.5	0.005	0.002	0.17	0.1	
最大值		22.7	87	NNW	5.5	0.011	0.008	0.18	0.2	
平均值		20.4	78	----	5.0	0.006	0.004	0.18	0.1	
標準偏差		1.2	5	----	0.3	0.001	0.001	0.00	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間
2. "ㄆ"表非監測時段
3. "ㄇ"表儀器損壞
4. "ㄈ"表電源中斷
5. 風向之最大值表最頻風向

附錄 IV.2-29 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年4月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月6日（陰）至101年4月7日（陰）	17 ～ 18	16.7	92	NW	0.7	0.010	0.008	0.13	0.3	
	18 ～ 19	16.6	89	SSW	2.0	0.005	0.004	0.12	0.1	
	19 ～ 20	16.7	88	WNW	1.0	0.006	0.004	0.12	0.1	
	20 ～ 21	16.4	91	NW	1.1	0.006	0.005	0.13	0.2	
	21 ～ 22	16.3	92	NW	0.6	0.006	0.004	0.12	0.1	
	22 ～ 23	16.2	93	NW	0.7	0.006	0.004	0.13	0.1	
	23 ～ 24	16.1	93	NW	0.7	0.007	0.006	0.12	0.2	
	00 ～ 01	16.0	93	NW	0.6	0.007	0.006	0.13	0.2	
	01 ～ 02	16.1	93	NW	0.8	0.009	0.007	0.13	0.2	
	02 ～ 03	16.1	92	W	0.6	0.007	0.006	0.12	0.2	
	03 ～ 04	16.5	89	NW	0.9	0.007	0.005	0.12	0.2	
	04 ～ 05	16.4	89	WNW	0.6	0.009	0.007	0.12	0.1	
	05 ～ 06	16.5	89	WNW	0.5	0.006	0.005	0.12	0.1	
	06 ～ 07	17.0	88	W	0.4	0.014	0.011	0.12	0.1	
	07 ～ 08	17.4	89	SSW	0.7	0.008	0.007	0.14	0.2	
	08 ～ 09	18.9	78	SSW	0.7	0.007	0.005	0.12	0.1	
	09 ～ 10	20.4	70	SSW	2.4	0.006	0.004	0.12	0.1	
	10 ～ 11	21.7	65	SSW	1.3	0.005	0.004	0.12	0.1	
	11 ～ 12	22.5	61	NNW	4.3	0.010	0.008	0.12	0.1	
	12 ～ 13	21.7	64	NNW	4.6	0.012	0.010	0.12	0.1	
	13 ～ 14	21.8	65	NNW	4.4	0.009	0.007	0.12	0.1	
	14 ～ 15	22.2	65	NW	4.3	0.011	0.009	0.13	0.1	
	15 ～ 16	21.9	66	NNW	4.4	0.007	0.006	0.12	0.1	
	16 ～ 17	21.2	71	NNW	4.3	0.011	0.009	0.12	0.1	
最小值		16.0	61	----	0.4	0.005	0.004	0.12	0.1	
最大值		22.5	93	NW	4.6	0.014	0.011	0.14	0.3	
平均值		18.3	82	----	1.8	0.008	0.006	0.12	0.1	
標準偏差		2.5	12	----	1.6	0.002	0.002	0.00	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間
2. "ㄆ"表非監測時段
3. "ㄇ"表儀器損壞
4. "ㄈ"表電源中斷
5. 風向之最大值表最頻風向

附錄 IV.2-32 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年5月第2日)

日期	時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月3日（陰）至101年5月4日（陰）	17 ～ 18	23.6	75	E	1.6	0.019	0.013	0.14	0.4	
	18 ～ 19	23.5	77	ESE	0.7	0.018	0.013	0.13	0.3	
	19 ～ 20	22.9	83	WSW	0.2	0.008	0.005	0.14	0.2	
	20 ～ 21	21.8	95	WNW	0.4	0.008	0.005	0.14	0.3	
	21 ～ 22	21.7	96	E	1.3	0.011	0.008	0.11	0.2	
	22 ～ 23	21.4	96	SSW	0.6	0.008	0.005	0.11	0.2	
	23 ～ 24	21.0	96	WSW	0.5	0.005	0.002	0.11	0.2	
	00 ～ 01	21.0	96	WNW	0.4	0.005	0.003	0.11	0.2	
	01 ～ 02	21.1	97	WNW	0.3	0.005	0.002	0.11	0.2	
	02 ～ 03	21.0	97	NW	1.4	0.006	0.004	0.11	0.2	
	03 ～ 04	20.3	97	N	2.2	0.009	0.005	0.11	0.2	
	04 ～ 05	19.9	97	NNE	1.5	0.011	0.007	0.11	0.2	
	05 ～ 06	20.2	97	E	1.6	0.016	0.011	0.11	0.2	
	06 ～ 07	20.6	96	E	0.7	0.026	0.020	0.12	0.2	
	07 ～ 08	20.4	96	NNE	1.4	0.025	0.016	0.16	0.3	
	08 ～ 09	20.4	97	NE	1.5	0.023	0.016	0.13	0.2	
	09 ～ 10	20.5	97	NE	2.4	0.019	0.012	0.11	0.2	
	10 ～ 11	20.1	97	NNE	2.2	0.024	0.014	0.14	0.2	
	11 ～ 12	19.9	97	NE	2.4	0.018	0.012	0.13	0.2	
	12 ～ 13	19.7	97	NE	2.2	0.021	0.014	0.13	0.3	
	13 ～ 14	19.7	95	NE	1.8	0.022	0.015	0.12	0.3	
	14 ～ 15	20.0	97	NNE	1.2	0.023	0.017	0.12	0.3	
	15 ～ 16	20.1	97	NNE	1.4	0.019	0.014	0.12	0.3	
	16 ～ 17	20.0	96	N	0.9	0.027	0.022	0.14	0.4	
最小值		19.7	75	----	0.2	0.005	0.002	0.11	0.2	
最大值		23.6	97	NNE	2.4	0.027	0.022	0.16	0.4	
平均值		20.9	94	----	1.3	0.016	0.011	0.12	0.2	
標準偏差		1.1	6	----	0.7	0.008	0.006	0.01	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-32

附錄 IV.2-31 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年5月第1日)

日期	時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月2日（陰）至101年5月3日（陰）	17 ～ 18	25.2	93	ENE	1.9	0.021	0.010	0.15	0.6	
	18 ～ 19	23.7	96	NNE	2.6	0.010	0.005	0.13	0.4	
	19 ～ 20	22.6	97	ENE	3.0	0.007	0.003	0.12	0.3	
	20 ～ 21	22.2	98	NE	2.3	0.009	0.004	0.12	0.4	
	21 ～ 22	21.9	98	NNE	1.9	0.009	0.004	0.12	0.4	
	22 ～ 23	21.3	98	NW	1.0	0.010	0.005	0.12	0.4	
	23 ～ 24	21.4	98	WNW	0.5	0.005	0.002	0.12	0.3	
	00 ～ 01	21.4	98	NW	1.3	0.007	0.002	0.12	0.3	
	01 ～ 02	21.3	98	NW	1.2	0.006	0.002	0.11	0.3	
	02 ～ 03	21.4	98	NW	1.4	0.007	0.003	0.11	0.2	
	03 ～ 04	21.4	98	NW	1.3	0.009	0.004	0.12	0.3	
	04 ～ 05	21.5	96	N	1.0	0.017	0.010	0.12	0.3	
	05 ～ 06	21.7	92	NNW	1.1	0.028	0.016	0.13	0.3	
	06 ～ 07	22.1	90	NNW	0.6	0.023	0.012	0.14	0.3	
	07 ～ 08	23.1	84	NNE	0.9	0.032	0.016	0.19	0.5	
	08 ～ 09	23.6	79	NNE	1.0	0.029	0.015	0.15	0.3	
	09 ～ 10	24.5	75	NNE	1.2	0.025	0.011	0.14	0.3	
	10 ～ 11	25.0	72	NNE	1.4	0.029	0.013	0.14	0.3	
	11 ～ 12	25.6	70	NE	1.7	0.025	0.011	0.14	0.3	
	12 ～ 13	24.5	74	NE	1.3	0.036	0.018	0.14	0.3	
	13 ～ 14	24.1	75	NE	1.3	0.031	0.017	0.13	0.3	
	14 ～ 15	24.8	71	ENE	1.3	0.026	0.014	0.12	0.3	
	15 ～ 16	24.1	75	E	1.4	0.027	0.016	0.13	0.3	
	16 ～ 17	23.8	75	E	1.6	0.023	0.014	0.13	0.3	
最小值		21.3	70	----	0.5	0.005	0.002	0.11	0.2	
最大值		25.6	98	NNE	3.0	0.036	0.018	0.19	0.6	
平均值		23.0	87	----	1.4	0.019	0.009	0.13	0.3	
標準偏差		1.5	11	----	0.6	0.010	0.006	0.02	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-31

附錄 IV.2-34 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年6月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月27日（晴）至101年6月28日（晴）	17 ～ 18	30.6	72	SE	1.8	0.011	0.007	0.20	0.4	
	18 ～ 19	29.3	77	SE	1.5	0.008	0.007	0.19	0.3	
	19 ～ 20	28.8	80	SSE	1.2	0.005	0.004	0.18	0.3	
	20 ～ 21	28.3	81	SSE	1.0	0.005	0.004	0.18	0.3	
	21 ～ 22	28.1	81	SSE	1.4	0.005	0.004	0.17	0.3	
	22 ～ 23	27.9	82	SSE	1.7	0.005	0.004	0.17	0.2	
	23 ～ 24	28.0	83	SSE	1.7	0.005	0.004	0.17	0.2	
	00 ～ 01	27.9	83	SSE	1.5	0.005	0.004	0.17	0.2	
	01 ～ 02	27.7	83	S	1.8	0.005	0.003	0.17	0.2	
	02 ～ 03	27.7	82	S	1.7	0.004	0.003	0.17	0.2	
	03 ～ 04	26.8	85	SW	0.5	0.004	0.003	0.17	0.2	
	04 ～ 05	25.4	90	NW	0.8	0.008	0.004	0.18	0.2	
	05 ～ 06	24.9	92	NW	0.8	0.006	0.004	0.18	0.2	
	06 ～ 07	27.3	88	SSE	0.2	0.022	0.007	0.19	0.3	
	07 ～ 08	30.0	74	SE	1.9	0.015	0.007	0.19	0.3	
	08 ～ 09	30.3	73	SE	2.4	0.010	0.005	0.18	0.3	
	09 ～ 10	30.7	69	SE	3.2	0.013	0.006	0.18	0.2	
	10 ～ 11	31.2	68	SE	2.9	0.011	0.005	0.18	0.2	
	11 ～ 12	31.0	72	SE	3.0	0.010	0.005	0.18	0.2	
	12 ～ 13	30.6	73	ESE	3.1	0.015	0.006	0.18	0.3	
	13 ～ 14	29.5	78	ESE	3.7	0.013	0.005	0.20	0.3	
	14 ～ 15	30.1	76	ESE	4.1	0.007	0.003	0.31	0.2	
	15 ～ 16	29.7	78	ESE	4.1	0.010	0.004	0.21	0.3	
	16 ～ 17	28.7	84	ESE	3.0	0.010	0.005	0.14	0.2	
最小值		24.9	68	----	0.2	0.004	0.003	0.17	0.2	
最大值		31.2	92	SE	4.1	0.022	0.007	0.31	0.4	
平均值		28.8	79	----	2.0	0.009	0.005	0.18	0.3	
標準偏差		1.7	6	----	1.1	0.004	0.001	0.03	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-34

附錄 IV.2-33 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年5月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月4日（陰）至101年5月5日（晴）	17 ～ 18	20.3	94	N	0.4	0.018	0.015	0.19	0.4	
	18 ～ 19	20.0	94	WNW	0.3	0.007	0.005	0.17	0.4	
	19 ～ 20	19.8	96	NW	0.9	0.006	0.004	0.16	0.4	
	20 ～ 21	19.8	94	NW	0.9	0.006	0.004	0.16	0.3	
	21 ～ 22	19.8	94	NW	0.5	0.007	0.005	0.16	0.4	
	22 ～ 23	19.9	94	NW	0.4	0.005	0.003	0.16	0.3	
	23 ～ 24	19.8	94	NW	1.1	0.005	0.002	0.16	0.3	
	00 ～ 01	19.8	94	NW	0.9	0.005	0.002	0.15	0.3	
	01 ～ 02	19.8	94	WNW	0.9	0.005	0.002	0.15	0.3	
	02 ～ 03	19.9	94	NW	0.8	0.004	0.002	0.15	0.3	
	03 ～ 04	19.9	94	NW	0.9	0.005	0.002	0.15	0.3	
	04 ～ 05	20.0	95	NW	0.7	0.006	0.004	0.15	0.2	
	05 ～ 06	20.2	95	NW	1.3	0.015	0.009	0.16	0.3	
	06 ～ 07	21.4	92	NW	1.2	0.027	0.014	0.18	0.3	
	07 ～ 08	24.0	70	NNW	1.3	0.015	0.010	0.19	0.3	
	08 ～ 09	25.4	57	N	1.7	0.020	0.013	0.18	0.2	
	09 ～ 10	25.9	59	NNE	2.1	0.016	0.010	0.18	0.2	
	10 ～ 11	26.0	58	NNE	2.2	0.015	0.009	0.18	0.2	
	11 ～ 12	26.4	58	NNE	2.3	0.019	0.012	0.18	0.2	
	12 ～ 13	26.4	56	NNE	2.4	0.016	0.009	0.18	0.2	
	13 ～ 14	26.7	52	NNE	2.1	0.014	0.009	0.18	0.2	
	14 ～ 15	26.7	54	NNE	1.9	0.015	0.010	0.18	0.1	
	15 ～ 16	26.3	57	NNE	1.9	0.016	0.010	0.19	0.2	
	16 ～ 17	25.7	59	NNE	1.6	0.013	0.008	0.18	0.2	
最小值		19.8	52	----	0.3	0.004	0.002	0.15	0.1	
最大值		26.7	96	NW	2.4	0.027	0.015	0.19	0.4	
平均值		22.5	79	----	1.3	0.012	0.007	0.17	0.3	
標準偏差		3.0	18	----	0.7	0.006	0.004	0.01	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-33

附錄 IV.2-36 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年6月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月29日（晴）至101年6月30日（晴）	17 ～ 18	28.9	75	S	2.2	0.006	0.004	0.17	0.2	
	18 ～ 19	28.4	79	SSE	1.7	0.006	0.005	0.16	0.2	
	19 ～ 20	28.0	83	SSE	2.1	0.006	0.004	0.16	0.1	
	20 ～ 21	28.0	83	SSE	1.9	0.006	0.004	0.16	0.1	
	21 ～ 22	27.8	83	S	1.8	0.006	0.004	0.16	0.1	
	22 ～ 23	27.8	82	S	1.4	0.006	0.004	0.16	0.1	
	23 ～ 24	27.9	82	S	1.4	0.006	0.004	0.16	0.1	
	00 ～ 01	27.8	83	S	1.6	0.006	0.004	0.16	0.1	
	01 ～ 02	27.7	85	SSW	1.1	0.006	0.004	0.16	0.1	
	02 ～ 03	27.2	87	NW	0.5	0.007	0.005	0.17	0.2	
	03 ～ 04	26.2	90	NW	0.7	0.006	0.004	0.16	0.2	
	04 ～ 05	25.7	92	WNW	0.3	0.012	0.006	0.17	0.2	
	05 ～ 06	25.8	93	WNW	0.6	0.008	0.005	0.18	0.2	
	06 ～ 07	28.2	86	ESE	0.3	0.019	0.006	0.18	0.2	
	07 ～ 08	29.2	77	SSE	1.3	0.007	0.004	0.18	0.2	
	08 ～ 09	30.1	71	SSE	2.1	0.007	0.004	0.18	0.2	
	09 ～ 10	30.9	69	SSE	2.9	0.005	0.004	0.17	0.2	
	10 ～ 11	30.2	74	S	2.5	0.006	0.004	0.17	0.2	
	11 ～ 12	30.5	74	S	3.2	0.006	0.004	0.18	0.2	
	12 ～ 13	31.0	70	S	3.9	0.005	0.004	0.17	0.1	
	13 ～ 14	31.2	67	S	4.2	0.006	0.004	0.17	0.1	
	14 ～ 15	31.0	67	SSW	3.7	0.006	0.004	0.17	0.3	
	15 ～ 16	30.1	71	SSW	1.7	0.006	0.004	0.17	0.3	
	16 ～ 17	29.8	75	NE	1.6	0.018	0.010	0.18	0.4	
最小值		25.7	67	----	0.3	0.005	0.004	0.16	0.1	
最大值		31.2	93	S	4.2	0.019	0.010	0.18	0.4	
平均值		28.7	79	----	1.9	0.007	0.005	0.17	0.2	
標準偏差		1.7	8	----	1.1	0.004	0.001	0.01	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-36

附錄 IV.2-35 石碇宮空氣品質逐時監測結果

(101年6月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月28日（晴）至101年6月29日（晴）	17 ～ 18	27.4	87	SE	1.9	0.007	0.005	0.16	0.2	
	18 ～ 19	27.1	91	SE	2.9	0.007	0.004	0.15	0.2	
	19 ～ 20	27.7	91	ESE	4.0	0.006	0.004	0.16	0.2	
	20 ～ 21	28.0	87	ESE	3.5	0.005	0.004	0.15	0.2	
	21 ～ 22	28.0	86	SE	3.6	0.006	0.004	0.16	0.2	
	22 ～ 23	28.2	84	SE	4.0	0.005	0.004	0.16	0.2	
	23 ～ 24	27.5	89	SE	4.0	0.005	0.003	0.16	0.2	
	00 ～ 01	27.2	87	SSE	3.3	0.005	0.003	0.15	0.2	
	01 ～ 02	27.4	86	SE	3.8	0.005	0.004	0.15	0.2	
	02 ～ 03	27.5	86	SSE	3.6	0.005	0.003	0.15	0.2	
	03 ～ 04	26.8	88	SSE	3.0	0.005	0.004	0.15	0.2	
	04 ～ 05	26.9	87	SE	3.4	0.006	0.004	0.15	0.2	
	05 ～ 06	27.5	83	SSE	2.9	0.005	0.004	0.15	0.2	
	06 ～ 07	28.1	80	S	1.4	0.006	0.004	0.15	0.2	
	07 ～ 08	29.0	74	S	2.5	0.007	0.005	0.16	0.2	
	08 ～ 09	29.7	73	SSE	2.9	0.006	0.004	0.16	0.2	
	09 ～ 10	29.9	72	SSE	2.9	0.006	0.004	0.16	0.2	
	10 ～ 11	31.2	67	SSE	3.2	0.007	0.005	0.16	0.2	
	11 ～ 12	31.0	69	S	3.0	0.005	0.004	0.16	0.2	
	12 ～ 13	30.9	69	S	3.3	0.005	0.004	0.16	0.2	
	13 ～ 14	30.4	72	S	3.6	0.006	0.004	0.17	0.2	
	14 ～ 15	29.9	76	SSE	3.2	0.006	0.004	0.17	0.3	
	15 ～ 16	29.4	78	SSE	2.8	0.006	0.005	0.16	0.3	
	16 ～ 17	29.3	80	SSE	2.1	0.008	0.006	0.18	0.2	
最小值		26.8	67	----	1.4	0.005	0.003	0.15	0.2	
最大值		31.2	91	SSE	4.0	0.008	0.006	0.18	0.3	
平均值		28.6	81	----	3.1	0.006	0.004	0.16	0.2	
標準偏差		1.4	8	----	0.7	0.001	0.001	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-35

附錄 IV.2-38 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年4月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月20日（晴）至101年4月21日（晴）	14 ～ 15	24.9	91	NNW	0.2	0.009	0.006	0.16	0.3	
	15 ～ 16	25.4	89	E	0.3	0.007	0.005	0.16	0.3	
	16 ～ 17	25.2	91	ESE	0.6	0.008	0.005	0.17	0.3	
	17 ～ 18	25.1	93	E	0.3	0.007	0.005	0.16	0.3	
	18 ～ 19	24.6	95	NNW	0.2	0.006	0.004	0.16	0.3	
	19 ～ 20	24.3	98	NW	0.4	0.005	0.003	0.16	0.3	
	20 ～ 21	24.1	98	W	0.3	0.005	0.003	0.18	0.3	
	21 ～ 22	24.0	98	W	0.3	0.006	0.003	0.17	0.3	
	22 ～ 23	24.2	98	SSW	0.2	0.005	0.003	0.16	0.3	
	23 ～ 24	24.2	98	S	0.2	0.005	0.003	0.16	0.2	
	00 ～ 01	23.8	98	W	0.3	0.004	0.002	0.16	0.2	
	01 ～ 02	23.4	98	NNW	0.2	0.006	0.003	0.16	0.2	
	02 ～ 03	23.1	98	NW	0.4	0.005	0.003	0.17	0.2	
	03 ～ 04	22.9	98	WNW	0.3	0.005	0.003	0.16	0.3	
	04 ～ 05	22.7	98	S	0.2	0.007	0.003	0.17	0.3	
	05 ～ 06	22.6	98	W	0.4	0.009	0.005	0.17	0.3	
	06 ～ 07	22.8	98	W	0.3	0.005	0.003	0.18	0.3	
	07 ～ 08	24.3	98	S	0.2	0.009	0.003	0.18	0.3	
	08 ～ 09	25.7	91	ESE	0.9	0.013	0.005	0.19	0.3	
	09 ～ 10	27.7	82	NE	0.2	0.009	0.004	0.25	0.3	
	10 ～ 11	27.7	83	NW	0.3	0.009	0.005	0.28	0.4	
	11 ～ 12	27.5	86	NW	0.5	0.007	0.003	0.19	0.3	
	12 ～ 13	28.1	85	NW	0.4	0.008	0.004	0.16	0.2	
	13 ～ 14	27.1	89	NW	0.7	0.008	0.005	0.15	0.2	
最小值		22.6	82	----	0.2	0.004	0.002	0.15	0.2	
最大值		28.1	98	NW	0.9	0.013	0.006	0.28	0.4	
平均值		24.8	94	----	0.3	0.007	0.004	0.18	0.3	
標準偏差		1.7	5	----	0.2	0.002	0.001	0.03	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附錄 IV.2-37 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年4月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月19日（晴）至101年4月20日（晴）	14 ～ 15	26.1	82	WNW	0.2	0.011	0.008	0.16	0.3	
	15 ～ 16	26.1	83	NNW	0.2	0.010	0.008	0.16	0.3	
	16 ～ 17	25.0	88	WNW	0.4	0.011	0.007	0.19	0.4	
	17 ～ 18	24.5	91	NW	0.2	0.009	0.008	0.19	0.3	
	18 ～ 19	23.7	96	WNW	0.3	0.007	0.005	0.19	0.3	
	19 ～ 20	23.4	98	WNW	0.2	0.007	0.006	0.19	0.3	
	20 ～ 21	23.6	98	E	0.4	0.008	0.006	0.18	0.3	
	21 ～ 22	23.4	98	N	0.2	0.007	0.006	0.18	0.3	
	22 ～ 23	23.0	98	W	0.2	0.005	0.004	0.19	0.3	
	23 ～ 24	22.7	98	WSW	0.2	0.005	0.004	0.19	0.3	
	00 ～ 01	22.3	98	WSW	0.2	0.005	0.004	0.19	0.3	
	01 ～ 02	22.1	98	SW	0.3	0.005	0.004	0.19	0.3	
	02 ～ 03	22.1	98	WSW	0.2	0.006	0.004	0.18	0.3	
	03 ～ 04	22.2	98	SW	0.2	0.005	0.004	0.18	0.3	
	04 ～ 05	22.4	98	WSW	0.2	0.005	0.004	0.18	0.3	
	05 ～ 06	22.5	98	SW	0.2	0.011	0.005	0.18	0.3	
	06 ～ 07	22.6	98	NW	0.2	0.006	0.004	0.18	0.3	
	07 ～ 08	23.1	98	N	0.2	0.009	0.007	0.19	0.3	
	08 ～ 09	23.8	98	ESE	0.5	0.011	0.008	0.18	0.3	
	09 ～ 10	24.9	95	ESE	0.5	0.011	0.008	0.17	0.3	
	10 ～ 11	24.6	92	ESE	0.8	0.011	0.008	0.16	0.3	
	11 ～ 12	24.6	92	ESE	0.6	0.009	0.006	0.17	0.3	
	12 ～ 13	24.7	90	ESE	0.2	0.009	0.006	0.16	0.3	
	13 ～ 14	24.5	91	SE	0.2	0.009	0.007	0.17	0.3	
最小值		22.1	82	----	0.2	0.005	0.004	0.16	0.3	
最大值		26.1	98	ESE	0.8	0.011	0.008	0.19	0.4	
平均值		23.7	95	----	0.3	0.008	0.006	0.18	0.3	
標準偏差		1.2	5	----	0.2	0.002	0.002	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向

2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附錄 IV.2-40 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年5月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月9日（陰）至101年5月10日（陰）	17 ～ 18	22.1	97	NNW	1.3	0.008	0.006	0.13	0.2	
	18 ～ 19	22.2	97	NW	0.3	0.007	0.004	0.15	0.2	
	19 ～ 20	22.4	96	WNW	0.3	0.004	0.002	0.14	0.2	
	20 ～ 21	22.6	95	W	0.4	0.004	0.002	0.13	0.1	
	21 ～ 22	22.7	93	WNW	0.5	0.003	0.002	0.12	0.1	
	22 ～ 23	22.7	93	NW	0.4	0.003	0.002	0.12	0.1	
	23 ～ 24	22.9	92	NNW	0.8	0.006	0.003	0.12	0.1	
	00 ～ 01	23.1	88	NNW	0.8	0.005	0.002	0.12	0.1	
	01 ～ 02	23.2	87	NNW	1.6	0.005	0.003	0.12	0.1	
	02 ～ 03	23.2	86	NNW	1.1	0.007	0.004	0.12	0.1	
	03 ～ 04	23.1	87	NNW	1.0	0.010	0.007	0.12	0.1	
	04 ～ 05	22.8	90	NNW	0.7	0.015	0.010	0.12	0.1	
	05 ～ 06	22.6	94	NNW	0.9	0.015	0.011	0.11	0.1	
	06 ～ 07	23.1	92	NNW	0.5	0.014	0.010	0.11	0.1	
	07 ～ 08	23.6	89	NNW	1.3	0.012	0.008	0.12	0.1	
	08 ～ 09	24.0	86	NNW	1.3	0.009	0.006	0.12	0.1	
	09 ～ 10	24.3	83	NNW	1.7	0.010	0.007	0.12	0.1	
	10 ～ 11	24.3	86	NNW	2.2	0.010	0.006	0.12	0.1	
	11 ～ 12	24.1	84	NNW	1.7	0.011	0.007	0.12	0.2	
	12 ～ 13	24.0	84	NNW	1.5	0.010	0.006	0.12	0.1	
	13 ～ 14	23.6	86	NNW	1.8	0.010	0.006	0.12	0.1	
	14 ～ 15	23.5	86	NNW	1.4	0.010	0.006	0.12	0.2	
	15 ～ 16	23.1	87	NNW	1.0	0.009	0.005	0.12	0.2	
	16 ～ 17	22.9	87	NNW	1.7	0.009	0.005	0.13	0.2	
最小值		22.1	83	----	0.3	0.003	0.002	0.11	0.1	
最大值		24.3	97	NNW	2.2	0.015	0.011	0.15	0.2	
平均值		23.2	89	----	1.1	0.009	0.005	0.12	0.1	
標準偏差		0.6	4	----	0.5	0.004	0.003	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

報告專用章 環境監測股份有限公司 台北市中正路788號5樓之4 TEL:(02)7731-3232

附-IV.2-40

附錄 IV.2-39 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年4月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年4月21日（晴）至101年4月22日（晴）	14 ～ 15	27.2	85	NW	0.5	0.007	0.004	0.17	0.2	
	15 ～ 16	26.1	89	SE	0.2	0.006	0.004	0.16	0.2	
	16 ～ 17	25.4	94	SSE	0.3	0.005	0.003	0.18	0.3	
	17 ～ 18	25.1	90	SSE	0.5	0.006	0.004	0.21	0.3	
	18 ～ 19	25.2	81	SSE	0.8	0.006	0.004	0.22	0.3	
	19 ～ 20	24.3	87	SSW	0.3	0.006	0.004	0.23	0.4	
	20 ～ 21	24.4	84	S	0.4	0.006	0.005	0.23	0.4	
	21 ～ 22	24.3	84	SSE	0.4	0.007	0.005	0.21	0.4	
	22 ～ 23	23.6	90	WNW	0.3	0.006	0.004	0.21	0.4	
	23 ～ 24	23.2	93	NW	0.5	0.005	0.003	0.19	0.4	
	00 ～ 01	22.6	95	WNW	1.0	0.005	0.003	0.21	0.5	
	01 ～ 02	21.4	96	WNW	1.4	0.005	0.003	0.23	0.6	
	02 ～ 03	20.1	95	NW	1.6	0.005	0.003	0.24	0.6	
	03 ～ 04	19.3	96	WNW	0.3	0.006	0.004	0.22	0.5	
	04 ～ 05	19.8	97	NNW	0.2	0.014	0.011	0.22	0.5	
	05 ～ 06	19.5	98	NW	0.4	0.006	0.004	0.21	0.5	
	06 ～ 07	19.7	98	E	0.3	0.008	0.006	0.21	0.5	
	07 ～ 08	20.7	93	NNW	0.2	0.008	0.006	0.20	0.5	
	08 ～ 09	21.2	88	NNE	0.2	0.010	0.007	0.20	0.5	
	09 ～ 10	22.6	81	NW	0.3	0.008	0.005	0.20	0.4	
	10 ～ 11	24.0	74	WSW	0.2	0.006	0.004	0.20	0.4	
	11 ～ 12	24.8	72	ESE	0.2	0.007	0.004	0.19	0.4	
	12 ～ 13	24.1	70	NE	0.2	0.007	0.004	0.19	0.4	
	13 ～ 14	25.3	64	ESE	0.4	0.007	0.004	0.19	0.4	
最小值		19.3	64	----	0.2	0.005	0.003	0.16	0.2	
最大值		27.2	98	NW	1.6	0.014	0.011	0.24	0.6	
平均值		23.1	87	----	0.5	0.007	0.005	0.21	0.4	
標準偏差		2.3	10	----	0.4	0.002	0.002	0.02	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-39

附錄 IV.2-42 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年5月第3日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月11日（陰）至101年5月12日（陰）	17 ～ 18	23.5	90	ESE	0.3	0.015	0.011	0.17	0.3	
	18 ～ 19	23.1	92	SSW	0.7	0.004	0.002	0.15	0.3	
	19 ～ 20	23.0	94	SW	0.4	0.005	0.003	0.14	0.3	
	20 ～ 21	23.2	94	S	0.2	0.009	0.007	0.14	0.3	
	21 ～ 22	23.0	96	S	0.2	0.009	0.007	0.14	0.3	
	22 ～ 23	23.2	96	SE	0.2	0.006	0.004	0.13	0.3	
	23 ～ 24	23.0	95	SW	0.3	0.004	0.002	0.13	0.3	
	00 ～ 01	23.1	95	SW	0.3	0.004	0.002	0.13	0.3	
	01 ～ 02	23.2	95	SSW	0.3	0.005	0.003	0.13	0.3	
	02 ～ 03	23.1	95	SW	0.4	0.006	0.003	0.13	0.3	
	03 ～ 04	23.0	96	WSW	0.2	0.005	0.002	0.12	0.3	
	04 ～ 05	23.3	96	SW	0.4	0.005	0.003	0.13	0.3	
	05 ～ 06	23.6	96	SE	0.3	0.015	0.011	0.12	0.3	
	06 ～ 07	23.7	96	ESE	0.8	0.019	0.012	0.12	0.3	
	07 ～ 08	24.0	96	ESE	0.8	0.014	0.009	0.12	0.3	
	08 ～ 09	24.1	95	ESE	0.9	0.013	0.007	0.12	0.3	
	09 ～ 10	24.6	94	S	0.2	0.010	0.006	0.12	0.3	
	10 ～ 11	24.7	93	E	0.6	0.017	0.010	0.13	0.3	
	11 ～ 12	24.8	94	SSW	0.2	0.010	0.006	0.12	0.3	
	12 ～ 13	24.6	94	ESE	0.7	0.017	0.010	0.13	0.3	
	13 ～ 14	24.7	94	ESE	1.5	0.016	0.008	0.13	0.3	
	14 ～ 15	25.1	91	ESE	1.1	0.013	0.007	0.13	0.3	
	15 ～ 16	24.9	91	ESE	1.1	0.012	0.007	0.13	0.3	
	16 ～ 17	24.5	93	E	1.3	0.007	0.004	0.12	0.3	
最小值		23.0	90	----	0.2	0.004	0.002	0.12	0.3	
最大值		25.1	96	ESE	1.5	0.019	0.012	0.17	0.3	
平均值		23.8	94	----	0.6	0.010	0.006	0.13	0.3	
標準偏差		0.7	2	----	0.4	0.005	0.003	0.01	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

電話:(02)7731-3229 報告專用 公司章 地址:台北市中正路738號5樓之1

附-IV.2-42

附錄 IV.2-41 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年5月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 方位	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年5月10日（陰）至101年5月11日（陰）	17 ～ 18	22.5	88	NNW	2.0	0.007	0.004	0.12	0.2	
	18 ～ 19	22.1	93	NNW	2.0	0.005	0.003	0.11	0.1	
	19 ～ 20	21.7	95	NNW	1.7	0.006	0.003	0.11	0.1	
	20 ～ 21	21.8	95	NNW	0.9	0.006	0.004	0.11	0.2	
	21 ～ 22	21.6	95	WNW	0.3	0.007	0.004	0.11	0.2	
	22 ～ 23	22.0	94	NNW	0.2	0.006	0.003	0.11	0.2	
	23 ～ 24	21.9	93	S	0.2	0.007	0.004	0.11	0.2	
	00 ～ 01	21.5	93	NNW	0.2	0.007	0.004	0.11	0.2	
	01 ～ 02	20.9	95	SW	0.2	0.005	0.003	0.12	0.2	
	02 ～ 03	21.2	96	NW	0.2	0.009	0.006	0.12	0.2	
	03 ～ 04	20.9	97	SW	0.3	0.004	0.002	0.12	0.2	
	04 ～ 05	21.0	98	SSW	0.2	0.004	0.002	0.12	0.2	
	05 ～ 06	21.1	98	SSW	0.3	0.003	0.002	0.12	0.2	
	06 ～ 07	21.3	98	SW	0.2	0.005	0.002	0.12	0.2	
	07 ～ 08	21.9	98	ESE	0.2	0.015	0.010	0.14	0.2	
	08 ～ 09	22.4	98	SSW	0.2	0.009	0.006	0.13	0.1	
	09 ～ 10	23.7	95	NW	0.2	0.008	0.005	0.13	0.2	
	10 ～ 11	24.1	87	ESE	0.2	0.011	0.007	0.13	0.3	
	11 ～ 12	24.0	85	SW	0.2	0.006	0.002	0.12	0.4	
	12 ～ 13	25.2	78	ENE	0.2	0.010	0.005	0.13	0.4	
	13 ～ 14	25.1	81	NNW	0.2	0.014	0.010	0.13	0.4	
	14 ～ 15	24.1	87	ENE	0.7	0.013	0.009	0.12	0.3	
	15 ～ 16	23.6	92	E	0.9	0.013	0.009	0.16	0.2	
	16 ～ 17	23.8	89	ESE	0.8	0.014	0.010	0.18	0.3	
最小值		20.9	78	----	0.2	0.003	0.002	0.11	0.1	
最大值		25.2	98	NNW	2.0	0.015	0.010	0.18	0.4	
平均值		22.5	92	----	0.5	0.008	0.005	0.12	0.2	
標準偏差		1.4	6	----	0.6	0.004	0.003	0.02	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-41

附錄 IV.2-44 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年6月第2日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月7日（晴）至101年6月8日（晴）	17 ～ 18	30.5	80	S	0.2	0.006	0.005	0.21	0.3	
	18 ～ 19	29.1	88	NW	0.2	0.005	0.004	0.20	0.3	
	19 ～ 20	28.2	92	NNW	0.2	0.008	0.007	0.22	0.3	
	20 ～ 21	27.6	94	W	0.2	0.007	0.006	0.23	0.3	
	21 ～ 22	27.2	97	W	0.3	0.005	0.004	0.22	0.3	
	22 ～ 23	26.7	98	WSW	0.3	0.006	0.005	0.24	0.3	
	23 ～ 24	26.5	98	W	0.4	0.005	0.004	0.24	0.3	
	00 ～ 01	26.2	98	WSW	0.5	0.005	0.004	0.24	0.3	
	01 ～ 02	26.5	98	W	0.4	0.005	0.004	0.24	0.3	
	02 ～ 03	26.2	98	NNW	0.2	0.005	0.004	0.24	0.3	
	03 ～ 04	26.0	98	SW	0.3	0.007	0.006	0.26	0.4	
	04 ～ 05	26.1	98	WSW	0.5	0.006	0.005	0.29	0.4	
	05 ～ 06	26.3	98	SW	0.5	0.007	0.006	0.34	0.5	
	06 ～ 07	27.2	97	S	0.3	0.011	0.009	0.36	0.5	
	07 ～ 08	29.5	86	SE	0.4	0.017	0.015	0.41	0.5	
	08 ～ 09	29.2	86	W	0.3	0.012	0.011	0.38	0.5	
	09 ～ 10	30.2	83	WNW	0.3	0.009	0.008	0.31	0.4	
	10 ～ 11	31.1	79	WNW	0.2	0.010	0.008	0.26	0.4	
	11 ～ 12	31.3	78	S	0.2	0.010	0.009	0.29	0.4	
	12 ～ 13	32.1	75	WNW	0.3	0.008	0.007	0.52	0.4	
	13 ～ 14	32.1	73	SSW	0.2	0.007	0.006	0.37	0.4	
	14 ～ 15	31.9	74	SSE	0.2	0.007	0.006	0.29	0.4	
	15 ～ 16	30.6	79	SE	0.2	0.007	0.006	0.23	0.4	
	16 ～ 17	29.6	86	SW	0.4	0.007	0.006	0.19	0.3	
最小值		26.0	73	----	0.2	0.005	0.004	0.19	0.3	
最大值		32.1	98	W	0.5	0.017	0.015	0.52	0.5	
平均值		28.7	89	----	0.3	0.008	0.006	0.28	0.4	
標準偏差		2.2	9	----	0.1	0.003	0.003	0.08	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-44

附錄 IV.2-43 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年6月第1日)

日期	項目 / 時間	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月6日（晴）至101年6月7日（晴）	17 ～ 18	27.8	83	ESE	1.0	0.010	0.009	0.26	0.5	
	18 ～ 19	27.4	86	ESE	0.7	0.008	0.007	0.26	0.4	
	19 ～ 20	26.8	90	ESE	0.7	0.009	0.008	0.26	0.4	
	20 ～ 21	26.4	93	NW	0.2	0.008	0.006	0.26	0.4	
	21 ～ 22	26.1	95	ESE	0.2	0.007	0.005	0.26	0.4	
	22 ～ 23	26.7	90	SSW	0.2	0.005	0.004	0.24	0.4	
	23 ～ 24	26.6	89	SSW	0.4	0.006	0.005	0.24	0.4	
	00 ～ 01	27.5	81	SSE	0.8	0.006	0.005	0.22	0.4	
	01 ～ 02	27.7	80	SW	0.5	0.006	0.005	0.23	0.4	
	02 ～ 03	26.7	85	W	0.3	0.007	0.006	0.24	0.4	
	03 ～ 04	25.6	91	WNW	0.2	0.008	0.007	0.25	0.4	
	04 ～ 05	24.7	96	NNW	0.2	0.008	0.007	0.26	0.4	
	05 ～ 06	24.5	98	SW	0.3	0.007	0.005	0.26	0.4	
	06 ～ 07	25.9	94	SW	0.2	0.007	0.006	0.27	0.4	
	07 ～ 08	28.5	84	NNW	0.2	0.010	0.009	0.31	0.5	
	08 ～ 09	30.0	76	ESE	0.2	0.014	0.012	0.31	0.5	
	09 ～ 10	32.5	66	SE	0.2	0.012	0.011	0.28	0.5	
	10 ～ 11	31.3	72	SSE	0.3	0.011	0.010	0.26	0.4	
	11 ～ 12	30.4	78	SE	0.4	0.011	0.010	0.23	0.4	
	12 ～ 13	32.4	68	S	0.4	0.007	0.006	0.25	0.4	
	13 ～ 14	32.6	67	SE	1.2	0.008	0.007	0.26	0.4	
	14 ～ 15	32.6	70	SSE	0.6	0.007	0.005	0.24	0.4	
	15 ～ 16	31.9	74	SSE	0.6	0.006	0.004	0.23	0.4	
	16 ～ 17	31.7	74	SSE	0.4	0.005	0.004	0.22	0.4	
最小值		24.5	66	----	0.2	0.005	0.004	0.22	0.4	
最大值		32.6	98	ESE	1.2	0.014	0.012	0.31	0.5	
平均值		28.5	83	----	0.4	0.008	0.007	0.26	0.4	
標準偏差		2.7	10	----	0.3	0.002	0.002	0.02	0.0	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-43

附錄 IV.2-45 貢寮焚化廠入口旁之民宅空氣品質逐時監測結果

(101年6月第3日)

日期	時間＼項目	溫度 ℃	濕度 %	風向 DEG	風速 m/s	NO_x ppm	NO_2 ppm	NMHC ppm	CO ppm	備註
101年6月8日（晴）至101年6月9日（晴）	17 ~ 18	27.3	93	WSW	0.3	0.006	0.005	0.17	0.3	
	18 ~ 19	26.6	94	WNW	0.2	0.005	0.004	0.16	0.2	
	19 ~ 20	26.1	97	SW	0.3	0.005	0.004	0.17	0.2	
	20 ~ 21	25.9	98	WSW	0.2	0.006	0.004	0.17	0.2	
	21 ~ 22	26.0	98	SSW	0.3	0.006	0.005	0.18	0.3	
	22 ~ 23	25.8	98	SSW	0.5	0.005	0.004	0.19	0.3	
	23 ~ 24	25.7	98	SW	0.3	0.006	0.005	0.19	0.3	
	00 ~ 01	25.7	98	SSW	0.4	0.006	0.004	0.19	0.3	
	01 ~ 02	25.8	98	SSW	0.2	0.007	0.005	0.19	0.3	
	02 ~ 03	25.7	98	W	0.6	0.006	0.005	0.20	0.3	
	03 ~ 04	25.9	98	W	0.4	0.006	0.005	0.20	0.3	
	04 ~ 05	25.4	98	WSW	0.3	0.007	0.005	0.21	0.3	
	05 ~ 06	25.7	98	S	0.6	0.010	0.007	0.26	0.4	
	06 ~ 07	26.6	98	SSW	0.6	0.013	0.007	0.28	0.4	
	07 ~ 08	28.4	93	SSW	0.2	0.012	0.007	0.28	0.4	
	08 ~ 09	30.8	80	SSE	0.2	0.014	0.008	0.25	0.4	
	09 ~ 10	31.2	78	NW	0.2	0.012	0.009	0.22	0.4	
	10 ~ 11	31.5	77	NNW	0.2	0.011	0.008	0.19	0.3	
	11 ~ 12	32.5	75	SE	0.2	0.011	0.008	0.18	0.3	
	12 ~ 13	32.5	77	NNW	0.2	0.008	0.006	0.15	0.3	
	13 ~ 14	29.6	86	NW	0.3	0.010	0.008	0.17	0.4	
	14 ~ 15	29.9	86	S	0.2	0.008	0.007	0.18	0.4	
	15 ~ 16	30.0	86	W	0.3	0.007	0.006	0.19	0.4	
	16 ~ 17	29.9	87	W	0.4	0.007	0.005	0.20	0.4	
最小值		25.4	75	-----	0.2	0.005	0.004	0.15	0.2	
最大值		32.5	98	SSW	0.6	0.014	0.009	0.28	0.4	
平均值		27.9	91	----	0.3	0.008	0.006	0.20	0.3	
標準偏差		2.5	8	----	0.1	0.003	0.002	0.04	0.1	

1. "ㄅ"表校正時間　3. "ㄇ"表儀器損壞　5. 風向之最大值表最頻風向
2. "ㄆ"表非監測時段　4. "ㄈ"表電源中斷

附-IV.2-45

附錄 IV.2-46 空氣品質監測101年4月一氧化碳8小時監測結果

時間＼項目	貢寮國小				福隆海水浴場				川湯養殖池				石碇宮					
	4/5	4/6	4/7	4/8	4/27	4/28	4/29	4/30	4/2	4/3	4/4	4/5	4/5	4/6	4/7	4/8	4/19	4/20	4/21	4/22
00 ~ 08	ㄆ	0.3	0.3	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.1	0.1	0.1	ㄆ	0.2	0.2	0.1	ㄆ	0.3	0.3	0.5
01 ~ 09	ㄆ	0.3	0.3	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.1	0.1	0.1	ㄆ	0.2	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	0.5
02 ~ 10	ㄆ	0.3	0.3	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.1	0.1	0.1	ㄆ	0.2	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	0.5
03 ~ 11	ㄆ	0.3	0.3	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.1	0.1	0.1	ㄆ	0.2	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	0.5
04 ~ 12	ㄆ	0.3	0.3	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.1	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	0.5
05 ~ 13	ㄆ	0.3	0.3	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.1	0.1	ㄆ	ㄆ	0.3	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	0.4
06 ~ 14	ㄆ	0.3	0.2	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.1	0.1	ㄆ	ㄆ	0.3	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	0.4
07 ~ 15	ㄆ	0.4	0.2	0.2	ㄆ	0.4	0.3	0.3	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.3	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
08 ~ 16	ㄆ	0.4	0.2	0.2	ㄆ	0.4	0.3	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.4	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
09 ~ 17	ㄆ	0.4	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.3	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.4	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
10 ~ 18	ㄆ	0.4	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.3	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.4	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
11 ~ 19	ㄆ	0.5	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.4	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
12 ~ 20	ㄆ	0.5	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.3	0.1	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
13 ~ 21	ㄆ	0.5	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.3	0.2	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
14 ~ 22	ㄆ	0.5	0.2	ㄆ	ㄆ	0.5	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.3	0.2	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
15 ~ 23	0.3	0.5	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.1	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
16 ~ 24	0.3	0.4	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
17 ~ 01	0.3	0.4	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
18 ~ 02	0.3	0.4	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
19 ~ 03	0.3	0.4	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.4	ㄆ	ㄆ	0.2	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
20 ~ 04	0.3	0.3	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.3	ㄆ	ㄆ	0.1	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.2	ㄆ
21 ~ 05	0.3	0.3	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.3	ㄆ	ㄆ	0.1	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.2	ㄆ
22 ~ 06	0.3	0.3	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.3	ㄆ	ㄆ	0.1	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.2	ㄆ
23 ~ 07	0.3	0.3	0.2	ㄆ	ㄆ	0.4	0.3	ㄆ	ㄆ	0.1	0.1	ㄆ	ㄆ	0.2	0.2	0.2	ㄆ	0.3	0.3	ㄆ
最大值	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.5

1. "ㄅ"表校正時間
2. "ㄆ"表非監測時段
3. "ㄇ"表儀器損壞
4. "ㄈ"表電源中斷

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8232

附錄 IV.2-47 空氣品質監測101年5月一氧化碳8小時監測結果

項目 / 時間	貢寮國小				福隆海水浴場				川島養殖池				石碇宮				貢寮焚化廠入口旁之民宅			
	5/3	5/4	5/5	5/6	5/24	5/25	5/26	5/27	5/6	5/7	5/8	5/9	5/2	5/3	5/4	5/5	5/9	5/10	5/11	5/12
00 ～ 08	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3
01 ～ 09	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3
02 ～ 10	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3
03 ～ 11	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3
04 ～ 12	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.1	0.2	0.3
05 ～ 13	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.1	0.2	0.3
06 ～ 14	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.1	0.3	0.3
07 ～ 15	夂	0.3	0.4	0.4	夂	0.3	0.2	夂	夂	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.1	0.3	0.3
08 ～ 16	夂	0.3	0.4	夂	夂	0.3	0.2	夂	夂	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	0.2	夂	0.1	0.3	0.3
09 ～ 17	夂	0.3	0.4	夂	夂	0.3	0.2	夂	夂	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	0.2	夂	0.1	0.3	0.3
10 ～ 18	夂	0.4	0.4	夂	夂	0.3	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	夂	夂	0.1	0.3	夂
11 ～ 19	夂	0.4	0.4	夂	夂	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	夂	夂	0.1	0.3	夂
12 ～ 20	夂	0.4	0.4	夂	夂	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	夂	夂	0.1	0.3	夂
13 ～ 21	夂	0.4	0.4	夂	夂	0.3	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	夂	夂	0.1	0.3	夂
14 ～ 22	夂	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	夂	夂	0.1	0.3	夂
15 ～ 23	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.4	夂	夂	0.1	0.3	夂
16 ～ 24	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	夂	夂	0.1	0.3	夂
17 ～ 01	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.3	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.3	夂	0.1	0.1	0.3	夂
18 ～ 02	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.3	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.1	0.3	夂
19 ～ 03	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.3	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3	夂
20 ～ 04	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3	夂
21 ～ 05	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3	夂
22 ～ 06	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3	夂
23 ～ 07	0.3	0.4	0.4	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.1	0.2	0.3	夂
最大值	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3

1. "ㄅ"表校正時間
2. "夂"表非監測時段
3. "ㄇ"儀器損壞
4. "ㄈ"電源中斷

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之2

附錄 IV.2-48 空氣品質監測101年6月一氧化碳8小時監測結果

項目 / 時間	貢寮國小				福隆海水浴場				川島養殖池				石碇宮				貢寮焚化廠入口旁之民宅			
	6/27	6/28	6/29	6/30	6/23	6/24	6/25	6/26	6/22	6/23	6/24	6/25	6/27	6/28	6/29	6/30	6/06	6/07	6/08	6/09
00 ～ 08	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.3
01 ～ 09	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.4
02 ～ 10	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.4
03 ～ 11	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.5	0.4
04 ～ 12	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.5	0.4
05 ～ 13	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.5	0.4
06 ～ 14	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.4
07 ～ 15	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.2	0.3	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.4
08 ～ 16	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.2	夂	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.3
09 ～ 17	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.2	夂	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.3
10 ～ 18	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.4	0.4	夂
11 ～ 19	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.4	0.3	夂
12 ～ 20	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.4	0.3	夂
13 ～ 21	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.3	夂
14 ～ 22	夂	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.3	夂
15 ～ 23	夂	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.2	夂	夂	0.3	0.3	夂
16 ～ 24	夂	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	夂	0.2	0.1	夂	夂	0.3	0.3	夂
17 ～ 01	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.1	夂	0.4	0.3	0.3	夂
18 ～ 02	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	0.4	0.3	0.3	夂
19 ～ 03	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.3	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	0.4	0.3	0.3	夂
20 ～ 04	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	0.4	0.3	0.3	夂
21 ～ 05	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	0.4	0.3	0.3	夂
22 ～ 06	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.1	夂	0.4	0.4	0.3	夂
23 ～ 07	0.2	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.2	0.2	夂	0.2	0.2	0.2	夂	0.4	0.4	0.3	夂
最大值	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4

1. "ㄅ"表校正時間
2. "夂"表非監測時段
3. "ㄇ"儀器損壞
4. "ㄈ"電源中斷

附錄IV.2-50 空氣品質監測總懸浮微粒監測結果(101年5月)

項目	測站	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
第1天	初重(W1)	3.5132	3.4832	3.4605	3.4561	3.4654
	末重(W2)	3.5411	3.5433	3.5303	3.5217	3.5105
	初流量(l/min)	1320	1320	1290	1290	1200
	末流量(l/min)	1300	1300	1280	1280	1190
	時間起	14:50	14:00	09:50	16:35	16:50
	時間迄	14:50	14:00	09:50	16:35	16:50
	天候	陰	晴	晴	陰	陰
	總採氣量(l)	1886400	1886400	1850400	1850400	1720800
	濃度($\mu g/m^3$)	15	32	38	35	26
第2天	初重(W1)	3.5094	3.4766	3.4594	3.4496	3.4798
	末重(W2)	3.5866	3.5891	3.5304	3.5040	3.5236
	初流量(l/min)	1320	1320	1290	1290	1290
	末流量(l/min)	1300	1300	1280	1280	1280
	時間起	15:00	14:10	10:00	16:50	17:05
	時間迄	15:00	14:10	10:00	16:50	17:05
	天候	陰轉晴	晴	晴	陰	陰
	總採氣量(l)	1886400	1886400	1850400	1850400	1850400
	濃度($\mu g/m^3$)	41	60	38	29	24
第3天	初重(W1)	3.5005	3.4677	3.4634	3.4523	3.4784
	末重(W2)	3.5882	3.5641	3.5088	3.5647	3.5073
	初流量(l/min)	1320	1320	1290	1290	1290
	末流量(l/min)	1300	1300	1280	1280	1280
	時間起	15:10	14:20	10:10	17:00	17:15
	時間迄	15:10	14:20	10:10	17:00	17:15
	天候	晴	晴轉陰	晴轉陰	陰轉晴	陰
	總採氣量(l)	1886400	1886400	1850400	1850400	1850400
	濃度($\mu g/m^3$)	46	51	25	61	16

備註
1.初重(W1),末重(W2)單位為公克重
2.總採氣量(l):採樣時間(min)×平均流量(l/min)
3.濃度($\mu g/m^3$)：$\frac{\text{末重(W2)}-\text{初重(W1)}}{\text{總採氣量(l)}} \times 10^9$

附-IV.2-50

附錄IV.2-49 空氣品質監測總懸浮微粒監測結果(101年4月)

項目	測站	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
第1天	初重(W1)	3.5123	3.4601	3.5649	3.5476	3.4844
	末重(W2)	3.5640	3.4962	3.6471	3.6482	3.5451
	初流量(l/min)	1310	1310	1230	1230	1310
	末流量(l/min)	1300	1300	1200	1200	1290
	時間起	14:50	14:50	11:00	16:50	14:15
	時間迄	14:50	14:50	11:00	16:50	14:15
	天候	晴轉陰	陰轉晴	晴轉陰	陰	晴
	總採氣量(l)	1879200	1879200	1749600	1749600	1872000
	濃度($\mu g/m^3$)	28	19	47	57	32
第2天	初重(W1)	3.5053	3.4584	3.5675	3.5366	3.4698
	末重(W2)	3.5641	3.4973	3.7191	3.6061	3.5113
	初流量(l/min)	1310	1310	1230	1230	1310
	末流量(l/min)	1300	1300	1200	1200	1290
	時間起	15:00	15:00	11:10	17:00	14:25
	時間迄	15:00	15:00	11:10	17:00	14:25
	天候	陰	晴	陰轉晴	陰	晴
	總採氣量(l)	1879200	1879200	1749600	1749600	1872000
	濃度($\mu g/m^3$)	31	21	87	40	22
第3天	初重(W1)	3.5122	3.4573	3.5566	3.5370	3.4792
	末重(W2)	3.5762	3.4914	3.6484	3.6124	3.5668
	初流量(l/min)	1310	1310	1230	1230	1310
	末流量(l/min)	1300	1300	1200	1200	1290
	時間起	15:10	15:10	11:20	17:10	14:35
	時間迄	15:10	15:10	11:20	17:10	14:35
	天候	陰	晴	晴轉陰	陰	晴
	總採氣量(l)	1879200	1879200	1749600	1749600	1872000
	濃度($\mu g/m^3$)	34	18	52	43	47

備註
1.初重(W1),末重(W2)單位為公克重
2.總採氣量(l):採樣時間(min)×平均流量(l/min)
3.濃度($\mu g/m^3$)：$\frac{\text{末重(W2)}-\text{初重(W1)}}{\text{總採氣量(l)}} \times 10^9$

附-IV.2-49

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232

附錄IV.2-51 空氣品質監測總懸浮微粒監測結果(101年6月)

項目	測站	貢寮國小	福隆海水浴場	川島養殖池	石碇宮	貢寮焚化廠入口旁之民宅
第1天	初重(W1)	3.3542	3.3592	3.3184	3.3482	3.3013
	末重(W2)	3.3941	3.4440	3.3524	3.3862	3.3992
	初流量(l/min)	1260	1310	1290	1290	1300
	末流量(l/min)	1250	1290	1280	1280	1290
	時間起	16:40	14:00	14:40	16:50	16:40
	時間迄	16:40	14:00	14:40	16:50	16:40
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
	總採氣量(l)	1807200	1872000	1850400	1850400	1864800
	濃度($\mu g/m^3$)	22	45	18	21	52
第2天	初重(W1)	3.3553	3.346	3.3249	3.3417	3.3159
	末重(W2)	3.3943	3.4158	3.3660	3.3840	3.3885
	初流量(l/min)	1260	1310	1290	1290	1300
	末流量(l/min)	1250	1290	1280	1280	1290
	時間起	16:50	14:10	14:50	17:00	16:50
	時間迄	16:50	14:10	14:50	17:00	16:50
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
	總採氣量(l)	1807200	1872000	1850400	1850400	1864800
	濃度($\mu g/m^3$)	22	37	22	23	39
第3天	初重(W1)	3.3454	3.3574	3.3391	3.3512	3.3097
	末重(W2)	3.3848	3.4126	3.3872	3.3852	3.3673
	初流量(l/min)	1260	1310	1290	1290	1300
	末流量(l/min)	1250	1290	1280	1280	1290
	時間起	17:00	14:20	15:00	17:10	17:00
	時間迄	17:00	14:20	15:00	17:10	17:00
	天候	晴	晴	晴	晴	晴
	總採氣量(l)	1807200	1872000	1850400	1850400	1864800
	濃度($\mu g/m^3$)	22	29	26	18	31

備註:1.初重(W1),末重(W2)單位為公克重

2.總採氣量(l):採樣時間(min)×平均流量(l/min)

濃度($\mu g/m^3$): $\frac{\text{末重(W2)}-\text{初重(W1)}}{\text{總採氣量(l)}} \times 10^9$

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3202 台北市中正路738號5樓之2

附錄Ⅳ.2-52 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年4月監測結果
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/04/01~2012/04/30
印表日期: 2012/5/9

項目 / 日期	二氧化硫(SO_2)ppb			二氧化氮(NO_2)ppb			氮氧化物(NO_X)ppb			一氧化氮(NO)ppb		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	4.2	4.9	3.4	2.1	3.9	1.1	3.9	5.9	2.9	1.8	2.0	1.7
2	3.6	4.9	0.2	7.9	17.5	2.9	11.5	23.4	4.9	3.5	7.1	1.8
3	4.4	7.8	0.4	8.7	17.8	2.1	14.0	26.4	5.1	5.3	10.6	2.9
4	4.9	5.9	3.2	4.2	9.9	1.8	7.6	14.1	4.9	3.4	4.2	3.0
5	5.7	6.7	4.5	12.5	20.6	5.8	18.9	30.7	10.2	6.3	10.0	3.7
6	6.4	8.0	5.1	9.0	24.2	3.0	13.5	34.8	6.1	4.5	10.5	3.0
7	5.6	6.8	4.3	6.6	20.1	1.7	11.0	28.8	4.8	4.4	8.7	3.2
8	6.0	6.7	4.5	2.8	5.3	1.4	6.0	8.6	4.6	3.2	3.4	3.0
9	5.0	6.8	3.0	4.3	12.1	1.5	7.4	14.9	4.3	3.1	3.6	2.3
10	4.3	5.8	2.4	4.7	13.7	2.0	8.1	20.3	4.3	3.4	6.5	2.3
11	4.7	5.9	3.6	6.0	12.8	2.4	11.9	26.4	4.9	5.9	18.1	2.3
12	4.3	5.1	2.9	7.1	19.7	1.8	12.1	29.1	4.2	5.0	9.5	2.3
13	4.8	6.1	3.4	7.8	13.0	2.0	13.3	22.9	4.5	5.5	11.1	2.4
14	4.3	5.3	2.9	5.8	12.2	2.6	8.5	16.2	4.9	2.7	4.0	2.3
15	5.2	6.2	3.6	9.1	13.1	3.2	13.9	21.3	5.9	4.9	10.5	2.7
16	4.6	6.2	3.6	9.8	14.9	4.0	13.6	19.3	6.7	3.8	5.1	2.6
17	4.5	5.3	3.6	7.5	18.8	2.3	11.4	28.8	4.3	4.0	9.9	2.1
18	5.0	6.5	3.3	8.5	16.3	2.1	14.2	27.3	4.5	5.8	13.0	2.3
19	5.5	6.8	4.0	7.2	17.2	2.4	13.1	41.0	4.8	5.9	23.8	2.1
20	5.8	6.7	4.2	7.3	16.3	2.0	11.5	25.3	4.3	4.2	10.0	2.1
21	6.0	7.3	4.6	7.5	13.8	3.2	12.9	27.6	6.1	5.4	18.1	2.4
22	5.3	6.4	4.2	4.9	10.9	2.1	7.5	14.6	4.3	2.6	4.3	2.1
23	4.8	6.1	3.7	7.1	20.3	2.7	12.3	48.7	4.5	5.2	28.5	0.5
24	3.6	5.3	2.1	8.8	19.0	3.0	12.3	31.4	4.0	3.5	12.5	1.0
25	3.4	4.7	2.1	9.9	17.9	4.3	15.3	27.8	6.1	5.4	12.2	1.5
26	2.6	3.7	2.1	6.2	11.9	2.4	7.6	16.0	3.0	1.4	4.9	0.5
27	2.6	3.1	2.1	11.9	19.1	3.7	15.2	27.6	4.5	3.3	8.9	0.7
28	2.7	3.2	2.1	8.2	13.0	2.7	11.6	23.1	3.6	3.4	10.0	0.8
29	3.1	4.0	2.1	7.8	16.5	4.3	10.5	17.9	5.6	2.7	8.0	1.1
30	3.3	4.3	2.1	6.2	11.4	3.0	9.7	18.1	3.9	3.5	6.8	1.0
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	4.5			7.2			11.3			4.1		
最大值	6.4			12.5			18.9			6.3		
發生日期	6			5			5			5		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-52 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年4月監測結果（續1）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/04/01~2012/04/30
印表日期: 2012/5/9

項目 / 日期	一氧化碳(CO)ppm			總碳氫化合物(THC)ppm			甲烷(CH_4)ppm			非甲烷(NMHC)ppm		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	0.37	0.40	0.34	1.85	2.05	1.37	1.78	1.88	1.35	0.07	0.24	0.02
2	0.51	0.77	0.39	1.94	2.14	1.85	1.83	1.88	1.79	0.11	0.31	0.02
3	0.62	0.81	0.39	2.10	3.32	1.85	1.86	1.93	1.81	0.24	1.44	0.02
4	0.45	0.53	0.39	2.07	2.36	1.88	1.84	1.88	1.81	0.23	0.48	0.02
5	0.55	0.67	0.49	2.46	2.72	1.98	1.84	1.88	1.81	0.61	0.89	0.10
6	0.54	0.71	0.34	2.40	2.75	1.91	1.85	1.90	1.81	0.54	0.89	0.02
7	0.43	0.55	0.39	1.93	2.15	1.78	1.82	1.88	1.76	0.10	0.34	0.02
8	0.46	0.53	0.39	1.92	2.12	1.85	1.82	1.85	1.81	0.10	0.29	0.02
9	0.49	0.62	0.42	1.93	2.12	1.83	1.80	1.83	1.69	0.12	0.32	0.02
10	0.55	0.61	0.52	1.99	2.62	1.81	1.78	1.81	1.76	0.21	0.84	0.03
11	0.57	0.68	0.51	2.25	2.56	2.03	1.77	1.83	1.71	0.48	0.80	0.27
12	0.58	0.67	0.48	2.22	2.67	1.90	1.75	1.81	1.71	0.47	0.89	0.09
13	0.62	0.75	0.56	2.05	2.32	1.85	1.79	1.85	1.76	0.26	0.50	0.05
14	0.64	0.71	0.58	2.01	2.27	1.83	1.82	1.86	1.78	0.19	0.43	0.02
15	0.68	0.78	0.61	2.02	2.22	1.83	1.82	1.85	1.76	0.20	0.44	0.03
16	0.61	0.68	0.55	2.17	2.41	1.95	1.81	1.86	1.76	0.36	0.63	0.15
17	0.52	0.55	0.43	2.11	2.53	1.86	1.80	1.85	1.78	0.31	0.74	0.02
18	0.57	0.70	0.49	2.15	2.75	1.79	1.78	1.81	1.68	0.36	0.99	0.02
19	0.59	0.71	0.55	2.01	2.41	1.85	1.78	1.83	1.71	0.23	0.60	0.02
20	0.56	0.67	0.52	2.23	2.53	1.85	1.76	1.83	1.68	0.47	0.80	0.05
21	0.56	0.67	0.49	1.95	2.31	1.81	1.74	1.81	1.64	0.20	0.53	0.03
22	0.64	0.81	0.53	2.04	2.38	1.85	1.83	1.90	1.79	0.21	0.53	0.02
23	0.70	0.84	0.61	2.21	2.53	1.90	1.82	1.86	1.76	0.39	0.70	0.05
24	0.69	0.86	0.56	2.14	2.50	1.95	1.77	1.83	1.62	0.37	0.67	0.17
25	0.63	0.77	0.55	2.09	2.39	1.90	1.74	1.85	1.71	0.35	0.68	0.17
26	0.74	1.12	0.58	2.06	2.24	1.85	1.82	1.86	1.74	0.24	0.43	0.03
27	0.71	0.83	0.64	2.15	2.31	2.00	1.81	1.85	1.78	0.33	0.50	0.17
28	0.68	0.78	0.61	1.93	2.15	1.81	1.79	1.81	1.78	0.13	0.34	0.02
29	0.61	0.71	0.53	1.88	2.02	1.78	1.76	1.81	1.73	0.12	0.24	0.03
30	0.55	0.67	0.49	2.05	2.41	1.81	1.73	1.76	1.69	0.32	0.67	0.09
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	0.58			2.08			1.80			0.28		
最大值	0.74			2.46			1.86			0.61		
發生日期	26			5			3			5		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-52 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年4月監測結果（續2）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/04/01~2012/04/30
印表日期: 2012/5/9

項目 / 日期	總懸浮微粒(TSP) μg/m³		懸浮微粒(PM_{10}) μg/m³		懸浮微粒($PM_{2.5}$) μg/m³		臭氧(O_3)ppb			風速	風向
	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	每日平均值
1	127.4	155.1	89.6	117.2	----	----	59.4	62.9	55.0	1.4	東南東
2	71.6	114.0	50.5	75.4	22.9	35.2	42.3	53.7	31.1	0.7	南南西
3	110.4	180.7	----	----	44.5	85.7	53.6	71.3	27.8	1.2	北北西
4	81.0	119.2	----	----	27.0	34.4	55.1	64.7	37.6	1.6	南南東
5	53.7	76.7	----	----	30.1	50.1	27.0	47.5	9.2	0.6	西北西
6	88.2	127.0	----	----	43.2	72.3	15.8	22.3	10.3	0.9	北北西
7	60.7	81.8	----	----	27.3	43.2	25.5	65.0	11.1	1.3	南
8	75.5	90.1	----	----	33.8	49.8	16.7	32.0	7.7	1.5	南南東
9	53.8	108.2	----	----	29.2	69.1	34.7	50.2	16.8	1.1	東南
10	46.9	59.8	----	----	24.7	40.3	39.0	52.7	25.7	1.4	南南東
11	58.6	78.1	----	----	29.3	48.8	32.3	72.2	12.4	0.7	東北
12	50.0	69.4	----	----	25.0	39.6	39.2	62.9	14.4	0.5	西北
13	77.5	98.4	----	----	49.8	60.1	41.8	69.4	15.0	0.7	西北西
14	68.8	98.4	----	----	35.1	61.5	61.1	72.7	42.7	0.8	北
15	64.9	155.1	----	----	40.8	59.8	35.5	54.4	18.5	0.5	西
16	56.1	86.4	33.1	40.5	22.9	40.5	55.0	62.9	36.8	1.0	北
17	63.4	82.3	44.6	56.5	----	----	52.0	65.3	36.3	0.8	北北東
18	43.2	60.6	28.1	35.4	----	----	40.7	62.5	23.4	0.8	西南
19	48.7	64.2	32.1	46.1	----	----	44.2	60.3	16.2	0.6	北北西
20	51.5	62.5	35.2	48.1	----	----	44.9	60.6	24.4	0.7	東
21	43.6	54.2	26.7	42.2	----	----	36.5	60.0	17.1	0.7	西北西
22	70.3	90.1	51.9	67.8	----	----	59.5	76.3	43.0	0.9	東北東
23	55.3	116.2	41.0	74.2	----	----	53.0	70.0	24.5	1.2	南
24	49.6	61.3	33.0	42.8	----	----	36.3	48.9	21.9	1.1	西南
25	53.5	80.1	34.1	57.3	----	----	25.5	45.2	15.6	0.8	西
26	74.7	171.9	57.8	75.6	----	----	60.2	74.2	17.9	1.2	北北東
27	61.3	104.8	44.8	79.7	----	----	46.3	65.0	32.6	0.7	南南西
28	42.2	52.3	26.8	37.3	----	----	40.1	62.9	21.5	0.9	西南
29	42.0	54.7	23.8	37.9	----	----	31.2	42.0	21.5	0.7	西
30	40.2	83.0	23.0	31.3	19.1	23.9	28.3	46.8	19.1	1.0	西南西
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	62.8		39.8		31.6		41.1			0.9	
最大值	127.4		89.6		49.8		61.1			1.6	南南東
發生日期	1		1		13		14			4	10%
日標準值	250		125								
時標準值											
備註											

附錄Ⅳ.2-53 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年5月監測結果
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/05/01~2012/05/31
印表日期: 2012/6/8

項目 / 日期	二氧化硫(SO_2)ppb			二氧化氮(NO_2)ppb			氮氧化物(NO_X)ppb			一氧化氮(NO)ppb		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	1.6	3.2	0.2	5.7	14.0	2.7	8.6	16.9	3.6	2.8	8.7	0.8
2	1.2	3.2	0.1	5.8	10.0	3.0	8.6	14.7	3.6	2.8	7.8	0.7
3	0.7	1.7	0.1	6.8	18.1	1.7	8.6	24.4	2.4	1.9	7.3	0.7
4	1.5	2.9	0.2	5.7	15.2	2.1	6.9	17.7	2.7	1.2	2.6	0.7
5	2.9	4.3	1.4	7.1	11.2	3.4	9.1	17.5	4.3	2.1	6.8	0.8
6	2.4	3.4	1.1	4.4	12.2	1.7	5.9	16.5	2.3	1.5	5.6	0.5
7	2.8	3.9	1.2	6.4	15.0	2.3	8.6	20.1	2.9	2.3	5.9	0.7
8	3.8	5.5	2.4	7.3	14.7	2.6	9.6	22.8	3.3	2.3	8.0	0.7
9	3.0	5.1	1.2	11.3	20.1	4.8	17.0	46.2	5.8	5.7	27.0	1.0
10	2.1	3.6	0.8	6.0	10.6	1.5	7.5	13.4	2.1	1.5	2.9	0.7
11	2.4	3.4	1.2	6.5	16.2	1.8	8.6	24.5	2.4	2.2	8.9	0.5
12	2.6	4.9	1.4	3.3	10.6	1.0	4.4	16.9	1.5	1.2	6.2	0.5
13	3.1	7.3	1.1	4.0	8.6	1.0	5.3	13.1	1.5	1.3	4.6	0.7
14	2.4	4.6	0.8	6.1	12.2	2.6	8.9	19.3	3.2	2.8	10.2	0.5
15	2.7	7.1	1.2	9.0	15.9	4.9	12.3	27.6	6.1	3.3	13.4	0.7
16	3.6	9.3	0.1	10.3	19.1	3.4	14.7	30.0	4.6	4.3	11.9	1.1
17	2.3	4.6	1.2	11.9	28.8	3.7	16.2	40.1	5.2	4.4	11.2	1.2
18	2.5	7.1	1.0	6.1	17.9	2.4	8.6	29.4	3.6	2.4	11.5	1.0
19	2.7	6.1	1.2	6.5	12.8	1.8	9.0	19.6	2.9	2.5	6.7	1.0
20	3.0	5.8	1.4	5.5	11.5	2.3	7.8	15.8	3.2	2.3	6.5	1.0
21	2.2	3.7	0.1	5.3	8.7	2.4	6.8	10.5	3.4	1.5	2.6	1.0
22	1.9	3.7	0.2	7.4	14.0	2.7	9.5	17.2	3.9	2.1	4.0	1.1
23	2.4	4.6	0.2	7.9	16.3	1.7	12.3	32.6	2.7	4.4	16.2	1.1
24	3.8	9.2	1.4	7.5	13.6	3.3	10.1	18.4	4.5	2.6	5.1	1.1
25	3.7	7.7	1.7	8.9	13.6	6.1	12.2	20.9	7.3	3.3	10.9	1.0
26	3.3	6.4	1.8	7.3	16.6	2.3	9.5	29.5	3.0	2.2	13.0	0.7
27	2.5	5.5	0.7	6.7	11.9	2.1	8.8	14.6	2.9	2.1	5.3	0.7
28	1.9	3.9	1.1	6.2	15.6	1.4	8.1	20.6	2.1	1.9	5.9	0.7
29	2.4	6.7	0.4	3.4	14.6	1.1	4.6	21.3	2.0	1.2	6.8	0.7
30	3.3	9.5	0.5	6.6	13.6	2.0	9.8	25.0	2.7	3.2	11.4	0.8
31	1.6	4.3	0.1	6.4	11.2	2.3	8.4	15.2	3.2	2.0	4.6	0.8
月平均值	2.5			6.7			9.2			2.5		
最大值	3.8			11.9			17.0			5.7		
發生日期	8			17			9			9		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-53 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年5月監測結果（續1）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/05/01~2012/05/31
印表日期: 2012/6/8

項目 / 日期	一氧化碳(CO)ppm			總碳氫化合物(THC)ppm			甲烷 (CH_4)ppm			非甲烷 (NMHC)ppm		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	0.59	0.71	0.51	1.89	2.14	1.78	1.73	1.78	1.69	0.16	0.43	0.05
2	0.64	0.74	0.52	2.27	2.95	1.89	1.76	1.85	1.69	0.51	1.16	0.10
3	0.65	0.73	0.59	2.09	2.51	1.96	1.78	1.81	1.78	0.31	0.72	0.17
4	0.68	0.80	0.58	2.37	2.96	2.08	1.80	1.83	1.76	0.58	1.18	0.29
5	0.73	0.81	0.67	2.20	2.43	2.01	1.81	1.81	1.79	0.40	0.62	0.21
6	0.79	0.93	0.74	2.20	2.55	1.88	1.81	1.83	1.78	0.40	0.72	0.07
7	0.73	0.81	0.65	2.18	2.51	1.96	1.80	1.83	1.78	0.38	0.70	0.15
8	0.79	0.93	0.71	1.91	2.15	1.83	1.81	1.90	1.78	0.10	0.34	0.05
9	0.79	0.95	0.64	1.99	2.15	1.83	1.82	1.88	1.78	0.17	0.34	0.05
10	0.63	0.67	0.61	2.33	2.74	1.91	1.77	1.78	1.73	0.56	0.96	0.15
11	0.66	0.74	0.61	2.32	2.52	1.93	1.77	1.81	1.74	0.55	0.74	0.15
12	0.65	0.68	0.62	2.30	2.62	1.95	1.76	1.81	1.73	0.54	0.84	0.17
13	0.68	0.78	0.65	2.21	2.70	2.04	1.75	1.78	1.73	0.47	0.97	0.31
14	0.66	0.77	0.58	2.27	2.72	1.93	1.76	1.78	1.73	0.51	0.99	0.15
15	0.64	0.78	0.58	2.21	2.43	1.96	1.75	1.85	1.71	0.45	0.62	0.17
16	0.62	0.71	0.58	2.19	2.66	1.80	1.74	1.76	1.73	0.45	0.92	0.07
17	0.66	0.83	0.58	2.22	2.48	2.01	1.80	1.86	1.74	0.41	0.63	0.26
18	0.67	0.83	0.53	2.21	2.41	1.98	1.84	1.88	1.78	0.37	0.55	0.17
19	0.63	0.73	0.59	2.13	2.34	1.97	1.79	1.85	1.76	0.34	0.53	0.19
20	0.60	0.67	0.55	2.15	2.46	1.86	1.77	1.79	1.74	0.38	0.70	0.07
21	0.55	0.59	0.52	2.11	2.44	1.97	1.78	1.79	1.76	0.33	0.68	0.19
22	0.49	0.53	0.43	2.15	2.46	1.90	1.77	1.79	1.76	0.37	0.67	0.14
23	0.48	0.55	0.43	2.05	2.41	1.81	1.76	1.81	1.73	0.29	0.65	0.05
24	0.49	0.55	0.45	2.04	2.37	1.83	1.88	2.07	1.74	0.17	0.34	0.06
25	0.58	0.70	0.48	2.08	6.00	1.81	1.86	3.21	1.76	0.22	2.79	0.05
26	0.53	0.56	0.51	1.94	2.23	1.83	1.78	1.83	1.76	0.16	0.45	0.06
27	0.53	0.56	0.49	1.95	2.13	1.88	1.78	1.79	1.76	0.17	0.34	0.12
28	0.53	0.59	0.48	1.90	2.22	1.81	1.77	1.79	1.74	0.13	0.43	0.05
29	0.49	0.55	0.46	1.95	2.19	1.81	1.74	1.79	1.71	0.21	0.46	0.09
30	0.52	0.71	0.45	1.83	1.89	1.77	1.75	1.79	1.71	0.08	0.15	0.05
31	0.44	0.58	0.40	1.94	2.08	1.89	1.75	1.78	1.73	0.19	0.34	0.15
月平均值	0.62			2.12			1.78			0.33		
最大值	0.79			2.37			1.88			0.58		
發生日期	8			4			24			4		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-53 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年5月監測結果（續2）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/05/01~2012/05/31
印表日期: 2012/6/8

項目 / 日期	總懸浮微粒(TSP) μg/m³		懸浮微粒(PM_{10}) μg/m³		懸浮微粒($PM_{2.5}$) μg/m³		臭氧(O_3)ppb			風速	風向
	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	每日平均值
1	43.2	66.7	----	----	22.9	34.2	33.9	51.5	18.1	0.9	南
2	51.0	76.2	----	----	26.9	46.2	38.8	61.0	13.0	1.1	南南東
3	48.4	71.1	----	----	27.6	42.2	52.8	67.3	36.0	0.7	東
4	57.2	89.6	----	----	37.2	63.2	64.0	80.1	46.4	0.9	東南東
5	80.6	105.5	----	----	47.4	60.3	65.1	93.8	40.8	1.1	南南東
6	75.8	89.6	----	----	50.0	64.2	56.8	79.8	33.6	1.0	南南東
7	66.2	81.8	----	----	41.3	51.3	48.3	66.3	35.8	1.4	西南
8	71.5	108.4	----	----	45.4	64.7	42.3	55.3	28.5	1.1	南南西
9	71.0	105.7	----	----	44.1	96.9	40.2	66.3	13.3	0.7	南南東
10	48.0	62.8	----	----	22.7	33.7	50.8	60.4	44.2	1.0	北北東
11	43.9	68.6	----	----	26.4	36.1	45.1	55.6	31.9	0.6	南南東
12	43.7	59.1	----	----	27.6	49.8	36.8	40.4	30.0	1.2	南南東
13	48.0	66.7	----	----	23.0	39.3	38.4	51.8	23.5	1.0	南南東
14	51.7	59.6	43.8	54.7	28.1	33.9	40.7	73.6	19.6	0.9	西南
15	59.0	82.5	46.8	83.3	----	----	40.4	61.0	15.5	0.9	南南西
16	58.7	76.4	52.2	90.6	----	----	52.8	67.3	36.0	0.7	東南東
17	47.6	63.2	37.9	47.6	----	----	57.4	68.1	46.4	0.8	南南東
18	93.7	149.2	81.3	140.4	----	----	52.8	66.9	27.8	1.0	南南東
19	72.4	87.7	63.0	75.0	----	----	42.8	48.6	31.6	0.9	南南西
20	45.2	56.9	41.5	71.3	----	----	27.1	35.8	19.7	1.2	東南
21	58.3	68.4	55.5	71.6	----	----	48.1	61.8	20.4	1.2	北北東
22	52.0	67.9	43.2	58.1	----	----	48.5	58.5	34.1	1.2	北北東
23	55.6	89.6	41.4	65.2	----	----	47.6	68.9	25.1	0.8	南南東
24	42.9	78.4	38.2	121.1	----	----	49.3	71.7	33.6	1.6	西南
25	69.6	102.8	55.1	90.6	----	----	55.4	110.0	23.1	1.4	東北東
26	60.2	76.7	45.9	69.8	----	----	53.1	66.9	27.8	0.8	東北東
27	41.5	50.3	29.3	39.6	----	----	48.5	58.5	34.1	1.6	東
28	43.3	60.3	30.4	38.6	----	----	48.8	54.9	38.3	1.7	東北
29	54.3	90.1	44.1	71.3	----	----	42.9	48.6	31.6	2.9	東南東
30	42.7	92.3	27.5	51.3	----	----	27.1	35.8	19.7	1.5	南南東
31	61.8	78.6	53.5	84.3	----	----	56.0	68.1	20.4	2.6	北
月平均值	56.7		46.1		33.6		46.9			1.2	
最大值	93.7		81.3		50.0		65.1			2.9	南南東
發生日期	18		18		6		5			29	35%
日標準值	250		125								
時標準值											
備註											

附錄Ⅳ.2-54 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年6月監測結果
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/06/01~2012/06/30
印表日期: 2012/7/9

項目 / 日期	二氧化硫(SO_2)ppb			二氧化氮(NO_2)ppb			氮氧化物(NO_X)ppb			一氧化氮(NO)ppb		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	2.2	5.9	0.1	8.0	13.4	2.9	10.2	18.7	3.7	2.2	5.2	1.0
2	2.2	5.1	0.5	6.7	11.5	2.9	10.1	17.4	3.7	3.4	9.2	0.8
3	2.0	5.5	0.4	3.6	5.3	2.4	4.7	6.8	3.2	1.1	1.7	0.8
4	3.2	7.1	0.8	5.5	9.0	2.0	8.0	14.6	2.9	2.5	5.9	0.8
5	2.2	5.5	0.5	7.8	10.8	4.3	11.6	16.8	5.8	3.8	7.0	1.5
6	2.5	4.5	0.8	5.9	11.6	2.0	9.4	25.7	2.7	3.5	14.1	0.7
7	2.8	7.8	1.4	7.1	11.6	2.0	10.9	27.3	3.0	3.8	17.1	0.8
8	2.5	4.3	1.1	7.2	11.6	4.5	10.5	23.2	5.2	3.3	12.4	0.8
9	3.8	9.2	1.4	9.0	18.4	4.0	12.6	31.3	5.1	3.7	15.3	1.0
10	2.1	5.5	0.7	5.3	9.2	2.3	7.5	14.1	3.3	2.3	5.2	1.0
11	2.2	4.0	0.4	6.6	9.7	2.7	11.2	24.5	3.6	4.6	15.9	1.0
12	2.4	3.6	1.4	8.9	16.5	3.7	11.5	23.5	4.8	2.7	7.4	1.0
13	2.5	3.7	1.1	6.3	17.9	1.7	8.2	21.9	2.4	2.0	7.0	0.7
14	2.9	5.2	1.5	9.7	20.6	2.7	14.0	30.3	4.0	4.4	13.3	0.8
15	3.3	5.6	1.5	5.3	12.8	2.1	7.4	19.4	3.0	2.1	6.7	0.8
16	3.9	11.4	1.5	6.6	12.4	1.4	9.4	18.1	2.3	2.8	9.3	0.7
17	2.9	4.9	1.4	2.0	3.7	1.0	3.1	5.2	1.8	1.1	1.8	0.8
18	3.2	4.5	1.7	5.1	9.3	1.4	9.4	22.8	2.3	4.3	16.0	1.0
19	4.1	6.8	2.9	8.1	13.4	3.7	12.8	29.8	4.6	4.6	16.9	0.7
20	3.6	5.6	2.4	7.2	11.8	2.4	10.1	20.1	3.3	2.9	9.0	0.8
21	2.7	4.0	1.7	7.2	11.1	3.4	8.9	14.6	4.5	1.7	3.4	1.0
22	2.8	4.3	1.5	5.9	11.1	1.5	9.2	20.4	2.4	3.3	9.7	0.8
23	3.7	6.5	2.4	4.7	7.7	2.4	7.0	13.0	3.3	2.3	6.1	1.0
24	3.5	4.6	1.5	4.0	6.7	2.0	6.3	13.8	2.7	2.4	7.3	0.8
25	4.0	5.6	2.9	5.6	10.8	2.3	10.1	23.1	3.3	4.5	16.6	1.0
26	3.8	5.6	2.3	5.1	9.3	1.8	9.0	17.2	2.7	3.9	11.8	0.8
27	3.6	4.9	2.4	3.8	7.3	1.8	6.8	18.8	2.7	3.0	12.4	0.7
28	4.1	12.4	2.3	2.7	8.1	1.0	5.3	20.4	1.7	2.6	12.2	0.7
29	3.2	6.4	1.4	2.2	3.4	1.4	3.3	5.1	2.3	1.1	1.7	0.8
30	2.8	4.5	1.8	4.9	9.6	1.7	8.0	15.9	2.7	3.1	9.3	1.0
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	3.0			5.9			8.9			3.0		
最大值	4.1			9.7			14.0			4.6		
發生日期	28			14			14			19		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-54 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年6月監測結果（續1）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/06/01~2012/06/30
印表日期: 2012/7/9

項目 / 日期	一氧化碳(CO)ppm			總碳氫化合物(THC)ppm			甲烷 (CH_4)ppm			非甲烷 (NMHC)ppm		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	0.44	0.55	0.40	1.88	1.97	1.81	1.75	1.76	1.71	0.13	0.21	0.09
2	0.45	0.51	0.42	1.86	2.05	1.78	1.73	1.76	1.71	0.13	0.31	0.07
3	0.44	0.48	0.42	1.87	1.95	1.82	1.73	1.76	1.71	0.14	0.24	0.08
4	0.44	0.48	0.42	1.82	1.96	1.77	1.71	1.76	1.69	0.11	0.27	0.07
5	0.46	0.49	0.42	1.86	2.00	1.80	1.73	1.76	1.71	0.13	0.27	0.09
6	0.47	0.56	0.45	1.88	2.03	1.82	1.75	1.79	1.73	0.13	0.27	0.08
7	0.53	0.64	0.45	1.90	2.05	1.83	1.75	1.79	1.71	0.15	0.26	0.07
8	0.60	0.81	0.46	1.89	2.05	1.79	1.76	1.83	1.69	0.13	0.27	0.07
9	0.59	0.78	0.49	1.93	2.07	1.84	1.75	1.79	1.71	0.19	0.33	0.06
10	0.50	0.59	0.42	1.91	2.21	1.75	1.70	1.74	1.68	0.20	0.50	0.06
11	0.54	0.62	0.46	1.95	2.17	1.79	1.72	1.78	1.69	0.22	0.46	0.09
12	0.60	0.68	0.49	2.16	2.28	2.02	1.78	1.83	1.73	0.38	0.50	0.21
13	0.63	0.71	0.59	2.16	2.33	2.03	1.79	1.81	1.78	0.36	0.55	0.22
14	0.61	0.80	0.46	2.14	2.27	1.97	1.77	1.81	1.71	0.37	0.50	0.21
15	0.50	0.67	0.43	2.03	2.19	1.90	1.71	1.74	1.68	0.32	0.48	0.21
16	0.52	0.65	0.40	2.06	2.22	1.92	1.72	1.78	1.68	0.34	0.46	0.21
17	0.42	0.49	0.39	2.03	2.18	1.85	1.66	1.69	1.62	0.37	0.50	0.21
18	0.46	0.59	0.39	2.01	2.16	1.85	1.67	1.71	1.62	0.35	0.50	0.21
19	0.59	0.89	0.46	2.04	2.21	1.79	1.71	1.74	1.68	0.33	0.50	0.10
20	0.54	0.70	0.43	2.06	2.19	1.92	1.71	1.74	1.66	0.35	0.48	0.21
21	0.48	0.56	0.43	2.10	2.22	2.01	1.73	1.76	1.71	0.37	0.50	0.25
22	0.49	0.58	0.42	2.02	2.23	1.84	1.72	1.76	1.69	0.30	0.50	0.15
23	0.51	0.61	0.46	2.06	2.21	1.90	1.72	1.76	1.68	0.35	0.50	0.21
24	0.47	0.53	0.43	2.01	2.23	1.89	1.69	1.71	1.66	0.32	0.55	0.19
25	0.48	0.55	0.42	2.07	2.21	1.91	1.68	1.71	1.66	0.38	0.50	0.23
26	0.48	0.55	0.42	2.01	2.15	1.91	1.69	1.71	1.66	0.32	0.46	0.22
27	0.46	0.58	0.42	2.04	2.18	1.88	1.68	1.71	1.66	0.36	0.50	0.19
28	0.41	0.48	0.37	2.04	2.19	1.94	1.67	1.69	1.64	0.37	0.55	0.28
29	0.43	0.49	0.39	2.02	2.16	1.89	1.68	1.68	1.66	0.34	0.48	0.21
30	0.45	0.49	0.40	2.07	2.18	1.91	1.69	1.73	1.68	0.38	0.50	0.23
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	0.50			2.00			1.72			0.28		
最大值	0.63			2.16			1.79			0.38		
發生日期	13			13			13			25		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-54 核四施工環境空氣品質連續監測--澳底測站101年6月監測結果（續2）

空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 澳底站　監測時間: 2012/06/01~2012/06/30

印表日期: 2012/7/9

項目 / 日期	總懸浮微粒(TSP) μg/m³		懸浮微粒(PM_{10}) μg/m³		懸浮微粒($PM_{2.5}$) μg/m³		臭氧(O_3)ppb			風速	風向
	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	每日平均值
1	62.3	92.8	33.7	55.4	----	----	51.2	60.3	31.7	1.7	北北東
2	47.2	61.1	24.5	39.2	----	----	37.8	47.3	20.1	2.0	N/A
3	66.6	87.2	43.4	70.2	----	----	50.2	55.8	46.2	2.0	北北東
4	57.2	101.8	28.1	43.0	25.1	60.1	39.2	47.4	35.1	2.8	N/A
5	50.0	73.0	----	----	20.0	29.3	36.5	46.4	26.6	2.0	北北東
6	71.0	153.1	----	----	20.9	32.0	38.6	52.2	18.7	0.9	南
7	58.3	89.1	----	----	26.2	40.3	33.8	55.3	17.9	1.5	南
8	64.6	96.7	----	----	37.7	54.2	41.5	92.8	13.7	1.3	東南
9	62.2	85.0	----	----	33.2	52.3	39.5	75.5	12.5	0.9	南南東
10	45.7	61.8	----	----	21.3	33.2	29.3	40.1	17.5	1.3	東南
11	47.1	67.9	----	----	21.9	31.0	25.0	40.5	12.7	1.1	南
12	40.1	75.2	----	----	26.7	64.0	49.0	69.1	25.0	0.8	東南東
13	74.5	108.2	----	----	49.7	68.6	53.7	72.0	28.4	1.4	東
14	45.9	69.6	----	----	27.8	47.9	36.2	50.6	20.3	1.1	南南東
15	44.9	85.0	----	----	19.4	26.6	33.0	43.0	20.3	2.6	南
16	52.2	70.6	----	----	24.4	36.4	36.1	69.8	19.1	1.7	東南
17	41.9	81.8	----	----	19.1	32.7	21.5	26.9	17.4	3.3	南
18	59.8	91.8	49.6	72.0	21.1	27.6	26.2	44.0	12.2	1.5	東南
19	55.4	74.2	42.7	64.7	----	----	35.9	73.3	12.2	1.1	東
20	48.7	57.4	40.1	53.2	----	----	35.0	62.5	21.6	1.2	東
21	40.6	55.2	31.6	41.5	----	----	50.0	57.5	38.3	1.4	東南東
22	42.5	52.7	30.8	38.3	----	----	37.5	54.7	23.8	1.3	南南西
23	53.1	107.4	41.8	93.8	----	----	34.4	58.5	20.6	1.1	南南東
24	60.3	77.4	52.7	75.2	----	----	30.2	44.5	17.2	1.4	東北東
25	60.3	80.1	50.0	63.7	----	----	24.4	41.4	15.2	1.4	東南
26	59.9	90.6	50.9	77.9	----	----	32.0	66.2	14.3	1.4	南南東
27	57.5	73.3	50.9	68.1	----	----	32.5	65.3	16.3	2.5	東南東
28	46.0	63.7	39.5	68.6	----	----	23.6	27.5	14.3	3.7	南
29	45.1	54.7	38.7	60.3	----	----	29.9	32.6	22.3	4.7	南
30	46.6	86.0	36.0	52.5	----	----	26.9	34.4	11.4	1.9	南南西
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	53.6		40.3		26.3		35.7			1.8	
最大值	74.5		52.7		49.7		53.7			4.7	南
發生日期	13		24		13		13			29	25%
日標準值	250		125								
時標準值											
備註											

附錄Ⅳ.2-55 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年4月監測結果

空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 龍門站　監測時間: 2012/04/01~2012/04/30

印表日期: 2012/5/10

項目 / 日期	二氧化硫(SO_2)ppb			二氧化氮(NO_2)ppb			氮氧化物(NO_X)ppb			一氧化氮(NO)ppb		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	1.9	2.9	1.2	2.1	4.6	0.9	3.4	6.8	1.9	1.3	2.2	0.9
2	1.6	2.6	0.3	5.7	16.4	1.2	7.4	20.0	1.5	1.7	3.6	0.2
3	0.9	1.7	0.2	5.9	13.7	2.9	7.5	15.9	4.3	1.6	2.2	1.0
4	1.2	1.7	0.9	4.0	6.7	2.2	4.8	8.4	2.4	0.8	2.1	0.2
5	1.0	1.4	0.7	6.4	8.9	3.1	7.5	10.8	3.9	1.1	2.7	0.3
6	0.9	1.0	0.7	4.9	8.9	2.6	6.5	12.1	3.9	1.5	3.1	1.0
7	0.6	1.0	0.5	3.5	5.5	2.1	5.2	7.7	3.4	1.7	2.2	1.4
8	0.6	0.9	0.3	2.5	3.9	1.7	4.4	6.0	3.8	2.0	2.1	1.5
9	0.9	1.5	0.3	3.3	7.4	1.4	5.3	9.6	3.1	2.0	2.4	1.4
10	1.3	1.5	1.2	2.2	3.9	1.4	3.9	6.2	2.9	1.6	2.1	1.5
11	1.4	1.7	1.2	4.0	10.4	1.5	6.3	15.4	3.2	2.2	4.8	1.5
12	1.3	1.7	1.0	3.1	6.5	1.4	5.0	8.5	2.9	1.9	2.4	1.4
13	1.5	1.7	1.2	4.4	9.9	1.9	6.6	14.2	3.9	2.2	4.3	1.4
14	1.3	1.7	1.2	2.4	3.6	1.5	4.2	5.5	3.2	1.8	2.1	1.5
15	1.3	1.7	0.7	4.4	9.9	1.9	6.5	14.7	3.8	2.1	4.8	1.5
16	1.3	1.5	1.0	3.2	5.5	1.4	4.9	7.2	3.1	1.7	2.1	1.4
17	1.3	1.5	0.7	2.5	4.8	1.2	4.4	7.5	2.6	1.9	2.7	1.5
18	1.3	1.5	1.0	3.5	5.8	2.2	5.5	8.2	3.9	2.0	2.4	1.7
19	1.3	1.5	1.0	3.9	8.7	1.5	6.0	12.0	3.4	2.1	3.9	1.7
20	1.3	1.5	1.0	3.4	6.3	1.4	5.5	10.4	3.2	2.1	4.4	1.5
21	1.4	1.5	1.2	4.3	9.4	1.4	6.4	11.6	3.1	2.1	3.4	1.7
22	1.4	1.5	1.0	3.6	6.5	2.2	5.5	10.1	4.1	1.9	3.6	1.5
23	1.6	2.6	1.2	3.2	7.2	1.4	5.1	9.2	3.4	1.9	2.6	1.4
24	1.4	1.7	1.0	4.9	14.0	1.5	7.3	19.3	3.6	2.5	7.9	1.9
25	1.4	1.7	0.9	5.6	15.2	2.4	8.1	18.6	4.1	2.5	3.9	1.9
26	1.3	1.5	1.2	2.9	5.3	1.4	4.9	7.7	3.2	2.0	2.4	1.7
27	1.3	1.5	1.0	5.8	14.0	2.4	8.0	16.6	4.3	2.2	3.1	1.9
28	1.2	1.5	0.9	4.4	7.9	1.9	6.5	11.3	3.9	2.2	3.6	1.7
29	1.3	1.5	0.9	4.5	8.2	2.1	6.8	11.6	3.9	2.4	4.6	1.7
30	1.3	1.5	1.0	3.4	6.2	1.9	5.8	8.4	4.1	2.4	3.6	2.1
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	1.3			3.9			5.8			1.9		
最大值	1.9			6.4			8.1			2.5		
發生日期	1			5			25			25		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-55 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年4月監測結果（續1）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 龍門站　監測時間: 2012/04/01~2012/04/30
印表日期: 2012/5/10

項目 / 日期	一氧化碳(CO)ppm			總碳氫化合物(THC)ppm			甲烷 (CH_4)ppm			非甲烷 (NMHC)ppm		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	0.24	0.62	0.10	2.24	2.44	2.05	1.78	1.83	1.74	0.45	0.68	0.21
2	0.27	0.58	0.12	2.29	2.74	2.12	1.79	1.83	1.74	0.50	0.99	0.31
3	0.29	0.48	0.10	2.24	2.51	1.95	1.84	1.91	1.79	0.40	0.72	0.10
4	0.22	0.34	0.10	2.17	2.38	1.95	1.84	1.88	1.79	0.33	0.50	0.15
5	0.30	0.67	0.15	2.23	2.62	2.02	1.83	1.88	1.78	0.39	0.77	0.17
6	0.31	0.55	0.07	2.21	2.41	2.05	1.85	1.90	1.79	0.36	0.63	0.17
7	0.16	0.53	0.07	2.14	2.53	1.86	1.84	1.88	1.78	0.30	0.70	0.05
8	0.14	0.31	0.05	2.21	2.43	2.05	1.82	1.86	1.78	0.39	0.63	0.21
9	0.12	0.38	0.05	2.21	2.50	1.90	1.80	1.85	1.78	0.40	0.68	0.10
10	0.12	0.21	0.07	2.11	2.41	1.91	1.78	1.81	1.76	0.32	0.60	0.15
11	0.15	0.32	0.05	2.17	2.48	1.97	1.79	1.86	1.76	0.38	0.67	0.21
12	0.12	0.19	0.05	2.15	2.60	1.90	1.78	1.83	1.74	0.37	0.82	0.15
13	0.24	0.38	0.10	2.22	2.53	2.02	1.81	1.85	1.78	0.41	0.72	0.21
14	0.27	0.36	0.22	2.16	2.38	1.93	1.84	1.88	1.76	0.33	0.62	0.10
15	0.27	0.41	0.19	2.23	2.53	2.03	1.82	1.86	1.78	0.41	0.74	0.22
16	0.19	0.32	0.10	2.14	2.44	1.95	1.82	1.88	1.78	0.32	0.62	0.10
17	0.10	0.15	0.05	2.12	2.44	1.90	1.83	1.86	1.78	0.30	0.62	0.09
18	0.10	0.14	0.05	2.18	2.43	2.02	1.82	1.86	1.79	0.35	0.60	0.21
19	0.12	0.19	0.05	2.17	2.46	2.00	1.81	1.85	1.76	0.36	0.65	0.17
20	0.12	0.26	0.05	2.14	2.51	1.97	1.80	1.86	1.76	0.34	0.70	0.19
21	0.14	0.31	0.05	2.15	2.38	1.93	1.77	1.79	1.74	0.38	0.58	0.17
22	0.20	0.38	0.07	2.24	2.43	2.07	1.86	1.91	1.83	0.38	0.55	0.19
23	0.20	0.46	0.05	2.23	2.68	1.93	1.84	1.88	1.79	0.39	0.80	0.12
24	0.14	0.27	0.05	2.13	2.51	1.93	1.80	1.86	1.74	0.33	0.65	0.14
25	0.18	0.32	0.09	2.14	2.43	1.98	1.77	1.81	1.73	0.38	0.67	0.22
26	0.39	0.75	0.26	2.11	2.44	1.85	1.82	1.88	1.79	0.29	0.62	0.05
27	0.26	0.32	0.17	2.20	2.58	1.91	1.82	1.88	1.78	0.38	0.72	0.12
28	0.27	0.39	0.15	2.17	2.50	1.97	1.82	1.86	1.78	0.35	0.72	0.15
29	0.22	0.56	0.10	2.15	2.44	1.97	1.77	1.85	1.73	0.38	0.67	0.19
30	0.46	0.74	0.10	2.20	2.58	1.98	1.74	1.78	1.69	0.46	0.82	0.24
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	0.21			2.18			1.81			0.37		
最大值	0.46			2.29			1.86			0.50		
發生日期	30			2			22			2		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-55 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年4月監測結果（續2）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 龍門站　監測時間: 2012/04/01~2012/04/30
印表日期: 2012/5/10

項目 / 日期	總懸浮微粒(TSP) μg/m³		懸浮微粒(PM_{10}) μg/m³		懸浮微粒($PM_{2.5}$) μg/m³		臭氧(O_3)ppb			風速	風向
	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	每日平均值
1	101.8	195.2	81.7	176.2	----	----	52.1	59.3	20.5	2.0	東南
2	59.8	100.6	48.1	71.7	16.7	37.5	36.2	52.5	19.0	1.1	東南
3	96.8	178.1	----	----	41.9	85.7	45.3	72.3	20.7	2.2	南南西
4	59.5	81.6	----	----	24.3	32.4	48.9	62.7	17.9	2.7	南
5	51.5	82.9	----	----	26.6	42.2	43.5	63.2	21.4	1.1	西南西
6	76.7	130.5	----	----	37.9	60.6	57.9	79.3	31.1	0.9	南南東
7	52.8	68.3	----	----	25.1	45.7	54.6	64.4	32.0	1.7	南
8	65.0	80.0	----	----	32.0	48.6	66.0	71.5	57.6	2.6	南
9	50.1	82.2	----	----	24.1	52.1	46.4	56.4	34.7	0.6	南南東
10	41.6	61.3	----	----	17.3	23.8	35.8	47.7	22.7	2.1	南南西
11	50.5	67.9	----	----	21.8	36.8	29.8	65.6	9.4	1.2	南南東
12	47.1	84.8	----	----	17.9	30.2	34.2	57.6	8.7	1.1	東南
13	66.9	96.2	----	----	38.8	57.8	32.9	61.2	8.5	1.1	南
14	71.1	161.9	----	----	28.7	62.2	56.2	66.3	34.5	1.5	東北東
15	55.0	97.5	----	----	29.1	54.3	33.4	49.9	15.6	0.9	南
16	51.9	87.3	40.9	45.3	12.2	29.5	52.1	68.4	32.3	2.1	西北
17	54.1	67.6	42.6	61.9	----	----	44.5	62.1	26.0	0.9	南南東
18	35.5	54.9	22.5	36.5	----	----	39.0	58.5	27.4	0.9	南南西
19	43.0	58.7	30.8	62.5	----	----	35.4	54.7	15.0	0.8	東南
20	47.7	60.0	34.6	50.8	----	----	32.3	53.3	8.7	0.7	東南
21	37.5	47.3	22.0	41.6	----	----	32.2	49.7	13.8	0.9	南
22	61.8	88.3	52.4	73.7	----	----	49.1	65.5	23.1	1.2	南南東
23	52.1	71.7	37.3	53.3	----	----	50.8	65.5	36.6	1.4	南南西
24	42.8	55.2	30.2	41.9	----	----	32.7	50.6	15.6	1.0	南南西
25	47.9	109.2	37.8	107.9	----	----	21.1	38.5	10.9	0.9	南南東
26	68.2	124.8	57.8	73.3	----	----	53.9	63.8	13.3	1.9	東
27	54.0	94.0	43.2	75.2	----	----	47.8	60.3	34.9	0.7	南
28	41.2	54.3	24.3	35.2	----	----	36.8	56.8	15.0	0.6	南南西
29	37.2	54.9	21.9	43.5	----	----	27.3	39.0	14.5	1.1	南
30	30.8	41.6	18.6	22.5	10.1	18.1	21.2	41.7	12.1	1.2	南
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	55.1		38.0		25.3		41.6			1.3	
最大值	101.8		81.7		41.9		66.0			2.7	南
發生日期	1		1		3		8			4	30%
日標準值	250		125								
時標準值											
備註											

附錄Ⅳ.2-56 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年5月監測結果
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處 測站名稱: 龍門站 監測時間: 2012/05/01~2012/05/31
印表日期: 2012/6/8

項目 / 日期	二氧化硫(SO_2)ppb			二氧化氮(NO_2)ppb			氮氧化物(NO_X)ppb			一氧化氮(NO)ppb		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	1.4	1.7	1.2	3.0	6.2	1.7	5.5	8.4	3.6	2.4	3.4	1.9
2	1.4	1.5	0.9	3.1	5.5	1.7	5.4	8.0	3.6	2.3	3.8	1.5
3	1.3	1.5	1.0	2.4	5.3	1.0	4.3	7.4	2.7	1.9	2.2	1.7
4	1.4	1.5	1.0	2.4	6.3	0.7	4.3	8.2	2.9	2.0	2.1	1.7
5	1.5	1.7	1.2	2.6	5.0	1.5	4.6	8.0	3.4	2.1	3.1	1.7
6	1.5	1.7	1.4	2.5	8.5	1.0	4.7	10.9	3.2	2.2	2.9	1.7
7	1.8	2.6	1.2	2.7	3.9	1.5	4.8	6.7	3.6	2.0	2.7	1.5
8	1.7	2.1	0.7	3.7	6.8	1.4	6.1	9.9	3.6	2.3	3.4	1.9
9	1.5	1.9	1.2	4.9	8.9	2.1	7.4	15.6	3.6	2.6	6.7	1.4
10	1.3	1.5	1.0	1.3	2.6	0.7	3.3	4.4	2.7	2.0	2.2	1.7
11	1.4	1.7	1.2	2.8	4.8	1.2	4.7	7.2	2.9	2.0	2.6	1.7
12	1.3	1.5	0.9	2.0	4.1	0.9	4.0	6.3	2.7	2.1	2.4	1.9
13	1.4	1.5	1.2	2.4	5.5	1.0	4.5	7.4	3.1	2.1	2.4	1.7
14	1.5	1.7	1.4	3.0	7.0	1.9	5.3	10.1	3.6	2.3	3.4	1.5
15	1.6	1.7	1.2	5.5	9.4	3.8	7.8	12.5	6.2	2.4	3.4	1.7
16	1.4	1.7	1.2	3.8	10.1	1.4	6.3	13.0	3.1	2.4	4.3	1.4
17	1.4	1.7	1.0	3.8	7.9	1.0	6.1	10.4	3.1	2.3	3.8	1.9
18	1.6	1.9	1.2	3.1	10.3	1.5	5.2	12.0	3.4	2.1	2.6	1.7
19	1.5	1.7	1.2	2.7	5.1	1.5	4.9	7.2	3.6	2.2	2.9	1.9
20	1.4	1.5	1.0	2.5	7.2	0.7	4.8	10.1	2.9	2.3	3.1	1.9
21	1.4	1.5	1.0	1.9	7.5	0.5	4.7	14.7	2.7	2.8	7.2	1.9
22	1.4	1.5	1.2	2.5	5.8	0.7	4.8	7.9	3.1	2.3	3.2	1.7
23	1.6	2.4	0.5	3.9	7.9	1.2	6.5	10.9	2.7	2.6	3.8	1.5
24	1.9	2.4	1.5	2.8	6.7	1.5	5.2	9.6	3.6	2.4	3.1	2.1
25	1.9	2.6	1.2	3.9	6.2	1.9	6.5	9.9	4.1	2.5	4.1	1.7
26	1.7	2.2	1.4	2.5	5.8	1.4	4.7	8.0	3.2	2.2	2.6	1.9
27	1.6	1.7	1.4	1.9	4.1	0.9	4.2	6.7	2.7	2.2	2.6	1.9
28	1.6	1.7	1.4	2.0	6.2	0.9	4.1	8.5	2.7	2.1	2.4	1.7
29	1.6	1.9	1.2	2.3	8.0	0.9	4.4	10.9	2.7	2.2	2.9	1.5
30	1.8	2.4	1.5	3.7	8.4	1.0	6.4	13.2	3.2	2.7	5.1	1.9
31	1.7	1.9	1.2	2.1	5.6	0.7	4.2	8.0	2.4	2.1	2.6	1.7
月平均值	1.5			2.9			5.1			2.3		
最大值	1.9			5.5			7.8			2.8		
發生日期	25			15			15			21		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-56 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年5月監測結果（續1）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處 測站名稱: 龍門站 監測時間: 2012/05/01~2012/05/31
印表日期: 2012/6/8

項目 / 日期	一氧化碳(CO)ppm			總碳氫化合物(THC)ppm			甲烷 (CH_4)ppm			非甲烷 (NMHC)ppm		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	0.62	1.04	0.46	2.21	2.67	2.00	1.74	1.76	1.71	0.47	0.94	0.24
2	0.66	1.01	0.44	2.21	2.53	2.02	1.78	1.86	1.71	0.43	0.72	0.21
3	0.69	1.13	0.51	2.18	2.41	1.96	1.80	1.85	1.76	0.38	0.62	0.17
4	0.52	0.99	0.26	2.19	2.45	1.95	1.81	1.86	1.74	0.38	0.67	0.14
5	0.40	0.79	0.26	2.27	2.51	2.09	1.83	1.85	1.79	0.44	0.72	0.26
6	0.38	0.58	0.31	2.24	2.48	2.07	1.83	1.88	1.79	0.41	0.67	0.21
7	0.36	0.62	0.22	2.18	2.45	1.91	1.82	1.86	1.78	0.36	0.63	0.05
8	0.39	0.92	0.17	2.21	2.48	2.05	1.82	1.90	1.76	0.39	0.60	0.22
9	0.40	0.84	0.15	2.26	2.61	1.90	1.83	1.90	1.76	0.43	0.75	0.14
10	0.26	0.67	0.12	2.11	2.41	1.87	1.77	1.79	1.73	0.34	0.65	0.09
11	0.29	0.74	0.12	2.19	2.51	1.93	1.79	1.86	1.74	0.41	0.72	0.14
12	0.27	0.67	0.12	2.16	2.44	1.93	1.78	1.85	1.74	0.38	0.68	0.14
13	0.28	0.67	0.12	2.21	2.46	2.00	1.76	1.81	1.73	0.45	0.72	0.26
14	0.38	0.74	0.14	2.16	2.67	1.91	1.79	1.83	1.74	0.37	0.91	0.12
15	0.38	0.75	0.19	2.12	2.53	1.88	1.81	1.90	1.78	0.30	0.70	0.05
16	0.33	0.77	0.14	2.06	2.56	1.88	1.80	1.88	1.76	0.25	0.75	0.09
17	0.40	0.74	0.19	2.16	2.48	1.82	1.86	1.95	1.79	0.30	0.67	0.03
18	0.34	0.50	0.22	2.21	2.36	1.98	1.89	1.98	1.83	0.32	0.46	0.05
19	0.35	0.72	0.21	2.13	2.45	1.93	1.85	1.91	1.79	0.28	0.62	0.09
20	0.33	0.72	0.19	2.09	2.36	1.88	1.82	1.86	1.78	0.28	0.58	0.05
21	0.31	0.68	0.14	2.09	2.41	1.91	1.81	1.85	1.78	0.28	0.58	0.10
22	0.25	0.63	0.10	2.09	2.32	1.89	1.81	1.88	1.74	0.28	0.53	0.10
23	0.38	0.70	0.12	2.17	2.48	1.88	1.82	1.86	1.76	0.35	0.62	0.07
24	0.32	0.62	0.03	2.12	2.36	1.89	1.78	1.86	1.74	0.33	0.62	0.10
25	0.37	0.74	0.17	2.15	2.89	1.86	1.81	1.86	1.76	0.34	1.11	0.05
26	0.28	0.70	0.12	2.02	2.37	1.85	1.80	1.88	1.74	0.21	0.56	0.05
27	0.30	0.72	0.14	1.99	2.37	1.82	1.79	1.85	1.74	0.20	0.60	0.03
28	0.31	0.67	0.15	1.99	2.41	1.79	1.80	1.86	1.74	0.20	0.67	0.03
29	0.24	0.65	0.09	2.00	2.39	1.86	1.78	1.85	1.73	0.22	0.65	0.03
30	0.25	0.67	0.09	2.02	2.43	1.86	1.77	1.81	1.73	0.25	0.67	0.07
31	0.23	0.63	0.05	2.01	2.29	1.81	1.77	1.81	1.73	0.24	0.51	0.03
月平均值	0.36			2.14			1.80			0.33		
最大值	0.69			2.27			1.89			0.47		
發生日期	3			5			18			1		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-56 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年5月監測結果（續2）

空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 龍門站　監測時間: 2012/05/01~2012/05/31
印表日期: 2012/6/8

項目 / 日期	總懸浮微粒(TSP) μg/m³		懸浮微粒(PM_{10}) μg/m³		懸浮微粒($PM_{2.5}$) μg/m³		臭氧(O_3)ppb			風速	風向
	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	每日平均值
1	38.2	61.0	----	----	12.4	23.8	26.4	43.9	10.9	1.2	南
2	43.2	65.4	----	----	17.4	32.7	34.6	55.9	10.1	1.3	南南東
3	43.6	61.6	----	----	17.9	34.6	45.7	58.6	23.9	0.9	東南東
4	49.9	71.7	----	----	28.1	59.0	56.3	74.7	34.9	1.3	東南東
5	69.4	95.9	----	----	36.5	48.6	55.0	87.7	24.1	1.8	南南東
6	65.2	84.4	----	----	37.1	42.5	43.5	72.8	21.9	1.3	東南
7	59.9	86.3	----	----	31.3	40.3	43.4	58.1	26.7	1.7	南南西
8	58.3	69.2	----	----	34.5	53.7	36.1	49.2	21.2	2.2	南
9	59.3	98.7	----	----	33.3	78.4	37.3	64.1	13.0	1.3	南
10	41.4	66.3	----	----	14.4	25.1	47.2	54.0	40.5	1.9	東
11	36.5	53.7	----	----	15.6	28.3	40.3	52.3	32.0	0.6	南南東
12	34.5	59.0	----	----	17.1	48.6	32.0	37.4	26.3	1.2	南南東
13	43.1	78.1	----	----	14.2	39.0	31.5	41.7	12.3	0.9	東南
14	45.5	60.3	39.3	78.1	14.9	21.0	30.8	60.2	14.4	1.4	南
15	46.5	80.3	37.2	74.6	----	----	38.4	75.6	18.6	0.9	南
16	44.8	54.9	34.5	62.2	----	----	30.3	45.6	11.1	0.9	西南
17	40.3	114.0	24.9	35.2	----	----	37.5	61.5	23.1	1.0	南南西
18	80.6	137.8	61.8	121.6	----	----	54.6	97.1	26.5	1.3	東南
19	67.3	119.0	48.8	80.3	----	----	42.3	63.2	21.0	0.9	南南西
20	46.0	124.1	35.6	82.9	----	----	47.7	66.8	11.8	2.2	西北
21	80.0	92.4	69.1	87.3	----	----	64.4	68.2	59.0	3.1	東南
22	56.4	95.2	46.9	76.8	----	----	53.1	65.5	19.3	1.8	南南東
23	51.3	95.9	40.3	108.3	----	----	34.4	55.0	13.8	1.1	南南東
24	31.1	42.5	17.9	34.9	----	----	45.2	54.7	25.6	1.6	南南西
25	61.4	122.2	33.8	83.5	----	----	44.8	65.0	15.0	1.5	東南東
26	55.7	82.9	39.8	70.8	----	----	50.7	64.3	25.3	1.1	東
27	34.7	44.4	20.8	31.1	----	----	46.9	59.8	24.3	1.8	東
28	39.9	121.0	21.0	35.2	----	----	48.1	55.6	36.1	1.7	東北
29	34.9	59.7	21.0	32.4	----	----	38.4	44.6	27.5	1.6	南南東
30	28.6	39.4	15.0	36.5	----	----	26.0	34.5	18.3	1.2	南南西
31	57.7	95.9	45.4	81.2	----	----	57.5	72.3	15.2	2.9	東南
月平均值	49.8		36.3		23.2		42.6			1.5	
最大值	80.6		69.1		37.1		64.4			3.1	南南東
發生日期	18		21		6		21			21	23%
日標準值	250		125								
時標準值											
備註											

附錄Ⅳ.2-57 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年6月監測結果

空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 龍門站　監測時間: 2012/06/01~2012/06/30
印表日期: 2012/7/9

項目 / 日期	二氧化硫($S0_2$)ppb			二氧化氮(NO_2)ppb			氮氧化物(NO_X)ppb			一氧化氮(NO)ppb		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	1.7	2.1	1.0	1.9	6.0	0.7	4.0	9.4	2.6	2.1	3.2	1.7
2	1.8	3.4	1.0	2.4	3.8	1.2	4.9	8.0	2.9	2.5	4.3	1.7
3	1.8	1.9	1.5	0.9	1.2	0.7	3.0	3.6	2.2	2.1	2.4	1.5
4	1.7	2.1	1.5	1.9	2.9	0.7	4.1	5.3	2.7	2.2	2.7	1.7
5	1.8	2.1	1.7	3.9	7.9	1.2	6.4	11.6	3.4	2.6	3.8	2.1
6	2.0	2.4	1.7	2.4	5.1	1.0	4.9	8.7	3.1	2.5	3.8	1.7
7	2.4	3.4	1.7	3.8	7.9	1.2	6.5	12.8	3.2	2.7	5.1	2.1
8	2.8	5.6	1.7	4.0	7.7	2.7	6.8	11.8	5.0	2.8	5.8	2.1
9	2.4	3.2	1.7	4.5	7.7	2.1	7.3	13.2	4.4	2.9	6.7	2.2
10	2.0	2.2	1.7	2.8	4.3	1.5	5.2	7.0	3.1	2.4	3.2	1.5
11	2.1	2.6	1.7	3.9	8.4	2.1	6.6	10.8	4.3	2.8	4.6	2.1
12	2.1	2.2	2.1	4.4	10.8	1.2	6.8	13.2	3.2	2.4	3.1	2.1
13	2.1	2.4	1.9	2.4	5.3	1.0	4.8	8.0	3.4	2.4	3.2	2.1
14	2.1	2.4	1.9	4.7	23.4	1.2	8.0	35.4	3.6	3.3	12.0	2.1
15	2.2	2.4	2.1	2.6	6.0	1.0	4.9	8.5	3.4	2.4	2.7	2.1
16	2.6	4.4	1.9	3.0	8.5	1.0	5.6	11.8	3.4	2.6	3.4	2.1
17	2.2	2.4	1.9	1.3	2.7	0.9	3.7	5.6	3.1	2.4	3.2	2.1
18	2.2	2.6	1.9	2.2	3.9	1.4	5.0	6.5	3.8	2.8	4.4	2.2
19	2.7	4.4	2.1	4.7	9.1	2.4	7.8	14.9	4.4	3.2	6.7	2.1
20	2.2	2.6	1.7	3.9	11.1	1.0	6.5	14.5	3.1	2.6	3.4	1.9
21	2.4	4.8	1.9	2.9	6.2	1.5	5.2	8.7	3.6	2.3	2.6	1.9
22	2.2	2.7	1.4	2.7	5.1	1.4	5.2	8.0	3.4	2.5	3.4	2.1
23	2.7	5.1	2.1	2.6	4.8	1.2	5.0	7.7	3.2	2.5	3.9	2.1
24	2.6	3.4	2.2	2.0	3.4	1.4	4.5	6.2	3.6	2.5	3.1	1.9
25	2.7	4.4	2.1	3.3	6.3	1.4	5.9	9.1	3.8	2.7	3.9	1.9
26	2.5	3.4	2.2	2.7	6.0	1.2	5.4	8.0	3.6	2.7	4.4	2.2
27	2.8	4.1	2.2	2.6	6.0	1.0	5.3	9.2	3.4	2.8	4.4	2.1
28	2.4	2.7	2.1	1.6	3.8	0.9	4.1	7.0	2.9	2.6	4.4	2.1
29	2.7	6.0	2.2	1.2	2.1	0.9	3.5	4.3	2.7	2.3	2.6	2.1
30	2.5	3.4	2.2	2.6	5.6	1.4	5.3	7.9	3.6	2.7	4.3	2.1
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	2.3			2.9			5.4			2.6		
最大值	2.8			4.7			8.0			3.3		
發生日期	27			14			14			14		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-57 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年6月監測結果（續1）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 龍門站　監測時間: 2012/06/01~2012/06/30
印表日期: 2012/7/9

項目 / 日期	一氧化碳(CO)ppm			總碳氫化合物(THC)ppm			甲烷 (CH_4)ppm			非甲烷 (NMHC)ppm		
	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	小時最大值	小時最小值
1	0.24	0.58	0.12	1.92	2.23	1.77	1.77	1.85	1.73	0.15	0.50	0.02
2	0.25	0.65	0.12	1.94	2.24	1.76	1.77	1.86	1.73	0.17	0.48	0.02
3	0.23	0.56	0.12	1.95	2.16	1.78	1.75	1.79	1.69	0.20	0.44	0.02
4	0.29	0.58	0.13	2.01	2.22	1.83	1.73	1.78	1.69	0.28	0.48	0.05
5	0.28	0.50	0.12	2.06	2.21	1.94	1.75	1.83	1.68	0.31	0.44	0.21
6	0.27	0.56	0.12	2.13	2.24	1.97	1.77	1.83	1.71	0.36	0.50	0.23
7	0.30	0.62	0.15	2.13	2.29	1.95	1.78	1.85	1.73	0.35	0.50	0.18
8	0.38	0.82	0.14	2.14	2.29	1.93	1.79	1.86	1.74	0.36	0.50	0.17
9	0.34	0.68	0.14	2.10	2.26	1.92	1.77	1.81	1.71	0.33	0.48	0.18
10	0.29	0.58	0.12	2.05	2.23	1.87	1.74	1.79	1.68	0.31	0.50	0.15
11	0.38	0.65	0.14	2.10	2.22	1.87	1.75	1.79	1.69	0.36	0.44	0.16
12	0.48	0.87	0.21	2.13	2.33	1.92	1.81	1.88	1.76	0.32	0.50	0.14
13	0.50	0.85	0.34	2.14	2.31	1.97	1.83	1.85	1.78	0.31	0.48	0.16
14	0.50	0.89	0.26	2.14	2.33	1.91	1.79	1.85	1.71	0.36	0.50	0.15
15	0.38	0.92	0.14	2.08	2.26	1.88	1.74	1.78	1.64	0.34	0.50	0.17
16	0.52	0.84	0.22	2.11	2.31	1.93	1.75	1.88	1.66	0.37	0.50	0.19
17	0.39	0.67	0.14	1.88	2.17	0.66	1.58	1.73	0.26	0.30	0.48	0.03
18	0.31	0.62	0.14	2.05	2.24	1.84	1.70	1.78	1.66	0.34	0.50	0.15
19	0.52	0.87	0.21	2.08	2.26	1.90	1.75	1.81	1.69	0.33	0.50	0.16
20	0.45	0.70	0.15	2.09	2.26	1.91	1.75	1.79	1.71	0.34	0.50	0.16
21	0.37	0.68	0.14	2.12	2.29	1.91	1.78	1.85	1.74	0.34	0.50	0.15
22	0.34	0.70	0.13	2.13	2.29	1.89	1.78	1.81	1.74	0.35	0.50	0.15
23	0.30	0.58	0.12	2.13	2.29	1.92	1.78	1.83	1.74	0.35	0.50	0.16
24	0.27	0.51	0.12	2.09	2.27	1.95	1.75	1.81	1.71	0.34	0.48	0.17
25	0.24	0.53	0.12	2.10	2.24	1.90	1.75	1.79	1.71	0.35	0.50	0.16
26	0.22	0.44	0.12	2.04	2.22	1.83	1.74	1.78	1.68	0.31	0.50	0.15
27	0.22	0.50	0.12	2.07	2.22	1.89	1.73	1.78	1.69	0.34	0.50	0.16
28	0.24	0.36	0.12	2.04	2.21	1.84	1.70	1.74	1.66	0.35	0.50	0.16
29	0.20	0.36	0.12	2.00	2.14	1.87	1.70	1.71	1.66	0.31	0.43	0.16
30	0.23	0.41	0.12	2.08	2.26	1.89	1.72	1.78	1.69	0.36	0.50	0.18
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	0.33			2.07			1.75			0.32		
最大值	0.52			2.14			1.83			0.37		
發生日期	19			14			13			16		
日標準值												
時標準值												
備註												

附錄Ⅳ.2-57 核四施工環境空氣品質連續監測--龍門測站101年6月監測結果（續2）
空氣品質監測月報表

主管單位: 台電環保處　測站名稱: 龍門站　監測時間: 2012/06/01~2012/06/30
印表日期: 2012/7/9

項目 / 日期	總懸浮微粒(TSP) $\mu g/m^3$		懸浮微粒(PM_{10}) $\mu g/m^3$		懸浮微粒($PM_{2.5}$) $\mu g/m^3$		臭氧(O_3)ppb			風速	風向
	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	每日平均值	小時最大值	小時最小值	每日平均值	每日平均值
1	68.0	90.2	42.9	59.1	----	----	52.5	65.1	20.5	2.1	東北東
2	45.8	57.1	22.5	38.0	----	----	35.1	50.1	10.1	1.6	東
3	65.8	101.3	47.1	72.3	----	----	50.2	54.9	46.0	3.7	北北東
4	53.7	197.1	27.6	56.1	13.8	69.5	39.4	45.6	33.8	2.8	東南東
5	46.4	76.5	----	----	9.8	18.4	31.5	51.5	20.7	1.7	南南東
6	56.2	111.1	----	----	10.3	19.7	35.4	50.3	10.3	0.9	南南東
7	45.7	72.7	----	----	15.2	26.0	31.5	51.8	13.5	1.1	南
8	55.7	82.2	----	----	22.9	35.9	37.5	90.8	9.9	1.0	南南東
9	48.6	61.6	----	----	18.8	32.1	36.3	78.1	9.6	0.9	南
10	39.1	59.7	----	----	10.9	20.6	27.3	40.2	12.8	1.1	南
11	38.8	61.6	----	----	9.6	14.6	23.0	37.3	7.7	1.2	南
12	32.2	65.4	----	----	14.0	43.2	45.0	69.1	22.6	0.6	南南東
13	65.1	97.1	----	----	34.6	52.4	49.6	69.7	27.0	1.0	南南東
14	38.2	67.0	----	----	16.6	33.3	34.7	50.8	15.2	1.2	南南西
15	32.7	48.6	----	----	8.5	17.1	31.9	42.1	14.7	2.8	南南西
16	46.2	71.4	----	----	13.3	22.9	33.9	71.1	12.1	1.7	東南
17	31.7	39.0	----	----	8.2	12.7	19.4	24.4	16.2	3.0	南
18	56.3	104.4	43.9	91.7	9.4	13.3	24.0	38.1	8.4	1.4	東南
19	46.1	64.8	33.0	53.3	----	----	30.4	56.6	9.1	0.7	南
20	41.9	62.9	26.7	46.3	----	----	33.0	63.2	15.9	1.1	南
21	34.0	54.9	19.5	39.0	----	----	50.8	61.0	33.5	1.0	西南西
22	37.0	46.0	21.4	30.8	----	----	33.1	51.5	15.6	1.0	南南西
23	46.0	58.1	30.3	41.0	----	----	30.0	57.1	14.4	1.1	東南
24	51.5	65.7	37.8	55.9	----	----	25.3	43.4	12.0	1.2	南南東
25	48.3	64.8	34.1	44.4	----	----	20.4	40.5	10.4	1.1	南
26	57.1	181.6	38.7	70.2	----	----	27.6	64.3	8.9	1.1	南南東
27	49.7	63.5	37.5	50.5	----	----	29.1	59.0	10.9	1.7	南
28	35.8	51.4	24.8	38.7	----	----	20.6	24.3	11.6	2.5	南南東
29	35.3	45.7	23.3	40.0	----	----	28.8	32.3	25.1	3.6	南
30	37.2	55.9	22.8	38.7	----	----	25.0	34.5	9.1	1.9	南
31	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
月平均值	46.2		31.4		14.4		33.1			1.6	
最大值	68.0		47.1		34.6		52.5			3.7	南
發生日期	1		3		13		1			3	37%
日標準值	250		125								
時標準值											
備註											

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01


測站名稱：貢寮國小　　監測方式：24hr連續

檢測項目：NOx/NO、CO、THC/NMHC、TSP、wd、ws、Temp、Hum、%

檢 測 員：[illegible]　　監測日期：101.4.5-6

一、採樣作業及位置：

4/5
△11:00－12:30 架設監測儀器等.
△12:30-12:45 zero cal chk.
△12:45-13:30 span cal chk
△13:30-13:45 zero check chk
△13:45-13:50 zero cal NO,CO
△13:50-14:00 span cal NO,CO.
△14:00-14:05 zero chk NO,CO.
△15:00 收 14:50 TSP Stop

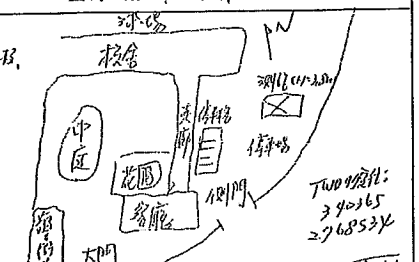

二、現場狀況說明：

△測站旁停車場上下課時段有車輛出入.

△測站旁道路偶有車輛經過

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_8H_8	PM_{10}
最小值	N	4	3	0.3	N	1.81	N	0.15	N
最大值		8	6	0.4		1.89		0.21	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：C:\X0105\5\101049AQ\GC0406.xls

品保品管組：[illegible] 101.4.12

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 □THC □TSP □PM_{10} □Pb □ws □wd □Temp □Hum

檢測員：[illegible]　　監測日期：101.4.5-6

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	P8A-006	1200	1200	1200	1190	1190	1190	14:50	1305	1879200
	P8A-[illegible]	1200	1310		1190	1200		14:50	1440	
PM_{10}								/ :		
								:		
風向	P8A-006							14:30		
	101020023							14:35		
採樣前查校時間		14:20 ~ 14:30			採樣後查校時間			14:51 ~ 14:58		

流量查校

a. 儀器編號 P8A-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7% ?☑是 □否
流量校正器編號 X0599；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。

b. 儀器編號 P8A-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7% ?☑是 □否
流量校正器編號 X0599；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2			//		NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	V	72.8 KPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	V	39.0 KPa	NIEA A421.11C
O_3			//		NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-1017	V	V	82.0 KPa	—
TSP	KIMOTO121FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			//		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a.粒狀物 14:50 b.氣狀物 15:00 c.其它
2. 風速約為 0.2 ~ 1.4 m/s ： 風向多為 西南 風~ 偏南 風
3. 溫度變化 18.5 ~ 19.0 ℃ ： 溼度變化 85 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 761 torr(mm-Hg)

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-0202 台北市中正路788號6樓之2

附錄 IV.2-58 空氣品質監測現場紀錄(101 年 4 月貢寮國小)(續 2)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：□SO_2 ☑NOx □CO □O_3 ☑THC □TSP □PM_{10} □Pb ☑WS ☑WD □Temp □Hum

檢測員：[illegible]　　監測日期：101.4.6-7

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-006	1200	1200	1200	1190	1190	1190	15:00	1305	1839200
	601020744	1200	1310		1190	1300		15:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查校		
	採樣前查校時間 14:57 ~ 14:58	採樣後查校時間 15:01 ~ 15:08
a.	儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量校正器編號 2059；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。	流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
b.	儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量校正器編號 2059；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。	流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2			//		NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	o	23.8 LPM	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	o	24.0 LPM	NIEA A421.11C
O_3			//		NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	1200 次	83.4 cc/min	—
TSP	KIMOTO 1.0 IFT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			//		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 15:00 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 1.7 m/s ： 風向多為 西南 風~ 東南風
3. 溫度變化 11.2 ~ 22.4 ℃ ： 溼度變化 65 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 □陰 □雨)；結束日(□晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 760 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980508(附表十五(9705修訂)

附錄 IV.2-58 空氣品質監測現場紀錄(101 年 4 月貢寮國小)(續 3)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：24-hr連續

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、wd、ws、Temp、Hum%

檢 測 員：[illegible]　　監測日期：101.4.6-7

一、採樣作業及位置：

△15:00 TSP
15:00 起 Setup

二、現場狀況說明：

△測點旁道路偶有車輛行駛過.

△測點旁偶爾會有偶有車輛出入.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	4	3	0.2	X	1.79	X	0.15	X
最大值	/	24	11	0.6	/	1.97	/	0.36	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：C:/X0105/51/100-04/all/ETC/Gem04-7米.米

品保品管組：[illegible] 101.4.12

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980508(附表十六(9608修訂)

檢驗報告專用章
新北市環境檢驗有限公司
電話:(02)7731-3232
新北市中和區中正路738號5樓之2

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：□SO_2 □NOx ☑CO □O_3 ☑THC □TSP □PM_{10} □Pb □WS □Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：潘彥正、范柯順、郭振名　　監測日期：101.4.7-8

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間(HR:MM)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HR:MM)	採樣時間(min)	
TSP	PAH-006	1200	1200	1200	1190	1190	1190	15:10	1205	1877200
	101020025	1200	1310		1190	1300		15:10	1445	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間：15：01～15：08　　採樣後查校時間：15：12～15：20

流量查校：
a. 儀器編號 PAH-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否
流量校正器編號 Sde597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min
b. 儀器編號 PAH-005；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否
流量校正器編號 Sde597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	前後過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量(l/min)	環保公告檢測方法
SO_2			//		NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	O	22.8Kpa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	O	34.0Kpa	NIEA A421.11C
O_3			//		NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	O	0.9 %min	—
TSP	三洋 GS-131FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—	//	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述
1. 監測開始時間：a. 粒狀物 1500 b. 氣狀物 1500 c. 其它
2. 風速均為 0.2 ～ 2.6 m/s ；風向多為 西南 風～ 西南偏西 風
3. 溫度變化 18.8℃～23.7℃ ；濕度變化 70 ～ 95 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 □陰 □雨)；結束日(□晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 761 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：24hr連續

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、wd、WS、Temp、Hum%

檢 測 員：潘彥正、范柯順、郭振名　　監測日期：101.4.7-8

一、採樣作業及位置：

△15:00 AP Replin
15:10 TSP

二、快查校
△15:00-15:10 air ZERO check
△15:10-15:28 CH4 SPAN check(6ppm)
△15:28-15:38 CH4 SPAN check(4ppm)
△15:38-15:45 CH4 ZERO check
△15:45-15:52 NO,CO ZERO check
△15:52-16:05 NO,CO SPAN check(400ppb)
△16:05-16:13 NO,CO SPAN check(600ppb)
△16:13-16:20 NO,CO, ZERO check

二、現場狀況說明：
△測站臺道路偶有汽机車經過、
△假日時段偶有重机車輛經過.
△偶有車輛進入校園修改.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值		5	3	0.2		1.76		0.14	
最大值		6	4	0.3		1.81		0.15	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：之 1X0105\51\ 100-09\APQ\ EPA0408\ 污染

品保品管組：郭振福 101.4.12

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8202 新北市中和區中正路738號3樓之2

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：連續監測.


檢測項目：NOx/NO、CO、THC/NMHC、TSP、We、Wd、Temp、Hum%.

檢 測 員：溫存正、林友祿　　監測日期：101.5.3～101.5.4.

一、採樣作業及位置：

101.5.3

14:30～15:30 整點校帳,測漏,查核
15:30～15:45 CH4 ZERO Cal
15:45～17:00 CH4 SPAN Cal
17:00～17:10 CH4 SPAN Check
17:10～17:30 CH4 ZERO Check
17:30～17:30 NO.CO SPAN ZERO cal
17:30～17:55 NO.CO SPAN Cal
17:55～18:05 NO.CO SPAN Check
18:05～18:15 NO.CO ZERO Check
14:50 TSP Start
15:00 AQ Start.

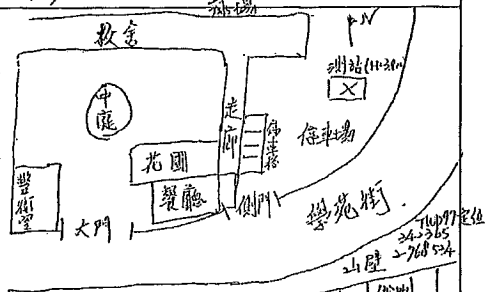

二、現場狀況說明：

1.測站旁貢寮國小上下課時段 家長接送車輛出入易影響測值.
2.測站旁貢寮國小停車場 偶有老師及洽公車輛出入.
3.測站旁道路過有車輛經過.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值		4	>	0.2		1.77		0.11	
最大值		10	8	0.4		1.82		0.17	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\101-05\AQ\GL\GL0504.AQ ***

品保品管組：林依穎 (101.5.11)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：溫存正、林友祿、朱恆毅　　監測日期：101.5.3～101.5.4

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間(HH:MM)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HH:MM)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-006	12.00	12.00	12.00	1180	1180	1180	14:50	1310	18864.00.
	10103035	12.00	12.00		1180	1300		14:50	1440	
PM_{10}										
Bk	PAA-006							14:40		
	10103034							14:45		
流量查核	採樣前查核時間	14:30～14:40			採樣後查核時間			14:50～14:58		

a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查核誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 SI 0527；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。

b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查核誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 SI 0527；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	採樣過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	V	71.9 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	V	33.7 kPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	V	0.9 L/min	—
TSP	KIMOTO 121-FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:50 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ～ 1.7 m/s ； 風向多為 東北 風～ 東北東 風
3. 溫度變化 19.8 ～ 24.6 ℃ ； 溼度變化 77 ～ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☐晴 ☑陰 ☐雨)；結束日(☐晴 ☑陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 754 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、WS、Wd、Temp、Hum%

檢 測 員：林友福、朱順毅　　監測日期：101.5.4～101.5.5

一、採樣作業及位置：

05:00 TSP、AQ start.

二、現場狀況說明：

05:00 測站為貢寮國小上下課時段，家長接送車輛出入易影響測值

05:00 測站為貢寮國小停車場偶有光陸及貨公車輛出入

05:00 測站為道路偶有車輛經過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	7	7	0.3	X	1.83	X	0.13	X
最大值		8	6	0.5		1.87		0.17	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\01-05\AQ\GL\GL0505AQ4.dat

品保品管組：林福禧 101.5.11

A-23

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表十六(9608修訂))

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑WS ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：林友福、朱順毅　　監測日期：101.5.4～101.5.5

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量淨子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量淨子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-006	1200	1200	1200	1180	1180	1180	15:00	1440.	1886400.
	10103026	1200	1370		1180.	1300		15:00	1440	
PM_{10}								:		
~~BC~~	~~PAA-006~~							:		
								:		

流量查核	採樣前查核時間	14:50 ～ 16:58	採樣後查核時間	15:02～15:08
	a. 儀器編號 PAA-006；淨子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；			流量查核誤差是否<±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 No 0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。			
	b. 儀器編號 PAA-006；淨子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；			流量查核誤差是否<±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 X0057；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。			

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	指壓地端紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	——	——	——	——	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	O	71.9 KPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	O	33.7 KPa	NIEA A421.11C
O_3	——	——	——	——	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	O	0.9	—
TSP	KIMOTO 121-FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	——	——	—	——	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 15:00 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ～ 3.6 m/s ： 風向多為 西南 風～東北 風
3. 溫度變化 18.8 ～ 25.5 ℃ ： 溼度變化 57 ～ 98 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 754 torr(mm-Hg)

A-22

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2262 新北市中和區中正路738號5樓之2

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小.

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑flum

檢測員：朱恒毅、賴振岳　　監測日期：101.5.5～101.5.6

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-006	1200	1200	1200	1180	1180	1180	15:10	1310	1886400
	1010302	1200	1320		1180	1300		15:10	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
流量查校	採樣前查校時間	15：02 ～ 15：08			採樣後查校時間			15：12 ～ 15：20		

a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1342 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 A0187；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min。

b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1342 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 A0187；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min。

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環器公告檢測方法
SO_2	———	———	———	———	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	✓	O	91.9 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	✓	O	33.7 kPa	NIEA A421.11C
O_3	———	———	———	———	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	✓	O	0.9 l/min	—
TSP	KIMOTO 131ET	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	———	———	—	———	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 15:10 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ～ 2.3 m/s ；風向多為 東北 風～西南 風
3. 溫度變化 17.0 ～ 25.8 ℃ ；濕度變化 62 ～ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 756 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：連續監測.

檢測項目：NO_x/NO_2. CO. THC/NMHC. TSP. Wd. Ws. Temp. RH%

檢 測 員：朱恒毅、賴振岳　　監測日期：101.5.5～101.5.6.

一、採樣作業及位置：

101.5.5.

△15:00 AQ start

△15:10 TSP start.

101.5.6 中途查核.

△15:00～15:10

CH4 ZERO check.

△15:10～15:40

CH4 SPAN check.

△15:40～15:05

CH4 ZERO check.

△15:05～15:15

NO. CO ZERO check.

△15:15～16:35

NO. CO SPAN check.

△16:35～16:50

NO. CO ZERO check.

二、現場狀況說明：

△測站位於貢寮國小側門旁的停車場內。


△測站東方至南方為學校街、楊梅大型車輛繞過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	3	0.4	/	1.82	/	0.12	/
最大值	/	7	5	0.4	/	1.87	/	0.16	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料儲存位置：L:\X0105\5\101-05\AQ\GL\GL0506米.米.

品保品管組：林恒達 101.5.11



附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：連續監測


檢測項目：NO_x/NO, CO, HTC/MHC, TSP, Ws, Wd, Temp, RH%

檢 測 員：郭旻宗、林友孫　　監測日期：101.5.27 ~ 101.6.28

一、採樣作業及位置：

101.6.27.

△ 整站、吸氣、測漏、查線　(16:00) (16:17)
△ NO, CO, ZERO cal.　16:30~16:35
△ NO, CO, SPAN cal.　16:35~16:45
△ NO, CO ZERO check　16:45~16:50
△ CH_4 ZERO cal.　14:10~14:15
△ CH_4 SPAN cal.　14:15~15:05
△ CH_4 ZERO check　15:05~15:10
△ AQ Sample Start 17:00.
△ TSP Start　16:40

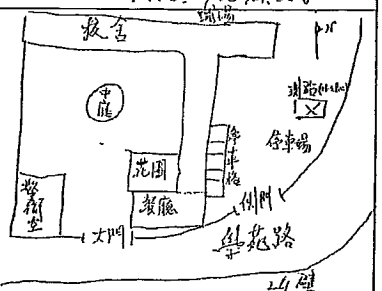

二、現場狀況說明：

△ 測定值於貢寮國小內側門旁停車場.
△ 上下課時間常有車輛出入, 接送學生.
△ 測定旁學校路偶有車輛經過.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值		5	4	0.37		1.70		0.18	
最大值		11	6	0.45		1.78		0.26	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:/X0105/51/101.06/AQ/GL/GL0628.xx.

品保品管組：王振瑞 101.7.5

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：□SO_2 ☑NO_x ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：郭旻宗、林友孫　　監測日期：101.6.27 ~ 101.6.28

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採流量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-005	1160	1160	1160	1150	1150	1150	16:40	1255	1807.200
	101P4032	1160	1160		1150	1150		16:40	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查核			流量查核誤差是否<±7 % ?
	採樣前查核時間	16:20 ~ 16:30	採樣後查核時間	16:40 ~ 16:48
	a. 儀器編號 PAA-005；浮子讀值 1140；實際流量 1342 l/min		☑是 □否
	流量校正器編號 0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min		
	b. 儀器編號 PAA-005；浮子讀值 1140；實際流量 1342 l/min		☑是 □否
	流量校正器編號 0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min		

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	前置過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	V	72.4 KPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	V	73.5 KPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	V	0.9	—
TSP	KIMOTO 1167	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:40　b. 氣狀物 17:00　c. 其它
2. 風速約為 0.1 ~ 2.2 m/s ： 風向多為 西南西 風 ~ 西南 風
3. 溫度變化 25.7 ~ 32.2 ℃ ： 溼度變化 74 ~ 97 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 753.38 torr(mm-Hg)

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9232 新北市中和區中正路738號5樓之1

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：K0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：連續監測.

檢測項目：NOx/NO, CO, THC/NMHC, TSP, Ws, Wd, Temp, RH%.

檢 測 員：林友孫　　監測日期：101.6.28 ~ 101.6.29

一、採樣作業及位置：

1. TSP start 16:50
2. AQ Sample start 17:00

二、現場狀況說明：

1. 測點位於貢寮國小內側門停車場.
2. 上下課時間常有車輛出入接送學生.
3. 測點旁學校路偶有車輛經過.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值		5	4	0.2		1.69		0.16	
最大值		8	5	0.37		1.74		0.20	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\K0105\51\101-06\AQ\GL\GL0629.**

品保品管組：王振孫 101.7.5

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980603(附錄十六(9608修訂)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：K0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☐Temp ☑Hum

檢測員：林友孫　　監測日期：101.6.28 ~ 101.6.29

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(1)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-045	1160	1160	1160	1150	1150	1150	16:50	1455	1807.200
	101C4033	1160	1160		1150	1150		16:50	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查校	採樣前查校時間	16:40 ~ 16:48	採樣後查校時間 16:50 ~ 16:58
	a. 儀器編號 PAA-045；浮子讀值 1140；實際流量 1145 l/min；流量校正器編號 SW0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1143 l/min		流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否
	b. 儀器編號 PAA-045；浮子讀值 1140；實際流量 1145 l/min；流量校正器編號 SW0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1143 l/min		流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	檢查過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	O	72.4 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	O	33.5 kPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	O	0.9	—
TSP	KIMOTO 1HT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 細微物 16:50 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 0.9 ~ 6.0 m/s ： 風向多為西南西風~西北風
3. 溫度變化 27.1 ~ 30.9 °C ： 濕度變化 73 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 757 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980603(附錄十五(9708修訂)

檢驗報告專用章 新北市中和區中正路738號5樓之2 電話:(02)7731-3222

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb □WS □WD ☑Temp ☑Hum

檢測員：林友孫　　監測日期：101.6.29～101.6.30

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間(HR:MN)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HR:MN)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-005	1160	1160	1160	1150	1150	1150	17:00	1255	1807.200
	1010403H	1160	1160		1150	1150		17:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間 16：50 ～ 16：58　　採樣後查校時間 17：02 ～ 17：10

流量查校

a. 儀器編號 PAA-005；浮子讀值 1140；實際流量 1262 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 SN0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1262 l/min

b. 儀器編號 PAA-005；浮子讀值 1140；實際流量 1262 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 SN0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1262 l/min

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量(l/min)	環器公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	O	72.4 KPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	O	33.5 KPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	O	0.9	–
TSP	KIMOTO 1HT	V	–	–	NIEA A102.12A
PM_{10}			–		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:00 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 5.4 ～ 6.0 m/s ；風向多為 西北 風～西北西風
3. 溫度變化 26.0 ～ 31.9 ℃ ；溫度變化 69 ～ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 749 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980508(附表十五(9708修訂)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：貢寮國小　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO, CO, THC/NMHC, TSP, WS, WD, Temp, RH%.

檢 測 員：林友孫　　監測日期：101.6.29～101.6.30

一、採樣作業及位置：

101.6.29
△TSP Start 17:00
△AQ Sample Start 17:00.

6/30 中央查核
△(NO-CO) Zero cal 17:00～17:05
△(NO-CO) SPAN cal 17:05～17:40
△(NO-CO) Zero check 17:40～17:45
△CH4 Zero cal 17:45～17:51
△CH4 SPAN cal 17:51～18:30
△CH4 Zero check 18:30～18:35

二、現場狀況說明：

△測站位於貢寮國小內側門旁停車場.
△上下課時間,常有車輛出入接送學生.
△測站旁學苑路偶有車輛經過.

三、監測結果：

項目	SO_2	NOx	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值		5	4	CO 0.2		1.69		0.16	
最大值		9	6	CO 0.3		1.79		0.23	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

D:/X0105/S1/101-06/AQ/GL/GL0630 林友

品保品管組：林德福 101.7.5

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980508(附表十六(9608修訂)

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3233 中正路788號5樓之1

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：連續監測


檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、Hum%

檢測員：湯存正、林友孫　　監測日期：101.4.27~28

一、採樣作業及位置：

4/27
- 11:00-12:20 零點校正測漂移
- 12:20-12:35 Zero air NOx CO
- 12:35-13:15 Span air NO NO2
- 13:15-13:35 Zero check CO
- 13:35-13:45 Zero air CH4
- 13:45-14:35 Span air CH4
- 14:35-14:40 Zero check CH4
- 14:50 TSP Start
- 15:00 A/C Start

TWD97座標：
3.45162
2768099

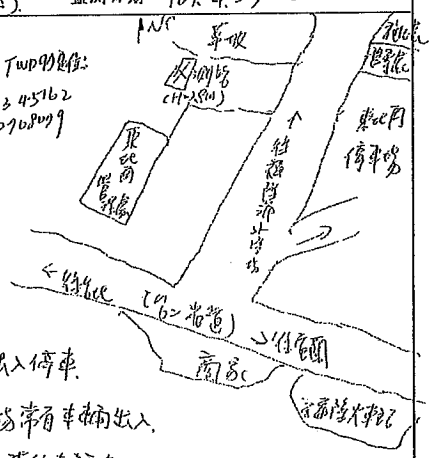

二、現場狀況說明：

- 測項旁空地偶有車輛出入停車
- 測項旁東北角管理處停車場常有車輛出入
- 測項南方100M處為台一省道，常往車輛多

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_8H_8	PM_{10}
最小值		4	3	0.4		1.93		0.12	
最大值		22	14	0.5		11.83		0.14	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	μg/m³

電子資料檔儲存位置：C:\X0105\S1\101.04.27 EN0428.mdb

品保品管組：林俊輝 101.5.2

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：湯存正、林友孫　　監測日期：101.4.27~101.4.28

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-006	1200	1200	1200	1190	1190	1190	14:50	1305	1809200
	101030023	1200	1310		1190	1300		14:50	1440	
PM_{10}								:		
								:		
備註	PAA-006							14:40		
	101040002							14:45		
流量查校	採樣前查校時間	14:28 ~ 14:37			採樣後查校時間			14:57 ~ 15:09		

流量查校：
- a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
  流量校正器編號 X10597：水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min
- b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
  流量校正器編號 X10597：水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環境公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	V	72.3 KPA	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	V	33.7 KPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	V	0.9 l/min	—
TSP	KIMOTO 1MFT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}					NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:50 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 3.6 m/s ； 風向多為 南 風~盛行西風
3. 溫度變化 20.6 ~ 29.4 ℃ ； 濕度變化 21 ~ 99 %
4. 天候狀況　開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 758 torr(mm-Hg)

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2220 中華民國中正路788號3樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd □Temp □Hum

檢測員：楊俊正　　監測日期：101、4、28~29

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總排氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAH-006	1200	1200	1200	1190	1190	1190	15:00	1305	1809/200
	10030044	1200	1310		1190	1300		15:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		
流量查校	採樣前查校時間	14:51~14:59			採樣後查校時間			15:01~15:08		

a. 儀器編號 PAH-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 X0597；水柱壓差 14.5 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。

b. 儀器編號 PAH-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 X0597；水柱壓差 14.5 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min。

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	檢查過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	——	——	——	——	NIEA A416.11C
NOx	HORIBA APNA-370	V	o	72.3 FPM	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	o	25.2 FPM	NIEA A421.11C
O_3	——	——	——	——	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	o	0.7 L/m	—
TSP	KIMOTO 2FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	——	——	——	——	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 15:00 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 2.3 m/s ： 風向多為 南 風~北北西 風
3. 溫度變化 21.0 ~ 30.0 ℃ ： 溼度變化 60 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 758 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：24hr連續

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、wd、ws、Temp、Hum%

檢 測 員：楊俊正　　監測日期：101、4、28~29

一、採樣作業及位置：

4/28 15:00 ADR
15:00 TSP Sampler

二、現場狀況說明：

○測項旁管理處通往海水場較多車輛出入

○測項旁偶有車輛開出入傳車

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	4	3	0.3	/	1.68	/	0.11	/
最大值	/	16	9	0.5	/	1.99	/	0.14	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：C:\X0105\01\1050428\ EN 04039.mdb

品保品管組：不相干 101.5.2

新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 台北市中正區中正路738號3樓之1

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：□SO_2 ☒NOx ☒CO □O_3 ☒THC ☒TSP □PM_{10} □Pb □Ws □Wd □Temp □Hum

檢測員：福彥屯　　監測日期：101、4、29-30

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間(HH:MM)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HH:MM)	採樣時間(min)	
TSP	PAS-006	1300	1200	1200	1190 1190	1190	1190	15:10	1305	1809.00
	10103005	1200	1310		1190	1300		15:10	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查核		
	採樣前查校時間 15:01 ~ 15:08	採樣後查校時間 15:12 ~ 15:19
	a. 儀器編號 PAS-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量校正器編號 405097；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min	流量查校誤差是否<±7 %？☒是 □否
	b. 儀器編號 PAS-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量校正器編號 405097；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min	流量查校誤差是否<±7 %？☒是 □否

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	有無過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2			//		NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA370	V	O	22.3 KPA	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APHA370	V	O	33.7 KPA	NIEA A421.11C
O_3			//		NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA370	V	O	0.9 %/min	—
TSP	Kimoto 101FJ	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			//		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 15:10 b. 氣狀物 15:10 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 2.6 m/s ： 風向多為 南 風~東南 風
3. 溫度變化 23.6 ~ 31.5 ℃ ： 溼度變化 44 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☒晴 □陰 □雨)；結束日(☒晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 759 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：24小時連續

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、WS、Temp、Hum%

檢 測 員：福彥屯　　監測日期：101、4、29-30

一、採樣作業及位置：

15:00 AQ Sampling
15:10 TSP Sampling

0 %
1500-1505 Zero cal CH4
0 1505-1515 Span cal CH4
0 1515-1530 Zero+Span CH4
0 1530-1535 Zero cal NO,CO
0 1535-1600 Span cal NO,CO
0 1600-1605 Zero+Span NO,CO

二、現場狀況說明：

0 測項旁東北側管理處停車場遊客車輛出入頻繁.

0 測項南側約100m處為台一省道、車往車輛多.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	//	5	>	0.2	//	1.66	//	0.11	//
最大值	//	16	10	0.4	//	1.75	//	0.16	//
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：乙2 | X0105 | S11 | 101.04.01 | 乙2、430米.米

品保品管組：李柏樺 101.5.2

檢驗報告專用章 財團法人台灣綜合工程顧問有限公司 電話:(02)7731-2999 中正路788號5樓之2

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：連續監測

檢測項目：風速、CO、風向、TSP、Ws、Wd、Temp、Hum、NOx/NO2、THC/NMHC。

檢 測 員：賴振谷、黃宇智　　監測日期：101.05.24~101.5.25

一、採樣作業及位置：

101.5.24.

△11:00~13:30 架設、暖機、測繪、畫校。

△13:30~13:45 CH4 ZERO cal

△13:35~13:58 CH4 SPAN cal.

△13:50~13:55 NO. CO ZERO cal.

△13:55~14:05 NO. CO SPAN cal.

△14:05~13:15 NO. CO SPAN check


△13:15~13:45 NO. CO ZERO check

△13:45~14:00 CH4 ZERO check

△14:00 TSP start

△14:05~14:10 CH4 SPAN check

△14:13 AQI start

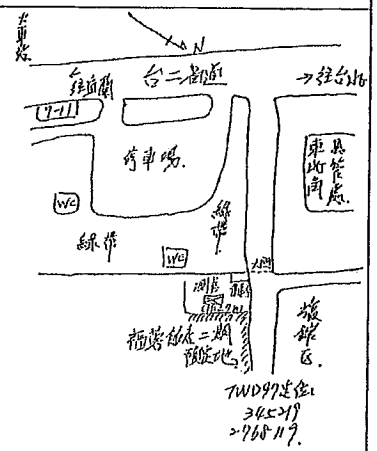

二、現場狀況說明：

△測站設在福隆海水浴場入門旁的空地上。

△測站所在空地，偶有車輛停放。

△測站南方約100公尺處為停車場，常有遊客車輛出入停放。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	4	0.1	/	1.70	/	0.08	/
最大值	/	15	12	0.4	/	1.92	/	0.20	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\2015\51\101-05\AQ\EN\EN0515W.W.

品保品管組：賴振谷 101.5.29　　黃明信 5/29

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980608(附表十六(9608)新訂)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：□SO_2 ☑NO_x □CO □O_3 □THC ☑TSP □PM_{10} □Pb □Ws □Wd □Temp □Hum

檢測員：黃宇智、賴振谷　　監測日期：101.5.24~101.5.25

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量淨子讀值 第1次	初流量淨子讀值 第2次	初流量淨子讀值 第3次	末流量淨子讀值 第1次	末流量淨子讀值 第2次	末流量淨子讀值 第3次	開始時間(HR:MN)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HR:MN)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-006	1200	1200	1200	1180	1180	1180	14:00	1310	1886400
	10103037	1200	1320		1180	1300		14:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
P.K.	PAA-006							13:47		
	10102036							13:58		
流量查校	採樣前查校時間	13:45 ~ 13:55			採樣後查校時間			14:01 ~ 14:08		
	a. 儀器編號 PAA-006；淨子讀值 1150；實際流量 1342 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否									
	流量校正器編號 410597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min									
	b. 儀器編號 PAA-006；淨子讀值 1150；實際流量 1342 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否									
	流量校正器編號 410597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min									

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					
NO_x	HORIBA APNA-370	V	V	90.1 kPa	NIEA A416.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	V	33.8 kPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	V	0.9 l/min	—
TSP	PZMOTO-12IFT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:00 b. 氣狀物 14:13 c. 其它
2. 風速約為 0.7 ~ 5.5 m/s；風向多為 東風 ~ 東北風
3. 溫度變化 28.8 ~ 32.2 ℃；濕度變化 61 ~ 93 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 753 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單第11-1版)-980608(附表十五(9708)新訂)

新光工程顧問有限公司 環境檢驗測定中心 檢驗報告專用章 電話：(02)7731-2232 台北市中正路738號5樓之2

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☐Hum

檢測員：賴振名、葉宗樂、　　監測日期：101.5.25～101.5.26

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HR:MN)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HR:MN)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-006	1200	1300	1200	1180	1180	1180	14:10	1310	1886400
	10102038	1200	1330		1180	1300		14:10	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間	14：02 ～ 14：08	採樣後查校時間	14：12 ～ 14：18	
流量查校	a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1341 l/min；流量校正器編號 3202592；水柱壓差 165 mm-H_2O；校正流量 1241 l/min			流量查校誤差是否＜±7 %？☐是 ☐否
	b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量校正器編號 3202597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1262 l/min			流量查校誤差是否＜±7 %？☐是 ☐否

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	採樣通道氣泡更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	———	———	———	———	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	無UPS✓	0	92.1 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	✓	0	93.8 kPa	NIEA A421.11C
O_3	———	———	———	———	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	✓	0	0.9 l/min	—
TSP	KIMOTO 131F1	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	———	———	—	———	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:10 b. 氣狀物 14:00 c. 其它
2. 風速約為 4.5～10.6 m/s；風向多為 西 風～西北 風
3. 溫度變化 34.0～38.9 ℃；溼度變化 72～93 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 752 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：連續監測

檢測項目：NO_x/NO、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：賴振名、葉宗樂.　　監測日期：101.5.25～101.5.26

一、採樣作業及位置：

101.5.25

△14:00

AQ start

△14:10

TSP start

二、現場狀況說明：

△測站位於福隆海水浴場大門出入口旁的空地上.

△測站附近空地，偶有車輛出入停放.

△測站南方約100公尺處的停車場，常有車輛出入停放.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	3	2	0.2	/	1.72	/	0.09	/
最大值	/	21	18	0.4	/	1.84	/	0.16	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料儲存位置：L:\X0105\S1\101-05\AQ\EM\EM0516 d.w.

品保品管組：賴振名 101.5.29

新北工務局環境監測有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3229 臺中市中正路738號5樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp □Hum

檢測員：黃宥螢、林艷禎　　監測日期：101.05.26～101.05.27

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間(HR:MI)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	流紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HR:MI)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-006	1200	1200	1200	1180	1180	1180	14:20	1310	1886400
	10103039	1200	1320		1180	1300		14:20	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查核時間　14：12～14：18　採樣後查核時間　14：22～14：30

流量查核

a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查核誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 5A10597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查核誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 5A0699；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用前原狀況 OK(V)CHECK(O)	採樣過濾紙更換 是(V) 否(O)	採氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2	——	——	——	——	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	✓	O	72.1 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	✓	O	33.8 kPa	NIEA A421.11C
O_3	——	——	——	——	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	✓	O	0.9 l/min	—
TSP	KIMOTO 121ET	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	——	——	—	——	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 1320 b. 氣狀物 14:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ～ 0.5 m/s ； 風向多為 東北 風～ 西南 風
3. 溫度變化 23.8 ～ 27.0 ℃ ； 溫度變化 81 ～ 98 %
4. 天候狀況　開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 752 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：連續監測

檢測項目：TSP、NO、NO_2、CO、THC、CH_4、WD、WS、Temp、RH%

檢測員：黃宥螢、林艷禎　　監測日期：101.05.26～101.05.27

一、採樣作業及位置：

101-5-26

△ 10:00
AQ: start

△ 14:20
TSP start

△101.5.29 中壢站
△14:00～14:40 Zero check (NO.CO)
△14:40～15:15 span check (NO.CO)
△15:15～15:35 zero check (NO.CO)
△15:40～15:50 zero check (CH4)
△15:40～15:50 span check (CH4)

二、現場狀況說明：△15:50～16:00 zero check (CH4)
△測站位於福隆海水浴場大門警察地上。
△測站兩旁約100公尺處為停車場，出當車輛進出多。
△福隆海水浴場舉辦沙雕季活動，進出人員及車輛多。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	4	2	0.2	/	1.70	/	0.09	/
最大值	d	11	9	0.3	d	1.80	d	0.16	d
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-05\AQ\EW\~~EW0526.XX~~ (假檔案名)
EW0527.XX

品保品管組：賴振杏 101.5.29

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗專用章 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 臺中市西屯區中正路788號5樓之4

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01


測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：連續監測

檢測項目：TSP、NOx/NO2、CO、THC/NMHC、WS、Wd、Temp、RH%

檢 測 員：林振禧、林友祿　　監測日期：101.6.23～6.24

一、採樣作業及位置：

△採樣點確認、測漏、重設(指針歸零)　11:15～12:20
△Zero cal (NO.CO)　12:20～12:31
△Span cal (NO.CO)　12:31～13:10
△Zero check (NO.CO)　13:10～13:20
△Zero cal (CH4)　13:25～13:35
△Span cal (CH4)　13:35～13:54
△Zero check (CH4)　13:54～14:03
△SAMPLE IN 14:03
△AM SAMPLE START 14:10
△TSP START 14:00

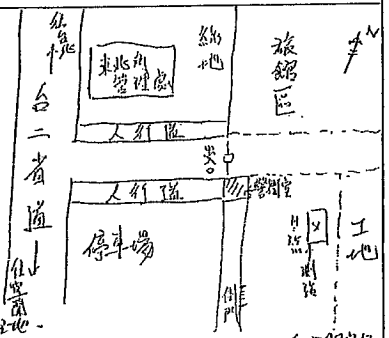

二、現場狀況說明：

△測站位於福隆海水浴場入口旁空地。
△常有遊客出入福隆海水浴場，偶有車輛從旁出入。
△測站鄰近停車場，進出最大(假日期間)。
△福隆海水浴場且鄰近海風吹襲沙塵嚴。

TWD97定位
345219
2768119

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	4	0.1	/	1.67	/	0.11	/
最大值	/	24	23	0.3	/	1.81	/	0.22	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	μg/m³

電子資料檔儲存位置：

C:/X0105/S1/101-06/AQ/FL/FL0624.xls

品保品管組：林振禧 101.7.5

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表十六(9608修訂))

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：□SO_2 ☑NOx □CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑WS ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：林振禧、林友祿　　監測日期：101.6.23～6.24

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間(HH:MM) / 結束時間(HH:MM)	平均流量(l/min) / 採樣時間(min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)				
TSP	PAA-035	1200	1200	1200	1180	1180	1180	14:00	1300	1872000
	01040029	1200	1210		1180	1190		14:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
日水	PAA-035							13:54		
	10101060							13:57		
流量查校	採樣前查校時間	13:46～13:54			採樣後查校時間			14:00～14:08		
	a. 儀器編號 PAA-035；浮子讀值 1350；實際流量 1480 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否									
	流量校正器編號 X0199；水柱壓差 203 mm-H_2O；校正流量 1421 l/min									
	b. 儀器編號 PAA-035；浮子讀值 1350；實際流量 1480 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否									
	流量校正器編號 X0199；水柱壓差 203 mm-H_2O；校正流量 1421 l/min									

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	採樣過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2	〃	〃	〃	〃	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	V	22.6 kpa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	V	33.4 kPa	NIEA A421.11C
O_3	〃	〃	〃	〃	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	V	0.9	-
TSP	KIMOTO 1217	V	-	-	NIEA A102.12A
PM_{10}	〃	〃	-	〃	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:00 b. 氣狀物 14:10 c. 其它 面 林振禧
2. 風速約為 0.3 ～ 3.0 m/s ： 風向多為 東北 風～ 西南 風
3. 溫度變化 25.4 ～ 31.4 ℃ ： 濕度變化 71 ～ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 754 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表十五(9708修訂))

新北市中和區中正路738號5樓之2 新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9292

附錄 IV.2-63 空氣品質監測現場紀錄(101 年 6 月福隆海水浴場)(續 2)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑WS □Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：朱柏毅、杜友孫　　監測日期：101.6.24～101.6.25

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量淨子讀值 第1次	初流量淨子讀值 第2次	初流量淨子讀值 第3次	末流量淨子讀值 第1次	末流量淨子讀值 第2次	末流量淨子讀值 第3次	開始時間(HR:MIN)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HR:MIN)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-015	1200	1200	1200	1180	1180	1180	14:10	1300	1873000
	10104030	1200	1310		1180	1390		14:10	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

流量查校	採樣前查校時間	14：00 ～ 14：08	採樣後查校時間	14：10 ～ 14：18
	a.儀器編號 PAA-015；淨子讀值 1350；實際流量 1480 l/min			流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 SW0597；水柱壓差 303 mm-H_2O；校正流量 1471 l/min			
	b.儀器編號 PAA-015；淨子讀值 1350；實際流量 1486 l/min			流量查校誤差是否<±7 %？□是 □否
	流量校正器編號 SW0597；水柱壓差 303 mm-H_2O；校正流量 1471 l/min			

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	紙帶過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	V	O	73.6 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	O	33.4 kPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	O	0.9	—
TSP	KIMOTO 1317	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a.粒狀物 14:10 b.氣狀物 14:00 c.其它
2. 風速約為 0.3 ～ 3.9 m/s ；風向多為 西南西 風～ 東北東 風
3. 溫度變化 25.1 ～ 32.8 ℃ ；濕度變化 68 ～ 97 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 754 torr(mm-Hg)

附錄 IV.2-63 空氣品質監測現場紀錄(101 年 6 月福隆海水浴場)(續 3)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、wd、ws、Temp、RH%、TSP

檢 測 員：杜友孫、朱柏毅　　監測日期：101.6.24～101.6.25

一、採樣作業及位置：

6/24 AQ Sample start 14:00

TSP Start 14:10

二、現場狀況說明：

1. 測點位於福隆海水浴場入口停車地
2. 常有遊客出入福隆海水浴場，偶有車輛經過出入口。
3. 測站前方停車場進出量大（假日期間）
4. 福隆海水浴場目前舉辦國際沙雕賽。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值		4	3	0.2		1.68		0.75	
最大值		26	13	0.3		1.77		0.20	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	μg/m³

電子資料檔儲存位置：

L:/X0105/S1/101-06/AQ/TL/TL_0625.xx

品保品管經：朱柏毅 101.7.5

新北市中和區中正路738號5樓之5 新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3239

附錄 IV.2-63 空氣品質監測現場紀錄(101 年 6 月福隆海水浴場)(續 4)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場

檢測項目：☐SO_2 ☐NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑WS ☑Wd ☐Temp ☑Hum

檢測員：林友發、朱柏毅　　監測日期：101.6.25～101.6.26

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間(HR:MN)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HR:MN)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-045	1300	1300	1300	1180	1180	1180	14:30	1300	187>1000
	1010403	1300	1310		1186	1190		14:30	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查核			
採樣前查核時間	14：10 ～ 14：18	採樣後查核時間	14:30 ～ 14：38
a. 儀器編號 PAA-045；浮子讀值 1350；實際流量 1480 l/min；流量校正器編號 SM0597；水柱壓差 203 mm-H_2O；校正流量 1471 l/min			流量查核誤差是否<±7 %？☑是 ☐否
b. 儀器編號 PAA-045；浮子讀值 1350；實際流量 1480 l/min；流量校正器編號 SM0597；水柱壓差 203 mm-H_2O；校正流量 1471 l/min			流量查核誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APHA-370	V	O	32.6 l/Pm	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	O	33.4 l/Pm	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	O	0.9	–
TSP	KIMOTO 1HFT	V	–	–	NIEA A102.12A
PM_{10}			–		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:30 b. 氣狀物 14:00 c. 其它
2. 風速範圍 0.3 ～ 3.0 m/s ： 風向多為 西南風 風～東北東風
3. 溫度變化 26.0 ～ 32.8 ℃ ： 濕度變化 67 ～ 97 %
4. 天候狀況 開始日(V)晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(V)晴 ☐陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 753 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-950608(附表十五(9508修訂)

附錄 IV.2-63 空氣品質監測現場紀錄(101 年 6 月福隆海水浴場)(續 5)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆海水浴場　　監測方式：連續監測.

檢測項目：NO_x/NO_2, CO, THC/NMHC, TSP, Wd, Ws, Temp, RH%.

檢 測 員：林友發、朱柏毅　　監測日期：101.6.25～101.6.26.

一、採樣作業及位置：

101.6.25

△ AIR sample start 14:00

△ TSP start 14:30

101.6.26. 中午蓋錶.

△ CH_4 ZERO check 14:00～14:10

△ CH_4 SPAN check 14:10～14:20

△ CH_4 ZERO check 14:20～14:25

△ NO.CO ZERO check 14:25～14:45

△ NO.CO SPAN check 14:45～15:05

△ NO.CO ZERO check 15:05～15:15

二、現場狀況說明：

△測点位於福隆海水浴場入口旁空地.

△常有遊客出入福隆海水浴場,偶有車輛經過出入口.

□測点再為停車場偶有車輛進出停放(非假日期間).

△福隆海水浴場日前舉辦國際沙雕節.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_8H_8	PM_{10}
最小值		4	2	0.2		1.68		0.15	
最大值		14	10	0.2		1.77		0.22	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:/X0105/S1/101-06/AQ/TL/FL0626 *.*

品保品管組：林俊彥 101.7.5

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-950608(附表十六(9508修訂)

新宏工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 臺中市中正路738號5樓之1

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01


測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO2、CO, THC/NMHC, TSP、WD、WS、Temp、RH%

檢 測 員：朱柏毅　　監測日期：101.4.2-3

一、採樣作業及位置：

△08:30—09:40 空氣品質測站例行校驗
△09:40—09:45 THC ZERO
△09:45—10:20 THC SPAN
△10:20—10:25 THC zero check.
△10:25—10:35 NO.CO ZERO
△10:35—11:01 NO.CO SPAN
△11:01—11:09 NO.CO zero check
△11:00 TSP start
△11:09 AQ start.

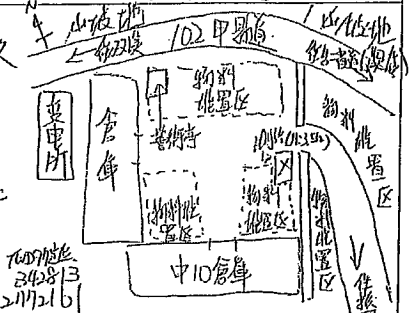

二、現場狀況說明：

△測站位於物回收能門他工區中10倉庫前3公尺地上
△測站旁道路偶有他工人員車輛經過，並有保警每4小時駕機車經過。
△測站北方約80M處為102甲縣道偶有車輛經過

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	4	2	0.1	X	1.84	X	0.10	X
最大值		10	8	0.2		2.05		0.19	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\81\101-04\AQ\IL\IL0403 AQ朱.xls

品保品管組：朱柏毅 101.4.10

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑WS ☑WD ☑Temp ☑Hum

檢測員：朱柏毅　　監測日期：101.4.2-3

一、粒狀污染物採樣記錄

項目 \ 內容	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-024	1100	1100	1100	1080	1080	1080	11:00	1215	1749600
	10102024	1100	1230		1080	1200		11:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
BK	PAA-024							10:35		
	10102013							10:40		

採樣前查校時間	10:20~10:30	採樣後查校時間	11:00~11:08	
流量查校	a. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min			流量查校誤差是否<±7%？☑是 □否
	流量校正器編號 SL0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min			
	b. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min			流量查校誤差是否<±7%？☑是 □否
	流量校正器編號 SL0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min			

二、儀器使用查對

項目 \ 內容	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	物質過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	V	0.8	NIEA A417.11C
CO	API 300E	V	V	0.89	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	V	0.8	—
TSP	KIMOTO 121FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 11:00 b. 氣狀物 11:09 c. 其它
2. 風速均為 0.2~5.1 m/s ： 風向多為 西北 風~偏北南 風
3. 溫度變化 19.4~27.8 ℃ ： 濕度變化 57~90 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 765 torr(mm-Hg)

附錄 IV.2-64 空氣品質監測現場紀錄(101 年 4 月川島養殖池)(續 3)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、WD、WS、Temp、RH%

檢 測 員：朱恆毅　　監測日期：101.4.3-4

一、採樣作業及位置：

3/4 11:00 AQ start

△ 11:10 TSP start.

二、現場狀況說明：

△測站為緊臨內道路偶有小型車輛及保養車輛經過易產生揚塵、

△測站北約約80m處為102甲線道偶有車輛經過.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	4	2	0.1	X	1.87	X	0.10	X
最大值		9	6	0.3		1.98		0.15	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	μg/m³

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\01-04\AQ\TL\TL0404\10米來

品保品管組：林恒耀 101.4.10

A-23

RP-03-C-01(紀錄表單張11-2版)-980503制表十六(9503修訂)

新北工程顧問有限公司 品質管理專用章 校驗報告 電話:(02)7731-3222 新北市中正路738號6樓之1

附錄 IV.2-64 空氣品質監測現場紀錄(101 年 4 月川島養殖池)(續 2)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：朱恆毅、張祖聰　　監測日期：101.4.3-4

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM) / 結束時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min) / 採樣時間 (min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)				
TSP	PAA-024	1100	1100	1100	1080	1080	1080	11 :10	1215	1749600
	10102015	1100	1280		1080	1200		11 :10	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查校			
	採樣前查校時間	11 :00 ~ 11 :08	採樣後查校時間 11 :12 ~ 11 :18
	a. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120 ；實際流量 1252 l/min	流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否	
	流量校正器編號 L0659；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min		
	b. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120 ；實際流量 1250 l/min	流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否	
	流量校正器編號 L0659；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min		

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	前處過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環器公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_X	HORIBA APNA-360	✓	0	0.8	NIEA A417.11C
CO	API 300E	✓	0	0.89	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	✓	0	0.8	—
TSP	KIMOTO 121FT	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 11:10 b. 氣狀物 11:00 c. 其它

2. 風速約為 0.3 ~ 5.1 m/s；風向多為 南南東 風~ 西北西 風

3. 溫度變化 12.7 ~ 未記錄 ℃；溫度變化 55 ~ 92 %

4. 天候狀況　開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(□晴 □陰 □雨)

5. 大氣壓力 726 torr(mm-Hg)

A-22

RP-03-C-01(紀錄表單張11-2版)-980503制表十五(9503修訂)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp □Hum

檢測員：范品聰、朱俐穎　　監測日期：101.4.4 - 101.4.5

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MN)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HR:MN)	採樣時間 (min)	
TSP	PMA-024	1100	1100	1100	1080	1080	1080	11 :20	1215	1749600
	10102016	1100	1230		1080	1200		11 :20	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間 11 :12 ~ 11 :18　　採樣後查校時間 11 :20 ~ 11 :30

流量查校

a. 儀器編號 PMA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 20596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

b. 儀器編號 PMA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1254 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 20596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	溶壓過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	項番公告 檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	O	0.8	NIEA A417.11C
CO	APT 300E	V	O	0.89	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	O	0.8	—
TSP	KIMOTO 1-2PRT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 1120 b. 氣狀物 1120 c. 其它
2. 風速約為 0.3 m/s；風向多為 南 風~西北西 風
3. 溫度變化 18.1 ~ 23.0 ℃；濕度變化 53 ~ 90 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 766 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980603(附表十五(9703修訂)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、WS、Temp、RH%

檢 測 員：范品聰、朱俐穎　　監測日期：101.4.4 - 101.4.5

一、採樣作業及位置：

△11:00 AQ START

△11:20 TSP START

△11:20-11:40 NO、CO zero

△11:40-12:00 NO、CO 校準後

△12:00-12:10 NO、CO zero check

△12:10-12:15 THC zero

△12:15-12:35 THC 校準後

△12:35-12:40 THC zero check

二、現場狀況說明：

△測點旁偶有工程車輛及保警執勤經過巡查。

△測點北方約80m處為102甲線道，偶有車輛經過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	4	2	0.1	X	185	X	0.10	X
最大值		6	4	0.2		1.94		0.13	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\101-04\AQ\TL\TL0405AQ.xls

品保品管組：李昆穎 101.4.10

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980603(附表十六(9703修訂)

檢驗報告專用章
財團法人中興工程顧問股份有限公司
台灣中小企業
台灣
電話:(02)7731-8222
台北市中正路738號5樓之2

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO2, CO, THC/CH4C, TSP, Wd, Ws, Temp, RH%

檢 測 員：朱福毅　　監測日期：101.5.6-7

一、採樣作業及位置：

5/6 Δ18:30-19:20 架設設備,測場查核

Δ19:20-19:30 NO, CO ZERO

Δ19:30-19:55 NO, CO SPAN

Δ19:55-20:03 NO, CO ZERO check


Δ20:03-20:10 THC ZERO

Δ20:10-20:33 THC SPAN

Δ20:33-20:40 THC ZERO check

Δ20:40 sample on

5/7 Δ09:50 tsp start, Δ10:00 AQ start

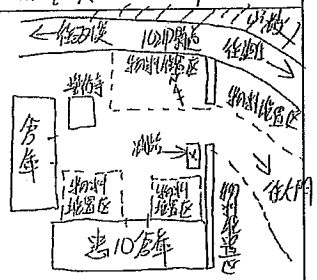

二、現場狀況說明：

Δ測站位於採樣四面區內距10倉庫前空地上。

Δ測站附近102甲縣道偶有車輛經過

Δ測站鳥瞰區內道路偶有保養人員騎車經過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_8H_8	PM_{10}
最小值	X	5	3	0.1	X	1.77	X	0.11	X
最大值		9	6	0.2		1.86		0.13	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	μg/m³

電子資料儲存位置：

L:\X0105\S1\101-05\AQ\TL\TL05D7AQ.未來

品保品管組：王冠鑫 101.5.18

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：朱福毅　　監測日期：101.5.6-7

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-019	1250	1250	1250	1240	1240	1240	09:50	1285	1850400
	10103015	1250	1290		1240	1280		09:50	1440	
PM_{10}										

採樣前查校時間：09:20 ~ 09:30　　採樣後查校時間：09:50 ~ 09:58

流量查校

a. 儀器編號 PAA-019；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校結果是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 X0105；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

b. 儀器編號 PAA-019；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 X0105；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	檢查過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	ECOTECH ML-9841	V	V	0.64	NIEA A417.11C
CO	0AS161 3008	V	V	1.0	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	V	0.9	—
TSP	KIMOTO 121FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 09:50 b. 氣狀物 10:00 c. 其它

2. 風速約為 0.2 ~ 2.9 m/s ： 風向多為 極北風 ~ 東 風

3. 溫度變化 18.6 ~ 29.2 ℃ ： 濕度變化 55 ~ 92 %

4. 天候狀況 開始日(V)晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)

5. 大氣壓力 723 torr(mm-Hg)

檢驗報告專用章 台灣綠保工程顧問有限公司 台中市中正路738號5樓之4 電話:(02)7731-9229

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Illum

檢測員：朱柄毅　　監測日期：101.5.7-8

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子指值 第1次	初流量浮子指值 第2次	初流量浮子指值 第3次	末流量浮子指值 第1次	末流量浮子指值 第2次	末流量浮子指值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-019	1250	1250	1250	1240	1240	1240	10:00	1285	1850400
	1010316	1250	1290		1240	1280		10:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查校

採樣前查校時間 09:50 ~ 09:58　　採樣後查校時間 10:00 ~ 10:08

a. 儀器編號 PAA-019；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 3X0575；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

b. 儀器編號 PAA-019；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 3X0575；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	採用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	ECOTECH ML-9841	V	是☑ 否○	0.64	NIEA A417.11C
CO	dasibi 3008	V	是☑ 否○	1.0	NIEA A421.11C
O_3	—	—	是○ 否○	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	是☑ 否○	0.9	—
TSP	KIMOTO 121F	V	是- 否-	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 10:00 b. 氣狀物 10:00 c. 其它
2. 風速約為 0.4 ~ 4.1 m/s ： 風向多為西北西風~南南東風
3. 溫度變化 21.2 ~ 30.0 ℃ ： 溫度變化 52 ~ 90 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 767 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單頁11-2版)-980608(附表十五(9808修訂))

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO_2、CO、THC/NMC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH

檢 測 員：朱柄毅　　監測日期：101.5.7-8

一、採樣作業及位置：

△10:00 TSP、AQ-Stack、

二、現場狀況說明：

△測站旁道路日間時段偶有施工車輛出入。

△測站附近102甲路道偶有車輛經過

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	6	4	0.2	X	1.78	X	0.11	X
最大值		13	9	0.3		1.94		0.19	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\101-05\AQ\IL\IL0508AQ.xls

品保品管組：王振禮 101.5.11

RP-03-C-01(記錄表單頁11-2版)-980608(附表十六(9808修訂))

檢驗報告專用章 新竹工業區環境保護中心 電話:(03)5773131 傳真:5726592 新竹市中正路588號5樓之2

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp □Hum

檢測員：朱炳毅　　監測日期：101.5.8-9

一、粒狀污染物採樣記錄

項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MN)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HR:MN)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-017	1250	1250	1250	1240	1240	1240	10:10	1285	18504.00
	10103017	1250	1290		1240	1250		10:10	1440	
PM_{10}										
										—

流量查校	採樣前查校時間	10:00~10:08	採樣後查校時間	10:10~10:20
	a. 儀器編號 PAA-017；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min			流量查校誤差是否< ±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 SM595；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min			
	b. 儀器編號 PAA-017；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min			流量查校誤差是否< ±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 SM595；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min			

二、儀器使用查對

項目 / 內容	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	採樣過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	ECOTECH ML9841	V	O	0.64	NIEA A417.11C
CO	CASLAB 2008	V	O	1.0	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-350	V	O	0.5	—
TSP	KANOMAX 1247	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 1020 b. 氣狀物 1000 c. 其它
2. 風速約為 0.2~3.3 m/s ： 風向多數西北西風~南風
3. 溫度變化 26.5~31.0℃ ： 濕度變化 55~94 %
4. 天候狀況，開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 762 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：朱炳毅　　監測日期：101.5.8-9

一、採樣作業及位置：

△10:00 AQ start

△10:10 TSP start

二、現場狀況說明：

△測站旁道路偶有施工人員車輛及保警人員車輛經過

△測站附近102甲縣道，偶有車輛經過

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	—	6	4	0.1	—	1.77	—	0.12	—
最大值		16	11	0.3		1.99		0.23	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\101-05\AQ\IL\IL0509AQ朱炳毅

品保品管組：李明達 101.5.18

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-0292 臺中市中正路738號5樓之1

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續24hr

檢測項目：NOx/NO2. CO. THC/CH4HC. Temp. Ws. Wd. Temp. RH%

檢 測 員：郭景豪　　監測日期：101.6.22～23

一、採樣作業及位置：

6/22 △開始. 暖氣. 測漏查校
11:30/12:00
△CH4 Zero cal 13:00～13:10
△CH4 Span cal 13:10～13:40
△CH4 Zero check 13:40～13:50
△(NO、CO) Zero cal 13:45～13:55
△(NO、CO) Span cal 13:55～15:04
△(NO、CO) Zero check 15:04～15:10
△ Tsp start 14:40
△ Wd start 15:11



二、現場狀況說明：

△101甲道車流量小偶有大型車輛經過
△測站旁偶有廠區工程車輛經過

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	4	3	0.2	/	1.82	/	0.16	/
最大值	/	6	4	0.4	/	1.92	/	0.20	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\51\101-06\AQ\工L工 0622文

品保品管組：林振輝 101.6.28

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Humm

檢測員：郭景豪　　監測日期：101.6.22～23

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM) / 結束時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min) / 採樣時間 (min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)				
TSP	PAA-074	1150	1150	1150	1140	1140	1140	14:40	1285	1850+1440
	101040123	1150	1290		1140	1280		14:40	1440	郭景豪
PM_{10}								:		
								:		
以下	PAA-074							14:35		
	101040222							14:36		
	採樣前查校時間	14:20～14:20			採樣後查校時間			14:41～14:48		
流量查校	a. 儀器編號 PAA-074；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否									
	流量校正器編號 SW0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min									
	b. 儀器編號 PAA-074；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否									
	流量校正器編號 SW0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min									

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	檢查過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	✓	✓	0.8	NIEA A417.11C
CO	API-300E	✓	✓	0.89	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	✓	✓	0.8	—
TSP	KIMOTO 1HT	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:40 b. 氣狀物 15:11 c. 其它
2. 風速約為 0.3 ～ 1.7 m/s ： 風向多為 東北東風～東 風
3. 溫度變化 23.9 ～ 30.3 ℃ ： 濕度變化 70 ～ 92 %
4. 天候狀況　開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 758 torr(mm-Hg)

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-5857 新北市中和區中正路738號5樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：鄧景榮　　監測日期：101.6.23～24

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量淨子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量淨子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採樣量(l)
	流紋編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-074	1150	1150	1150	1140	1140	1140	14：50	1285	1850400
	10104-074	1150	1290		1140	1280		14：50	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間 14：41～14：48　　採樣後查校時間 14：51～14：58

流量查校

a. 儀器編號 PAA-074；淨子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量校正器編號 5W0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min；流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否

b. 儀器編號 PAA-074；淨子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量校正器編號 5W0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min；流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用前保養狀況 OK(v)CHECK(o)	採樣過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	O	0.8	NIEA A417.11C
CO	APT-300E	V	O	0.89	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	O	0.8	—
TSP	KZ-120 12177	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:50 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2～2.1 m/s ： 風向多為 西北西風～西北風
3. 溫度變化 24.5～30.2 ℃ ： 溼度變化 71～92 %
4. 天候狀況 開始日 (☑晴 □陰 □雨)；結束日 (☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 758 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980508(附表十五(9708修訂))

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續24hr

檢測項目：NOx/NO2, CO, THC/NMHC, Tsp, Ws, Wd, Temp, RH%

檢 測 員：鄧景榮　　監測日期：101.6.23～24

一、採樣作業及位置：

△ Tsp start 14:50

△ AQ start 15:00

二、現場狀況說明：

△ 測站旁偶有廠區駐警騎車經過。

△ 102甲果道車偶有重型車輛通過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	4	3	0.2	/	1.76	/	0.16	/
最大值	/	7	5	0.2	/	1.89	/	0.20	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\分\101-06\HR\IL\IL0624.txt

品保品管組：王佳穎 101.6.28

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980508(附表十六(9708修訂))

檢驗報告專用章 新竹工程顧問有限公司 環境檢驗室 電話:(03)7731-9999 新竹市中正路738號5樓之1

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：XD105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☐Temp ☑Hum

檢測員：鄧景富　　監測日期：101.6.24~25

一、粒狀污染物採樣記錄

項目 \ 內容	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MIN)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HR:MIN)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-024	1150	1150	1150	1140	1140	1140	15:00	1285	1850400
	101040025	1150	1280		1140	1280		15:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

流量查校

採樣前查校時間 14:51~14:58　　採樣後查校時間 15:02~15:10

a. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min　流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 SN0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

b. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min　流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 SN0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

二、儀器使用查對

項目 \ 內容	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	O	0.8	NIEA A417.11C
CO	API-300E	V	O	0.89	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	O	0.8	—
TSP	KIMOTO 121A7	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 15:00 b. 氣狀物 15:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 2.3 m/s ： 風向多為 東北風~東南東風
3. 溫度變化 24.2 ~ 30.8 ℃ ： 濕度變化 70 ~ 93 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 115.9 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：XD105　　計畫期數：01

測站名稱：川島養殖池　　監測方式：連續>24hr

檢測項目：NOx/NO, CO, THC/CH4/NMHC, TSP, WS, WD, Temp, RH%

檢 測 員：鄧景富　　監測日期：101.6.24~25

一、採樣作業及位置：

6/25 中央管制

△TSP, AQ start 15:00

△CH4 Zero cal 15:00~15:05

△CH4 SPAN cal 15:05~15:25

△CH4 Zero cal 15:25~15:30

△(NO, CO) Zero cal 15:30~15:35

△(NO, CO) SPAN cal 15:35~15:55

△(NO, CO) Zero check 15:55~16:00

二、現場狀況說明：

△107甲線通車流量小，偶有大型車經過。

△3附近偶有廠區工程車輛經過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	4	3	0.2	/	1.77	/	0.16	/
最大值	/	8	5	0.4	/	1.86	/	設備故障	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm 計算	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\XD105\01\101-06\RAW\IL0625.xx

品保品管組：林振輝 101.6.28

環境工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3990 臺中市西屯區正路788號5樓之4

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：XD105　　計畫期數：0

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO、CO、THC/NMHC、TSP、WI、WS、Temp、RH%

檢 測 員：[illegible]毅　　監測日期：101.4.5-6

一、採樣作業及位置：

△13:40-14:40 零值與測漂移檢查

△14:40-14:50 THC ZERO

△14:50-15:25 THC SPAN

△15:25-15:35 THC ZERO check

△15:35-15:40 NO、CO ZERO


△15:40-16:20 NO、CO SPAN

△16:20-16:35 NO、CO ZERO check

△16:35 sample in

△16:50 TSP start

△17:00 AQ start

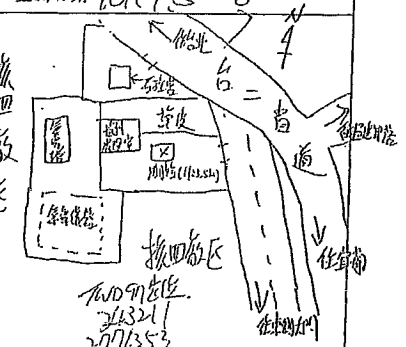

二、現場狀況說明：

△測站在往擺回嶺隧道坪林方向地上

△測站西北方約40m處為石碇宮，偶有民眾祭拜燃燒紙錢

△測站為往二省道偶有大型車及貨車經過且車流量大

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	4	2	0.1	X	1.68	X	0.12	X
最大值		31	24	0.4		2.99		0.15	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\XD105\S1\101-04\AQ\ST\ST0406AQ.xls

品保品管組：[illegible]101.4.12

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980609(附表十六(9603修訂))

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：XD105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☐THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☐WS ☐Wd ☐Temp ☑Hum

檢測員：[illegible]毅　　監測日期：101.4.5-6

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MN)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HR:MN)	採樣時間 (min)	
TSP	bAA-024	1100	1100	1100	1080	1080	1080	16:50	1215	1749600
	10102017	1100	1230		1080	1200		16:50	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間	16:20 ~ 16:30	採樣後查校時間	16:50 ~ 16:58	
流量查校	a. 儀器編號 AAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min	流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否		
	流量校正器編號 SA0516；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min			
	b. 儀器編號 AAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min	流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否		
	流量校正器編號 SA0516；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min			

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	V	0.8	NIEA A417.11C
CO	API 300E	V	V	0.88	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	V	0.8	--
TSP	KIMOTO 121F	V	-	-	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	-	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:50 b. 氣狀物 17:00 c. 共包
2. 風速約為 0.4 ~ 3.8 m/s ： 風向多為 北北西 風~東北 風
3. 溫度變化 16.8 ~ 20.4 ℃ ： 溫度變化 57 ~ 97 %
4. 天候狀況 開始日(☐晴 ☑陰 ☐雨)；結束日(☐晴 ☑陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 766 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980609(附表十五(9708修訂))

新統工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9292 中正路738號5樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☐Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：朱福銀　　監測日期：101、4、6-7

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間(HR:MIN)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HR:MIN)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-024	1100	1100	1100	1080	1080	1080	17:00	1215	1749600
	10102018	100	1230		080	1200		17:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
	採樣前查校時間	16:50 ~16:58			採樣後查校時間			17:00~17:08		

流量查校

a. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量查校採樣是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 SN0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

b. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量查校結果是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 SN0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(v)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(v) 否(o)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2	——	——	——	——	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	0	0.85	NIEA A417.11C
CO	API 300E	V	0	0.88	NIEA A421.11C
O_3	——	——	——	——	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APNA-360	V	0	0.8	—
TSP	KIMOTO 121-FT	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	——	——	—	——	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:00 b. 氣狀物 17:00 c. 其它 ——
2. 風速約為 0.4 ~ 4.6 m/s ： 風向多為 西北 風~ 北風
3. 溫度變化 16.0 ~ 22.5 ℃ ： 濕度變化 61 ~ 93 %
4. 天候狀況 開始自(□晴 ☑陰 □雨)；結束自(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 765 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續監測

檢測項目：NO_x/NO_2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：朱福銀　　監測日期：101、4、6-7

一、採樣作業及位置：

△17:00 AQ, TSP start

二、現場狀況說明：

△測站西方3~4者道車流量大，偶有大型車及大貨車經過

△測站西北方約40m處為石碇宮，偶有民眾祭拜。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	5	4	0.1	X	1.87	X	0.12	X
最大值		14	11	0.3		1.98		0.14	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\101-04\AQ\ST\ST040710.txt

品保品管組：李祖德 101.4.12

新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 臺中市中正路738號5樓之2

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC □WSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd □Temp ☑Hum

檢測員：朱福毅、賴振在、林炎禎　　監測日期：101.4.7-8

一、粒狀污染物採樣記錄

項目	儀器編號 / 濾紙編號	物流量淳子讀值 第1次 3次平均值	物流量淳子讀值 第2次 實際初流量(l/min)	物流量淳子讀值 第3次	本流量淳子讀值 第1次 3次平均值	本流量淳子讀值 第2次 實際末流量(l/min)	本流量淳子讀值 第3次	開始時間(HH:MM) 結束時間(HH:MM)	平均流量(l/min) 採樣時間(min)	總採氣量(l)
TSP	PAA-024	1100	1100	1100	1080	1080	1080	17:10	1215	1749600
	1610019	1100	1230		1080	1300		17:10	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查校

採樣前查校時間 17:00 ~ 17:08　　採樣後查校時間 17:12 ~ 17:20

a. 儀器編號 PAA-024；淳子讀值 1120；實際流量 1252 l/min　流量查校採樣是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 SN0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1251 l/min

b. 儀器編號 PAA-024；淳子讀值 1130；實際流量 1252 l/min　流量查校採樣是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 SN0596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

二、儀器使用查對

項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	物採過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量(l/min)	採樣分析檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	0	0.8	NIEA A417.11C
CO	APL 300E	V	0	0.8	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	0	0.8	—
TSP	KZ40070 121FT	√	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:10 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 4.5 ~ 5.5 m/s ：風向多為 北北西風、北北西風
3. 溫度變化 18.5 ~ 22.7 ℃ ：溼度變化 69 ~ 87 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 759.2 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：朱福毅、賴振在、林炎禎　　監測日期：101.4.7-8

一、採樣作業及位置：

△17:00 AQ start

△17:10 TSP start.

△中途查校

△17:00~17:10
CH4 ZERO check.

△17:10~17:30
CH4 SPAN check

△17:30~17:40
CH4 ZERO check

△17:40~17:50
NO、CO ZERO check

△17:50~18:20
NO、CO SPAN check

△18:20~18:30
NO、CO ZERO check

二、現場狀況說明：

△假日期間台二省道車流量較多，且偶有車隊經過，

△台二省道偶有大型車及貨櫃車經過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	5	2	0.1	X	1.85	X	0.17	X
最大值		11	8	0.2		1.90		0.18	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料儲存位置：

L:\XO105\S1\101-04\AQ\ST\ST0408AQ.dat

品保品管組：林炎禎 101.4.12

BP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980608(附錄十六(96年修訂))

檢驗報告專用章
電話:(02)7731-3292
新北市中和區中正路788號5樓之2

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO.CO.THC/NMHC, TSP, Ws.Wd.Temp Hum%

檢 測 員：范和聰、林友孫　　監測日期：101.5.2 ～ 101.5.3

一、採樣作業及位置：

5/2 12:40~13:40 架跑機,測路查核

1340-1350 CH4 ZERO cal

1350-1407 CH4 SPAN cal

1407-1415 CH4 ZERO check


1415-1445 NO.CO ZERO cal

1445-1500 NO.CO SPAN cal

1500-1540 NO.CO ZERO check

1635 TSP START

1900 AQ START

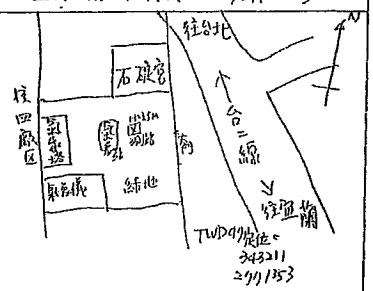

二、現場狀況說明：

台二線車流量大,重型車輛來往頻繁.

△測點旁石碇宮供有民眾祭拜及焚燒紙錢。

△上下班時段車流量大。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_2H_2	PM_{10}
最小值		5	2	0.2		1.90	6	0.11	
最大值		76	18	0.5		2.00	6	0.19	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:X0105\501\0105\AQ\ST\ST0503.XX

品保品管紀：李依蓮 101.5.18

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：范和聰、林友孫　　監測日期：101.5.2 ～ 101.5.3

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	物流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際物流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-019	1250	1250	1250	1240	1240	1240	16:25	1285	1850.4
	10103012	1250	1240 L/min		1240	1280		16:35	1440	
PM_{10}								:		
								:		
BK	PAA-019							16:30		
	10103011							16:32		

採樣前查校時間　16:20 ～ 16:28　　採樣後查校時間　16:38 ～ 16:45

流量查校

a. 儀器編號 PAA-019；流子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校誤差是否<±7%？☑是 □否

流量校正器編號 PAA-001；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

b. 儀器編號 PAA-019；流子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校誤差是否<±7%？□是 □否

流量校正器編號 0595；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	ECOTECH 9841B	V	V	0.63 SLPM=1 L/min	NIEA A417.11C
CO	DASIBI 3008	V	V	1.0 L/min	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	V	1.0 L/min	-
TSP	KIMOTO	V	-	-	NIEA A102.12A
PM_{10}			-		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:35 b. 氣狀物 17:00 c. 其它

2. 風速約為 0.6 m/s；風向多為 東北風~西北 風

3. 溫度變化 24.3 ~ 25.6℃；濕度變化 70 ~ 98 %

4. 天候狀況 開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)

5. 大氣壓力 760 torr(mm-Hg)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：范永聰、朱炯毅　　監測日期：101.5.3～101.5.9

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MI) / 結束時間 (HR:MI)	平均流量 (l/min) / 採樣時間 (min)	總採氣量(l)
TSP	PAA-019	1250	1250	1250	1260	1240	1240	16：50	1285	1850400
	1403013	1250	1290		1240	1280		16：50	1440	
PM_{10}								：		
								：		
								：		
								：		

流量查校

採樣前查校時間 16：38～16：45　　採樣後查校時間 16：50～16：58

a. 儀器編號 PAA-019；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min　流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 2005；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

b. 儀器編號 PAA-016；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min　流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 2005；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OS(V)CHECK(O)	粉塵過濾紙是接 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	ECOTECH 9841B	V	O	0.63	NIEA A417.11C
CO	dasibi 3008	V	O	1.0	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	O	1.0	—
TSP	KIMOTO 121FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:50 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2～2.4 m/s ： 風向多為 東北 風～北北東風
3. 溫度變化 19.7～23.6 ℃ ： 溫度變化 75～97 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 762 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO, CO, THC/NMHC, TSP, Ws/Wd, Temp, RH%

檢 測 員：范永聰、朱炯毅　　監測日期：101.5.3～101.5.9

一、採樣作業及位置：

△16:50 TSP START

△17:00 AQS START

二、現場狀況說明：

△測點位於校園內緊鄰石碇宮廟埕空地 石碇宮偶有民眾祭拜 BB燒紙錢

△測點廟台二省道 車流量大 上下班時段車輛頻繁

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	2	0.2	X	1.88	X	0.11	X
最大值	/	27	22	0.4	X	1.97	X	0.16	X
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\SO1\10105\AIR\ST\ST0504.MDB

品保品管組：林佩蓁 101.5.11

檢驗報告專用章 新竹工程顧問股份有限公司 中正路788號5樓之1 電話:(02)7731-8282

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☐CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：朱順毅　　監測日期：101.5.4－101.5.5

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MM) / 結束時間 (HR:MM)	平均流量 (l/min) / 採樣時間 (min)	總排氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)				
TSP	PAA-019	1250	1250	1250	1240	1240	1240	17:00	1285	850400
	101080114	1250	1290		1240	1280		17:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

流量查校

採樣前查校時間 16:50 ~ 16:58　採樣後查校時間 17:00 ~ 17:10

a. 儀器編號 PAA-019；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校誤差是否＜±7 % ？☑是 ☐否

流量校正器編號 3010515；水柱壓差 45 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

b. 儀器編號 PAA-019；浮子讀值 1200；實際流量 1235 l/min；流量查校誤差是否＜±7 % ？☑是 ☐否

流量校正器編號 3010515；水柱壓差 45 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	前濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_2	ECOTECH ML9841	V	0	0.63	NIEA A417.11C
CO	classic 3008	V	0	1.0	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	0	1.0	-
TSP	KIMOTO 1217F	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間；a. 粒狀物 17:00 b. 氣狀物 17:00 c. 其它

2. 風速約為 0.3 ~ 2.4 m/s ： 風向多為 西北 風~ 北東 風

3. 溫度變化 18 ~ 26 ℃ ： 濕度變化 52 ~ 96 %

4. 天候狀況　開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)

5. 大氣壓力 703 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO_2, CO、THC/NMHC, TSP WS. WS. Temp. RH

檢 測 員：朱順毅　　監測日期：101.5.4－101.5.5

一、採樣作業及位置：

5/4 △ 17:00 AQ、TSP start.

5/5 △ 17:00－17:08 THC ZERO

△ 17:08－17:23 THC 校準後

△ 17:25－17:30 THC ZERO check

△ 17:30－17:35 NO、CO ZERO

△ 17:35－17:57 NO、CO 校準後

△ 17:57－18:05 NO、CO ZERO check

二、現場狀況說明：

△測站為石碇宮偶有民眾到宮燒香拜拜，偶有燃燒紙錢情形

△測站為一交通車流量大，偶有大型車交通擾車經過.

三、監測結果：

項目	SO_2	NOx	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	4	2	0.1	X	1.93	X	0.15	X
最大值		27	15	0.4		1.98		0.19	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

I:\XO105\S1\101-05\AQ\ST\ST0505AQ.txt

品保品管組：李依璋(101.5.11)

檢驗報告專用章 新北市中和區中正路788號3樓之4 電話:(02)7731-8229 新紀工程顧問有限公司 環境檢驗

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO2, CO, THC/NMHC, TSP, Wd, Ws, Temp, RH%

檢 測 員：朱炳毅　　監測日期：101.6.27-28

一、採樣作業及位置：

△10:30-12:20 朱炳毅執行例行維護

△12:20-12:30 THC ZERO

△12:30-14:10 THC SPAN

△14:10-14:20 THC ZERO check

△14:20-14:30 NO、CO ZERO


△14:30-15:35 NO、CO SPAN

△15:35-15:45 NO、CO ZERO check

△15:45 sample in

△16:50 TSP start

△17:00 AQ start

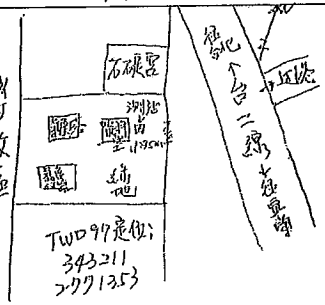

二、現場狀況說明：

△台二線車流量大.重型車輛來往頻繁

△校園廢址下班時段車輛增多.偶有塵霧情形

△石碇宮偶有民眾燒香拜拜及焚燒紙錢

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值		4	3	0.2		1.74		0.14	
最大值		22	7	0.4		1.89		0.31	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L:\X0105\S1\101-06\AQ\ST\ST0628AQ.xls

品保品管組：[illegible] 101.7.5

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☐Rain

檢測員：朱炳毅、鄭景華　　監測日期：101.6.27-28

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	DAA-024	1150	1150	1150	1140	1140	1140	16:50	1285	1850400
	10104026	1150	1290		1140	1280		16:50	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間 15:30 ~ 15:40　　採樣後查校時間 16:57 ~ 16:58

流量查校

a. 儀器編號 DAA-024：浮子讀值 1150；實際流量 1252 l/min　流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 10576：水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

b. 儀器編號 DAA-024：浮子讀值 1150；實際流量 1282 l/min　流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 10576：水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	檢查過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	V	0.8	NIEA A417.11C
CO	APi 300E	V	V	0.89	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	V	0.8	—
TSP	KIMOTO 121FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:50 b. 氣狀物 17:00 c. 其它

2. 風速約為 0.2 ~ 4.1 m/s ： 風向多為 東南 風~ 西南東 風

3. 溫度變化 24.9 ~ 31.2 ℃ ： 濕度變化 68 ~ 92 %

4. 天候狀況 開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)

5. 大氣壓力 719 torr(mm-Hg)

新竹工程顧問有限公司 環境檢驗室 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中正路738號5樓之1

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：□SO_2 ☑NOx □CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb □WS ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：鄧景豪　　監測日期：101.6.28~29

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM) / 結束時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min) / 採樣時間 (min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)				
TSP	PM-034	1150	1150	1150	1140	1140	1140	17:00	1285	1850400
	1010427	1150	1290		1140	1280		17:00	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間 16：57~16：58　　採樣後查校時間 17：01~17：08

流量查校

a. 儀器編號 PM-034：浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
流量校正器編號 446596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

b. 儀器編號 PM-034：浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
流量校正器編號 446596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(v)CHECK(o)	粒塵過濾紙更換 是(v) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APHA-360	✓	o	0.8	NIEA A417.11C
CO	API-300E	✓	o	0.89	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	✓	o	0.8	—
TSP	KIMOTO 121BT	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:00 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 1.4 ~ 4.0 m/s ： 風向多為 東南 風~ 西南 風
3. 溫度變化 28.8 ~ 31.2 ℃ ： 濕度變化 67 ~ 91 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 758 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續72hr

檢測項目：NOx/NO2, CO, THC/CH4/NMHC, Tsp, Ws, Wd, Temp, RH%

檢 測 員：鄧景豪　　監測日期：101.6.28~29

一、採樣作業及位置：

ΔTsp. AQ start 17:00

二、現場狀況說明：

△校門廠址，下班時段，車輛增多.
△台二線車流量大，重型車輛來往頻繁

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	3	0.2	/	1.72	/	0.15	/
最大值	/	8	6	0.3	/	1.76	/	0.18	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料儲存位置：

上\X0105\6\101-06\檢\ST\ST06\9X3.

品保品管組：林佐疆 101.7.5

新北市中和區中正路738號5樓之1 新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：鄭旻宇、李佩毅　　監測日期：101.6.29~30

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MN)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HR:MN)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-024	1150	1150	1150	1140	1140	1140	17:10	1285	18504.00
	10104-028	1150	1190		1140	1280		17:10	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查校			
	採樣前查校時間	17 :01 ~ 17 :08	採樣後查校時間	17:10 ~ 11 :20
a. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min	流量校正器編號 SMC596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min			流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
b. 儀器編號 PAA-024；浮子讀值 1120；實際流量 1252 l/min	流量校正器編號 SMC596；水柱壓差 140 mm-H_2O；校正流量 1252 l/min			流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	對塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	採樣分析檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-360	V	o	0.8	NIEA A417.11C
CO	API-300E	V	o	0.89	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	o	0.8	—
TSP	SIBATA 121 FIT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:10 b. 氣狀物 17:20 c. 其它
2. 風速約為 0.3 ~ 4.2 m/s ； 風向多為 東南 風~東南東風
3. 溫度變化 25.9 ~ 34.2 ℃ ； 溼度變化 69 ~ 93 %
4. 天候狀況　開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 959 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：石碇宮　　監測方式：連續實況hr

檢測項目：NOx/NO2. CO. THC/NMHC. Tsp. Ws. wd. Temp. RH%

檢 測 員：鄭旻宇、李佩毅　　監測日期：101.6.29~30

一、採樣作業及位置：

△AQ start 17:00

△ Tsp start 17:10

6/30 △17:00~17:05 NO. CO ZERO

△17:05~17:35 NO. CO 比對

△17:35~17:42 NO. CO zero check

△17:42~17:50 THC/CH4 ZERO

△17:50~18:10 THC 比對

△18:10~18:20 THC zero check

二、現場狀況說明：

△測站附近石碇宮偶有民眾出入祭祀並燃燒紙錢

△測站旁為一普通假日車流量大，偶有大型及重型車經過

三、監測結果：

項目	SO_2	NOx	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	4	0.1	/	1.72	/	0.16	/
最大值	/	19	10	0.4	/	1.80	/	0.18	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\SI\101-06\AQ\ST\ST0630***

品保品管組：林振樟 101.7.5

新北工程顧問有限公司 環境科 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之4

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：賴振名、林炎祿　　監測日期：101.4.19~101.4.20.

一、採樣作業及位置：

101.4.19

△13:30~13:00 架設、曝機、測漏、查收。

△13:00~13:10 NO.CO ZERO cal

△13:10~13:25 NO.CO SPAN cal

△13:25~13:32 NO.CO SPAN check


△13:32~13:40 NO.CO ZERO check. CH4 ZERO cal.

△13:40~14:04 CH4 SPAN cal.

△14:04~14:10 CH4 SPAN check

△14:10~14:14 CH4 ZERO check

△14:15 NO.TSP start.

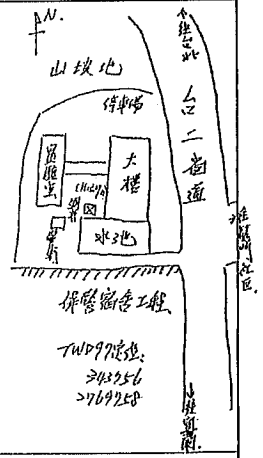

二、現場狀況說明：

△測站位於放射實驗室大樓旁的空地上。

△測站南方約 25公尺處有保警隊舍新建工程施工中。

△測站東方約 60公尺處為台二省道，車流量均大、且重型車輛多。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	4	0.3	/	1.25	/	0.16	/
最大值	/	11	8	0.4	/	1.80	/	0.19	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\51\101-04\AQ\HS\HS 0430 XX

品保品管組：李振福 101.4.26

A-23

RP-03-C-01(紀錄表單第11-7版)-980608(附表十六(0608修訂))

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：賴振名、林炎祿　　監測日期：101.4.19~101.4.20

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-006	1300	1300	1300	1180	1180	1180	14:15	1300	1872000
	1010038	1300	1310		1180	1190		14:15	1440	
PM_{10}								:		
								:		
底K	PAA-006							14:25		
	1402036							14:07		
流量查校	採樣前查校時間	13:20 ~ 13:25			採樣後查校時間			14:17 ~ 14:25		
	a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1342 l/min；流量校正器編號 2005097；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min								流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否	
	b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1342 l/min；流量校正器編號 2005097；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min								流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否	

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	前置過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2	——	——	——	——	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	✓	✓	71.9 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	✓	✓	33.4 kPa	NIEA A421.11C
O_3	——	——	——	——	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	✓	✓	0.9 L/min	—
TSP	KIMOTO HVFT	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	——	——	——	——	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 1415 b. 氣狀物 14:15 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 0.8 m/s ； 風向多為 東南東 風~西北西 風
3. 溫度變化 23.1 ~ 26.1 ℃ ； 溫度變化 82 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 754 torr(mm-Hg)

A-22

RP-03-C-01(紀錄表單第11-7版)-980608(附表十五(0608修訂))

新北工程顧問有限公司 環境檢測實驗室 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-5292 新北市中和區中正路758號3樓之4

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：賴振名 林友祿　　監測日期：101.4.20～101.4.21

一、採樣作業及位置：

101.4.20

△14:00
AQ start

△14:25
TSP start.

二、現場狀況說明：

△測站位於放鞭炮場空大楊樹空地上

△測站南方約25公尺處有併聚福垂大楊新建工程施工中，有車車在卡拌物車。

△測站東方的60公尺處為台二省道，左因車流量甚大，且重型車輛多。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	4	2	0.2	/	1.71	/	0.15	/
最大值	/	13	6	0.4	/	1.85	/	0.38	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\51\101-04\AQ\HS\HS0604.xls

品保品管組：李振福 101.4.26

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：賴振名 林友祿　　監測日期：101.4.20～101.4.21

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-006	1300	1300	1300	1180	1180	1180	14:25	1300	1871.000
	1010-039	1300	1310		1180	1190		14:25	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

流量查校	採樣前查校時間	14:17 ～ 14:25	採樣後查校時間	14:29 ～ 14:35
	a. 儀器編號 PAA-006；淨子讀值 1150；實際流量 1341 l/min			流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 AU0597；水柱壓差 185 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min			
	b. 儀器編號 PAA-006；淨子讀值 1150；實際流量 1341 l/min			流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 AU0597；水柱壓差 185 mm-H_2O；校正流量 1342 l/min			

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	採樣過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	———	———	———	———	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APUA-370	✓	0	91.9 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	✓	0	33.4 kPa	NIEA A421.11C
O_3	———	———	———	———	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	✓	0	0.9 l/min	—
TSP	KIMOTO 1H FT	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	———	———	—	———	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:25 b. 氣狀物 14:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ～ 0.9 m/s ； 風向多為 西北 風～ 西 風
3. 溫度變化 22.6 ～ 28.1 ℃ ； 溫度變化 82 ～ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 755 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx、NO2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：賴振名、林友祿　　監測日期：101.4.21～101.4.22

一、採樣作業及位置：

101.4.21　　10.4.22 中區

△14:00　　△14:10～14:10

AQ start.　　NO. CO ZERO check

△14:10～14:25

△14:25　　NO. CO SPAN check

TSP start　　△14:25～14:40

NO. CO ZERO check

△14:40～14:50

CH4 ZERO check

△14:50～15:15

CH4 SPAN check

△15:15～15:30

CH4 ZERO check

二、現場狀況說明：

△測站位於放射實驗室大樓旁的空地上。

△測站南方約 15 公尺處，有正舉辦焚化大樓新建工程施工中。

△測站東方約 60 公尺處為台二高速，全日車流量頗大，且重型車輛多。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	3	0.1	/	1.70	/	0.16	/
最大值	/	14	11	0.6	/	1.95	/	0.24	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\51\101-04\AQ\HS\HS0422.ASC.

品保品管組：林俊輝 101.4.26

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表十六(9608修訂))

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☐Temp ☑Hum

檢測員：賴振名、林友祿　　監測日期：101.4.21～101.4.22

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM) / 結束時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min) / 採樣時間 (min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量 (l/min)		3次平均值	實際末流量 (l/min)				
TSP	PAA-006	1300	1300	1300	1180	1180	1180	14:25	1300	1872000
	101030460	1300	1310		1180	1190		14:25	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

採樣前查核時間 14:27～14:25　　採樣後查核時間 14:27～14:25

流量查核

a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min　　流量查核誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 Q6057；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min　　流量查核誤差是否<±7 %？☑是 ☐否

流量校正器編號 Q6057；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器 廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	檢量過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	———	———	———	———	NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APNA-370	✓	O	11.9 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	✓	O	33.4 kPa	NIEA A421.11C
O_3	———	———	———	———	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	✓	O	0.9 L/min.	—
TSP	KIMOTO 1PIFT	✓	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	———	———	—	———	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 14:35　b. 氣狀物 14:00　c. 其它

2. 風速約為 0.3 ～ 1.6 m/s ： 風向多為 西北 風～西北西風

3. 溫度變化 19.3 ～ 29.2 ℃ ： 溼度變化 64 ～ 98 %

4. 天候狀況 開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)

5. 大氣壓力 754 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表十五(9706修訂))

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗室
檢驗報告專用章
電話:(02)7731-5256
台北市中正區中正路738號3樓之4

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：0


測站名稱：民宅　　監測方式：連續自動

檢測項目：NOx/NO2、CO、THC/NMHC、TSP、Wd、Ws、Temp、RH%

檢 測 員：[illegible]、范和聰　　監測日期：101、5、9-10

一、採樣作業及位置：

△12:40-13:50 架設採樣機測漏校
△13:50-14:00 NO、CO ZERO
△14:00-14:40 NO、CO SPAN
△14:40-14:50 NO、CO ZERO check
△14:50-15:00 THC ZERO
△15:00-15:32 THC SPAN
△15:32-15:40 THC ZERO check
△15:40 sample in.
△16:50 TSP start
△17:00 AQ START

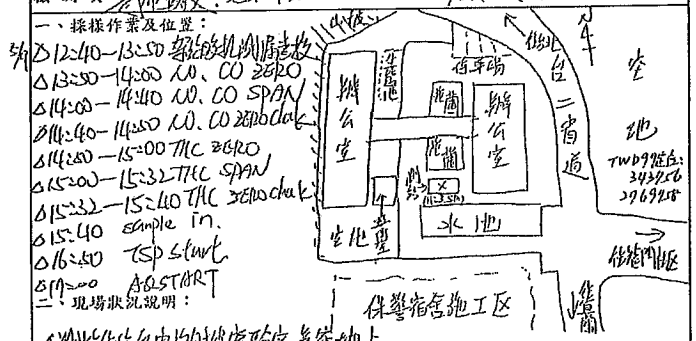

二、現場狀況說明：

△測站位於台電放射線實驗室旁空地上
△測站南方約30m處為保警宿舍新建工程，主體建物已施作，仍有工人施工
△測站西方為二號道，偶有大型車輛經過。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	X	3	2	0.1	X	1.79	X	0.11	X
最大值		15	11	0.2		1.85		0.15	
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

I:\XO105\51\101-05\AQ\HS\HS0510AQ.txt

品保品管組：[illegible] 101.5.17

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Illum

檢測員：[illegible]、范和聰　　監測日期：101、5、9-10

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間(HH:MM)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
		3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HH:MM)	採樣時間(min)	
TSP	AAA-019	1180	1180	1180	1190	1190	1190	16:50	1495	1720820
	10103018	1180	1200		1190	1190		16:50	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間	16:00 ~ 16:10	採樣後查校時間	16:52 ~ 16:56	
流量查校 a. 儀器編號 AAA-01	浮子讀值 1200	實際流量 1235 l/min	流量查校誤差是否<±7 % ?☑是 □否	
流量校正器編號 [illegible]	水柱壓差 145 mm-H_2O	校正流量 1235 l/min		
b. 儀器編號 AAA-019	浮子讀值 1200	實際流量 1235 l/min	流量查校誤差是否<±7 % ?☑是 □否	
流量校正器編號 [illegible]	水柱壓差 145 mm-H_2O	校正流量 1235 l/min		

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器 廠牌規格	使用電腦狀況 OK(v)CHECK(o)	檢查過濾紙更換 光(v) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告 檢測方法
SO_2	—	—	—	—	NIEA A416.11C
NO_X	ECOTECH ML-9841	V	V	0.64	NIEA A417.11C
CO	dasibi 3008	V	V	1.0	NIEA A421.11C
O_3	—	—	—	—	NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	V	0.7	—
TSP	VAN10 12IF1	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}	—	—	—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:50 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 0.3 ~ 2.7 m/s ： 風向多為 北北東風~西北 風
3. 溫度變化 22.1 ~ 24.3 ℃ ： 溼度變化 83 ~ 97 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 763 torr(mm-Hg)

新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3229 臺中市中正路738號5樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅

檢測項目：□SO_2 ☑NOx □CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp □Hum

檢測員：范宏明　　監測日期：101.5.10－101.5.11

一、粒狀污染物採樣記錄

項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	3次平均值	實際初流量 (l/min)			3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HH:MM)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-001	1200	1200	1200	1190	1190	1190	17:05	1285	1850400
	1003019	1200	1290		1190	1280		17:05	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

採樣前查校時間 16：58～17：03　　採樣後查校時間 17：08～17：13

流量查校

a. 儀器編號 PAA-001；浮子讀值 1130；實際流量 1220 l/min；流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 EM0495；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

b. 儀器編號 PAA-001；浮子讀值 1130；實際流量 1220 l/min；流量查校誤差是否＜±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 EM0495；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

二、儀器使用查對

項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(O)	前置過濾紙更換 是(V) 否(O)	抽氣流量 (l/min)	採樣分析檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	ECOTECH 9841B	V	O	0.64	NIEA A417.11C
CO	dasibi 2008	V	O	1.0	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	V	O	0.9	—
TSP	KIMOTO 121 FT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:05 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ～ 2.0 m/s ： 風向多為 東北風～西北 風
3. 溫度變化 20.9 ～ 25.2 ℃ ： 溼度變化 98 ～ 98 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 663 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅　　監測方式：連續監測

檢測項目：NOx/NO_2, CO, THC/NMHC, TSP, Ws/Wd, Temp, RH%

檢 測 員：范宏明　　監測日期：101.5.10－101.5.11

一、採樣作業及位置：

△ 17:00 AQ START

△ 17:05 TSP START

二、現場狀況說明：

△測點位於台電汐碧實驗變電所空地。

△台二甲道車流量大，偶有大型車經過，上下班時段車車物多

△測站南方約300M處為保警宿舍新建工程，主體建物已至3樓，偶有灑水作業。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO	NO_2	CO	O_3	THC	Cl_2	C_6H_6	PM_{10}
最小值	X	3	2	0.1	X	1.77	X	0.11	X
最大值	X	15	10	0.4	X	1.84	X	0.18	X
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：

L=X0105\S1\101-05\AQ\HS\HS0511AQ.*

品保品管組：邱志禮 101.5.16

檢驗報告專用章 新北工程顧問有限公司 電話:(02)7731-2282 新北市中和區中正路738號5樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅

檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 □THC ☑TSP □PM_{10} □Pb □Ws □Wd □Temp ☑Rain

檢測員：范宗璋、賴振裕　　監測日期：101.5.11 - 101.5.12

一、粒狀污染物採樣記錄

項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間 (HR:MN)	平均流量 (l/min)	總採氣量(l)
	3次平均值	實際初流量 (l/min)			3次平均值	實際末流量 (l/min)		結束時間 (HR:MN)	採樣時間 (min)	
TSP	PAA-001	1200	1200	1200	1190	1190	1190	17:15	1285	18504.00
	10103020	1200	1290		1190	1282		17:15	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

流量查校

採樣前查校時間 17 :08 ~ 17 :13　　採樣後查校時間 17 :17 ~ 17 :25

a. 儀器編號 PAA-001；浮子讀值 1120；實際流量 1220 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 ZC0195；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

b. 儀器編號 PAA-001；浮子讀值 1120；實際流量 1220 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否

流量校正器編號 ZC0195；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1235 l/min

二、儀器使用查對

項目 / 內容	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(v)CHECK(o)	採樣過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NOx	ECOTECH 9841B	v	o	0.64	NIEA A417.11C
CO	dasibi 3008	v	o	1.0	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-360	v	o	0.9	--
TSP	KIMOTO 121FT	v	-	-	NIEA A102.12A
PM_{10}			-		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述

1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:15 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 2.5 m/s ： 風向多為 東南東 風~西南 風
3. 溫度變化 23.0 ~ 25.1 ℃ ： 溼度變化 90 ~ 96 %
4. 天候狀況 開始日(□晴 ☑陰 □雨)；結束日(□晴 ☑陰 □雨)
5. 大氣壓力 964 torr(mm-Hg)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅　　監測方式：連續監測

檢測項目：NO/NO_2 CO THC/NMHC TSP WS/WD Temp. RH%

檢 測 員：范宗璋、賴振裕　　監測日期：101.5.11 - 101.5.12

一、採樣作業及位置：

△ 17:00 AQ START

△ 17:05 TSP START

各、快查核

△ 11:40-11:53 NO/NO_2 ZERO check
△ 11:53-12:03 NO/NO span check
△ 12:03-12:10 NO/CO SPAN ZERO check
△ 12:30-12:35 CH_4 ZERO check
△ 12:35-12:58 CH_4 SPAN check
△ 12:58-13:05 CH_4 ZERO check

二、現場狀況說明：

△ 測定位於自由放財實驗室旁

△ 台二省道車流量大，偶有大型車經過，上下班時段車量較多。

△ 測站南方為約30m處為住警宿舍新建工程，主体建築已施作，偶有工人施工。

三、監測結果：

項目	SO_2	NOx	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	4	2	0.3	/	1.75	/	0.12	/
最大值	/	19	12	0.3	/	1.83	/	0.19	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\01\101-05\AQ\HS\1150512AQ.xls

品保品管組：宋振璋 101.5.16

新紀工程顧問有限公司 環境檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3229 新北市中和區中正路738號5樓之1

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01


測站名稱：民宅　　監測方式：連續實測24hr

檢測項目：NOx/NO2. CO. THC/NMHC、TSP. WS. WD. Temp. RH%

檢 測 員：劉昊宗　　監測日期：101.6.5~7

一、採樣作業及位置：

6/6 △開站.日報.3Pcl 編.查核
10:30~12:30
△(NO.CO) Zero cal 12:30~12:40
△(NO.CO) span cal 12:40~13:00
△(NO.CO) Zero check 13:00~13:20
△CH4 Zero cal 13:20~13:40
△CH4 span cal 13:40~14:10
△CH4 Zero check 14:10~14:20
△Tsp start 16:40
△Ad start 17:00

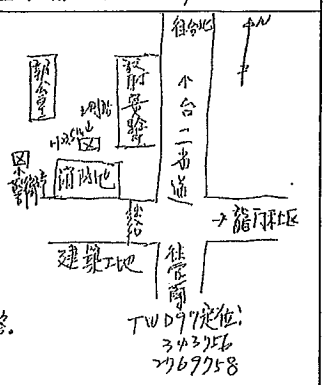

二、現場狀況說明：
△台省道車流數.重型車輛雜頻繁.
△測站旁有保警宿舍建築工程.
△測站旁偶有車輛出入.

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_8H_8	PM_{10}
最小值	/	5	4	0.4	/	1.76	/	0.22	/
最大值	/	14	12	0.5	/	1.93	/	0.31	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\51\101-06\AQ\HSI\HS0607.xx

品保品管組：王柏耀 101.6.14

A-23

RP-03-C-01(採樣表格第11-2版)-980608(附表十六(5604修訂))

新竹工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2222 中和區中正路738號5樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：民宅

檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☑CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum

檢測員：郭昊宇　　監測日期：101.6.6~7

一、粒狀污染物採樣記錄

內容 / 項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間(HH:MM)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	濾紙編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HH:MM)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-006	1190	1190	1190	1180	1180	1180	16:40	1295	1864800
	101040/8	1190	1200		1180	1290		16:40	1440	
PM_{10}								:		
								:		
B.K	PAA-006							14:25		
	101040/7							14:26		
流量查校	採樣前查校時間	14:10~14:20			採樣後查校時間			16:41~16:48		

a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否
流量校正器編號 HV0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☑是 ☐否
流量校正器編號 HV0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min

二、儀器使用查對

內容 / 項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粒塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APHA-370	V	V	72.1 kpa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APHA-370	V	V	33.5 kpa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	V	80.7 kpa	—
TSP	KIMOTO 1211T	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述
1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:40 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速約為 0.2 ~ 1.2 m/s ； 風向多為 東南東 風~東南東 風
3. 溫度變化 24.5 ~ 32.6 ℃ ； 溼度變化 69.67 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☑晴 ☐陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 758 torr(mm-Hg)

A-22

RP-03-C-01(採樣表格第11-2版)-980603(附表十五(9704修訂))

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：民宅　　監測方式：連續24hr
檢測項目：NOx/NO、CO、THC/NMHC、TSP、WS、WD、Temp、RH%
檢 測 員：鄧昱宗　　監測日期：101.6.7~8

一、採樣作業及位置：
△TSP start 16:50
△Met start 17:00

二、現場狀況說明：
△測點旁偶有車輛的經過。
△台二線車流量大重型車輛來往頻繁。
△測點旁有保警宿舍建築工程。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_X	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	4	0.3	/	1.70	/	0.19	/
最大值	/	17	15	0.5	/	2.09	/	0.52	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	$\mu g/m^3$

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\51\01-06\測\HS\HS0608X.xx

品保品管組：李振福 101.6.11

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980601(附表十六(96081修訂)

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：民宅
檢測項目：□SO_2 ☑NOx ☑CO □O_3 ☑THC ☑TSP □PM_{10} □Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☑Hum
檢測員：鄧昱宗　　監測日期：101.6.7~8

一、粒狀污染物採樣記錄

內容/項目	儀器編號	初流量浮子讀值 第1次	初流量浮子讀值 第2次	初流量浮子讀值 第3次	末流量浮子讀值 第1次	末流量浮子讀值 第2次	末流量浮子讀值 第3次	開始時間(HH:MM)	平均流量(l/min)	總採氣量(l)
	流低編號	3次平均值	實際初流量(l/min)		3次平均值	實際末流量(l/min)		結束時間(HH:MM)	採樣時間(min)	
TSP	PAA-006	1190	1190	1190	1180	1180	1180	16:50	1295	1864800
	10104019	1190	1200		1187	1190		16:50	1440	
PM_{10}								:		
								:		
								:		

流量查校	採樣前查校時間	16:41~16:48	採樣後查校時間 16:51~16:58
	a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min		流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 SHU0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min		
	b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min		流量查校誤差是否<±7 %？☑是 □否
	流量校正器編號 SHU0597；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min		

二、儀器使用查對

內容/項目	使用儀器廠牌規格	使用電源狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量(l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NO_x	HORIBA APMA-370	V	O	72.1 kPa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	O	32.5 kPa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	O	80.7 kPa	—
TSP	KIMOTO 121AT	V	—	—	NIEA A102.12A
PM_{10}			—	—	NIEA A206.10C

三、現場狀況描述
1. 監測開始時間：a. 粒狀物 16:50 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速為 0.2 ~ 0.5 m/s ； 風向多為 西 風~西北西風
3. 溫度變化 26.0 ~ 32.1 ℃ ； 溼度變化 73 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 □陰 □雨)；結束日(☑晴 □陰 □雨)
5. 大氣壓力 757 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980601(附表十五(97081修訂)

新北工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2222 新北市中和區中正路738號3樓之4

附表十五　空氣品質監測現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：民宅
檢測項目：☐SO_2 ☑NOx ☐CO ☐O_3 ☑THC ☑TSP ☐PM_{10} ☐Pb ☑Ws ☑Wd ☑Temp ☐Hum
檢測員：鄭景晉　　監測日期：101.6.8~9

一、粒狀污染物採樣記錄

項目	儀器編號 / 濾紙編號	初流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	末流量浮子讀值 第1次	第2次	第3次	開始時間 (HH:MM) / 結束時間 (HH:MM)	平均流量 (l/min) / 採樣時間 (min)	總採氣量(l)
TSP	PAA-006 / 101040	1190 / 1190	1190 / 1300		1180 / 1180	1180 / 1290		17:00 / 17:00	1295 / 1440	1864800
PM_{10}								: / :		
								: / :		

採樣前查校時間 16:51~16:58　　採樣後查校時間 17:02~17:10

流量查校
a. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量校正器編號 4L0497；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☐是 ☐否
b. 儀器編號 PAA-006；浮子讀值 1150；實際流量 1242 l/min；流量校正器編號 4L0497；水柱壓差 145 mm-H_2O；校正流量 1242 l/min；流量查校誤差是否<±7 %？☐是 ☐否

二、儀器使用查對

項目	使用儀器 原牌規格	採用電腦狀況 OK(V)CHECK(o)	粉塵過濾紙更換 是(V) 否(o)	抽氣流量 (l/min)	環署公告檢測方法
SO_2					NIEA A416.11C
NOx	HORIBA APNA-370	V	o	72.1 kpa	NIEA A417.11C
CO	HORIBA APMA-370	V	o	32.5 kpa	NIEA A421.11C
O_3					NIEA A420.11C
THC	HORIBA APHA-370	V	o	80.7 kpa	-
TSP	KIMOTO 1011T	V	-	-	NIEA A102.12A
PM_{10}			-		NIEA A206.10C

三、現場狀況描述
1. 監測開始時間：a. 粒狀物 17:00 b. 氣狀物 17:00 c. 其它
2. 風速為 0.2 ~ 0.6 m/s ； 風向多為 西 風~ 偏西 風
3. 溫度變化 25.4 ~ 32.5 ℃ ； 溫度變化 75 ~ 98 %
4. 天候狀況 開始日(☑晴 ☐陰 ☐雨)；結束日(☐晴 ☐陰 ☐雨)
5. 大氣壓力 757 torr(mm-Hg)

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-910601(附表十五(970305修訂)

附表十六　空氣品質監測工作記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：民宅　　監測方式：連續24hr
檢測項目：NOx/NO2, CO, THC/NMHC, Tsp, Ws, Wd, Temp, RH%
檢 測 員：鄭景晉　　監測日期：101.6.8~9

一、採樣作業及位置：
△ Tsp, AQ start 17:00
△ 6/9 sample 結束 17:00

6/10 中央查核
△(NO, CO) zero cal 11:50~12:00
△(NO, CO) span cal 12:00~12:55
△(NO, CO) zero check 12:55~13:05
△ CH4 zero cal 13:00~13:05
△ CH4 span cal 13:05~13:25
△ CH4 zero cal 13:25~13:31

二、現場狀況說明：
△ 台二線車流量大，重型車輛多
△ 測站旁保警寮含避難工地，偶有零星工程。

三、監測結果：

項目	SO_2	NO_x	NO_2	CO	O_3	THC	CH_4	C_3H_8	PM_{10}
最小值	/	5	4	0.2	/	1.73	/	0.16	/
最大值	/	14	9	0.4	/	1.92	/	0.28	/
單位	ppb	ppb	ppb	ppm	ppb	ppm	ppm	ppm	μg/m³

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-06\AQ\HIS\HIS0609XX

品保品管組：林恒禧 101.6.14

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-910605(附表十六(970305修訂)

新光工程顧問有限公司環境檢驗專用章
電話:(02)7731-3222
新北市中和區中正路788號5樓之4

附　錄　Ⅳ.3

噪音與振動監測成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附錄Ⅳ.3-1 台2省道與102甲縣道交叉口101年4月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/20～101/4/21

單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	76.5	69.9	49.7	41.7	41.2	84.2	68.1	22.0	98	1007.6	0.2	292.5	(NE)	
01~02	77.8	72.8	50.5	41.8	41.3	84.5	69.1	21.8	98	1007.4	0.3	157.5	(SSE)	
02~03	79.4	76.4	53.2	42.5	42.2	86.3	70.8	21.9	98	1007.2	0.2	157.5	(SSE)	
03~04	80.2	78.1	57.1	42.5	41.8	92.5	72.4	22.3	98	1007.1	0.3	270.0	(W)	
04~05	81.0	79.2	60.2	43.8	41.9	92.6	73.6	22.6	98	1007.4	0.3	315.0	(NW)	
05~06	81.3	79.6	63.5	49.8	46.3	91.5	74.2	22.7	98	1007.5	0.3	315.0	(NW)	
06~07	80.1	78.0	63.7	53.9	51.8	93.9	72.9	22.6	98	1007.5	0.3	0.0	(N)	
07~08	79.0	77.2	69.3	59.7	56.9	85.1	72.9	23.0	98	1008.4	0.6	0.0	(N)	
08~09	79.3	77.4	65.6	56.2	54.1	97.0	72.9	23.6	98	1008.3	0.7	0.0	(N)	
09~10	79.5	77.7	65.5	56.1	54.0	89.5	72.9	24.3	97	1007.9	0.8	0.0	(N)	
10~11	79.5	78.0	67.2	57.0	54.9	91.0	73.5	24.0	96	1007.7	1.2	0.0	(N)	
11~12	79.4	77.8	67.5	58.8	56.9	88.4	73.1	23.9	96	1006.9	0.9	0.0	(N)	
12~13	78.3	76.4	66.7	58.0	56.0	88.5	72.1	23.9	95	1006.5	0.9	0.0	(N)	
13~14	78.2	76.3	64.8	55.5	53.2	90.6	71.5	23.9	95	1005.6	0.6	337.5	(NNW)	
14~15	78.4	76.1	64.0	54.3	52.4	89.4	71.5	24.3	95	1004.7	0.8	0.0	(N)	
15~16	78.5	76.4	64.3	55.5	53.3	99.4	72.5	24.4	96	1004.0	0.9	0.0	(N)	
16~17	78.4	75.9	65.7	57.8	55.6	87.1	71.5	24.6	97	1004.3	0.8	0.0	(N)	
17~18	77.4	75.3	66.3	59.9	58.3	94.3	71.6	24.6	98	1005.3	0.6	337.5	(NNW)	
18~19	72.7	69.3	60.4	52.6	51.1	96.7	68.1	24.4	98	1005.5	0.4	337.5	(NNW)	
19~20	75.2	72.2	61.4	53.5	52.1	86.0	68.4	23.9	98	1005.7	0.3	315.0	(NW)	
20~21	76.7	73.9	60.9	52.8	51.2	87.8	69.6	23.6	98	1006.2	0.3	292.5	(WNW)	
21~22	75.8	72.3	59.7	51.4	49.9	85.7	68.5	23.3	98	1005.5	0.2	337.5	(NNW)	
22~23	76.2	70.4	55.5	47.6	46.1	85.7	68.5	23.3	98	1005.3	0.3	247.5	(WSW)	
23~24	75.8	70.7	56.3	45.0	43.5	88.9	68.6	23.3	99	1005.6	0.2	22.5	(NNE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。

2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-2 台2省道與102甲縣道交叉口101年4月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/21～101/4/22

單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	79.7	74.9	60.9	52.9	52.0	88.6	71.7	23.1	99	1004.6	0.5	292.5	(WNW)	
01~02	79.2	74.2	51.6	44.3	43.4	84.5	70.4	22.9	99	1002.9	0.3	0.0	(N)	
02~03	80.3	76.5	54.5	42.8	42.3	86.3	71.8	22.6	99	1002.7	0.2	337.5	(NNW)	
03~04	81.0	78.7	58.0	42.9	42.0	86.3	72.8	22.3	99	1002.1	0.3	315.0	(NW)	
04~05	81.3	79.8	62.0	44.9	43.0	90.5	74.1	22.2	99	1002.5	0.3	337.5	(NNW)	
05~06	80.9	79.1	63.0	49.1	46.6	90.7	73.5	22.1	99	1002.5	0.4	292.5	(WNW)	
06~07	80.3	78.5	65.1	53.7	50.8	91.4	73.5	22.2	99	1002.7	0.3	0.0	(N)	
07~08	79.6	77.5	67.3	57.0	54.8	87.5	72.9	23.3	99	1003.1	0.4	315.0	(NW)	
08~09	80.0	78.1	66.5	55.6	53.4	94.0	73.5	24.6	99	1003.0	0.6	0.0	(N)	
09~10	79.0	77.5	66.6	56.5	53.9	89.3	72.7	26.3	93	1002.9	0.9	0.0	(N)	
10~11	80.0	78.5	67.6	56.5	54.2	91.3	73.7	27.0	86	1002.5	0.8	0.0	(N)	
11~12	79.0	77.3	67.7	59.0	56.0	91.6	73.0	27.0	92	1002.3	0.8	337.5	(NNW)	
12~13	78.2	76.4	66.6	57.1	55.3	91.0	72.0	27.1	93	1002.1	0.9	337.5	(NNW)	
13~14	77.7	75.9	65.9	55.4	53.4	88.0	71.5	26.5	96	1001.6	0.9	337.5	(NNW)	
14~15	78.8	76.8	66.6	56.6	54.5	86.9	72.1	26.2	96	1001.3	0.8	337.5	(NNW)	
15~16	77.7	75.5	66.1	57.5	55.4	85.1	71.1	25.5	98	1001.8	0.5	315.0	(NW)	
16~17	78.5	75.5	67.0	58.0	55.8	88.3	71.7	25.1	98	1002.3	0.4	315.0	(NW)	
17~18	74.8	72.2	65.3	57.6	55.9	88.9	69.0	24.7	98	1003.2	0.9	292.5	(WNW)	
18~19	75.5	72.3	62.3	54.8	53.6	85.3	68.6	24.8	87	1003.9	1.3	270.0	(W)	
19~20	73.4	70.1	58.9	52.0	51.3	82.4	66.4	24.1	92	1004.7	0.4	292.5	(WNW)	
20~21	75.0	71.2	58.6	51.0	50.0	83.6	67.5	24.2	91	1005.5	0.9	270.0	(W)	
21~22	74.4	70.3	56.8	49.3	48.4	83.4	67.1	24.5	84	1006.2	0.8	292.5	(WNW)	
22~23	72.8	68.1	52.2	47.2	45.6	84.6	65.9	24.4	85	1006.7	0.6	0.0	(N)	
23~24	71.8	66.7	50.8	43.9	43.2	84.3	65.7	23.6	91	1006.8	1.2	0.0	(N)	

註：1.監測起始時間為當日0時。

2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

檢驗報告專用章
電話:(02)7731-8232

附錄IV.3-3 鹽寮海濱公園101年4月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/20～101/4/21　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	72.7	67.7	48.9	42.0	41.4	84.6	66.5	22.1	95	1007.6	0.4	270.0	(W)	
01~02	74.5	69.6	49.8	42.2	41.6	91.6	67.9	21.9	95	1007.4	0.4	225.0	(SW)	
02~03	76.8	72.5	55.1	43.6	42.2	88.8	69.4	22.0	95	1007.2	0.4	247.5	(WSW)	
03~04	79.1	74.8	56.3	45.5	44.0	92.7	71.3	22.4	95	1007.1	0.6	202.5	(SSW)	
04~05	80.4	77.0	59.9	47.2	45.4	91.3	73.0	22.8	94	1007.4	0.5	135.0	(SE)	
05~06	81.4	77.9	61.2	48.3	46.3	95.0	73.9	22.8	94	1007.5	0.7	202.5	(SSW)	
06~07	78.1	74.7	61.2	50.2	48.0	89.0	71.3	22.8	93	1007.5	0.6	180.0	(S)	
07~08	77.0	74.0	63.7	53.3	51.5	93.4	70.6	23.1	91	1008.4	0.9	135.0	(SE)	
08~09	78.4	74.5	61.0	50.8	49.4	92.2	71.6	23.5	87	1008.3	0.9	112.5	(ESE)	
09~10	77.7	74.6	60.2	49.8	48.4	89.9	70.9	24.2	86	1007.9	1.0	112.5	(ESE)	
10~11	77.4	74.7	62.0	52.0	50.5	86.6	70.6	23.9	86	1007.7	1.3	112.5	(ESE)	
11~12	77.9	74.9	61.4	51.7	50.5	87.0	70.5	23.7	86	1006.9	1.2	112.5	(ESE)	
12~13	77.9	75.2	61.4	50.3	48.9	87.6	71.0	23.7	85	1006.5	1.1	112.5	(ESE)	
13~14	76.6	73.9	61.0	50.7	49.0	88.0	70.0	23.8	85	1005.6	0.9	67.5	(ENE)	
14~15	76.1	73.2	59.0	48.7	47.3	89.2	69.3	24.0	85	1004.7	0.9	90.0	(E)	
15~16	75.0	72.0	59.0	49.4	48.3	89.3	68.6	24.2	86	1004.0	1.0	112.5	(ESE)	
16~17	74.2	71.5	60.1	51.5	50.1	92.1	68.5	24.3	87	1004.3	1.1	135.0	(SE)	
17~18	75.1	71.9	59.3	49.1	47.2	89.2	68.8	24.3	88	1005.3	0.9	112.5	(ESE)	
18~19	72.4	68.6	55.7	46.9	45.7	86.0	66.7	24.4	89	1005.5	0.6	135.0	(SE)	
19~20	72.7	68.9	55.3	45.1	43.7	84.8	66.7	24.2	91	1005.7	0.5	247.5	(WSW)	
20~21	76.0	70.6	55.4	45.0	43.7	88.4	68.4	23.7	94	1006.2	0.4	225.0	(SW)	
21~22	71.7	67.3	51.6	45.2	44.1	86.0	66.1	23.7	94	1005.5	0.3	225.0	(SW)	
22~23	72.8	68.2	50.9	44.6	43.7	89.6	67.1	23.9	94	1005.3	0.8	180.0	(S)	
23~24	72.3	67.0	51.1	44.9	44.3	87.0	66.3	24.0	93	1005.6	0.5	157.5	(SSE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄IV.3-4 鹽寮海濱公園101年4月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/21～101/4/22　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	76.4	71.4	56.1	44.9	43.4	86.6	69.3	23.4	94	1004.6	0.6	270.0	(W)	
01~02	75.1	70.5	51.9	42.0	40.8	87.9	68.9	23.0	95	1002.9	0.6	157.5	(SSE)	
02~03	77.0	72.6	54.3	42.9	41.7	94.2	70.3	22.7	95	1002.7	0.5	247.5	(WSW)	
03~04	79.3	75.0	57.9	45.4	42.8	87.2	71.5	22.4	96	1002.1	0.5	225.0	(SW)	
04~05	81.1	77.9	60.8	45.3	43.5	89.6	73.6	22.4	96	1002.5	0.5	157.5	(SSE)	
05~06	80.2	76.5	60.1	48.1	46.0	95.5	72.7	22.3	96	1002.5	0.5	180.0	(S)	
06~07	79.5	76.1	61.2	50.4	48.0	88.4	72.2	22.5	96	1002.7	0.6	180.0	(S)	
07~08	77.9	74.3	61.4	49.7	47.8	90.3	70.6	24.2	91	1003.1	0.8	135.0	(SE)	
08~09	77.7	74.0	59.1	48.6	46.8	88.4	70.4	24.9	84	1003.0	1.0	112.5	(ESE)	
09~10	77.2	73.8	59.7	47.2	45.5	92.1	71.0	25.8	79	1002.9	1.1	90.0	(E)	
10~11	78.4	74.9	61.1	48.8	47.0	87.7	71.1	26.1	78	1002.5	1.0	67.5	(ENE)	
11~12	76.7	73.6	61.5	50.9	48.6	87.2	69.7	26.3	81	1002.3	1.2	45.0	(NE)	
12~13	77.6	73.8	61.7	49.0	46.9	87.0	70.2	26.3	82	1002.1	1.3	45.0	(NE)	
13~14	77.4	74.0	61.0	49.2	47.5	87.7	70.3	26.2	83	1001.6	1.4	22.5	(NNE)	
14~15	76.3	72.8	60.1	48.0	46.7	90.3	70.0	25.8	81	1001.3	1.0	90.0	(E)	
15~16	74.9	72.0	60.8	50.6	48.4	87.7	68.8	25.6	82	1001.8	0.6	135.0	(SE)	
16~17	75.4	72.9	63.5	53.5	51.5	88.0	69.6	25.4	86	1002.3	0.9	292.5	(WNW)	
17~18	73.5	71.1	61.8	52.4	50.0	84.4	67.9	25.2	77	1003.2	1.7	315.0	(NW)	
18~19	73.6	69.8	58.6	48.4	47.1	88.8	67.8	25.1	71	1003.9	1.5	337.5	(NNW)	
19~20	72.1	68.6	54.8	43.7	42.2	84.7	65.7	24.3	76	1004.7	0.9	315.0	(NW)	
20~21	73.0	68.4	52.9	42.2	41.1	87.6	67.0	24.3	75	1005.5	0.9	337.5	(NNW)	
21~22	71.3	66.5	49.7	41.4	40.5	91.3	66.0	24.2	74	1006.2	0.9	337.5	(NNW)	
22~23	68.6	64.4	48.6	41.3	40.5	88.4	63.7	24.3	74	1006.7	0.9	337.5	(NNW)	
23~24	68.8	63.3	47.1	42.3	41.5	83.7	63.6	23.5	79	1006.8	0.0	0.0	(N)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

環境報告書專用章 備註:備用章 新北市中和區中正路

附錄Ⅳ.3-5 福隆街上101年4月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/20～101/4/21　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	80.0	73.7	50.8	36.8	36.0	91.7	72.4	22.6	98	1007.6	0.5	270.0	(W)	
01~02	80.0	74.7	51.4	37.1	36.2	90.2	72.4	22.5	98	1007.4	0.6	22.5	(NNE)	
02~03	82.7	78.3	56.3	38.3	37.6	92.1	74.7	22.5	98	1007.2	0.6	202.5	(SSW)	
03~04	84.3	81.3	60.1	39.4	38.1	93.6	76.3	22.4	98	1007.1	0.7	337.5	(NNW)	
04~05	85.0	82.5	63.5	46.2	42.4	93.3	77.2	22.6	98	1007.4	0.5	67.5	(ENE)	
05~06	85.3	82.8	66.4	49.9	47.1	97.0	77.9	22.9	98	1007.5	0.6	112.5	(ESE)	
06~07	83.7	81.3	64.3	49.4	46.3	93.3	76.4	22.8	98	1007.5	0.6	337.5	(NNW)	
07~08	82.2	79.8	65.9	53.2	50.3	100.1	75.3	23.6	95	1008.4	0.8	45.0	(NE)	
08~09	83.1	80.7	65.6	51.2	48.6	98.2	76.3	24.2	89	1008.3	0.7	90.0	(E)	
09~10	83.3	81.1	66.9	52.1	49.9	94.1	76.6	24.7	88	1007.9	2.1	67.5	(ENE)	
10~11	83.3	81.4	68.0	54.4	51.3	98.2	76.8	24.7	88	1007.7	1.8	67.5	(ENE)	
11~12	83.0	80.9	69.0	55.0	52.4	100.5	77.0	24.4	88	1006.9	2.5	45.0	(NE)	
12~13	82.7	80.3	67.6	51.7	48.9	92.8	75.8	24.5	87	1006.5	2.4	67.5	(ENE)	
13~14	81.2	79.0	66.1	55.4	52.4	90.7	74.4	24.3	88	1005.6	2.3	67.5	(ENE)	
14~15	81.8	79.4	65.3	51.6	49.0	96.4	74.9	24.6	88	1004.7	2.0	67.5	(ENE)	
15~16	80.9	78.3	65.0	52.9	50.2	95.2	74.0	24.9	89	1004.0	2.1	67.5	(ENE)	
16~17	81.0	78.2	63.9	51.7	48.5	93.2	73.8	25.2	87	1004.3	0.9	45.0	(NE)	
17~18	81.5	78.7	64.8	51.2	48.7	97.5	74.7	25.3	88	1005.3	0.6	90.0	(E)	
18~19	77.0	73.4	60.3	49.3	47.6	93.7	70.7	25.1	90	1005.5	0.6	135.0	(SE)	
19~20	78.4	73.8	57.0	45.1	43.2	90.8	71.3	24.8	92	1005.7	0.6	247.5	(WSW)	
20~21	80.5	76.2	57.1	43.1	41.1	95.0	73.5	24.6	94	1006.2	0.6	135.0	(SE)	
21~22	79.3	73.4	52.2	39.6	38.7	91.0	71.9	24.9	93	1005.5	0.8	337.5	(NNW)	
22~23	79.5	74.8	55.7	41.7	40.3	91.6	72.3	25.0	93	1005.3	1.9	315.0	(NW)	
23~24	79.3	73.7	54.3	39.8	39.0	92.7	72.6	25.1	93	1005.6	1.3	22.5	(NNE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-6 福隆街上101年4月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/21～101/4/22　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	81.3	76.4	59.7	48.2	47.3	93.5	74.2	24.6	92	1004.6	2.1	270.0	(W)	
01~02	81.7	76.7	51.9	41.9	41.2	91.4	73.8	23.8	96	1002.9	0.8	337.5	(NNW)	
02~03	82.7	78.4	55.2	39.5	38.8	91.9	74.8	23.5	98	1002.7	0.6	315.0	(NW)	
03~04	84.0	81.3	61.6	41.9	40.3	93.5	76.3	23.3	98	1002.1	0.6	202.5	(SSW)	
04~05	85.1	82.5	64.2	45.1	41.7	93.0	77.5	23.2	98	1002.5	0.7	135.0	(SE)	
05~06	84.3	82.1	64.1	47.9	44.6	97.7	77.1	23.1	98	1002.5	0.7	315.0	(NW)	
06~07	83.6	81.6	65.0	48.2	45.0	96.9	76.7	23.2	98	1002.7	0.6	247.5	(WSW)	
07~08	82.3	79.9	64.9	49.4	47.1	89.8	74.9	25.0	90	1003.1	0.6	225.0	(SW)	
08~09	82.5	80.3	65.8	51.5	48.5	97.6	75.6	25.8	84	1003.0	1.3	67.5	(ENE)	
09~10	82.4	80.1	67.2	54.8	51.4	93.3	75.5	27.0	79	1002.9	1.4	90.0	(E)	
10~11	82.8	80.7	69.0	57.4	54.7	94.1	76.1	27.0	83	1002.5	1.5	90.0	(E)	
11~12	81.5	79.2	68.4	64.5	64.0	91.6	74.8	27.4	82	1002.3	1.4	90.0	(E)	
12~13	81.0	79.2	67.6	53.2	50.5	88.4	74.6	27.4	83	1002.1	2.5	67.5	(ENE)	
13~14	81.5	78.8	66.5	53.8	51.2	91.0	74.4	26.8	86	1001.6	1.9	67.5	(ENE)	
14~15	79.8	77.1	66.2	53.0	50.8	90.8	72.9	26.8	81	1001.3	1.6	90.0	(E)	
15~16	78.2	75.4	65.8	54.3	51.6	92.0	71.6	26.7	82	1001.8	0.7	202.5	(SSW)	
16~17	78.8	76.1	66.5	52.4	49.1	93.7	72.5	26.5	87	1002.3	0.6	157.5	(SSE)	
17~18	78.6	75.7	66.2	52.6	50.5	87.9	72.3	25.8	88	1003.2	0.8	202.5	(SSW)	
18~19	77.2	74.0	61.6	48.8	46.9	92.8	70.9	25.9	78	1003.9	1.7	247.5	(WSW)	
19~20	77.0	73.0	57.8	46.6	45.4	87.9	70.1	25.1	81	1004.7	0.8	247.5	(WSW)	
20~21	77.2	71.7	52.9	44.3	43.6	92.2	70.3	25.2	78	1005.5	1.4	202.5	(SSW)	
21~22	75.7	70.5	51.6	44.0	43.1	93.5	69.8	25.2	78	1006.2	1.1	135.0	(SE)	
22~23	75.7	70.7	51.7	44.5	43.7	88.9	69.3	25.1	79	1006.7	1.4	135.0	(SE)	
23~24	73.3	67.6	48.1	44.6	43.9	90.6	68.5	24.6	83	1006.8	1.4	112.5	(ESE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

工程顧問有限公司 環境檢驗專用章 檢驗報告 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓

附錄Ⅳ.3-7　102縣道新社橋101年4月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/3～101/4/4　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	59.3	58.5	54.8	50.4	49.4	79.4	56.3	18.1	93	1011.8	0.9	135.0	(SE)	
01~02	60.6	60.0	57.4	53.2	52.2	70.6	57.7	18.3	94	1010.8	0.5	112.5	(ESE)	
02~03	59.3	58.6	55.6	52.2	51.4	71.4	56.4	18.2	93	1010.8	0.7	135.0	(SE)	
03~04	57.5	56.3	52.1	49.8	49.3	70.9	53.7	18.5	91	1011.3	0.7	135.0	(SE)	
04~05	53.0	51.7	49.2	47.8	47.6	77.0	53.2	20.2	90	1011.8	1.1	112.5	(ESE)	
05~06	56.2	53.6	48.7	47.3	47.0	84.4	55.5	24.0	89	1011.4	1.3	0.0	(N)	
06~07	63.9	60.5	51.0	48.5	48.1	83.9	59.8	24.2	83	1011.9	1.2	157.5	(SSE)	
07~08	67.1	63.5	53.4	48.6	48.1	82.8	61.8	24.8	83	1013.2	0.6	90.0	(E)	
08~09	63.9	59.4	50.2	47.9	47.6	80.8	58.2	26.3	76	1014.2	1.0	22.5	(NNE)	
09~10	66.6	61.6	50.4	47.6	47.2	83.3	62.2	27.3	74	1014.8	1.2	0.0	(N)	
10~11	66.5	61.9	50.0	46.8	46.5	81.3	61.2	26.4	77	1016.7	1.8	0.0	(N)	
11~12	65.7	61.8	51.3	47.7	47.3	83.7	61.1	20.7	82	1017.8	2.6	337.5	(NNW)	
12~13	64.9	60.5	50.3	47.4	47.1	82.9	60.6	20.6	71	1017.1	3.3	337.5	(NNW)	
13~14	64.3	59.6	50.4	47.2	46.8	81.4	59.2	19.9	72	1016.8	3.2	337.5	(NNW)	
14~15	63.4	59.1	49.7	46.6	46.3	76.5	57.6	18.9	75	1016.9	3.0	337.5	(NNW)	
15~16	64.3	60.1	49.1	46.1	45.7	85.3	58.9	18.3	74	1017.2	2.2	337.5	(NNW)	
16~17	65.0	60.5	49.4	45.8	45.5	79.9	58.8	18.0	71	1017.7	1.7	337.5	(NNW)	
17~18	65.6	61.8	50.3	46.2	45.8	84.5	59.8	17.7	64	1018.1	1.4	337.5	(NNW)	
18~19	63.5	58.8	47.6	45.6	45.3	85.4	58.8	16.7	70	1018.6	0.8	67.5	(ENE)	
19~20	60.7	56.7	47.5	45.6	45.4	75.9	55.1	14.7	87	1019.2	0.9	112.5	(ESE)	
20~21	60.7	57.1	52.9	46.6	46.0	85.7	58.7	14.3	89	1019.7	0.8	112.5	(ESE)	
21~22	55.7	52.3	46.7	46.0	45.8	81.1	53.3	13.8	93	1019.8	0.5	135.0	(SE)	
22~23	57.4	53.1	47.7	46.6	46.4	74.8	54.1	13.1	94	1019.8	0.3	157.5	(SSE)	
23~24	53.7	50.0	47.6	47.0	46.8	77.0	52.2	12.2	95	1019.4	0.2	90.0	(E)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
　　2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-8　102 縣道之新社橋101年4月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/4～101/4/5　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	50.9	48.2	47.1	46.6	46.4	77.8	51.3	11.7	96	1018.5	0.3	67.5	(ENE)	
01~02	47.9	47.5	46.8	46.3	46.1	70.9	48.3	11.5	95	1017.3	0.3	112.5	(ESE)	
02~03	47.9	47.4	46.6	46.0	45.9	69.7	48.7	11.3	95	1016.5	0.2	90.0	(E)	
03~04	48.1	47.5	46.5	45.9	45.8	64.3	47.0	11.2	95	1016.1	0.2	90.0	(E)	
04~05	52.1	48.7	46.5	45.8	45.6	85.2	55.0	11.4	93	1016.4	0.3	112.5	(ESE)	
05~06	57.1	54.0	48.4	46.1	45.8	83.9	55.7	12.1	92	1016.6	0.2	45.0	(NE)	
06~07	65.2	60.7	50.8	47.6	47.2	85.4	59.7	13.0	93	1017.0	0.3	22.5	(NNE)	
07~08	67.3	64.3	53.7	47.7	47.2	87.0	62.1	16.4	93	1017.0	0.7	90.0	(E)	
08~09	67.6	65.1	53.3	46.7	46.1	82.1	61.5	19.4	76	1016.4	1.2	90.0	(E)	
09~10	67.9	64.9	53.6	46.4	45.7	93.5	64.4	20.6	73	1016.0	1.6	90.0	(E)	
10~11	67.4	64.8	52.8	46.6	46.0	85.0	61.7	21.5	71	1015.0	1.4	112.5	(ESE)	
11~12	67.4	64.6	53.7	47.8	47.1	88.2	62.7	21.7	67	1013.7	1.7	135.0	(SE)	
12~13	66.6	63.5	52.9	47.4	46.7	84.2	61.3	21.8	66	1012.4	2.0	135.0	(SE)	
13~14	68.0	65.6	54.8	48.7	47.5	88.6	63.1	22.0	66	1011.4	2.4	135.0	(SE)	
14~15	69.2	66.5	56.3	49.7	48.3	92.7	65.1	22.0	67	1010.2	2.3	135.0	(SE)	
15~16	68.9	66.3	55.7	49.6	48.5	84.4	63.7	21.7	70	1009.8	2.0	157.5	(SSE)	
16~17	69.3	67.0	57.5	50.0	48.8	82.4	63.6	21.2	73	1009.7	2.0	135.0	(SE)	
17~18	68.7	66.0	55.4	49.3	48.3	83.7	63.1	20.9	76	1010.2	2.6	157.5	(SSE)	
18~19	66.1	62.6	51.9	47.8	47.1	83.1	60.8	20.8	78	1011.1	2.6	157.5	(SSE)	
19~20	63.2	59.3	51.2	48.2	47.7	84.9	58.0	21.0	79	1012.0	2.4	157.5	(SSE)	
20~21	59.9	56.3	47.7	45.5	45.1	74.5	54.8	21.0	81	1012.0	2.4	157.5	(SSE)	
21~22	56.4	50.7	45.9	44.8	44.5	81.1	54.6	20.8	81	1012.1	2.2	180.0	(S)	
22~23	58.3	53.9	46.2	44.8	44.5	77.1	54.0	20.6	81	1012.0	2.4	157.5	(SSE)	
23~24	53.9	50.3	46.1	44.8	44.5	75.0	50.8	20.6	81	1011.6	2.4	157.5	(SSE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
　　2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

檢驗報告專用章
電話:(02)7791-8232

附錄IV.3-9 過港部落101年4月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/3～101/4/4　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	42.9	41.6	38.2	36.6	36.1	51.6	39.4	19.4	86	1011.8	0.3	180.0	(S)	
01~02	43.1	42.0	38.8	36.5	35.9	55.6	39.7	19.7	85	1010.8	0.2	202.5	(SSW)	
02~03	44.4	43.2	39.6	37.3	36.8	74.6	45.3	19.6	86	1010.8	0.2	157.5	(SSE)	
03~04	46.3	45.1	41.7	39.3	38.4	57.5	42.9	19.9	88	1011.3	0.4	135.0	(SE)	
04~05	49.9	47.7	42.1	38.0	37.0	56.9	44.6	23.5	78	1011.8	0.7	225.0	(SW)	
05~06	50.6	49.4	44.6	37.5	35.9	67.3	46.5	23.9	77	1011.4	0.6	225.0	(SW)	
06~07	53.3	50.4	45.1	41.3	40.3	70.0	49.1	24.5	72	1011.9	0.8	225.0	(SW)	
07~08	52.6	50.8	46.8	43.5	42.4	71.4	49.7	25.6	65	1013.2	0.9	225.0	(SW)	
08~09	53.0	51.3	46.8	43.6	42.9	72.4	49.8	27.0	58	1014.2	1.0	225.0	(SW)	
09~10	50.9	49.1	44.6	41.0	40.2	69.5	47.8	28.1	55	1014.8	0.8	202.5	(SSW)	
10~11	55.6	52.6	45.5	41.2	40.4	71.8	50.5	26.7	60	1016.7	0.9	315.0	(NW)	
11~12	54.0	52.0	47.0	44.6	44.1	64.9	49.2	20.9	67	1017.8	1.4	0.0	(N)	
12~13	52.0	50.3	45.9	43.7	43.3	65.7	48.1	20.9	58	1017.1	1.4	0.0	(N)	
13~14	51.2	49.9	46.8	45.0	44.5	68.2	48.6	20.4	59	1016.8	1.6	0.0	(N)	
14~15	51.5	50.4	47.4	45.7	45.3	67.2	48.7	19.7	61	1016.9	1.8	22.5	(NNE)	
15~16	50.5	49.3	47.3	45.8	45.4	67.1	48.8	18.8	61	1017.2	1.8	22.5	(NNE)	
16~17	49.6	48.4	46.8	45.6	45.3	71.1	48.6	18.2	59	1017.7	2.1	22.5	(NNE)	
17~18	54.8	51.9	46.6	45.2	44.9	70.2	50.2	17.9	57	1018.1	2.7	45.0	(NE)	
18~19	50.1	47.5	45.2	44.0	43.7	62.4	46.9	17.7	59	1018.6	2.1	45.0	(NE)	
19~20	47.2	46.8	45.7	44.7	44.4	52.7	45.8	17.8	60	1019.2	1.9	45.0	(NE)	
20~21	47.8	47.5	46.4	45.3	45.0	64.7	46.7	17.8	59	1019.7	1.9	45.0	(NE)	
21~22	47.0	46.6	45.4	44.1	43.8	60.9	45.8	17.8	58	1019.8	1.8	45.0	(NE)	
22~23	45.7	45.3	44.0	43.0	42.8	51.7	44.3	18.0	58	1019.8	1.8	45.0	(NE)	
23~24	45.7	45.3	43.9	42.4	41.9	61.3	44.1	17.8	60	1019.4	0.8	67.5	(ENE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄IV.3-10 過港部落101年4月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/4/4～101/4/5　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	48.1	47.4	45.1	43.4	43.0	50.4	45.6	16.8	65	1018.5	0.3	157.5	(SSE)	
01~02	48.6	48.2	46.3	44.4	44.1	52.7	46.5	15.9	70	1017.3	0.3	180.0	(S)	
02~03	48.9	48.3	46.5	44.7	44.3	52.9	46.7	15.7	71	1016.5	0.2	202.5	(SSW)	
03~04	49.2	48.7	47.2	45.4	45.0	53.5	47.3	15.3	75	1016.1	0.2	225.0	(SW)	
04~05	47.9	47.3	45.4	43.5	43.0	51.9	45.7	15.6	75	1016.4	0.3	202.5	(SSW)	
05~06	54.8	53.4	48.2	45.5	45.0	63.1	50.3	15.6	77	1016.6	0.3	247.5	(WSW)	
06~07	53.4	51.1	46.4	43.8	43.3	69.2	49.2	16.4	75	1017.0	0.3	180.0	(S)	
07~08	51.7	48.9	44.2	42.2	41.7	77.0	49.6	19.8	58	1017.0	0.6	135.0	(SE)	
08~09	50.9	48.9	44.6	42.3	41.8	67.3	47.2	20.6	56	1016.4	0.7	157.5	(SSE)	
09~10	50.0	48.0	43.8	41.2	40.7	64.6	46.1	21.5	55	1016.0	0.8	157.5	(SSE)	
10~11	51.3	49.3	44.0	41.4	40.8	74.8	49.7	22.4	54	1015.0	0.9	157.5	(SSE)	
11~12	50.1	48.0	43.6	40.8	40.3	67.2	46.6	23.4	52	1013.7	0.9	157.5	(SSE)	
12~13	52.2	50.0	44.3	41.0	40.2	75.3	49.1	23.9	51	1012.4	0.9	180.0	(S)	
13~14	54.9	52.2	45.6	41.7	40.9	75.5	50.8	23.9	52	1011.4	1.0	180.0	(S)	
14~15	52.6	50.5	45.2	42.1	41.4	68.8	48.5	23.7	53	1010.2	0.9	180.0	(S)	
15~16	54.4	51.5	44.9	41.7	41.1	78.3	52.0	23.1	57	1009.8	0.9	180.0	(S)	
16~17	51.2	48.9	44.4	41.8	41.3	69.6	47.8	22.5	60	1009.7	0.8	180.0	(S)	
17~18	58.2	54.4	44.1	41.0	40.4	74.6	52.6	21.4	64	1010.2	0.8	180.0	(S)	
18~19	45.7	44.7	41.4	39.3	38.9	63.8	43.1	20.9	68	1011.1	0.6	180.0	(S)	
19~20	46.7	45.2	41.8	39.6	39.2	75.0	46.7	21.0	69	1012.0	0.7	202.5	(SSW)	
20~21	43.4	42.1	39.4	37.6	37.2	52.2	40.2	21.0	71	1012.0	0.6	202.5	(SSW)	
21~22	44.0	42.6	39.6	37.5	37.0	52.1	40.6	20.8	70	1012.1	0.6	180.0	(S)	
22~23	45.3	43.7	40.0	38.0	37.6	76.0	47.0	20.6	71	1012.0	0.6	202.5	(SSW)	
23~24	44.2	43.0	39.0	36.5	35.8	61.3	40.6	20.5	70	1011.6	0.5	225.0	(SW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

經驗顧有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 台北市中和區中正路738號5樓之2

附錄IV.3-11 台2省道與102甲縣道交叉口101年5月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/7～101/5/8　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	76.1	71.1	50.9	42.9	42.4	87.5	68.3	19.4	98	1006.9	0.3	202.5	(SSW)	
01~02	75.2	67.9	45.3	42.0	41.8	86.4	67.6	19.1	98	1006.8	0.5	270.0	(W)	
02~03	78.8	74.2	52.1	43.3	42.8	86.0	70.1	18.7	97	1007.1	0.4	270.0	(W)	
03~04	80.1	76.5	53.7	43.8	43.4	91.0	71.7	18.3	93	1007.1	0.6	315.0	(NW)	
04~05	81.7	79.5	60.1	45.0	44.0	90.4	74.0	18.2	90	1007.2	0.5	292.5	(WNW)	
05~06	81.8	79.8	61.8	49.1	46.8	96.0	74.6	18.2	90	1007.7	0.6	270.0	(W)	
06~07	80.9	78.5	64.6	53.4	51.4	95.0	74.1	19.7	88	1007.9	0.5	292.5	(WNW)	
07~08	79.1	77.2	69.3	59.2	56.4	87.3	73.0	23.4	79	1007.9	0.5	292.5	(WNW)	
08~09	80.2	78.0	65.8	56.1	54.4	89.0	73.3	26.9	69	1007.9	0.8	225.0	(SW)	
09~10	80.1	78.0	66.1	56.8	54.9	90.0	73.4	27.9	65	1008.0	1.1	225.0	(SW)	
10~11	79.2	76.9	64.6	55.7	54.4	93.5	72.9	28.9	63	1008.0	1.0	225.0	(SW)	
11~12	79.2	77.2	67.9	59.2	57.4	90.3	73.0	29.7	63	1007.8	1.2	315.0	(NW)	
12~13	79.5	77.6	67.2	58.6	56.7	90.7	73.2	29.6	63	1007.3	1.2	247.5	(WSW)	
13~14	78.7	76.5	64.9	55.5	53.5	90.6	72.3	29.4	64	1006.9	1.3	225.0	(SW)	
14~15	79.1	77.4	66.2	56.4	54.8	92.2	72.7	29.5	63	1006.3	1.2	225.0	(SW)	
15~16	79.5	77.2	68.0	57.5	55.7	88.6	73.0	28.8	65	1005.5	1.3	225.0	(SW)	
16~17	78.8	76.7	68.0	59.7	57.6	88.0	72.6	27.9	68	1005.5	1.1	225.0	(SW)	
17~18	78.9	76.9	68.4	62.4	60.7	93.4	73.0	26.7	73	1005.3	0.9	225.0	(SW)	
18~19	77.4	74.9	66.3	58.5	56.5	90.6	71.5	25.4	78	1005.7	0.5	247.5	(WSW)	
19~20	75.5	72.9	63.8	56.3	54.5	95.7	69.6	23.8	88	1005.9	0.3	247.5	(WSW)	
20~21	77.3	74.5	64.1	54.9	53.3	90.8	70.7	22.9	96	1006.1	0.2	225.0	(SW)	
21~22	77.8	74.8	61.3	52.2	50.9	90.2	70.7	22.5	98	1005.9	0.4	270.0	(W)	
22~23	76.0	71.8	56.4	48.1	46.5	86.6	68.4	22.0	98	1005.6	0.3	292.5	(WNW)	
23~24	76.1	71.6	53.9	42.9	42.1	88.1	68.8	21.9	98	1005.5	0.4	247.5	(WSW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄IV.3-12 台2省道與102甲縣道交叉口101年5月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/6～101/5/7　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	72.7	67.5	48.2	41.6	41.3	84.5	66.2	18.0	98	1006.9	0.6	225.0	(SW)	
01~02	77.6	72.2	52.5	41.9	41.5	98.4	72.6	17.8	98	1006.6	0.6	225.0	(SW)	
02~03	76.7	70.3	48.4	42.1	41.8	91.8	69.4	17.8	98	1006.7	0.8	270.0	(W)	
03~04	78.7	72.9	52.1	42.7	42.3	93.8	71.0	17.8	98	1007.3	0.6	270.0	(W)	
04~05	80.3	76.4	54.1	42.4	42.0	86.7	71.6	17.9	98	1007.7	0.5	292.5	(WNW)	
05~06	80.2	76.3	58.5	47.2	45.2	87.9	71.7	18.0	98	1008.2	0.7	292.5	(WNW)	
06~07	80.4	77.7	62.5	50.1	48.4	89.5	72.7	18.9	98	1009.0	0.7	292.5	(WNW)	
07~08	79.3	77.0	66.0	55.2	53.2	89.3	72.5	21.6	94	1009.4	0.6	270.0	(W)	
08~09	79.6	77.1	67.2	56.4	53.7	86.7	72.7	25.1	71	1009.6	0.8	0.0	(N)	
09~10	78.7	76.2	68.0	57.0	54.5	96.0	72.5	25.4	70	1009.7	0.9	337.5	(NNW)	
10~11	78.6	76.5	68.9	58.6	56.1	89.2	72.5	25.8	67	1009.3	0.9	0.0	(N)	
11~12	76.0	73.6	66.5	59.4	57.4	89.3	70.3	26.4	66	1008.8	0.8	337.5	(NNW)	
12~13	75.0	72.5	65.0	59.3	57.8	92.8	69.6	26.7	64	1008.3	1.0	315.0	(NW)	
13~14	72.8	70.6	64.1	57.1	55.2	91.7	67.8	26.8	62	1007.9	1.0	315.0	(NW)	
14~15	76.1	73.8	67.3	60.1	58.0	87.7	70.6	26.8	62	1007.4	0.9	337.5	(NNW)	
15~16	76.6	74.2	68.4	59.1	57.3	89.2	71.3	26.5	65	1007.0	0.9	337.5	(NNW)	
16~17	76.0	73.7	67.0	59.5	57.5	84.9	70.5	26.1	67	1007.0	0.9	315.0	(NW)	
17~18	76.9	73.8	65.8	60.0	58.0	87.1	70.7	25.1	73	1007.1	0.7	292.5	(WNW)	
18~19	71.8	69.5	63.5	58.4	57.3	85.0	67.0	23.3	83	1007.3	0.4	247.5	(WSW)	
19~20	72.7	69.6	62.1	57.3	56.0	86.9	66.8	21.2	96	1007.7	0.2	247.5	(WSW)	
20~21	75.1	71.7	61.9	53.2	51.9	90.6	68.8	20.3	98	1008.0	0.4	247.5	(WSW)	
21~22	74.5	71.2	58.1	50.3	49.3	84.9	67.9	20.0	98	1008.1	0.5	225.0	(SW)	
22~23	73.4	70.3	56.3	48.2	46.3	90.0	66.9	19.8	98	1007.7	0.6	225.0	(SW)	
23~24	74.1	68.7	51.8	43.7	43.0	86.8	67.3	19.6	98	1007.3	0.4	247.5	(WSW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

報告專用章
電話:(02)7731-3232
新北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.3-13　鹽寮海濱公園101年5月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/7～101/5/8　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	72.6	67.5	49.7	43.0	42.3	89.5	66.9	20.2	86	1006.9	0.4	202.5	(SSW)	
01~02	71.6	65.4	48.6	43.2	42.7	85.8	66.4	19.6	85	1006.8	0.5	315.0	(NW)	
02~03	76.3	70.9	53.1	44.3	43.5	86.2	68.7	18.9	85	1007.1	0.8	292.5	(WNW)	
03~04	78.6	73.2	54.8	44.7	43.9	89.8	70.8	18.3	84	1007.1	0.8	292.5	(WNW)	
04~05	81.4	77.7	60.3	49.4	47.7	95.2	73.9	18.3	84	1007.2	0.6	270.0	(W)	
05~06	81.4	78.2	60.2	50.6	49.3	91.6	73.9	18.5	83	1007.7	0.6	270.0	(W)	
06~07	79.1	75.2	60.5	48.9	47.0	89.8	71.8	21.0	73	1007.9	0.4	45.0	(NE)	
07~08	78.0	74.3	61.9	49.4	47.3	93.0	71.2	24.8	64	1007.9	0.9	135.0	(SE)	
08~09	78.7	74.3	58.8	48.9	47.5	93.9	71.7	26.7	59	1007.9	2.0	157.5	(SSE)	
09~10	76.5	73.1	59.2	51.6	50.2	92.2	70.4	27.7	55	1008.0	2.6	157.5	(SSE)	
10~11	75.4	72.2	57.4	48.2	46.4	89.6	68.8	28.9	51	1008.0	2.6	180.0	(S)	
11~12	76.4	73.6	63.0	53.4	52.1	85.4	69.7	29.1	51	1007.8	2.6	157.5	(SSE)	
12~13	77.5	74.0	59.3	48.7	46.9	90.6	70.3	28.9	53	1007.3	3.0	157.5	(SSE)	
13~14	77.1	73.3	58.8	50.0	48.7	90.3	69.6	28.9	56	1006.9	2.7	180.0	(S)	
14~15	76.3	73.8	61.5	51.2	49.6	91.1	69.7	28.9	55	1006.3	2.6	180.0	(S)	
15~16	75.6	72.9	62.9	53.2	51.3	85.5	69.4	28.4	56	1005.5	2.7	180.0	(S)	
16~17	75.6	72.9	64.7	55.3	53.3	86.7	69.7	28.0	58	1005.5	1.8	180.0	(S)	
17~18	75.4	73.0	65.5	54.1	51.2	87.9	70.1	27.1	61	1005.3	1.8	202.5	(SSW)	
18~19	74.1	71.6	64.1	52.4	49.4	87.5	68.8	26.3	64	1005.7	1.2	180.0	(S)	
19~20	75.1	71.5	60.6	48.4	46.3	89.6	69.0	25.8	67	1005.9	1.1	202.5	(SSW)	
20~21	76.0	71.4	57.7	46.5	45.0	86.0	69.0	24.5	75	1006.1	0.8	292.5	(WNW)	
21~22	75.0	70.6	54.2	45.3	44.2	88.9	68.4	23.5	80	1005.9	0.7	292.5	(WNW)	
22~23	71.8	67.1	51.9	44.1	43.0	83.6	65.5	23.2	80	1005.6	0.9	292.5	(WNW)	
23~24	71.5	66.3	51.0	43.7	42.8	82.8	64.6	23.6	77	1005.5	0.9	315.0	(NW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
　　2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-14　鹽寮海濱公園101年5月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/6～101/5/7　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	68.3	61.8	45.9	41.5	41.0	84.7	62.5	18.2	88	1006.9	0.5	315.0	(NW)	
01~02	73.4	68.0	48.1	41.9	41.4	85.8	67.5	18.0	90	1006.6	0.5	292.5	(WNW)	
02~03	71.8	66.9	48.7	42.6	42.1	89.9	67.4	17.7	91	1006.7	0.5	292.5	(WNW)	
03~04	76.5	70.5	52.0	43.2	42.6	94.5	70.7	17.8	91	1007.3	0.4	292.5	(WNW)	
04~05	78.6	73.2	53.0	42.8	41.8	92.3	71.5	18.0	91	1007.7	0.5	247.5	(WSW)	
05~06	77.9	72.7	55.9	47.3	45.7	92.5	70.8	18.0	90	1008.2	0.4	337.5	(NNW)	
06~07	78.3	74.1	57.8	46.3	44.6	87.5	71.0	20.2	82	1009.0	0.6	0.0	(N)	
07~08	75.4	72.1	57.5	45.2	43.5	88.0	69.3	23.1	69	1009.4	0.6	67.5	(ENE)	
08~09	77.1	72.9	58.9	45.4	43.8	93.4	70.6	24.3	62	1009.6	1.3	45.0	(NE)	
09~10	74.2	71.2	59.8	46.1	43.9	91.0	68.4	24.6	62	1009.7	1.5	45.0	(NE)	
10~11	75.2	72.1	61.1	50.3	47.6	85.4	68.5	24.8	61	1009.3	1.6	45.0	(NE)	
11~12	74.5	71.0	61.1	47.6	45.5	87.5	68.3	25.0	60	1008.8	1.6	45.0	(NE)	
12~13	75.1	71.5	61.9	52.0	48.4	90.3	69.2	25.3	58	1008.3	1.7	45.0	(NE)	
13~14	72.3	69.7	61.4	50.4	47.4	84.3	66.9	25.3	57	1007.9	1.7	45.0	(NE)	
14~15	72.8	70.3	62.6	52.9	50.2	87.7	67.4	25.3	58	1007.4	1.6	22.5	(NNE)	
15~16	72.5	70.2	63.3	52.7	49.3	85.9	67.8	25.4	60	1007.0	1.3	45.0	(NE)	
16~17	72.4	70.7	63.9	53.1	50.8	83.7	67.2	25.1	61	1007.0	1.1	90.0	(E)	
17~18	72.8	71.1	65.1	55.3	52.3	83.3	67.9	24.5	67	1007.1	1.0	112.5	(ESE)	
18~19	72.6	71.0	65.1	54.2	51.9	82.7	67.7	23.8	71	1007.3	1.1	157.5	(SSE)	
19~20	72.8	70.9	64.4	53.2	51.1	87.2	68.5	22.1	80	1007.7	0.6	292.5	(WNW)	
20~21	72.9	69.6	56.4	47.8	46.7	86.2	67.2	21.2	84	1008.0	0.9	292.5	(WNW)	
21~22	72.0	68.9	53.6	44.9	43.6	85.6	66.1	20.6	86	1008.1	0.8	292.5	(WNW)	
22~23	70.5	67.3	51.3	43.3	42.8	84.4	64.5	20.2	88	1007.7	0.8	292.5	(WNW)	
23~24	70.1	65.5	48.7	42.6	42.1	86.8	64.8	20.1	88	1007.3	0.4	292.5	(WNW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
　　2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

[illegible]顧問有限公司環境檢驗報告專用章
電話:(02)7731-3252
台北市中和區中正路738號5樓之2

附錄Ⅳ.3-15 福隆街上101年5月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/7～101/5/8　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	78.5	71.9	46.5	35.8	35.1	88.7	71.2	20.1	98	1006.9	0.9	180.0	(S)	
01~02	76.3	69.9	44.5	36.1	35.6	91.4	70.6	19.7	98	1006.8	0.8	225.0	(SW)	
02~03	81.3	75.7	52.7	38.9	37.8	90.2	73.3	19.6	98	1007.1	0.7	112.5	(ESE)	
03~04	82.9	78.7	56.6	40.7	38.5	91.4	75.0	19.0	98	1007.1	0.6	112.5	(ESE)	
04~05	85.0	82.3	63.2	52.0	50.0	95.4	77.1	18.7	98	1007.2	0.9	180.0	(S)	
05~06	84.9	82.4	64.5	50.0	47.9	93.1	77.1	18.7	98	1007.7	0.8	157.5	(SSE)	
06~07	83.3	80.8	62.7	48.7	46.2	91.6	75.7	20.6	94	1007.9	0.7	135.0	(SE)	
07~08	82.4	79.0	66.1	53.0	48.7	91.7	74.9	24.7	86	1007.9	1.7	270.0	(W)	
08~09	82.7	79.8	63.8	52.4	50.4	98.2	75.4	26.1	85	1007.9	2.5	292.5	(WNW)	
09~10	82.2	79.6	64.1	51.9	49.0	92.3	74.9	26.7	81	1008.0	2.4	315.0	(NW)	
10~11	81.5	78.7	65.3	58.3	55.2	95.7	74.5	27.2	80	1008.0	2.8	292.5	(WNW)	
11~12	81.3	78.8	66.4	58.8	57.3	90.3	74.3	27.3	82	1007.8	3.0	292.5	(WNW)	
12~13	81.0	78.6	64.2	50.8	48.6	95.2	74.0	27.3	84	1007.3	3.3	292.5	(WNW)	
13~14	80.0	77.3	65.3	57.5	51.3	99.2	73.8	27.5	84	1006.9	2.9	315.0	(NW)	
14~15	80.8	78.8	66.0	52.0	49.1	89.8	73.9	27.5	83	1006.3	2.8	292.5	(WNW)	
15~16	80.0	77.8	67.0	54.7	51.7	95.1	73.6	27.2	83	1005.5	3.0	292.5	(WNW)	
16~17	77.6	75.1	67.0	59.9	56.2	85.8	71.2	26.7	86	1005.5	2.5	292.5	(WNW)	
17~18	80.4	77.9	68.8	58.1	55.4	93.8	74.7	26.1	88	1005.3	2.3	292.5	(WNW)	
18~19	78.3	75.2	67.5	56.6	53.1	93.4	72.5	25.5	90	1005.7	2.0	292.5	(WNW)	
19~20	78.4	75.3	65.6	49.8	46.3	97.7	72.5	25.3	92	1005.9	1.7	315.0	(NW)	
20~21	80.8	76.5	61.3	45.7	43.3	92.5	73.4	25.3	94	1006.1	1.1	45.0	(NE)	
21~22	79.8	75.3	57.3	43.2	41.4	92.1	72.3	24.9	96	1005.9	0.9	180.0	(S)	
22~23	77.7	73.2	55.2	40.8	39.1	89.7	70.6	24.7	96	1005.6	1.4	315.0	(NW)	
23~24	77.5	72.4	52.6	38.4	37.3	90.3	70.7	25.0	94	1005.5	1.8	292.5	(WNW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-16 福隆街上101年5月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/6～101/5/7　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	75.3	70.0	47.8	37.3	36.7	88.4	69.3	17.5	98	1006.9	0.8	247.5	(WSW)	
01~02	78.5	72.2	46.5	36.7	36.0	90.1	71.7	17.5	98	1006.6	0.6	202.5	(SSW)	
02~03	80.1	74.2	47.7	36.8	36.2	99.4	73.6	17.4	98	1006.7	0.6	225.0	(SW)	
03~04	81.7	76.2	53.5	38.4	37.5	93.0	74.5	17.2	98	1007.3	0.8	225.0	(SW)	
04~05	83.3	78.7	57.3	42.1	39.2	93.9	75.2	17.0	98	1007.7	0.6	292.5	(WNW)	
05~06	82.8	78.6	59.2	47.0	45.2	91.4	74.8	16.7	98	1008.2	0.6	202.5	(SSW)	
06~07	82.6	79.1	60.5	46.5	44.1	93.2	74.9	18.5	98	1009.0	1.1	247.5	(WSW)	
07~08	80.8	77.7	62.8	48.3	45.6	89.8	73.4	21.8	94	1009.4	1.1	225.0	(SW)	
08~09	80.6	77.6	64.0	51.0	48.8	91.2	73.3	24.6	84	1009.6	1.1	90.0	(E)	
09~10	77.3	74.1	63.5	50.8	48.6	93.0	70.8	25.1	84	1009.7	1.7	67.5	(ENE)	
10~11	77.1	74.7	65.4	55.9	53.5	94.4	71.2	25.5	83	1009.3	1.8	67.5	(ENE)	
11~12	75.1	72.4	64.3	57.0	55.0	96.0	70.1	25.7	83	1008.8	2.0	67.5	(ENE)	
12~13	75.6	73.1	64.2	57.0	55.1	93.9	70.7	25.9	79	1008.3	2.2	45.0	(NE)	
13~14	74.6	71.8	64.0	57.2	55.2	93.8	69.4	26.1	77	1007.9	2.0	45.0	(NE)	
14~15	72.9	70.3	63.9	58.3	56.8	88.6	67.9	25.7	77	1007.4	2.0	45.0	(NE)	
15~16	73.1	70.7	63.1	58.7	57.6	95.2	68.3	25.4	80	1007.0	2.0	45.0	(NE)	
16~17	70.3	67.7	60.9	56.9	56.0	87.3	64.9	24.7	82	1007.0	2.3	45.0	(NE)	
17~18	74.9	72.0	63.1	58.4	57.2	92.1	69.8	24.6	85	1007.1	1.1	0.0	(N)	
18~19	70.7	68.0	61.1	56.6	55.6	88.9	66.1	23.1	96	1007.3	0.6	247.5	(WSW)	
19~20	72.4	69.7	60.8	55.0	52.6	92.9	66.8	22.2	98	1007.7	0.7	90.0	(E)	
20~21	76.3	72.8	58.8	47.1	44.4	88.3	70.1	21.3	98	1008.0	0.6	135.0	(SE)	
21~22	75.3	72.3	55.7	41.3	39.5	87.3	69.2	20.6	98	1008.1	0.6	202.5	(SSW)	
22~23	75.2	71.4	50.7	39.2	38.2	87.9	68.8	20.4	98	1007.7	0.8	202.5	(SSW)	
23~24	76.4	70.6	45.9	36.8	36.0	89.0	69.7	20.2	98	1007.3	0.8	202.5	(SSW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

有限公司 試驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.3-17　102縣道新社橋101年5月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/11～101/5/12　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	53.0	51.5	50.3	49.8	49.6	75.9	53.2	20.5	98	1007.2	0.4	22.5	(NNE)	
01~02	51.9	51.0	50.2	49.7	49.6	75.9	52.0	20.2	98	1007.0	0.2	67.5	(ENE)	
02~03	51.4	51.0	50.5	50.1	49.9	81.4	55.0	20.2	98	1006.8	0.2	0.0	(N)	
03~04	51.2	50.7	50.2	49.8	49.6	61.9	50.5	20.3	98	1006.6	0.2	22.5	(NNE)	
04~05	54.5	52.4	50.7	50.1	49.9	86.6	56.9	20.3	98	1006.8	0.3	0.0	(N)	
05~06	60.0	57.3	52.0	50.4	50.1	82.6	57.4	20.3	99	1007.1	0.3	337.5	(NNW)	
06~07	64.2	60.2	51.2	49.8	49.6	80.7	59.2	20.6	99	1007.2	0.2	337.5	(NNW)	
07~08	68.0	63.5	52.6	49.9	49.6	84.1	62.0	20.9	99	1007.4	0.2	0.0	(N)	
08~09	67.3	62.7	51.4	49.6	49.4	87.6	62.0	21.4	99	1007.5	0.3	315.0	(NW)	
09~10	68.8	63.4	52.9	49.9	49.6	90.8	64.5	22.5	99	1007.5	0.6	337.5	(NNW)	
10~11	69.4	66.5	59.6	51.4	50.5	86.6	63.9	23.5	98	1007.2	0.6	157.5	(SSE)	
11~12	68.0	63.3	53.1	49.6	49.4	82.3	61.6	23.1	98	1006.9	0.4	22.5	(NNE)	
12~13	63.8	59.3	51.1	49.2	48.7	82.5	58.4	24.4	98	1006.2	0.6	22.5	(NNE)	
13~14	65.6	60.9	50.8	48.8	48.5	83.4	60.7	23.8	98	1005.6	1.2	22.5	(NNE)	
14~15	66.5	62.9	51.9	48.9	48.6	88.3	61.5	23.5	98	1005.5	0.9	45.0	(NE)	
15~16	66.1	62.0	51.9	49.5	49.2	82.5	60.5	23.3	98	1005.3	1.1	135.0	(SE)	
16~17	67.1	63.1	53.0	50.0	49.7	80.7	60.5	23.2	98	1005.1	0.6	112.5	(ESE)	
17~18	68.0	64.8	53.8	49.7	49.4	82.7	61.9	23.0	98	1005.3	0.5	112.5	(ESE)	
18~19	65.9	61.7	52.0	49.7	49.5	83.4	60.5	22.4	98	1005.6	0.4	202.5	(SSW)	
19~20	64.6	62.1	52.8	51.0	50.8	79.0	59.7	22.2	99	1006.3	0.3	45.0	(NE)	
20~21	63.1	59.8	52.1	50.7	50.5	77.5	58.6	22.2	99	1006.7	0.8	45.0	(NE)	
21~22	61.3	57.9	51.5	50.5	50.3	78.4	57.4	22.3	99	1007.0	0.4	45.0	(NE)	
22~23	62.3	58.5	51.8	50.6	50.3	79.5	57.9	22.4	99	1006.8	0.7	135.0	(SE)	
23~24	62.6	60.0	53.4	50.8	50.4	85.4	59.7	22.3	99	1006.3	0.3	157.5	(SSE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-18　102 縣道之新社橋101年5月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/12～101/5/13　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	64.4	63.3	55.0	51.2	50.6	81.8	59.8	22.1	99	1005.8	0.3	157.5	(SSE)	
01~02	63.6	62.2	54.9	52.5	51.9	82.0	59.0	22.2	99	1005.5	0.6	180.0	(S)	
02~03	58.5	55.6	53.0	51.5	51.2	76.4	55.6	22.3	99	1005.2	0.4	202.5	(SSW)	
03~04	53.2	52.2	50.8	50.2	50.1	82.4	56.0	22.2	99	1005.0	0.3	157.5	(SSE)	
04~05	55.6	53.3	50.6	50.1	49.9	90.8	58.3	22.1	99	1004.7	0.4	337.5	(NNW)	
05~06	62.9	60.4	53.6	50.7	50.2	83.7	59.6	22.5	99	1005.0	0.5	0.0	(N)	
06~07	66.2	61.6	52.6	50.7	50.3	89.1	62.3	23.0	99	1005.2	1.2	90.0	(E)	
07~08	70.3	66.1	54.8	51.5	51.1	87.7	64.6	23.5	99	1005.6	1.1	67.5	(ENE)	
08~09	71.7	67.6	56.3	52.2	51.8	84.9	65.4	23.8	99	1005.6	1.4	135.0	(SE)	
09~10	72.1	68.2	55.9	51.7	51.3	88.3	66.4	24.1	99	1005.3	0.9	0.0	(N)	
10~11	73.1	70.4	58.6	52.9	52.3	91.3	67.5	24.2	99	1005.3	0.9	135.0	(SE)	
11~12	72.6	70.0	57.6	52.1	51.8	86.1	66.1	24.5	98	1004.6	0.8	45.0	(NE)	
12~13	73.9	71.8	60.4	53.1	52.4	85.6	67.3	24.2	98	1003.8	1.1	45.0	(NE)	
13~14	73.4	71.1	59.3	53.8	53.4	88.3	66.9	24.2	99	1003.2	1.0	112.5	(ESE)	
14~15	72.6	69.6	58.5	53.5	52.8	88.8	66.8	24.4	98	1003.0	1.0	67.5	(ENE)	
15~16	72.8	70.9	59.2	53.1	52.6	85.0	66.1	24.3	99	1003.0	1.5	22.5	(NNE)	
16~17	73.0	70.7	61.4	55.3	54.3	87.4	67.0	23.9	99	1003.2	2.2	157.5	(SSE)	
17~18	71.4	68.3	56.9	52.9	52.6	82.8	64.4	23.9	98	1003.5	1.3	135.0	(SE)	
18~19	69.8	65.9	54.7	52.4	52.2	85.4	63.3	23.7	99	1003.6	1.1	112.5	(ESE)	
19~20	67.8	63.3	57.8	53.0	52.6	79.8	62.6	23.4	99	1003.9	0.5	45.0	(NE)	
20~21	68.1	63.4	57.0	56.0	55.8	80.0	62.9	23.5	99	1004.2	0.7	67.5	(ENE)	
21~22	60.8	57.4	55.1	54.3	54.1	80.8	58.2	24.1	99	1004.1	1.4	45.0	(NE)	
22~23	60.0	56.7	54.3	53.7	53.5	78.5	58.2	24.4	99	1003.6	1.2	67.5	(ENE)	
23~24	56.9	55.5	54.1	53.5	53.4	76.0	56.0	24.8	99	1003.0	0.9	90.0	(E)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

[illegible]工程顧問有限公司 檢驗專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-19　過港部落101年5月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/11～101/5/12　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	48.1	47.5	44.7	42.8	42.5	58.8	45.4	21.4	98	1007.2	0.6	22.5	(NNE)	
01~02	49.8	48.8	46.2	42.3	41.5	61.6	46.7	21.1	98	1007.0	0.4	0.0	(N)	
02~03	50.7	50.0	47.9	44.8	43.9	58.0	48.1	21.0	98	1006.8	0.2	337.5	(NNW)	
03~04	52.9	51.9	44.9	42.0	41.5	72.4	48.7	20.9	98	1006.6	0.2	157.5	(SSE)	
04~05	53.7	52.3	49.4	46.9	46.2	64.9	50.4	21.1	98	1006.8	0.2	180.0	(S)	
05~06	52.3	50.4	45.4	42.2	41.3	64.7	47.8	21.2	98	1007.1	0.2	247.5	(WSW)	
06~07	46.7	45.0	41.4	38.3	37.6	64.1	43.8	21.5	98	1007.2	0.2	270.0	(W)	
07~08	53.3	51.7	42.2	37.3	36.7	76.8	49.2	21.6	99	1007.4	0.2	0.0	(N)	
08~09	48.4	46.9	42.2	38.2	37.3	66.4	45.1	22.1	99	1007.5	0.2	225.0	(SW)	
09~10	50.1	45.7	40.1	37.2	36.6	69.1	46.5	22.7	99	1007.5	0.3	22.5	(NNE)	
10~11	46.1	44.0	40.0	37.4	36.8	67.7	44.2	23.2	99	1007.2	0.2	180.0	(S)	
11~12	51.4	48.0	42.2	38.9	38.1	66.5	46.9	23.2	98	1006.9	0.3	202.5	(SSW)	
12~13	50.8	47.5	40.1	36.8	36.0	73.0	48.4	23.9	97	1006.2	0.5	67.5	(ENE)	
13~14	45.7	42.8	38.3	36.7	36.3	72.0	47.1	23.9	94	1005.6	0.9	45.0	(NE)	
14~15	50.2	46.7	38.7	36.8	36.3	77.6	48.4	23.6	98	1005.5	0.5	45.0	(NE)	
15~16	48.4	44.9	39.5	37.5	37.1	69.1	45.9	23.3	98	1005.3	0.4	67.5	(ENE)	
16~17	48.7	44.9	40.5	37.8	37.2	77.6	48.0	23.3	98	1005.1	0.2	180.0	(S)	
17~18	50.3	45.3	40.5	38.4	37.9	72.3	47.9	23.1	98	1005.3	0.2	180.0	(S)	
18~19	47.1	45.5	41.7	38.8	38.0	70.5	45.2	22.9	98	1005.6	0.3	202.5	(SSW)	
19~20	44.2	43.1	41.1	39.7	39.3	64.1	42.4	22.9	98	1006.3	0.2	202.5	(SSW)	
20~21	43.6	42.8	40.7	39.1	38.5	64.0	42.0	23.1	98	1006.7	0.2	180.0	(S)	
21~22	46.0	45.3	42.0	39.6	39.1	53.5	42.9	23.1	98	1007.0	0.2	270.0	(W)	
22~23	45.0	44.0	41.4	39.6	39.1	51.6	42.1	23.0	98	1006.8	0.3	157.5	(SSE)	
23~24	43.9	43.1	40.9	39.0	38.5	55.4	41.4	22.8	98	1006.3	0.3	202.5	(SSW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-20　過港部落101年5月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/5/12～101/5/13　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	43.7	42.6	40.3	38.3	38.0	54.8	41.0	22.8	98	1005.8	0.2	202.5	(SSW)	
01~02	44.9	43.8	41.5	39.7	39.3	50.0	42.0	22.9	98	1005.5	0.3	202.5	(SSW)	
02~03	45.6	44.5	41.2	39.1	38.8	73.6	45.2	22.9	98	1005.2	0.2	202.5	(SSW)	
03~04	45.1	44.2	41.7	40.0	39.7	51.4	42.3	22.8	98	1005.0	0.2	225.0	(SW)	
04~05	49.7	48.5	44.3	42.0	41.5	67.5	45.9	22.8	99	1004.7	0.3	225.0	(SW)	
05~06	54.1	51.8	46.6	42.9	42.2	64.5	48.8	23.2	99	1005.0	0.2	202.5	(SSW)	
06~07	50.9	49.6	45.3	42.1	41.2	76.3	49.6	23.3	99	1005.2	0.4	180.0	(S)	
07~08	53.4	52.5	46.8	43.7	43.1	70.8	49.3	23.7	99	1005.6	0.5	180.0	(S)	
08~09	55.2	53.0	48.3	45.7	45.2	68.6	50.8	23.7	99	1005.6	0.3	180.0	(S)	
09~10	54.1	48.8	43.4	39.9	39.3	76.0	48.3	24.2	99	1005.3	0.3	157.5	(SSE)	
10~11	62.3	58.8	47.2	40.5	39.7	69.7	55.2	24.2	99	1005.3	0.4	157.5	(SSE)	
11~12	50.9	48.5	43.4	39.8	38.9	68.7	48.0	24.3	99	1004.6	0.3	135.0	(SE)	
12~13	57.7	56.9	47.6	42.8	42.1	68.1	52.4	24.2	99	1003.8	0.3	157.5	(SSE)	
13~14	61.9	61.1	48.8	42.1	41.0	77.1	57.5	24.3	99	1003.2	0.4	157.5	(SSE)	
14~15	49.3	46.7	42.5	40.3	39.9	82.0	50.8	24.6	99	1003.0	0.4	180.0	(S)	
15~16	55.2	52.1	45.6	42.4	41.7	78.5	50.5	24.6	99	1003.0	0.5	180.0	(S)	
16~17	54.4	51.4	45.7	42.2	41.6	71.7	50.1	24.2	99	1003.2	0.3	180.0	(S)	
17~18	50.7	47.8	43.6	41.4	41.0	73.0	49.1	24.1	99	1003.5	0.4	180.0	(S)	
18~19	46.7	45.6	42.5	40.7	40.4	73.0	45.4	24.0	99	1003.6	0.4	180.0	(S)	
19~20	60.5	59.7	54.4	41.1	40.7	67.7	56.0	23.9	99	1003.9	0.3	202.5	(SSW)	
20~21	64.5	62.1	58.7	50.7	48.7	69.9	59.6	24.0	99	1004.2	0.4	202.5	(SSW)	
21~22	49.2	48.0	44.5	42.5	42.2	71.5	47.3	24.1	99	1004.1	0.4	180.0	(S)	
22~23	45.6	44.4	42.2	41.0	40.7	66.8	43.6	24.3	99	1003.6	0.4	202.5	(SSW)	
23~24	46.7	45.5	42.4	41.1	40.8	64.2	43.8	24.6	99	1003.0	0.5	202.5	(SSW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

檢驗報告專用章
電話:(02)7730-3899
台北市中和區中正路738號5樓

附錄Ⅳ.3-21　台2省道與102甲縣道交叉口101年6月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/25～101/6/26　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	73.3	67.5	49.0	43.5	43.2	85.2	66.1	24.7	93	1003.1	0.4	315.0	(NW)	
01~02	77.7	73.1	50.9	43.2	42.9	86.7	69.2	24.6	94	1002.7	0.4	292.5	(WNW)	
02~03	77.8	73.4	50.3	43.5	43.2	87.5	69.3	24.5	96	1002.6	0.5	337.5	(NNW)	
03~04	79.0	76.2	55.0	44.1	43.6	88.5	70.8	24.6	96	1002.4	0.5	315.0	(NW)	
04~05	79.6	77.5	57.1	44.4	43.7	87.3	71.8	24.7	97	1002.7	0.3	247.5	(WSW)	
05~06	80.3	78.3	62.1	49.6	48.1	88.7	72.9	24.8	97	1002.8	0.3	247.5	(WSW)	
06~07	78.8	76.6	63.3	53.2	51.2	92.3	71.9	26.0	91	1003.2	0.4	315.0	(NW)	
07~08	78.1	76.1	68.0	58.9	56.5	90.6	72.1	28.6	82	1003.1	0.5	0.0	(N)	
08~09	77.6	75.5	64.2	55.6	54.2	85.7	70.7	29.2	78	1003.1	0.7	337.5	(NNW)	
09~10	78.5	76.7	65.8	57.5	55.9	93.7	72.3	29.5	76	1003.2	0.8	0.0	(N)	
10~11	78.5	77.1	66.4	56.6	55.2	88.9	72.4	30.0	75	1003.1	0.9	0.0	(N)	
11~12	77.9	76.3	66.5	58.9	56.7	89.3	71.9	30.9	75	1002.7	1.3	22.5	(NNE)	
12~13	78.4	76.7	66.7	58.4	56.9	86.7	72.1	30.9	76	1002.3	1.5	22.5	(NNE)	
13~14	79.3	77.2	67.1	57.1	54.9	90.1	73.4	31.9	72	1002.0	1.2	0.0	(N)	
14~15	77.8	75.8	64.4	55.7	54.0	85.2	71.0	31.2	73	1002.0	1.3	22.5	(NNE)	
15~16	77.2	75.1	64.7	57.6	56.2	91.7	70.8	29.8	77	1002.1	0.9	0.0	(N)	
16~17	77.2	75.2	66.0	59.0	57.3	94.9	71.6	28.5	79	1001.9	0.6	315.0	(NW)	
17~18	78.7	76.7	67.2	60.0	58.3	95.3	72.6	27.7	81	1002.0	0.4	315.0	(NW)	
18~19	75.3	72.3	62.6	55.6	54.3	85.7	68.7	27.8	83	1002.3	0.3	315.0	(NW)	
19~20	74.5	71.3	60.4	54.1	53.1	82.4	67.4	26.6	82	1002.8	0.3	315.0	(NW)	
20~21	75.3	72.1	61.6	54.7	53.6	89.9	68.6	25.9	89	1003.4	0.4	315.0	(NW)	
21~22	75.9	72.9	60.3	53.3	52.4	83.9	68.6	25.6	89	1003.4	0.5	315.0	(NW)	
22~23	73.7	69.1	53.9	45.9	44.1	83.2	66.1	25.3	90	1003.1	0.4	337.5	(NNW)	
23~24	75.3	70.3	51.9	43.3	42.8	86.2	67.5	25.4	91	1002.9	0.3	0.0	(N)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-22　台2省道與102甲縣道交叉口101年6月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/24～101/6/25　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	68.3	63.2	46.2	43.3	43.1	83.6	63.2	25.2	90	1002.7	0.4	315.0	(NW)	
01~02	68.9	62.9	45.5	43.5	43.3	81.9	63.2	25.0	92	1002.0	0.3	315.0	(NW)	
02~03	69.4	63.0	45.0	43.4	43.2	83.5	64.1	24.8	93	1001.7	0.3	337.5	(NNW)	
03~04	76.5	70.8	50.4	44.5	44.2	87.6	68.4	24.6	95	1002.0	0.6	337.5	(NNW)	
04~05	78.1	73.1	53.0	44.5	44.1	86.1	69.6	24.6	94	1002.1	0.4	292.5	(WNW)	
05~06	77.4	73.0	56.8	48.6	47.3	91.2	69.4	24.4	92	1002.4	0.3	270.0	(W)	
06~07	76.8	72.9	59.4	50.8	49.4	88.7	69.5	25.8	89	1002.8	0.6	315.0	(NW)	
07~08	77.0	73.9	61.2	52.6	50.9	84.8	69.6	28.3	85	1002.8	0.6	0.0	(N)	
08~09	77.6	75.0	63.4	54.0	52.0	84.3	70.5	30.1	79	1002.7	0.7	22.5	(NNE)	
09~10	76.1	73.5	64.9	54.7	52.7	100.5	70.9	31.0	70	1002.8	0.8	0.0	(N)	
10~11	76.7	74.2	66.1	56.2	54.2	85.5	70.4	30.6	68	1003.1	0.8	0.0	(N)	
11~12	74.8	72.6	65.0	56.8	55.1	83.0	68.8	30.7	70	1002.7	1.5	22.5	(NNE)	
12~13	73.5	71.3	64.3	57.5	55.5	84.3	68.2	30.4	76	1002.4	1.4	0.0	(N)	
13~14	72.0	69.7	63.3	56.4	55.0	89.9	66.8	29.9	77	1002.5	1.2	0.0	(N)	
14~15	72.5	70.1	63.8	57.2	55.7	84.6	67.2	29.4	83	1002.2	0.8	0.0	(N)	
15~16	74.5	72.3	65.4	58.9	56.8	91.5	69.2	28.9	86	1002.4	0.7	0.0	(N)	
16~17	75.5	72.7	65.3	59.0	57.0	88.6	69.4	29.1	84	1002.2	0.7	0.0	(N)	
17~18	74.6	72.0	65.1	60.4	58.7	83.9	68.9	28.6	82	1002.7	0.6	337.5	(NNW)	
18~19	72.8	70.1	64.3	59.0	57.2	84.1	67.5	27.8	79	1003.2	0.4	315.0	(NW)	
19~20	72.6	69.6	62.0	55.9	54.2	88.5	67.1	26.5	86	1003.0	0.5	315.0	(NW)	
20~21	72.7	69.3	60.3	53.5	52.4	91.6	66.7	26.0	87	1003.3	0.2	225.0	(SW)	
21~22	73.6	70.1	58.8	51.6	50.9	87.2	67.0	25.6	89	1003.1	0.5	315.0	(NW)	
22~23	72.0	68.1	54.0	45.7	44.4	85.1	65.6	25.1	91	1003.1	0.5	315.0	(NW)	
23~24	72.1	67.8	51.7	45.0	44.2	83.8	65.4	25.0	93	1002.9	0.4	337.5	(NNW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

核5.0檢 報告 章 用
33章5
電話:(02)7731-3222
台北市中和區中正路738號5樓之

附錄Ⅳ.3-23　鹽寮海濱公園101年6月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/25～101/6/26　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	71.6	65.8	46.9	40.1	39.6	85.9	65.9	25.3	91	1003.1	0.5	292.5	(WNW)	
01~02	75.3	70.4	50.4	41.0	40.3	88.4	68.6	25.2	90	1002.7	0.7	270.0	(W)	
02~03	76.4	70.1	50.3	41.5	40.7	90.0	69.4	25.2	90	1002.6	0.4	270.0	(W)	
03~04	78.1	73.6	53.8	43.6	42.7	94.9	70.9	25.2	89	1002.4	0.5	270.0	(W)	
04~05	80.1	75.8	57.2	45.9	44.2	91.6	72.6	25.3	89	1002.7	0.5	157.5	(SSE)	
05~06	81.0	77.3	61.1	47.9	45.6	92.1	73.6	25.2	90	1002.8	0.5	247.5	(WSW)	
06~07	77.3	73.6	58.7	46.5	44.2	88.0	70.7	28.1	79	1003.2	0.5	22.5	(NNE)	
07~08	76.9	73.4	62.3	50.1	48.1	91.2	70.6	29.4	74	1003.1	0.9	112.5	(ESE)	
08~09	76.2	72.3	56.7	46.6	44.9	87.7	69.6	29.5	73	1003.1	1.1	112.5	(ESE)	
09~10	77.2	73.4	59.4	49.3	48.1	87.6	70.2	29.2	74	1003.2	1.0	90.0	(E)	
10~11	78.8	75.4	60.6	49.2	47.8	89.2	71.4	29.7	74	1003.1	1.1	90.0	(E)	
11~12	77.0	73.3	58.8	47.3	45.9	87.8	69.8	30.3	71	1002.7	1.3	67.5	(ENE)	
12~13	76.6	73.2	59.4	48.4	46.6	86.1	69.5	30.7	71	1002.3	1.5	90.0	(E)	
13~14	76.8	73.7	60.0	49.0	47.7	87.7	69.8	30.9	69	1002.0	1.6	112.5	(ESE)	
14~15	76.2	72.8	60.4	49.3	47.7	89.6	69.6	30.7	70	1002.0	1.3	67.5	(ENE)	
15~16	75.3	72.1	59.4	49.1	47.5	87.3	68.5	30.5	66	1002.1	1.2	157.5	(SSE)	
16~17	74.9	71.7	61.3	51.7	49.5	86.6	68.5	29.7	74	1001.9	0.9	315.0	(NW)	
17~18	75.8	72.8	62.9	55.6	54.0	85.5	69.2	28.9	76	1002.0	0.7	225.0	(SW)	
18~19	73.5	70.9	60.9	53.4	51.2	86.7	67.8	28.9	77	1002.3	0.6	292.5	(WNW)	
19~20	72.7	69.1	58.3	49.3	47.9	88.9	67.2	27.4	84	1002.8	0.6	292.5	(WNW)	
20~21	73.8	69.7	55.5	46.1	45.1	85.9	67.4	26.7	87	1003.4	0.6	292.5	(WNW)	
21~22	74.2	69.8	53.6	45.8	44.9	86.7	67.6	26.5	88	1003.4	0.6	270.0	(W)	
22~23	72.0	66.7	49.3	40.3	38.9	84.7	65.9	26.2	88	1003.1	0.5	292.5	(WNW)	
23~24	73.2	67.9	48.8	38.7	37.9	85.5	66.7	26.1	89	1002.9	0.5	180.0	(S)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
　　2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-24　鹽寮海濱公園101年6月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/24～101/6/25　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	65.5	59.7	44.6	40.8	40.1	84.8	61.9	25.9	89	1002.7	0.5	315.0	(NW)	
01~02	65.4	59.3	43.7	40.0	39.5	83.2	61.6	25.5	90	1002.0	0.5	292.5	(WNW)	
02~03	66.3	60.4	45.1	40.6	40.0	86.1	63.1	25.3	90	1001.7	0.5	270.0	(W)	
03~04	74.0	68.8	49.4	41.8	41.3	90.7	68.1	25.1	91	1002.0	0.5	270.0	(W)	
04~05	77.0	70.7	50.8	43.3	42.9	89.9	70.3	25.1	90	1002.1	0.5	157.5	(SSE)	
05~06	75.2	70.0	53.0	44.1	43.2	88.0	68.9	25.1	90	1002.4	0.6	270.0	(W)	
06~07	73.3	69.7	54.8	43.8	42.1	90.2	67.4	27.8	80	1002.8	0.4	315.0	(NW)	
07~08	73.8	70.3	54.6	43.1	41.2	86.8	67.6	30.3	67	1002.8	0.7	315.0	(NW)	
08~09	74.2	70.8	56.5	44.8	43.3	86.3	67.8	30.2	71	1002.7	1.1	90.0	(E)	
09~10	72.1	68.6	56.5	45.4	44.0	86.3	66.3	29.8	77	1002.8	1.4	90.0	(E)	
10~11	74.1	70.8	59.2	48.0	45.8	90.8	68.3	29.3	82	1003.1	1.5	90.0	(E)	
11~12	74.7	71.1	60.6	50.6	48.6	88.8	68.4	29.9	74	1002.7	2.1	22.5	(NNE)	
12~13	72.6	70.0	61.2	50.3	48.0	85.8	67.2	30.5	69	1002.4	2.5	22.5	(NNE)	
13~14	71.8	69.5	61.5	52.4	50.1	90.1	67.2	29.8	74	1002.5	2.1	22.5	(NNE)	
14~15	71.9	69.8	62.4	52.7	50.1	86.7	67.0	28.9	81	1002.2	1.4	45.0	(NE)	
15~16	72.1	70.5	64.4	56.0	53.3	84.8	67.4	28.4	84	1002.4	1.0	67.5	(ENE)	
16~17	72.3	70.6	64.4	54.9	52.1	90.9	68.0	28.5	82	1002.2	0.9	90.0	(E)	
17~18	72.6	70.9	64.4	53.7	50.7	83.8	67.6	28.4	83	1002.7	1.0	112.5	(ESE)	
18~19	72.5	70.7	64.9	54.2	50.8	85.6	67.9	28.3	80	1003.2	0.8	157.5	(SSE)	
19~20	73.0	70.6	62.5	51.9	50.1	85.9	67.9	27.4	83	1003.0	0.5	315.0	(NW)	
20~21	70.8	68.2	55.0	46.0	44.6	86.5	65.5	26.7	85	1003.3	0.6	292.5	(WNW)	
21~22	71.2	68.2	52.8	45.0	43.9	84.7	65.5	26.1	88	1003.1	0.6	292.5	(WNW)	
22~23	70.2	66.5	49.5	41.0	40.2	81.8	63.9	25.7	90	1003.1	0.6	315.0	(NW)	
23~24	69.5	65.2	47.9	40.3	39.6	85.1	64.1	25.7	90	1002.9	0.6	270.0	(W)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
　　2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

核驗報告專用章
電話:(02)7731-3232
新北市中和區中正路738號5樓之

附錄Ⅳ.3-25　福隆街上101年6月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/25～101/6/26　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	77.1	70.7	44.8	35.5	35.1	88.9	70.7	25.8	94	1003.1	0.4	315.0	(NW)	
01~02	81.2	75.7	50.0	37.4	36.6	93.3	73.5	25.5	93	1002.7	0.6	315.0	(NW)	
02~03	81.4	76.6	52.0	37.1	36.3	93.5	73.8	25.3	95	1002.6	0.5	315.0	(NW)	
03~04	83.6	79.9	56.2	39.7	37.9	93.2	75.3	25.1	95	1002.4	0.4	315.0	(NW)	
04~05	84.7	81.1	60.1	45.0	42.4	93.7	76.7	25.1	95	1002.7	0.5	315.0	(NW)	
05~06	85.2	82.6	65.4	48.9	46.4	92.5	77.5	25.0	97	1002.8	0.5	315.0	(NW)	
06~07	82.8	80.5	62.3	45.2	43.3	91.9	75.5	26.8	92	1003.2	0.3	315.0	(NW)	
07~08	81.7	79.0	64.9	50.7	48.3	93.6	74.6	29.9	75	1003.1	0.8	292.5	(WNW)	
08~09	81.9	78.7	61.7	49.3	46.8	89.5	74.0	30.3	73	1003.1	1.4	270.0	(W)	
09~10	82.4	79.9	65.0	51.8	49.5	106.4	76.8	30.1	74	1003.2	1.5	270.0	(W)	
10~11	82.2	80.0	66.9	54.4	51.4	95.2	75.3	30.5	72	1003.1	1.8	270.0	(W)	
11~12	80.9	78.5	64.0	50.3	47.4	92.5	73.6	31.5	69	1002.7	0.8	270.0	(W)	
12~13	81.0	78.7	64.3	50.4	47.1	92.1	73.9	31.1	71	1002.3	1.7	337.5	(NNW)	
13~14	81.3	78.9	65.4	50.6	47.6	104.2	75.5	30.9	71	1002.0	1.4	292.5	(WNW)	
14~15	81.2	78.5	64.9	50.7	48.4	91.7	74.1	31.2	69	1002.0	1.7	270.0	(W)	
15~16	81.0	78.0	65.2	52.5	48.5	93.0	73.9	29.8	75	1002.1	1.0	270.0	(W)	
16~17	80.3	77.5	64.9	50.7	47.8	97.4	73.5	29.4	77	1001.9	0.6	315.0	(NW)	
17~18	80.9	78.1	65.0	52.1	48.9	91.9	74.0	29.7	78	1002.0	0.6	315.0	(NW)	
18~19	79.3	75.3	60.7	46.8	45.2	96.0	72.0	29.3	81	1002.3	0.4	315.0	(NW)	
19~20	78.3	73.5	56.6	43.2	41.5	90.7	71.1	27.4	89	1002.8	0.4	315.0	(NW)	
20~21	79.2	75.1	56.4	44.0	42.0	101.3	72.7	26.6	91	1003.4	0.4	315.0	(NW)	
21~22	79.8	75.0	54.7	41.9	40.3	91.6	72.1	26.2	93	1003.4	0.4	315.0	(NW)	
22~23	77.1	71.5	49.9	39.7	38.8	93.2	70.8	25.9	95	1003.1	0.4	315.0	(NW)	
23~24	78.7	71.8	48.0	36.8	36.1	90.5	71.4	25.9	94	1002.9	0.3	315.0	(NW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-26　福隆街上101年6月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/24～101/6/25　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	71.6	65.6	41.4	36.9	36.3	90.9	68.0	26.9	88	1002.7	0.6	315.0	(NW)	
01~02	70.5	64.3	39.9	35.8	35.5	88.8	66.6	26.6	90	1002.0	0.6	315.0	(NW)	
02~03	73.9	67.1	41.6	37.1	36.7	91.1	69.1	26.4	89	1001.7	0.6	315.0	(NW)	
03~04	79.9	73.6	49.4	38.6	37.6	92.0	72.7	26.0	92	1002.0	0.7	315.0	(NW)	
04~05	81.3	75.4	52.3	40.7	39.3	92.9	73.9	25.9	92	1002.1	0.6	315.0	(NW)	
05~06	81.0	75.5	56.4	45.5	43.9	91.5	73.4	25.7	95	1002.4	0.5	315.0	(NW)	
06~07	79.8	75.4	56.0	44.1	42.3	90.1	72.0	27.4	88	1002.8	0.5	315.0	(NW)	
07~08	80.0	76.9	60.3	46.5	43.9	89.4	72.7	29.7	76	1002.8	0.6	315.0	(NW)	
08~09	79.9	76.4	61.0	48.0	45.2	88.7	72.3	31.2	69	1002.7	1.1	270.0	(W)	
09~10	77.9	74.5	63.3	52.1	49.6	88.8	70.9	30.7	73	1002.8	1.8	270.0	(W)	
10~11	76.4	74.2	64.8	55.4	52.8	104.0	73.0	30.4	77	1003.1	1.9	270.0	(W)	
11~12	75.3	72.6	63.8	57.3	55.2	86.4	69.2	29.8	83	1002.7	2.0	270.0	(W)	
12~13	74.3	71.5	63.8	57.1	55.2	93.9	68.8	31.1	77	1002.4	1.4	270.0	(W)	
13~14	73.0	70.4	62.7	57.4	56.0	85.4	67.4	30.9	76	1002.5	1.2	270.0	(W)	
14~15	72.1	69.5	62.1	57.6	56.4	87.0	66.6	30.1	81	1002.2	1.5	270.0	(W)	
15~16	72.4	69.4	62.0	57.6	56.6	93.4	67.3	29.1	85	1002.4	1.7	270.0	(W)	
16~17	73.1	70.4	62.7	57.7	56.6	83.0	66.9	29.2	82	1002.2	2.0	270.0	(W)	
17~18	75.1	71.7	63.1	58.3	57.4	93.3	70.1	29.2	80	1002.7	0.9	270.0	(W)	
18~19	71.7	68.7	61.6	57.3	56.3	84.3	66.4	29.1	79	1003.2	0.3	315.0	(NW)	
19~20	73.6	71.6	62.4	48.6	45.5	87.1	68.0	27.6	87	1003.0	0.5	315.0	(NW)	
20~21	75.5	72.2	57.0	43.4	41.8	93.8	69.8	26.8	90	1003.3	0.4	315.0	(NW)	
21~22	76.1	72.7	53.9	41.6	40.7	88.9	69.8	26.3	93	1003.1	0.3	315.0	(NW)	
22~23	75.8	71.5	50.7	40.9	39.9	87.2	69.1	26.0	95	1003.1	0.3	315.0	(NW)	
23~24	75.1	69.8	48.3	37.8	36.2	88.7	69.1	26.0	93	1002.9	0.3	315.0	(NW)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

電話:(02)7731-8282
台北市中和區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-27　102縣道新社橋101年6月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/8～101/6/9　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	57.3	56.1	52.2	51.1	50.9	89.6	59.5	26.2	98	1002.2	0.4	157.5	(SSE)	
01~02	54.8	53.6	52.2	51.3	51.1	66.8	52.7	26.0	98	1001.9	0.6	157.5	(SSE)	
02~03	53.6	53.3	52.5	51.9	51.7	73.2	53.1	25.9	98	1002.0	0.7	135.0	(SE)	
03~04	53.0	52.6	51.9	51.4	51.2	77.5	53.1	25.9	98	1001.7	0.7	157.5	(SSE)	
04~05	56.4	55.7	51.9	51.1	51.0	75.9	54.2	25.9	98	1001.4	0.4	112.5	(ESE)	
05~06	58.4	55.4	52.4	51.5	51.4	89.9	59.2	25.8	98	1001.5	0.4	157.5	(SSE)	
06~07	65.0	60.6	52.2	51.0	50.8	89.5	61.1	27.7	95	1001.4	0.3	157.5	(SSE)	
07~08	66.7	63.9	53.0	51.1	50.9	88.9	63.1	30.2	80	1001.2	0.4	135.0	(SE)	
08~09	67.6	63.3	52.1	50.5	50.2	93.2	65.0	30.8	77	1001.3	1.6	225.0	(SW)	
09~10	71.1	66.3	53.5	50.1	49.6	87.4	66.6	30.9	77	1001.3	1.7	22.5	(NNE)	
10~11	66.3	62.7	51.7	49.5	49.2	82.6	60.5	31.0	76	1001.3	1.5	22.5	(NNE)	
11~12	66.7	62.2	52.4	49.3	48.6	81.0	60.5	30.9	77	1001.4	1.5	22.5	(NNE)	
12~13	65.8	61.4	50.4	48.7	48.4	88.5	62.3	30.5	78	1000.5	1.7	22.5	(NNE)	
13~14	65.3	61.2	50.7	48.8	48.5	89.8	61.6	31.0	76	1000.3	1.5	22.5	(NNE)	
14~15	66.9	63.2	52.0	49.2	48.9	84.4	60.8	30.8	76	999.9	1.5	0.0	(N)	
15~16	66.6	63.0	52.1	49.7	49.2	86.3	61.4	30.5	78	1000.0	1.0	22.5	(NNE)	
16~17	69.8	66.5	55.3	50.6	50.2	86.9	63.5	29.9	83	1000.6	0.7	22.5	(NNE)	
17~18	68.8	65.1	54.0	50.7	50.4	83.0	62.1	27.8	88	1000.3	0.5	180.0	(S)	
18~19	65.2	61.3	53.1	50.8	50.1	86.7	60.2	27.3	91	1000.5	0.5	135.0	(SE)	
19~20	62.8	58.3	51.1	50.1	49.9	84.1	58.7	26.3	95	1000.6	0.6	157.5	(SSE)	
20~21	61.4	58.2	51.2	50.3	50.1	80.6	57.0	26.0	96	1001.3	0.5	157.5	(SSE)	
21~22	61.2	58.4	52.2	50.3	50.2	79.0	57.7	25.9	97	1001.3	0.5	135.0	(SE)	
22~23	59.4	57.7	51.4	50.3	50.1	90.0	59.5	25.7	98	1001.4	0.7	157.5	(SSE)	
23~24	55.6	53.6	50.6	49.9	49.8	75.3	53.5	25.6	98	1001.5	0.8	135.0	(SE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-28　102 縣道之新社橋101年6月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/9～101/6/10　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	55.1	53.5	51.4	50.4	50.2	84.8	57.1	25.6	98	1001.3	0.6	135.0	(SE)	
01~02	55.0	53.8	52.4	51.5	51.2	97.5	65.2	25.7	98	1000.6	0.8	135.0	(SE)	
02~03	53.9	53.1	51.9	51.1	50.8	74.5	53.8	25.8	98	1000.4	0.4	157.5	(SSE)	
03~04	52.1	51.8	51.0	50.6	50.5	71.4	51.7	25.6	98	1000.0	0.5	157.5	(SSE)	
04~05	59.4	57.2	51.2	50.6	50.5	77.6	55.2	25.4	98	999.6	0.6	157.5	(SSE)	
05~06	58.4	55.9	52.1	51.1	51.0	84.1	56.9	25.3	98	1000.1	0.9	135.0	(SE)	
06~07	64.7	61.1	51.8	50.8	50.7	83.8	60.2	26.7	96	1000.5	0.6	135.0	(SE)	
07~08	66.3	62.1	52.2	50.8	50.6	87.9	61.8	28.8	84	1000.7	0.3	157.5	(SSE)	
08~09	66.5	62.5	52.5	50.5	50.3	85.7	61.5	30.9	76	1000.7	0.5	315.0	(NW)	
09~10	67.8	64.3	53.9	50.3	49.9	93.6	65.1	31.4	74	1000.8	0.8	337.5	(NNW)	
10~11	67.9	64.8	53.4	49.7	49.2	88.1	63.1	30.9	76	1000.2	1.2	0.0	(N)	
11~12	70.2	67.1	54.0	48.5	48.0	88.7	65.3	31.7	74	999.7	1.7	0.0	(N)	
12~13	71.4	67.3	54.1	48.5	48.1	89.5	66.7	32.0	72	999.4	1.8	0.0	(N)	
13~14	72.1	69.2	58.5	50.5	49.5	82.5	65.4	29.2	86	998.9	1.3	22.5	(NNE)	
14~15	70.8	68.5	56.8	50.9	50.4	85.5	64.8	29.4	84	997.9	0.7	45.0	(NE)	
15~16	69.6	67.5	58.2	51.6	50.6	86.1	64.5	29.8	82	997.8	0.6	180.0	(S)	
16~17	69.1	66.5	56.0	51.0	50.4	83.0	62.9	30.5	81	998.3	0.4	112.5	(ESE)	
17~18	69.8	67.6	56.6	51.6	51.1	85.4	63.7	29.1	91	998.3	0.6	112.5	(ESE)	
18~19	71.5	67.4	56.1	51.1	50.8	87.4	64.4	27.9	95	998.5	0.7	135.0	(SE)	
19~20	68.6	63.2	52.9	50.7	50.4	83.1	62.0	27.4	98	998.9	0.5	135.0	(SE)	
20~21	65.2	59.6	51.1	50.5	50.3	80.8	59.4	27.2	98	999.0	0.4	157.5	(SSE)	
21~22	62.4	57.4	51.2	50.7	50.6	79.7	58.4	27.0	98	999.1	0.4	157.5	(SSE)	
22~23	58.0	53.4	51.2	50.7	50.6	75.4	55.3	26.8	98	998.4	0.6	135.0	(SE)	
23~24	56.0	53.0	50.8	50.3	50.2	74.9	54.1	26.8	98	997.6	0.8	135.0	(SE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

報告專用章
電話:(02)7731-3232
台北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.3-29　過港部落101年6月非假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/8～101/6/9　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	44.8	44.4	42.3	36.6	36.2	49.6	41.9	26.7	98	1002.2	0.2	157.5	(SSE)	
01~02	42.3	41.4	39.1	36.0	35.6	74.7	46.3	26.4	98	1001.9	0.2	180.0	(S)	
02~03	42.4	41.4	39.3	37.8	37.5	59.4	40.4	26.3	98	1002.0	0.2	0.0	(N)	
03~04	48.8	45.0	41.7	40.0	39.6	59.4	44.1	26.3	98	1001.7	0.2	67.5	(ENE)	
04~05	57.3	53.6	45.0	41.3	41.0	72.1	51.1	26.1	98	1001.4	0.2	90.0	(E)	
05~06	51.2	48.0	43.5	41.2	40.6	68.2	47.3	26.2	98	1001.5	0.2	112.5	(ESE)	
06~07	51.8	48.0	42.4	40.5	40.2	69.2	48.5	27.2	98	1001.4	0.4	67.5	(ENE)	
07~08	52.5	49.0	41.4	39.6	39.2	76.6	48.9	28.4	96	1001.2	0.6	45.0	(NE)	
08~09	53.3	49.3	41.3	39.2	38.8	72.5	49.2	28.7	92	1001.3	0.8	45.0	(NE)	
09~10	52.7	49.9	40.2	37.8	37.4	79.1	52.5	29.1	89	1001.3	0.8	45.0	(NE)	
10~11	51.6	47.9	40.1	37.7	37.2	69.0	47.0	29.7	87	1001.3	0.9	45.0	(NE)	
11~12	54.1	51.1	41.0	37.4	36.7	72.8	50.1	30.0	85	1001.4	0.9	45.0	(NE)	
12~13	58.3	55.5	45.5	35.8	35.0	76.1	53.2	31.0	80	1000.5	0.9	22.5	(NNE)	
13~14	54.3	50.6	38.7	35.0	34.4	69.8	49.3	30.6	79	1000.3	0.6	22.5	(NNE)	
14~15	50.7	47.7	39.5	35.7	35.0	71.2	47.6	30.8	78	999.9	0.4	135.0	(SE)	
15~16	55.0	50.9	41.9	37.6	36.7	86.6	55.4	29.8	88	1000.0	0.3	157.5	(SSE)	
16~17	59.4	55.0	48.5	41.5	39.8	85.7	58.2	29.2	88	1000.6	0.3	157.5	(SSE)	
17~18	55.2	49.5	42.5	39.5	39.0	70.7	49.7	27.3	94	1000.3	0.3	247.5	(WSW)	
18~19	48.5	46.0	40.2	36.8	36.2	68.6	44.8	27.0	93	1000.5	0.3	157.5	(SSE)	
19~20	44.4	43.1	39.3	37.0	36.3	75.1	47.8	26.4	98	1000.6	0.3	135.0	(SE)	
20~21	48.2	45.9	42.9	41.3	41.0	73.4	49.7	26.2	98	1001.3	0.2	45.0	(NE)	
21~22	45.6	44.5	40.7	38.7	38.2	70.3	45.8	26.1	98	1001.3	0.3	135.0	(SE)	
22~23	42.4	41.0	38.2	36.7	36.3	78.4	45.9	26.1	98	1001.4	0.2	135.0	(SE)	
23~24	44.8	42.4	39.5	37.5	37.0	72.8	45.9	26.1	98	1001.5	0.2	135.0	(SE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

附錄Ⅳ.3-30　過港部落101年6月假日噪音逐時監測結果

監測日期：101/6/9～101/6/10　　單位：dB(A)

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	溫度(℃)	濕度(%)	氣壓(hPa)	風速(m/s)	風向（度）	風向（方位）	備註
00~01	41.0	40.5	38.5	37.0	36.7	50.4	38.9	26.2	98	1001.3	0.3	180.0	(S)	
01~02	41.7	40.7	38.0	36.3	36.0	71.8	44.0	26.1	98	1000.6	0.3	90.0	(E)	
02~03	43.5	41.6	38.6	36.6	35.8	56.2	40.0	26.0	98	1000.4	0.2	270.0	(W)	
03~04	49.2	45.1	40.2	38.6	38.3	67.8	44.6	25.8	98	1000.0	0.2	270.0	(W)	
04~05	56.9	54.0	44.1	40.6	40.3	77.3	51.0	25.7	98	999.6	0.2	315.0	(NW)	
05~06	55.5	52.0	45.4	41.6	41.0	72.0	50.2	25.9	98	1000.1	0.3	315.0	(NW)	
06~07	52.2	48.7	42.6	39.6	38.8	69.2	47.7	27.3	97	1000.5	0.3	67.5	(ENE)	
07~08	51.4	47.5	41.3	37.4	36.9	71.2	48.3	28.7	89	1000.7	0.3	90.0	(E)	
08~09	52.1	48.0	39.5	35.7	34.8	74.6	49.4	30.7	82	1000.7	0.4	22.5	(NNE)	
09~10	52.3	48.5	41.2	37.9	37.2	72.4	49.7	29.1	87	1000.8	0.7	22.5	(NNE)	
10~11	49.7	46.5	40.3	38.0	37.6	71.3	47.4	29.5	87	1000.2	0.9	22.5	(NNE)	
11~12	51.9	48.0	41.3	38.7	38.2	71.1	48.1	30.1	84	999.7	0.8	22.5	(NNE)	
12~13	52.4	47.3	39.3	36.5	35.8	75.5	49.0	30.1	87	999.4	1.1	22.5	(NNE)	
13~14	54.7	53.6	43.7	38.8	38.0	71.0	50.7	29.5	88	998.9	0.8	22.5	(NNE)	
14~15	49.7	48.6	39.4	36.7	36.0	72.6	46.6	28.9	97	997.9	0.4	67.5	(ENE)	
15~16	52.6	48.3	39.7	35.6	34.8	74.8	48.9	29.4	93	997.8	0.3	112.5	(ESE)	
16~17	54.4	50.6	45.8	37.3	36.0	73.3	51.1	30.1	87	998.3	0.2	90.0	(E)	
17~18	55.5	54.9	41.2	36.8	35.8	74.5	51.4	29.7	93	998.3	0.2	157.5	(SSE)	
18~19	55.6	53.1	47.7	42.5	39.1	69.9	50.8	28.2	98	998.5	0.3	67.5	(ENE)	
19~20	61.6	60.3	46.6	42.4	41.7	72.7	54.9	27.6	98	998.9	0.2	135.0	(SE)	
20~21	44.9	44.1	41.3	39.5	39.2	65.4	43.1	27.3	99	999.0	0.2	135.0	(SE)	
21~22	47.8	46.2	43.7	42.5	42.2	66.7	45.1	27.0	99	999.1	0.2	67.5	(ENE)	
22~23	45.0	44.2	40.3	38.4	37.9	60.5	42.0	27.0	99	998.4	0.2	270.0	(W)	
23~24	43.6	42.4	38.9	36.7	36.2	60.6	41.0	26.9	99	997.6	0.2	67.5	(ENE)	

註：1.監測起始時間為當日0時。
2.氣壓資料為引用中央氣象局基隆站之氣象資料。

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232

附錄Ⅳ.3-31 台2省道與102甲縣道交叉口101年4月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/20～101/4/21　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	36.8	30.0	30.0	30.0	30.0	48.6	32.8	
01~02	38.7	31.8	30.0	30.0	30.0	51.5	33.2	
02~03	41.5	36.1	30.0	30.0	30.0	49.9	34.4	
03~04	42.1	38.3	30.0	30.0	30.0	49.6	35.0	
04~05	43.8	40.6	30.0	30.0	30.0	50.2	36.2	
05~06	43.5	41.2	30.0	30.0	30.0	50.5	36.5	
06~07	41.6	38.0	30.0	30.0	30.0	49.8	34.7	
07~08	38.9	35.7	30.0	30.0	30.0	53.1	33.4	
08~09	39.2	35.7	30.0	30.0	30.0	46.8	33.3	
09~10	41.2	38.1	30.0	30.0	30.0	48.3	34.6	
11~12	41.6	39.1	30.0	30.0	30.0	48.6	35.0	
11~12	40.6	38.0	30.0	30.0	30.0	47.6	34.3	
12~13	40.1	37.3	30.0	30.0	30.0	49.0	34.0	
13~14	39.8	36.7	30.0	30.0	30.0	49.7	33.8	
14~15	40.5	36.6	30.0	30.0	30.0	50.5	33.9	
15~16	39.5	36.3	30.0	30.0	30.0	51.7	33.6	
16~17	37.6	33.6	30.0	30.0	30.0	47.8	32.6	
17~18	36.5	33.0	30.0	30.0	30.0	46.9	32.1	
18~19	33.1	30.0	30.0	30.0	30.0	52.3	31.5	
19~20	34.2	30.0	30.0	30.0	30.0	49.1	31.7	
20~21	36.1	30.6	30.0	30.0	30.0	47.6	32.1	
21~22	35.6	30.0	30.0	30.0	30.0	52.5	32.4	
22~23	33.8	30.0	30.0	30.0	30.0	49.3	32.0	
23~24	32.7	30.0	30.0	30.0	30.0	48.8	31.8	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-32 台2省道與102甲縣道交叉口101年4月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/21～101/4/22　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	36.8	30.0	30.0	30.0	30.0	49.0	32.7	
01~02	38.0	30.6	30.0	30.0	30.0	48.3	33.0	
02~03	40.7	34.6	30.0	30.0	30.0	56.0	34.4	
03~04	42.4	38.3	30.0	30.0	30.0	50.7	35.0	
04~05	43.0	40.1	30.0	30.0	30.0	50.6	35.8	
05~06	43.2	40.3	30.0	30.0	30.0	49.9	35.8	
06~07	42.4	39.4	30.0	30.0	30.0	49.6	35.3	
07~08	40.8	37.2	30.0	30.0	30.0	48.7	34.1	
08~09	40.9	37.8	30.0	30.0	30.0	48.5	34.3	
09~10	41.0	37.6	30.0	30.0	30.0	60.1	34.9	
10~11	41.9	39.3	30.0	30.0	30.0	48.6	35.0	
11~12	40.3	37.0	30.0	30.0	30.0	50.8	33.8	
12~13	40.6	37.9	30.0	30.0	30.0	49.6	34.2	
13~14	39.9	36.8	30.0	30.0	30.0	47.8	33.8	
14~15	39.9	36.1	30.0	30.0	30.0	51.4	33.8	
15~16	37.9	33.2	30.0	30.0	30.0	47.7	32.6	
16~17	36.9	32.2	30.0	30.0	30.0	51.1	32.5	
17~18	33.9	30.0	30.0	30.0	30.0	47.7	31.7	
18~19	33.3	30.0	30.0	30.0	30.0	45.7	31.3	
19~20	32.7	30.0	30.0	30.0	30.0	46.1	31.3	
20~21	32.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.3	31.4	
21~22	31.7	30.0	30.0	30.0	30.0	47.9	31.5	
22~23	31.8	30.0	30.0	30.0	30.0	47.8	31.6	
23~24	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	47.3	31.5	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-33 鹽寮海濱公園101年4月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/20～101/4/21　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	43.5	37.7	30.0	30.0	30.0	54.7	36.8	
01~02	44.1	40.0	30.0	30.0	30.0	54.3	37.2	
02~03	46.4	42.9	30.0	30.0	30.0	55.8	39.1	
03~04	46.9	44.1	30.0	30.0	30.0	58.1	39.8	
04~05	48.0	45.2	30.0	30.0	30.0	55.5	40.8	
05~06	49.2	46.9	30.0	30.0	30.0	57.1	42.0	
06~07	48.0	45.2	30.0	30.0	30.0	56.6	40.6	
07~08	47.5	44.6	30.0	30.0	30.0	56.7	40.0	
08~09	47.5	44.9	30.0	30.0	30.0	54.4	40.1	
09~10	48.4	45.7	30.0	30.0	30.0	59.2	41.2	
10~11	48.9	46.7	30.0	30.0	30.0	58.3	41.7	
11~12	48.3	46.2	30.0	30.0	30.0	55.1	41.0	
12~13	48.3	46.2	30.0	30.0	30.0	57.6	41.0	
13~14	47.6	45.3	30.0	30.0	30.0	56.8	40.3	
14~15	47.3	44.5	30.0	30.0	30.0	53.9	39.8	
15~16	46.8	43.6	30.0	30.0	30.0	55.2	39.3	
16~17	45.7	41.9	30.0	30.0	30.0	54.9	38.2	
17~18	46.0	42.2	30.0	30.0	30.0	55.0	38.5	
18~19	42.3	36.5	30.0	30.0	30.0	53.5	36.1	
19~20	43.9	38.6	30.0	30.0	30.0	56.0	37.4	
20~21	45.8	41.4	30.0	30.0	30.0	55.5	38.4	
21~22	43.4	37.2	30.0	30.0	30.0	55.1	36.8	
22~23	42.3	36.6	30.0	30.0	30.0	54.7	36.0	
23~24	41.2	33.3	30.0	30.0	30.0	54.1	35.4	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-34 鹽寮海濱公園101年4月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/21～101/4/22　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	43.2	37.7	30.0	30.0	30.0	57.4	36.4	
01~02	44.8	39.8	30.0	30.0	30.0	55.1	37.6	
02~03	45.7	41.4	30.0	30.0	30.0	54.2	38.3	
03~04	47.0	44.0	30.0	30.0	30.0	55.7	39.4	
04~05	48.2	45.5	30.0	30.0	30.0	55.9	40.8	
05~06	47.8	45.2	30.0	30.0	30.0	58.6	40.8	
06~07	48.6	46.1	30.0	30.0	30.0	58.6	41.2	
07~08	47.6	44.6	30.0	30.0	30.0	54.9	39.9	
08~09	47.7	45.2	30.0	30.0	30.0	59.1	40.3	
09~10	48.0	45.7	30.0	30.0	30.0	57.1	40.9	
10~11	49.0	46.5	30.0	30.0	30.0	58.8	41.7	
11~12	47.7	45.5	30.0	30.0	30.0	55.4	40.4	
12~13	48.1	46.0	30.0	30.0	30.0	55.0	40.9	
13~14	47.5	44.9	30.0	30.0	30.0	56.8	40.2	
14~15	47.0	44.2	30.0	30.0	30.0	55.2	39.5	
15~16	45.1	41.7	30.0	30.0	30.0	57.3	37.9	
16~17	45.5	41.3	30.0	30.0	30.0	57.1	38.3	
17~18	42.6	36.9	30.0	30.0	30.0	54.3	36.1	
18~19	42.8	37.3	30.0	30.0	30.0	53.9	36.4	
19~20	41.8	35.5	30.0	30.0	30.0	53.5	35.6	
20~21	42.7	36.7	30.0	30.0	30.0	55.8	36.5	
21~22	42.0	35.1	30.0	30.0	30.0	56.8	36.4	
22~23	40.1	32.5	30.0	30.0	30.0	56.4	35.3	
23~24	38.2	30.0	30.0	30.0	30.0	54.1	34.6	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-35 福隆街上101年4月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/20～101/4/21　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	54.8	47.9	30.0	30.0	30.0	65.5	47.5	
01~02	55.9	49.1	30.0	30.0	30.0	65.4	47.6	
02~03	57.5	52.7	30.0	30.0	30.0	67.2	49.6	
03~04	58.8	55.3	33.4	30.0	30.0	69.3	51.1	
04~05	59.5	56.9	37.0	30.0	30.0	66.4	51.7	
05~06	60.5	57.8	40.1	30.0	30.0	68.6	53.0	
06~07	57.6	54.2	35.0	30.0	30.0	66.3	50.2	
07~08	56.4	53.1	35.9	30.0	30.0	66.0	49.1	
08~09	58.3	55.3	36.6	30.0	30.0	65.6	50.6	
09~10	58.2	55.4	38.9	30.0	30.0	68.7	51.1	
11~12	58.1	55.3	40.4	30.0	30.0	67.3	50.9	
11~12	57.8	55.0	41.1	30.0	30.0	69.9	50.8	
12~13	57.9	55.3	40.0	30.0	30.0	67.7	50.8	
13~14	56.7	53.7	37.0	30.0	30.0	66.7	49.4	
14~15	55.1	52.1	36.5	30.0	30.0	66.2	48.4	
15~16	54.6	51.4	34.8	30.0	30.0	67.1	47.5	
16~17	54.3	50.5	32.2	30.0	30.0	66.3	47.2	
17~18	55.3	52.0	32.3	30.0	30.0	65.2	47.9	
18~19	51.4	46.4	30.0	30.0	30.0	63.0	44.8	
19~20	53.6	47.3	30.0	30.0	30.0	66.3	47.0	
20~21	56.2	51.1	30.0	30.0	30.0	66.9	48.2	
21~22	53.7	46.4	30.0	30.0	30.0	66.3	46.9	
22~23	53.5	46.6	30.0	30.0	30.0	68.3	46.7	
23~24	50.9	44.3	30.0	30.0	30.0	69.1	45.9	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-36 福隆街上101年4月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/21～101/4/22　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	53.0	46.7	30.0	30.0	30.0	67.1	46.8	
01~02	55.4	49.1	30.0	30.0	30.0	65.1	47.7	
02~03	57.1	52.3	30.0	30.0	30.0	69.8	49.8	
03~04	58.5	55.1	32.3	30.0	30.0	67.2	50.9	
04~05	60.4	57.9	37.8	30.0	30.0	70.1	52.6	
05~06	60.0	57.3	37.3	30.0	30.0	68.8	52.3	
06~07	58.4	55.6	37.5	30.0	30.0	68.0	51.0	
07~08	56.5	53.1	34.8	30.0	30.0	65.3	49.0	
08~09	56.6	53.3	34.3	30.0	30.0	69.1	49.8	
09~10	56.9	54.0	38.3	30.0	30.0	67.1	50.2	
10~11	58.1	55.2	40.5	30.0	30.0	67.6	50.9	
11~12	56.2	53.2	37.8	30.0	30.0	67.5	49.0	
12~13	56.6	53.8	39.9	30.0	30.0	65.0	49.7	
13~14	56.4	53.6	37.5	30.0	30.0	64.8	49.1	
14~15	55.4	52.2	36.8	30.0	30.0	66.3	48.3	
15~16	53.6	50.3	35.7	30.0	30.0	65.2	46.7	
16~17	53.8	49.9	36.2	30.0	30.0	67.8	47.2	
17~18	51.3	46.6	31.9	30.0	30.0	66.8	45.3	
18~19	51.8	46.8	30.0	30.0	30.0	67.0	45.4	
19~20	51.2	45.9	30.0	30.0	30.0	66.2	45.0	
20~21	53.6	45.4	30.0	30.0	30.0	67.1	46.5	
21~22	51.3	44.3	30.0	30.0	30.0	64.9	44.9	
22~23	49.8	43.2	30.0	30.0	30.0	67.3	44.9	
23~24	47.3	39.5	30.0	30.0	30.0	67.8	44.1	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-37 102縣道之新社橋101年4月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/3～101/4/4　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.2	30.1	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.7	30.1	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	45.4	30.1	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.8	30.1	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	47.3	30.2	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	58.6	31.5	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	58.7	32.4	
07~08	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	55.9	33.0	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	54.7	31.5	
09~10	33.4	30.0	30.0	30.0	30.0	56.9	34.8	
10~11	30.9	30.0	30.0	30.0	30.0	55.0	32.6	
11~12	30.2	30.0	30.0	30.0	30.0	57.0	33.4	
12~13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	55.9	32.9	
13~14	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	55.1	31.5	
14~15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.5	31.2	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	59.8	32.8	
16~17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	57.1	31.8	
17~18	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	55.2	32.0	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	56.5	31.1	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.5	30.2	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.8	30.5	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.9	30.1	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.0	30.3	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.7	30.0	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-38 102 縣道之新社橋101年4月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/4～101/4/5　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	56.0	30.8	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.9	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.6	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	32.9	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	55.7	30.8	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	58.9	31.6	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	51.3	30.7	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.4	30.6	
08~09	32.6	30.0	30.0	30.0	30.0	50.3	31.2	
09~10	33.9	30.0	30.0	30.0	30.0	57.1	31.8	
11~12	35.7	30.3	30.0	30.0	30.0	48.5	32.0	
11~12	33.5	30.0	30.0	30.0	30.0	48.3	31.2	
12~13	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0	44.7	30.7	
13~14	34.7	30.3	30.0	30.0	30.0	50.2	31.5	
14~15	34.2	30.3	30.0	30.0	30.0	51.0	31.3	
15~16	34.0	30.1	30.0	30.0	30.0	50.9	31.4	
16~17	34.5	30.3	30.0	30.0	30.0	54.3	31.5	
17~18	34.8	30.0	30.0	30.0	30.0	54.4	31.7	
18~19	31.3	30.0	30.0	30.0	30.0	46.3	30.8	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.8	30.3	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	52.3	30.6	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	56.9	31.0	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.2	30.2	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.5	30.0	

註：監測起始時間為當日0時。

電話:(02)7731-3232 臺中市中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-39 過港部落101年4月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/3～101/4/4　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	31.9	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	35.0	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.9	30.0	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.9	30.1	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.9	30.1	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.9	30.0	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.0	30.0	
10~11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.7	30.1	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.2	30.0	
12~13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.2	30.1	
13~14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.5	30.1	
14~15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.2	30.1	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.8	30.1	
16~17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.9	30.0	
17~18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	49.4	30.5	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	54.1	30.8	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.7	30.0	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.6	30.1	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-40 過港部落101年4月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/4/4～101/4/5　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.0	30.0	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.0	30.2	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.1	30.1	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	35.8	30.0	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.1	30.1	
10~11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.1	30.1	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.8	30.1	
12~13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	46.8	30.2	
13~14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.0	30.4	
14~15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.9	30.3	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.9	30.2	
16~17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.6	30.1	
17~18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.0	30.2	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.3	30.0	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.7	30.0	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.9	30.0	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.4	30.1	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	

註：監測起始時間為當日0時。

新北市中和區中正路738號5樓之4 電話:(02)7731-3232 專用章

附錄Ⅳ.3-41 台2省道與102甲縣道交叉口101年5月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/7～101/5/8　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	36.1	30.0	30.0	30.0	30.0	47.8	32.3	
01~02	34.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.4	32.2	
02~03	39.2	32.4	30.0	30.0	30.0	49.4	33.2	
03~04	40.9	35.4	30.0	30.0	30.0	49.5	34.1	
04~05	42.6	39.4	30.0	30.0	30.0	50.8	35.5	
05~06	42.9	40.0	30.0	30.0	30.0	50.4	35.5	
06~07	40.5	36.8	30.0	30.0	30.0	50.0	33.8	
07~08	37.4	34.0	30.0	30.0	30.0	46.9	32.5	
08~09	39.3	35.5	30.0	30.0	30.0	49.5	33.3	
09~10	39.4	36.2	30.0	30.0	30.0	48.2	33.4	
11~12	38.7	34.8	30.0	30.0	30.0	47.0	32.9	
11~12	38.0	34.9	30.0	30.0	30.0	47.7	32.6	
12~13	37.7	34.9	30.0	30.0	30.0	49.2	32.6	
13~14	35.8	32.4	30.0	30.0	30.0	46.0	31.9	
14~15	38.6	36.1	30.0	30.0	30.0	46.6	32.8	
15~16	38.2	35.6	30.0	30.0	30.0	53.3	33.0	
16~17	37.9	34.4	30.0	30.0	30.0	51.5	32.7	
17~18	35.6	32.2	30.0	30.0	30.0	48.6	31.9	
18~19	34.5	31.0	30.0	30.0	30.0	47.5	31.2	
19~20	33.8	30.2	30.0	30.0	30.0	47.6	31.3	
20~21	35.7	31.3	30.0	30.0	30.0	46.7	31.9	
21~22	36.7	31.3	30.0	30.0	30.0	48.2	32.1	
22~23	35.0	30.0	30.0	30.0	30.0	47.3	31.8	
23~24	34.4	30.0	30.0	30.0	30.0	50.5	32.0	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-42 台2省道與102甲縣道交叉口101年5月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/6～101/5/7　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	47.0	31.2	
01~02	35.1	30.0	30.0	30.0	30.0	50.1	32.5	
02~03	34.6	30.0	30.0	30.0	30.0	47.9	32.1	
03~04	38.6	30.8	30.0	30.0	30.0	48.8	33.3	
04~05	41.3	36.1	30.0	30.0	30.0	50.2	34.5	
05~06	40.2	34.7	30.0	30.0	30.0	47.3	33.7	
06~07	40.7	35.9	30.0	30.0	30.0	48.3	33.9	
07~08	39.2	34.9	30.0	30.0	30.0	50.0	33.3	
08~09	40.0	36.3	30.0	30.0	30.0	52.8	33.7	
09~10	39.0	34.5	30.0	30.0	30.0	47.0	32.9	
10~11	39.3	35.3	30.0	30.0	30.0	50.5	33.4	
11~12	36.3	32.1	30.0	30.0	30.0	47.5	32.1	
12~13	35.7	32.5	30.0	30.0	30.0	49.0	31.7	
13~14	33.4	30.0	30.0	30.0	30.0	44.3	31.0	
14~15	34.8	31.0	30.0	30.0	30.0	46.4	31.6	
15~16	32.9	30.4	30.0	30.0	30.0	44.9	31.2	
16~17	31.4	30.0	30.0	30.0	30.0	45.2	30.9	
17~18	30.3	30.0	30.0	30.0	30.0	49.1	30.8	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.6	30.3	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	49.3	30.7	
20~21	30.9	30.0	30.0	30.0	30.0	46.8	30.9	
21~22	31.6	30.0	30.0	30.0	30.0	47.5	31.3	
22~23	30.2	30.0	30.0	30.0	30.0	49.5	31.2	
23~24	33.0	30.0	30.0	30.0	30.0	49.5	31.8	

註：監測起始時間為當日0時。

專用章 電話:(02)7731-3232 中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-43 鹽寮海濱公園101年5月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/7～101/5/8　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	43.3	38.1	30.0	30.0	30.0	58.3	37.1	
01~02	41.8	34.9	30.0	30.0	30.0	57.8	36.2	
02~03	44.9	40.6	30.0	30.0	30.0	56.1	37.7	
03~04	45.6	41.6	30.0	30.0	30.0	55.1	38.2	
04~05	47.5	44.9	30.0	30.0	30.0	56.8	40.2	
05~06	48.1	45.7	30.0	30.0	30.0	57.6	40.7	
06~07	47.5	44.8	30.0	30.0	30.0	57.5	40.1	
07~08	46.3	42.8	30.0	30.0	30.0	56.5	39.0	
08~09	46.9	44.0	30.0	30.0	30.0	55.4	39.4	
09~10	46.9	44.1	30.0	30.0	30.0	56.7	39.6	
10~11	46.9	43.8	30.0	30.0	30.0	56.1	39.4	
11~12	47.0	44.4	30.0	30.0	30.0	54.0	39.4	
12~13	47.5	44.6	30.0	30.0	30.0	55.3	39.9	
13~14	45.9	42.3	30.0	30.0	30.0	56.0	38.5	
14~15	47.1	44.3	30.0	30.0	30.0	55.2	39.5	
15~16	47.3	44.8	30.0	30.0	30.0	54.4	40.0	
16~17	46.2	43.2	30.0	30.0	30.0	55.4	38.9	
17~18	45.5	42.2	30.0	30.0	30.0	54.0	38.1	
18~19	44.6	40.7	30.0	30.0	30.0	54.6	37.5	
19~20	43.6	39.8	30.0	30.0	30.0	54.1	36.8	
20~21	45.0	41.2	30.0	30.0	30.0	54.4	37.7	
21~22	45.3	41.0	30.0	30.0	30.0	56.8	38.0	
22~23	42.1	36.9	30.0	30.0	30.0	59.3	36.1	
23~24	40.2	34.9	30.0	30.0	30.0	51.1	34.4	

註：監測起始時間為當日0時。

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-44 鹽寮海濱公園101年5月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/6～101/5/7　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	37.1	30.0	30.0	30.0	30.0	52.7	33.6	
01~02	41.4	35.3	30.0	30.0	30.0	53.5	35.4	
02~03	41.4	34.4	30.0	30.0	30.0	55.7	35.6	
03~04	44.2	39.3	30.0	30.0	30.0	57.0	37.2	
04~05	45.9	41.9	30.0	30.0	30.0	54.4	38.2	
05~06	45.2	41.0	30.0	30.0	30.0	56.1	38.0	
06~07	46.2	43.0	30.0	30.0	30.0	54.1	38.7	
07~08	45.8	41.9	30.0	30.0	30.0	53.8	38.1	
08~09	46.4	43.6	30.0	30.0	30.0	55.4	39.0	
09~10	45.9	42.2	30.0	30.0	30.0	56.1	38.3	
10~11	46.5	43.5	30.0	30.0	30.0	56.6	38.8	
11~12	45.7	42.2	30.0	30.0	30.0	58.3	38.4	
12~13	45.7	42.2	30.0	30.0	30.0	55.2	38.4	
13~14	42.8	38.3	30.0	30.0	30.0	52.0	36.0	
14~15	43.3	39.2	30.0	30.0	30.0	53.8	36.5	
15~16	42.0	36.2	30.0	30.0	30.0	55.5	35.8	
16~17	38.9	33.6	30.0	30.0	30.0	54.7	34.1	
17~18	39.3	34.2	30.0	30.0	30.0	52.9	34.9	
18~19	35.2	31.7	30.0	30.0	30.0	50.1	32.6	
19~20	40.2	33.7	30.0	30.0	30.0	54.3	34.8	
20~21	41.1	34.4	30.0	30.0	30.0	56.7	35.9	
21~22	41.3	34.5	30.0	30.0	30.0	54.7	35.8	
22~23	37.1	30.0	30.0	30.0	30.0	52.8	33.7	
23~24	41.1	33.8	30.0	30.0	30.0	55.4	35.2	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-45 福隆街上101年5月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/7～101/5/8　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	53.3	46.0	30.0	30.0	30.0	67.7	47.5	
01~02	51.0	43.3	30.0	30.0	30.0	68.6	46.4	
02~03	56.9	50.9	30.0	30.0	30.0	66.6	49.3	
03~04	57.1	52.1	30.0	30.0	30.0	69.5	49.6	
04~05	59.2	56.4	36.0	30.0	30.0	70.8	51.7	
05~06	59.6	56.8	36.9	30.0	30.0	72.1	52.2	
06~07	57.2	53.6	32.6	30.0	30.0	70.2	50.0	
07~08	56.9	53.3	33.4	30.0	30.0	68.4	49.4	
08~09	56.8	53.5	35.6	30.0	30.0	67.6	49.2	
09~10	55.5	51.9	33.4	30.0	30.0	67.8	48.4	
11~12	56.0	52.3	33.9	30.0	30.0	68.1	49.1	
11~12	55.3	51.8	36.2	30.0	30.0	64.6	48.2	
12~13	55.1	52.0	35.8	30.0	30.0	63.8	47.8	
13~14	55.1	51.6	33.7	30.0	30.0	66.8	48.0	
14~15	54.3	51.5	37.3	30.0	30.0	65.8	47.9	
15~16	53.6	51.5	39.6	30.0	30.0	65.4	47.6	
16~17	53.3	50.7	39.1	30.0	30.0	64.9	46.7	
17~18	54.1	50.5	39.3	30.0	30.0	64.8	47.3	
18~19	53.5	49.2	37.5	30.0	30.0	64.6	46.6	
19~20	53.7	49.2	34.3	30.0	30.0	64.4	46.5	
20~21	56.6	51.8	30.5	30.0	30.0	67.1	48.7	
21~22	54.9	49.2	30.0	30.0	30.0	67.0	47.7	
22~23	53.4	47.3	30.0	30.0	30.0	67.0	46.9	
23~24	50.9	44.5	30.0	30.0	30.0	65.0	45.4	

註：監測起始時間為當日0時。

新北市政府環境保護局 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 地址:中和區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-46 福隆街上101年5月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/6～101/5/7　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	48.0	41.3	30.0	30.0	30.0	66.2	43.9	
01~02	50.6	44.0	30.0	30.0	30.0	66.2	45.4	
02~03	51.1	44.7	30.0	30.0	30.0	67.7	46.2	
03~04	54.9	48.1	30.0	30.0	30.0	68.9	48.4	
04~05	57.4	52.2	30.0	30.0	30.0	68.4	50.0	
05~06	56.7	51.7	30.0	30.0	30.0	68.3	49.1	
06~07	56.2	51.8	30.0	30.0	30.0	67.6	48.5	
07~08	55.2	51.1	30.7	30.0	30.0	68.8	48.3	
08~09	55.0	51.1	33.4	30.0	30.0	66.0	47.3	
09~10	52.3	48.5	33.4	30.0	30.0	64.4	45.3	
10~11	52.2	49.5	36.7	30.0	30.0	64.0	45.5	
11~12	51.0	47.3	35.1	30.0	30.0	63.1	44.1	
12~13	50.7	46.6	35.5	30.0	30.0	61.9	43.4	
13~14	48.7	45.3	34.9	30.0	30.0	56.4	41.6	
14~15	46.5	43.0	34.8	30.0	30.0	59.6	40.7	
15~16	44.5	41.2	31.8	30.0	30.0	56.6	38.2	
16~17	41.0	37.6	30.0	30.0	30.0	51.9	35.2	
17~18	42.7	38.9	30.7	30.0	30.0	56.1	36.8	
18~19	38.5	35.3	30.0	30.0	30.0	52.8	34.2	
19~20	42.3	38.5	30.0	30.0	30.0	61.2	39.0	
20~21	52.2	45.9	30.0	30.0	30.0	64.8	45.8	
21~22	49.7	44.1	30.0	30.0	30.0	67.0	45.0	
22~23	47.9	42.7	30.0	30.0	30.0	66.5	44.3	
23~24	50.2	43.4	30.0	30.0	30.0	63.6	44.7	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-47 102縣道之新社橋101年5月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/11～101/5/12　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.9	30.1	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.6	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.8	30.3	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	58.2	32.5	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	52.2	30.4	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.3	30.6	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	51.9	31.6	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	52.5	31.0	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	49.0	30.4	
10~11	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	52.5	31.4	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	54.7	31.2	
12~13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	54.9	31.2	
13~14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	58.8	32.0	
14~15	30.1	30.0	30.0	30.0	30.0	54.1	31.3	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	51.0	31.4	
16~17	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0	53.2	31.7	
17~18	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0	54.5	32.2	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	55.7	31.5	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.3	30.2	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	52.7	30.6	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	49.5	30.3	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.4	30.2	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	55.6	31.3	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-48 102縣道之新社橋101年5月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/12～101/5/13　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	56.1	31.4	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	46.0	30.1	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.2	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.6	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	58.3	31.6	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.8	30.5	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.9	30.2	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	59.3	32.9	
08~09	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0	59.3	33.5	
09~10	34.3	30.0	30.0	30.0	30.0	58.5	34.1	
11~12	34.4	30.0	30.0	30.0	30.0	53.6	32.9	
11~12	34.2	30.0	30.0	30.0	30.0	53.8	32.0	
12~13	35.6	31.4	30.0	30.0	30.0	58.5	32.6	
13~14	34.9	31.0	30.0	30.0	30.0	55.3	32.2	
14~15	35.0	30.8	30.0	30.0	30.0	57.1	32.7	
15~16	35.3	31.8	30.0	30.0	30.0	57.9	32.2	
16~17	36.3	31.9	30.0	30.0	30.0	52.9	32.5	
17~18	33.3	30.0	30.0	30.0	30.0	45.0	30.9	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	56.0	31.2	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.2	30.3	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	54.0	30.8	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	52.8	30.4	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.4	30.1	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.4	30.0	

註：監測起始時間為當日0時。

新竹工程技術顧問股份有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 台北市中正區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.3-49 過港部落101年5月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/11～101/5/12　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.3	30.2	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.0	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.1	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	53.3	31.6	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	32.0	30.0	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.0	30.0	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.3	30.0	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.6	30.0	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.7	30.1	
10~11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.9	30.0	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	46.3	30.4	
12~13	31.6	30.5	30.0	30.0	30.0	42.8	30.4	
13~14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.4	30.1	
14~15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.6	30.1	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.5	30.0	
16~17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.5	30.1	
17~18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.7	30.0	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.8	30.1	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.0	30.2	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	33.8	30.0	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-50 過港部落101年5月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/5/12～101/5/13　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.9	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.4	30.0	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.2	30.0	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.7	30.1	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	30.0	
10~11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.6	30.1	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.1	30.2	
12~13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.4	30.0	
13~14	38.8	36.6	30.0	30.0	30.0	42.9	32.8	
14~15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	52.1	30.4	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	45.1	30.3	
16~17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.9	30.1	
17~18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.9	30.1	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.3	30.2	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	46.5	30.2	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.8	30.0	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.1	30.1	

註：監測起始時間為當日0時。

專用章 電話:(02)7731-3222 中華區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-51 台2省道與102甲縣道交叉口101年6月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/25～101/6/26　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	32.6	30.0	30.0	30.0	30.0	46.9	31.4	
01~02	37.5	30.8	30.0	30.0	30.0	49.9	32.5	
02~03	37.8	31.8	30.0	30.0	30.0	46.9	32.5	
03~04	39.8	35.1	30.0	30.0	30.0	48.7	33.3	
04~05	40.5	37.4	30.0	30.0	30.0	49.1	34.1	
05~06	41.4	38.7	30.0	30.0	30.0	47.8	34.6	
06~07	39.0	35.5	30.0	30.0	30.0	51.6	33.2	
07~08	37.4	34.0	30.0	30.0	30.0	47.4	32.4	
08~09	37.1	33.8	30.0	30.0	30.0	48.7	32.2	
09~10	37.9	34.7	30.0	30.0	30.0	47.0	32.5	
11~12	39.0	36.9	30.0	30.0	30.0	48.0	33.4	
11~12	37.5	34.3	30.0	30.0	30.0	44.6	32.1	
12~13	37.1	34.1	30.0	30.0	30.0	48.8	32.3	
13~14	37.6	34.0	30.0	30.0	30.0	47.5	32.3	
14~15	36.9	33.8	30.0	30.0	30.0	45.7	32.0	
15~16	36.1	32.5	30.0	30.0	30.0	47.6	31.8	
16~17	36.1	32.1	30.0	30.0	30.0	47.2	31.8	
17~18	36.2	32.1	30.0	30.0	30.0	47.5	31.9	
18~19	33.9	30.0	30.0	30.0	30.0	46.5	31.2	
19~20	32.8	30.0	30.0	30.0	30.0	48.0	31.2	
20~21	33.2	30.0	30.0	30.0	30.0	49.7	31.2	
21~22	34.6	30.0	30.0	30.0	30.0	47.9	31.6	
22~23	33.4	30.0	30.0	30.0	30.0	47.2	31.4	
23~24	34.0	30.0	30.0	30.0	30.0	47.9	31.7	

註：監測起始時間為當日0時。

新北市中和區中正路788號5樓之4
電話:(02)7731-3229
專用章

附錄Ⅳ.3-52 台2省道與102甲縣道交叉口101年6月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/24～101/6/25　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	47.8	30.8	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	46.7	30.8	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	52.8	31.2	
03~04	36.5	30.0	30.0	30.0	30.0	50.5	32.4	
04~05	38.2	30.8	30.0	30.0	30.0	49.0	32.9	
05~06	37.6	31.2	30.0	30.0	30.0	47.6	32.5	
06~07	36.7	30.2	30.0	30.0	30.0	49.7	32.2	
07~08	37.0	31.4	30.0	30.0	30.0	48.8	32.2	
08~09	37.1	32.5	30.0	30.0	30.0	47.0	32.1	
09~10	34.2	30.5	30.0	30.0	30.0	45.8	31.2	
10~11	36.3	32.4	30.0	30.0	30.0	48.2	31.8	
11~12	34.8	30.2	30.0	30.0	30.0	45.1	31.5	
12~13	32.7	30.0	30.0	30.0	30.0	43.2	30.8	
13~14	30.4	30.0	30.0	30.0	30.0	46.8	30.5	
14~15	31.1	30.0	30.0	30.0	30.0	43.6	30.6	
15~16	31.2	30.0	30.0	30.0	30.0	44.4	30.6	
16~17	31.7	30.0	30.0	30.0	30.0	48.4	31.0	
17~18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	45.5	30.6	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.3	30.3	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.1	30.3	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	45.4	30.6	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.6	30.8	
22~23	30.7	30.0	30.0	30.0	30.0	44.1	31.0	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.1	31.4	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-53 鹽寮海濱公園101年6月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/25～101/6/26　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	42.1	35.4	30.0	30.0	30.0	57.9	36.9	
01~02	45.0	40.8	30.0	30.0	30.0	55.8	37.9	
02~03	45.6	40.9	30.0	30.0	30.0	59.1	38.3	
03~04	45.8	42.2	30.0	30.0	30.0	56.1	38.4	
04~05	47.3	44.4	30.0	30.0	30.0	55.9	39.8	
05~06	47.6	45.3	30.0	30.0	30.0	56.1	40.5	
06~07	46.8	44.0	30.0	30.0	30.0	59.4	39.7	
07~08	46.0	43.2	30.0	30.0	30.0	54.2	38.7	
08~09	45.7	42.4	30.0	30.0	30.0	53.6	38.4	
09~10	47.6	44.9	30.0	30.0	30.0	55.5	40.1	
10~11	48.5	46.2	30.0	30.0	30.0	56.6	41.4	
11~12	47.4	45.0	30.0	30.0	30.0	59.6	40.2	
12~13	47.4	45.0	30.0	30.0	30.0	56.0	40.1	
13~14	47.3	44.7	30.0	30.0	30.0	57.0	40.0	
14~15	46.7	43.5	30.0	30.0	30.0	54.3	39.4	
15~16	45.7	42.5	30.0	30.0	30.0	55.7	38.3	
16~17	46.2	42.8	30.0	30.0	30.0	58.6	39.3	
17~18	45.9	42.3	30.0	30.0	30.0	58.6	38.7	
18~19	43.2	38.9	30.0	30.0	30.0	57.5	36.7	
19~20	42.5	37.3	30.0	30.0	30.0	56.1	36.3	
20~21	44.0	39.8	30.0	30.0	30.0	56.2	37.2	
21~22	44.7	40.2	30.0	30.0	30.0	58.0	37.5	
22~23	41.7	36.7	30.0	30.0	30.0	57.5	36.0	
23~24	42.5	37.2	30.0	30.0	30.0	53.9	35.8	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-54 鹽寮海濱公園101年6月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/24～101/6/25　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	31.7	30.0	30.0	30.0	30.0	51.6	32.7	
01~02	32.2	30.0	30.0	30.0	30.0	51.6	32.6	
02~03	37.0	30.0	30.0	30.0	30.0	53.7	33.7	
03~04	43.3	38.1	30.0	30.0	30.0	59.0	37.2	
04~05	44.4	40.4	30.0	30.0	30.0	53.8	37.6	
05~06	44.1	39.0	30.0	30.0	30.0	55.3	37.2	
06~07	43.9	38.8	30.0	30.0	30.0	53.7	36.6	
07~08	44.6	40.2	30.0	30.0	30.0	55.5	37.3	
08~09	45.0	41.1	30.0	30.0	30.0	54.1	37.7	
09~10	44.4	39.8	30.0	30.0	30.0	56.6	37.7	
10~11	45.1	42.0	30.0	30.0	30.0	56.4	38.0	
11~12	44.4	40.6	30.0	30.0	30.0	53.3	37.4	
12~13	43.7	39.1	30.0	30.0	30.0	52.9	36.5	
13~14	41.7	35.6	30.0	30.0	30.0	55.8	35.7	
14~15	41.9	36.2	30.0	30.0	30.0	52.5	35.6	
15~16	42.7	37.1	30.0	30.0	30.0	58.2	36.3	
16~17	41.7	36.4	30.0	30.0	30.0	53.9	35.6	
17~18	40.9	35.3	30.0	30.0	30.0	54.1	35.0	
18~19	37.8	32.6	30.0	30.0	30.0	53.4	33.9	
19~20	38.4	32.4	30.0	30.0	30.0	52.2	34.2	
20~21	38.9	31.0	30.0	30.0	30.0	55.2	34.9	
21~22	41.7	34.1	30.0	30.0	30.0	56.0	36.2	
22~23	40.7	32.0	30.0	30.0	30.0	53.4	35.1	
23~24	39.6	30.9	30.0	30.0	30.0	54.3	34.6	

註：監測起始時間為當日0時。

新竹工程測量技師事務所 專用章 電話:(02)7731-8232 臺北市中山區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-55 福隆街上101年6月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/25～101/6/26　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	53.8	46.2	30.0	30.0	30.0	65.9	47.3	
01~02	56.9	50.6	30.0	30.0	30.0	69.5	49.5	
02~03	56.3	50.8	30.0	30.0	30.0	65.4	48.5	
03~04	58.3	54.6	30.0	30.0	30.0	68.7	50.7	
04~05	59.3	56.3	31.9	30.0	30.0	68.9	51.5	
05~06	59.8	57.1	38.1	30.0	30.0	67.8	52.3	
06~07	56.6	53.1	30.5	30.0	30.0	68.3	49.8	
07~08	56.2	52.5	33.1	30.0	30.0	66.5	49.0	
08~09	56.8	52.7	30.6	30.0	30.0	69.6	49.2	
09~10	58.5	55.1	37.3	30.0	30.0	69.0	51.0	
11~12	58.0	55.3	41.8	30.0	30.0	67.3	51.1	
11~12	56.7	54.0	38.0	30.0	30.0	66.8	49.6	
12~13	57.3	54.2	38.4	30.0	30.0	66.8	50.0	
13~14	57.2	53.9	37.9	30.0	30.0	68.4	50.1	
14~15	56.7	53.1	36.6	30.0	30.0	68.8	49.6	
15~16	56.5	52.7	35.7	30.0	30.0	66.3	48.9	
16~17	54.9	51.3	35.3	30.0	30.0	68.4	48.1	
17~18	54.2	51.0	34.1	30.0	30.0	68.8	47.7	
18~19	52.9	49.1	30.0	30.0	30.0	61.6	45.6	
19~20	53.0	47.3	30.0	30.0	30.0	69.1	46.8	
20~21	55.2	50.0	30.0	30.0	30.0	69.7	48.0	
21~22	55.4	50.2	30.0	30.0	30.0	70.5	48.4	
22~23	54.1	46.9	30.0	30.0	30.0	66.9	47.3	
23~24	53.5	46.9	30.0	30.0	30.0	66.0	46.8	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-56 福隆街上101年6月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/24～101/6/25　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	44.3	37.0	30.0	30.0	30.0	64.9	42.7	
01~02	40.9	32.4	30.0	30.0	30.0	64.2	41.1	
02~03	49.5	41.8	30.0	30.0	30.0	68.9	45.8	
03~04	55.3	48.4	30.0	30.0	30.0	69.1	48.5	
04~05	56.6	49.8	30.0	30.0	30.0	67.9	49.1	
05~06	55.4	49.5	30.0	30.0	30.0	67.4	48.3	
06~07	53.1	48.1	30.0	30.0	30.0	68.0	46.7	
07~08	53.7	49.7	30.0	30.0	30.0	66.3	47.3	
08~09	53.9	49.5	30.0	30.0	30.0	70.3	47.7	
09~10	51.8	47.2	30.8	30.0	30.0	67.7	45.4	
10~11	52.5	49.3	35.5	30.0	30.0	69.3	46.0	
11~12	52.4	48.6	35.3	30.0	30.0	64.0	45.1	
12~13	49.3	45.5	34.8	30.0	30.0	61.6	42.4	
13~14	46.2	42.4	32.3	30.0	30.0	58.9	40.5	
14~15	43.8	40.2	30.8	30.0	30.0	57.7	38.1	
15~16	43.6	40.4	31.3	30.0	30.0	56.0	37.4	
16~17	45.9	42.4	32.0	30.0	30.0	56.7	39.0	
17~18	44.6	40.9	30.8	30.0	30.0	59.7	38.4	
18~19	42.2	38.4	30.6	30.0	30.0	53.5	36.5	
19~20	45.9	42.5	31.0	30.0	30.0	61.7	41.2	
20~21	50.5	43.9	30.0	30.0	30.0	69.5	46.0	
21~22	51.7	45.2	30.0	30.0	30.0	67.8	46.2	
22~23	51.2	45.0	30.0	30.0	30.0	68.5	45.9	
23~24	50.1	42.8	30.0	30.0	30.0	67.3	45.3	

註：監測起始時間為當日0時。

專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路738號6樓之1

附錄Ⅳ.3-57 102縣道之新社橋101年6月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/8～101/6/9　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	45.0	30.2	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.3	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.8	30.2	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.9	30.0	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	60.4	33.1	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	48.1	30.8	
07~08	31.7	30.0	30.0	30.0	30.0	55.3	33.8	
08~09	35.7	30.0	30.0	30.0	30.0	59.1	36.1	
09~10	37.5	30.0	30.0	30.0	30.0	55.6	35.8	
10~11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	51.0	30.7	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	46.8	30.8	
12~13	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	58.4	33.0	
13~14	30.6	30.0	30.0	30.0	30.0	52.2	31.2	
14~15	30.8	30.0	30.0	30.0	30.0	54.0	31.0	
15~16	31.0	30.0	30.0	30.0	30.0	49.7	31.0	
16~17	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0	51.8	31.4	
17~18	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0	53.5	31.9	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	56.8	31.8	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.5	30.3	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	47.8	30.2	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	51.1	30.5	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.5	30.1	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	37.8	30.1	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-58 102 縣道之新社橋101年6月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/9～101/6/10　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	45.6	30.2	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.0	30.2	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.5	30.1	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.6	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.9	30.2	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	55.8	31.4	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	55.8	31.3	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	59.5	33.4	
08~09	30.5	30.0	30.0	30.0	30.0	57.0	32.6	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	51.2	30.9	
11~12	33.1	30.0	30.0	30.0	30.0	58.5	32.5	
11~12	34.3	30.0	30.0	30.0	30.0	53.9	31.6	
12~13	34.2	30.2	30.0	30.0	30.0	53.5	31.7	
13~14	34.9	31.0	30.0	30.0	30.0	55.4	32.1	
14~15	35.0	31.6	30.0	30.0	30.0	56.7	32.3	
15~16	35.5	31.8	30.0	30.0	30.0	53.1	31.7	
16~17	34.7	31.3	30.0	30.0	30.0	51.9	31.7	
17~18	35.1	31.1	30.0	30.0	30.0	47.9	31.5	
18~19	32.1	30.0	30.0	30.0	30.0	48.6	31.0	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.7	30.3	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	53.4	30.8	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	51.0	30.3	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.6	30.1	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.9	30.1	

註：監測起始時間為當日0時。

檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 台中市中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.3-59 過港部落101年6月非假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/8～101/6/9　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.2	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	33.1	30.0	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	35.5	30.0	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.8	30.1	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.2	30.0	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.3	30.0	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	35.2	30.0	
10~11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.1	30.0	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.7	30.1	
12~13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.3	30.3	
13~14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.0	30.0	
14~15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.4	30.1	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.4	30.2	
16~17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.8	30.1	
17~18	32.1	30.0	30.0	30.0	30.0	43.1	30.5	
18~19	32.4	30.6	30.0	30.0	30.0	42.8	30.5	
19~20	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.9	30.1	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.2	30.1	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.1	30.0	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.7	30.0	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	42.8	30.1	

註：監測起始時間為當日0時。

附錄Ⅳ.3-60 過港部落101年6月假日振動逐時監測結果

監測日期：101/6/9～101/6/10　　單位：dB

時間L值	L_5	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{95}	L_{max}	L_{eq}	備註
00~01	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
01~02	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	33.3	30.0	
02~03	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	33.2	30.0	
03~04	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.9	30.0	
04~05	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
05~06	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	45.7	30.1	
06~07	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.8	30.1	
07~08	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.5	30.0	
08~09	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	44.7	30.1	
09~10	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.3	30.1	
10~11	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.5	30.1	
11~12	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.3	30.2	
12~13	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.8	30.1	
13~14	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	43.5	30.2	
14~15	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	36.1	30.0	
15~16	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	39.8	30.1	
16~17	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	40.3	30.1	
17~18	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.5	30.2	
18~19	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.2	30.1	
19~20	34.3	32.2	30.0	30.0	30.0	41.4	31.0	
20~21	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	35.2	30.0	
21~22	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	33.5	30.0	
22~23	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	41.3	30.0	
23~24	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	38.3	30.0	

註：監測起始時間為當日0時。

專用章 電話:(02)7731-3232 中正路788號5樓之4

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 4 月台 2 省道與 102 甲縣道交叉口)(續 1)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：%0105　　計畫期數：(01)

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口　樣品編號：T20420 N V

檢 測 員：賴振谷、范和聰、林友發　監測日期：101.04.20 — 101.04.21 (晚夜間)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	重車經過 (V.)
08 ~ 09	重車剎車聲 (N.)
09 ~ 10	
10 ~ 11	
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	重車喇叭聲 (N.)
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	收讀車號箱聲 (N.)　重車經過 (V.)
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	重車經過 (V.)
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：△ dBA 為噪音，台二省道車流量大且重型車，易影響噪音、振動測值。

電子資料檔儲存位置：L:\Z0105\01\101-04\振動\Z0105-01-20120420-N.

新紀工程顧問股份有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 新北市中和區中正路788號6樓之4

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 4 月台 2 省道與 102 甲縣道交叉口)

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：%0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口　樣品編號：T20420 N V / T2 0421 N V

檢 測 員：賴振谷、范和聰、林友發　監測日期：101.4.20-101.4.21(晚夜間) 101.4.21-101.4.22(假日)

一. 現場環境說明：

1. 氣象條件概述：

溫度：21.8~22.1℃　風速：0.2~1.3m/s　天氣：陰

溫度：84-89%　風向：北~北北西面　大氣壓力：754 torr (mmHg)

2. 監測點周圍環境現況概述：

△測點位於台二省道旁公園綠地邊，距路邊1m處。

△指振器放置於堅硬平坦且水平的自然地面上。


△最近降雨日期：101.4.19

二. 現場特殊狀況說明：

△測點旁道路邊常有車輛停放。

△台二省道車流量大，重型車往來頻繁。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

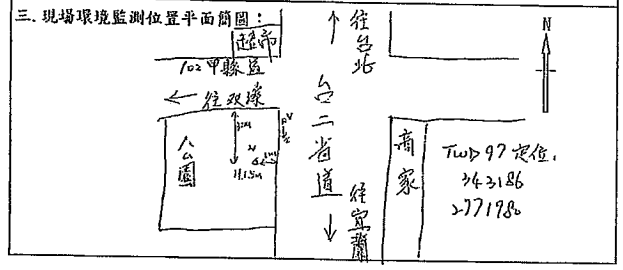

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 5 月 台 2 省道與 102 甲縣道交叉口)(續 3)

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口　　樣品編號：T205061U, T205062U, T205071U, T205072U

檢 測 員：朱國毅、鄭振谷　　監測日期：101.5.6－101.5.7(假日)、101.5.7－101.5.8(平假日)


一、現場環境說明：

1. 氣象條件概述：
   溫度：17.8－29.7°C　風速：0.2－1.3m/s　天氣：晴
   濕度：62－98%　風向：西南-西南西　大氣壓力：762-760(mmHg)
2. 監測點周圍環境現況概述：
   △測站位於台二省道公園內，距道路邊1m處
   △振動儀設置於堅硬平坦且水平之柏油路面上
   △最近降雨日期：101.5.4

二、現場特殊狀況說明：

△測站台台二省道車流量大，重車往來頻繁
△測站台道路邊偶有車輛停放

三、現場環境監測位置平面簡圖：

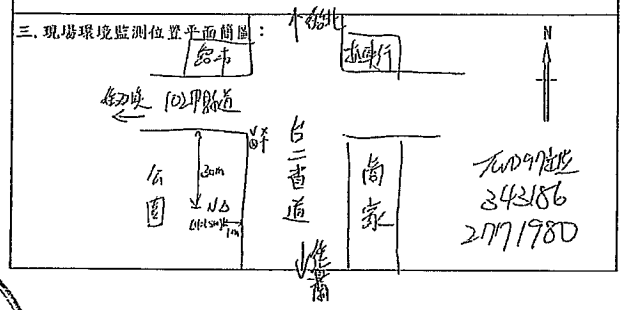

RF-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980605制表二十(9602修訂)

新北市中和區中正路788號5樓之1 新紀工程顧問有限公司 環境檢驗報告專用 電話:(02)7731-9299

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 4 月 台 2 省道與 102 甲縣道交叉口)(續 2)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口　　樣品編號：T205041U, T205042U

檢 測 員：賴振谷、范和儒、林友獅　　監測日期：101.04.21－101.4.22(假日)

	時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
✓	00 ～ 01	
	01 ～ 02	
	02 ～ 03	重車經過(V.)
	03 ～ 04	
	04 ～ 05	
	05 ～ 06	
	06 ～ 07	
	07 ～ 08	
	08 ～ 09	重車喇叭聲(V.)
	09 ～ 10	重車經過(V.)
	10 ～ 11	
	11 ～ 12	
	12 ～ 13	
	13 ～ 14	
	14 ～ 15	
	15 ～ 16	
	16 ～ 17	
	17 ～ 18	
	18 ～ 19	
	19 ～ 20	
	20 ～ 21	
	21 ～ 22	
	22 ～ 23	
	23 ～ 24	

備註：A 四～4時，台二省道車流量大且重車多，易影響噪音振動的測值。

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\51\100-104\04\T21\T205041.mdb

RF-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980605制表二十一(9602修訂)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口　樣品編號：T2050N, T2050V

檢 測 員：朱柏毅　　監測日期：101.5.7-101.5.8(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
√ 00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	重車經過 (V)
05 ~ 06	重車喇叭聲 (N)　重車經過 (V)
06 ~ 07	重車剎車聲 (N)　重車經過 (V)
07 ~ 08	
08 ~ 09	
09 ~ 10	
10 ~ 11	重車引擎聲 (N)
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	機車車音聲音 (N)
15 ~ 16	重車經過 (V)
16 ~ 17	重車經過 (V)
17 ~ 18	改裝車排氣管聲 (N)
18 ~ 19	
19 ~ 20	重車喇叭聲 (N)
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	重車經過 (V)

備註：△00~24時台二省道車流量大且重車多，易影響噪音振動測值。

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-05\NL\T2\T2050N\朱柏毅\T2\T2050N\WAV

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01　　T2050V

測站名稱：台二省道與102甲縣道交叉口　樣品編號：T2050V, ~~T2050N~~ 朱柏毅

檢 測 員：朱柏毅, 賴指合　　監測日期：101.5.6-101.5.7 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
√ 00 ~ 01	
01 ~ 02	改裝車排氣管聲 (N)　重車經過 (V)
02 ~ 03	
03 ~ 04	重車引擎聲 (N)
04 ~ 05	重車經過 (V)
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	重車經過 (V)
08 ~ 09	重車經過 (V)
09 ~ 10	重車喇叭聲 (N)
10 ~ 11	重車經過 (V)
11 ~ 12	
12 ~ 13	重車喇叭聲 (N)
13 ~ 14	重車喇叭聲 (N)
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	機車車音聲音 (N)
21 ~ 22	
22 ~ 23	重車車斗碰撞聲 (N)
23 ~ 24	

備註：△00~24時台二省道車流量大且重車多，易影響噪音振動測值。

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-05\NL\T2\T2050V\朱柏毅\T2\T2050V\WAV

新光工程顧問有限公司 環境檢驗報告專用
檢驗專用
電話:(02)7731-3232
臺中市中西區中正路738號5樓之2

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105 (第1次)　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道第102甲縣道交叉口　採品編號：T206Z4 N
T206Z5 N

檢測員：郭昊宗、朱恒毅、許友孫　監測日期：101.6.24～101.6.25 (假日)
101.6.25～101.6.26 (假日)


一、現場環境說明：

1. 氣象條件概述：
溫度：24.4～31.5°C　風速：0.2～1.5 m/s　天氣：晴
溫度：68～97%　風向：西北～北　大氣壓力：754 (torr, cmHg)

2. 監測點周圍環境現況概述：
△測點位於台二省道南公園綠地邊距道路邊 ~~1.00公尺~~ 5米
△指標器放置於堅硬平坦且水平的相油地面上。
△最近降雨日期：101.6.23.

二、現場特殊狀況說明：
△測點旁道路邊常有車輛停放。
△台二省道車流量大，重型車往來頻繁。

三、現場環境監測位置平面簡圖：

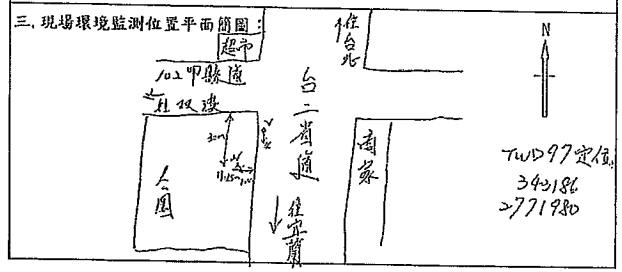

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道第102甲縣道交叉口　採品編號：T206Z4 N

檢測員：郭昊宗、朱恒毅、許友孫　監測日期：101.6.24～101.6.25 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	
05 ～ 06	重車喇叭聲(N)
06 ～ 07	
07 ～ 08	
08 ～ 09	
09 ～ 10	重車喇叭聲(N)
10 ～ 11	
11 ～ 12	
12 ～ 13	
13 ～ 14	
14 ～ 15	
15 ～ 16	重車喇叭聲(N)
16 ～ 17	
17 ～ 18	
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	重車剎車聲(N)
21 ～ 22	
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：△00:00～24:00間台二道車流量大且重型車多，易影響噪音振動測值

電子資料檔儲存位置：D:/X0105/S1/101.06/NL/T2/T206Z4N.xx
D:/X0105/S1/101.06/VM/T2/T206Z4V.xx

新光工程顧問股份有限公司 檢驗報告專用
電話:(02)7713-8320
臺中市中正路738號5樓之2

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園　　樣品編號：NL04320 NL04321

檢 測 員：賴振谷、范和聰、林友財　　監測日期：101.4.20～101.4.21(假日) 101.4.21～101.4.22(假日)


一、現場環境說明：

1. 氣象條件概述：
溫度：21.9～26.3℃　風速：0.3～4.2 m/s　天氣：陰
濕度：91-96%　風向：東南東～ESE西大氣壓力：754 torr (mmHg)

2. 監測點周圍環境現況概述：
a.測點位於鹽寮海濱公園前台二省道旁，距道路 1m 處
b.振動器放置於堅硬平坦且水平之相對地面上。
c.最近降雨日期：101.4.19

二、現場特殊狀況說明：
a.測點旁台二省道車流量大，且大型車重型車頻多。
b.鹽寮海濱公園停車場偶有車輛進出停放。

三、現場環境監測位置平面簡圖：



RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表二十(9602修訂))

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：台二省道-西-102甲縣道交叉口　樣品編號：T2060505

檢 測 員：郭晏宗、朱恒毅、林友財　監測日期：101.6.05～101.6.06(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	
05 ～ 06	
06 ～ 07	重車噪音 (N)
07 ～ 08	重車噪音 (N)
08 ～ 09	
09 ～ 10	重車噪音 (N)
10 ～ 11	
11 ～ 12	
12 ～ 13	
13 ～ 14	洗街車清掃音 (N)
14 ～ 15	
15 ～ 16	改道車排氣管音 (N)
16 ～ 17	機車喇叭音 (N)
17 ～ 18	機車排氣管音 (N)
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	
21 ～ 22	
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：20:00→24:00 時台二省道車流量大且重車多，易影響背景振動測值。

電子資料檔儲存位置：D:/X0105/S1/101.06/NL/T2/T2060505N*.*
D:/X0105/S1/101.06/VM/T2/T2060505V*.*

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980608(附表二十一(9602修訂))

新竹工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3299 台北市中正路738號5樓之1

附表二十一 監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：~~W0105~~ 北區 W0105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園　　樣品編號：~~N~~ 北區 N~~L~~ 04201 N~~V~~

檢 測 員：賴振谷、范和聰、林友孫　　監測日期：101、4、20 ~101.4.21 (非假日).

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	重車經過(LV)
04 ~ 05	
05 ~ 06	小型車排氣聲(LH)
06 ~ 07	
07 ~ 08	重車卸料、石頭撞擊(LH)
08 ~ 09	
09 ~ 10	重車經過(LV)
10 ~ 11	重車經過(LV)
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：△00~24時，台二省道車流量大且重車多，易影響噪音、振動的測值。

電子資料檔儲存位置：公1\X0105\S1\10109.LV\N0420.呼

附表二十一 監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：~~W0105~~ 北區 W0105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園　　樣品編號：~~N~~ 北區 N~~L~~ 04211 N~~V~~

檢 測 員：賴振谷、林友孫　　監測日期：101、4、21 ~101.4.22 (假日).

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	重車引擎聲(LH)
03 ~ 04	
04 ~ 05	
05 ~ 06	重車引擎聲(LH)　重車經過(LV)
06 ~ 07	重車經過(LV)
07 ~ 08	
08 ~ 09	重車經過(LV)
09 ~ 10	
10 ~ 11	重車經過(LV)
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：△00~24時，台二省道車流量大且重車多，易影響噪音、振動的測值。

電子資料檔儲存位置：公1\X0105\S1\10109.LV\N0421.呼

新竹工業技術研究院 檢驗報告專用章 電話:(03)5917731-3939 新竹縣竹東鎮中興路四段195號

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 5 月鹽寮海濱公園)
(續 12)


附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：鹽寮海濱公園　　樣品編號：VL050601,VL050602
VL050701,VL050702
檢測員：朱炳毅,趙振台　　監測日期：101.5.6-101.5.7(假日)
101.5.7-101.5.8(補假日)

一. 現場環境說明：
1. 氣象條件概述：
溫度：19.1-29.1℃　風速：0.4-3.0m/s　天氣：晴
溫度：51-91%　風向：西北西-東北　大氣壓力：762torr(mmHg)
2. 監測點周圍環境現況概述：
△測站位於鹽寮濱海公園停車場旁，距道路1m處。
△指標點設置於現場平坦且水平之柏油路面上。
△最近降雨日期：101.5.4

二. 現場特殊狀況說明：
△測站各一車道車流量大且大型車及重車多。
△鹽寮海濱公園停車場偶有車輛出入停放。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

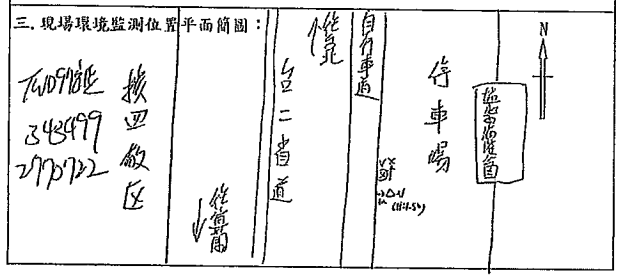

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 5 月鹽寮海濱公園)
(續 13)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01
測站名稱：鹽寮海濱公園　　樣品編號：VL050601,VL050602
檢測員：朱炳毅,趙振台　　監測日期：101.5.6-101.5.7(假日)

時間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
√ 00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	重車引擎聲(N)　重車經過(V)
04 ~ 05	重車引擎聲(N)
05 ~ 06	重車引擎聲(N)　重車經過(V)
06 ~ 07	
07 ~ 08	
08 ~ 09	重車引擎聲(N)
09 ~ 10	重車引擎聲(N)　重車經過(V)
10 ~ 11	重車經過(V)
11 ~ 12	重車經過(V)
12 ~ 13	重車引擎聲(N)
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	重車經過(V)
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：本00-24時台二省道車流量大且重車多，易影響噪音推動測值。

電子資料檔儲存位置：E:\X0105\81\101-05\VL\VL\VL050601\檢驗報告\VL050602\原始

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9939 臺北市中山區中正路788號6樓之2

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園　　樣品編號：VL062414V, VL062415V

檢 測 員：朱順毅、賴順來、林政欽　　監測日期：101.6.24－101.6.25(假日)
101.6.25－101.6.26(假日)

一、現場環境說明：

1. 氣象條件概述：　0.6－2.5m/s

溫度：25.1－30.9℃　風速：~~0.3－3.0m/s~~　天氣：晴

溫度：66－91%　風向：西北西－東　大氣壓力：754 torr (mm-Hg)

2. 監測點周圍環境現況概述：

△測站位於鹽寮海濱公園南方一處海岸，距海岸約100公尺。

△採樣點設置於空曠平坦且水平之地面上。


△最近降雨日期：101.6.23

二、現場特殊狀況說明：

△測站旁有一處道路流量大，且偶有大型車及重型車經過。

△鹽寮海濱公園停車場偶有車輛出入停放。

三、現場環境監測位置平面簡圖：

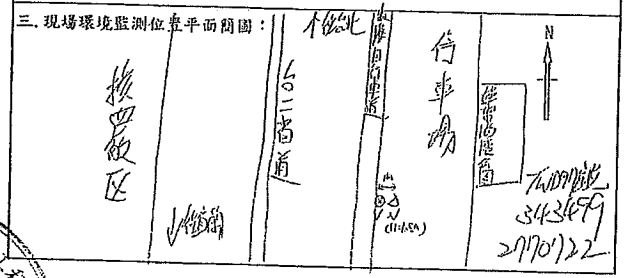

RP 03-C-01(環境表單第11-2版)-980608(附表二十(9803修訂)

檢驗報告專用章
新北市環境保護局環境檢驗所
電話:(02)7731-2932
地址:新北市中和區中正路738號5樓之4

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園　　樣品編號：VL050711V, VL050712V

檢 測 員：朱順毅　　監測日期：101.5.7－101.5.8(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	重車經過(V)
01 ～ 02	重車經過(V)
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	重型引擎聲(V)
05 ～ 06	重型引擎聲(V)　重車經過(V)
06 ～ 07	重車經過(V)
07 ～ 08	機車排氣管聲(V)
08 ～ 09	重型引擎聲(V)
09 ～ 10	改裝車排氣管聲(V)
10 ～ 11	
11 ～ 12	
12 ～ 13	重型引擎聲(V)
13 ～ 14	重型引擎聲(V)
14 ～ 15	重型引擎聲(V)
15 ～ 16	
16 ～ 17	
17 ～ 18	
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	
21 ～ 22	
22 ～ 23	重車經過(V)
23 ～ 24	

備註：00－24時，台一省道車流量大且重車多，易影響噪音振動測值。

電子資料檔儲存位置：C:\X0105\S1\101-05\VL\VL050711V.txt
VL050712V.txt

RP 03-C-01(環境表單第11-2版)-980608(附表二十一(9803修訂)

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 6 月鹽寮海濱公園)
(續 17)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園　　採品編號：LL0625V, LL0626V

檢 測 員：[illegible]　　監測日期：101.6.25–101.6.26 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	重車行駛車 LN)　　重車經過 LN)
03 ～ 04	重車行駛車 LN)
04 ～ 05	重車行駛車 LN)
05 ～ 06	重車行駛車 LN)
06 ～ 07	重車經過 LN)
07 ～ 08	重車行駛車 LN)
08 ～ 09	
09 ～ 10	
10 ～ 11	
11 ～ 12	重車經過 LN)
12 ～ 13	
13 ～ 14	
14 ～ 15	
15 ～ 16	
16 ～ 17	重車經過 LN)
17 ～ 18	重車經過 LN)
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	
21 ～ 22	重車經過 LN)
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：
△00–24時，各一般道路車流量大且重車多，易影響時段振動測值。

電子資料儲存位置：L:\XO105\S1\101-06\LL\LL0625V等共4筆\LL0626V等共4筆

新北市中和區中正路738號5樓之2 新北工程顧問有限公司 環境檢驗部 章用章 電話:(02)7731-3202

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 6 月鹽寮海濱公園)
(續 16)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：XO105　　計畫期數：01

測站名稱：鹽寮海濱公園　　採品編號：LL0624V, LL0624V

檢 測 員：[illegible]　　監測日期 101.6.24–101.6.25 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	重車行駛車 LN)　　重車經過 LN)
04 ～ 05	
05 ～ 06	
06 ～ 07	重車行駛車 LN)
07 ～ 08	
08 ～ 09	
09 ～ 10	
10 ～ 11	機車行駛車 LN)
11 ～ 12	
12 ～ 13	
13 ～ 14	機車非駕駛 LN)
14 ～ 15	
15 ～ 16	車輛經過 LN)
16 ～ 17	車輛喇叭聲 LN)
17 ～ 18	
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	
21 ～ 22	
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：
△00–24時，各一般道路車流量大且重車多，易影響時段振動測值。

電子資料儲存位置：L:\XO105\S1\101-06\LL\LL0624V等共4筆\LL0624V等共4筆

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　採品編號：FL 04320 N
FL 04321 V

檢 測 員：賴振谷、范和聰、林友緣　　監測日期：101.4.20-101.4.21(晴)
101.4.21 for 東北季風(陰)


一. 現場環境說明：

1. 氣象條件概述：
溫度：22.4-29.4°C　風速：0.5-2.5m/s　天氣：陰
溫度：78-98%　風向：東、東北東　大氣壓力：754 torr (mmHg)

2. 監測站周圍環境現況概述：
1.測點位於中華電信福隆營業所前方空地。
2.拾振器放置於堅硬平坦且水平鋪水泥地面上。
3.最近降雨日期：101.4.19

二. 現場特殊狀況說明：
1.測點前方台二省道全日車流量很大，且重車多。
2.常有遊客經過測點旁空地。
3.測點前道路邊常有車輛停放。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

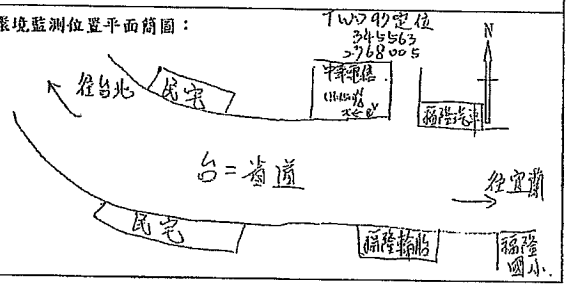

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980609(附表二十(9602修訂)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　採品編號：FL 04320 N

檢 測 員：賴振谷、范和聰、林友緣　　監測日期：101.4.20～101.4.21(晴)(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	重車輛經過(V)
04 ～ 05	
05 ～ 06	車輛開始聲響(V)
06 ～ 07	
07 ～ 08	重車經過(V)
08 ～ 09	車輛陸續增加(V)
09 ～ 10	
10 ～ 11	車輛及車斗石碰撞聲(V)
11 ～ 12	重車經過(V)　　重車經過(V)
12 ～ 13	
13 ～ 14	
14 ～ 15	
15 ～ 16	
16 ～ 17	
17 ～ 18	車斗石碰撞聲(V)
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	
21 ～ 22	
22 ～ 23	
23 ～ 24	重車經過(V)

備註：台10~24時，台二都經車流量大且重車多，易影響等振動測值。

電子資料檔儲存位置：公司\X01-S\S1\101/04/22\FL04320水平

RP-03-C-01(記錄表單第11-2版)-980609(附表二十一(9602修訂)

新竹工程顧問有限公司 環境檢驗室
檢驗報告專用章
電話:(03)5770111-2220
新竹市中正路738號5樓之4

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　樣品編號：FL042N

檢 測 員：趙振谷、林友猷　　監測日期：101、4、21－101.4.22 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	車車經過頻(V)
03 ～ 04	
04 ～ 05	車車經過頻(V)
05 ～ 06	車車引擎聲(V)
06 ～ 07	
07 ～ 08	
08 ～ 09	福隆車站播音(V)　車車經過(V)
09 ～ 10	
10 ～ 11	
11 ～ 12	
12 ～ 13	
13 ～ 14	
14 ～ 15	
15 ～ 16	
16 ～ 17	
17 ～ 18	
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	
21 ～ 22	
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：△00～24時，台二省道車流量大且重車多，易影響環境振動的測值。

電子資料檔儲存位置：C:\X0105\S1\101.4.21\FL042*.*

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　樣品編號：FL050611, FL050621, FL050711, FL050721

檢 測 員：趙振谷、林友猷　　監測日期：101.5.6－101.5.7 (假日)、101.5.7－101.5.8 (假日)


一. 現場環境說明：

1. 氣象條件概述：
溫度：16.7－27.5°C　風速：0.6－3.3 m/s　天氣：晴
溫度：77－98%　風向：西北西－東北　大氣壓力：761 torr (mm-Hg)

2. 監測點周圍環境現況概述：
△測站位於中華電信福隆營業所前的空地上。
△指標點設置於硬鋪面且水平之斜坡面上。
△最近降雨日期：101、5、4

二. 現場特殊狀況說明：
△測站旁台二省道全日均有車輛經過，且重車多。
△測站旁道路偶有車輛行駛。
△測站旁台二省道此路段路面坑洞多，車輛經過時易影響噪音振動測值。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

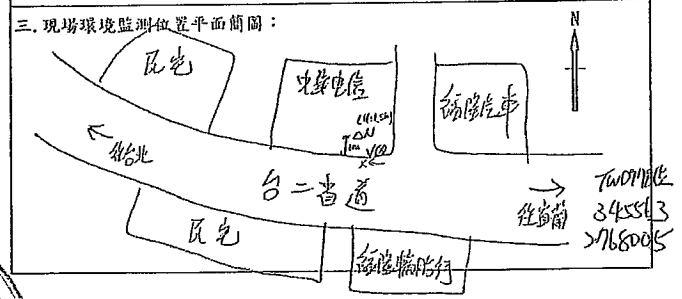

新北市中和區中正路738號5樓之4 新北工程顧問股份有限公司 環境檢驗室 檢驗報告專用 電話:(02)7731-3299

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　樣品編號：FL0506N, FL0506V

檢 測 員：朱國毅、林振名　　監測日期：101.5.6-101.5.7(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	改裝車排氣聲(N)　重車經過(N)
03 ~ 04	重型引擎聲(N)　重車經過(N)
04 ~ 05	重型引擎聲(N)　重車經過(N)
05 ~ 06	重車經過(N)
06 ~ 07	重型引擎聲(N)
07 ~ 08	重車經過(V)
08 ~ 09	
09 ~ 10	重車車斗碰撞聲(N)
10 ~ 11	重車喇叭聲(N)
11 ~ 12	卡車撞擊聲(N)
12 ~ 13	拖說車警笛聲(N)
13 ~ 14	重車喇叭聲(N)
14 ~ 15	
15 ~ 16	小朋友喊叫聲(N)
16 ~ 17	
17 ~ 18	機車急煞聲(N)
18 ~ 19	
19 ~ 20	重型引擎聲(N)
20 ~ 21	
21 ~ 22	重車經過(N)
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：以00-24時台二省道車流量大且重車多，易影響噪音振動測值

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-05\WL\FL\FL0506N\朱.朱
\WM\FL\FL0506V\朱.朱

A-29

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)(980508)(附表二十一(9502修訂)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　樣品編號：FL0507N, FL0507V

檢 測 員：朱國毅　　監測日期：101.5.7-101.5.8(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	重車經過(V)
04 ~ 05	重型引擎聲(N)　重車經過(V)
05 ~ 06	重型引擎聲(N)　重車經過(V)
06 ~ 07	重車經過(V)
07 ~ 08	
08 ~ 09	重型引擎聲(N)
09 ~ 10	
10 ~ 11	重車車斗碰撞聲(N)　重車經過(V)
11 ~ 12	
12 ~ 13	重車車斗碰撞聲(N)
13 ~ 14	重車車斗碰撞聲(N)
14 ~ 15	
15 ~ 16	重車車斗碰撞聲(N)
16 ~ 17	
17 ~ 18	機車急煞聲(N)
18 ~ 19	重車車斗碰撞聲(N)
19 ~ 20	重車車斗碰撞聲(N)
20 ~ 21	重車經過(V)
21 ~ 22	重車經過(V)
22 ~ 23	重車經過(V)
23 ~ 24	

備註：以00-24時台二省道車流量大且重車多，易影響噪音振動測值

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-05\WL\FL\FL0507N\朱.朱
\WM\FL\FL0507V\朱.朱

A-29

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)(980508)(附表二十一(9502修訂)

新北市政府環境保護局 公害糾紛檢驗專用章 檢驗報告專用章 電話:(02)7151-2559 地址:中正路788號5樓之4

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　樣品編號：FL0624N, FL0624V, FL0625N, FL0625V

檢 測 員：黃國毅, 郭昊宗, 林政欣　　監測日期：101.6.24-101.6.25(假日), 101.6.25-101.6.26(非假日)

一、現場環境說明：

1. 氣象條件概述：

溫度：25.0~31.5°C　風速：0.3-2.0m/s　天氣：晴

濕度：69-91%　風向：西北-西　大氣壓力：753 torr (mmHg)

2. 監測點周圍環境現況概述：

△測點像中華電信福隆電信分局占地、

△振動計設置於堅硬平坦且水平之水泥地面上。


△最近降雨日期：101.6.23.

二、現場特殊狀況說明：

△測站旁台二省道全日車流量大，偶有重車。

△假日時段偶有車輛停放測站旁台二省道上，並有遊客經過。

三、現場環境監測位置平面簡圖：

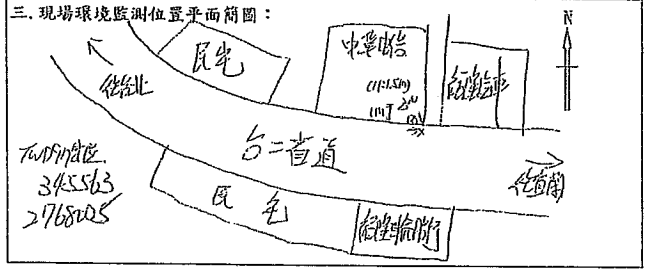

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上　　樣品編號：FL0624N, FL0624V

檢 測 員：黃國毅, 郭昊宗, 林政欣　　監測日期：101.6.24-101.6.25(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	
08 ~ 09	垂車經過 (V)
09 ~ 10	
10 ~ 11	改裝車排氣管聲 (N)
11 ~ 12	
12 ~ 13	垂車排氣管聲 (N)
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	垂車喇叭聲 (N)
16 ~ 17	
17 ~ 18	拖曳車煞車聲 (N)
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	垂車車斗碰撞聲 (N)
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：

00-24時，台2省道車流量大且車多，易影響測站振動測值。

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-06\NL\FL\FL0624N\未加工\NL\FL\FL0624N\未加工

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-2999 新北市中和區中正路738號5樓之4

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋　　樣品編號：CS0403N, CS0403V, CS0404N, CS0404V

檢 測 員：朱柄毅、范姜智　　監測日期：101.4.3～101.4.4(假日), 101.4.4～101.4.5(假日)


一、現場環境說明：

1. 氣象條件概述：
溫度：11.2～27.3℃　風速：0.2～3.3m/s　天氣：陰
濕度：64～96%　風向：北北西～南南東　大氣壓力：763 torr(mm-Hg)

2. 監測點周圍環境現況概述：
△測點位於102縣道新社橋考土地公廟旁空地上.距道路1m處
△振動儀故置於堅硬平坦且水平之物體地面上
△最近降雨日期：101.3.31

二、現場特殊狀況說明：
△102縣道往東為台三道路.偶有車輛行駛.
△102縣道偶有重型机車經過.假日期間車流量增加.

三、現場環境監測位置平面簡圖：

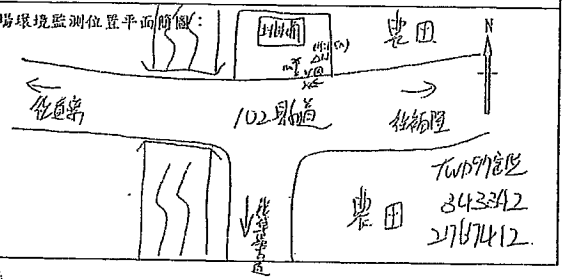

新北市環境檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-8200 新北市中和區中正路788號5樓之4

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：福隆街上、　　樣品編號：FL0625N, FL0625V

檢 測 員：朱柄毅、郭昱宏、林秋欣　　監測日期：101.6.25～101.6.26(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	
05 ～ 06	
06 ～ 07	
07 ～ 08	
08 ～ 09	
09 ～ 10	重車輛小車(N)
10 ～ 11	重車車斗碰撞車(N)
11 ～ 12	
12 ～ 13	
13 ～ 14	重車輛小車(N)
14 ～ 15	
15 ～ 16	
16 ～ 17	重車車斗碰撞車(N)
17 ～ 18	
18 ～ 19	重車車斗碰撞車(N)
19 ～ 20	
20 ～ 21	重車車斗碰撞車(N) 雨(V)
21 ～ 22	鐵軌車輛經過(N)
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：
△00→4時.台二道路車流量大且重車多,易物件掉落振動測值.

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-06\N\FL\FL0625N等.
N\FL\FL0625V等.

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：(1)縣道之新社橋　　樣品編號：CS0404N, CS0404V

檢 測 員：朱炳毅、范振鴻　　監測日期：101.4.4～101.4.5 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	車輛經過 (V)
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	重車車斗碰撞聲 (N)　車輛經過 (V)
05 ～ 06	車輛經過 (V)
06 ～ 07	機車排氣管聲 (N)
07 ～ 08	機車排氣管聲 (N)
08 ～ 09	
09 ～ 10	警車警笛聲 (N)　車輛經過 (V)
10 ～ 11	機車排氣管聲 (N)
11 ～ 12	機車排氣管聲 (N)
12 ～ 13	
13 ～ 14	重型車斗碰撞聲 (N)
14 ～ 15	機車排氣管聲 (N)
15 ～ 16	機車排氣管聲 (N)
16 ～ 17	車輛經過 (V)
17 ～ 18	車輛經過 (V)
18 ～ 19	
19 ～ 20	機車排氣管聲 (N)
20 ～ 21	
21 ～ 22	車輛經過 (V)
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\101-04\VL\CS\CS0404N\背景\VL\CS\CS0404V\背景

A-29

RP-01-C-01(環境資源第11-2版)-980608(附表二十一(9602修訂))

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：(1)縣道之新社橋　　樣品編號：CS0403N, CS0403V

檢 測 員：朱炳毅、范振鴻　　監測日期：101.4.3～101.4.4 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	
05 ～ 06	重型車車斗碰撞聲 (N)　重車經過 (V)
06 ～ 07	重型車引擎聲 (N)　重車經過 (V)
07 ～ 08	
08 ～ 09	
09 ～ 10	重型車引擎聲 (N)　重車經過 (V)
10 ～ 11	
11 ～ 12	重型車引擎聲 (N)　重車經過 (V)
12 ～ 13	
13 ～ 14	
14 ～ 15	
15 ～ 16	重型車車斗碰撞聲 (N)　重車經過 (V)
16 ～ 17	重車經過 (V)
17 ～ 18	重型車引擎聲 (N)　重車經過 (V)
18 ～ 19	機車排氣管聲 (N)　重車經過 (V)
19 ～ 20	
20 ～ 21	機車排氣管聲 (N)
21 ～ 22	
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S1\背景\101-04\VL\CS\CS0403N\背景\VL\CS\CS0403V\背景

A-29

RP-01-C-01(環境資源第11-2版)-980608(附表二十一(9602修訂))

檢驗報告專用章
電話：(02)7731-2929
臺中市中正路738號5樓之4

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋　　樣品編號：CS0511N (假日)
CS0512N (假日)

檢 測 員：黃禾珮、賴福名　　監測日期：~~101.5.11~101.5.12~~ 101.5.11～101.5.12 (假日)
101.5.12～101.5.13 (假日)

一. 現場環境說明：

1. 氣象條件概述：

溫度：24.3～25.8°C　風速：0.1m/s～2.8m/s　天氣：陰

溼度：98～99%　風向：東北～東北東　大氣壓力：963 (mmHg)

2. 監測點周圍環境現況概述：

△測點位於102縣道之新社橋旁，距道路邊1m處。

△拾振器設置於堅硬平坦且水平之柏油地面上。

△最近降雨日期：101.5.10


二. 現場特殊狀況說明：

△102縣道常有重型車(機具)經過。

○102縣道往草嶺古道旁常有車輛進出停放。

△102縣道全日均有重型車經過易影響測值。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

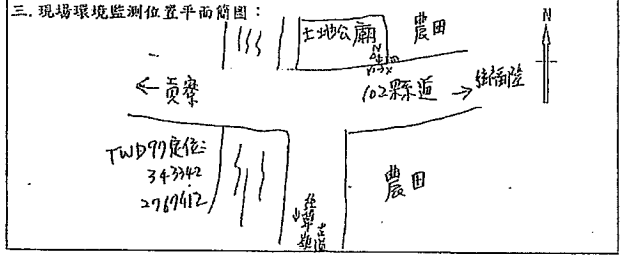

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋　　樣品編號：CS0511N、CS0512N (假日)

檢 測 員：黃禾珮　　監測日期：101.5.11～101.5.12 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	重車經過(N)
05 ～ 06	
06 ～ 07	
07 ～ 08	
08 ～ 09	重機車斗碰撞聲(N)
09 ～ 10	除草機聲(N)
10 ～ 11	
11 ～ 12	
12 ～ 13	
13 ～ 14	重車經過(N)
14 ～ 15	機車排氣管聲(N)
15 ～ 16	
16 ～ 17	
17 ～ 18	
18 ～ 19	
19 ～ 20	
20 ～ 21	
21 ～ 22	
22 ～ 23	
23 ～ 24	

備註：

電子資料檔館存位置：Z:\X0105\S1\NL\CS\CS0511N、S

新竹工業區開發有限公司環境檢驗中心
檢驗報告專用章
電話:(03)7781-9939
新竹市中正路738號6樓之4

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋　　樣品編號：C50512N

檢 測 員：范永順、賴振谷　　監測日期：101.5.12~101.5.13 (平/假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	車輛車斗碰撞聲(W.)
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	重車經過(W.)
08 ~ 09	重車經過(W.)
09 ~ 10	
10 ~ 11	重車引擎聲(W.)
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：Z:\X0105\51\NL\CS\C50512.xls

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋　　樣品編號：C50608N / C50609N

檢 測 員：鄒昊宸、范永順　　監測日期：101.6.8~101.6.9 (平/假日) ; 101.6.9~101.6.10 (假/平日)

一. 現場環境說明：

1. 氣象條件概述：

溫度：25.3~32.0°C　　風速：0.3~1.8m/s　　天氣：晴

溼度：72~98%　　風向：東南→北　　大氣壓力：758.6mm Hg

2. 監測站周圍環境現況概述：

△測點位於102縣道新社橋旁，距道路1m處。

△檢測點設於堅硬平坦水平之植被地面上。


△最近降雨日期：101.6.5

二. 現場特殊狀況說明：

△測點旁102縣假日時段常有車輛停放於此處。

△102縣道偶有重型機車經過。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

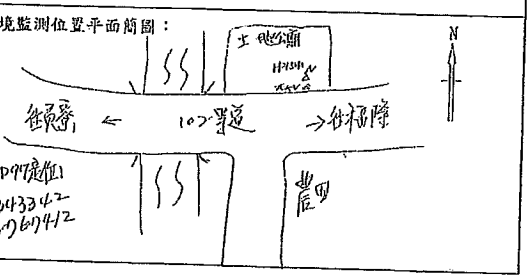

檢驗報告專用章
電話:(02)7731-9292
苗栗縣苗栗市中正路738號5樓之4

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 6 月 102 縣道之新社橋)(續 34)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋　　樣品編號：CS060804

檢 測 員：鄧景榮,池和龍　　監測日期：101.6.8~101.6.9(含假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	
05 ~ 06	車輛沿路邊經過(V)，
06 ~ 07	
07 ~ 08	
08 ~ 09	重車敲擊聲(H)　重車經過(V)、
09 ~ 10	
10 ~ 11	
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	私車排氣管聲(H)、
23 ~ 24	

備註：0600-1900 常有車輛經過，易影響噪音振動測值。

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S\101-06\錄\CS060804.*

附錄 IV.3-61 噪音及振動量測現場紀錄(101 年 6 月 102 縣道之新社橋)(續 35)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：102縣道之新社橋　　樣品編號：CS060705

檢 測 員：鄧景榮,池和龍　　監測日期：101.6.9~101.6.10(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	砂石車排氣管聲(H)
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	重車經過(V)
08 ~ 09	
09 ~ 10	重型砂石車排氣管聲(H)
10 ~ 11	重車經過(V)
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：0600->2400 常有車輛經過，易影響噪音振動測值。

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S\101-06\錄\CS060705.*

新紀工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3232 臺中市中正路738號5樓之4

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　　樣品編號：GC0403N, GC0403V, GC0404N, GC0404V

檢 測 員：[illegible]　　監測日期：101.4.3－101.4.4(非假日) 101.4.4－101.4.5(假日)

一、現場環境說明：

1. 氣象條件概述：

溫度：15.3－28.1℃　風速：0.2－2.7m/s　天氣：陰

溫度：51～88%　風向：南～南南西　大氣壓力：764 torr (mm-Hg)

2. 監測點周圍環境現況概述：

△測站位於過港部落民宅旁空地

△指振器放置於空地平坦且水平之柏油路面上。

△最近降雨日期：101.3.31


二、現場特殊狀況說明：

△測站旁道路偶有民眾機車及車輛經過。

△測站旁偶有民眾聊天。

△測站旁樹林偶有鳥鳴鳥叫聲傳出。

三、現場環境監測位置平面簡圖：

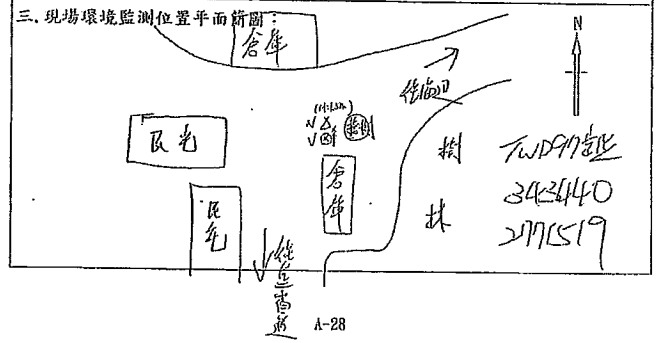

A-28

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980508(附表二十(9602版))

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　　樣品編號：GC0403N, GC0403V

檢 測 員：[illegible]　　監測日期：101.4.3－101.4.4(非假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）	
00 ～ 01		
01 ～ 02		
02 ～ 03	機車經過(N)	
03 ～ 04		
04 ～ 05		
05 ～ 06		
06 ～ 07	民眾拍攝(N)	車輛經過(V)
07 ～ 08	機車騎過(N)	車輛經過(V)
08 ～ 09	機車騎過(N)	
09 ～ 10		
10 ～ 11	車輛駛過(N)	
11 ～ 12		
12 ～ 13		
13 ～ 14		車輛經過(V)
14 ～ 15		車輛經過(V)
15 ～ 16		
16 ～ 17	機車排氣聲(N)	
17 ～ 18	民眾談話聲(N)	民眾談話經過(V)
18 ～ 19		車輛經過(V)
19 ～ 20		
20 ～ 21		
21 ～ 22		
22 ～ 23		
23 ～ 24		

備註：

電子資料檔儲存位置：L:\X0105\S\101.04\NL\GC\GC0403N\未上傳
L:\NL\GC\GC0403V\未上傳

A-29

RP-03-C-01(紀錄表單第11-2版)-980508(附表二十一(9602版))

新光工程顧問有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-3022 臺中市中正路738號5樓之2

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　　樣品編號：GC0404N, GC0404V

檢 測 員：朱炳毅、范和聰　　監測日期：101.4.4－101.4.5 (假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ～ 01	
01 ～ 02	
02 ～ 03	
03 ～ 04	
04 ～ 05	
05 ～ 06	
06 ～ 07	車輛經過 (V)
07 ～ 08	機車引擎聲 (N)　車輛經過 (V)
08 ～ 09	
09 ～ 10	
10 ～ 11	機車排氣管聲 (N)
11 ～ 12	
12 ～ 13	民宅開鐵門聲 (N)　車輛經過 (V)
13 ～ 14	機車排氣管聲 (N)　車輛經過 (V)
14 ～ 15	車輛經過 (V)
15 ～ 16	機車排氣管聲 (N)
16 ～ 17	
17 ～ 18	步行車聲聲音 (N)
18 ～ 19	
19 ～ 20	機車引擎聲 (N)
20 ～ 21	
21 ～ 22	
22 ～ 23	機車引擎聲 (N)
23 ～ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：E:\X0105\S1\101-04\NL\GC\GC0404N.wav
W:\GC\GC0404V.wav

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　　樣品編號：GC0511N、GC0512V

檢 測 員：范和聰、顏振名　　監測日期：101.5.11～101.5.12 (假日)

一. 現場環境說明：


1. 氣象條件概述：
溫度：20.9～24.6℃　風速：0.2 m/s　天氣：陰
溫度 88～99 %　風向：南～南南西　大氣壓力：763 mm-Hg

2. 監測點周圍環境現況概述：
△測点位於過港部落且空曠空地
◎指向器放置於堤防平坦且水平的柏油地面
△最近降雨日期：101.5.10

二. 現場特殊狀況說明：

△測点常偶有等車民眾聊天。
△測点常偶有車輛經過。
◎偶有虫鳴鳥叫聲。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

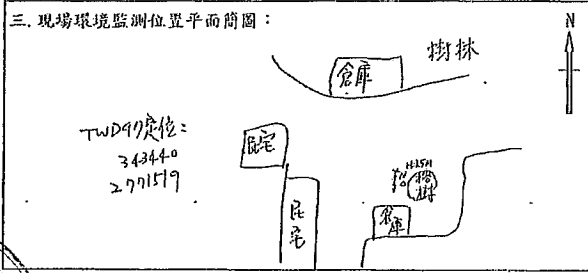

檢驗報告專用
雲林縣環境工程顧問股份有限公司
雲林縣斗六市中山路中正路738號5樓之4
電話:(02)7731-3232

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　　樣品編號：GC0511N

檢 測 員：范和聰　　監測日期：101.5.11－101.5.12(倒休假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	車輛經過(V.)
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	
08 ~ 09	
09 ~ 10	
10 ~ 11	
11 ~ 12	車輛經過(V.)
12 ~ 13	
13 ~ 14	
14 ~ 15	車輛剎車聲.(V.)
15 ~ 16	
16 ~ 17	機車排氣管聲(V.)
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	車輛經過(V.)
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：Z:\X0105\51\10105\NL\VM\GC\GC0511N.X

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　　樣品編號：GC0512N

檢 測 員：范和聰 賴振谷　　監測日期：101.5.12－101.5.13(例假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	
08 ~ 09	
09 ~ 10	
10 ~ 11	
11 ~ 12	
12 ~ 13	
13 ~ 14	車輛引擎聲(V.)
14 ~ 15	鐵門關閉聲(V.)　車輛經過(V.)
15 ~ 16	〃 (V.)
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	鳥鳴聲(V.)　車輛經過(V.)
20 ~ 21	〃 (V.)
21 ~ 22	車輛經過(V.)
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：Z:\X0105\51\10105\NL\VM\GC\GC0512N.X

新竹工程顧問股份有限公司 檢驗報告專用章 電話:(02)7731-9999 臺中市中正路738號5樓之4

附表二十　環境噪音、振動監測現場狀況記錄

計畫編號：X0105	計畫期數：01
測站名稱：過港部落	樣品編號：EC06084 EC06094
檢 測 員：鄧景豪. 施和聰	監測日期：101.6.8~101.6.9(非假日) 101.6.9~101.6.10(假日)

一. 現場環境說明：

1. 氣象條件概述：

溫度：25.1-31.0°C　風速：0.2-1.1 m/s　天氣：晴

溫度：98-99%　風向：東北-北北東　大氣壓力：758 torr (1011 hPa)

2. 監測點周圍環境現況概述：

△測定位於過港部落民宅旁屋地上。

△指示器置於堅硬平坦且呈水平之柏油路面上。


△最近降雨日期：101.6.5

二. 現場特殊狀況說明：

△測定旁偶有樹林偶有蟲鳴鳥叫聲

△測定旁偶有車輛(重型車輛)車輛經過。

三. 現場環境監測位置平面簡圖：

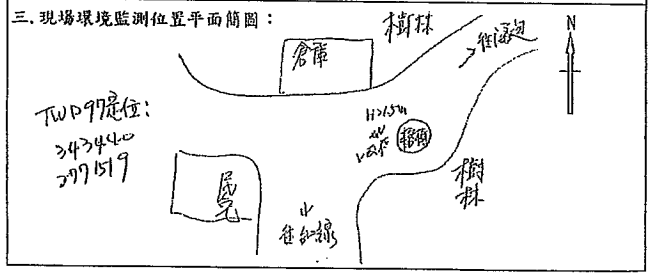

RP-03-C-01(紀錄表草案(11-2版)-980608)附表二十(9502修訂)

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：X0105　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　樣品編號：EC06083

檢 測 員：鄧景豪. 施和聰　監測日期：101.6.8~101.6.9(非假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	
05 ~ 06	
06 ~ 07	
07 ~ 08	
08 ~ 09	
09 ~ 10	鳥叫聲(n)
10 ~ 11	
11 ~ 12	
12 ~ 13	車輛經過(V)
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	蟲聲聲(n).
16 ~ 17	〃 (n)
17 ~ 18	車輛經過(V).
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：上\X0105\S\101-061份\EC06083.X

RP-03-C-01(紀錄表草案(11-2版)-980608)附表二十一(9502修訂)

檢驗報告專用章 電話:(02)77031-5252 新北市中和區中正路738號5樓之4

附表二十一　監測作業環境逐時調查現場記錄

計畫編號：K0105　　計畫期數：01

測站名稱：過港部落　　樣品編號：GC0609%

檢 測 員：鄧皇章　　監測日期：101.6.9~10 1.6.11(假日)

時　間	狀況說明（含氣象條件、特殊音源、振源及背景因素等）
00 ~ 01	
01 ~ 02	
02 ~ 03	
03 ~ 04	
04 ~ 05	鳥叫聲(M)，
05 ~ 06	人車近距離經過(N)
06 ~ 07	
07 ~ 08	
08 ~ 09	
09 ~ 10	
10 ~ 11	
11 ~ 12	
12 ~ 13	鳥叫聲(M)，
13 ~ 14	
14 ~ 15	
15 ~ 16	
16 ~ 17	
17 ~ 18	
18 ~ 19	
19 ~ 20	
20 ~ 21	
21 ~ 22	
22 ~ 23	
23 ~ 24	

備註：

電子資料檔儲存位置：上\K0105\01\101-06\噪\GC0609%X

專用章 電話:(02)7731-3299 新北市中正路738號5樓之4

附　錄　Ⅳ.4

交通流量監測成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附錄Ⅳ.4-1 台2省道與102甲縣道交叉口101年4月非假日交通流量監測結果

日期: 101/4/20～101/4/21

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	13	26	11	58	228.5
1	2	25	18	74	284.0
2	4	13	24	103	372.0
3	2	5	19	149	491.0
4	5	22	11	199	643.5
5	30	33	13	253	833.0
6	102	112	23	189	776.0
7	550	410	51	167	1288.0
8	204	278	26	191	1005.0
9	188	226	29	218	1032.0
10	148	257	18	260	1147.0
11	312	274	15	253	1219.0
12	310	270	12	236	1157.0
13	150	252	24	208	999.0
14	121	305	19	163	892.5
15	159	309	21	155	895.5
16	270	463	46	114	1032.0
17	355	450	34	122	1061.5
18	201	267	13	53	552.5
19	107	222	16	66	505.5
20	88	169	10	92	509.0
21	50	134	11	70	391.0
22	33	75	5	47	242.5
23	17	60	9	45	221.5
TOTAL	3421	4657	478	3485	17778.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新紀工程顧問有限公司環境檢驗室 檢驗報告 專用章 電話:(02)7731-3232 台北市中和區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.4-2 台2省道與102甲縣道交叉口101年4月假日交通流量監測結果

日期: 101/4/21～101/4/22

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	6	57	16	55	257.0
1	6	30	5	76	271.0
2	3	16	18	90	323.5
3	6	13	14	140	464.0
4	9	33	18	198	667.5
5	34	58	16	187	668.0
6	148	143	16	213	888.0
7	410	299	28	160	1040.0
8	157	280	43	178	978.5
9	155	309	45	181	1019.5
10	153	351	36	233	1198.5
11	300	441	39	187	1230.0
12	266	407	23	208	1210.0
13	145	454	29	180	1124.5
14	112	491	25	148	1041.0
15	102	578	24	102	983.0
16	191	603	29	88	1020.5
17	256	534	14	54	852.0
18	117	341	8	57	586.5
19	73	225	14	40	409.5
20	57	170	3	57	375.5
21	52	111	8	42	279.0
22	36	78	10	32	212.0
23	19	70	6	33	190.5
TOTAL	2813	6092	487	2939	17289.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-3 鹽寮海濱公園101年4月非假日交通流量監測結果

日期: 101/4/20～101/4/21

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	5	23	11	51	200.5
1	2	23	10	78	278.0
2	2	14	22	101	362.0
3	2	11	44	121	463.0
4	2	24	32	175	614.0
5	8	24	21	242	796.0
6	67	97	24	186	736.5
7	328	242	24	170	964.0
8	69	203	18	186	831.5
9	49	154	31	221	903.5
10	49	175	25	256	1017.5
11	81	230	16	256	1070.5
12	55	196	14	182	797.5
13	56	162	14	136	626.0
14	54	247	33	166	838.0
15	68	234	21	143	739.0
16	208	312	23	113	801.0
17	166	315	20	121	801.0
18	92	223	12	48	437.0
19	67	169	17	60	416.5
20	43	126	22	82	437.5
21	27	112	13	63	340.5
22	9	68	4	50	230.5
23	9	46	9	46	206.5
TOTAL	1518	3430	480	3253	14908.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新泓工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
台北市中和區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.4-4 鹽寮海濱公園101年4月假日交通流量監測結果

日期: 101/4/21～101/4/22

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	5	38	11	65	257.5
1	3	27	5	76	266.5
2	1	14	9	97	323.5
3	4	15	9	153	494.0
4	4	26	10	197	639.0
5	14	42	7	196	651.0
6	70	103	17	214	814.0
7	202	195	15	167	827.0
8	60	229	31	191	894.0
9	67	249	27	197	927.5
10	79	313	14	256	1148.5
11	96	361	26	166	959.0
12	89	374	20	230	1148.5
13	86	409	24	189	1067.0
14	81	473	22	147	998.5
15	56	504	29	106	908.0
16	118	530	24	92	913.0
17	134	463	10	58	724.0
18	54	294	4	62	515.0
19	39	199	8	46	372.5
20	30	141	3	62	348.0
21	20	90	7	43	243.0
22	13	81	6	35	204.5
23	16	54	3	33	167.0
TOTAL	1341	5224	341	3078	15810.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-5 福隆街上101年4月非假日交通流量監測結果

日期: 101/4/20～101/4/21

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	4	14	14	60	224.0
1	1	28	9	77	277.5
2	5	13	17	100	349.5
3	3	12	21	149	502.5
4	1	20	22	193	643.5
5	5	24	16	243	787.5
6	47	53	22	185	675.5
7	92	161	43	149	740.0
8	54	172	21	186	799.0
9	36	159	20	223	886.0
10	53	172	13	259	1001.5
11	68	196	8	267	1047.0
12	49	164	5	256	966.5
13	50	162	7	203	810.0
14	61	210	12	174	786.5
15	72	230	10	136	694.0
16	72	205	4	140	669.0
17	61	236	16	121	661.5
18	56	167	4	58	377.0
19	32	89	8	63	310.0
20	13	78	3	103	399.5
21	17	72	4	63	277.5
22	10	45	3	52	212.0
23	8	39	6	52	211.0
TOTAL	870	2721	308	3512	14508.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232

附錄Ⅳ.4-6 福隆街上101年4月假日交通流量監測結果

日期: 101/4/21～101/4/22

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	2	32	4	63	230.0
1	2	19	4	80	268.0
2	2	17	7	100	332.0
3	8	14	4	160	506.0
4	3	16	7	203	640.5
5	10	31	15	199	663.0
6	35	74	14	206	737.5
7	65	142	22	153	677.5
8	69	186	15	193	829.5
9	75	217	29	208	936.5
10	63	274	24	255	1118.5
11	57	329	20	189	964.5
12	64	387	18	225	1130.0
13	73	403	15	182	1015.5
14	82	469	13	145	971.0
15	64	506	19	97	867.0
16	73	524	28	87	877.5
17	71	420	16	53	646.5
18	41	259	7	62	479.5
19	34	150	14	49	342.0
20	27	102	2	53	278.5
21	26	60	9	37	202.0
22	19	58	8	39	200.5
23	7	38	2	30	135.5
TOTAL	972	4727	316	3068	15049.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-7 102縣道之新社橋101年4月非假日交通流量監測結果

日期: 101/4/3～101/4/4

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	3	2	0	0	3.5
1	0	3	0	0	3.0
2	1	3	0	1	6.5
3	0	3	0	0	3.0
4	1	5	0	1	8.5
5	4	8	0	1	13.0
6	25	32	3	4	62.5
7	60	61	5	7	122.0
8	29	56	3	3	85.5
9	30	74	3	18	149.0
10	48	65	1	10	121.0
11	35	74	0	12	127.5
12	31	60	1	7	98.5
13	20	76	2	6	108.0
14	27	72	0	4	97.5
15	35	67	2	1	91.5
16	43	61	8	2	104.5
17	34	82	5	1	112.0
18	15	50	0	2	63.5
19	10	38	1	0	45.0
20	6	26	1	0	31.0
21	3	20	0	0	21.5
22	8	22	0	0	26.0
23	3	10	0	0	11.5
TOTAL	471	970	35	80	1551.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-8232
新北市中和區中正路738號3樓之

附錄Ⅳ.4-8 102縣道之新社橋101年4月假日交通流量監測結果

日期: 101/4/4～101/4/5

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	2	4	1	1	10.0
1	2	2	0	0	3.0
2	2	3	0	0	4.0
3	0	1	0	0	1.0
4	3	6	0	1	10.5
5	3	14	2	2	25.5
6	24	39	3	0	57.0
7	47	92	3	3	130.5
8	42	130	2	1	158.0
9	49	143	3	3	182.5
10	56	146	1	1	179.0
11	65	161	2	0	197.5
12	57	151	1	0	181.5
13	74	213	5	2	266.0
14	92	215	1	5	278.0
15	87	215	2	1	265.5
16	84	218	3	1	269.0
17	61	173	6	2	221.5
18	38	91	0	0	110.0
19	24	55	1	0	69.0
20	7	35	1	0	40.5
21	5	15	0	1	20.5
22	9	24	0	0	28.5
23	5	10	0	0	12.5
TOTAL	838	2156	37	24	2721.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-9 過港部落101年4月非假日交通流量監測結果

日期: 101/4/3～101/4/4

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	0	1	0	0	1.0
1	0	1	0	0	1.0
2	1	0	0	0	0.5
3	0	0	0	0	0.0
4	0	0	0	0	0.0
5	0	0	0	0	0.0
6	5	1	0	0	3.5
7	8	2	0	0	6.0
8	5	1	0	0	3.5
9	3	0	0	0	1.5
10	3	5	0	0	6.5
11	1	1	0	0	1.5
12	3	6	0	0	7.5
13	1	6	0	0	6.5
14	1	4	0	0	4.5
15	4	4	0	0	6.0
16	3	2	0	0	3.5
17	3	4	0	0	5.5
18	2	3	0	0	4.0
19	0	1	0	0	1.0
20	1	0	0	0	0.5
21	1	3	0	0	3.5
22	0	0	0	0	0.0
23	0	0	0	0	0.0
TOTAL	45	45	0	0	

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

環境工程顧問有限公司 環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
台北市中和區中正路788號5樓之1

附錄Ⅳ.4-10 過港部落101年4月假日交通流量監測結果

日期: 101/4/4～101/4/5

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	0	0	0	0	0.0
1	0	1	0	0	1.0
2	0	0	0	0	0.0
3	0	0	0	0	0.0
4	0	0	0	0	0.0
5	0	0	0	0	0.0
6	3	1	0	0	2.5
7	5	2	0	0	4.5
8	3	0	0	0	1.5
9	1	4	0	0	4.5
10	6	2	0	0	5.0
11	4	1	0	0	3.0
12	3	5	0	0	6.5
13	2	14	0	0	15.0
14	3	8	0	0	9.5
15	6	12	0	0	15.0
16	9	4	0	0	8.5
17	6	4	0	0	7.0
18	1	2	0	0	2.5
19	3	0	0	0	1.5
20	0	0	0	0	0.0
21	0	0	0	0	0.0
22	2	0	0	0	1.0
23	0	0	0	0	0.0
TOTAL	57	60	0	0	88.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-11 台2省道與102甲縣道交叉口101年5月非假日交通流量監測結果

日期: 101/5/7～101/5/8

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	7	46	10	57	240.5
1	5	21	2	49	174.5
2	8	17	4	87	290.0
3	3	13	10	113	373.5
4	6	24	2	194	613.0
5	32	40	11	199	675.0
6	111	145	24	176	776.5
7	511	415	45	136	1168.5
8	175	273	29	171	931.5
9	174	292	25	182	975.0
10	156	265	14	136	779.0
11	376	388	17	170	1120.0
12	344	373	22	195	1174.0
13	186	381	12	130	888.0
14	145	460	12	93	835.5
15	146	730	31	182	1411.0
16	295	894	43	127	1508.5
17	390	1005	60	107	1641.0
18	204	909	26	78	1297.0
19	152	582	24	71	919.0
20	143	324	32	83	708.5
21	55	172	20	85	494.5
22	25	102	14	51	295.5
23	27	93	14	49	281.5
TOTAL	3676	7964	503	2921	19571.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新亞工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
新北市中和區中正路738號3樓之1

附錄Ⅳ.4-12 台2省道與102甲縣道交叉口101年5月假日交通流量監測結果

日期: 101/5/6～101/5/7

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	21	68	10	25	173.5
1	16	74	3	55	253.0
2	8	51	3	45	196.0
3	5	36	7	78	286.5
4	4	45	6	114	401.0
5	32	87	5	107	434.0
6	77	133	14	141	622.5
7	152	316	35	119	819.0
8	130	481	22	146	1028.0
9	183	618	27	103	1072.5
10	175	819	15	130	1326.5
11	202	996	26	97	1440.0
12	200	1112	18	111	1581.0
13	199	1166	23	61	1494.5
14	211	1275	22	69	1631.5
15	217	1357	21	50	1657.5
16	288	1189	21	28	1459.0
17	251	1139	20	36	1412.5
18	190	1075	16	13	1241.0
19	98	928	14	32	1101.0
20	100	461	5	49	668.0
21	49	220	8	44	392.5
22	53	127	5	32	259.5
23	22	63	4	46	220.0
TOTAL	2883	13836	350	1731	21170.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-13 鹽寮海濱公園101年5月非假日交通流量監測結果

日期: 101/5/7～101/5/8

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	8	32	7	53	209.0
1	2	17	3	51	177.0
2	6	9	4	86	278.0
3	2	12	9	106	349.0
4	0	20	11	182	588.0
5	9	34	25	189	655.5
6	73	94	32	162	680.5
7	293	242	21	127	811.5
8	76	190	26	175	805.0
9	48	240	22	172	824.0
10	59	214	17	136	685.5
11	106	306	24	164	899.0
12	118	280	24	174	909.0
13	105	333	9	130	793.5
14	69	414	15	188	1042.5
15	93	661	35	191	1350.5
16	209	838	36	133	1413.5
17	204	967	43	112	1491.0
18	113	840	25	80	1186.5
19	74	552	21	73	850.0
20	78	292	27	85	640.0
21	33	168	13	87	471.5
22	15	113	16	50	302.5
23	15	90	11	51	272.5
TOTAL	1808	6958	476	2957	17685.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

檢驗報告 專用章 電話:(02)7731-3232

附錄Ⅳ.4-14 鹽寮海濱公園101年5月假日交通流量監測結果

日期: 101/5/6～101/5/7

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	16	57	7	30	169.0
1	8	49	5	51	216.0
2	6	43	15	36	184.0
3	3	36	14	75	290.5
4	4	34	12	99	357.0
5	22	69	16	102	418.0
6	52	112	9	127	537.0
7	107	266	32	118	737.5
8	101	444	20	149	981.5
9	111	599	32	103	1027.5
10	128	766	17	129	1251.0
11	134	952	28	98	1369.0
12	156	1015	15	115	1468.0
13	165	1103	22	63	1418.5
14	180	1239	19	67	1568.0
15	184	1317	21	45	1586.0
16	258	1194	19	28	1445.0
17	216	1117	18	34	1363.0
18	141	1096	13	14	1234.5
19	61	915	13	33	1070.5
20	50	305	8	44	478.0
21	31	197	12	34	338.5
22	29	131	3	34	253.5
23	13	53	4	47	208.5
TOTAL	2176	13109	374	1675	19970.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-15 福隆街上101年5月非假日交通流量監測結果

日期: 101/5/7～101/5/8

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	4	21	11	53	204.0
1	9	14	3	47	165.5
2	4	9	3	90	287.0
3	0	6	9	114	366.0
4	0	9	10	185	584.0
5	9	32	8	195	637.5
6	41	71	11	184	665.5
7	160	269	29	313	1346.0
8	40	155	15	173	724.0
9	80	190	10	151	703.0
10	70	236	17	170	815.0
11	69	266	15	155	795.5
12	74	336	9	140	811.0
13	68	390	8	193	1019.0
14	91	557	16	183	1183.5
15	89	567	14	188	1203.5
16	96	781	38	125	1280.0
17	91	835	36	106	1270.5
18	66	731	26	80	1056.0
19	30	522	14	73	784.0
20	20	221	16	93	542.0
21	16	122	17	81	407.0
22	22	101	17	55	311.0
23	9	71	8	50	241.5
TOTAL	1158	6512	360	3197	17402.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車



附錄Ⅳ.4-16 福隆街上101年5月假日交通流量監測結果

日期: 101/5/6～101/5/7

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	13	49	8	32	167.5
1	8	26	2	53	193.0
2	9	63	5	49	224.5
3	2	39	7	80	294.0
4	1	38	6	116	398.5
5	13	61	7	113	420.5
6	38	85	7	128	502.0
7	66	170	30	118	617.0
8	72	311	15	148	821.0
9	92	457	14	101	834.0
10	148	678	17	137	1197.0
11	150	855	13	92	1232.0
12	204	862	20	94	1286.0
13	228	1028	15	59	1349.0
14	214	1103	12	54	1396.0
15	181	1237	17	57	1532.5
16	196	991	10	29	1196.0
17	151	1040	14	39	1260.5
18	127	1008	10	13	1130.5
19	53	767	10	31	906.5
20	55	209	5	46	384.5
21	26	180	6	38	319.0
22	16	115	3	35	234.0
23	8	39	6	47	196.0
TOTAL	2071	11411	259	1709	18091.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-17 102縣道之新社橋101年5月非假日交通流量監測結果

日期: 101/5/11～101/5/12

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	1	4	1	0	6.5
1	0	3	0	0	3.0
2	0	6	0	1	9.0
3	0	0	0	0	0.0
4	0	3	0	1	6.0
5	1	12	1	0	14.5
6	15	22	3	0	35.5
7	49	51	7	1	92.5
8	21	47	3	1	66.5
9	20	36	2	1	53.0
10	33	80	10	2	122.5
11	27	69	0	1	85.5
12	11	50	0	1	58.5
13	28	47	2	5	80.0
14	26	71	1	7	107.0
15	29	64	1	5	95.5
16	44	84	5	1	119.0
17	50	79	7	6	136.0
18	13	45	2	2	61.5
19	13	38	0	0	44.5
20	13	32	1	0	40.5
21	3	20	0	0	21.5
22	4	21	0	0	23.0
23	5	16	0	2	24.5
TOTAL	406	900	46	37	1306.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新光工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
臺北市中和區中正路738號5樓之4

附錄Ⅳ.4-18 102縣道之新社橋101年5月假日交通流量監測結果

日期: 101/5/12～101/5/13

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	3	5	0	2	12.5
1	0	6	1	1	11.0
2	2	3	0	0	4.0
3	4	4	0	0	6.0
4	0	1	2	1	8.0
5	8	12	0	1	19.0
6	13	33	1	0	41.5
7	24	59	3	6	95.0
8	22	86	2	5	116.0
9	57	109	7	12	187.5
10	56	168	0	9	223.0
11	54	171	2	5	217.0
12	46	227	5	4	272.0
13	45	207	2	2	239.5
14	44	188	3	1	219.0
15	51	237	2	2	272.5
16	74	209	4	1	257.0
17	43	144	2	0	169.5
18	17	100	0	1	111.5
19	13	44	0	0	50.5
20	4	55	1	0	59.0
21	2	17	0	0	18.0
22	2	19	0	0	20.0
23	4	7	0	0	9.0
TOTAL	588	2111	37	53	2638.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-19 過港部落101年5月非假日交通流量監測結果

日期: 101/5/11～101/5/12

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	0	0	0	0	0.0
1	0	0	0	0	0.0
2	0	0	0	0	0.0
3	1	0	0	0	0.5
4	0	0	0	0	0.0
5	0	0	0	0	0.0
6	0	1	0	0	1.0
7	3	4	0	0	5.5
8	1	1	0	0	1.5
9	5	4	0	0	6.5
10	2	0	0	0	1.0
11	2	7	0	0	8.0
12	4	2	0	0	4.0
13	1	2	0	0	2.5
14	1	12	0	0	12.5
15	3	1	0	0	2.5
16	3	3	0	0	4.5
17	5	0	0	0	2.5
18	2	2	0	0	3.0
19	1	1	0	0	1.5
20	1	1	0	0	1.5
21	0	1	0	0	1.0
22	0	0	0	0	0.0
23	0	0	0	0	0.0
TOTAL	35	42	0	0	59.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新光工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
台北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.4-20 過港部落101年5月假日交通流量監測結果

日期: 101/5/12～101/5/13

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	0	0	0	0	0.0
1	0	0	0	0	0.0
2	1	0	0	0	0.5
3	0	0	0	0	0.0
4	0	0	0	0	0.0
5	0	0	0	0	0.0
6	2	2	0	0	3.0
7	0	1	0	0	1.0
8	0	4	0	0	4.0
9	0	3	0	0	3.0
10	2	3	0	0	4.0
11	2	5	0	0	6.0
12	2	3	0	0	4.0
13	2	4	0	0	5.0
14	2	1	0	0	2.0
15	0	6	0	0	6.0
16	7	5	0	0	8.5
17	5	4	0	0	6.5
18	0	0	0	0	0.0
19	0	2	0	0	2.0
20	0	0	0	0	0.0
21	3	2	0	0	3.5
22	1	0	0	0	0.5
23	0	1	0	0	1.0
TOTAL	29	46	0	0	60.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-21 台2省道與102甲縣道交叉口101年6月非假日交通流量監測結果

日期: 101/6/25～101/6/26

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	15	37	11	47	207.5
1	13	17	1	89	292.5
2	7	12	12	83	288.5
3	6	10	7	128	411.0
4	10	24	4	160	517.0
5	49	47	15	212	737.5
6	115	127	18	167	721.5
7	589	447	62	150	1315.5
8	192	246	33	155	873.0
9	199	272	21	196	1001.5
10	163	330	21	274	1275.5
11	352	372	23	185	1149.0
12	327	352	25	191	1138.5
13	211	408	22	185	1112.5
14	146	411	20	159	1001.0
15	172	407	23	153	998.0
16	336	482	54	132	1154.0
17	428	505	28	143	1204.0
18	176	303	15	80	661.0
19	144	175	9	65	460.0
20	157	188	14	87	555.5
21	89	109	13	83	428.5
22	44	74	5	52	262.0
23	29	46	13	53	245.5
TOTAL	3969	5401	469	3229	18010.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232

附錄Ⅳ.4-22 台2省道與102甲縣道交叉口101年6月假日交通流量監測結果

日期: 101/6/24～101/6/25

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	23	62	9	14	133.5
1	23	36	4	16	103.5
2	8	25	4	30	127.0
3	7	39	2	69	253.5
4	14	51	2	80	302.0
5	57	93	11	76	371.5
6	83	133	13	87	461.5
7	121	245	13	82	577.5
8	117	380	18	109	801.5
9	113	573	20	75	894.5
10	157	734	20	104	1164.5
11	148	876	13	87	1237.0
12	125	1060	19	74	1382.5
13	153	999	19	44	1245.5
14	165	632	14	53	901.5
15	158	1330	20	50	1599.0
16	159	1187	22	50	1460.5
17	162	1078	12	43	1312.0
18	123	1014	14	25	1178.5
19	100	765	12	34	941.0
20	86	309	5	38	476.0
21	61	207	7	40	371.5
22	28	126	5	39	267.0
23	22	76	4	33	194.0
TOTAL	2213	12030	282	1352	17756.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-23 鹽寮海濱公園101年6月非假日交通流量監測結果

日期: 101/6/25～101/6/26

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	23	33	12	40	188.5
1	4	15	15	78	281.0
2	10	8	32	63	266.0
3	6	10	30	100	373.0
4	9	13	40	126	475.5
5	30	37	49	173	669.0
6	75	83	47	149	661.5
7	302	249	31	133	861.0
8	90	179	37	140	718.0
9	76	206	27	200	898.0
10	67	266	24	264	1139.5
11	103	319	18	200	1006.5
12	77	205	18	136	687.5
13	110	371	15	182	1002.0
14	89	387	24	155	944.5
15	101	366	22	143	889.5
16	204	356	28	131	907.0
17	189	387	26	139	950.5
18	106	241	9	72	528.0
19	88	158	11	65	419.0
20	79	153	10	82	458.5
21	49	95	15	84	401.5
22	23	67	7	49	239.5
23	18	37	11	57	239.0
TOTAL	1928	4241	558	2961	15204.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

檢驗報告 專用章 電話:(02)7731-3232

附錄Ⅳ.4-24 鹽寮海濱公園101年6月假日交通流量監測結果

日期: 101/6/24～101/6/25

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	16	59	5	19	134.0
1	6	38	4	16	97.0
2	7	17	4	30	118.5
3	6	36	4	71	260.0
4	9	36	6	87	313.5
5	27	70	11	84	357.5
6	58	106	17	80	409.0
7	76	181	20	92	535.0
8	78	314	20	106	711.0
9	77	504	25	77	823.5
10	110	715	17	108	1128.0
11	109	817	19	85	1164.5
12	97	1013	21	74	1325.5
13	128	1020	23	44	1262.0
14	150	1166	17	52	1431.0
15	153	1319	31	51	1610.5
16	122	1138	20	51	1392.0
17	129	1076	24	41	1311.5
18	86	1152	16	20	1287.0
19	87	748	12	30	905.5
20	50	290	16	32	443.0
21	28	191	11	39	344.0
22	25	117	9	35	252.5
23	16	81	6	33	200.0
TOTAL	1650	12204	358	1357	17816.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-25 福隆街上101年6月非假日交通流量監測結果

日期: 101/6/25～101/6/26

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	9	14	10	33	137.5
1	3	10	0	89	278.5
2	7	3	5	87	277.5
3	3	6	4	124	387.5
4	10	15	8	160	516.0
5	16	42	30	204	722.0
6	41	61	21	150	573.5
7	105	166	19	143	685.5
8	52	124	22	139	611.0
9	79	142	21	198	817.5
10	54	178	23	246	989.0
11	67	231	22	192	884.5
12	72	228	34	171	845.0
13	74	279	21	163	847.0
14	72	289	23	135	776.0
15	80	305	26	131	790.0
16	110	270	20	118	719.0
17	85	264	29	113	703.5
18	84	160	9	84	472.0
19	63	100	7	67	346.5
20	35	81	4	81	349.5
21	25	65	4	82	331.5
22	21	40	8	51	219.5
23	9	29	12	55	222.5
TOTAL	1176	3102	382	3016	13502.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新紀工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
新北市中和區中正路738號5樓之2

附錄Ⅳ.4-26 福隆街上101年6月假日交通流量監測結果

日期: 101/6/24～101/6/25

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	11	33	7	18	106.5
1	7	36	3	15	90.5
2	2	15	4	36	132.0
3	0	25	6	72	253.0
4	9	25	16	72	277.5
5	20	44	21	75	321.0
6	38	78	10	77	348.0
7	81	153	14	95	506.5
8	53	202	12	98	546.5
9	92	384	14	79	695.0
10	131	666	14	106	1077.5
11	145	841	14	86	1199.5
12	139	946	20	77	1286.5
13	247	1032	14	47	1324.5
14	165	1161	19	47	1422.5
15	150	1227	18	49	1485.0
16	141	1170	21	54	1444.5
17	147	1026	16	44	1263.5
18	114	1071	8	22	1210.0
19	64	560	8	32	704.0
20	42	203	5	32	330.0
21	25	168	7	35	299.5
22	22	98	4	41	240.0
23	24	51	5	37	184.0
TOTAL	1869	11215	280	1346	16747.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-27 102縣道之新社橋101年6月非假日交通流量監測結果

日期: 101/6/8～101/6/9

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	10	5	1	0	12.0
1	1	1	0	0	1.5
2	1	2	0	0	2.5
3	0	3	1	0	5.0
4	0	2	0	0	2.0
5	5	8	0	2	16.5
6	26	27	3	3	55.0
7	55	64	5	8	125.5
8	40	61	1	21	146.0
9	45	51	5	19	140.5
10	50	90	2	0	119.0
11	45	70	1	2	100.5
12	32	71	4	6	113.0
13	37	77	5	2	111.5
14	45	75	2	5	116.5
15	42	99	1	1	125.0
16	55	106	5	2	149.5
17	40	80	6	3	121.0
18	33	48	2	2	74.5
19	18	36	0	0	45.0
20	19	28	0	0	37.5
21	15	16	2	0	27.5
22	6	14	0	0	17.0
23	6	16	0	0	19.0
TOTAL	626	1050	46	76	1683.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新紀工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
台北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.4-28 102縣道之新社橋101年6月假日交通流量監測結果

日期: 101/6/9～101/6/10

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	5	6	3	0	14.5
1	0	23	0	0	23.0
2	1	13	0	0	13.5
3	3	3	0	0	4.5
4	1	2	1	0	4.5
5	8	6	0	3	19.0
6	33	30	1	2	54.5
7	41	49	4	2	83.5
8	32	79	4	5	118.0
9	64	89	3	0	127.0
10	65	125	1	4	171.5
11	108	195	1	4	263.0
12	129	191	3	2	267.5
13	55	240	4	2	281.5
14	94	242	4	3	306.0
15	68	276	2	1	317.0
16	64	215	3	0	253.0
17	53	216	3	0	248.5
18	22	114	3	0	131.0
19	15	56	0	0	63.5
20	9	47	1	0	53.5
21	11	25	0	0	30.5
22	1	20	0	0	20.5
23	2	14	0	0	15.0
TOTAL	884	2276	41	28	2884.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-29 過港部落101年6月非假日交通流量監測結果

日期: 101/6/8～101/6/9

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	0	0	0	0	0.0
1	4	0	0	0	2.0
2	0	0	0	0	0.0
3	0	0	0	0	0.0
4	0	0	0	0	0.0
5	1	0	0	0	0.5
6	8	1	0	0	5.0
7	5	0	0	0	2.5
8	2	0	0	0	1.0
9	3	0	0	0	1.5
10	2	2	0	0	3.0
11	6	2	0	0	5.0
12	9	10	0	0	14.5
13	5	3	0	0	5.5
14	2	6	0	0	7.0
15	2	5	0	0	6.0
16	6	2	0	0	5.0
17	7	12	0	0	15.5
18	1	2	0	0	2.5
19	5	2	0	0	4.5
20	11	6	0	0	11.5
21	7	2	0	0	5.5
22	2	1	0	0	2.0
23	4	2	0	0	4.0
TOTAL	92	58	0	0	104.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新竹工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
臺北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.4-30 過港部落101年6月假日交通流量監測結果

日期: 101/6/9～101/6/10

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	0	0	0	0	0.0
1	2	0	0	0	1.0
2	0	5	0	0	5.0
3	2	4	0	0	5.0
4	0	0	0	0	0.0
5	1	1	0	0	1.5
6	3	4	0	0	5.5
7	8	1	0	0	5.0
8	1	3	0	0	3.5
9	8	2	0	0	6.0
10	3	3	0	0	4.5
11	9	2	0	0	6.5
12	7	9	0	0	12.5
13	5	6	0	0	8.5
14	3	3	0	0	4.5
15	4	6	0	0	8.0
16	11	8	0	0	13.5
17	12	6	0	0	12.0
18	0	7	0	0	7.0
19	3	4	0	0	5.5
20	1	0	0	0	0.5
21	1	0	0	0	0.5
22	0	2	0	0	2.0
23	0	2	0	0	2.0
TOTAL	84	78	0	0	120.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-31 核四門口101年4月非假日交通流量監測結果

日期: 101/4/20～101/4/21

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	2	7	1	0	10.0
1	0	2	0	0	2.0
2	1	0	0	0	0.5
3	0	4	0	0	4.0
4	1	3	0	0	3.5
5	9	0	0	0	4.5
6	71	16	1	1	56.5
7	830	237	32	1	719.0
8	212	141	4	5	270.0
9	120	108	1	2	176.0
10	116	105	5	3	182.0
11	422	173	1	3	395.0
12	411	110	1	2	323.5
13	229	117	1	1	236.5
14	150	117	0	2	198.0
15	163	123	2	2	214.5
16	503	285	43	0	622.5
17	399	139	3	0	344.5
18	116	35	2	0	97.0
19	20	20	2	0	34.0
20	54	31	2	0	62.0
21	5	11	2	0	17.5
22	2	2	0	0	3.0
23	5	7	1	0	11.5
TOTAL	3841	1793	104	22	3987.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

核工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
新北市中和區中正路738號5樓之

附錄Ⅳ.4-32 核四門口101年4月假日交通流量監測結果

日期: 101/4/21～101/4/22

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	4	4	1	0	8.0
1	0	0	0	0	0.0
2	2	0	0	0	1.0
3	0	1	0	0	1.0
4	0	4	0	0	4.0
5	6	0	0	0	3.0
6	56	8	1	0	38.0
7	449	130	6	0	366.5
8	141	70	1	0	142.5
9	83	38	0	0	79.5
10	90	47	0	0	92.0
11	277	72	1	0	212.5
12	288	49	0	0	193.0
13	108	38	0	0	92.0
14	68	25	1	4	73.0
15	84	56	2	0	102.0
16	256	126	7	0	268.0
17	197	55	1	0	155.5
18	47	7	0	0	30.5
19	9	0	0	0	4.5
20	5	4	0	0	6.5
21	0	1	0	0	1.0
22	2	6	2	0	11.0
23	4	6	1	0	10.0
TOTAL	2176	747	24	4	1895.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-33 核四門口101年5月非假日交通流量監測結果

日期: 101/5/7～101/5/8

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	4	7	5	0	19.0
1	1	1	0	0	1.5
2	0	0	0	0	0.0
3	5	3	4	0	13.5
4	0	1	0	0	1.0
5	7	0	0	0	3.5
6	76	10	1	0	50.0
7	769	230	35	1	687.5
8	223	155	6	4	290.5
9	169	121	4	7	234.5
10	140	103	0	6	191.0
11	434	157	0	2	380.0
12	416	93	2	1	308.0
13	315	108	2	6	287.5
14	117	118	1	7	199.5
15	130	117	2	4	198.0
16	450	218	38	3	528.0
17	479	169	1	2	416.5
18	131	48	0	0	113.5
19	40	25	6	0	57.0
20	94	63	2	0	114.0
21	10	21	2	0	30.0
22	1	8	0	0	8.5
23	2	6	1	0	9.0
TOTAL	4013	1782	112	43	4141.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

新紀工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
臺北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.4-34 核四門口101年5月假日交通流量監測結果

日期: 101/5/6～101/5/7

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	7	6	0	0	9.5
1	0	2	0	0	2.0
2	0	2	0	0	2.0
3	0	2	0	0	2.0
4	0	3	0	0	3.0
5	5	6	0	0	8.5
6	39	8	6	0	39.5
7	90	41	16	0	118.0
8	30	21	4	0	44.0
9	25	23	4	0	43.5
10	24	26	0	0	38.0
11	47	21	0	0	44.5
12	51	17	6	0	54.5
13	30	27	7	0	56.0
14	17	11	0	0	19.5
15	23	8	1	0	21.5
16	59	23	3	0	58.5
17	43	20	0	0	41.5
18	45	5	0	0	27.5
19	0	4	0	0	4.0
20	0	1	0	0	1.0
21	7	1	0	0	4.5
22	4	3	0	0	5.0
23	4	5	1	0	9.0
TOTAL	550	286	48	0	657.0

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附錄Ⅳ.4-35 核四門口101年6月非假日交通流量監測結果

日期: 101/6/25～101/6/26

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	6	10	4	0	21.0
1	0	1	0	0	1.0
2	1	0	1	0	2.5
3	10	2	5	0	17.0
4	1	3	0	0	3.5
5	11	1	0	0	6.5
6	60	13	4	0	51.0
7	748	219	38	0	669.0
8	203	124	4	10	263.5
9	163	99	0	6	198.5
10	134	87	1	11	189.0
11	399	137	0	4	348.5
12	389	68	1	1	267.5
13	279	105	3	6	268.5
14	143	95	0	7	187.5
15	142	105	3	5	197.0
16	454	178	37	1	482.0
17	380	125	1	0	317.0
18	98	32	2	0	85.0
19	29	29	2	0	47.5
20	69	55	2	0	93.5
21	31	3	2	0	22.5
22	8	3	0	0	7.0
23	3	4	0	0	5.5
TOTAL	3761	1498	110	51	3751.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

核工工程顧問有限公司環境檢驗室
檢驗報告
專用章
電話:(02)7731-3232
台北市中和區中正路738號5樓之1

附錄Ⅳ.4-36 核四門口101年6月假日交通流量監測結果

日期: 101/6/24～101/6/25

時　間	機　車	小型車	大型車	特種車	PCU/H
0	2	1	1	0	4.0
1	1	0	0	0	0.5
2	0	0	0	0	0.0
3	0	1	0	0	1.0
4	1	1	0	0	1.5
5	6	0	0	0	3.0
6	30	1	0	0	16.0
7	51	17	1	0	44.5
8	31	14	0	0	29.5
9	6	10	0	0	13.0
10	15	8	0	0	15.5
11	30	15	0	0	30.0
12	28	6	0	0	20.0
13	19	17	0	0	26.5
14	14	1	1	0	10.0
15	5	9	0	0	11.5
16	25	11	1	0	25.5
17	23	6	0	0	17.5
18	41	4	0	0	24.5
19	6	1	0	0	4.0
20	2	3	0	0	4.0
21	0	7	0	0	7.0
22	1	2	0	0	2.5
23	6	4	0	0	7.0
TOTAL	343	139	4	0	318.5

註:PCU/H=0.5*機車+1.0*小型車+2*大型車+3*特種車

附　錄　Ⅳ.5

河川水質與廠區水質監測成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-1　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120405CD8

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

樣品基質：河川水

樣品編號：PW4020201~07、20301

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：河川部分

採樣時間：101年04月12日12時00分

至：101年04月12日14時40分

收樣時間：101年04月12日17時13分

報告日期：101年05月03日

報告編號：PW/2012/40202A

聯絡人：周家薇

電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
7.報告編號PW/2012/40202A取代原本PW/2012/40202。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀[illegible]

檢驗室主管：實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956894

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-2　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW4020201~07、20301

認證	序號	樣品編號		MDL	單位	PW4020201	PW4020202	PW4020203	PW4020204	PW4020205	PW4020206	PW4020207	PW4020301	-	-
		檢驗項目	檢驗方法			上游水文站(石碇溪)(314994;2772587)	石碇溪廢棄(石碇溪)(342392;2772007)	支流時保上游(沼澤區)(342659;2771965)	溫底二號橋舊水壩上游(石碇溪)(343174;2771427)	溫底二號橋(石碇溪)(343188;2771449)	貪客國小(雙溪)(342372;2768331)	新社大橋(雙溪)(342978;2769023)	運送空白	-	-
*	1	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	7.514	7.245	7.014	7.382	7.627	7.622	7.286	-	-	-
*	2	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	111	116	164	656	326	122	2690	-	-	-
*	3	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	7.7	7.8	6.3	7.6	7.7	7.8	7.5	-	-	-
*	4	懸浮固體(備註2.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	3.8	3.1	6.0	4.4	6.5	4.0	3.6	-	-	-
*	5	硝酸鹽氮	NIEA W436.50C	0.01	mg/L	1.14	1.16	0.22	1.17	1.43	0.52	0.47	-	-	-
*	6	正磷酸鹽(備註3.)	NIEA W427.53B	0.006	mg/L	0.353	0.236	1.08	0.571	0.653	0.034	0.037	-	-	-
*	7	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	1.3×10^3	9.0×10^2	1.0×10^4	1.3×10^4	3.5×10^3	1.3×10^2	25	<10	-	-
*	8	生化需氧量(備註4.)	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	3.6	1.6	<1.0	<1.0	1.2	-	-	-
*	9	化學需氧量	NIEA W517.52B	2.9	mg/L	8.5	6.3	14.3	11.1	7.1	6.5	10.9	-	-	-
*	10	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-
*	11	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	0.16	0.07	0.96	0.84	0.76	<0.05(0.03)	0.08	-	-	-
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.005	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.050(0.008)	-	-	-
*	13	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	0.366	0.398	2.28	0.693	0.657	0.202	0.298	-	-	-
*	14	鋅	NIEA W311.52C	0.015	mg/L	<0.050(0.024)	ND	<0.050(0.016)	<0.050(0.029)	<0.050(0.016)	<0.050(0.023)	<0.050(0.020)	-	-	-
*	15	鎘	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	<0.003(0.001)	ND	-	-	-
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	<0.050(0.003)	ND	ND	ND	<0.050(0.003)	<0.050(0.003)	<0.050(0.003)	-	-	-
*	17	總鉻	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	<0.050(0.004)	<0.050(0.006)	<0.050(0.004)	<0.050(0.006)	<0.050(0.008)	ND	<0.050(0.010)	-	-	-
*	18	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	12:00	12:30	12:50	13:20	13:40	14:10	14:30	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	-
		以下空白													

備註
1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
2.PW4020201~02,04,06~07懸浮固體樣品以全量過濾分析。
3.此數據是以正磷酸鹽中的磷經係數換算爲三價磷酸根。
4.樣品添加硝化抑制劑之使用量PW4020201：0.0031g/0.0030g/0.0029g；02：0.0028g/0.0031g/0.0029g；04：0.0031g/0.0030g/0.0028g；05：0.0029g/0.0031g/0.0030g

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956895

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-3　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120427AF4

委託單位：	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	採樣時間：	101年05月23日11時30分
		至：	101年05月23日13時40分
計畫名稱：	核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	收樣時間：	101年05月23日16時04分
樣品基質：	河川水	報告日期：	101年05月31日
樣品編號：	PW5006801~07、6901	報告編號：	PW/2012/50068
採樣單位：	台灣檢驗科技股份有限公司	聯絡人：	周家薇
採樣地點：	河川部分	電話/傳真：	02-2299-3279ext2306 / 02-2299-32616

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：實驗室主任郭淑清

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6958837

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-4　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW5006801~07、6901

認證	序號	樣品編號		MDL	單位	PW5006801	PW5006802	PW5006803	PW5006804	PW5006805	PW5006806	PW5006807	PW5006901	-	-
		檢驗項目	檢驗方法			上游水文站(石碇溪)(314994;2772587)	石碇溪廠界(石碇溪)(342392;2772007)	支流頭寮上游(溜灣區)(342659;2771965)	溝底二號橋頭水環上游(石碇溪)(343174;2771427)	溝底二號橋(石碇溪)(343188;2771449)	育富國小(雙溪)(342372;2768331)	新社大橋(雙溪)(342978;2769023)	運送空白	-	-
*	1	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	7.499	7.291	6.988	7.366	7.451	7.925	7.451	-	-	-
*	2	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	93	96	178	204	208	96	107	-	-	-
*	3	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	8.0	8.6	4.8	8.3	8.3	8.3	8.2	-	-	-
*	4	懸浮固體(備註2.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	4.0	3.6	6.9	2.6	2.4	3.8	18.4	-	-	-
*	5	硝酸態氮	NIEA W436.50C	0.01	mg/L	0.42	0.55	<0.05(0.04)	0.54	0.55	0.35	0.38	-	-	-
*	6	正磷酸鹽(備註3.)	NIEA W427.53B	0.006	mg/L	0.101	0.086	1.00	0.209	0.190	0.034	0.071	-	-	-
*	7	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	2.8E+02	2.7E+03	8.8E+04	5.3E+04	3.3E+04	3.8E+02	2.4E+03	<10	-	-
*	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	3.3	<1.0	6.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-
*	9	化學需氧量	NIEA W517.52B	2.9	mg/L	4.4	3.3	13.3	3.9	4.0	3.1	ND	-	-	-
*	10	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-
*	11	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	<0.05(0.03)	<0.05(0.03)	1.36	0.25	0.25	ND	ND	-	-	-
*	12	錳	NIEA W311.52C	0.005	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	13	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	0.294	0.433	3.45	0.540	0.546	0.298	0.900	-	-	-
*	14	鋅	NIEA W311.52C	0.015	mg/L	<0.050(0.028)	ND	<0.050(0.025)	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	15	鎘	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	17	總鉻	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	18	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	11:30	11:50	12:10	12:30	12:50	13:10	13:30	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	-
		以下空白													

備註
1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
2.PW5006801~02,04~06懸浮固體樣品以全量過濾分析。
3.此數據是以正磷酸鹽中的磷經保數換算爲三價磷酸根。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即爲1.5×10^{2}。

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6958838

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-5　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120528BH2

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

樣品基質：河川水

樣品編號：PW6000901~07、1001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：河川部分

採樣時間：101年06月05日11時10分

至：101年06月05日13時40分

收樣時間：101年06月05日16時37分

報告日期：101年06月13日

報告編號：PW/2012/60009

聯絡人：周家薇

電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚覲成

檢驗室主管：

實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959538

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-6　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW6000901~07、1001

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW6000901 上游水文站(石碇溪)(314994;2772587)	PW6000902 石碇溪與界(石碇溪)(342392;2772007)	PW6000903 支流暗渠上游(沼澤區)(342659;2771965)	PW6000904 溫泉二號橋橋墩上游(石碇溪)(343174;2771427)	PW6000905 溫泉二號橋(石碇溪)(343188;2771449)	PW6000906 資客國小(雙溪)(342372;2768331)	PW6000907 新社大橋(雙溪)(342978;2769023)	PW6001001 運送空白	-	-
*	1	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	7.497	7.092	6.942	7.395	7.499	7.659	7.635	-	-	-
*	2	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	84	89	154	200	190	79	80	-	-	-
*	3	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	7.4	8.1	6.2	7.9	7.2	8.6	8.1	-	-	-
*	4	懸浮固體	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	2.8	4.0	19.1	4.9	4.6	8.2	5.4	-	-	-
*	5	硝酸鹽氮	NIEA W436.50C	0.01	mg/L	0.46	0.51	0.14	0.57	0.61	0.43	0.46	-	-	-
*	6	正磷酸鹽(備註2.)	NIEA W427.53B	0.006	mg/L	0.092	0.089	0.794	0.202	0.196	0.052	0.034	-	-	-
*	7	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	2.6E+03	2.9E+03	2.2E+04	2.8E+03	4.4E+03	2.7E+03	5.8E+02	<10	-	-
*	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	2.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-
*	9	化學需氧量	NIEA W517.52B	2.9	mg/L	ND	ND	13.2	4.5	ND	ND	ND	-	-	-
*	10	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-
*	11	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	<0.05(0.02)	<0.05(0.03)	0.75	0.12	0.14	<0.05(0.02)	ND	-	-	-
*	12	鎳	NIEA W311.52C	0.005	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	13	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	0.298	0.445	3.12	0.643	0.608	0.546	0.418	-	-	-
*	14	鋅	NIEA W311.52C	0.015	mg/L	ND	ND	<0.050(0.018)	ND	ND	<0.050(0.016)	ND	-	-	-
*	15	錫	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	16	銅	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	17	總鉻	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
*	18	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	-
-	-	-	-	採樣日期：		6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	-	-
-	-	-	-	採樣時間：		11:10	11:35	11:55	12:20	12:40	13:10	13:30	-	-	-
-	-	-	-	天氣：		陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	-	-
		以下空白													

備註
1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
2.此數據是以正磷酸鹽中的磷經係數換算爲三價磷酸根。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即爲1.5×10^{2}。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959539

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-7　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120329AC2

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

樣品基質：河川水

樣品編號：PW4003901~03、4001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：河口部分

採樣時間：101年04月03日11時10分

至：101年04月03日12時00分

收樣時間：101年04月03日16時25分

報告日期：101年05月03日

報告編號：PW/2012/40039A

聯絡人：張箐芸

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示＂＊＂者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以＂ND＂表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以＂<檢測報告最低位數單位值＂表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
7.報告編號PW/2012/40039A取代原本PW/2012/40039。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚勃

檢驗室主管：

實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6956888
SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 | t (886-2) 2299-3939 | f (886-2) 2299-3230 | www.tw.sgs.com
Member of SGS Group
1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-8　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW4003901~03、4001

認證	序號	樣品編號		MDL	單位	PW4003901	PW4003902	PW4003903	PW4004001	-	-	-	-	-	-
		檢驗項目	檢驗方法			石碇溪河口 (343652;2771567)	雙溪河口 (345269;2768235)	雙溪溪河口 (343364;2770589)	運送空白	-	-	-	-	-	-
	1	鹽度	NIEA W447.20C	-	psu	21.9	6.9	0.3	-	-	-	-	-	-	-
*	2	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	3.0×10^3	8.1×10^2	2.3×10^3	<10	-	-	-	-	-	-
*	3	生化需氧量(備註1.)	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	2.6	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體(備註2.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	3.8	5.6	4.4	-	-	-	-	-	-	-
	5	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	2.8	4.0	3.4	-	-	-	-	-	-	-
*	6	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	7.1	8.6	9.0	-	-	-	-	-	-	-
*	7	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.069	0.020	0.020	-	-	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	11:10	11:30	11:50	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註：1.樣品添加硝化抑制劑之使用量PW4003901：0.0032g/0.0030g/0.0028g。
2.PW4003901,03懸浮固體樣品以全量過濾分析。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6956889
SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 | t (886-2) 2299-3939 | f (886-2) 2299-3230 | www.tw.sgs.com
Member of SGS Group
1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.5-9　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120427AH3

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：河川水
樣品編號：PW5006301~03、6401
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：河口部分

採樣時間：101年05月03日11時00分
至：101年05月03日11時50分
收樣時間：101年05月03日16時40分
報告日期：101年05月11日
報告編號：PW/2012/50063
聯絡人：張箐芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象而受嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚觀成
檢驗室主管：

實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-10　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW5006301~03、6401

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW5006301 石碇溪河口 (343652;2771567)	PW5006302 螢溪河口 (345269;2768235)	PW5006303 雙溪溪河口 (343364;2770589)	PW5006401 運送空白	-	-	-	-	-	-
	1	鹽度	NIEA W447.20C	-	psu	3.2	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-
*	2	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	4.1×10^3	3.2×10^4	9.8×10^4	<10	-	-	-	-	-	-
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.2	<1.0	1.7	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體(備註1.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	8.2	17.6	4.6	-	-	-	-	-	-	-
	5	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	7.4	16	3.8	-	-	-	-	-	-	-
*	6	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	7.3	7.2	6.4	-	-	-	-	-	-	-
*	7	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.080	0.060	0.030	-	-	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	11:00	11:20	11:40	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註：1.PW5006303懸浮固體樣品以全量過濾分析。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-11　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120528BH5

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：河川水
樣品編號：PW6000401~03、00501
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：河口部分

採樣時間：101年06月04日12時45分
至：101年06月04日13時35分
收樣時間：101年06月04日17時23分
報告日期：101年06月13日
報告編號：PW/2012/60004
聯絡人：周家薇
電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示＂＊＂者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以＂ND＂表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以＂<檢測報告最低位數單位值＂表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實罪、偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚觀成
檢驗室主管：實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6959530

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-12　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW6000401~03、00501

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW6000401 石碇溪河口 (343652;2771567)	PW6000402 雙溪河口 (345269;2768235)	PW6000403 鹽寮溪河口 (343364;2770589)	PW6000501 運送空白	-	-	-	-	-	-
	1	鹽度	NIEA W447.20C	-	psu	7.3	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-
*	2	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	2.5E+03	1.3E+04	2.2E+03	<10	-	-	-	-	-	-
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.1	1.0	3.7	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	4.8	29.2	9.2	-	-	-	-	-	-	-
	5	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	4.7	21	9.0	-	-	-	-	-	-	-
*	6	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	6.3	8.0	6.7	-	-	-	-	-	-	-
*	7	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.085	0.067	0.026	-	-	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣日期：		6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣時間：		12:45	13:05	13:25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	天氣：		陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-	-
		以下空白													
備註															

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6959531


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-14 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析(1)	
採樣地點：石碇溪廠界	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342392 N：2772007
採樣日期：2012.4.12	採樣人員：[illegible]
採樣時間：12:30-12:40	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨 氣溫：28.8 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：4.9 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	0.37 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

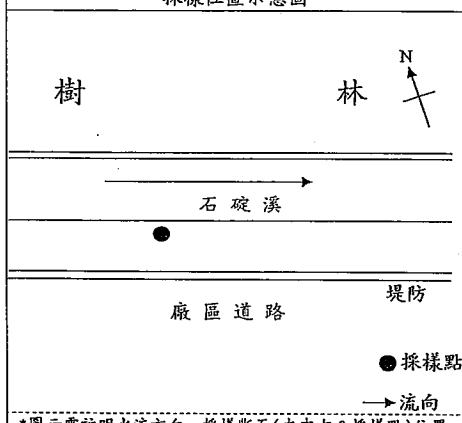

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☑湍急 ☐一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：堤防內
西向：堤防內
南向：廠區道路
北向：樹林
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 4/12


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-13 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析(1)	
採樣地點：上游水文站	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：314994 N：2772587
採樣日期：2012.4.12	採樣人員：[illegible]
採樣時間：12:00-12:10	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨 氣溫：28.6 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：10.3 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	2.2 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

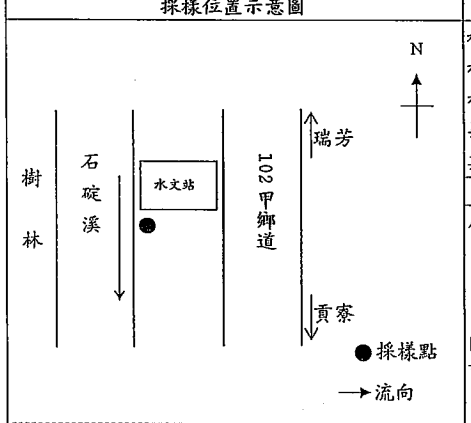

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：102 甲鄉道
西向：樹林
南向：石碇溪
北向：水文站
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 4/12


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-16 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 ~~調查評析~~	
採樣地點：澳底二號橋攔水堰上游	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343174 N：2771427
採樣日期：2012.4.12	採樣人員：[illegible]
採樣時間：13:20-13:30	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：29.1 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：>5.0 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段,低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」,請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.1 公尺	1.4 公尺	1.3 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	、、公尺	、、公尺	、、公尺

採樣位置示意圖

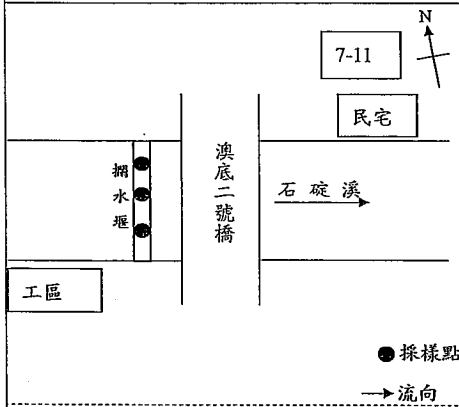

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：澳底二號橋
西向：石碇溪
南向：河岸
北向：民宅
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 4/12


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-15 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 ~~調查評析~~	
採樣地點：支流暗渠上游 (沼澤區)	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342659 N：2771965
採樣日期：2012.4.12	採樣人員：
採樣時間：12:50-13:00	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：29.0 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：11.0 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段,低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」,請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	0.7 公尺	_____公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	、、公尺	、、公尺	、、公尺

採樣位置示意圖

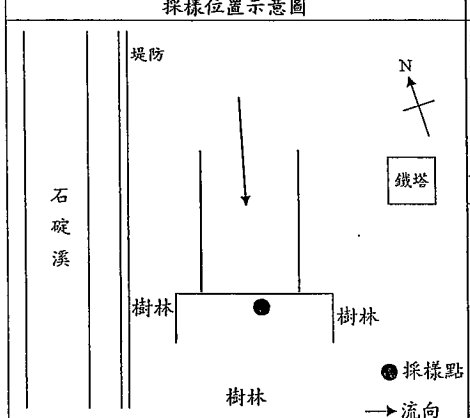

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☐一般 ☑緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☐透明無色 ☑其他~~淺綠~~色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：樹林
西向：樹林
南向：樹林
北向：石碇溪支流
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 4/12


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-18 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查許新國	
採樣地點：貢寮國小	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342372 N：2768331
採樣日期：2012.4.12	採樣人員：翟懷智
採樣時間：14:10-14:20	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：29.0 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：37.0 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☐否 (若爲感潮河段,低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☐是 ☐否(如勾選「否」,請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.2 公尺	_____公尺	_____公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

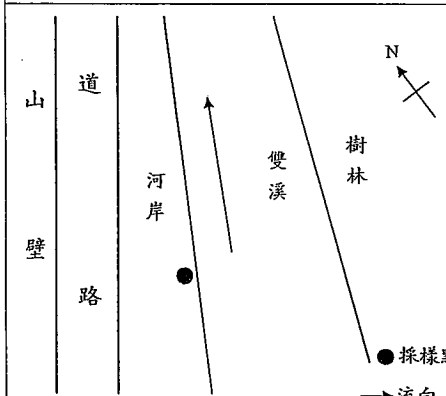

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：堤防內
西向：堤防內
南向：廢區道路
北向：樹林
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 4/12


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-17 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查許新國	
採樣地點：澳底二號橋	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343188 N：2771449
採樣日期：2012.4.12	採樣人員：翟懷智
採樣時間：13:40-13:50	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：28.9 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：30.0 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☐否 (若爲感潮河段,低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☐是 ☐否(如勾選「否」,請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.2 公尺	1.5 公尺	1.5 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

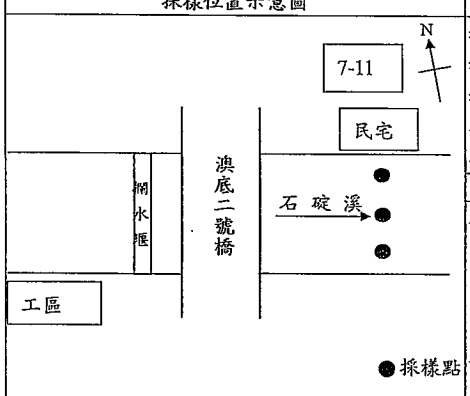

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪
西向：澳底二號橋
南向：河岸
北向：民宅
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 4/12


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-20 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：上游水文站	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：314994 N：2772587
採樣日期：2012、5、23	採樣人員：劉懷哲
採樣時間：11:30-11:40	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：27.4℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐仲縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：10.7 公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	2.1 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

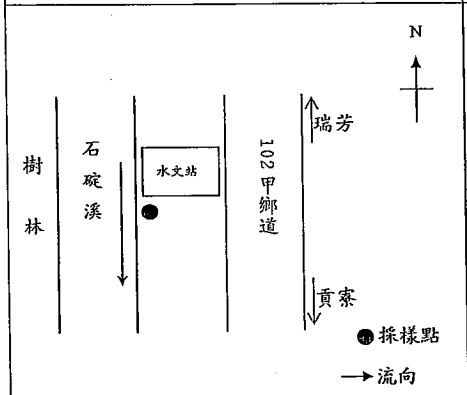

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：102 甲鄉道
西向：樹林
南向：石碇溪
北向：水文站
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 5/23


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-19 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評析(圖)	
採樣地點：新社大橋	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342978 N：2769023
採樣日期：2012.4.12	採樣人員：劉懷哲
採樣時間：14:30-14:40	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：29.0℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐仲縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：48.5 公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.6 公尺	1.8 公尺	1.7 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

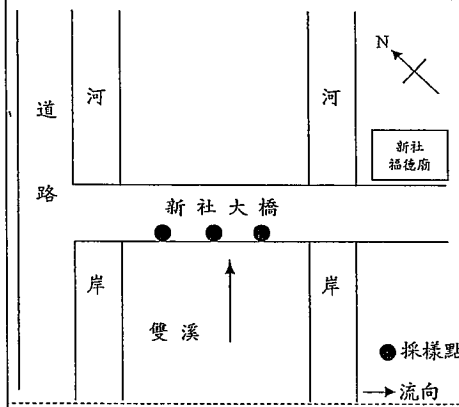

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：雙溪
西向：雙溪
南向：雙溪
北向：道路
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 4/12


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-22 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：支流暗渠上游（沼澤區）	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342659 N：2771965
採樣日期：2012、5.23	採樣人員：劉小姐
採樣時間：12:10～12:20	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨 氣溫：28.0 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他＿＿＿＿	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他＿＿＿＿	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：23.1 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：＿＿＿＿) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	＿＿公尺	0.9 公尺	＿＿公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

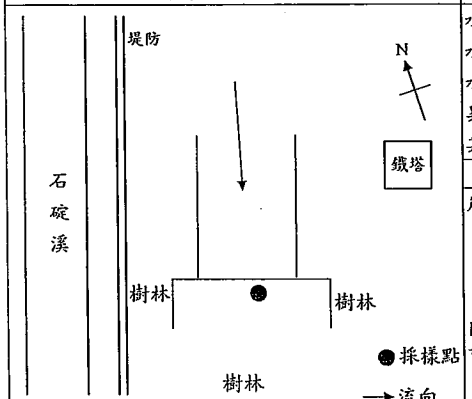

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☐一般 ☑緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☐透明無色 ☑其他 黃綠 色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：樹林
西向：樹林
南向：樹林
北向：石碇溪支流
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-21 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：石碇溪廠界	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342392 N：2772007
採樣日期：2012-5-23	採樣人員：劉小姐
採樣時間：11:50-12:00	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨 氣溫：27.9 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他＿＿＿＿	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他＿＿＿＿	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：4.8 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：＿＿＿＿) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	＿＿公尺	＿＿公尺	0.35 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

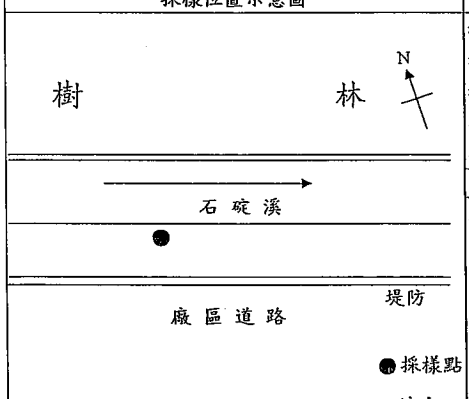

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☑湍急 ☐一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他＿＿＿色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：堤防內
西向：堤防內
南向：廠區道路
北向：樹林
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-24 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：澳底二號橋	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343188 N：2771449
採樣日期：2012.5.23	採樣人員：劉懷智
採樣時間：12:50-13:00	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨 氣溫：28.2 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：30.1 公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.3 公尺	1.4 公尺	1.4 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	、、公尺	、、公尺	、、公尺

採樣位置示意圖

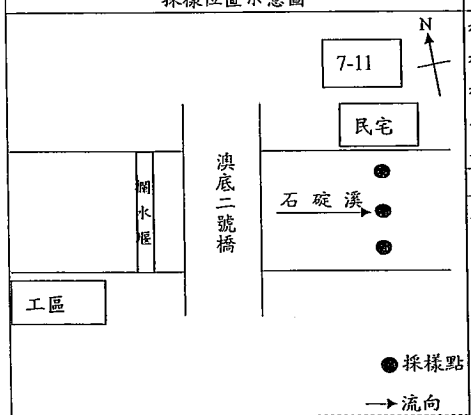

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪
西向：澳底二號橋
南向：河岸
北向：民宅
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：陳昌義 5/23

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-23 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：澳底二號橋攔水堰上游	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343174 N：2771427
採樣日期：2012.5.23	採樣人員：劉懷智
採樣時間：12:30-12:40	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨 氣溫：28.1 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：27.1 公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.0 公尺	1.3 公尺	1.4 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	、、公尺	、、公尺	、、公尺

採樣位置示意圖

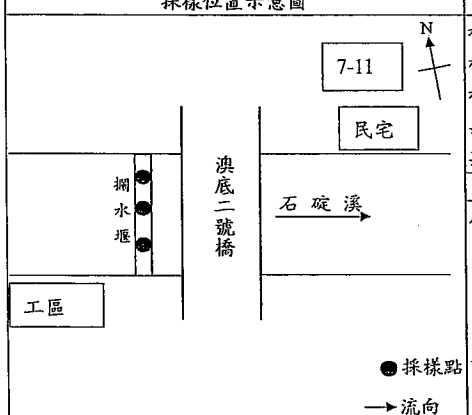

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：澳底二號橋
西向：石碇溪
南向：河岸
北向：民宅
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：陳昌義 5/23

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-26 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：新社大橋	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342978 N：2769023
採樣日期：2012.5.23	採樣人員：[illegible]
採樣時間：13:30-13:40	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：28.5 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：48.4 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.5 公尺	1.7 公尺	1.7 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

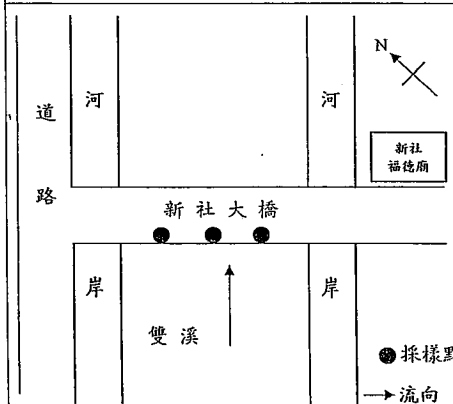

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：雙溪
西向：雙溪
南向：雙溪
北向：道路
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[signature] 5/23

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-25 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：貢寮國小	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342372 N：2768331
採樣日期：2012.5.23	採樣人員：[illegible]
採樣時間：13:10-13:20	天　候：☑晴 ☐陰 ☐雨　氣溫：28.4 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：36.9 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.1 公尺	_____公尺	_____公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

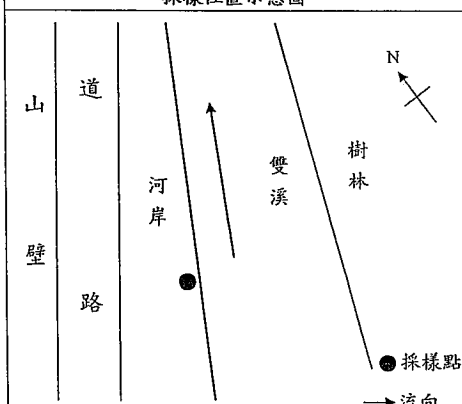

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：堤防內
西向：堤防內
南向：廠區道路
北向：樹林
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[signature] 5/23

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-28 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：石碇溪廠界	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342392 N：2772007
採樣日期：2012_06_05	採樣人員：劉懷智
採樣時間：11：35 ～ 11：45	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.4℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐仲縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：4.8 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	0.39 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： _____公尺 _____、_____公尺 _____、_____、_____公尺	採樣深度： _____公尺 _____、_____公尺 _____、_____、_____公尺	採樣深度： _____公尺 _____、_____公尺 _____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

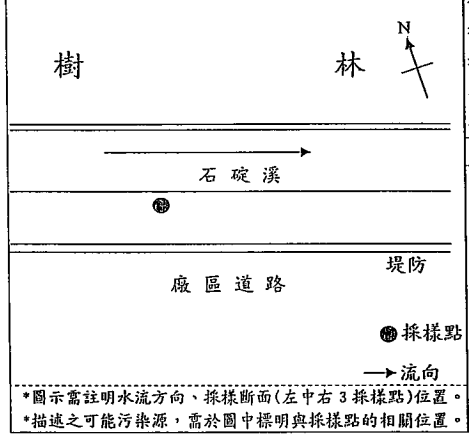

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☑湍急 ☐一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：堤防內
西向：堤防內
南向：廠區道路
北向：樹林
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：謝志遠


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-27 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：上游水文站	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：314994 N：2772587
採樣日期：2012_06_05	採樣人員：劉懷智
採樣時間：11：10 ～ 11：20	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.2℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐仲縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：10.3 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：_____) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	2.1 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： _____公尺 _____、_____公尺 _____、_____、_____公尺	採樣深度： _____公尺 _____、_____公尺 _____、_____、_____公尺	採樣深度： _____公尺 _____、_____公尺 _____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

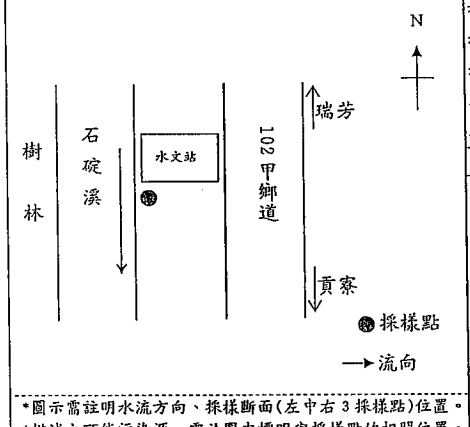

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：102 甲鄉道
西向：樹林
南向：石碇溪
北向：水文站
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：謝志遠


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-29 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：支流暗渠上游 (沼澤區)	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342659 N：2771965
採樣日期：2015.06.05	採樣人員：劉懷福
採樣時間：11:55 ~ 12:05	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.5 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他＿＿＿＿	
採樣器種類：☐仲縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他＿＿＿＿	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：33.1 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：＿＿＿＿) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	＿＿公尺	0.6 公尺	＿＿公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

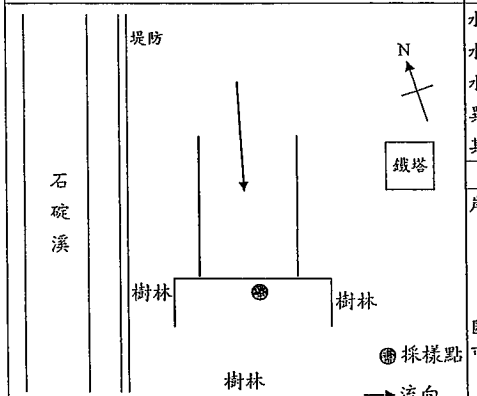

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐滿急 ☐一般 ☑緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☐透明無色 ☑其他 暗 色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：樹林
西向：樹林
南向：樹林
北向：石碇溪支流
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：謝志遠 6/5

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-30 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：澳底二號橋攔水堰上游	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343174 N：2771427
採樣日期：2015.06.05	採樣人員：劉懷福
採樣時間：12:20 ~ 12:30	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.1 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他＿＿＿＿	
採樣器種類：☑仲縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他＿＿＿＿	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：35.2 公尺	是否爲感潮河段：☐是 ☑否 (若爲感潮河段，低平潮時間：＿＿＿＿) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.0 公尺	1.3 公尺	1.4 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

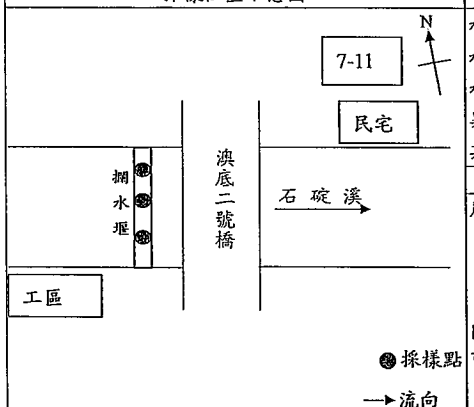

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐滿急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他＿＿色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：澳底二號橋
西向：石碇溪
南向：河岸
北向：民宅
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：謝志遠 6/5

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0

附4.5-15


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-32 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：貢寮國小	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342372 N：2768331
採樣日期：2012.06.05	採樣人員：鄧懷智
採樣時間：13:10 ~ 13:20	天 候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.3 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：37.0 公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.1 公尺	_____ 公尺	_____ 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____ 公尺	採樣深度： _____ 公尺	採樣深度： _____ 公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____ 公尺	_____、_____ 公尺	_____、_____ 公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____ 公尺	_____、_____、_____ 公尺	_____、_____、_____ 公尺

採樣位置示意圖

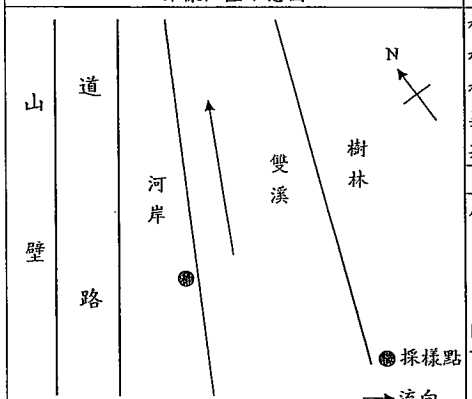

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：堤防內
西向：堤防內
南向：廢區道路
北向：樹林
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：謝志遠


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-31 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：澳底二號橋	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343188 N：2771449
採樣日期：2012.06.05	採樣人員：鄧懷智
採樣時間：12:40~12:50	天 候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.2 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：30.0 公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.1 公尺	1.4 公尺	1.5 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____ 公尺	採樣深度： _____ 公尺	採樣深度： _____ 公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____ 公尺	_____、_____ 公尺	_____、_____ 公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____ 公尺	_____、_____、_____ 公尺	_____、_____、_____ 公尺

採樣位置示意圖

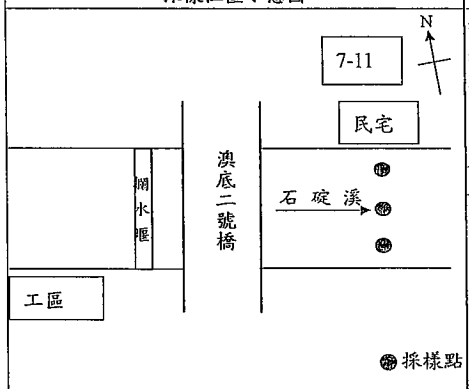

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪
西向：澳底二號橋
南向：河岸
北向：民宅
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：謝志遠 6/5


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-34 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析	
採樣地點：石碇溪河口	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343652 N：2771567
採樣日期：2012.04.03	採樣人員：[illegible]
採樣時間：11:10 - 11:20	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：20.5 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：36.2 公尺	是否為感潮河段：☑是 ☐否 (若為感潮河段，低平潮時間：11:46) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	1.7 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

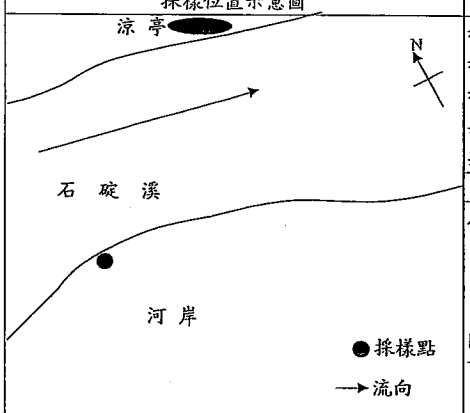

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪
西向：石碇溪
南向：河岸
北向：石碇溪
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

審核人員 蔡承甫 2012.04.03


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-33 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：新社大橋	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：342978 N：2769023
採樣日期：2012.06.05	採樣人員：[illegible]
採樣時間：13:30 ~ 13:40	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.4 ℃
水樣採集：☐單一水樣 ☑混和水樣	
採樣方式：☐涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☑橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☐伸縮式採樣器 ☑吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：48.6 公尺	是否為感潮河段：☐是 ☑否 (若為感潮河段，低平潮時間：_____) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	1.5 公尺	1.8 公尺	1.7 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

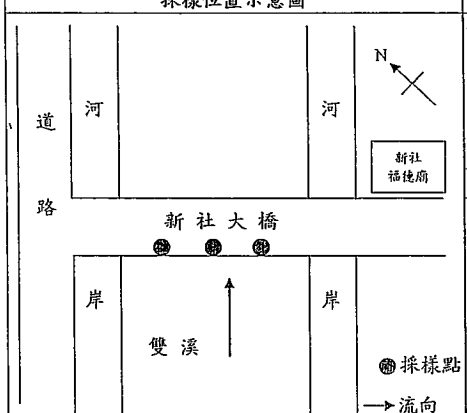

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：雙溪
西向：雙溪
南向：雙溪
北向：道路
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

審核人員：謝志遠 6/5


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-36 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評估	
採樣地點：鹽寮溪河口	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343364 N：2770589
採樣日期：2012.04.03	採樣人員：[illegible]
採樣時間：11:50 - 12:00	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：20.1 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：5.0 公尺	是否為感潮河段：☑是 ☐否 (若為感潮河段，低平潮時間：11:46) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	0.3 公尺	＿＿公尺	＿＿公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

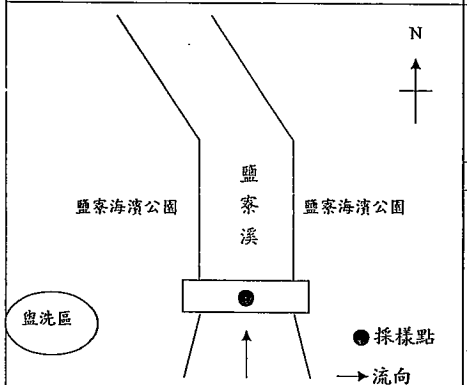

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他＿＿色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：鹽寮海濱公園
西向：鹽寮海濱公園
南向：鹽寮溪
北向：鹽寮溪
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[signature] 2012.04.03

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-35 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 調查評估	
採樣地點：雙溪河口	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：345269 N：2768235
採樣日期：2012.04.03	採樣人員：[illegible]
採樣時間：11:30 - 11:40	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：20.3 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：48.1 公尺	是否為感潮河段：☑是 ☐否 (若為感潮河段，低平潮時間：11:46) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	＿＿公尺	＿＿公尺	1.8 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿公尺
*水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺	＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

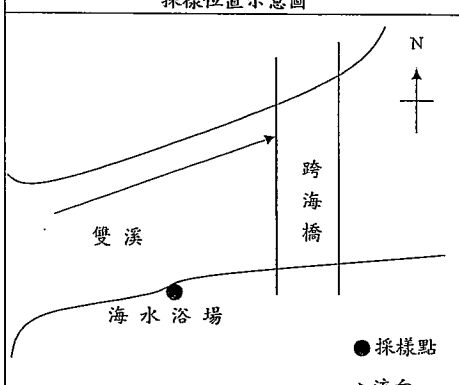

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他＿＿色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：海水浴場
西向：雙溪
南向：海水浴場
北向：雙溪
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[signature] 2012.04.03

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-38 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：雙溪河口	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：345269 N：2768235
採樣日期：2012. 05. 03	採樣人員：[illegible]
採樣時間：11:20 - 11:20	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：26.0 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：47.0 公尺	是否為感潮河段：☑是 ☐否 (若為感潮河段，低平潮時間：11:43) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	1.8 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

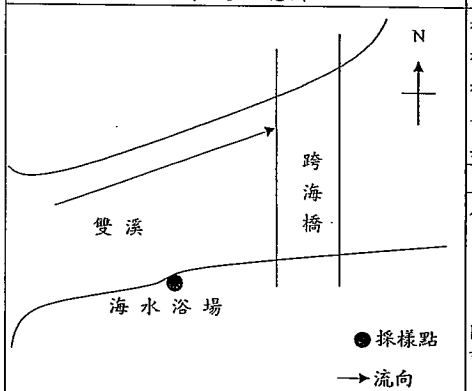

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：海水浴場
西向：雙溪
南向：海水浴場
北向：雙溪
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 2012.05.03

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-37 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：石碇溪河口	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343652 N：2771567
採樣日期：2012. 05. 03	採樣人員：[illegible]
採樣時間：11:00 - 11:10	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：23.9 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他_____	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他_____	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：_____公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下_____公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：26.1 公尺	是否為感潮河段：☑是 ☐否 (若為感潮河段，低平潮時間：11:43) 是否為表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	_____公尺	_____公尺	1.6 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺	採樣深度： _____公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	_____、_____公尺	_____、_____公尺	_____、_____公尺
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺	_____、_____、_____公尺

採樣位置示意圖

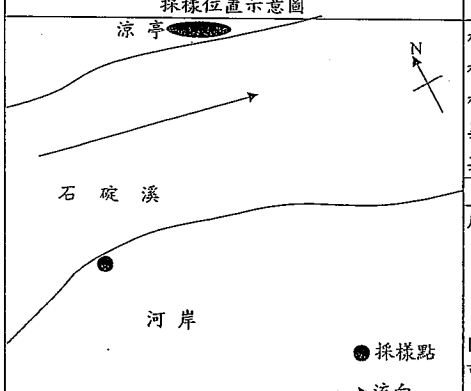

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他_____色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪
西向：石碇溪
南向：河岸
北向：石碇溪
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：[illegible] 2012.05.03

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-40 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：石碇溪河口	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343652 N：2771567
採樣日期：2012.6.4	採樣人員：劉懷智
採樣時間：12:45-12:55	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：24.7 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他＿＿＿＿	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他＿＿＿＿	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：25.8 公尺	是否爲感潮河段：☑是 ☐否 (若爲感潮河段，低平潮時間：13:30) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	＿＿公尺	＿＿公尺	1.4 公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

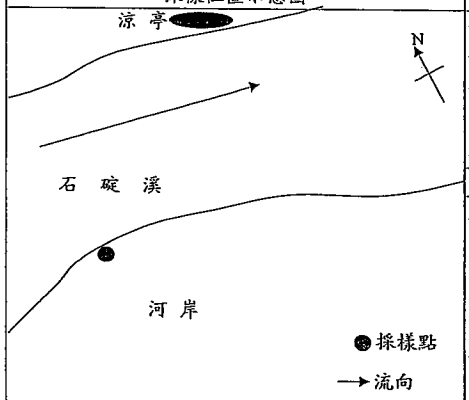

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他＿＿色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：石碇溪
西向：石碇溪
南向：河岸
北向：石碇溪
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：謝志遠 6/4


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-39 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析	
採樣地點：鹽寮溪河口	衛星定位座標(☑TWD97 ☐WGS84) E：343364 N：2770589
採樣日期：2012.05.03	採樣人員：劉懷智
採樣時間：11:40-11:50	天　候：☐晴 ☑陰 ☐雨 氣溫：23.8 ℃
水樣採集：☑單一水樣 ☐混和水樣	
採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他＿＿＿＿	
採樣器種類：☑伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他＿＿＿＿	
☐湖泊、水庫採樣 採樣點水深：＿＿公尺	採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下＿＿公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)
☑河川採樣 河寬：7.9 公尺	是否爲感潮河段：☑是 ☐否 (若爲感潮河段，低平潮時間：11:43) 是否爲表層採樣：☑是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	0.3 公尺	＿＿公尺	＿＿公尺
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處) *水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處) *水深> 3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺	採樣深度： ＿＿公尺 ＿＿、＿＿公尺 ＿＿、＿＿、＿＿公尺

採樣位置示意圖

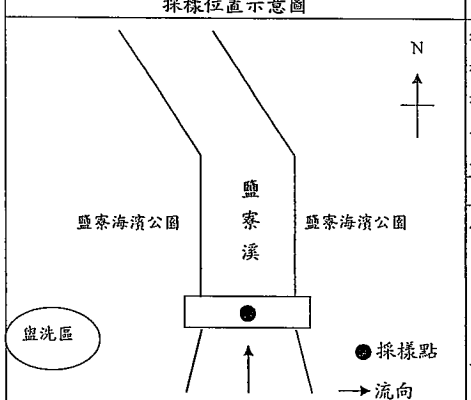

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。
*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☐一般 ☑緩慢 ☐靜止
水質：☑澄清 ☐微濁 ☐混濁
水色：☑透明無色 ☐其他＿＿色
異味：☐有 ☑無
其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：鹽寮海濱公園
西向：鹽寮海濱公園
南向：鹽寮溪
北向：鹽寮溪
匯流情形：☐有 ☑無
可能污染源：無

審核人員：葛孟甫 2012.05.03

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-41 河川、湖泊及水庫水質採樣現場記錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

採樣地點：雙溪河口　衛星定位座標(☒TWD97 ☐WGS84) E：345269 N：2768235

採樣日期：2012.6.4　採樣人員：龐小豫

採樣時間：17:05-17:15　天　候：☐晴 ☒陰 ☐雨　氣溫：27.2 ℃

水樣採集：☒單一水樣 ☐混和水樣

採樣方式：☑涉水 ☐艇筏或船隻作業 ☐橋上測定 ☐其他

採樣器種類：☒伸縮式採樣器 ☐吊索懸掛水桶 ☐深層採水器 ☐其他

☐湖泊、水庫採樣　採樣深度：☐表水層(水面下 0.5 公尺處) ☐中層(水面下 ＿＿ 公尺處) ☐底層(底床上 1 公尺處)

採樣點水深：＿＿ 公尺

☑河川採樣　是否爲感潮河段：☒是 ☐否 (若爲感潮河段，低平潮時間：12:30)

河寬：44.8 公尺　是否爲表層採樣：☒是 ☐否(如勾選「否」，請紀錄採樣深度)

採樣點：	左岸	中央	右岸
水深：	公尺	公尺	1.7 公尺
採樣深度：		採樣深度：	採樣深度：
*水深<1.5 公尺 (水深 3/5 處)	公尺	公尺	公尺
*水深介於 1.5~3.0 公尺 (水深 1/5、4/5 處)	公尺	公尺	公尺
*水深>3.0 公尺 (水深 1/5、3/5、4/5 處)	公尺	公尺	公尺

現場水體狀況

水流：☐湍急 ☑一般 ☐緩慢 ☐靜止

水質：☐澄清 ☑微濁 ☐混濁

水色：☑透明無色 ☐其他＿＿色

異味：☐有 ☒無

其他：☐漂流物 ☐沈澱物

採樣位置附近地貌

岸邊景觀 東向：海水浴場 西向：雙溪 南向：海水浴場 北向：雙溪

匯流情形：☐有 ☒無

可能污染源：無

採樣位置示意圖

*圖示需註明水流方向、採樣斷面(左中右 3 採樣點)位置。

*描述之可能污染源，需於圖中標明與採樣點的相關位置。

審核人員：謝士嘉 6/4

FORM-TESP-PW-104-01 發行日期：2011.12.01 版次：2.0

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-43 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120405CE1

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

樣品基質：放流水

樣品編號：PW4020401~05

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：廠區水質

採樣時間：101年04月12日09時30分 至：101年04月12日11時40分

收樣時間：101年04月12日17時13分

報告日期：101年05月03日

報告編號：PW/2012/4020401A

聯絡人：周家薇

電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
7.報告編號PW/2012/4020401A取代原本PW/2012/4020401。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實僞造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚攽成

檢驗室主管：　實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956897

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-44　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號： PW4020401~05

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW4020401	PW4020402	PW4020403	PW4020404	PW4020405	-	-	-	-	-
						榮公區排水口(1) (343027;2771352)	榮公區排水口(2) (343189;2771435)	宿舍區排水口 (343175;2771431)	2號排洪渠道 (342166;2771555)	廢棄一號碼排洪渠道出口 (343455;2770596)	-	-	-	-	-
*	1	流量(備註1.)	NIEA W022.51C/NIEA W020.51C	-	CMD	18.3	20.4	5.47×10^3	8.35×10^3	1.15×10^3	-	-	-	-	-
*	2	pH(備註2.)	NIEA W424.52A	-	-	7.594	7.092	7.154	7.306	8.139	-	-	-	-	-
*	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	213	336	845	244	800	-	-	-	-	-
*	4	真色色度	NIEA W223.52B	<25	-	<25	<25	26	<25	<25	-	-	-	-	-
*	5	懸浮固體(備註3.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	2.3	4.6	6.8	4.2	<1.0	-	-	-	-	-
*	6	化學需氧量	NIEA W517.52B	2.9	mg/L	12.1	3.7	21.1	12.6	4.8	-	-	-	-	-
*	7	生化需氧量(備註4.)	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.7	<1.0	4.0	1.4	<1.0	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-
*	9	氰氫	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	1.65	0.18	3.83	0.56	<0.05(0.01)	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日	4月12日	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	09:30	10:00	10:30	11:00	11:30	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註
1.PW4020403~05的流量以流速計法(NIEA W022.51C)量測；PW4020401~02的流量以容器法(NIEA W020.51C)量測。
2.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
3.PW4020401~02,04~05懸浮固體樣品以全量過濾分析。
4.樣品添加硝化抑制劑之使用量PW4020401：0.0029g/0.0031g/0.0028g；03：0.0031g/0.0030g/0.0029g；04：0.0030g/0.0029g/0.0032g。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956898

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 | t (886-2) 2299-3939 | f (886-2) 2299-3230 | www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-45　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼： FIWA120427AG0

委託單位： 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱： 核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質： 放流水
樣品編號： PW5007001~05
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點： 廠區水質

採樣時間： 101年05月23日09時20分
至： 101年05月23日11時10分
收樣時間： 101年05月23日16時04分
報告日期： 101年05月29日
報告編號： PW/2012/5007001
聯絡人： 周家薇
電話/傳真： 02-2299-3279ext2306 / 02-2299-32616

備　註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〝＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〝ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〝<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：
(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：
檢驗室主管：

實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958596

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 | t (886-2) 2299-3939 | f (886-2) 2299-3230 | www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-46　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號： PW5007001~05

認證	序號	樣品編號 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW5007001	PW5007002	PW5007003	PW5007004	PW5007005	-	-	-	-	-
						新公區排水口(1) (343027;2771352)	新公區排水口(2) (343189;2771435)	宿舍區排水口 (343175;2771431)	2號排洪渠道 (342166;2771555)	進塞一號海排洪渠道出口 (343455;2770596)					
*	1	流量(備註1.)	NIEA W022.51C/NIEA W020.51C	-	CMD	26.6	37.4	6.05×10^3	6.91×10^3	1.44×10^3	-	-	-	-	-
*	2	pH(備註2.)	NIEA W424.52A	-	-	7.395	7.156	7.118	7.620	8.174	-	-	-	-	-
*	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	640	430	802	184	718	-	-	-	-	-
*	4	真色色度	NIEA W223.52B	<25	-	67	<25	42	<25	<25	-	-	-	-	-
*	5	懸浮固體(備註3.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	11.2	4.2	8.9	2.4	14.5	-	-	-	-	-
*	6	化學需氧量	NIEA W517.52B	2.9	mg/L	52.4	ND	26.0	4.2	ND	-	-	-	-	-
*	7	生化需氧量(備註4.)	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	24.0	<1.0	13.7	1.1	<1.0	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-
*	9	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	43.2	0.21	2.29	0.26	<0.05(0.03)	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	09:20	09:40	10:10	10:35	11:00	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註
1.PW5007003~05的流量以流速計法(NIEA W022.51C)量測；PW5007001~02的流量以容器法(NIEA W020.51C)量測。
2.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
3.PW5007002,04懸浮固體樣品以全量過濾分析。
4.樣品添加硝化抑制劑之使用量PW5007003：0.0028g/0.0031g/0.0032g。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-47　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼： FIWA120528BH3

委託單位： 美商傑明工程顧問股份有限公司 台灣分公司
計畫名稱： 核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質： 放流水
樣品編號： PW6001101~05
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點： 廠區水質

採樣時間： 101年06月05日09時00分
至： 101年06月05日10時50分
收樣時間： 101年06月05日16時37分
報告日期： 101年06月13日
報告編號： PW/2012/6001101
聯絡人： 周家薇
電話/傳真： 02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備　註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示＂＊＂者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以＂ND＂表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以＂<檢測報告最低位數單位值＂表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：
(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實僞造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚觀成
檢驗室主管：

實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

樣品編號： PW6001101~05

認證	序號	檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW6001101	PW6001102	PW6001103	PW6001104	PW6001105	-	-	-	-	-
		樣品編號				新公園排水口(1) (343027;2771352)	新公園排水口(2) (343189;2771435)	宿舍區排水口 (343175;2771431)	2號排洪渠道 (342166;2771555)	垃圾一號掩埋場渠道出口 (343455;2770596)	-	-	-	-	-
*	1	流量(備註1.)	NIEA W022.51C/NIEA W020.51C	-	CMD	23.7	31.9	5.47×10^3	6.91×10^3	1.73×10^3	-	-	-	-	-
*	2	pH(備註2.)	NIEA W424.52A	-	-	7.295	7.166	7.147	7.527	7.774	-	-	-	-	-
*	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	551	325	659	263	740	-	-	-	-	-
*	4	真色色度	NIEA W223.52B	<25	-	45	<25	47	<25	<25	-	-	-	-	-
*	5	懸浮固體	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	9.0	1.8	6.2	3.2	2.7	-	-	-	-	-
*	6	化學需氧量	NIEA W517.52B	2.9	mg/L	34.1	ND	14.2	3.0	ND	-	-	-	-	-
*	7	生化需氧量(備註3.)	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	8.1	<1.0	2.9	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-
*	9	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	32.8	0.16	0.44	0.17	0.11	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	6月5日	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	09:00	09:20	09:45	10:10	10:40	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	陰	陰	陰	陰	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註：
1.PW6001103~05的流量以流速計法(NIEA W022.51C)量測；PW6001101~02的流量以容器法(NIEA W020.51C)量測。
2.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
3.樣品添加硝化抑制劑之使用量PW6001101：0.0031g/0.0028g/0.0030g；03：0.0030g/0.0028g/0.0029g。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告專章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-49 流量現場記錄與計算表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測 監測日期：2012 年 04 月 12 日 流速計編號：

測點名稱：二號排洪渠道 監測人員：劉慶智

河　寬：7 公尺

測點間距 b(m)	1	速域間距 b'(m)	0	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	ΔV (%)	q (m^3/sec)
0	0.00	0.000			0.00	0.00	--	0.01
1	0.19	0.261			0.00	0.26	--	0.05
2	0.19	0.261			0.00	0.26	0.0%	0.05
3	0.20	0.281			0.00	0.28	7.7%	0.06
4	0.21	0.283			0.00	0.28	0.0%	0.06
5	0.21	0.283			0.00	0.28	0.0%	0.06
6	0.20	0.272			0.00	0.27	3.6%	0.00
7	0.00	0.000			0.00	0.00		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15							--	--
16								
總流量 Q (m^3/sec)								0.29

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。
2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準，河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測
若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。
平均流速變化率(%)：$\Delta V_n=\frac{V_n-V_{n-1}}{V_{n-1}}\times100\%$
3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，$V_n=V_{0.6}$。
(2)水深＞0.4 m時，$V_n=(V_{0.2}+V_{0.8})/2$。
其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。
4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)V_{n-1}+V_n)+\frac{b}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員：

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-51 流量現場記錄與計算表

調查許折⑧

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 04 月 12 日

測點名稱: 宿舍區排水口　　流速計編號:

河　寬: 6 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1				邊坡間距 b'(m)	0	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.01
1	0.15		0.28		0.00	0.28	--	0.04
2	0.15		0.28		0.00	0.28	0.0%	0.04
3	0.16		0.28		0.00	0.28	0.0%	0.05
4	0.17		0.29		0.00	0.29	3.6%	0.05
5	0.17		0.30		0.00	0.30	3.4%	0.00
6	0.00		0.00		0.00	0.00		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							--	--
總流量 Q (m^3/sec)								0.19

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)： $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$

3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，$Vn=V_{0.6}$。

(2)水深＞0.4 m時，$Vn=(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。

其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。

4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n)+\frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 崔煥榮

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-50 流量現場記錄與計算表(續)

調查許折⑧


計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

監測日期: 2012 年 04 月 12 日

測點名稱: 二號排洪渠道

河　寬: 7.0 公尺

測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.0 公尺

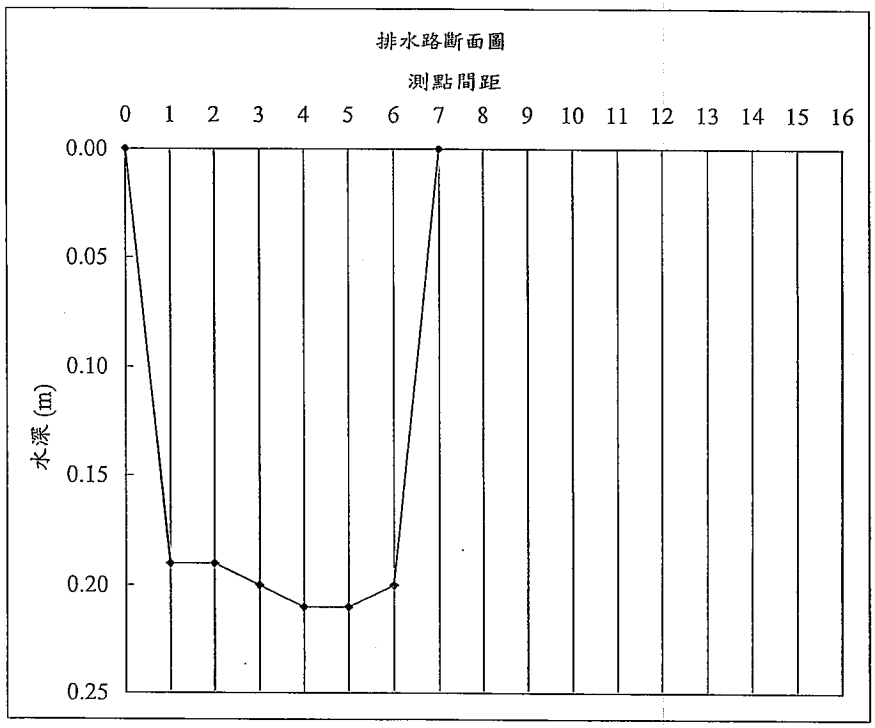

審核人員: 崔煥榮

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-53 流量現場記錄與計算表

調查許折(2)

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 04 月 12 日

測點名稱: 豐泰一號橋　　流速計編號:

河　　寬: 6.7 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1		邊坡間距 b'(m)		0.7	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.00
1	0.06		0.07		0.00	0.07	--	0.00
2	0.06		0.07		0.00	0.07	0.0%	0.00
3	0.07		0.08		0.00	0.08	14.3%	0.01
4	0.08		0.09		0.00	0.09	12.5%	0.01
5	0.08		0.10		0.00	0.10	11.1%	0.01
6	0.07		0.08		0.00	0.08	20.0%	0.01
7	0.07		0.08		0.00	0.08	0.0%	0.00
8	0.00		0.00		0.00	0.00		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							---	---
總流量 Q (m^3/sec)								0.04

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測

若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)：$\Delta V_n=\frac{V_n-V_{n-1}}{V_{n-1}}\times 100\%$

3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，Vn=$V_{0.6}$。

(2)水深＞0.4 m時，Vn=$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。

其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。

4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n)+\frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 崔煥榮 4/12

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

附4.5-26

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-52 流量現場記錄與計算表(續)

調查許折(2)


計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

監測日期: 2012 年 04 月 12 日

測點名稱: 宿舍區排水口

河　　寬: 6.0 公尺

測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.0 公尺

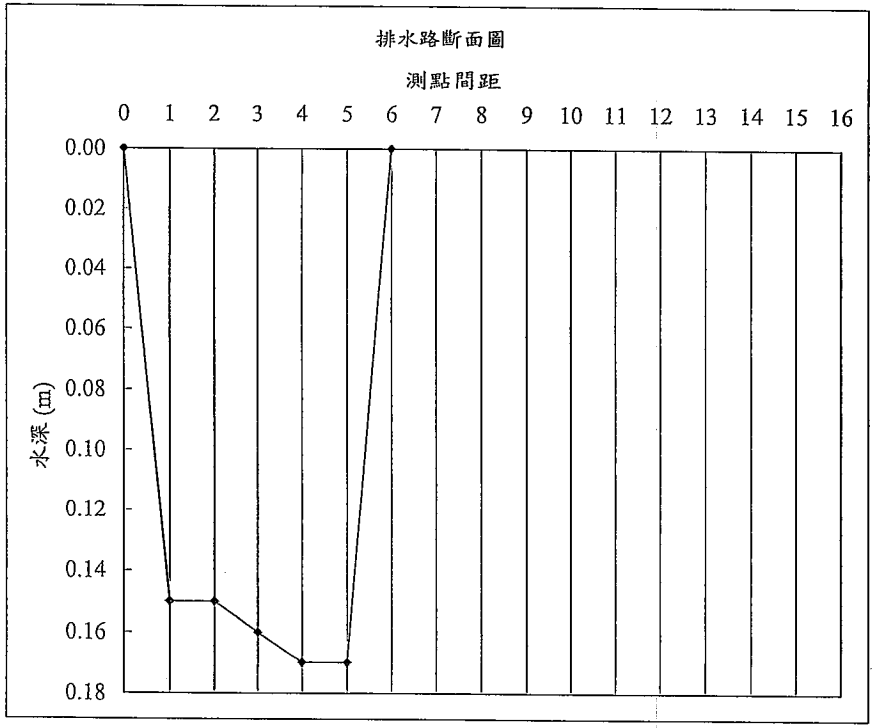

審核人員: 崔煥榮 4/12

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-54 流量現場記錄與計算表(續)

調查許軒(簡)

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測
監測日期: 2012 年 04 月 12 日
測點名稱: 鹽寮一號橋
河　寬: 6.7 公尺
測點間距: 1.0 公尺　邊坡間距: 0.7 公尺

審核人員: 崔煥榮 2012

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-55 水量測定記錄表(容器法)

調查許軒(簡)

廠商名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　測定日期: 2012 年 04 月 12 日

測定人員:劉懷智

測點位置	水體體積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m^3/sec)	平均流量值 CMM (m^3/min)	平均流量值 CMD (m^3/Day)
辦公區排水口(一)	6.6	10.3	0.000640777	0.000638429	0.03830573	55.16025128
	6.5	10.2	0.000637255			
	6.5	10.2	0.000637255			
辦公區排水口(二)	7.2	10.2	0.000705882	0.00071007	0.042604226	61.35008567
	7.4	10.3	0.000718447			
	7.2	10.2	0.000705882			

備註：1.本方法是依照NIEA W020.51C 水量測定方法一容器法 所制定。

2.流量CMS(m^3/sec)=容器內水體達到一定體積(L)/所需時間(sec)/1000(L/m^3)。


3.CMD(m^3/day) = 86400 × CMS(m^3/sec)，CMM(m^3/min) = 60 × CMS(m^3/sec)。

驗算人員:　　審核人員: 崔煥榮

FORM-TESP-020-01 版次：3.1 發行日期： 96.10.15

附錄 IV.5-57 流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測
監測日期: 2012 年 05 月 23 日
測點名稱: 鹽寮一號橋
河　　寬: 6.7 公尺
測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.7 公尺

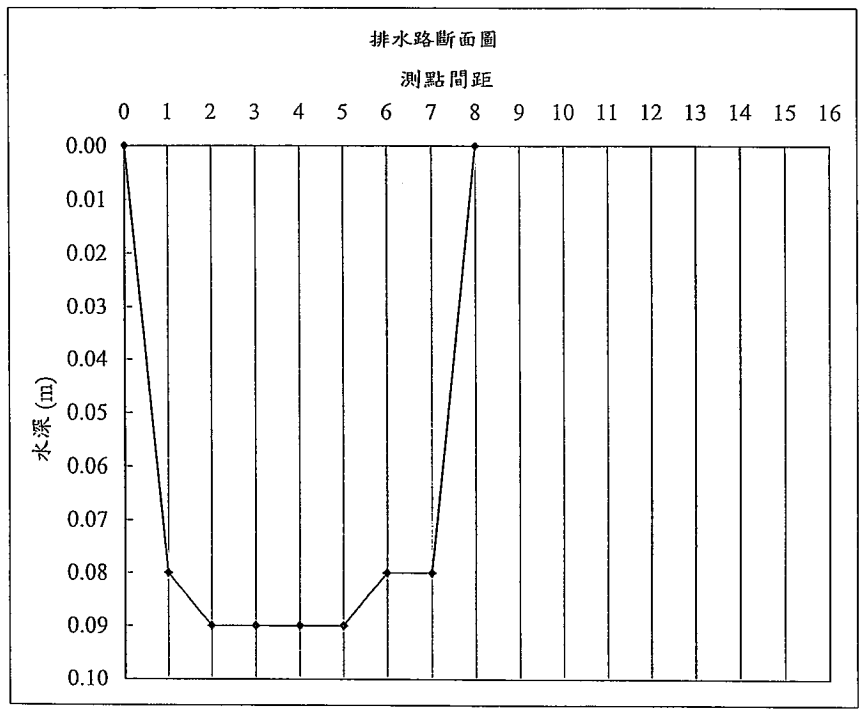

審核人員: 陳[illegible] 5/24 崔振榮 5/24

附錄 IV.5-56 流量現場記錄與計算表

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 05 月 23 日
測點名稱: 鹽寮一號橋　　流速計編號:
河　　寬: 6.7 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1		邊坡間距 b'(m)		0.7	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.00
1	0.08		0.09		0.00	0.09	--	0.01
2	0.09		0.10		0.00	0.10	11.1%	0.01
3	0.09		0.10		0.00	0.10	0.0%	0.01
4	0.09		0.10		0.00	0.10	0.0%	0.01
5	0.09		0.09		0.00	0.09	10.0%	0.01
6	0.08		0.08		0.00	0.08	11.1%	0.01
7	0.08		0.08		0.00	0.08	0.0%	0.00
8	0.00		0.00		0.00	0.00		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							---	---
總流量 Q (m^3/sec)								0.05

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)： $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$

3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，Vn=$V_{0.6}$。

(2)水深＞0.4 m時，Vn=$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。

其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。


4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n)+\frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 陳[illegible] 5/24 崔振榮 5/24

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-59 流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測
監測日期: 2012 年 05 月 23 日
測點名稱: 宿舍區排水口
河　　寬: 6.0 公尺
測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.0 公尺

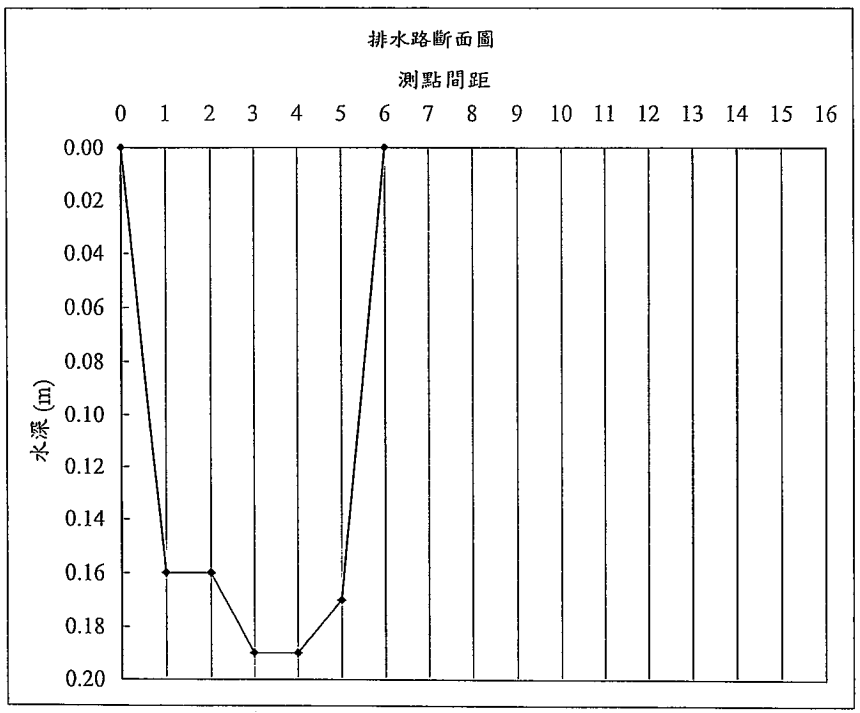

審核人員: 5/23 崔煥榮 5/24

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-58 流量現場記錄與計算表

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 05 月 23 日
測點名稱: 宿舍區排水口　　流速計編號:
河　　寬: 6 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1		邊坡間距 b'(m)		0	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.01
1	0.16		0.27		0.00	0.27	--	0.04
2	0.16		0.27		0.00	0.27	0.0%	0.05
3	0.19		0.29		0.00	0.29	7.4%	0.06
4	0.19		0.29		0.00	0.29	0.0%	0.05
5	0.17		0.28		0.00	0.28	3.4%	0.00
6	0.00		0.00		0.00	0.00		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							--	--
總流量 Q (m^3/sec)								0.21

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)： $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$

3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，$V_n = V_{0.6}$。

(2)水深＞0.4 m時，$V_n = (V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。

其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。


4.$Q = q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1} = \frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n) + \frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 5/23 崔煥榮 5/24

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

附錄 IV.5-61 流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測
監測日期: 2012 年 05 月 23 日
測點名稱: 二號排洪渠道
河　　寬: 7.0 公尺
測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.0 公尺

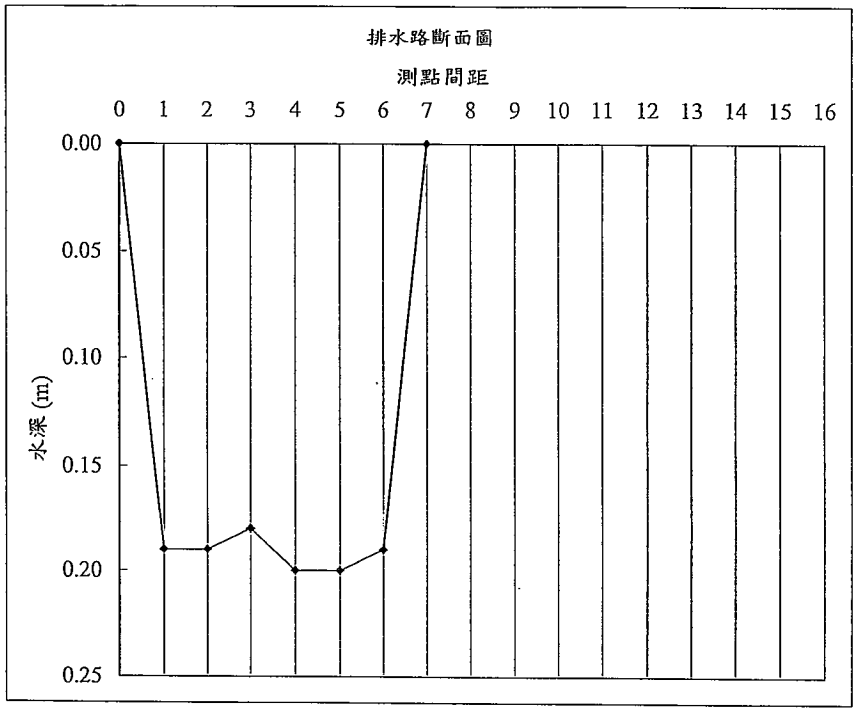

審核人員: 陳昌豪 5/23 崔煥榮 5/24

附錄 IV.5-60 流量現場記錄與計算表

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 05 月 23 日
測點名稱: 二號排洪渠道　　流速計編號:
河　　寬: 7 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1		邊坡間距 b'(m)		0	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.01
1	0.19		0.24		0.00	0.24	--	0.05
2	0.19		0.24		0.00	0.24	0.0%	0.04
3	0.18		0.23		0.00	0.23	4.2%	0.05
4	0.20		0.25		0.00	0.25	8.7%	0.05
5	0.20		0.25		0.00	0.25	0.0%	0.05
6	0.19		0.25		0.00	0.25	0.0%	0.00
7	0.00		0.00		0.00	0.00		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							--	--
總流量 Q (m^3/sec)								0.24

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。
2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測
若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。
平均流速變化率(%)： $\Delta V_n=\frac{V_n-V_{n-1}}{V_{n-1}}\times 100\%$
3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，$Vn=V_{0.6}$。
(2)水深＞0.4 m時，$Vn=(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。
其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。
4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n)+\frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 陳昌豪 5/23 崔煥榮 5/24

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-62 水量測定記錄表(容器法)

廠商名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　測定日期: 2012 年 05 月 23 日

測定人員:劉懷智

測點位置	水體體積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m^3/sec)	平均流量值 CMM (m^3/min)	平均流量值 CMD (m^3/Day)
辦公區排水口(一)	9.4	10.2	0.000921569	0.000925313	0.055518751	79.94700171
	9.6	10.3	0.000932039			
	9.5	10.3	0.00092233			
辦公區排水口(二)	13.5	10.3	0.00131068	0.001307431	0.07844587	112.9620525
	13.6	10.4	0.001307692			
	13.3	10.2	0.001303922			

備註：1.本方法是依照NIEA W020.51C 水量測定方法一容器法 所制定。

2.流量CMS(m^3/sec)=容器內水體達到一定體積(L)/所需時間(sec)/1000(L/m^3)。

3.CMD(m^3/day) = 86400 × CMS(m^3/sec)，CMM(m^3/min) = 60 × CMS(m^3/sec)。

驗算人員: 陳昱豪 5/3　　審核人員:

FORM-TESP-020-01 版次：3.1 發行日期： 96.10.15

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-63 水量測定記錄表(容器法)

廠商名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　測定日期: 2012 年 06 月 05 日

測定人員:劉懷智

測點位置	水體體積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m^3/sec)	平均流量值 CMM (m^3/min)	平均流量值 CMD (m^3/Day)
辦公區排水口(一)	8.5	10.3	0.000825243	0.000824101	0.049446031	71.20228441
	8.4	10.2	0.000823529			
	8.4	10.2	0.000823529			
辦公區排水口(二)	11.3	10.2	0.001107843	0.001113618	0.066817057	96.21656196
	11.5	10.3	0.001116505			
	11.5	10.3	0.001116505			

備註：1.本方法是依照NIEA W020.51C 水量測定方法一容器法 所制定。

2.流量CMS(m^3/sec)=容器內水體達到一定體積(L)/所需時間(sec)/1000(L/m^3)。

3.CMD(m^3/day) = 86400 × CMS(m^3/sec)，CMM(m^3/min) = 60 × CMS(m^3/sec)。

驗算人員: 謝志遠 6/5　　審核人員: 崔煥榮 6/6

FORM-TESP-020-01 版次：3.1 發行日期： 96.10.15

附錄 IV.5-64 流量現場記錄與計算表

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 06 月 05 日

測點名稱: 二號排洪渠道　　流速計編號:

河　寬: 7 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1		邊坡間距 b'(m)		0	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.01
1	0.17		0.23		0.00	0.23	--	0.04
2	0.18		0.23		0.00	0.23	0.0%	0.04
3	0.18		0.24		0.00	0.24	4.3%	0.05
4	0.19		0.26		0.00	0.26	8.3%	0.05
5	0.19		0.25		0.00	0.25	3.8%	0.05
6	0.20		0.26		0.00	0.26	4.0%	0.00
7	0.00		0.00		0.00	0.00		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							--	--
總流量 Q (m^3/sec)								0.24

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測

若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)：$\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$

3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，$Vn=V_{0.6}$。

(2)水深＞0.4 m時，$Vn=(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。

其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。

4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n)+\frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 謝志遠 6/5 崔換榮 6/6

附錄 IV.5-65 流量現場記錄與計算表(續)


計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測

監測日期: 2012 年 06 月 05 日

測點名稱: 二號排洪渠道

河　寬: 7.0 公尺


測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.0 公尺

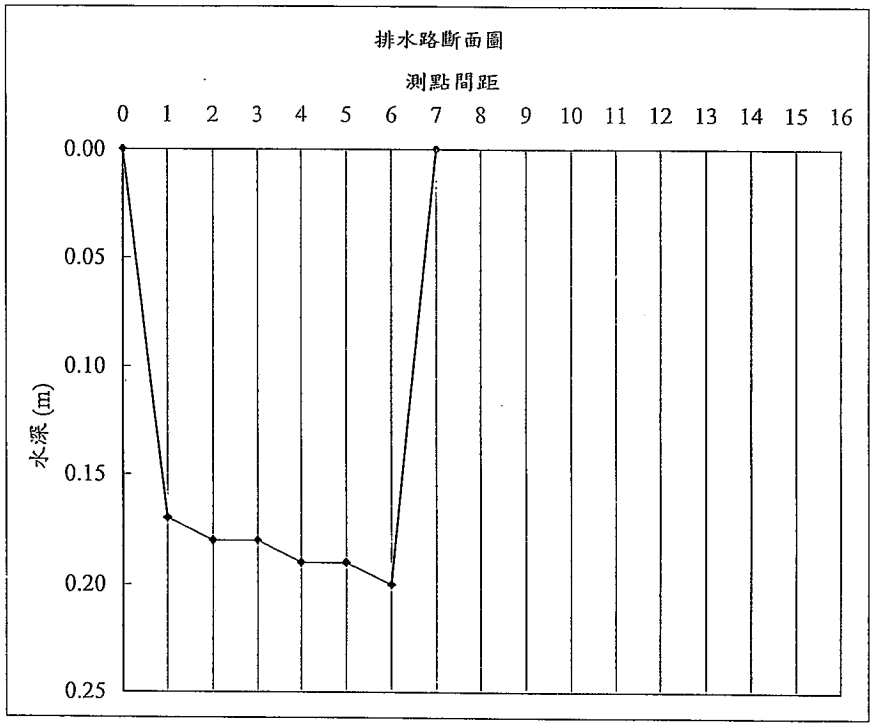

審核人員: 謝志遠 6/5 崔換榮 6/6

附錄 IV.5-67 流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測
監測日期: 2012 年 06 月 05 日
測點名稱: 宿舍區排水口
河　寬: 6.0 公尺
測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.0 公尺

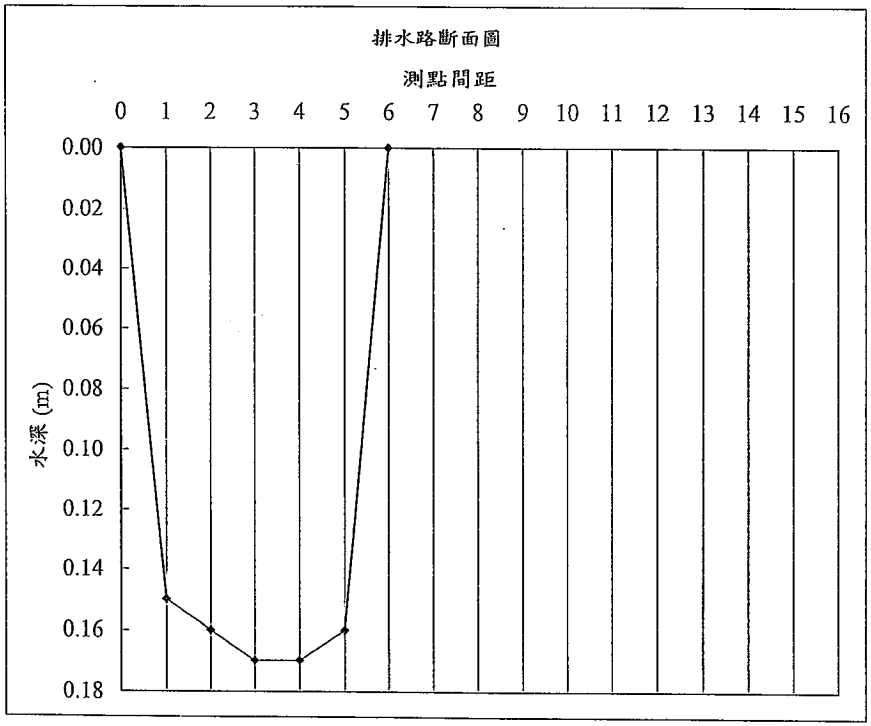

審核人員: 謝志遠 6/5 崔煥榮 6/6

附錄 IV.5-66 流量現場記錄與計算表

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 06 月 05 日
測點名稱: 宿舍區排水口　　流速計編號:
河　寬: 6 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1		邊坡間距 b'(m)		0	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.01
1	0.15		0.26		0.00	0.26	--	0.04
2	0.16		0.26		0.00	0.26	0.0%	0.04
3	0.17		0.27		0.00	0.27	3.8%	0.05
4	0.17		0.28		0.00	0.28	3.7%	0.05
5	0.16		0.27		0.00	0.27	3.6%	0.00
6	0.00		0.00		0.00	0.00		
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							--	--
總流量 Q (m^3/sec)								0.19

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測
若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。
平均流速變化率(%)： $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$

3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，$V_n=V_{0.6}$。
(2)水深＞0.4 m時，$V_n=(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。
其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。


4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n)+\frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 謝志遠 6/5 崔煥榮 6/6

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-69 流量現場記錄與計算表(續)

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測
監測日期: 2012 年 06 月 05 日
測點名稱: 鹽寮一號橋
河　　寬: 6.7 公尺
測點間距: 1.0 公尺　　邊坡間距: 0.7 公尺

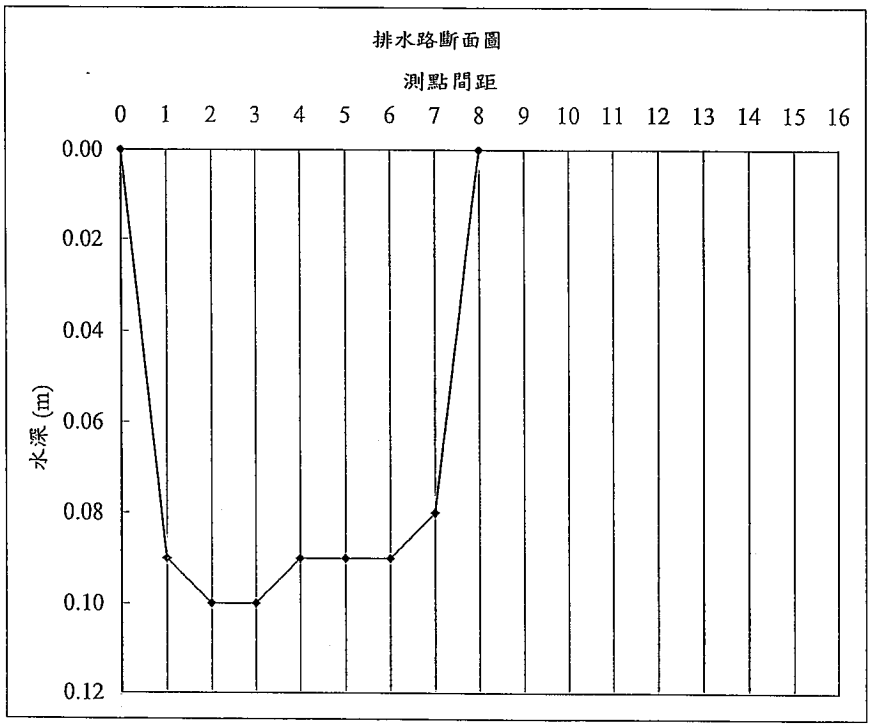

審核人員: 謝志遠 6/5 崔煥榮 6/6

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.5-68 流量現場記錄與計算表

計畫名稱: 核能四廠發電工程施工期間環境監測　　監測日期: 2012 年 06 月 05 日
測點名稱: 鹽寮一號橋　　流速計編號:
河　　寬: 6.7 公尺　　監測人員: 劉懷智

測點間距 b(m)	1		邊坡間距 b'(m)		0.7	平均流速	平均流速變化率	區間流量
測點編號	水深H (m)	流速$V_{0.2}$ (m/sec)	流速$V_{0.6}$ (m/sec)	流速$V_{0.8}$ (m/sec)	$(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ (m/sec)	V (m/sec)	△V (%)	q (m^3/sec)
0	0.00		0.00		0.00	0.00	--	0.00
1	0.09		0.10		0.00	0.10	--	0.01
2	0.10		0.11		0.00	0.11	10.0%	0.01
3	0.10		0.11		0.00	0.11	0.0%	0.01
4	0.09		0.10		0.00	0.10	9.1%	0.01
5	0.09		0.09		0.00	0.09	10.0%	0.01
6	0.09		0.09		0.00	0.09	0.0%	0.01
7	0.08		0.09		0.00	0.09	0.0%	0.00
8	0.00		0.00		0.00	0.00		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16							--	---
總流量 Q (m^3/sec)								0.06

備註：1.本方法是依照NIEA W022.51C 水量測定方法－流速計法 所制定。

2.河寬小於15公尺時，測點間距以1公尺為基準; 河寬大於15公尺以上時，設定 15 個以上之等間隔測若各測定點間之流速變化大於 20 % 以上時，則應縮小其間隔。

平均流速變化率(%)： $\Delta V_n = \frac{V_n - V_{n-1}}{V_{n-1}} \times 100\%$

3.流速之測定：(1)水深≦0.4 m時，$V_n=V_{0.6}$。

(2)水深＞0.4 m時，$V_n=(V_{0.2}+V_{0.8})/2$ 。

其中$V_{0.2}$、$V_{0.6}$、$V_{0.8}$係指水面開始至 20%、60%、80%水深處之流速。

4.$Q=q_1+q_2+q_3+\cdots\cdots+q_n+\cdots\cdots+q_{m+1}=\frac{b}{4}\sum_{n=1}^{m}(H_{n-1}+H_n)(V_{n-1}+V_n)+\frac{b'}{4}(H_m+H_{m+1})(V_m+V_{m+1})$

審核人員: 謝志遠 6/5 崔煥榮 6/6

FORM-TESP-PW-022-01 版次：3.2 發行日期：2011.12.01

附　錄　Ⅳ.6

地下水監測成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-1 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIUW120329AC0、FIUW120405CC6、FIUW120405CC7、FIUW120405CC8、FIUW120405CD0、FIUW120405CD2

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：地下水
樣品編號：PG4004401~02,16001~02,16101~02、PG4016201,03,16301~02,16401~02
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：監測井

採樣時間：101年04月02日11時15分
至：101年04月17日14時00分
收樣時間：101年04月02日17時49分
至：101年04月17日18時33分
報告日期：101年05月03日
報告編號：PG/2012/40044A
聯絡人：張簪芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/麥方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
2.本報告共9頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得地下水採樣(NIEA W103.54B)之許可。
7.報告編號PG/2012/40044A取代原本PG/2012/40044。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚覲[illegible]
檢驗室主管：實驗室主任郭淑清

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956905

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-2 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號： PG4004401~02,16001~02,16101~02,16201,03,16301~02

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PG4004401 GM11 (342300;2771693)	PG4004402 P5-I (343337;2770959)	PG4016001 P8-I' (343723;2769755)	PG4016002 GM12 (342665;2771253)	PG4016101 GM9 (343623;2769385)	PG4016102 GM10 (344193;2769036)	PG4016201 GM2 (343631;2772082)	PG4016203 GM3-1 (343228;2771354)	PG4016301 GM7 (343014;2770211)	PG4016302 GM14-1 (343168;2770141)
	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	22.0	25.7	23.1	22.4	23.0	23.4	23.4	24.0	22.1	21.9
	2	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	6.273	6.489	6.904	6.014	5.483	7.855	6.734	6.311	7.705	7.080
	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	224	382	331	292	115	900	235	427	748	761
	4	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	5.0	0.25	9.7	6.1	7.9	8.0	8.0	5.1	4.8	8.0
*	5	氯鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	21.6	33.8	28.1	22.8	22.0	170	25.6	22.0	22.8	24.0
*	6	硫酸鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	10.3	21.8	25.7	34.2	8.14	31.2	11.9	76.3	53.5	101
	7	懸浮固體(備註2.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	5.2	<1.0	9.8	9.7	8.1	8.4	8.2	5.4	5.6	8.6
	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
*	9	總有機碳	NIEA W532.52C	0.1	mg/L	0.9	0.4	0.6	0.3	0.9	0.6	0.6	0.8	0.3	0.5
	10	化學需氧量	NIEA W515.54A	1.9	mg/L	ND	ND	2.7	1.9	4.9	2.1	7.0	2.8	3.2	ND
*	11	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	<0.05(0.03)	<0.05(0.01)	ND	ND	ND	<0.05(0.04)	<0.05(0.01)	0.67	0.17	0.21
	12	硫化物	NIEA W433.51A	0.01	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	13	總硬度	NIEA W208.51A	1.6	mg/L	75.2	140	118	89.7	18.1	243	56.3	159	158	324
*	14	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	<0.100(0.026)	<0.100(0.032)	<0.100(0.040)	<0.100(0.039)	<0.100(0.045)	<0.100(0.034)	0.877	2.31	<0.100(0.033)	0.403
*	15	錳	NIEA W311.52C	0.002	mg/L	0.242	<0.020(0.018)	0.138	<0.020(0.010)	0.032	0.133	3.90	<0.020(0.008)	0.046	
*	16	銀	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	<0.020(0.007)	<0.020(0.006)	ND	0.020	ND	ND	ND	<0.020(0.004)
*	17	鉛	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	<0.020(0.006)	<0.020(0.005)	<0.020(0.005)	<0.020(0.005)	ND	<0.020(0.005)	ND	<0.020(0.006)
*	18	鎘	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	19	鉻	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	ND	ND	<0.020(0.006)	<0.020(0.004)	<0.020(0.003)	<0.020(0.004)	<0.020(0.003)	<0.020(0.003)	<0.020(0.004)	<0.020(0.004)
*	20	銅	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	<0.020(0.009)	ND	<0.020(0.004)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	21	鋅	NIEA W311.52C	0.010	mg/L	0.034	0.021	0.031	0.022	<0.020(0.011)	<0.020(0.017)	<0.020(0.013)	0.046	<0.020(0.010)	<0.020(0.012)
*	22	砷	NIEA W434.53B	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.0020(0.0009)	ND	ND
*	23	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
-	-	-	-	採樣日期：		4月2日	4月2日	4月13日	4月13日	4月14日	4月14日	4月15日	4月15日	4月16日	4月16日
-	-	-	-	採樣時間：		11:15	15:45	10:20	15:00	12:20	13:40	11:55	15:20		16:52
-	-	-	-	天氣：		晴	晴	晴	晴	陰	陰	陰	晴		陰

備註 1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
2.PG4004402懸浮固體樣品以全量過濾分析。

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956906

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-3　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號： PG4016401~02

認證	序號	樣品編號		MDL	單位	PG4016401	PG4016402	-	-	-	-	-	-	-	-
		檢驗項目	檢驗方法			GM13 (342766;2770400)	GM6-1 (343038,2772087)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	22.1	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	5.941	7.709	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	164	446	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	8.2	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*	5	氟鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	20.6	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-
*	6	硫酸鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	9.80	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	懸浮固體	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	9.0	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.2	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
*	9	總有機碳	NIEA W532.52C	0.1	mg/L	0.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	化學需氧量	NIEA W515.54A	1.9	mg/L	10.9	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
*	11	氰氫	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	硫化物	NIEA W433.51A	0.01	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	13	總硬度	NIEA W208.51A	1.6	mg/L	48.8	204	-	-	-	-	-	-	-	-
*	14	鎘	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	<0.100(0.041)	<0.100(0.024)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	15	鉛	NIEA W311.52C	0.002	mg/L	<0.020(0.011)	<0.020(0.004)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	16	銀	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	17	銅	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	<0.020(0.006)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	18	鎳	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	19	鉻	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	<0.020(0.003)	<0.020(0.004)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	20	鋼	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	21	鋅	NIEA W311.52C	0.010	mg/L	<0.020(0.017)	0.056	-	-	-	-	-	-	-	-
*	22	砷	NIEA W434.53B	0.0004	mg/L	ND	<0.0020(0.0014)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	23	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	4月17日	4月17日	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	12:30	13:45	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	陰	-	-	-	-	-	-	-	-

備註 1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956907

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-4　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼： FIUW120427BW6、FIUW120427BW8、FIUW120504AF5、FIUW120504AF7、FIUW120504AG1、FIUW120504AF2

委託單位： 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司

計畫名稱： 核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

樣品基質： 地下水

樣品編號： PG5004201~02,4101~02,7501~02、PG5007601~02,7701~02,7801~02

採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點： 監測井

採樣時間： 101年05月05日09時50分
至： 101年05月10日12時55分

收樣時間： 101年05月05日15時58分
至： 101年05月10日16時04分

報告日期： 101年05月31日

報告編號： PG/2012/50042

聯絡人： 張簪芸

電話/傳真： 02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：
1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
2.本報告共9頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得地下水採樣(NIEA W103.54B)之許可。

聲明書：
(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，並願接受法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚
檢驗室主管

實驗室 主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958448

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-5　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號： PG5004201~02、4101~02、7501~02、7601~02、7701~02

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PG5004201 GM10 (344193;2769036)	PG5004202 GM9 (343623;2769385)	PG5004101 GM2 (343631;2772082)	PG5004102 GM3-1 (343228;2771354)	PG5007501 P5-1 (343337;2770959)	PG5007502 GM11 (342300;2771693)	PG5007601 P8-1' (343723;2769755)	PG5007602 GM12 (342665;2771253)	PG5007701 GM7 (343014;2770211)	PG5007702 GM14-1 (343168;2770141)
	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	25.1	22.1	25.1	26.3	25.0	23.7	25.7	22.6	26.3	24.9
	2	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	7.573	5.593	6.721	6.198	6.004	6.166	6.901	5.398	7.550	6.936
	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	1250	113	222	394	210	189	346	193	745	762
	4	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	0.40	8.0	2.5	8.1	9.6	1.0	8.6	4.0	0.70	4.0
*	5	氨鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	262	20.2	25.7	19.7	22.8	20.6	27.4	20.5	21.9	22.4
*	6	硫酸鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	45.9	8.32	11.8	67.2	11.0	7.80	20.0	38.0	52.7	123
	7	懸浮固體(備註2.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	<1.0	8.3	2.6	8.8	9.8	1.1	8.9	4.2	<1.0	4.2
	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	3.9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
*	9	總有機碳	NIEA W532.52C	0.1	mg/L	0.8	0.4	0.2	0.8	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.6
	10	化學需氧量	NIEA W515.54A	1.9	mg/L	8.3	ND	ND	4.4	4.9	ND	3.1	3.3	4.0	3.5
*	11	氰氫	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	0.17	ND	<0.05(0.02)	0.76	<0.05(0.03)	ND	<0.05(0.02)	ND	0.21	0.19
	12	硫化物	NIEA W433.51A	0.01	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	13	總硬度	NIEA W208.51A	1.6	mg/L	302	16.6	60.8	155	68.8	55.3	128	48.0	146	345
*	14	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	<0.100(0.017)	0.195	0.969	1.41	<0.100(0.031)	<0.100(0.031)	<0.100(0.037)	<0.100(0.038)	<0.100(0.023)	0.596
*	15	錳	NIEA W311.52C	0.002	mg/L	<0.020(0.011)	<0.020(0.003)	0.130	3.17	<0.020(0.009)	0.189	0.039	0.073	<0.020(0.006)	0.056
*	16	鎳	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	<0.020(0.006)	ND	<0.020(0.015)	<0.020(0.006)	ND	ND	<0.020(0.006)	<0.020(0.005)	ND	ND
*	17	鉛	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	<0.020(0.011)	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020(0.006)	ND	<0.020(0.005)
*	18	鎘	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	19	鉻	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	ND	ND	ND	ND	<0.020(0.003)	<0.020(0.003)	<0.020(0.004)	<0.020(0.005)	<0.020(0.004)	<0.020(0.003)
*	20	銅	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	21	鋅	NIEA W311.52C	0.010	mg/L	0.046	<0.020(0.015)	0.023	<0.020(0.012)	<0.020(0.017)	0.020	0.022	0.026	0.040	ND
*	22	砷	NIEA W434.53B	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	<0.0020(0.0007)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	23	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
-	-	-	-	採樣日期：		5月5日	5月5日	5月6日	5月6日	5月7日	5月7日	5月8日	5月8日	5月9日	5月9日
-	-	-	-	採樣時間：		09:50	11:50	11:25	15:10	09:36	09:15	14:20	12:20	17:00	
-	-	-	-	天氣：		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	陰	陰	

備註
1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
2.PG5004201,4101,7502,7602,7701~02懸浮固體樣品以全量過濾分析。

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958456

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-6　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號： PG5007801~02

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PG5007801 GM13 (342766;2770400)	PG5007802 GM6-1 (343038,2772087)	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	22.7	19.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	5.630	7.615	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	127	423	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	4.6	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
*	5	氨鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	21.8	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-
*	6	硫酸鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	8.71	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	懸浮固體(備註2.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	6.8	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
*	9	總有機碳	NIEA W532.52C	0.1	mg/L	0.7	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	化學需氧量	NIEA W515.54A	1.9	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	11	氰氫	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	ND	<0.05(0.01)	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	硫化物	NIEA W433.51A	0.01	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	13	總硬度	NIEA W208.51A	1.6	mg/L	26.8	192	-	-	-	-	-	-	-	-
*	14	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	<0.100(0.051)	<0.100(0.030)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	15	錳	NIEA W311.52C	0.002	mg/L	<0.020(0.016)	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	16	鎳	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	17	鉛	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	18	鎘	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	19	鉻	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	20	銅	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
*	21	鋅	NIEA W311.52C	0.010	mg/L	ND	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-
*	22	砷	NIEA W434.53B	0.0004	mg/L	ND	<0.0020(0.0014)	-	-	-	-	-	-	-	-
*	23	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣日期：		5月10日	5月10日	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣時間：		12:55	14:30	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	天氣：		陰	陰	-	-	-	-	-	-	-	-

備註
1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
2.PG5007802懸浮固體樣品以全量過濾分析。

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6958457

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-7　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIUW120528BG6、FIUW120528BG7、FIUW120528BG8、FIUW120528BG9、FIUW120528BH0、FIUW120528BH1、

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

樣品基質：地下水

樣品編號：PG6000201~02,00301~02,00401~02、PG6000501~02,00601~02,00701~02

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：監測井

採樣時間：101年06月02日11時15分 至：101年06月09日14時45分

收樣時間：101年06月02日14時01分 至：101年06月09日15時55分

報告日期：101年06月20日

報告編號：PG/2012/60002

聯絡人：張清珠

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)
2.本報告共9頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得地下水採樣(NIEA W103.54B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實罪及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀虎

檢驗室主管：

實驗室主任郭淑清

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

（第1頁，共9頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959520

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-8　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PG6000201~02、00301~02、00401~02、00501~02、00601~02

認證	序號	樣品編號 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PG6000201 GM9 (343623;2769385)	PG6000202 GM10 (344193;2769036)	PG6000301 GM2 (343631;2772082)	PG6000302 GM3-1 (343228;2771354)	PG6000401 P8-1' (343723;2769755)	PG6000402 GM12 (342665;2771253)	PG6000501 GM11 (342300;2771693)	PG6000502 P5-1 (343337;2770959)	PG6000601 GM7 (343014;2770211)	PG6000602 GM14-1 (343168;2770141)
	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	23.9	25.0	24.6	24.5	25.3	23.5	23.6	26.1	25.7	25.4
	2	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	5.667	7.564	6.526	6.152	6.472	5.130	6.187	6.317	7.529	6.897
	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	112	1260	221	397	283	190	206	346	760	796
	4	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	9.2	0.65	7.6	9.1	7.8	2.7	2.7	0.30	0.70	5.1
*	5	氯鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	18.5	260	25.3	19.3	24.5	20.2	21.0	33.7	20.1	21.3
*	6	硫酸鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	8.27	44.3	11.7	64.5	17.2	38.4	8.97	19.2	49.2	110
	7	懸浮固體	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	9.7	<1.0	8.4	9.6	8.8	4.2	2.8	<1.0	<1.0	5.5
	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	<1.0	1.1	<1.0	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
*	9	總有機碳	NIEA W532.52C	0.1	mg/L	0.7	0.4	0.3	0.9	1.0	1.1	0.3	0.2	<0.2(0.1)	0.9
	10	化學需氧量	NIEA W515.54A	1.9	mg/L	3.4	3.7	ND	5.9	7.1	7.4	ND	ND	ND	ND
*	11	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	<0.05(0.03)	0.14	<0.05(0.02)	0.84	<0.05(0.01)	<0.05(0.02)	ND	ND	0.22	0.24
	12	硫化物	NIEA W433.51A	0.01	mg/L	0.07	<0.04(0.03)	<0.04(0.02)	<0.04(0.03)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	13	總硬度	NIEA W208.51A	1.6	mg/L	20.2	301	61.5	154	102	33.5	66.9	117	154	354
*	14	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	<0.100(0.055)	<0.100(0.029)	1.01	2.74	ND	0.108	<0.100(0.026)	<0.100(0.021)	<0.100(0.029)	<0.100(0.047)
*	15	錳	NIEA W311.52C	0.002	mg/L	<0.020(0.002)	<0.020(0.012)	0.129	4.06	0.089	0.061	0.195	<0.020(0.010)	<0.020(0.007)	0.039
*	16	鎳	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	ND	<0.020(0.005)	<0.020(0.006)	ND	ND	ND	ND
*	17	鉛	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	18	鎘	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	19	鉻	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	<0.020(0.003)	<0.020(0.003)	ND	ND	ND
*	20	銅	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	<0.020(0.006)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	21	鋅	NIEA W311.52C	0.010	mg/L	ND	ND	ND	<0.020(0.017)	<0.020(0.012)	0.038	<0.020(0.017)	ND	ND	ND
*	22	砷	NIEA W434.53B	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	0.0024	ND	ND	ND	ND	ND	ND
*	23	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
-	-	-	-	採樣日期：		6月2日	6月2日	6月3日	6月3日	6月6日	6月6日	6月7日	6月7日	6月8日	6月8日
-	-	-	-	採樣時間：		11:15	12:40	11:30	15:10	10:00	14:45	12:50	13:20	15:20	16:55
-	-	-	-	天氣：		陰	陰	陰	陰	陰	陰	晴	晴	晴	晴
備註	1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。														

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

（第2頁，共9頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959599

樣品編號： PG6000701~02

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PG6000701 GM13 (342766;2770400)	PG6000702 GM6-1 (343038,2772087)	-	-	-	-	-	-	-
	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	25.4	23.5	-	-	-	-	-	-	-
	2	pH(備註1.)	NIEA W424.52A	-	-	5.764	7.504	-	-	-	-	-	-	-
	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	142	461	-	-	-	-	-	-	-
	4	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	2.9	3.1	-	-	-	-	-	-	-
*	5	氟鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	19.1	14.0	-	-	-	-	-	-	-
*	6	硫酸鹽	NIEA W415.52B	0.04	mg/L	8.46	15.0	-	-	-	-	-	-	-
	7	懸浮固體	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	4.0	6.2	-	-	-	-	-	-	-
	8	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	-	-	-	-	-	-	-
*	9	總有機碳	NIEA W532.52C	0.1	mg/L	0.8	1.2	-	-	-	-	-	-	-
	10	化學需氧量	NIEA W515.54A	1.9	mg/L	ND	2.9	-	-	-	-	-	-	-
*	11	氨氮	NIEA W437.51C	0.01	mg/L	<0.05(0.03)	ND	-	-	-	-	-	-	-
	12	硫化物	NIEA W433.51A	0.01	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	13	總硬度	NIEA W208.51A	1.6	mg/L	31.8	214	-	-	-	-	-	-	-
*	14	鐵	NIEA W311.52C	0.017	mg/L	<0.100(0.028)	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	15	錳	NIEA W311.52C	0.002	mg/L	0.022	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	16	鎳	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	17	鋁	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	18	鎘	NIEA W311.52C	0.001	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	19	鋅	NIEA W311.52C	0.003	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	20	銅	NIEA W311.52C	0.004	mg/L	<0.020(0.017)	ND	-	-	-	-	-	-	-
*	21	鉻	NIEA W311.52C	0.010	mg/L	ND	<0.020(0.019)	-	-	-	-	-	-	-
*	22	砷	NIEA W434.53B	0.0004	mg/L	ND	<0.0020(0.0013)	-	-	-	-	-	-	-
*	23	汞	NIEA W330.52A	0.0002	mg/L	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	6月9日	6月9日	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	13:05	14:30	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	晴	晴	-	-	-	-	-	-	-

備註：1.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境事業部 環驗報告專用章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6959522

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 | t (886-2) 2299-3939 | f (886-2) 2299-3230 | www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

1002

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.6-10　監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測　採樣日期：2012 年 4 月 2 日

採樣地點：調查評價　採樣人員：龍小豪 翁

井　號：P5-1　井篩深度：

井位座標：E: 321321　N: 2770959　(□TWD 67 □TWD 97 □　　)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水□非標準井有蓋無鎖　　)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH 111 EC T-10

洗井紀錄資料

洗井開始時間：11 時 50 分；洗井結束時間：15 時 40 分

井管內徑： 4 (inch)	水位面至井口深度：6.164 (m)	井底至井口深度：29.965 (m)
井水深度： 23.781 (m)	井水體積： 192.616 (L)	預估洗井時間： 23 L (min)
泵進水口深度：21.00 (m)	抽水速率： 2.5 (L/min)	水位洩降： 水 (m)
井篩長度： 水 (m)	水流元容積： 水 (L)	現場儀器量測頻率：水 (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於 min 變為 L/min)】
B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於 min 變為 L/min)】
C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) □蠕心式抽水泵 □氣囊式抽水泵( ) □其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 11:50	2.5	6.164	1	6.203	162.4			無色無味
(洗井中) 13:08	〃	6.339	194	6.794	341.1			〃
(洗井中) 13:41	〃	6.441	294	6.336	368			〃
(洗井中) 14:26	〃	6.469	388	6.371	372			〃
(洗井中) 15:05	〃	6.532	488	6.415	378			〃
(洗井後) 15:40	〃	6.596	582	6.447	380			〃
(採樣時) 15:45	4	6.604	670	6.489 / 25.1℃	382			〃

汲出水總體積：570 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：6.596 (m)

採樣資料【開始時間：15 時 45 分，結束時間：15 時 55 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他　採樣器放置深度：29.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙
□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非蠕氣龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。
□其它

FORM-TESP-PW-103-01　版次：2.7　發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥燊 4/3

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-12

監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測　採樣日期：2012 年 4 月 13 日

採樣地點：調查評析團　採樣人員：劉懷智

井　號：P8-1　井篩深度：

井位座標：E：343723　N：2769755　(☑TWD □67 ☑97 □_____)

資料來源：☑監測井告示牌 □業主提供 □無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 □否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：pH709 EC707

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 30 分；洗井結束時間：10 時 18 分

井管內徑：2 (inch)	水位面至井口深度：1.944 (m)	井底至井口深度：9.272 (m)
井水深度：7.328 (m)	井水體積：14.656 (L)	預估洗井時間：44 (min)
泵進水口深度：9.000 (m)	抽水速率：1 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:30	1	1.944	1	6.682	412			黃濁無味
(洗井中) 09:46	〃	1.955	16	6.790	360			〃
(洗井中) 09:54	〃	1.959	24	6.847	339			〃
(洗井中) 10:02	〃	1.964	32	6.887	334			〃
(洗井中) 10:10	〃	1.970	40	6.894	332			無色無味
(洗井後) 10:18	〃	1.975	48	6.907	330			〃
(採樣時) 10:20	〃	1.983	15	6.904/23.1 6.904/23.1 6.904/23.1 °C	331			〃

汲出水總體積：63 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：1.975 (m)

採樣資料【開始時間：10 時 20 分，結束時間：10 時 35 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：7.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 4/16

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-11

監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測　採樣日期：2012 年 4 月 2 日

採樣地點：調查評析團　採樣人員：劉懷智

井　號：GW11　井篩深度：

井位座標：E：342300　N：2771693　(☑TWD □67 ☑97 □_____)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：pH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：08 時 30 分；洗井結束時間：11 時 12 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：14.388 (m)	井底至井口深度：36.905 (m)
井水深度：22.517 (m)	井水體積：182.387 (L)	預估洗井時間：219 (min)
泵進水口深度：24.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 08:30	2.5	14.388	1	5.906	197.3			無色無味
(洗井中) 09:44	〃	14.553	184	6.082	208			〃
(洗井中) 10:21	〃	14.617	276	6.143	217			〃
(洗井中) 10:58	〃	14.689	368	6.198	220			〃
(洗井中) 11:35	〃	14.747	460	6.236	223			〃
(洗井後) 11:12	〃	14.817	552	6.251	223			〃
(採樣時) 11:15	〃	14.814	15	6.273/22.0 6.273/22.0 6.273/22.0 °C	224			〃

汲出水總體積：567 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：14.817 (m)

採樣資料【開始時間：11 時 15 分，結束時間：11 時 25 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：14.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 4/13

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-14

監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測　採樣日期：2012 年 4 月 14 日

採樣地點：調查詳新圖　採樣人員：劉懷智

井　號：GM9　井篩深度：

井位座標：E：343623　N：2769387　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐　)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：WT12 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：10 時 30 分；洗井結束時間：12 時 17 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：3.124 (m)	井底至井口深度：17.627 (m)
井水深度：10.503 (m)	井水體積：85.094 (L)	預估洗井時間：103 (min)
泵進水口深度：11.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 10:30	2.5	3.124	1	5.664	114.9			無色無味
(洗井中) 11:05	〃	3.198	87	5.591	114.8			〃
(洗井中) 11:23	〃	3.233	130	5.547	114.8			微濁無味
(洗井中) 11:41	〃	3.269	173	5.511	114.7			〃
(洗井中) 11:59	〃	3.301	216	5.506	114.7			〃
(洗井後) 12:17	〃	3.334	259	5.494	114.6			〃
(採樣時) 12:20	〃	3.342	15	5.483/23.0 5.483/23.0 ℃	114.7			〃

汲出水總體積：214 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：3.334 (m)

採樣資料【開始時間：12 時 20 分，結束時間：12 時 30 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：11.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01　版次：2.7　發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 4/16

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-13

監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測　採樣日期：2012 年 4 月 13 日

採樣地點：調查詳新圖　採樣人員：劉懷智

井　號：GM12　井篩深度：

井位座標：E：342665　N：2771253　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐　)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 ☐否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：WT09 ECT07

洗井紀錄資料

洗井開始時間：13 時 00 分；洗井結束時間：14 時 59 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：11.614 (m)	井底至井口深度：27.396 (m)
井水深度：11.782 (m)	井水體積：95.434 (L)	預估洗井時間：115 (min)
泵進水口深度：21.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 13:00	2.5	11.614	1	5.463	211			無色無味
(洗井中) 13:39	〃	11.690	97	5.827	262			〃
(洗井中) 13:59	〃	11.727	145	5.941	283			〃
(洗井中) 14:19	〃	11.763	193	5.983	288			〃
(洗井中) 14:39	〃	11.798	241	5.988	290			〃
(洗井後) 14:59	〃	11.834	289	5.992	292			〃
(採樣時) 15:00	〃	11.841	15	6.014/24.6 6.014/24.6 6.014/24.6 ℃	292			〃

汲出水總體積：304 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：11.834 (m)

採樣資料【開始時間：15 時 00 分，結束時間：15 時 10 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：21.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01　版次：2.7　發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 4/16

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-16 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測　採樣日期：2012 年 4 月 16 日

採樣地點：調查評析區　採樣人員：劉懷智

井　號：GW17　井篩深度：

井位座標：E：344014　N：2770211　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：08 時 30 分；洗井結束時間：12 時 18 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：9.606 (m)	井底至井口深度：32.648 (m)
井水深度：23.042 (m)	井水體積：186.640 (L)	預估洗井時間：224 (min)
泵進水口深度：30.000 (m)	抽水速率：2-5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：4 (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 08:30	2.5	9.606	1	7.602	791			無色無味
(洗井中) 09:46	〃	9.773	188	7.647	770			〃
(洗井中) 10:24	〃	9.852	282	7656	761			〃
(洗井中) 11:02	〃	9.933	376	7.682	755			〃
(洗井中) 11:40	〃	10.018	470	7.690	754			〃
(洗井後) 12:18	〃	10.097	564	7.699	750			〃
(採樣時) 12:20	〃	10.105	15	7.705/22.1 7.705/22.1 7.705/22.1℃	748			〃

汲出水總體積：564 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：10.097 (m)

採樣資料【開始時間：12 時 20 分，結束時間：12 時 30 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：30.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐非內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 4/17

附4.6-8

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-15 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測　採樣日期：2012 年 4 月 14 日

採樣地點：調查評析區　採樣人員：劉懷智

井　號：GW15　井篩深度：

井位座標：E：344193　N：2769036　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：12 時 50 分；洗井結束時間：13 時 37 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：17.647 (m)	井底至井口深度：21.992 (m)
井水深度：4.345 (m)	井水體積：35.194 (L)	預估洗井時間：43 (min)
泵進水口深度：19.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 12:50	2.5	17.647	1	7.713	635			無色無味
(洗井中) 13:05	〃	17.679	37	7.747	742			〃
(洗井中) 13:13	〃	17.688	55	7.810	867			〃
(洗井中) 13:21	〃	17.698	73	7.836	889			〃
(洗井中) 13:29	〃	17.706	91	7.847	894			〃
(洗井後) 13:37	〃	17.715	109	7.851	898			〃
(採樣時) 13:40	〃	17.723	15	7.855/23.4 7.855/23.4 7.855/23.4℃	900			〃

汲出水總體積：124 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：17.715 (m)

採樣資料【開始時間：13 時 40 分，結束時間：13 時 50 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：19.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐非內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 4/16

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-18 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析(3) 採樣日期：2012 年 4 月 17 日

採樣地點： 採樣人員：劉懷智

井　號：GM13 井篩深度：

井位座標：E：342766 N：2770400 (☑TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無 天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 ☐否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：WQT12 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 00 分；洗井結束時間：12 時 29 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：16.142 (m)	井底至井口深度：32.951 (m)
井水深度：16.809 (m)	井水體積：136.152 (L)	預估洗井時間：205 (min)
泵進水口深度：X (m)	抽水速率：X (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於 min 變為 L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於 min 變為 L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☑貝勒管(點源式) ☐離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵( ) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:00	2	16.142	1	5.836	182.4			無色無味
(洗井中) 10:09	1	16.259	138	5.884	174.8			微濁無味
(洗井中) 10:44	1	16.307	207	5.909	170.9			微(3)濁無味
(洗井中) 11:19	1	16.359	276	5.926	168.2			〃
(洗井中) 11:54	1	16.412	345	5.931	165.7			〃
(洗井後) 12:29	1	16.461	414	5.937	164.3			〃
(採樣時) 12:30	1	16.469	15	5.941/22.1 5.941/22.1 5.941/22.1 ℃	163.5			〃

汲出水總體積：429 (L) 洗井結束時水位面至井口深度：16.461 (m)

採樣資料【開始時間：12 時 30 分，結束時間：12 時 40 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他 採樣器放置深度：30.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15 審核人員：崔煥榮 4/18

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-17 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析(3) 採樣日期：2012 年 4 月 16 日

採樣地點： 採樣人員：劉懷智

井　號：GM14-1 井篩深度：

井位座標：E：343168 N：2770141 (☑TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無 天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：WQT12 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：12 時 50 分；洗井結束時間：16 時 50 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：5.402 (m)	井底至井口深度：29.785 (m)
井水深度：24.383 (m)	井水體積：199.502 (L)	預估洗井時間：238 (min)
泵進水口深度：29.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於 min 變為 L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於 min 變為 L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵( ) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 12:50	2.5	5.402		7.156	695			微濁無味
(洗井中) 14:10	〃	5.578	199	7.141	736			〃
(洗井中) 14:50	〃	5.655	298	7.129	750			無色無味
(洗井中) 15:30	〃	5.737	397	7.101	754			〃
(洗井中) 16:10	〃	5.815	496	7.104	759			〃
(洗井後) 16:50	〃	5.898	595	7.092	760			〃
(採樣時) 16:52	〃	5.907	15	2.080/61.9 2.080/61.9 2.080/61.9 ℃	761			〃

汲出水總體積：610 (L) 洗井結束時水位面至井口深度：5.898 (m)

採樣資料【開始時間：16 時 52 分，結束時間(3)16 時 58 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他 採樣器放置深度：29.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15 審核人員：崔煥榮 4/17

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-20 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境~~監測~~調查評析(第) 採樣日期：2012 年 5 月 5 日

採樣地點： 採樣人員：劉曉春

井　號：GM10 井篩深度：

井位座標：E：344193 N：2769036 (☑TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無 天候狀況：白天

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 00 分；洗井結束時間：09 時 48 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：17.501 (m)	井底至井口深度：21.994 (m)
井水深度：4.488 (m)	井水體積：32.352 (L)	預估洗井時間：66 (min)
泵進水口深度：19.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:00	2.5	~~4.50~~ 17.501	1	7.546	834			無色無味
(洗井中) 09:16	〃	17.505	38	7.547	1136			〃
(洗井中) 09:24	〃	17.506	57	7.551	1207			〃
(洗井中) 09:32	〃	17.548	76	7.562	1229			〃
(洗井中) 09:40	〃	17.559	95	7.568	1236			〃
(洗井後) 09:48	〃	17.571	114	7.570	1241			〃
(採樣時) 09:50	〃	17.519	15	7.573/25.1/25.1/25.1 7.573/25.1 ℃	1249			〃

汲出水總體積：129 (L) 洗井結束時水位面至井口深度：17.571 (m)

採樣資料【開始時間：09 時 56 分，結束時間：10 時 06 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____ 採樣器放置深度：19.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15 審核人員：崔煥榮 5/1

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-19 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測調查評析(第) 採樣日期：2012 年 4 月 17 日

採樣地點： 採樣人員：劉曉春

井　號：GM6-1 井篩深度：

井位座標：E：342564 N：2771327 (☐TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☑監測井告示牌 ☐業主提供 ☐無 天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 ☐否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：13 時 00 分；洗井結束時間：13 時 43 分

井管內徑：2 (inch)	水位面至井口深度：4.435 (m)	井底至井口深度：11.230 (m)
井水深度：6.795 (m)	井水體積：17.59 (L)	預估洗井時間：(第)41 (min)
泵進水口深度：X (m)	抽水速率：X (L/min)	水位洩降：(第)X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☑貝勒管(點源式) ☐離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 13:00	1	4.435	1	7.598	452			無色無味
(洗井中) 13:15	〃	4.445	15	7.634	450			〃
(洗井中) 13:22	〃	4.449	22	7.679	448			〃
(洗井中) 13:29	〃	4.451	29	7.684	448			〃
(洗井中) 13:36	〃	4.454	36	7.698	447			〃
(洗井後) 13:43	〃	4.457	43	7.701	447			〃
(採樣時) 13:45	〃	4.457	15	7.709/19.8/7.709/19.8 7.709/19.8 ℃	446			〃

汲出水總體積：58 (L) 洗井結束時水位面至井口深度：4.457 (m)

採樣資料【開始時間：13 時 45 分，結束時間(第)14 時 00 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____ 採樣器放置深度：9.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15 審核人員：崔煥榮 4/18

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-22 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 6 日

採樣地點：　採樣人員：劉憲爹

井　號：GM2　井篩深度：

井位座標：E：343631　N：2772082　(☑TWD □67 □97 □_____)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 □否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 00 分；洗井結束時間：11 時 24 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：0.564 (m)	井底至井口深度：15.026 (m)
井水深度：14.462 (m)	井水體積：117.142 (L)	預估洗井時間：141 (min)
泵進水口深度：13.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:00	2.5	0.564	1	6.460	226			無色無味
(洗井中) 09:08	〃	0.661	119	6.593	224			〃
(洗井中) 10:12	〃	0.704	178	6.649	224			〃
(洗井中) 10:36	〃	0.746	>237	6.677	223			〃
(洗井中) 11:00	〃	0.793	>296	6.692	223			〃
(洗井後) 11:24	〃	0.841	355	6.714	222			〃
(採樣時) 11:35	2	0.848	15	6.721/25.5 6.724/25.1 6.721/25.1℃	222			〃

汲出水總體積：370 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：0.841 (m)

採樣資料【開始時間：11 時 25 分，結束時間：11 時 35 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：12.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 5/7

附4.6-11

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-21 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境監測(初)評析　採樣日期：2012 年 5 月 5 日

採樣地點：　採樣人員：劉憲爹

井　號：GM9　井篩深度：

井位座標：E：343623　N：2769385　(☑TWD □67 ☑97 □_____)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：10 時 00 分；洗井結束時間：11 時 48 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：2.550 (m)	井底至井口深度：13.265 (m)
井水深度：10.709 (m)	井水體積：86.542 (L)	預估洗井時間：105 (min)
泵進水口深度：11.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 10:00	2.5	2.556	1	5.572	138.6			無色無味
(洗井中) 10:36	1	3.620	88	5.574	121.7			〃
(洗井中) 10:56	1	2.644	132	5.581	117.4			〃
(洗井中) 11:12	1	2.691	176	5.584	115.0			〃
(洗井中) 11:30	1	2.697	220	5.588	114.9			〃
(洗井後) 11:48	1	2.720	>264	5.590	114.7			〃
(採樣時) 11:50	1	2.729	15	5.597/22.1 5.597/22.1 5.597/22.1℃	113.4			〃

汲出水總體積：279 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：2.720 (m)

採樣資料【開始時間：11 時 50 分，結束時間：12 時 00 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：11.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 5/7

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-24

監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2017 年 5 月 7 日

採樣地點：　採樣人員：劉曉春

井　號：PS-1　井篩深度：

井位座標：E：343339 N：2710959 (☑TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☑無　天候狀況：白晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PHTIZ ECTOb

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 30 分；洗井結束時間：09 時 35 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：6.669 (m)	井底至井口深度：29.986 (m)
井水深度：25.317 (m)	井水體積：205.067 (L)	預估洗井時間：5 (min)
泵進水口深度：17.000 (m)	抽水速率：0.5 (L/min)	水位洩降：0.002 (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：0.5 (L)	現場儀器量測頻率：1 (min-次)

(1)洗井方法：A.☐井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☑微洗井【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☐離心式抽水泵 ☑氣囊式抽水泵(　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:30	0.5	6.669	0.5	5.991	223	2.(4)		無色無味
(洗井中) 09:31	〃	6.669	1	5.928	212			〃
(洗井中) 09:32	〃	6.670	1.5	5.911	206			〃
(洗井中) 09:33	〃	6.670	2	5.932	208			〃
(洗井中) 09:34	〃	6.670	2.5	5.961	209			〃
(洗井後) 09:35	〃	6.671	3	5.969	212			〃
(採樣時) 09:36	〃	6.680	15	6.004/25.0 6.004/25.0 6.004/25.0 ℃	210			〃

汲出水總體積：18 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：6.671 (m)

採樣資料【開始時間：09 時 36 分，結束時間：10 時 06 分】

採樣器材：☐貝勒管 ☑同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：17.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 5/8

附4.6-12

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-23

監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2017 年 5 月 6 日

採樣地點：　採樣人員：劉曉春

井　號：GW3-1　井篩深度：

井位座標：E：343208 N：2711354 (☑TWD ☐67 ☑97 ☐)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：白晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PHTIZ ECTOb

洗井紀錄資料

洗井開始時間：12 時 00 分；洗井結束時間：15 時 06 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：2.452 (m)	井底至井口深度：21.199 (m)
井水深度：18.749 (m)	井水體積：151.850 (L)	預估洗井時間：183 (min)
泵進水口深度：19.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 12:00	2.5	2.452	1	5.887	373			無色無味
(洗井中) 12:02	〃	2.590	153	5.946	386			〃
(洗井中) 13:33	〃	2.642	229	5.987	388			〃
(洗井中) 14:04	〃	2.703	305	5.992	390			〃
(洗井中) 14:35	〃	2.756	381	6.124	392			〃
(洗井後) 15:06	〃	2.810	457	6.156	394			〃
(採樣時) 15:10	〃	2.817	15	6.198/26.3 6.198/26.3 6.198/26.3 ℃	394			〃

汲出水總體積：472 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：2.491(復) 2.810 (m)

採樣資料【開始時間：15 時 10 分，結束時間：15 時 20 分】

採樣器材：☐貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：19.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 5/7

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-26 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 8 日
採樣地點：　採樣人員：劉懷春
井　號：GM12　井篩深度：
井位座標：E：342665 N：2771253 (☐TWD ☐67 ☑97 ☐)
資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：晴
環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)
現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)
現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料
洗井開始時間：11 時 30 分；洗井結束時間：14 時 19 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：9.565 (m)	井底至井口深度：23.219 (m)
井水深度：13.714 (m)	井水體積：111.083 (L)	預估洗井時間：167 (min)
泵進水口深度：* (m)	抽水速率：* (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾
(2)洗井設備：☑貝勒管(點源式) ☐離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 11:30	2	9.565	1	4.994	178.6			無色無味
(洗井中) 12:20	〃	9.663	113	5.247	184.1			〃
(洗井中) 12:55	〃	9.701	169	5.281	188.3			〃
(洗井中) 13:27	〃	9.783	225	5.346	190.9			〃
(洗井中) 13:51	〃	9.781	281	5.372	192.1			〃
(洗井後) 14:19	〃	9.818	337	5.386	192.6			〃
(採樣時) 14:20	〃	9.826	15	5.398 /22.6	192.7			〃

汲出水總體積：352 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：9.818 (m)
採樣資料【開始時間：14 時 20 分，結束時間：14 時 30 分】
採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：21.000 (m)
附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙
☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。
☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：5/8 崔煥榮 5/9

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-25 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 7 日
採樣地點：　採樣人員：劉懷春
井　號：GM11　井篩深度：
井位座標：E：342300 N：2771693 (☑TWD ☐67 ☑97 ☐)
資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：晴
環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)
現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)
現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料
洗井開始時間：10 時 40 分；洗井結束時間：13 時 55 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：12.727 (m)	井底至井口深度：36.225 (m)
井水深度：23.498 (m)	井水體積：190.333 (L)	預估洗井時間：229 (min)
泵進水口深度：34.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾
(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 10:40	4	12.727	1	5.267	114.5			無色無味
(洗井中) 11:19	〃	12.904	192	5.749	163.4			〃
(洗井中) 11:58	〃	12.982	288	5.936	170.9			〃
(洗井中) 12:37	〃	13.055	384	5.971	179.4			〃
(洗井中) 13:16	〃	13.114	480	5.993	183.2			〃
(洗井後) 13:55	〃	13.195	576	6.082	187.0			〃
(採樣時) 14:00	〃	13.209	15	6.166 /23.1	188.1			〃

汲出水總體積：591 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：13.195 (m)
採樣資料【開始時間：14 時 00 分，結束時間：14 時 10 分】
採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：34.000 (m)
附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙
☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。
☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 5/8

附錄 IV.6-28 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 7 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GW7　井篩深度：

井位座標：E：243014　N：2770214　(☑TWD □67 ☑97 □_____)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水□非標準井有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：08 時 30 分；洗井結束時間：12 時 18 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：9.538 (m)	井底至井口深度：32.626 (m)
井水深度：23.088 (m)	井水體積：187.012 (L)	預估洗井時間：225 (min)
泵進水口深度：30.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 08:30	2.5	9.538	1	7.731	768			無色無味
(洗井中) 09:46	〃	9.696	189	7.642	754			〃
(洗井中) 10:24	〃	9.763	283	7.607	750			〃
(洗井中) 11:02	〃	9.829	377	7.591	749			〃
(洗井中) 11:40	〃	9.892	471	7.576	748			〃
(洗井後) 12:18	〃	9.954	565	7.562	748			〃
(採樣時) 12:40	〃	9.962	16	7.550 12.3 ℃	745			〃

汲出水總體積：580 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：9.954 (m)

採樣資料【開始時間：12 時 20 分，結束時間：12 時 30 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：30.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

審核人員：崔煥榮 5/10

附錄 IV.6-27 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 8 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：P8-1　井篩深度：

井位座標：E：243723　N：2769755　(☑TWD □67 ☑97 □_____)

資料來源：☑監測井告示牌 □業主提供 □無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 □否 (現場情況描述：□井內積水□非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 20 分；洗井結束時間：10 時 14 分

井管內徑：2 (inch)	水位面至井口深度：0.778 (m)	井底至井口深度：9.255 (m)
井水深度：8.477 (m)	井水體積：16.954 (L)	預估洗井時間：51 (min)
泵進水口深度：7.00 (m)	抽水速率：1 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:20	1	0.778	1	6.682	356			無色無味
(洗井中) 09:38	〃	0.787	18	6.762	353			〃
(洗井中) 09:47	〃	0.794	27	6.847	348			〃
(洗井中) 09:56	〃	0.799	36	6.882	347			〃
(洗井中) 10:05	〃	0.803	45	6.896	347			〃
(洗井後) 10:14	〃	0.807	54	6.903	346			〃
(採樣時) 10:15	〃	0.818	15	6.901 6.901 6.901 25.7 ℃	346			〃

汲出水總體積：69 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：0.807 (m)

採樣資料【開始時間：10 時 15 分，結束時間：10 時 30 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：7.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

審核人員：崔煥榮 5/8

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-30 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 10 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GM13　井篩深度：

井位座標：E：343786　N：2770400　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐_____)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 ☐否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 00 分；洗井結束時間：12 時 54 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：13.892 (m)	井底至井口深度：32.992 (m)
井水深度：19.099 (m)	井水體積：154.902 (L)	預估洗井時間：223 (min)
泵進水口深度：X (m)	抽水速率：X (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☑貝勒管(點源式) ☐離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:00	2	13.892	1	5.502	134.3			無色無味
(洗井中) 10:18	〃	14.009	156	5.547	130.2			〃
(洗井中) 10:57	〃	14.082	234	5.582	129.6			〃
(洗井中) 11:36	〃	14.136	312	5.611	128.4			〃
(洗井中) 12:17	〃	14.198	390	5.617	128.0			〃
(洗井後) 12:54	〃	14.255	468	5.624	127.6			〃
(採樣時) 10:55	〃	14.262	15	5.630/22.9 5.630/22.9 5.630/22.9 ℃	129.3			〃

汲出水總體積：483 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：_____(m)

採樣資料【開始時間：12 時 55 分，結束時間：17 時 05 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：30.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氣囊材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員 崔煥榮 5/11

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-29 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 9 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GM14-1　井篩深度：

井位座標：E：343168　N：2770141　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐_____)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：12 時 50 分；洗井結束時間：16 時 16 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：4.936 (m)	井底至井口深度：29.772 (m)
井水深度：24.836 (m)	井水體積：201.171 (L)	預估洗井時間：242 (min)
泵進水口深度：27.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 12:50	2.5	4.936	1	6.881	784			無色無味
(洗井中) 14:12	〃	5.108	203	6.897	780			〃
(洗井中) 14:53	〃	5.184	304	6.917	773			〃
(洗井中) 15:34	〃	5.258	405	6.934	768			〃
(洗井中) 16:15	〃	5.330	506	6.929	765			〃
(洗井後) 16:56	〃	5.405	607	6.934	764			〃
(採樣時) 17:00	〃	5.417	15	6.936 6.9 6.934 6.9 6.936 /24.9 ℃	762			〃

汲出水總體積：672 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：5.405 (m)

採樣資料【開始時間：17 時 00 分，結束時間：17 時 10 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：29.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氣囊材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 5/10

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-32 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 2 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：G149　井篩深度：

井位座標：E：343623　N：2769385　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐_____)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 30 分；洗井結束時間：11 時 12 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：3.151 (m)	井底至井口深度：13.327 (m)
井水深度：10.176 (m)	井水體積：82.425 (L)	預估洗井時間：99 (min)
泵進水口深度：11.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:30	2.5	3.151	1	5.592	101.2			無色無味
(洗井中) 10:04	〃	3.216	84	5.623	104.7			〃
(洗井中) 10:21	〃	3.245	126	5.647	107.3			〃
(洗井中) 10:38	〃	3.277	168	5.651	109.4			〃
(洗井中) 10:55	〃	3.305	210	5.658	110.9			〃
(洗井後) 11:12	〃	3.337	252	5.661	111.4			〃
(採樣時) 11:15	〃	3.345	15	5.667/23.9 5.669/23.9 5.667/23.9 ℃	112.2			〃

汲出水總體積：267 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：3.345 (m)

採樣資料【開始時間：11 時 15 分，結束時間：11 時 25 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：11.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙
☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

審核人員：崔煥榮 6/6

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-31 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 5 月 10 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：G146-1　井篩深度：

井位座標：E：343564　N：2771327　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐_____)

資料來源：☑監測井告示牌 ☐業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 ☐否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：13 時 40 分；洗井結束時間：14 時 28 分

井管內徑：2 (inch)	水位面至井口深度：3.925 (m)	井底至井口深度：11.231 (m)
井水深度：7.306 (m)	井水體積：14.612 (L)	預估洗井時間：44 (min)
泵進水口深度：X (m)	抽水速率：X (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】
C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☑貝勒管(點源式) ☐離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 13:40	1	3.925	1	7.523	412			無色無味
(洗井中) 13:56	2	3.936	16	7.572	417			〃
(洗井中) 14:04	2	3.941	24	7.594	420			〃
(洗井中) 14:12	2	3.945	32	7.603	420			〃
(洗井中) 14:20	2	3.949	40	7.607	421			〃
(洗井後) 14:28	2	3.954	48	7.611	421			〃
(採樣時) 14:30	2	3.961	15	7.615/19.7 7.615/19.7 7.615/19.7 ℃	423			〃

汲出水總體積：63 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：3.954 (m)

採樣資料【開始時間：14 時 30 分，結束時間：14 時 45 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：9.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙
☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

審核人員：崔煥榮 5/11

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-34 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 06 月 3 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GW12　井篩深度：

井位座標：E：343131　N：2772082　(☑TWD □67□97 □　　)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 □否 (現場情況描述：□井內積水□非標準井　　)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PHT12 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 00 分；洗井結束時間：11 時 25 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：0.423 (m)	井底至井口深度：15.124 (m)
井水深度：14.701 (m)	井水體積：119.078 (L)	預估洗井時間：143 (min)
泵進水口深度：13.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於　　min 變為　　L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於　　min 變為　　L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式)☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:00	2.5	0.423	1	6.493	233			無色無味
(洗井中) 09:49	〃	0.526	121	6.497	229			〃
(洗井中) 10:13	〃	0.573	181	6.504	224			〃
(洗井中) 10:37	〃	0.619	241	6.511	223			〃
(洗井中) 11:01	〃	0.671	301	6.517	223			〃
(洗井後) 11:25	〃	0.719	361	6.521	220			〃
(採樣時) 11:30	〃	0.807	15	6.526/24.6 6.526/24.6 6.526/24.6℃	221			〃

汲出水總體積：376 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：0.719 (m)

採樣資料【開始時間：11 時 30 分，結束時間：11 時 40 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他　　採樣器放置深度：13.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔焕榮 6/4

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-33 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 2 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GW10　井篩深度：

井位座標：E：344193　N：2769036　(☑TWD □67□97 □　　)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水□非標準井有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PHT12 ECT06 (錯)

洗井紀錄資料

洗井開始時間：11 時 50 分；洗井結束時間：12 時 38 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：17.221 (m)	井底至井口深度：21.994 (m)
井水深度：4.773 (m)	井水體積：38.661 (L)	預估洗井時間：47 (min)
泵進水口深度：19.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於　　min 變為　　L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於　　min 變為　　L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式)☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 11:50	2.5	17.221	1	7.566	1156			無色無味
(洗井中) 12:06	〃	17.238	40	7.565	1204			〃
(洗井中) 12:14	〃	17.249	60	7.565	1232			〃
(洗井中) 12:22	〃	17.258	80	7.566	1258			〃
(洗井中) 12:30	〃	17.267	100	7.571	1260			〃
(洗井後) 12:38	〃	17.278	120	7.568	1261			〃
(採樣時) 12:40	〃	17.284	15	7.564/25.0 7.564/25.0 7.564/25.0℃	1262			〃

汲出水總體積：135 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：17.278 (m)

採樣資料【開始時間：12 時 40 分，結束時間：12 時 50 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他　　採樣器放置深度：19.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔焕榮 6/4

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-36 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 6 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GM12　井篩深度：

井位座標：E：342665　N：2770400　(☑TWD □67 ☑97 □　)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 □否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井　)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH12 EC06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：12 時 30 分；洗井結束時間：14 時 41 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：10.327 (m)	井底至井口深度：23.406 (m)
井水深度：13.079 (m)	井水體積：105.829 (L)	預估洗井時間：128 (min)
泵進水口深度：21.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：✗ (m)
井篩長度：✗ (m)	水流元容積：✗ (L)	現場儀器量測頻率：✗ (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於　min 變為　L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於　min 變為　L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式)☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　) □其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 12:30	2.5	10.327	1	5.068	194.2			無色無味
(洗井中) 13:13	〃	10.403	107	5.094	193.4			〃
(洗井中) 13:35	〃	10.441	160	5.099	192.7			〃
(洗井中) 13:57	〃	10.483	213	5.107	192.1			〃
(洗井中) 14:19	〃	10.500	266	5.112	191.4			〃
(洗井後) 14:41	〃	10.529	319	5.121	191.0			〃
(採樣時) 14:45	〃	10.548	15	5.130/5.5 5.130/5.5 5.130/23.5 ℃	190.5			〃

汲出水總體積：334 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：10.559 (m)

採樣資料【開始時間：14 時 45 分，結束時間：14 時 55 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他　採樣器放置深度：21.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/9

附4.6-18

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-35 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 3 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GM3-1　井篩深度：

井位座標：E：343228　N：2771354　(☑TWD □67 ☑97 □　)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH12 EC06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：12 時 00 分；洗井結束時間：15 時 06 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：2.143 (m)	井底至井口深度：21.159 (m)
井水深度：18.966 (m)	井水體積：153.624 (L)	預估洗井時間：185 (min)
泵進水口深度：19.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：✗ (m)
井篩長度：✗ (m)	水流元容積：✗ (L)	現場儀器量測頻率：✗ (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於　min 變為　L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於　min 變為　L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式)☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　) □其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 12:00	2.5	2.193	1	6.117	382			無色無味
(洗井中) 13:02	〃	2.330	155	6.121	390			〃
(洗井中) 13:33	〃	2.388	232	6.137	392			〃
(洗井中) 14:04	〃	2.441	309	6.141	396			〃
(洗井中) 14:35	〃	2.497	386	6.146	397			〃
(洗井後) 15:06	〃	2.546	463	6.150	397			〃
(採樣時) 15:10	〃	2.554	15	6.152/24.5 6.152/24.5 6.152/24.5 ℃	397			〃

汲出水總體積：478 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：2.546 (m)

採樣資料【開始時間：15 時 10 分，結束時間：15 時 20 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他　採樣器放置深度：19.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/5

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-38 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012年 6 月 7 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GW11　井篩深度：

井位座標：E：342300　N：2771693　(☑TWD ☐67 ☐97 ☐_____)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 00 分；洗井結束時間：12 時 47 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：13.425 (m)	井底至井口深度：36.278 (m)
井水深度：22.853 (m)	井水體積：185.09 (L)	預估洗井時間：223 (min)
泵進水口深度：34.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:00	2.5	13.425	1	5.101	1093			無色無味
(洗井中) 10:15	〃	13.588	187	6.032	167.9			〃
(洗井中) 10:53	〃	13.656	280	6.114	184.7			〃
(洗井中) 11:31	〃	13.730	373	6.147	196.3			〃
(洗井中) 12:09	〃	13.803	466	6.162	199.4			〃
(洗井後) 12:47	〃	13.809	559	6.177	203			〃
(採樣時) 12:50	〃	13.887	15	6.187/27.6 6.189/27.6℃	206			〃

汲出水總體積：574 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：13.879 (m)

採樣資料【開始時間：12 時 50 分，結束時間：13 時 00 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：34.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/8

附4.6-19

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-37 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012年 6 月 6 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GP8-1　井篩深度：

井位座標：E：343723　N：2769755　(☑TWD ☐67 ☐97 ☐_____)

資料來源：☑監測井告示牌 ☐業主提供 ☐無　天候狀況：陰

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 ☐否 (現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井_____)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PH712 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 00 分；洗井結束時間：09 時 54 分

井管內徑：4 2 (inch)	水位面至井口深度：0.762 (m)	井底至井口深度：9.247 (m)
井水深度：8.485 (m)	井水體積：16.97 (L)	預估洗井時間：51 (min)
泵進水口深度：7.000 (m)	抽水速率：1 (L/min)	水位洩降：* (m)
井篩長度：* (m)	水流元容積：* (L)	現場儀器量測頻率：* (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:00	1	0.762	1	6.474	288			無色無味
(洗井中) 09:18	〃	0.775	18	6.474	285			〃
(洗井中) 09:27	〃	0.781	27	6.474	285			〃
(洗井中) 09:36	〃	0.784	36	6.475	286			〃
(洗井中) 09:45	〃	0.789	45	6.474	284			〃
(洗井後) 09:54	〃	0.792	54	6.473	283			〃
(採樣時) 10:00	〃	0.797	15	6.474/25.7 6.472/25.3℃	283			〃

汲出水總體積：69 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：0.792 (m)

採樣資料【開始時間：10 時 00 分，結束時間：10 時 15 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他_____　採樣器放置深度：7.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/7

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-40 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 8 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GW17　井篩深度：

井位座標：E：343014　N：2770211　(☑TWD □67 ☑97 □)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PHT12 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：08 時 30 分；洗井結束時間：12 時 18 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：9.634 (m)	井底至井口深度：32.671 (m)
井水深度：23.037 (m)	井水體積：186.599 (L)	預估洗井時間：224 (min)
泵進水口深度：30.000 (m)	抽水速率：(2.0) 2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 08:30	2.5	9.634	1	7.526	736			無色無味
(洗井中) 09:46	〃	9.801	188	7.526	754			〃
(洗井中) 10:24	〃	9.877	282	7.526	754			〃
(洗井中) 11:02	〃	9.951	376	7.529	757			〃
(洗井中) 11:40	〃	10.024	470	7.528	759			〃
(洗井後) 12:18	〃	10.101	564	7.528	759			〃
(採樣時) 12:20	〃	10.109	15	7.529 / 25.9 / 7.529 / 25.7	760			〃

汲出水總體積：519 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：10.101 (m)

採樣資料【開始時間：12 時 20 分，結束時間：12 時 30 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：30.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/11

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-39 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 7 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：P5-1　井篩深度：

井位座標：E：343337　N：2771959　(☑TWD □67 ☑97 □)

資料來源：□監測井告示牌 ☑業主提供 □無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：□是 ☑否 (現場情況描述：□井內積水 □非標準井 有蓋無鎖)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：PHT12 ECT06

洗井紀錄資料

洗井開始時間：13 時 20 分；洗井結束時間：17 時 25 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：4.752 (m)	井底至井口深度：29.520 (m)
井水深度：24.768 (m)	井水體積：200.620 (L)	預估洗井時間：241 (min)
泵進水口深度：　(m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：□貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 13:20	2.5	4.752	1	6.015	113.2			無色無味
(洗井中) 14:41	〃	4.919	202	6.174	247			〃
(洗井中) 15:22	〃	4.986	303	6.263	312			〃
(洗井中) 16:03	〃	5.060	404	6.277	329			〃
(洗井中) 16:44	〃	5.133	505	6.294	334			〃
(洗井後) 17:25	〃	5.210	606	6.306	342			〃
(採樣時) 17:27	4	5.219	15	6.317 / 26.1 / 6.317 / 26.1 / 6.317 / 26.1℃	346			〃

汲出水總體積：621 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：5.210 (m)

採樣資料【開始時間：17 時 27 分，結束時間：17 時 37 分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　採樣器放置深度：27.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/8

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-42 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 9 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GW13　井篩深度：

井位座標：E：742766　N：2770400　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐　)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否（現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖）

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：YHT12 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：09 時 20 分；洗井結束時間：13 時 03 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：14.765 (m)	井底至井口深度：32.979 (m)
井水深度：18.214 (m)	井水體積：147.533 (L)	預估洗井時間：222 (min)
泵進水口深度：37 (m)	抽水速率：3 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☐定量抽水 ☐變量抽水(於＿＿＿＿min 變為＿＿＿＿L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於＿＿＿＿min 變為＿＿＿＿L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☑貝勒管(點源式) ☐離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：＿＿＿＿

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 09:20	2	14.765	1	5.585	132.4			無色無味
(洗井中) 10:35	1,	14.893	149	5.647	137.9			〃
(洗井中) 11:12	〃	14.945	223	5.689	139.2			〃
(洗井中) 11:47	〃	15.003	297	5.731	140.7			〃
(洗井中) 12:26	〃	15.056	371	5.743	140.9			〃
(洗井後) 13:03	〃	15.110	445	5.755	141.4			〃
(採樣時) 13:05	〃	15.118	17	5.776/25.4 5.764/25.4℃	5.786/25.4			〃

汲出水總體積：460 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：15.110 (m)

採樣資料【開始時間：13 時 05 分，結束時間：13 時 15 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他＿＿＿＿　採樣器放置深度：30.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它＿＿＿＿

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/12

附4.6-21

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-41 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　採樣日期：2012 年 6 月 8 日

採樣地點：　採樣人員：劉懷智

井　號：GW14-1　井篩深度：

井位座標：E：743168　N：2770141　(☑TWD ☐67 ☑97 ☐　)

資料來源：☐監測井告示牌 ☑業主提供 ☐無　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☐是 ☑否（現場情況描述：☐井內積水 ☐非標準井 有蓋無鎖）

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：YHT12 EC706

洗井紀錄資料

洗井開始時間：12 時 50 分；洗井結束時間：16 時 51 分

井管內徑：4 (inch)	水位面至井口深度：5.075 (m)	井底至井口深度：29.762 (m)
井水深度：24.687 (m)	井水體積：199.964 (L)	預估洗井時間：240 (min)
泵進水口深度：27.000 (m)	抽水速率：2.5 (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【☑定量抽水 ☐變量抽水(於＿＿＿＿min 變為＿＿＿＿L/min)】

B.☐微洗井【☐定量抽水 ☐變量抽水(於＿＿＿＿min 變為＿＿＿＿L/min)】

C.☐本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☐貝勒管(點源式) ☑離心式抽水泵 ☐氣囊式抽水泵(　　) ☐其他：＿＿＿＿

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 12:50	2.5	5.075	1	6.912	745			無色無味
(洗井中) 14:11	〃	5.259	201	6.909	767			〃
(洗井中) 14:51	〃	5.342	301	6.901	784			〃
(洗井中) 15:31	〃	5.421	401	6.899	791			〃
(洗井中) 16:11	〃	5.503	501	6.895	795			〃
(洗井後) 16:51	〃	5.579	601	6.898	796			〃
(採樣時) 16:55	〃	5.587	15	6.897/25.4 6.899/25.4℃	796			〃

汲出水總體積：616 (L)　洗井結束時水位面至井口深度：5.579 (m)

採樣資料【開始時間：16 時 55 分，結束時間：17 時 05 分】

採樣器材：☑貝勒管 ☐同洗井設備 ☐其他＿＿＿＿　採樣器放置深度：27.000 (m)

附註：☐採樣器放置深度由委託單位指定 ☐井內含有不互溶有機液體 ☐井底有泥沙

☐採集 VOCs 時(☐委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

☐其它＿＿＿＿

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　審核人員：崔煥榮 6/11

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.6-43 監測井地下水採樣紀錄表

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析　　採樣日期：2012年 6月 9日

採樣地點：　　採樣人員：劉儀館

井　號：GW6-1　　井篩深度：

井位座標：E：343564　N：2771327　(□TWD □67 ☑97 □　　)

資料來源：☑監測井告示牌 □業主提供 □無　　天候狀況：晴

環境描述：監測井鎖扣是否完整：☑是 □否 (現場情況描述：□井內積水□非標準井　　)

現場量測儀器校正：記錄於水質採樣各式儀器使用及校正紀錄表(FORM-TESP-PW-101-02)

現場量測儀器編號：pH712 EC700

洗井紀錄資料

洗井開始時間：13 時40 分；洗井結束時間：14 時29 分

井管內徑：2 (inch)	水位面至井口深度：3.375 (m)	井底至井口深度：11.220 (m)
井水深度：7.865 (m)	井水體積：15.03 (L)	預估洗井時間：48 (min)
泵進水口深度：X (m)	抽水速率：X (L/min)	水位洩降：X (m)
井篩長度：X (m)	水流元容積：X (L)	現場儀器量測頻率：X (min-次)

(1)洗井方法：A.☑井柱水體積置換法【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

B.□微洗井【□定量抽水 □變量抽水(於_____min 變為_____L/min)】

C.□本監測井屬低滲透性地層(以 0.1~0.5L/min 抽水洩降超過井篩長度 1/8)，將井水抽乾

(2)洗井設備：☑貝勒管(點源式)□離心式抽水泵 □氣囊式抽水泵(　　) □其他：_____

時間	汲水速率 (L/min)	水位深度 (m)	汲出水體積 (L)	pH 值 (pH/溫度℃) ±0.2	導電度 (μmho/cm) ±3 %	溶氧 (mg/L) ±10 %或±0.3	氧化還原電位 (mV) ±20 mV	洗井水觀察 (水色、色味、雜質)
(洗井前) 13:40	1	3.355	1	7.447	429			無色無味
(洗井中) 13:57	〃	3.364	17	7.473	450			〃
(洗井中) 14:05	〃	3.367	25	7.491	454			〃
(洗井中) 14:13	〃	3.371	33	7.494	457			〃
(洗井中) 14:21	〃	3.374	41	7.501	457			〃
(洗井後) 14:29	〃	3.378	49	7.503	459			〃
(採樣時) 14:30	〃	3.386	57	2.00/23.5 7.00/23.5 10.04/23.5 ℃	461			〃

汲出水總體積：64 (L)　　洗井結束時水位面至井口深度：3.378 (m)

採樣資料【開始時間：14時30分，結束時間：14時45分】

採樣器材：☑貝勒管 □同洗井設備 □其他_____　　採樣器放置深度：9.000 (m)

附註：□採樣器放置深度由委託單位指定 □井內含有不互溶有機液體 □井底有泥沙

□採集 VOCs 時(□委託單位指定)使用非鐵氟龍材質，與目前實施之地下水採樣方法不符，數據僅供業主參考。

□其它_____

FORM-TESP-PW-103-01 版次：2.7 發行日期：2011.03.15　　審核人員：崔振榮

附錄 IV.6-44　101 年 4 月 GM2 地下水位逐時記錄表

地面標高：9.92公尺　井頂標高：10.42公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	10.073	10.014	9.961	10.028	9.932	9.968	9.979	9.968	9.932	10.015	10.011	9.992	9.952	9.920	9.891	10.103	10.356	10.342	10.328	10.336	10.309	10.318	10.351	10.327	10.292	10.301	10.365	10.347	10.334	10.302
1	10.065	10.003	9.960	10.021	9.934	9.972	9.981	9.963	9.928	10.033	10.012	9.991	9.936	9.916	9.880	10.111	10.350	10.337	10.329	10.334	10.298	10.321	10.341	10.324	10.283	10.298	10.356	10.343	10.329	10.295
2	10.053	10.001	9.958	10.012	9.928	9.974	9.975	9.955	9.928	10.037	10.011	9.984	9.933	9.918	9.878	10.114	10.355	10.327	10.324	10.333	10.294	10.316	10.339	10.325	10.276	10.307	10.349	10.341	10.331	10.285
3	10.050	9.993	9.955	10.002	9.923	9.968	9.970	9.953	9.917	10.054	10.004	9.983	9.923	9.913	9.864	10.122	10.340	10.330	10.323	10.327	10.285	10.322	10.338	10.317	10.278	10.314	10.341	10.337	10.320	10.283
4	10.044	9.988	9.946	10.002	9.924	9.980	9.971	9.952	9.920	10.045	10.007	9.978	9.926	9.916	9.854	10.140	10.341	10.321	10.315	10.327	10.276	10.327	10.335	10.315	10.274	10.318	10.340	10.334	10.318	10.288
5	10.041	9.989	9.950	9.997	9.922	9.984	9.971	9.951	9.915	10.047	10.000	9.980	9.919	9.918	9.848	10.163	10.342	10.326	10.318	10.326	10.274	10.331	10.339	10.313	10.274	10.320	10.339	10.334	10.314	10.287
6	10.046	9.995	9.956	9.996	9.923	9.992	9.978	9.950	9.918	10.042	10.001	9.985	9.929	9.920	9.842	10.175	10.345	10.324	10.324	10.332	10.275	10.330	10.341	10.315	10.272	10.346	10.345	10.333	10.311	10.279
7	10.050	9.996	9.952	9.998	9.922	9.995	9.979	9.955	9.919	10.050	10.003	9.988	9.934	9.922	9.840	10.204	10.355	10.330	10.329	10.332	10.275	10.341	10.346	10.320	10.271	10.362	10.345	10.332	10.316	10.278
8	10.050	9.994	9.956	10.002	9.920	10.005	9.987	9.952	9.926	10.050	10.003	9.988	9.938	9.920	9.834	10.219	10.360	10.333	10.336	10.333	10.288	10.348	10.348	10.319	10.272	10.362	10.351	10.338	10.316	10.283
9	10.056	9.998	9.970	9.997	9.923	10.009	9.983	9.951	9.921	10.055	10.008	9.995	9.935	9.931	9.816	10.243	10.361	10.341	10.338	10.344	10.284	10.353	10.348	10.323	10.287	10.377	10.343	10.343	10.323	10.289
10	10.053	9.998	9.978	9.992	9.929	10.006	9.985	9.951	9.922	10.048	10.014	9.990	9.940	9.933	9.779	10.248	10.366	10.339	10.335	10.342	10.284	10.359	10.351	10.321	10.284	10.382	10.354	10.346	10.322	10.287
11	10.051	9.991	9.986	9.989	9.930	10.016	9.977	9.950	9.919	10.048	10.006	9.986	9.931	9.932	9.629	10.266	10.358	10.333	10.338	10.336	10.284	10.362	10.350	10.318	10.280	10.373	10.360	10.345	10.315	10.291
12	10.046	9.982	10.002	9.981	9.927	9.978	9.975	9.946	9.920	10.043	10.009	9.980	9.929	9.925	9.521	10.270	10.358	10.324	10.340	10.331	10.279	10.362	10.345	10.307	10.277	10.371	10.354	10.340	10.312	10.289
13	10.038	9.976	10.004	9.971	9.925	9.977	9.972	9.940	9.914	10.036	9.996	9.968	9.922	9.921	9.597	10.270	10.349	10.316	10.327	10.321	10.276	10.356	10.336	10.295	10.274	10.372	10.357	10.337	10.309	10.281
14	10.028	9.965	10.004	9.958	9.917	9.965	9.962	9.936	9.900	10.027	9.981	9.959	9.915	9.915	9.694	10.293	10.343	10.311	10.323	10.319	10.277	10.355	10.329	10.293	10.265	10.376	10.349	10.340	10.296	10.275
15	10.020	9.961	10.000	9.946	9.917	9.967	9.960	9.933	9.900	10.011	9.977	9.951	9.904	9.900	9.782	10.319	10.336	10.310	10.313	10.312	10.267	10.348	10.326	10.282	10.266	10.368	10.345	10.333	10.298	10.269
16	10.018	9.948	10.005	9.941	9.920	9.969	9.961	9.934	9.903	10.003	9.972	9.947	9.901	9.892	9.889	10.327	10.331	10.311	10.310	10.306	10.264	10.341	10.325	10.281	10.260	10.362	10.334	10.339	10.294	10.284
17	10.012	9.950	10.009	9.936	9.924	9.971	9.960	9.934	9.909	10.004	9.967	9.946	9.899	9.893	9.912	10.332	10.336	10.316	10.317	10.299	10.270	10.341	10.323	10.289	10.271	10.359	10.328	10.338	10.292	10.278
18	10.015	9.952	10.015	9.931	9.932	9.974	9.961	9.938	9.912	10.009	9.957	9.942	9.901	9.895	9.959	10.342	10.336	10.323	10.320	10.308	10.276	10.344	10.323	10.292	10.257	10.365	10.326	10.334	10.316	10.274
19	10.018	9.954	10.016	9.935	9.938	9.975	9.970	9.937	9.924	10.009	9.968	9.939	9.906	9.890	10.030	10.349	10.343	10.318	10.325	10.308	10.277	10.345	10.327	10.289	10.270	10.356	10.332	10.341	10.301	10.282
20	10.015	9.949	10.019	9.938	9.947	9.982	9.974	9.937	9.938	10.010	9.971	9.947	9.907	9.895	9.989	10.349	10.346	10.329	10.332	10.310	10.292	10.351	10.332	10.288	10.279	10.362	10.334	10.341	10.302	10.289
21	10.022	9.959	10.022	9.940	9.956	9.981	9.973	9.942	9.958	10.020	9.978	9.948	9.913	9.894	10.082	10.353	10.350	10.326	10.337	10.313	10.297	10.353	10.338	10.294	10.287	10.375	10.340	10.346	10.302	10.298
22	10.021	9.960	10.029	9.938	9.967	9.982	9.977	9.944	9.980	10.017	9.980	9.955	9.919	9.897	10.085	10.358	10.352	10.333	10.340	10.310	10.305	10.354	10.335	10.302	10.290	10.372	10.351	10.349	10.307	10.299
23	10.019	9.962	10.024	9.943	9.965	9.978	9.968	9.937	10.002	10.013	9.992	9.955	9.925	9.892	10.097	10.359	10.348	10.334	10.341	10.311	10.308	10.349	10.333	10.298	10.293	10.372	10.351	10.342	10.307	10.295
最高(m)	*10.073*	*10.014*	*10.029*	*10.028*	*9.967*	*10.016*	*9.987*	*9.968*	*10.002*	*10.055*	*10.014*	*9.995*	*9.952*	*9.933*	*10.097*	*10.359*	*10.366*	*10.342*	*10.341*	*10.344*	*10.309*	*10.362*	*10.351*	*10.327*	*10.293*	*10.382*	*10.365*	*10.349*	*10.334*	*10.302*
最低(m)	*10.012*	*9.948*	*9.946*	*9.931*	*9.917*	*9.965*	*9.960*	*9.933*	*9.900*	*10.003*	*9.957*	*9.939*	*9.899*	*9.890*	*9.521*	*10.103*	*10.337*	*10.310*	*10.310*	*10.299*	*10.264*	*10.316*	*10.323*	*10.281*	*10.257*	*10.298*	*10.326*	*10.332*	*10.292*	*10.269*
平均(m)	*10.038*	*9.978*	*9.987*	*9.975*	*9.931*	*9.982*	*9.973*	*9.946*	*9.926*	*10.030*	*9.993*	*9.970*	*9.922*	*9.911*	*9.858*	*10.251*	*10.348*	*10.326*	*10.328*	*10.323*	*10.284*	*10.343*	*10.337*	*10.306*	*10.276*	*10.353*	*10.345*	*10.340*	*10.312*	*10.286*

平均水位值： ***10.134***　　*月最高水位值：* ***10.382***　　*月最低水位值：* ***9.521***

附錄 IV.6-45　101 年 4 月 GM3-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：—公尺　井頂標高：9.530公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	6.938	6.881	6.800	6.861	6.769	6.791	6.817	6.808	6.776	6.890	6.856	6.787	6.755	6.726	6.917	6.312	6.618	6.591	6.517	6.504	6.442	6.525	6.659	6.558	6.496	6.432	7.008	6.843	6.711	6.640
1	6.929	6.869	6.801	6.853	6.765	6.797	6.813	6.800	6.776	6.913	6.848	6.783	6.750	6.722	6.929	6.312	6.616	6.586	6.523	6.502	6.431	6.522	6.649	6.543	6.485	6.421	6.982	6.823	6.703	6.630
2	6.931	6.862	6.804	6.853	6.759	6.797	6.813	6.791	6.768	6.936	6.843	6.784	6.733	6.722	6.960	6.314	6.617	6.581	6.523	6.499	6.438	6.533	6.640	6.536	6.478	6.428	6.957	6.820	6.689	6.628
3	6.925	6.860	6.792	6.840	6.756	6.805	6.815	6.787	6.760	6.935	6.835	6.779	6.730	6.721	6.982	6.321	6.607	6.577	6.513	6.496	6.472	6.533	6.632	6.539	6.463	6.435	6.942	6.814	6.682	6.613
4	6.919	6.850	6.785	6.836	6.755	6.809	6.810	6.789	6.752	6.939	6.829	6.772	6.721	6.717	7.001	6.321	6.602	6.568	6.510	6.490	6.496	6.553	6.630	6.526	6.466	6.450	6.925	6.793	6.671	6.611
5	6.917	6.845	6.794	6.833	6.756	6.814	6.812	6.774	6.761	6.942	6.832	6.768	6.719	6.715	7.013	6.336	6.594	6.571	6.511	6.493	6.511	6.588	6.621	6.520	6.462	6.486	6.909	6.789	6.664	6.592
6	6.919	6.844	6.792	6.838	6.759	6.819	6.810	6.786	6.756	6.940	6.827	6.775	6.719	6.722	7.024	6.354	6.591	6.570	6.511	6.492	6.528	6.627	6.619	6.526	6.465	6.513	6.903	6.781	6.658	6.601
7	6.927	6.847	6.790	6.835	6.757	6.831	6.827	6.787	6.765	6.944	6.825	6.782	6.724	6.720	7.031	6.389	6.590	6.570	6.518	6.494	6.534	6.672	6.624	6.528	6.468	6.599	6.899	6.772	6.656	6.585
8	6.923	6.852	6.791	6.839	6.754	6.837	6.819	6.789	6.758	6.950	6.827	6.784	6.731	6.728	7.040	6.418	6.591	6.570	6.512	6.489	6.539	6.697	6.625	6.523	6.460	6.701	6.899	6.764	6.648	6.583
9	6.935	6.851	6.803	6.837	6.758	6.837	6.826	6.788	6.768	6.945	6.825	6.784	6.736	6.732	7.048	6.428	6.594	6.565	6.514	6.488	6.544	6.700	6.623	6.521	6.462	6.776	6.893	6.766	6.654	6.581
10	6.929	6.849	6.812	6.830	6.757	6.840	6.823	6.782	6.767	6.940	6.839	6.790	6.744	6.734	7.041	6.440	6.587	6.561	6.515	6.492	6.543	6.705	6.612	6.526	6.461	6.803	6.873	6.769	6.652	6.584
11	6.929	6.828	6.817	6.821	6.758	6.836	6.817	6.781	6.760	6.933	6.839	6.787	6.743	6.730	7.046	6.457	6.586	6.557	6.512	6.478	6.540	6.705	6.606	6.514	6.452	6.815	6.871	6.769	6.649	6.574
12	6.925	6.836	6.831	6.821	6.761	6.827	6.820	6.777	6.751	6.919	6.828	6.778	6.730	6.734	7.042	6.461	6.572	6.551	6.504	6.475	6.533	6.705	6.602	6.510	6.447	6.809	6.863	6.754	6.638	6.575
13	6.912	6.819	6.838	6.806	6.750	6.810	6.812	6.783	6.749	6.913	6.828	6.776	6.724	6.734	6.962	6.465	6.570	6.541	6.507	6.468	6.530	6.700	6.591	6.504	6.437	6.795	6.851	6.749	6.629	6.568
14	6.902	6.816	6.830	6.799	6.752	6.804	6.809	6.771	6.746	6.901	6.813	6.763	6.714	6.790	6.863	6.462	6.568	6.543	6.492	6.464	6.528	6.695	6.578	6.485	6.436	6.794	6.861	6.741	6.614	6.558
15	6.898	6.804	6.830	6.791	6.744	6.807	6.798	6.769	6.740	6.890	6.809	6.751	6.707	6.746	6.749	6.485	6.551	6.534	6.497	6.459	6.515	6.691	6.573	6.484	6.417	6.816	6.868	6.729	6.605	6.547
16	6.890	6.793	6.831	6.778	6.754	6.810	6.796	6.773	6.736	6.875	6.799	6.743	6.702	6.805	6.312	6.542	6.542	6.530	6.490	6.452	6.507	6.681	6.568	6.474	6.409	6.879	6.884	6.728	6.595	6.535
17	6.885	6.791	6.839	6.773	6.756	6.814	6.802	6.775	6.743	6.874	6.794	6.741	6.695	6.804	6.310	6.572	6.532	6.526	6.487	6.448	6.510	6.683	6.562	6.475	6.416	6.896	6.862	6.722	6.591	6.544
18	6.887	6.793	6.846	6.778	6.761	6.812	6.801	6.777	6.745	6.868	6.783	6.736	6.694	6.769	6.297	6.589	6.529	6.528	6.484	6.444	6.514	6.680	6.562	6.482	6.415	6.896	6.860	6.719	6.591	6.565
19	6.888	6.786	6.847	6.773	6.770	6.820	6.803	6.781	6.753	6.865	6.761	6.738	6.695	6.812	6.292	6.594	6.536	6.529	6.487	6.451	6.516	6.675	6.560	6.484	6.422	6.889	6.851	6.709	6.599	6.588
20	6.884	6.786	6.849	6.779	6.775	6.815	6.812	6.783	6.762	6.865	6.767	6.735	6.709	6.846	6.303	6.612	6.562	6.524	6.490	6.451	6.510	6.672	6.558	6.495	6.425	6.875	6.847	6.711	6.599	6.610
21	6.886	6.792	6.853	6.780	6.777	6.826	6.815	6.788	6.772	6.869	6.770	6.744	6.709	6.877	6.306	6.613	6.579	6.523	6.491	6.448	6.521	6.674	6.565	6.490	6.437	6.873	6.845	6.716	6.620	6.617
22	6.887	6.794	6.857	6.773	6.788	6.823	6.814	6.781	6.819	6.868	6.779	6.750	6.714	6.897	6.303	6.627	6.595	6.533	6.492	6.452	6.521	6.673	6.560	6.500	6.431	6.946	6.841	6.717	6.624	6.623
23	6.889	6.793	6.857	6.773	6.792	6.820	6.817	6.782	6.872	6.864	6.790	6.752	6.727	6.915	6.312	6.628	6.590	6.531	6.501	6.434	6.524	6.665	6.555	6.504	6.427	7.002	6.846	6.714	6.644	6.634
最高(m)	*6.938*	*6.881*	*6.857*	*6.861*	*6.792*	*6.840*	*6.827*	*6.808*	*6.872*	*6.950*	*6.856*	*6.790*	*6.755*	*6.915*	*7.048*	*6.628*	*6.618*	*6.591*	*6.523*	*6.504*	*6.544*	*6.705*	*6.659*	*6.558*	*6.496*	*7.002*	*7.008*	*6.843*	*6.711*	*6.640*
最低(m)	*6.884*	*6.786*	*6.785*	*6.773*	*6.744*	*6.791*	*6.796*	*6.769*	*6.736*	*6.864*	*6.761*	*6.735*	*6.694*	*6.715*	*6.292*	*6.312*	*6.529*	*6.523*	*6.484*	*6.434*	*6.431*	*6.522*	*6.555*	*6.474*	*6.409*	*6.421*	*6.841*	*6.709*	*6.581*	*6.535*
平均(m)	*6.911*	*6.827*	*6.820*	*6.813*	*6.762*	*6.817*	*6.813*	*6.783*	*6.765*	*6.907*	*6.814*	*6.766*	*6.722*	*6.767*	*6.753*	*6.461*	*6.580*	*6.553*	*6.504*	*6.473*	*6.510*	*6.648*	*6.599*	*6.510*	*6.447*	*6.722*	*6.889*	*6.759*	*6.641*	*6.591*

平均水位值： ***6.701***　　*月最高水位值：* ***7.048***　　*月最低水位值：* ***6.292***

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

經濟部水利署第十河川局 收文章 102.07.17 收件者 [illegible]

附錄 IV.6-46　101 年 4 月 P5-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：—公尺　井頂標高：12.139公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	6.092	5.995	5.914	5.942	5.818	5.770	5.776	5.747	5.694	5.662	5.707	5.671	5.638	5.609	5.578	5.503	5.658	5.779	5.822	5.810	5.745	5.781	5.920	5.920	5.853	5.794	6.392	7.052	7.040	6.875
1	6.087	5.986	5.919	5.939	5.816	5.771	5.769	5.742	5.691	5.666	5.706	5.669	5.632	5.612	5.577	5.508	5.660	5.786	5.822	5.809	5.744	5.782	5.925	5.918	5.840	5.795	6.446	7.050	7.033	6.873
2	6.084	5.982	5.923	5.939	5.820	5.779	5.775	5.738	5.686	5.664	5.702	5.660	5.621	5.611	5.573	5.500	5.680	5.791	5.823	5.809	5.743	5.791	5.924	5.912	5.832	5.798	6.503	7.058	7.023	6.864
3	6.074	5.975	5.919	5.934	5.820	5.782	5.774	5.737	5.686	5.670	5.701	5.658	5.614	5.608	5.563	5.495	5.685	5.793	5.824	5.811	5.740	5.800	5.931	5.912	5.833	5.802	6.557	7.053	7.015	6.852
4	6.069	5.968	5.915	5.927	5.816	5.781	5.771	5.741	5.689	5.671	5.701	5.647	5.608	5.604	5.554	5.500	5.697	5.793	5.826	5.815	5.741	5.803	5.928	5.909	5.833	5.803	6.612	7.062	7.004	6.844
5	6.062	5.957	5.913	5.923	5.816	5.788	5.783	5.744	5.689	5.685	5.702	5.646	5.611	5.602	5.549	5.505	5.699	5.796	5.828	5.810	5.741	5.811	5.935	5.912	5.834	5.804	6.662	7.065	6.989	6.841
6	6.060	5.957	5.910	5.915	5.811	5.788	5.778	5.745	5.684	5.688	5.703	5.646	5.614	5.605	5.547	5.503	5.708	5.800	5.826	5.810	5.742	5.819	5.939	5.911	5.830	5.832	6.708	7.063	6.984	6.837
7	6.056	5.951	5.902	5.908	5.802	5.792	5.777	5.747	5.685	5.701	5.709	5.654	5.616	5.604	5.546	5.504	5.714	5.804	5.825	5.806	5.736	5.825	5.942	5.915	5.825	5.846	6.750	7.068	6.983	6.826
8	6.060	5.956	5.900	5.904	5.791	5.791	5.775	5.742	5.682	5.704	5.713	5.655	5.622	5.609	5.548	5.513	5.719	5.797	5.821	5.800	5.740	5.833	5.944	5.911	5.828	5.862	6.790	7.072	6.981	6.819
9	6.055	5.961	5.904	5.892	5.788	5.788	5.768	5.726	5.680	5.710	5.714	5.662	5.625	5.612	5.548	5.522	5.731	5.802	5.823	5.798	5.735	5.846	5.942	5.905	5.825	5.887	6.814	7.071	6.976	6.821
10	6.051	5.969	5.907	5.896	5.787	5.782	5.767	5.726	5.673	5.710	5.710	5.659	5.626	5.617	5.541	5.528	5.733	5.805	5.821	5.794	5.736	5.845	5.937	5.898	5.824	5.911	6.844	7.075	6.974	6.810
11	6.056	5.974	5.916	5.889	5.793	5.790	5.760	5.713	5.666	5.701	5.700	5.658	5.623	5.619	5.547	5.537	5.744	5.807	5.822	5.790	5.739	5.857	5.934	5.884	5.806	5.936	6.866	7.074	6.967	6.817
12	6.049	5.971	5.927	5.879	5.785	5.778	5.757	5.707	5.663	5.699	5.701	5.651	5.617	5.614	5.548	5.544	5.744	5.809	5.819	5.786	5.739	5.858	5.934	5.880	5.805	5.952	6.887	7.066	6.958	6.803
13	6.043	5.805	5.934	5.884	5.788	5.788	5.757	5.706	5.652	5.698	5.694	5.645	5.613	5.609	5.540	5.554	5.756	5.808	5.818	5.786	5.741	5.866	5.927	5.873	5.797	5.971	6.910	7.069	6.948	6.802
14	6.024	5.707	5.936	5.870	5.789	5.777	5.756	5.706	5.651	5.693	5.686	5.631	5.602	5.607	5.533	5.561	5.752	5.811	5.818	5.785	5.737	5.875	5.931	5.864	5.795	5.999	6.914	7.065	6.933	6.784
15	6.022	5.607	5.941	5.869	5.783	5.783	5.748	5.702	5.647	5.690	5.679	5.625	5.592	5.597	5.526	5.558	5.755	5.812	5.820	5.780	5.745	5.881	5.928	5.861	5.791	6.025	6.932	7.058	6.921	6.785
16	6.013	5.565	5.942	5.864	5.788	5.796	5.763	5.705	5.650	5.691	5.674	5.626	5.591	5.590	5.520	5.563	5.752	5.818	5.820	5.775	5.752	5.889	5.928	5.857	5.790	6.052	6.948	7.050	6.911	6.768
17	6.012	5.777	5.942	5.851	5.788	5.790	5.760	5.713	5.654	5.692	5.679	5.621	5.585	5.584	5.510	5.575	5.754	5.813	5.821	5.777	5.759	5.902	5.934	5.867	5.792	6.082	6.958	7.045	6.896	6.770
18	6.003	5.898	5.939	5.836	5.789	5.791	5.767	5.716	5.655	5.703	5.647	5.619	5.585	5.583	5.501	5.580	5.757	5.821	5.819	5.773	5.764	5.907	5.935	5.870	5.794	6.119	6.973	7.051	6.905	6.758
19	6.001	5.897	5.932	5.833	5.784	5.794	5.764	5.722	5.667	5.705	5.668	5.622	5.594	5.577	5.499	5.592	5.760	5.813	5.818	5.771	5.759	5.915	5.937	5.870	5.790	6.153	6.989	7.052	6.893	6.766
20	5.995	5.902	5.934	5.827	5.783	5.789	5.770	5.722	5.676	5.709	5.672	5.623	5.594	5.578	5.502	5.599	5.761	5.813	5.811	5.767	5.767	5.915	5.936	5.867	5.803	6.191	7.012	7.048	6.888	6.769
21	5.995	5.908	5.933	5.823	5.777	5.782	5.765	5.716	5.678	5.716	5.667	5.632	5.600	5.578	5.499	5.614	5.770	5.815	5.808	5.760	5.770	5.920	5.939	5.863	5.806	6.234	7.023	7.052	6.891	6.775
22	5.997	5.913	5.938	5.814	5.775	5.772	5.757	5.705	5.668	5.714	5.666	5.636	5.600	5.582	5.501	5.627	5.773	5.822	5.813	5.758	5.770	5.919	5.933	5.864	5.807	6.275	7.042	7.049	6.890	6.782
23	5.989	5.910	5.936	5.816	5.773	5.773	5.751	5.701	5.669	5.713	5.674	5.637	5.606	5.584	5.509	5.644	5.778	5.823	5.808	5.754	5.772	5.922	5.927	5.857	5.805	6.324	7.052	7.048	6.887	6.784
最高(m)	*6.092*	*5.995*	*5.942*	*5.942*	*5.820*	*5.796*	*5.783*	*5.747*	*5.694*	*5.716*	*5.714*	*5.671*	*5.638*	*5.619*	*5.578*	*5.644*	*5.778*	*5.823*	*5.828*	*5.815*	*5.772*	*5.922*	*5.944*	*5.920*	*5.853*	*6.324*	*7.052*	*7.075*	*7.040*	*6.875*
最低(m)	*5.989*	*5.565*	*5.900*	*5.814*	*5.773*	*5.770*	*5.748*	*5.701*	*5.647*	*5.662*	*5.647*	*5.619*	*5.585*	*5.577*	*5.499*	*5.495*	*5.656*	*5.779*	*5.808*	*5.754*	*5.735*	*5.781*	*5.920*	*5.857*	*5.790*	*5.794*	*6.392*	*7.045*	*6.887*	*6.758*
平均(m)	*6.040*	*5.895*	*5.924*	*5.882*	*5.795*	*5.784*	*5.766*	*5.724*	*5.672*	*5.694*	*5.691*	*5.644*	*5.610*	*5.600*	*5.536*	*5.547*	*5.731*	*5.805*	*5.820*	*5.789*	*5.748*	*5.857*	*5.939*	*5.888*	*5.814*	*5.977*	*6.816*	*7.059*	*6.954*	*6.809*

平均水位值： **5.927**　　*月最高水位值：* **7.075**　　*月最低水位值：* **5.495**

附錄 IV.6-47　101 年 4 月 P8-1'地下水位逐時記錄表

地面標高：—公尺　井頂標高：20.583公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	19.454	19.356	19.275	19.303	19.179	19.131	19.137	19.110	19.057	19.024	19.069	18.933	18.701	18.685	18.654	18.579	18.734	18.855	18.898	18.886	18.821	18.857	18.996	18.996	18.929	18.870	19.426	20.086	20.072	19.909
1	19.446	19.347	19.280	19.300	19.177	19.132	19.130	19.105	19.054	19.028	19.068	18.931	18.695	18.688	18.653	18.584	18.736	18.862	18.898	18.885	18.820	18.858	19.001	18.994	18.916	18.871	19.480	20.084	20.067	19.907
2	19.445	19.343	19.284	19.300	19.181	19.140	19.136	19.101	19.049	19.026	19.064	18.922	18.684	18.687	18.649	18.576	18.756	18.867	18.899	18.885	18.819	18.867	19.000	18.988	18.908	18.874	19.537	20.092	20.057	19.898
3	19.435	19.336	19.283	19.295	19.181	19.143	19.135	19.100	19.049	19.032	19.063	18.917	18.677	18.684	18.639	18.571	18.761	18.869	18.900	18.887	18.816	18.876	19.007	18.988	18.909	18.878	19.591	20.087	20.049	19.886
4	19.430	19.329	19.276	19.287	19.177	19.142	19.132	19.104	19.052	19.033	19.063	18.909	18.671	18.680	18.630	18.576	18.773	18.869	18.902	18.891	18.817	18.879	19.004	18.985	18.909	18.879	19.646	20.096	20.038	19.878
5	19.423	19.318	19.274	19.284	19.177	19.149	19.144	19.107	19.052	19.047	19.064	18.908	18.614	18.678	18.625	18.581	18.775	18.872	18.904	18.886	18.817	18.887	19.011	18.988	18.910	18.880	19.696	20.099	20.019	19.875
6	19.422	19.318	19.271	19.276	19.172	19.149	19.139	19.108	19.047	19.050	19.065	18.906	18.620	18.681	18.623	18.579	18.784	18.876	18.902	18.886	18.818	18.895	19.015	18.987	18.906	18.908	19.742	20.097	20.017	19.871
7	19.418	19.312	19.263	19.269	19.163	19.153	19.138	19.110	19.048	19.063	19.071	18.816	18.623	18.680	18.622	18.580	18.790	18.880	18.901	18.882	18.812	18.901	19.018	18.991	18.901	18.922	19.784	20.102	20.017	19.860
8	19.421	19.317	19.261	19.265	19.152	19.152	19.132	19.105	19.045	19.066	19.078	18.817	18.624	18.685	18.624	18.589	18.795	18.873	18.897	18.876	18.816	18.909	19.020	18.987	18.904	18.938	19.825	20.106	20.015	19.852
9	19.416	19.322	19.265	19.253	19.144	19.147	19.127	19.087	19.041	19.070	19.074	18.822	18.638	18.688	18.624	18.598	18.807	18.878	18.899	18.874	18.811	18.922	19.018	18.981	18.901	18.963	19.848	20.105	20.008	19.855
10	19.412	19.330	19.268	19.257	19.146	19.141	19.126	19.087	19.034	19.070	19.070	18.819	18.619	18.693	18.617	18.604	18.809	18.881	18.897	18.870	18.812	18.921	19.013	18.974	18.900	18.987	19.878	20.109	20.008	19.844
11	19.417	19.335	19.277	19.250	19.152	19.149	19.119	19.074	19.027	19.063	19.060	18.818	18.605	18.695	18.623	18.613	18.820	18.879	18.898	18.866	18.815	18.933	19.010	18.960	18.882	19.009	19.900	20.108	20.001	19.851
12	19.408	19.331	19.287	19.236	19.143	19.136	19.116	19.068	19.024	19.059	19.061	18.811	18.693	18.690	18.624	18.620	18.820	18.886	18.895	18.862	18.815	18.934	19.010	18.956	18.876	19.028	19.921	20.100	19.992	19.837
13	19.405	19.367	19.296	19.245	19.148	19.148	19.117	19.067	19.012	19.057	19.054	18.804	18.689	18.685	18.616	18.630	18.832	18.884	18.894	18.862	18.817	18.942	19.003	18.949	18.873	19.047	19.944	20.091	19.983	19.836
14	19.386	19.369	19.298	19.232	19.149	19.137	19.116	19.067	19.012	19.053	19.046	18.791	18.678	18.683	18.609	18.637	18.828	18.887	18.894	18.861	18.813	18.951	19.007	18.940	18.871	19.075	19.948	20.099	19.967	19.818
15	19.384	19.369	19.303	19.231	19.143	19.143	19.107	19.063	19.007	19.051	19.039	18.785	18.668	18.673	18.602	18.634	18.831	18.888	18.896	18.856	18.821	18.957	19.004	18.937	18.867	19.101	19.966	20.092	19.955	19.819
16	19.375	19.327	19.304	19.226	19.148	19.156	19.123	19.066	19.008	19.051	19.034	18.786	18.667	18.666	18.596	18.639	18.828	18.894	18.896	18.851	18.828	18.965	19.004	18.933	18.866	19.127	19.982	20.088	19.945	19.802
17	19.374	19.339	19.304	19.213	19.148	19.150	19.121	19.074	19.015	19.052	19.039	18.781	18.661	18.660	18.586	18.651	18.830	18.889	18.897	18.853	18.835	18.978	19.010	18.943	18.865	19.158	19.992	20.079	19.930	19.807
18	19.365	19.260	19.301	19.198	19.149	19.151	19.127	19.077	19.014	19.063	19.007	18.779	18.661	18.659	18.577	18.656	18.833	18.897	18.895	18.849	18.840	18.983	19.011	18.946	18.870	19.195	20.007	20.085	19.939	19.797
19	19.363	19.259	19.294	19.195	19.144	19.154	19.124	19.083	19.028	19.065	18.928	18.782	18.670	18.653	18.575	18.668	18.836	18.889	18.894	18.847	18.835	18.991	19.013	18.946	18.866	19.229	20.014	20.086	19.920	19.800
20	19.357	19.264	19.296	19.189	19.143	19.149	19.130	19.083	19.037	19.069	18.932	18.783	18.670	18.654	18.578	18.675	18.837	18.889	18.887	18.843	18.843	18.991	19.012	18.943	18.879	19.267	20.046	20.083	19.922	19.803
21	19.357	19.270	19.295	19.185	19.137	19.142	19.125	19.077	19.039	19.076	18.927	18.692	18.676	18.654	18.575	18.690	18.846	18.891	18.884	18.836	18.846	18.996	19.015	18.939	18.882	19.310	20.057	20.086	19.923	19.809
22	19.359	19.275	19.300	19.176	19.135	19.132	19.117	19.066	19.029	19.074	18.926	18.696	18.676	18.658	18.577	18.703	18.849	18.898	18.889	18.834	18.846	18.995	19.009	18.940	18.883	19.351	20.076	20.083	19.923	19.816
23	19.351	19.272	19.298	19.178	19.133	19.133	19.111	19.062	19.030	19.073	18.934	18.697	18.682	18.660	18.585	18.720	18.854	18.899	18.884	18.830	18.848	18.998	19.003	18.933	18.881	19.400	20.086	20.072	19.921	19.818
最高(m)	*19.454*	*19.369*	*19.304*	*19.303*	*19.181*	*19.156*	*19.144*	*19.110*	*19.057*	*19.076*	*19.078*	*18.933*	*18.701*	*18.695*	*18.654*	*18.720*	*18.854*	*18.899*	*18.904*	*18.891*	*18.848*	*18.998*	*19.020*	*18.996*	*18.929*	*19.400*	*20.086*	*20.109*	*20.072*	*19.909*
最低(m)	*19.351*	*19.259*	*19.261*	*19.176*	*19.133*	*19.131*	*19.107*	*19.062*	*19.007*	*19.024*	*18.926*	*18.692*	*18.605*	*18.653*	*18.575*	*18.571*	*18.734*	*18.855*	*18.884*	*18.830*	*18.811*	*18.857*	*18.996*	*18.933*	*18.865*	*18.870*	*19.426*	*20.072*	*19.921*	*19.792*
平均(m)	*19.401*	*19.319*	*19.286*	*19.243*	*19.155*	*19.144*	*19.126*	*19.085*	*19.034*	*19.055*	*19.031*	*18.821*	*18.661*	*18.676*	*18.612*	*18.623*	*18.807*	*18.881*	*18.896*	*18.865*	*18.824*	*18.933*	*19.009*	*18.964*	*18.890*	*19.053*	*19.850*	*20.093*	*19.987*	*19.843*

平均水位值： **19.106**　　*月最高水位值：* **20.109**　　*月最低水位值：* **18.571**

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-48　101 年 4 月 GM9 地下水位逐時記錄表

地面標高：16.71公尺　井頂標高：17.21公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	14.258	14.199	14.147	14.223	14.137	14.174	14.196	14.181	14.152	14.172	14.118	14.094	14.066	14.063	13.883	14.054	14.190	14.238	14.132	14.036	13.963	14.077	14.255	14.035	13.940	13.908	15.526	14.827	14.445	14.212
1	14.247	14.191	14.142	14.220	14.134	14.176	14.190	14.174	14.150	14.177	14.113	14.099	14.065	14.069	13.875	14.048	14.185	14.240	14.122	14.033	13.959	14.080	14.244	14.022	13.933	13.909	15.585	14.805	14.431	14.204
2	14.239	14.184	14.143	14.210	14.127	14.170	14.186	14.167	14.148	14.181	14.116	14.090	14.049	14.060	13.870	14.035	14.188	14.243	14.115	14.030	13.958	14.077	14.230	14.012	13.922	13.917	15.588	14.787	14.416	14.197
3	14.232	14.181	14.135	14.196	14.125	14.169	14.182	14.162	14.141	14.184	14.115	14.090	14.044	14.062	13.866	14.032	14.185	14.246	14.106	14.024	13.967	14.077	14.219	14.008	13.914	13.930	15.550	14.775	14.402	14.187
4	14.229	14.170	14.132	14.188	14.120	14.172	14.175	14.158	14.133	14.180	14.110	14.085	14.046	14.063	13.858	14.034	14.179	14.247	14.096	14.017	13.982	14.077	14.209	14.000	13.915	13.930	15.499	14.755	14.386	14.183
5	14.221	14.174	14.139	14.186	14.123	14.174	14.175	14.148	14.134	14.185	14.106	14.084	14.048	14.065	13.857	14.039	14.173	14.244	14.091	14.017	13.990	14.079	14.198	13.995	13.915	13.946	15.451	14.731	14.374	14.179
6	14.225	14.175	14.137	14.187	14.119	14.183	14.175	14.153	14.129	14.186	14.102	14.084	14.051	14.069	13.858	14.050	14.176	14.251	14.091	14.013	14.005	14.097	14.189	13.997	13.913	13.964	15.397	14.715	14.362	14.182
7	14.227	14.180	14.136	14.192	14.125	14.193	14.181	14.157	14.134	14.197	14.101	14.085	14.056	14.067	13.859	14.062	14.170	14.258	14.092	14.016	14.016	14.120	14.189	13.995	13.912	14.000	15.350	14.700	14.353	14.169
8	14.235	14.180	14.148	14.196	14.131	14.201	14.187	14.163	14.144	14.204	14.102	14.091	14.064	14.080	13.867	14.076	14.178	14.257	14.096	14.016	14.029	14.149	14.183	14.001	13.913	14.128	15.308	14.684	14.345	14.166
9	14.242	14.185	14.154	14.194	14.135	14.209	14.189	14.164	14.144	14.206	14.103	14.094	14.064	14.088	13.868	14.091	14.176	14.259	14.092	14.015	14.043	14.171	14.175	13.997	13.913	14.384	15.265	14.672	14.344	14.166
10	14.240	14.181	14.161	14.194	14.138	14.213	14.186	14.160	14.144	14.203	14.101	14.093	14.063	14.089	13.869	14.099	14.175	14.257	14.095	14.017	14.045	14.193	14.164	13.998	13.923	14.549	15.217	14.661	14.329	14.165
11	14.233	14.174	14.172	14.185	14.143	14.215	14.190	14.158	14.147	14.204	14.098	14.089	14.058	14.014	13.868	14.102	14.170	14.248	14.091	14.019	14.055	14.208	14.159	13.987	13.911	14.614	15.167	14.645	14.315	14.159
12	14.229	14.171	14.184	14.176	14.136	14.208	14.187	14.157	14.145	14.193	14.090	14.085	14.060	13.909	13.865	14.106	14.162	14.238	14.080	14.005	14.054	14.227	14.142	13.980	13.907	14.647	15.119	14.625	14.304	14.154
13	14.222	14.157	14.194	14.164	14.134	14.202	14.182	14.155	14.137	14.184	14.082	14.074	14.048	13.933	13.857	14.099	14.152	14.221	14.070	14.002	14.051	14.234	14.125	13.967	13.906	14.661	15.075	14.604	14.287	14.139
14	14.209	14.142	14.189	14.154	14.126	14.191	14.173	14.149	14.130	14.170	14.076	14.067	14.045	13.959	13.847	14.098	14.135	14.208	14.058	13.994	14.051	14.242	14.109	13.952	13.895	14.674	15.039	14.580	14.271	14.130
15	14.205	14.138	14.190	14.140	14.119	14.183	14.168	14.142	14.121	14.157	14.063	14.056	14.034	13.977	13.879	14.099	14.126	14.189	14.047	13.984	14.045	14.244	14.091	13.939	13.882	14.768	15.007	14.563	14.257	14.115
16	14.196	14.130	14.191	14.128	14.122	14.180	14.166	14.141	14.119	14.144	14.058	14.050	14.031	13.880	13.902	14.105	14.114	14.179	14.038	13.976	14.047	14.245	14.070	13.937	13.889	14.914	14.984	14.548	14.243	14.108
17	14.199	14.127	14.198	14.126	14.125	14.182	14.158	14.138	14.121	14.136	14.055	14.048	14.033	13.876	13.929	14.117	14.104	14.168	14.035	13.973	14.046	14.251	14.063	13.936	13.889	15.033	14.952	14.529	14.232	14.108
18	14.195	14.132	14.201	14.121	14.135	14.183	14.163	14.143	14.122	14.133	14.051	14.046	14.034	13.881	14.004	14.131	14.102	14.164	14.032	13.965	14.049	14.256	14.054	13.939	13.889	15.073	14.933	14.517	14.227	14.161
19	14.200	14.136	14.208	14.130	14.146	14.188	14.171	14.147	14.133	14.128	14.059	14.047	14.036	13.878	14.028	14.153	14.112	14.156	14.036	13.975	14.047	14.258	14.052	13.940	13.884	15.083	14.908	14.504	14.228	14.191
20	14.197	14.138	14.211	14.134	14.152	14.191	14.174	14.152	14.141	14.131	14.067	14.054	14.046	13.879	14.050	14.164	14.155	14.151	14.034	13.975	14.057	14.261	14.053	13.940	13.894	15.078	14.895	14.494	14.224	14.210
21	14.204	14.141	14.217	14.137	14.160	14.196	14.179	14.153	14.147	14.134	14.071	14.058	14.052	13.882	14.059	14.176	14.187	14.145	14.036	13.977	14.067	14.262	14.047	13.946	13.904	15.078	14.874	14.482	14.217	14.221
22	14.206	14.150	14.228	14.136	14.172	14.195	14.187	14.155	14.159	14.134	14.078	14.062	14.059	13.886	14.055	14.187	14.212	14.144	14.039	13.974	14.066	14.265	14.043	13.945	13.908	15.156	14.857	14.474	14.215	14.230
23	14.204	14.148	14.228	14.140	14.172	14.197	14.189	14.155	14.165	14.126	14.085	14.069	14.064	13.884	14.066	14.188	14.227	14.137	14.037	13.974	14.076	14.261	14.037	13.950	13.911	15.372	14.846	14.462	14.216	14.235
最高(m)	*14.258*	*14.199*	*14.228*	*14.223*	*14.172*	*14.215*	*14.196*	*14.181*	*14.165*	*14.206*	*14.118*	*14.099*	*14.066*	*14.089*	*14.066*	*14.188*	*14.227*	*14.259*	*14.132*	*14.036*	*14.076*	*14.265*	*14.255*	*14.035*	*13.940*	*15.372*	*15.588*	*14.827*	*14.445*	*14.235*
最低(m)	*14.195*	*14.127*	*14.132*	*14.121*	*14.119*	*14.169*	*14.158*	*14.138*	*14.119*	*14.126*	*14.051*	*14.046*	*14.031*	*13.876*	*13.847*	*14.032*	*14.102*	*14.137*	*14.032*	*13.965*	*13.958*	*14.077*	*14.037*	*13.936*	*13.882*	*13.908*	*14.846*	*14.462*	*14.215*	*14.108*
平均(m)	*14.221*	*14.162*	*14.174*	*14.169*	*14.136*	*14.189*	*14.180*	*14.156*	*14.139*	*14.169*	*14.088*	*14.075*	*14.051*	*13.984*	*13.914*	*14.098*	*14.164*	*14.212*	*14.073*	*14.001*	*14.028*	*14.184*	*14.138*	*13.976*	*13.908*	*14.530*	*15.183*	*14.631*	*14.309*	*14.174*

平均水位值： **14.180**　　*月最高水位值：* **15.588**　　*月最低水位值：* **13.847**

附錄 IV.6-49　101 年 4 月 GM11 地下水位逐時記錄表

地面標高：42.30公尺　井頂標高：42.89公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	28.574	28.527	28.547	28.644	28.623	28.592	28.587	28.566	28.524	28.486	28.428	28.378	28.339	28.299	28.273	28.215	28.207	28.177	28.141	28.117	28.087	28.060	28.082	28.092	28.088	28.090	28.200	29.273	30.160	30.128
1	28.572	28.527	28.551	28.646	28.619	28.593	28.582	28.567	28.518	28.486	28.426	28.385	28.334	28.298	28.270	28.215	28.205	28.174	28.136	28.112	28.086	28.060	28.081	28.088	28.091	28.094	28.212	29.354	30.165	30.116
2	28.570	28.523	28.558	28.651	28.622	28.588	28.584	28.562	28.519	28.480	28.422	28.384	28.332	28.292	28.269	28.215	28.206	28.175	28.134	28.111	28.084	28.063	28.085	28.086	28.087	28.099	28.225	29.443	30.170	30.114
3	28.569	28.520	28.565	28.649	28.617	28.592	28.579	28.563	28.517	28.483	28.418	28.377	28.334	28.297	28.266	28.209	28.206	28.169	28.131	28.114	28.084	28.064	28.083	28.090	28.083	28.102	28.244	29.518	30.169	30.099
4	28.564	28.512	28.569	28.650	28.617	28.586	28.581	28.559	28.515	28.480	28.421	28.376	28.327	28.294	28.263	28.205	28.198	28.166	28.133	28.110	28.075	28.065	28.086	28.087	28.083	28.102	28.263	29.590	30.175	30.097
5	28.564	28.513	28.574	28.653	28.611	28.590	28.578	28.552	28.513	28.473	28.412	28.374	28.322	28.292	28.260	28.208	28.199	28.164	28.131	28.109	28.079	28.064	28.080	28.087	28.082	28.103	28.290	29.659	30.179	30.087
6	28.564	28.515	28.579	28.650	28.609	28.591	28.577	28.554	28.506	28.477	28.416	28.370	28.325	28.294	28.255	28.207	28.197	28.160	28.127	28.111	28.072	28.069	28.083	28.087	28.085	28.112	28.316	29.708	30.175	30.088
7	28.565	28.506	28.582	28.648	28.605	28.589	28.579	28.554	28.508	28.473	28.413	28.373	28.325	28.295	28.253	28.207	28.194	28.162	28.131	28.107	28.071	28.068	28.084	28.088	28.084	28.121	28.345	29.760	30.179	30.075
8	28.563	28.502	28.586	28.653	28.609	28.586	28.577	28.554	28.510	28.468	28.407	28.371	28.324	28.291	28.258	28.205	28.194	28.159	28.122	28.106	28.069	28.069	28.087	28.084	28.085	28.123	28.378	29.803	30.181	30.071
9	28.559	28.425	28.589	28.649	28.609	28.589	28.576	28.552	28.506	28.470	28.409	28.370	28.319	28.294	28.251	28.209	28.194	28.159	28.124	28.108	28.072	28.073	28.090	28.091	28.085	28.128	28.410	29.847	30.184	30.063
10	28.560	28.302	28.596	28.654	28.606	28.591	28.580	28.551	28.504	28.466	28.407	28.366	28.325	28.294	28.246	28.209	28.194	28.158	28.126	28.108	28.069	28.076	28.086	28.092	28.089	28.131	28.444	29.883	30.183	30.060
11	28.553	28.206	28.601	28.649	28.605	28.591	28.581	28.550	28.506	28.466	28.404	28.369	28.320	28.291	28.245	28.210	28.193	28.157	28.129	28.106	28.068	28.078	28.092	28.091	28.086	28.137	28.484	29.918	30.182	30.053
12	28.558	28.277	28.602	28.649	28.604	28.593	28.579	28.551	28.503	28.464	28.405	28.360	28.317	28.294	28.247	28.212	28.194	28.157	28.127	28.106	28.063	28.079	28.090	28.087	28.083	28.139	28.518	29.949	30.180	30.048
13	28.557	28.363	28.613	28.648	28.607	28.595	28.577	28.551	28.501	28.460	28.400	28.359	28.317	28.288	28.244	28.214	28.195	28.156	28.127	28.107	28.063	28.080	28.088	28.092	28.089	28.142	28.558	29.980	30.178	30.038
14	28.551	28.346	28.613	28.643	28.598	28.587	28.575	28.542	28.499	28.457	28.399	28.355	28.314	28.290	28.242	28.213	28.195	28.148	28.123	28.103	28.064	28.079	28.091	28.083	28.087	28.145	28.601	30.006	30.168	30.027
15	28.547	28.354	28.615	28.641	28.596	28.594	28.573	28.542	28.494	28.453	28.395	28.353	28.310	28.287	28.239	28.211	28.188	28.146	28.124	28.101	28.058	28.077	28.089	28.086	28.083	28.148	28.645	30.026	30.163	30.022
16	28.546	28.361	28.620	28.641	28.595	28.589	28.571	28.538	28.496	28.448	28.390	28.352	28.309	28.289	28.236	28.208	28.186	28.147	28.120	28.095	28.057	28.081	28.085	28.082	28.084	28.149	28.694	30.046	30.158	30.018
17	28.545	28.404	28.624	28.635	28.594	28.587	28.568	28.538	28.494	28.447	28.386	28.345	28.307	28.281	28.235	28.211	28.181	28.144	28.118	28.095	28.055	28.080	28.082	28.083	28.084	28.154	28.748	30.069	30.158	30.013
18	28.541	28.433	28.629	28.632	28.593	28.588	28.571	28.532	28.494	28.443	28.382	28.345	28.305	28.279	28.228	28.207	28.181	28.141	28.117	28.093	28.056	28.078	28.086	28.082	28.085	28.158	28.814	30.089	30.156	30.004
19	28.537	28.458	28.632	28.631	28.593	28.586	28.565	28.531	28.488	28.442	28.384	28.342	28.301	28.279	28.226	28.205	28.184	28.143	28.113	28.093	28.056	28.079	28.088	28.083	28.085	28.159	28.883	30.105	30.153	29.996
20	28.535	28.478	28.632	28.629	28.596	28.586	28.567	28.532	28.491	28.441	28.379	28.342	28.302	28.278	28.224	28.206	28.183	28.143	28.117	28.090	28.053	28.080	28.088	28.086	28.088	28.163	28.951	30.119	30.148	29.993
21	28.537	28.495	28.637	28.624	28.593	28.581	28.567	28.529	28.489	28.436	28.383	28.338	28.299	28.278	28.221	28.205	28.175	28.141	28.114	28.092	28.055	28.079	28.085	28.088	28.087	28.173	29.021	30.130	30.142	29.988
22	28.534	28.512	28.640	28.627	28.592	28.586	28.566	28.528	28.490	28.432	28.382	28.340	28.297	28.276	28.224	28.208	28.178	28.140	28.117	28.090	28.058	28.081	28.088	28.089	28.089	28.181	29.099	30.141	30.137	29.988
23	28.530	28.526	28.647	28.626	28.595	28.588	28.566	28.523	28.486	28.428	28.383	28.338	28.297	28.274	28.217	28.206	28.176	28.140	28.116	28.088	28.058	28.082	28.085	28.090	28.091	28.189	29.186	30.150	30.135	29.979
最高(m)	*28.574*	*28.527*	*28.647*	*28.654*	*28.623*	*28.595*	*28.587*	*28.567*	*28.524*	*28.486*	*28.428*	*28.385*	*28.339*	*28.299*	*28.273*	*28.215*	*28.207*	*28.177*	*28.141*	*28.117*	*28.087*	*28.082*	*28.092*	*28.092*	*28.091*	*28.189*	*29.186*	*30.150*	*30.184*	*30.128*
最低(m)	*28.530*	*28.206*	*28.547*	*28.624*	*28.592*	*28.581*	*28.565*	*28.523*	*28.486*	*28.428*	*28.379*	*28.338*	*28.297*	*28.274*	*28.217*	*28.205*	*28.175*	*28.140*	*28.113*	*28.088*	*28.053*	*28.060*	*28.080*	*28.082*	*28.082*	*28.090*	*28.200*	*29.273*	*30.135*	*29.979*
平均(m)	*28.554*	*28.441*	*28.600*	*28.643*	*28.605*	*28.589*	*28.575*	*28.547*	*28.503*	*28.461*	*28.402*	*28.361*	*28.317*	*28.289*	*28.246*	*28.209*	*28.192*	*28.155*	*28.125*	*28.103*	*28.067*	*28.074*	*28.086*	*28.087*	*28.086*	*28.135*	*28.564*	*29.857*	*30.165*	*30.048*

平均水位值： **28.503**　　*月最高水位值：* **30.184**　　*月最低水位值：* **28.053**

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

財團法人工業技術研究院 量測技術發展中心 實驗報告專用章 2012.29939 2012.30230

附錄 IV.6-50　101 年 4 月 GM12 地下水位逐時記錄表

地面標高：43.56公尺　井頂標高：44.00公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	32.703	32.609	32.512	32.541	32.439	32.400	32.613	32.588	32.528	32.495	32.416	32.439	32.405	32.272	32.317	32.261	32.288	32.275	32.252	32.257	32.245	32.267	32.382	32.530	32.568	32.546	33.265	36.030	35.166	34.476
1	32.700	32.600	32.512	32.536	32.430	32.400	32.609	32.584	32.524	32.491	32.418	32.434	32.399	32.284	32.309	32.256	32.288	32.272	32.252	32.255	32.248	32.272	32.388	32.534	32.565	32.541	33.576	35.996	35.117	34.451
2	32.695	32.590	32.509	32.529	32.428	32.397	32.610	32.577	32.521	32.485	32.408	32.434	32.388	32.290	32.307	32.256	32.285	32.269	32.250	32.253	32.242	32.277	32.391	32.538	32.558	32.547	33.868	35.962	35.078	34.427
3	32.683	32.586	32.506	32.527	32.426	32.394	32.599	32.574	32.513	32.480	32.407	32.430	32.378	32.293	32.300	32.252	32.276	32.264	32.249	32.253	32.236	32.279	32.393	32.542	32.562	32.551	34.199	35.927	35.032	34.404
4	32.684	32.581	32.502	32.519	32.421	32.402	32.604	32.568	32.512	32.472	32.405	32.426	32.384	32.299	32.293	32.250	32.282	32.257	32.243	32.252	32.242	32.289	32.394	32.544	32.562	32.552	34.502	35.889	35.000	34.376
5	32.677	32.574	32.499	32.509	32.422	32.394	32.606	32.565	32.504	32.471	32.404	32.425	32.378	32.300	32.297	32.262	32.282	32.259	32.243	32.251	32.242	32.294	32.398	32.549	32.558	32.554	34.757	35.847	34.963	34.357
6	32.676	32.574	32.494	32.508	32.416	32.397	32.598	32.566	32.508	32.470	32.406	32.426	32.385	32.310	32.297	32.261	32.283	32.258	32.249	32.250	32.233	32.299	32.405	32.555	32.558	32.568	35.011	35.809	34.929	34.327
7	32.676	32.576	32.496	32.513	32.418	32.402	32.604	32.571	32.508	32.470	32.402	32.422	32.390	32.311	32.295	32.263	32.284	32.257	32.250	32.254	32.230	32.306	32.418	32.551	32.557	32.584	35.233	35.772	34.900	34.307
8	32.675	32.570	32.497	32.508	32.409	32.399	32.600	32.568	32.513	32.472	32.404	32.426	32.393	32.323	32.297	32.270	32.287	32.254	32.254	32.248	32.231	32.311	32.423	32.558	32.549	32.588	35.446	35.733	34.878	34.287
9	32.676	32.570	32.502	32.507	32.414	32.401	32.601	32.564	32.514	32.470	32.402	32.427	32.393	32.330	32.294	32.275	32.289	32.258	32.257	32.261	32.233	32.310	32.432	32.561	32.553	32.601	35.623	35.700	34.853	34.264
10	32.674	32.568	32.504	32.505	32.416	32.403	32.604	32.560	32.512	32.463	32.405	32.423	32.396	32.329	32.298	32.279	32.293	32.260	32.257	32.260	32.235	32.317	32.440	32.564	32.555	32.616	35.775	35.667	34.828	34.241
11	32.668	32.561	32.508	32.503	32.415	32.403	32.604	32.561	32.508	32.459	32.403	32.421	32.389	32.332	32.293	32.288	32.291	32.256	32.258	32.259	32.240	32.325	32.445	32.562	32.550	32.618	35.899	35.627	34.803	34.225
12	32.665	32.560	32.522	32.493	32.417	32.406	32.600	32.556	32.505	32.459	32.404	32.418	32.387	32.330	32.298	32.286	32.291	32.256	32.258	32.258	32.234	32.329	32.447	32.563	32.544	32.624	35.998	35.592	34.771	34.211
13	32.659	32.553	32.523	32.480	32.412	32.401	32.601	32.556	32.502	32.453	32.393	32.412	32.386	32.329	32.287	32.283	32.285	32.246	32.254	32.256	32.236	32.334	32.456	32.564	32.553	32.626	36.067	35.552	34.737	34.187
14	32.642	32.543	32.524	32.478	32.408	32.399	32.591	32.549	32.496	32.447	32.388	32.404	32.273	32.324	32.283	32.282	32.288	32.245	32.250	32.249	32.233	32.339	32.463	32.561	32.541	32.637	36.118	35.512	34.707	34.157
15	32.640	32.537	32.527	32.468	32.406	32.611	32.596	32.545	32.492	32.440	32.385	32.399	32.159	32.324	32.273	32.278	32.276	32.245	32.247	32.254	32.229	32.340	32.467	32.552	32.533	32.656	36.151	35.481	34.679	34.137
16	32.629	32.527	32.528	32.457	32.404	32.623	32.594	32.541	32.491	32.433	32.379	32.397	32.239	32.313	32.267	32.276	32.272	32.245	32.242	32.248	32.228	32.346	32.474	32.556	32.533	32.668	36.150	35.447	34.657	34.120
17	32.625	32.524	32.523	32.454	32.401	32.615	32.589	32.544	32.493	32.430	32.377	32.395	32.203	32.323	32.270	32.276	32.270	32.243	32.246	32.244	32.230	32.349	32.474	32.561	32.534	32.688	36.152	35.408	34.623	34.098
18	32.626	32.520	32.536	32.443	32.405	32.614	32.583	32.537	32.496	32.430	32.400	32.387	32.189	32.322	32.260	32.279	32.277	32.245	32.241	32.247	32.233	32.351	32.490	32.562	32.528	32.719	36.147	35.377	34.620	34.080
19	32.620	32.516	32.533	32.444	32.404	32.611	32.588	32.537	32.491	32.428	32.420	32.390	32.146	32.320	32.263	32.284	32.276	32.247	32.250	32.245	32.239	32.356	32.502	32.564	32.538	32.748	36.134	35.333	34.591	34.066
20	32.621	32.518	32.537	32.443	32.406	32.615	32.594	32.540	32.501	32.424	32.429	32.393	32.192	32.321	32.262	32.282	32.271	32.248	32.248	32.247	32.245	32.365	32.508	32.566	32.541	32.785	36.115	35.298	34.568	34.062
21	32.622	32.517	32.544	32.441	32.407	32.618	32.593	32.537	32.499	32.426	32.430	32.395	32.219	32.318	32.262	32.286	32.280	32.248	32.247	32.251	32.246	32.367	32.511	32.568	32.540	32.846	36.097	35.264	34.541	34.042
22	32.619	32.518	32.542	32.439	32.411	32.611	32.594	32.536	32.498	32.423	32.439	32.404	32.240	32.323	32.262	32.286	32.281	32.256	32.254	32.247	32.254	32.376	32.515	32.571	32.541	32.915	36.083	35.230	34.519	34.030
23	32.613	32.519	32.544	32.437	32.406	32.611	32.592	32.526	32.499	32.419	32.440	32.400	32.256	32.320	32.267	32.287	32.272	32.250	32.255	32.245	32.258	32.376	32.530	32.567	32.542	33.037	36.063	35.199	34.502	34.015
最高(m)	32.703	32.609	32.544	32.541	32.439	32.623	32.613	32.588	32.528	32.495	32.440	32.439	32.405	32.332	32.317	32.288	32.293	32.275	32.258	32.261	32.258	32.376	32.530	32.571	32.563	33.037	36.152	36.030	35.166	34.476
最低(m)	32.613	32.516	32.494	32.437	32.401	32.394	32.563	32.526	32.491	32.419	32.377	32.387	32.146	32.272	32.260	32.250	32.270	32.243	32.241	32.244	32.228	32.267	32.382	32.530	32.528	32.541	33.265	35.199	34.502	34.015
平均(m)	32.657	32.555	32.518	32.487	32.414	32.480	32.599	32.556	32.505	32.455	32.407	32.414	32.315	32.314	32.285	32.273	32.282	32.265	32.250	32.252	32.238	32.324	32.448	32.556	32.548	32.659	35.435	35.611	34.794	34.223

平均水位值：　32.770　　月最高水位值：　36.152　　月最低水位值：　32.146

附錄 IV.6-51　101 年 4 月 GM13 地下水位逐時記錄表

地面標高：55.25公尺　井頂標高：55.77公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	41.223	41.109	40.957	40.893	40.800	40.729	40.358	39.961	39.879	39.821	39.937	39.796	39.630	39.529	39.423	39.325	39.441	38.464	39.243	39.213	39.187	39.225	39.334	39.344	39.398	39.402	39.837	44.492	44.075	43.518
1	41.224	41.095	40.955	40.887	40.798	40.721	40.313	39.947	39.873	39.814	39.941	39.779	39.614	39.518	39.424	39.320	39.463	38.323	39.240	39.206	39.188	39.230	39.328	39.340	39.393	39.388	40.073	44.471	44.057	43.489
2	41.210	41.085	40.944	40.880	40.797	40.716	40.282	39.944	39.869	39.806	39.938	39.763	39.608	39.514	39.418	39.309	39.485	38.159	39.246	39.204	39.181	39.226	39.324	39.351	39.391	39.390	40.685	44.451	44.038	43.448
3	41.202	41.081	40.934	40.876	40.789	40.714	40.270	39.945	39.865	39.803	39.938	39.754	39.601	39.506	39.414	39.315	39.508	37.855	39.255	39.212	39.179	39.223	39.331	39.341	39.397	39.386	41.496	44.422	44.017	43.424
4	41.198	41.071	40.939	40.874	40.790	40.716	40.271	39.937	39.861	39.806	39.936	39.739	39.602	39.502	39.415	39.322	39.527	38.060	39.263	39.200	39.183	39.220	39.331	39.340	39.396	39.384	42.467	44.404	43.999	43.392
5	41.200	41.076	40.935	40.876	40.789	40.719	40.267	39.940	39.859	39.803	39.931	39.737	39.601	39.504	39.419	39.326	39.549	38.242	39.263	39.199	39.186	39.229	39.338	39.354	39.394	39.383	43.457	44.385	43.975	43.367
6	41.203	41.075	40.925	40.884	40.790	40.723	39.987	39.945	39.864	39.814	39.932	39.735	39.604	39.499	39.419	39.322	39.564	38.394	39.275	39.205	39.194	39.231	39.353	39.354	39.400	39.396	44.003	44.369	43.963	43.329
7	41.202	41.072	40.935	40.884	40.793	40.727	39.987	39.948	39.865	39.821	39.925	39.734	39.606	39.498	39.421	39.322	39.588	38.521	39.282	39.197	39.203	39.241	39.352	39.360	39.400	39.394	44.411	44.348	43.950	43.297
8	41.202	41.070	40.937	40.886	40.786	40.726	39.988	39.949	39.868	39.837	39.928	39.728	39.600	39.495	39.422	39.317	39.614	38.632	39.276	39.212	39.211	39.248	39.345	39.363	39.407	39.389	44.666	44.331	43.935	43.270
9	41.195	41.061	40.937	40.880	40.785	40.725	39.988	39.945	39.865	39.846	39.923	39.724	39.597	39.493	39.420	39.316	39.628	38.718	39.268	39.211	39.203	39.250	39.343	39.362	39.420	39.390	44.840	44.312	43.911	43.245
10	41.193	41.052	40.936	40.879	40.779	40.721	39.983	39.938	39.857	39.855	39.917	39.718	39.584	39.488	39.411	39.308	39.564	38.799	39.267	39.197	39.199	39.255	39.345	39.359	39.409	39.384	44.946	44.294	43.894	43.234
11	41.180	41.041	40.941	40.865	40.768	40.709	39.979	39.936	39.852	39.869	39.901	39.714	39.576	39.481	39.414	39.303	39.436	38.869	39.255	39.193	39.191	39.267	39.344	39.356	39.404	39.375	45.002	44.283	43.864	43.205
12	41.176	41.035	40.941	40.851	40.760	40.701	39.976	39.935	39.850	39.878	39.892	39.700	39.575	39.469	39.407	39.291	39.345	38.922	39.244	39.187	39.193	39.256	39.336	39.356	39.402	39.373	45.017	44.266	43.847	43.179
13	41.172	41.023	40.930	40.843	40.755	40.694	39.962	39.930	39.840	39.883	39.876	39.691	39.562	39.465	39.396	39.280	39.410	38.981	39.234	39.189	39.187	39.260	39.338	39.344	39.402	39.378	44.991	44.249	43.820	43.153
14	41.163	41.015	40.917	40.836	40.743	40.688	39.963	39.922	39.836	39.888	39.860	39.685	39.550	39.455	39.389	39.279	39.395	39.032	39.222	39.183	39.184	39.257	39.332	39.355	39.393	39.395	44.941	44.241	43.782	43.140
15	41.156	41.011	40.920	40.826	40.746	40.591	39.964	39.921	39.833	39.896	39.847	39.677	39.550	39.445	39.391	39.279	39.396	39.078	39.218	39.174	39.183	39.271	39.332	39.354	39.395	39.405	44.889	44.225	43.753	43.066
16	41.159	41.013	40.917	40.821	40.749	40.581	39.963	39.919	39.837	39.906	39.837	39.672	39.542	39.446	39.392	39.284	39.370	39.118	39.216	39.187	39.183	39.273	39.327	39.368	39.393	39.427	44.826	44.216	43.792	43.039
17	41.161	41.000	40.921	40.823	40.752	40.492	39.967	39.917	39.837	39.920	39.832	39.674	39.544	39.447	39.381	39.296	39.277	39.151	39.230	39.187	39.199	39.280	39.329	39.377	39.388	39.458	44.775	44.195	43.749	43.010
18	41.158	40.992	40.912	40.825	40.752	40.487	39.967	39.923	39.839	39.937	39.833	39.670	39.545	39.452	39.371	39.319	39.241	39.175	39.235	39.197	39.189	39.298	39.338	39.382	39.390	39.500	44.738	44.175	43.660	42.974
19	41.157	40.989	40.912	40.826	40.753	40.489	39.980	39.920	39.841	39.941	39.830	39.670	39.550	39.450	39.370	39.337	39.202	39.195	39.230	39.198	39.206	39.308	39.346	39.389	39.401	39.548	44.701	44.162	43.650	42.944
20	41.155	40.989	40.911	40.829	40.755	40.429	39.973	39.921	39.838	39.949	39.819	39.666	39.545	39.446	39.367	39.356	39.184	39.212	39.230	39.208	39.215	39.314	39.355	39.393	39.410	39.599	44.659	44.149	43.622	42.910
21	41.155	40.984	40.910	40.825	40.754	40.401	39.975	39.921	39.836	39.960	39.816	39.667	39.545	39.447	39.358	39.381	39.101	39.224	39.225	39.199	39.214	39.322	39.359	39.399	39.406	39.679	44.607	44.133	43.605	42.870
22	41.144	40.978	40.912	40.817	40.742	40.399	39.972	39.919	39.832	39.962	39.816	39.665	39.543	39.445	39.357	39.407	38.854	39.237	39.223	39.195	39.234	39.320	39.353	39.409	39.404	39.726	44.556	44.120	43.581	42.834
23	41.127	40.964	40.902	40.805	40.732	40.365	39.964	39.916	39.831	39.961	39.809	39.656	39.537	39.440	39.343	39.426	38.483	39.238	39.226	39.196	39.230	39.325	39.352	39.400	39.397	39.777	44.526	44.067	43.554	42.806
最高(m)	41.224	41.109	40.957	40.893	40.800	40.729	40.358	39.961	39.879	39.962	39.941	39.796	39.630	39.529	39.424	39.426	39.628	39.238	39.282	39.213	39.234	39.325	39.359	39.409	39.420	39.777	45.017	44.492	44.075	43.518
最低(m)	41.127	40.964	40.902	40.805	40.732	40.365	39.962	39.916	39.831	39.803	39.809	39.656	39.537	39.440	39.343	39.279	38.483	37.855	39.216	39.174	39.179	39.220	39.324	39.340	39.388	39.373	39.837	44.097	43.553	42.806
平均(m)	41.180	41.037	40.928	40.854	40.769	40.623	40.054	39.933	39.851	39.874	39.884	39.709	39.575	39.476	39.398	39.323	39.359	38.775	39.244	39.198	39.197	39.264	39.340	39.365	39.400	39.455	43.881	44.283	43.834	43.171

平均水位值：　40.341　　月最高水位值：　45.017　　月最低水位值：　37.855

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-52　101 年 4 月 GM7 地下水位逐時記錄表

地面標高：19.49公尺　井頂標高：19.96公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	11.387	11.338	11.288	11.328	11.251	11.285	10.417	10.402	10.356	10.354	10.403	10.398	10.374	10.357	10.329	10.294	9.872	10.256	10.311	10.329	10.303	10.329	10.390	10.350	10.321	10.277	10.467	10.462	10.433	10.375
1	11.385	11.333	11.298	11.324	11.255	11.288	10.411	10.396	10.360	10.366	10.400	10.398	10.366	10.350	10.328	10.294	9.920	10.260	10.314	10.328	10.301	10.330	10.377	10.343	10.309	10.264	10.462	10.455	10.424	10.373
2	11.376	11.337	11.290	11.325	11.249	11.284	10.415	10.396	10.345	10.365	10.400	10.404	10.357	10.354	10.334	10.293	9.954	10.256	10.314	10.328	10.306	10.330	10.369	10.338	10.304	10.276	10.471	10.466	10.419	10.366
3	11.379	11.326	11.286	11.316	11.249	11.290	10.414	10.393	10.336	10.355	10.395	10.394	10.355	10.351	10.326	10.296	9.980	10.272	10.314	10.328	10.305	10.340	10.369	10.337	10.302	10.282	10.455	10.448	10.416	10.362
4	11.373	11.323	11.290	11.311	11.251	11.296	10.412	10.400	10.337	10.356	10.390	10.391	10.351	10.346	10.315	10.307	10.013	10.262	10.311	10.329	10.305	10.356	10.368	10.338	10.301	10.290	10.452	10.449	10.409	10.360
5	11.369	11.323	11.290	11.310	11.241	11.300	10.415	10.391	10.330	10.357	10.398	10.389	10.353	10.352	10.318	10.324	10.047	10.270	10.327	10.333	10.309	10.350	10.380	10.340	10.297	10.297	10.463	10.444	10.400	10.366
6	11.368	11.325	11.286	11.321	11.248	11.310	10.420	10.395	10.330	10.365	10.402	10.401	10.349	10.364	10.313	10.320	10.064	10.276	10.324	10.333	10.312	10.364	10.369	10.343	10.299	10.323	10.460	10.447	10.399	10.355
7	11.370	11.324	11.281	11.310	11.246	11.300	10.414	10.402	10.335	10.366	10.399	10.397	10.360	10.355	10.314	10.333	10.096	10.279	10.319	10.332	10.312	10.377	10.374	10.350	10.300	10.347	10.463	10.444	10.398	10.356
8	11.375	11.324	11.293	11.304	11.253	11.303	10.417	10.407	10.330	10.371	10.399	10.410	10.357	10.356	10.322	10.343	10.108	10.279	10.323	10.333	10.319	10.390	10.382	10.346	10.303	10.363	10.465	10.443	10.396	10.350
9	11.373	11.325	11.290	11.298	11.242	11.298	10.419	10.397	10.328	10.371	10.411	10.403	10.354	10.360	10.310	10.351	10.124	10.283	10.324	10.338	10.319	10.387	10.374	10.356	10.296	10.384	10.463	10.447	10.406	10.355
10	11.372	11.317	11.295	11.295	11.243	11.293	10.416	10.388	10.323	10.366	10.406	10.405	10.358	10.362	10.304	10.286	10.140	10.291	10.322	10.327	10.303	10.385	10.367	10.346	10.295	10.399	10.464	10.451	10.391	10.354
11	11.368	11.313	11.307	11.281	11.236	11.289	10.409	10.379	10.323	10.365	10.390	10.400	10.348	10.363	10.311	10.027	10.146	10.279	10.316	10.326	10.297	10.388	10.357	10.344	10.290	10.400	10.469	10.445	10.391	10.352
12	11.367	11.309	11.324	11.276	11.237	11.284	10.401	10.375	10.306	10.354	10.387	10.391	10.343	10.358	10.314	9.898	10.162	10.277	10.325	10.319	10.296	10.382	10.351	10.330	10.283	10.404	10.467	10.441	10.386	10.346
13	11.360	11.307	11.310	11.274	11.236	11.277	10.397	10.365	10.306	10.363	10.380	10.382	10.337	10.353	10.301	9.893	10.167	10.278	10.320	10.313	10.295	10.383	10.344	10.314	10.278	10.402	10.464	10.439	10.376	10.343
14	11.361	11.300	11.316	11.269	11.240	11.275	10.393	10.361	10.289	10.355	10.372	10.377	10.342	10.349	10.302	9.918	10.176	10.282	10.314	10.320	10.299	10.376	10.342	10.312	10.269	10.413	10.460	10.436	10.370	10.339
15	11.350	11.305	11.316	11.267	11.231	11.279	10.396	10.361	10.285	10.361	10.367	10.367	10.331	10.344	10.294	9.899	10.182	10.282	10.315	10.307	10.289	10.378	10.339	10.305	10.266	10.415	10.461	10.434	10.358	10.345
16	11.347	11.289	11.332	11.262	11.252	10.425	10.392	10.361	10.283	10.360	10.374	10.369	10.338	10.343	10.292	9.874	10.190	10.289	10.316	10.308	10.293	10.382	10.334	10.309	10.261	10.419	10.450	10.441	10.354	10.340
17	11.342	11.294	11.326	11.264	11.254	10.419	10.406	10.364	10.284	10.370	10.367	10.367	10.328	10.344	10.279	9.795	10.199	10.295	10.327	10.317	10.302	10.381	10.336	10.314	10.255	10.420	10.447	10.428	10.349	10.354
18	11.345	11.289	11.326	11.261	11.265	10.434	10.399	10.366	10.292	10.379	10.364	10.376	10.328	10.344	10.283	9.808	10.223	10.303	10.328	10.313	10.312	10.386	10.348	10.323	10.250	10.427	10.454	10.427	10.358	10.348
19	11.340	11.285	11.336	11.258	11.282	10.427	10.407	10.370	10.301	10.388	10.362	10.365	10.334	10.334	10.291	9.820	10.229	10.303	10.327	10.312	10.311	10.385	10.351	10.324	10.260	10.430	10.454	10.432	10.361	10.357
20	11.353	11.293	11.329	11.260	11.286	10.431	10.410	10.372	10.318	10.393	10.369	10.366	10.337	10.330	10.280	9.828	10.234	10.308	10.328	10.313	10.317	10.388	10.355	10.324	10.269	10.433	10.457	10.434	10.362	10.370
21	11.344	11.283	11.330	11.257	11.282	10.432	10.413	10.372	10.334	10.402	10.371	10.370	10.340	10.341	10.280	9.836	10.249	10.306	10.330	10.314	10.320	10.388	10.368	10.324	10.268	10.449	10.459	10.436	10.368	10.366
22	11.345	11.292	11.333	11.254	11.283	10.433	10.414	10.366	10.344	10.405	10.383	10.372	10.347	10.333	10.283	9.779	10.247	10.309	10.334	10.319	10.322	10.386	10.355	10.329	10.267	10.465	10.475	10.436	10.373	10.374
23	11.337	11.290	11.325	11.250	11.279	10.419	10.409	10.363	10.352	10.403	10.389	10.376	10.351	10.335	10.291	9.824	10.251	10.308	10.328	10.304	10.334	10.382	10.355	10.328	10.266	10.469	10.468	10.435	10.376	10.374
最高(m)	*11.387*	*11.338*	*11.336*	*11.328*	*11.286*	*11.310*	*10.420*	*10.407*	*10.360*	*10.405*	*10.411*	*10.410*	*10.374*	*10.364*	*10.334*	*10.351*	*10.251*	*10.309*	*10.334*	*10.338*	*10.334*	*10.390*	*10.390*	*10.356*	*10.321*	*10.469*	*10.475*	*10.466*	*10.433*	*10.375*
最低(m)	*11.337*	*11.283*	*11.281*	*11.250*	*11.231*	*10.419*	*10.392*	*10.361*	*10.283*	*10.354*	*10.362*	*10.365*	*10.328*	*10.330*	*10.279*	*9.779*	*9.872*	*10.256*	*10.311*	*10.304*	*10.289*	*10.329*	*10.334*	*10.305*	*10.250*	*10.264*	*10.447*	*10.427*	*10.349*	*10.339*
平均(m)	*11.362*	*11.310*	*11.308*	*11.286*	*11.254*	*11.003*	*10.409*	*10.381*	*10.322*	*10.370*	*10.387*	*10.386*	*10.347*	*10.349*	*10.305*	*10.068*	*10.124*	*10.283*	*10.321*	*10.322*	*10.308*	*10.372*	*10.367*	*10.332*	*10.284*	*10.377*	*10.461*	*10.443*	*10.386*	*10.358*

平均水位值： **10.519**　　*月最高水位值：* **11.387**　　*月最低水位值：* **9.779**

附錄 IV.6-53　101 年 4 月 GM14-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：---公尺　井頂標高：12.69公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	7.630	7.565	7.505	7.561	7.454	7.452	7.373	7.362	7.326	7.324	7.312	7.310	7.293	7.293	7.274	7.224	7.262	7.284	7.284	7.282	7.235	7.281	7.377	7.338	7.285	7.272	7.705	7.812	7.739	7.646
1	7.623	7.557	7.507	7.551	7.454	7.456	7.369	7.355	7.321	7.324	7.311	7.307	7.286	7.291	7.270	7.225	7.258	7.282	7.286	7.277	7.234	7.284	7.372	7.332	7.277	7.267	7.720	7.801	7.733	7.637
2	7.619	7.553	7.497	7.542	7.451	7.452	7.370	7.353	7.317	7.320	7.310	7.304	7.276	7.291	7.266	7.212	7.263	7.281	7.281	7.275	7.230	7.285	7.370	7.330	7.271	7.277	7.735	7.804	7.729	7.626
3	7.607	7.546	7.493	7.530	7.441	7.447	7.360	7.345	7.310	7.319	7.310	7.297	7.267	7.288	7.260	7.207	7.258	7.278	7.275	7.271	7.220	7.289	7.368	7.319	7.266	7.279	7.731	7.794	7.714	7.614
4	7.602	7.545	7.492	7.525	7.445	7.447	7.357	7.345	7.307	7.321	7.306	7.292	7.272	7.285	7.255	7.216	7.260	7.273	7.271	7.266	7.219	7.297	7.363	7.317	7.264	7.289	7.745	7.792	7.706	7.624
5	7.609	7.544	7.490	7.525	7.440	7.452	7.360	7.340	7.308	7.324	7.302	7.293	7.271	7.292	7.254	7.232	7.254	7.277	7.266	7.267	7.223	7.299	7.361	7.314	7.257	7.293	7.752	7.790	7.699	7.625
6	7.610	7.545	7.489	7.526	7.442	7.462	7.364	7.341	7.310	7.327	7.303	7.294	7.280	7.296	7.253	7.234	7.262	7.282	7.273	7.265	7.226	7.308	7.366	7.318	7.266	7.319	7.758	7.786	7.690	7.617
7	7.614	7.547	7.496	7.529	7.440	7.470	7.370	7.343	7.308	7.331	7.307	7.299	7.284	7.300	7.256	7.250	7.267	7.285	7.280	7.267	7.232	7.330	7.367	7.324	7.266	7.352	7.771	7.789	7.699	7.614
8	7.619	7.549	7.505	7.529	7.446	7.476	7.369	7.348	7.313	7.335	7.307	7.300	7.290	7.306	7.261	7.257	7.271	7.287	7.282	7.274	7.236	7.345	7.372	7.327	7.260	7.394	7.783	7.791	7.697	7.616
9	7.615	7.551	7.504	7.527	7.453	7.480	7.372	7.342	7.314	7.340	7.312	7.307	7.291	7.310	7.261	7.270	7.274	7.289	7.282	7.275	7.243	7.354	7.362	7.328	7.270	7.444	7.775	7.785	7.697	7.619
10	7.615	7.545	7.516	7.523	7.457	7.485	7.371	7.339	7.311	7.341	7.310	7.305	7.290	7.315	7.262	7.277	7.275	7.289	7.285	7.274	7.242	7.372	7.371	7.323	7.271	7.473	7.784	7.786	7.695	7.617
11	7.612	7.535	7.533	7.512	7.451	7.477	7.373	7.340	7.311	7.338	7.306	7.301	7.287	7.313	7.263	7.284	7.275	7.281	7.287	7.271	7.239	7.376	7.373	7.315	7.254	7.490	7.784	7.788	7.684	7.612
12	7.605	7.528	7.547	7.503	7.448	7.477	7.369	7.337	7.309	7.332	7.305	7.298	7.285	7.312	7.257	7.286	7.278	7.284	7.285	7.262	7.243	7.381	7.370	7.307	7.261	7.501	7.788	7.780	7.685	7.604
13	7.594	7.515	7.545	7.490	7.441	7.471	7.370	7.329	7.303	7.324	7.298	7.288	7.276	7.303	7.251	7.281	7.269	7.276	7.279	7.259	7.239	7.386	7.356	7.295	7.258	7.513	7.791	7.788	7.667	7.592
14	7.578	7.503	7.540	7.483	7.439	7.468	7.359	7.329	7.295	7.325	7.289	7.279	7.271	7.296	7.238	7.118	7.266	7.272	7.271	7.254	7.236	7.388	7.352	7.290	7.244	7.524	7.789	7.786	7.661	7.589
15	7.571	7.498	7.540	7.468	7.432	7.462	7.354	7.323	7.293	7.309	7.283	7.271	7.258	7.289	7.230	7.016	7.257	7.261	7.268	7.247	7.231	7.381	7.340	7.275	7.240	7.537	7.793	7.764	7.646	7.578
16	7.577	7.491	7.541	7.459	7.434	7.359	7.353	7.319	7.292	7.304	7.276	7.271	7.262	7.280	7.226	6.899	7.248	7.266	7.263	7.235	7.231	7.382	7.340	7.273	7.246	7.550	7.795	7.766	7.647	7.590
17	7.574	7.498	7.546	7.455	7.433	7.361	7.349	7.321	7.296	7.307	7.277	7.271	7.262	7.280	7.221	6.839	7.251	7.272	7.262	7.232	7.235	7.382	7.332	7.285	7.249	7.564	7.794	7.763	7.640	7.593
18	7.573	7.498	7.552	7.460	7.442	7.366	7.354	7.326	7.300	7.311	7.285	7.272	7.264	7.283	7.218	7.042	7.254	7.280	7.265	7.234	7.241	7.377	7.341	7.287	7.242	7.582	7.793	7.760	7.636	7.599
19	7.574	7.496	7.557	7.460	7.445	7.369	7.358	7.324	7.309	7.312	7.286	7.269	7.270	7.282	7.219	7.223	7.260	7.278	7.274	7.238	7.240	7.385	7.344	7.282	7.248	7.594	7.789	7.754	7.638	7.613
20	7.575	7.506	7.561	7.463	7.451	7.372	7.364	7.331	7.312	7.314	7.283	7.280	7.277	7.283	7.226	7.234	7.264	7.281	7.272	7.239	7.256	7.384	7.348	7.284	7.258	7.610	7.791	7.750	7.647	7.639
21	7.579	7.509	7.564	7.467	7.461	7.374	7.365	7.328	7.317	7.317	7.290	7.284	7.282	7.288	7.226	7.237	7.276	7.283	7.277	7.244	7.260	7.386	7.348	7.282	7.265	7.631	7.802	7.762	7.642	7.639
22	7.581	7.508	7.567	7.467	7.460	7.374	7.373	7.329	7.323	7.320	7.303	7.291	7.291	7.287	7.231	7.258	7.285	7.292	7.283	7.242	7.268	7.377	7.344	7.294	7.266	7.659	7.808	7.754	7.652	7.656
23	7.574	7.506	7.567	7.455	7.456	7.375	7.366	7.327	7.323	7.312	7.313	7.295	7.292	7.286	7.238	7.263	7.283	7.287	7.277	7.239	7.279	7.383	7.343	7.289	7.269	7.686	7.814	7.748	7.653	7.651
最高(m)	*7.630*	*7.565*	*7.567*	*7.561*	*7.461*	*7.485*	*7.373*	*7.362*	*7.326*	*7.341*	*7.313*	*7.310*	*7.293*	*7.315*	*7.274*	*7.286*	*7.285*	*7.292*	*7.287*	*7.282*	*7.279*	*7.388*	*7.377*	*7.338*	*7.285*	*7.686*	*7.814*	*7.812*	*7.739*	*7.656*
最低(m)	*7.571*	*7.491*	*7.489*	*7.455*	*7.432*	*7.359*	*7.349*	*7.319*	*7.292*	*7.304*	*7.276*	*7.269*	*7.258*	*7.280*	*7.218*	*6.839*	*7.248*	*7.261*	*7.262*	*7.232*	*7.219*	*7.281*	*7.332*	*7.273*	*7.240*	*7.267*	*7.705*	*7.748*	*7.638*	*7.576*
平均(m)	*7.597*	*7.527*	*7.527*	*7.500*	*7.447*	*7.433*	*7.364*	*7.337*	*7.310*	*7.322*	*7.299*	*7.291*	*7.278*	*7.294*	*7.247*	*7.191*	*7.265*	*7.280*	*7.276*	*7.258*	*7.239*	*7.351*	*7.358*	*7.305*	*7.261*	*7.463*	*7.774*	*7.777*	*7.680*	*7.617*

平均水位值： **7.395**　　*月最高水位值：* **7.814**　　*月最低水位值：* **6.839**

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-55　101 年 4 月 GM6-1 地下水位逐時記錄表

[測井編號:GM06]　[地面標高:5.95 公尺]　[管頂標高:6.484 公尺]　[井深:11.2 公尺]　[儀器安裝標高:0.58 公尺]　[單位:公尺]

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均	最高	時間	最低	時間
日期	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
01	2.39	2.39	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.37	2.37	2.37	2.37	2.39	00:03	2.35	23:38
	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.35	2.35					
02	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.35	00:14	2.31	23:57
	2.34	2.34	2.34	2.34	2.33	2.33	2.33	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32					
03	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.32	00:19	2.28	22:24
	2.30	2.30	2.30	2.29	2.29	2.29	2.29	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28					
04	2.28	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.26	2.28	01:21	2.24	23:02
	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.25	2.25	2.25	2.25	2.24	2.24	2.24					
05	2.24	2.24	2.24	2.24	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.22	2.22	2.24	01:38	2.20	22:39
	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.20					
06	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	2.20	00:01	2.17	23:28
	2.19	2.19	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17					
07	2.17	2.17	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.15	2.15	2.17	00:20	2.13	23:36
	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.13					
08	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.13	00:44	2.10	22:14
	2.12	2.12	2.12	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.10	2.10	2.10	2.10					
09	2.10	2.10	2.10	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.08	2.10	00:02	2.07	21:27
	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07					
10	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.05	2.07	00:01	2.03	21:59
	2.06	2.06	2.06	2.05	2.04	2.04	2.04	2.04	2.03	2.03	2.03	2.03					
11	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.02	2.02	2.02	2.02	2.03	2.03	2.03	2.03	2.04	18:06	2.02	15:56
	2.03	2.02	2.02	2.03	2.03	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	2.03					
12	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.02	2.02	2.02	2.04	00:09	2.01	21:38
	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01					
13	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.01	01:12	1.98	23:46
	2.00	2.00	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.98	1.98	1.98					
14	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.98	00:20	1.96	23:46
	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96					
15	1.96	1.96	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.96	00:11	1.93	23:13
	1.95	1.95	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.93					
16	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.93	00:01	1.91	23:39
	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92					
17	1.92	1.92	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.92	14:51	1.90	23:14
	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.90	1.90	1.90					
18	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	00:01	1.89	22:30
	1.90	1.90	1.90	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89					
19	1.89	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.89	00:36	1.87	23:42
	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87					
20	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	00:28	1.86	21:02
	1.87	1.87	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86					
21	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.85	1.85	1.85	1.86	1.86	1.86	1.86	1.85	1.86	11:49	1.84	23:34
	1.86	1.86	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85					
22	1.85	1.85	1.84	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.84	1.85	13:38	1.84	19:13
	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84					
23	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	11:38	1.83	19:53
	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83					
24	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	04:42	1.82	21:38
	1.83	1.83	1.83	1.83	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82					
25	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.83	23:20	1.82	13:23
	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.83	1.83					
26	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.86	1.86	1.90	19:44	1.82	02:27
	1.86	1.87	1.87	1.87	1.88	1.88	1.88	1.89	1.88	1.87	1.86	1.87					
27	1.88	1.88	1.89	1.90	1.91	1.92	1.93	1.93	1.92	1.93	1.94	1.96	1.97	2.07	23:48	1.87	00:01
	1.97	1.97	1.98	2.00	2.01	2.02	2.03	2.03	2.04	2.05	2.05	2.06					
28	2.07	2.07	2.08	2.09	2.09	2.09	2.10	2.10	2.11	2.11	2.12	2.12	2.13	2.19	23:12	2.07	01:07
	2.12	2.13	2.14	2.15	2.15	2.16	2.16	2.17	2.17	2.18	2.18	2.19					
29	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.21	2.22	2.23	2.23	2.22	2.21	2.23	10:35	2.19	04:29
	2.22	2.22	2.22	2.23	2.22	2.22	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21					
30	2.21	2.21	2.21	2.21	2.20	2.21	2.21	2.21	2.22	2.23	2.23	2.23	2.21	2.24	13:39	2.19	22:18
	2.23	2.23	2.23	2.22	2.22	2.22	2.21	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20					

月平均水位值	2.04				
月最高水位值	2.39	發生時間	04/01	日	00:03
月最低水位值	1.82	發生時間	04/25	日	13:23

附錄 IV.6-54　101 年 4 月 GM10 地下水位逐時記錄表

[測井編號:GM10]　[地面標高:18.09 公尺]　[管頂標高:18.58 公尺]　[井深:21.95 公尺]　[儀器安裝標高:-0.37 公尺]　[單位:公尺]

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均	最高	時間	最低	時間
日期	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
01	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	00:29	1.43	23:09
	1.45	1.45	1.45	1.45	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.43	1.43	1.43					
02	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.44	16:12	1.42	22:42
	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.42	1.42	1.42	1.42					
03	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.42	1.41	1.41	1.41	1.42	00:01	1.40	21:29
	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	1.40					
04	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.40	1.40	1.40	1.41	09:03	1.39	23:37
	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.39	1.39					
05	1.39	1.39	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	00:14	1.37	22:36
	1.38	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37					
06	1.37	1.37	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.37	00:01	1.35	17:27
	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35					
07	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.36	00:01	1.33	18:46
	1.35	1.35	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.33	1.34	1.33	1.34					
08	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.34	00:19	1.31	23:46
	1.33	1.33	1.33	1.33	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32					
09	1.32	1.32	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.32	00:01	1.30	19:36
	1.31	1.31	1.31	1.31	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30					
10	1.30	1.30	1.30	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	1.29	1.30	13:22	1.28	21:13
	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.28	1.28					
11	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	12:12	1.26	22:22
	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26					
12	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.27	1.27	1.26	1.27	14:34	1.25	22:41
	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25					
13	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.25	00:01	1.23	23:51
	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	1.23	1.23					
14	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.23	1.23	23:41	1.22	12:59
	1.22	1.23	1.22	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23					
15	1.23	1.23	1.23	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23	1.24	1.23	1.24	1.25	23:54	1.23	00:02
	1.23	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.25					
16	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	23:18	1.25	00:01
	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26					
17	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.27	00:01	1.26	00:02
	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27					
18	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.28	22:36	1.27	00:01
	1.27	1.27	1.27	1.27	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28					
19	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.29	23:43	1.28	00:01
	1.28	1.28	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29					
20	1.29	1.29	1.29	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.29	1.29	1.29	1.30	1.30	23:57	1.29	01:30
	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30					
21	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.31	1.31	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	20:29	1.30	11:23
	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31					
22	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.32	1.32	1.31	1.31	1.31	1.31	1.30	1.30	1.32	06:30	1.27	23:46
	1.30	1.31	1.31	1.30	1.29	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27					
23	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.24	1.23	1.23	1.27	00:02	1.16	23:58
	1.23	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21	1.20	1.19	1.19	1.18	1.18	1.16					
24	1.16	1.15	1.16	1.15	1.15	1.16	1.16	1.15	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.16	00:02	1.12	23:09
	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.13	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12					
25	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.09	1.09	1.09	1.12	00:01	1.07	23:52
	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07					
26	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	23:21	1.07	05:25
	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.10	1.10					
27	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.12	15:31	1.10	00:01
	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10					
28	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	00:08	1.07	23:37
	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07					
29	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	12:19	1.05	23:20
	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06					
30	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	11:58	1.05	22:53
	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					

月平均水位值	1.26				
月最高水位值	1.45	發生時間	04/01	日	00:29
月最低水位值	1.05	發生時間	04/30	日	22:53

附錄 IV.6-56　101 年 5 月 GM2 地下水位逐時記錄表

地面標高：9.92公尺　井頂標高：10.42公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	9.843	9.834	9.861	9.861	9.875	9.883	9.873	9.854	9.824	9.884	9.895	9.889	9.854	9.856	9.870	9.877	9.857	9.899	9.910	9.854	9.878	9.904	9.896	9.882	9.872	9.899	9.894	9.888	9.913	9.872	9.867
1	9.832	9.827	9.862	9.851	9.868	9.876	9.871	9.850	9.824	9.878	9.893	9.878	9.846	9.849	9.862	9.870	9.848	9.894	9.906	9.851	9.868	9.898	9.892	9.877	9.869	9.892	9.887	9.883	9.906	9.867	9.859
2	9.829	9.817	9.854	9.846	9.865	9.873	9.870	9.849	9.821	9.876	9.887	9.871	9.844	9.847	9.855	9.861	9.851	9.887	9.895	9.834	9.869	9.894	9.887	9.870	9.861	9.884	9.882	9.878	9.901	9.861	9.862
3	9.824	9.814	9.851	9.837	9.864	9.875	9.867	9.851	9.816	9.879	9.881	9.869	9.843	9.851	9.854	9.859	9.846	9.882	9.889	9.835	9.862	9.895	9.875	9.868	9.862	9.883	9.872	9.877	9.898	9.854	9.858
4	9.825	9.810	9.857	9.840	9.866	9.872	9.871	9.846	9.823	9.875	9.882	9.869	9.841	9.852	9.855	9.854	9.847	9.884	9.887	9.827	9.868	9.888	9.883	9.865	9.864	9.880	9.878	9.875	9.893	9.857	9.869
5	9.825	9.809	9.856	9.847	9.870	9.881	9.872	9.851	9.823	9.881	9.880	9.869	9.838	9.854	9.849	9.854	9.846	9.888	9.888	9.833	9.870	9.890	9.882	9.869	9.859	9.878	9.880	9.883	9.899	9.860	9.868
6	9.829	9.816	9.859	9.845	9.873	9.884	9.873	9.843	9.832	9.870	9.885	9.863	9.840	9.860	9.861	9.858	9.851	9.894	9.886	9.831	9.872	9.889	9.885	9.868	9.859	9.876	9.882	9.886	9.900	9.863	9.873
7	9.835	9.822	9.865	9.850	9.878	9.893	9.879	9.849	9.834	9.874	9.882	9.875	9.846	9.859	9.866	9.865	9.857	9.901	9.891	9.835	9.879	9.901	9.890	9.869	9.866	9.884	9.884	9.890	9.897	9.863	9.876
8	9.844	9.822	9.868	9.859	9.883	9.899	9.879	9.845	9.845	9.872	9.887	9.880	9.845	9.861	9.871	9.857	9.856	9.898	9.896	9.837	9.883	9.901	9.899	9.873	9.875	9.886	9.890	9.888	9.905	9.862	9.878
9	9.839	9.828	9.876	9.861	9.883	9.856	9.877	9.846	9.844	9.878	9.895	9.878	9.851	9.865	9.870	9.866	9.863	9.912	9.899	9.850	9.890	9.902	9.895	9.872	9.873	9.890	9.892	9.895	9.907	9.865	9.883
10	9.840	9.831	9.874	9.863	9.892	9.738	9.878	9.841	9.842	9.882	9.890	9.870	9.853	9.868	9.872	9.864	9.869	9.913	9.885	9.850	9.897	9.900	9.897	9.874	9.880	9.885	9.895	9.889	9.903	9.873	9.885
11	9.837	9.825	9.871	9.875	9.891	9.627	9.875	9.846	9.842	9.884	9.887	9.874	9.840	9.867	9.870	9.863	9.874	9.912	9.889	9.851	9.892	9.897	9.891	9.870	9.872	9.893	9.888	9.892	9.895	9.870	9.890
12	9.832	9.828	9.868	9.870	9.882	9.609	9.873	9.843	9.841	9.899	9.889	9.871	9.846	9.862	9.868	9.858	9.875	9.909	9.883	9.845	9.895	9.899	9.888	9.867	9.868	9.880	9.893	9.895	9.891	9.865	9.886
13	9.833	9.824	9.868	9.872	9.881	9.652	9.875	9.835	9.839	9.893	9.890	9.865	9.836	9.854	9.866	9.847	9.882	9.906	9.878	9.841	9.888	9.899	9.879	9.866	9.865	9.876	9.894	9.891	9.890	9.864	9.889
14	9.828	9.819	9.863	9.875	9.873	9.805	9.869	9.833	9.847	9.893	9.876	9.859	9.834	9.856	9.856	9.845	9.874	9.900	9.867	9.844	9.885	9.891	9.880	9.861	9.865	9.876	9.877	9.892	9.886	9.856	9.886
15	9.821	9.817	9.855	9.866	9.875	9.826	9.867	9.819	9.852	9.879	9.874	9.855	9.821	9.854	9.853	9.840	9.877	9.898	9.869	9.844	9.881	9.888	9.867	9.854	9.862	9.870	9.881	9.881	9.885	9.848	9.881
16	9.812	9.823	9.852	9.863	9.867	9.867	9.862	9.818	9.852	9.882	9.873	9.851	9.821	9.851	9.858	9.842	9.875	9.898	9.862	9.845	9.883	9.886	9.863	9.856	9.863	9.869	9.879	9.886	9.875	9.848	9.882
17	9.819	9.821	9.844	9.863	9.873	9.870	9.856	9.816	9.855	9.885	9.870	9.850	9.823	9.845	9.852	9.841	9.875	9.892	9.861	9.851	9.880	9.883	9.867	9.849	9.860	9.867	9.877	9.887	9.873	9.852	9.880
18	9.814	9.827	9.846	9.863	9.866	9.874	9.857	9.810	9.863	9.891	9.870	9.857	9.828	9.854	9.860	9.841	9.870	9.898	9.860	9.851	9.881	9.883	9.867	9.856	9.865	9.876	9.876	9.896	9.877	9.854	9.881
19	9.826	9.837	9.850	9.865	9.874	9.877	9.862	9.805	9.869	9.889	9.874	9.853	9.832	9.857	9.867	9.841	9.879	9.901	9.864	9.854	9.888	9.886	9.877	9.856	9.873	9.884	9.881	9.897	9.879	9.855	9.889
20	9.825	9.852	9.849	9.871	9.878	9.879	9.861	9.816	9.872	9.899	9.877	9.858	9.843	9.863	9.873	9.849	9.890	9.904	9.858	9.867	9.890	9.896	9.875	9.862	9.881	9.886	9.885	9.906	9.886	9.853	9.890
21	9.836	9.851	9.860	9.874	9.883	9.879	9.859	9.818	9.874	9.901	9.886	9.863	9.851	9.864	9.877	9.849	9.899	9.909	9.860	9.866	9.903	9.895	9.888	9.867	9.889	9.893	9.889	9.912	9.889	9.866	9.893
22	9.836	9.860	9.859	9.875	9.883	9.882	9.861	9.827	9.879	9.899	9.886	9.867	9.858	9.873	9.878	9.863	9.904	9.916	9.863	9.873	9.910	9.898	9.887	9.868	9.898	9.894	9.891	9.916	9.883	9.861	9.898
23	9.834	9.864	9.862	9.876	9.885	9.878	9.858	9.822	9.881	9.895	9.889	9.865	9.861	9.876	9.881	9.859	9.899	9.916	9.858	9.879	9.909	9.900	9.887	9.865	9.898	9.896	9.896	9.916	9.883	9.866	9.899
最高(m)	*9.844*	*9.864*	*9.876*	*9.876*	*9.892*	*9.899*	*9.879*	*9.854*	*9.881*	*9.901*	*9.895*	*9.889*	*9.861*	*9.876*	*9.881*	*9.877*	*9.904*	*9.916*	*9.910*	*9.879*	*9.910*	*9.904*	*9.899*	*9.882*	*9.898*	*9.899*	*9.896*	*9.916*	*9.913*	*9.873*	*9.899*
最低(m)	*9.812*	*9.809*	*9.844*	*9.837*	*9.864*	*9.609*	*9.856*	*9.805*	*9.816*	*9.870*	*9.870*	*9.850*	*9.821*	*9.845*	*9.849*	*9.840*	*9.846*	*9.882*	*9.858*	*9.827*	*9.862*	*9.883*	*9.863*	*9.849*	*9.859*	*9.867*	*9.872*	*9.875*	*9.873*	*9.848*	*9.858*
平均(m)	*9.830*	*9.828*	*9.860*	*9.861*	*9.876*	*9.836*	*9.869*	*9.835*	*9.846*	*9.885*	*9.883*	*9.867*	*9.841*	*9.858*	*9.864*	*9.855*	*9.869*	*9.900*	*9.879*	*9.848*	*9.884*	*9.894*	*9.883*	*9.866*	*9.871*	*9.883*	*9.885*	*9.892*	*9.892*	*9.861*	*9.880*

平均水位值： **9.867**　　*月最高水位值：* **9.916**　　*月最低水位值：* **9.609**

附錄 IV.6-57　101 年 5 月 GM3-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：一公尺　井頂標高：9.530公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	6.983	6.887	7.160	7.094	7.285	7.097	6.828	6.824	6.742	6.974	7.265	7.269	7.400	7.261	7.184	7.442	7.481	7.511	7.368	7.240	7.223	7.173	7.128	7.058	7.004	6.980	6.944	7.302	7.435	7.474	7.637
1	6.975	6.868	7.169	7.142	7.279	7.089	6.837	6.820	6.741	6.969	7.269	7.257	7.383	7.250	7.174	7.441	7.483	7.497	7.356	7.233	7.214	7.160	7.125	7.050	6.983	6.973	6.937	7.319	7.423	7.492	7.629
2	6.963	6.861	7.162	7.160	7.262	7.082	6.841	6.817	6.731	6.963	7.261	7.244	7.370	7.245	7.165	7.434	7.465	7.490	7.347	7.219	7.207	7.152	7.109	7.046	6.986	6.964	6.934	7.315	7.420	7.513	7.615
3	6.957	6.855	7.158	7.149	7.257	7.082	6.844	6.803	6.733	6.952	7.269	7.232	7.364	7.237	7.163	7.430	7.466	7.473	7.341	7.221	7.206	7.151	7.108	7.036	6.983	6.954	6.926	7.314	7.412	7.548	7.603
4	6.956	6.848	7.161	7.158	7.250	7.084	6.848	6.802	6.733	6.954	7.267	7.231	7.354	7.242	7.147	7.420	7.458	7.470	7.332	7.213	7.203	7.141	7.098	7.035	6.975	6.956	6.926	7.305	7.402	7.588	7.598
5	6.947	6.841	7.149	7.188	7.249	7.082	6.850	6.811	6.734	6.954	7.269	7.223	7.338	7.235	7.154	7.417	7.473	7.469	7.324	7.206	7.194	7.145	7.102	7.042	6.983	6.948	6.922	7.321	7.402	7.620	7.592
6	6.954	6.842	7.146	7.215	7.248	7.084	6.851	6.804	6.743	6.969	7.281	7.221	7.336	7.237	7.151	7.412	7.491	7.462	7.321	7.199	7.205	7.148	7.102	7.039	6.980	6.956	6.929	7.360	7.401	7.631	7.585
7	6.952	6.840	7.143	7.210	7.243	7.081	6.860	6.805	6.739	6.978	7.287	7.223	7.337	7.237	7.153	7.413	7.490	7.461	7.316	7.206	7.200	7.145	7.108	7.032	6.986	6.959	6.931	7.433	7.408	7.635	7.574
8	6.953	6.842	7.140	7.228	7.237	7.076	6.855	6.803	6.750	6.989	7.302	7.229	7.334	7.235	7.149	7.404	7.479	7.458	7.315	7.208	7.201	7.143	7.112	7.035	6.989	6.957	6.941	7.441	7.425	7.631	7.574
9	6.942	6.830	7.141	7.289	7.223	7.075	6.853	6.790	6.747	6.992	7.313	7.231	7.328	7.240	7.152	7.403	7.474	7.456	7.313	7.208	7.202	7.144	7.112	7.039	6.988	6.964	6.939	7.448	7.442	7.618	7.569
10	6.941	6.835	7.134	7.325	7.222	7.073	6.855	6.787	6.749	6.982	7.305	7.231	7.328	7.235	7.149	7.398	7.475	7.454	7.308	7.215	7.202	7.135	7.106	7.029	6.987	6.961	6.939	7.450	7.503	7.605	7.563
11	6.931	6.838	7.123	7.382	7.210	7.073	6.846	6.780	6.737	6.976	7.309	7.232	7.319	7.222	7.151	7.396	7.471	7.445	7.291	7.213	7.200	7.134	7.093	7.022	6.985	6.958	6.950	7.437	7.507	7.609	7.556
12	6.922	6.829	7.120	7.393	7.200	7.078	6.847	6.776	6.731	7.342	7.301	7.241	7.309	7.223	7.152	7.378	7.487	7.438	7.288	7.212	7.195	7.152	7.087	7.020	6.976	6.951	6.963	7.429	7.490	7.590	7.549
13	6.911	6.824	7.110	7.384	7.193	6.941	6.839	6.764	6.728	7.335	7.290	7.257	7.301	7.216	7.142	7.373	7.544	7.431	7.279	7.213	7.188	7.151	7.080	7.014	6.970	6.936	6.967	7.416	7.481	7.580	7.551
14	6.906	6.822	7.105	7.367	7.186	6.829	6.837	6.758	6.731	7.326	7.282	7.264	7.286	7.211	7.136	7.376	7.571	7.421	7.274	7.217	7.184	7.145	7.073	7.004	6.971	6.933	6.978	7.420	7.468	7.564	7.539
15	6.892	6.817	7.097	7.352	7.177	6.724	6.826	6.764	6.730	7.318	7.277	7.277	7.274	7.209	7.139	7.418	7.555	7.411	7.267	7.216	7.182	7.146	7.070	7.004	6.959	6.926	6.989	7.431	7.452	7.553	7.523
16	6.906	6.814	7.080	7.336	7.166	6.751	6.840	6.757	6.758	7.314	7.279	7.277	7.253	7.200	7.166	7.491	7.544	7.402	7.256	7.215	7.179	7.145	7.068	6.992	6.958	6.928	7.040	7.442	7.442	7.542	7.513
17	6.896	6.814	7.075	7.332	7.160	6.753	6.838	6.763	6.800	7.220	7.270	7.273	7.253	7.188	7.255	7.519	7.537	7.402	7.249	7.222	7.175	7.135	7.069	6.990	6.956	6.923	7.084	7.480	7.434	7.533	7.493
18	6.892	6.810	7.062	7.325	7.154	6.791	6.839	6.759	6.889	7.225	7.268	7.275	7.253	7.188	7.378	7.527	7.530	7.398	7.258	7.218	7.173	7.139	7.069	6.991	6.959	6.921	7.096	7.490	7.457	7.539	7.492
19	6.889	6.824	7.064	7.318	7.146	6.806	6.845	6.754	6.952	7.230	7.269	7.275	7.248	7.180	7.445	7.516	7.523	7.386	7.247	7.224	7.172	7.141	7.069	6.995	6.963	6.929	7.120	7.493	7.492	7.589	7.485
20	6.891	6.892	7.059	7.314	7.138	6.823	6.842	6.753	6.970	7.243	7.270	7.275	7.253	7.185	7.457	7.507	7.529	7.387	7.246	7.231	7.175	7.135	7.066	6.998	6.970	6.943	7.142	7.427	7.501	7.603	7.475
21	6.890	7.056	7.063	7.312	7.134	6.830	6.841	6.759	6.974	7.254	7.274	7.289	7.256	7.183	7.458	7.497	7.523	7.384	7.250	7.223	7.177	7.135	7.076	7.000	6.979	6.946	7.168	7.429	7.499	7.628	7.480
22	6.890	7.121	7.065	7.306	7.116	6.833	6.838	6.753	6.978	7.262	7.273	7.373	7.272	7.186	7.452	7.495	7.525	7.378	7.251	7.224	7.174	7.134	7.067	6.997	6.983	6.949	7.191	7.435	7.486	7.649	7.466
23	6.888	7.157	7.070	7.295	7.109	6.835	6.824	6.751	6.984	7.269	7.279	7.407	7.265	7.193	7.454	7.494	7.516	7.372	7.246	7.228	7.174	7.133	7.067	6.996	6.984	6.950	7.238	7.438	7.479	7.655	7.464
最高(m)	*6.983*	*7.157*	*7.169*	*7.393*	*7.285*	*7.097*	*6.860*	*6.824*	*6.984*	*7.342*	*7.313*	*7.407*	*7.400*	*7.261*	*7.458*	*7.527*	*7.571*	*7.511*	*7.368*	*7.240*	*7.223*	*7.173*	*7.128*	*7.058*	*7.004*	*6.980*	*7.238*	*7.450*	*7.507*	*7.655*	*7.637*
最低(m)	*6.888*	*6.810*	*7.059*	*7.094*	*7.109*	*6.724*	*6.824*	*6.751*	*6.728*	*6.952*	*7.261*	*7.221*	*7.248*	*7.180*	*7.136*	*7.373*	*7.458*	*7.372*	*7.246*	*7.199*	*7.172*	*7.133*	*7.066*	*6.990*	*6.956*	*6.921*	*6.922*	*7.302*	*7.401*	*7.474*	*7.464*
平均(m)	*6.926*	*6.874*	*7.115*	*7.274*	*7.202*	*6.957*	*6.843*	*6.782*	*6.796*	*7.125*	*7.280*	*7.269*	*7.309*	*7.218*	*7.230*	*7.442*	*7.504*	*7.436*	*7.293*	*7.218*	*7.192*	*7.144*	*7.090*	*7.019*	*6.977*	*6.949*	*7.008*	*7.400*	*7.452*	*7.583*	*7.547*

平均水位值： **7.176**　　*月最高水位值：* **7.655**　　*月最低水位值：* **6.724**

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-58　101 年 5 月 P5-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：—公尺　井頂標高：12.139公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	6.827	6.753	6.881	7.264	8.000	7.852	7.561	7.359	7.087	7.046	7.106	7.121	7.139	7.356	7.244	7.728	8.266	8.579	8.334	7.974	7.738	7.540	7.335	7.153	7.006	6.907	6.797	6.827	7.748	8.337	9.194
1	6.826	6.746	6.935	7.270	8.011	7.845	7.555	7.341	7.076	7.056	7.101	7.114	7.155	7.348	7.237	7.771	8.284	8.583	8.321	7.962	7.731	7.535	7.325	7.141	7.003	6.900	6.785	6.835	7.770	8.353	9.217
2	6.824	6.734	6.990	7.275	8.020	7.832	7.546	7.336	7.069	7.059	7.099	7.110	7.180	7.348	7.223	7.803	8.296	8.578	8.310	7.947	7.724	7.526	7.315	7.135	6.988	6.891	6.774	6.858	7.785	8.366	9.221
3	6.815	6.730	7.028	7.285	8.027	7.829	7.543	7.325	7.059	7.065	7.094	7.106	7.193	7.342	7.214	7.825	8.313	8.571	8.295	7.934	7.725	7.521	7.308	7.130	6.988	6.880	6.772	6.887	7.801	8.403	9.232
4	6.813	6.719	7.069	7.297	8.026	7.813	7.527	7.320	7.059	7.065	7.092	7.104	7.210	7.339	7.198	7.846	8.319	8.575	8.285	7.924	7.712	7.514	7.302	7.122	6.986	6.878	6.764	6.915	7.815	8.549	9.232
5	6.807	6.712	7.091	7.295	8.028	7.807	7.521	7.315	7.055	7.078	7.091	7.094	7.224	7.335	7.190	7.864	8.330	8.561	8.266	7.914	7.708	7.507	7.300	7.124	6.986	6.878	6.764	6.945	7.835	9.067	9.219
6	6.813	6.707	7.124	7.300	8.018	7.794	7.511	7.304	7.054	7.085	7.097	7.100	7.246	7.325	7.185	7.880	8.331	8.549	8.245	7.897	7.695	7.501	7.295	7.120	6.984	6.879	6.759	6.976	7.851	8.795	9.214
7	6.816	6.699	7.145	7.316	8.009	7.786	7.500	7.295	7.049	7.090	7.102	7.098	7.268	7.334	7.184	7.896	8.338	8.542	8.227	7.889	7.685	7.488	7.292	7.117	6.984	6.881	6.764	7.017	7.871	8.773	9.207
8	6.814	6.697	7.171	7.356	8.011	7.763	7.477	7.278	7.040	7.092	7.119	7.106	7.284	7.332	7.176	7.906	8.350	8.533	8.208	7.869	7.677	7.481	7.280	7.108	6.979	6.874	6.759	7.064	7.892	8.801	9.198
9	6.812	6.688	7.189	7.366	8.001	7.753	7.469	7.257	7.027	7.099	7.111	7.099	7.302	7.330	7.168	7.920	8.354	8.527	8.191	7.857	7.664	7.465	7.263	7.099	6.966	6.869	6.758	7.118	7.954	8.832	9.191
10	6.806	6.691	7.208	7.414	7.991	7.737	7.471	7.235	7.016	7.098	7.108	7.095	7.305	7.326	7.165	7.931	8.368	8.516	8.175	7.847	7.655	7.453	7.255	7.082	6.959	6.865	6.758	7.173	7.953	8.873	9.177
11	6.808	6.691	7.220	7.481	7.988	7.724	7.487	7.226	7.002	7.096	7.110	7.092	7.317	7.321	7.168	7.936	8.376	8.509	8.158	7.832	7.645	7.440	7.245	7.075	6.944	6.854	6.750	7.225	7.976	8.897	9.168
12	6.810	6.691	7.238	7.552	7.978	7.701	7.489	7.209	6.989	7.093	7.110	7.083	7.322	7.317	7.158	7.941	8.393	8.498	8.145	7.824	7.632	7.433	7.229	7.066	6.938	6.839	6.744	7.279	8.019	8.916	9.159
13	6.798	6.680	7.248	7.638	7.975	7.694	7.479	7.198	6.982	7.099	7.103	7.080	7.330	7.310	7.149	7.941	8.412	8.488	8.132	7.820	7.626	7.420	7.216	7.057	6.927	6.829	6.735	7.329	8.052	8.919	9.140
14	6.794	6.677	7.254	7.712	7.974	7.693	7.471	7.182	6.978	7.092	7.103	7.068	7.324	7.301	7.130	7.946	8.437	8.481	8.121	7.814	7.620	7.417	7.211	7.055	6.927	6.824	6.735	7.366	8.082	8.915	9.118
15	6.785	6.670	7.258	7.772	7.968	7.687	7.466	7.176	6.982	7.090	7.101	7.067	7.325	7.298	7.137	8.069	8.468	8.467	8.107	7.811	7.617	7.409	7.206	7.049	6.920	6.814	6.734	7.412	8.115	8.908	9.102
16	6.777	6.668	7.258	7.828	7.958	7.683	7.463	7.171	6.984	7.090	7.101	7.068	7.325	7.284	7.551	7.969	8.488	8.453	8.099	7.804	7.618	7.402	7.201	7.043	6.918	6.809	6.736	7.452	8.136	8.905	9.081
17	6.768	6.651	7.256	7.865	7.946	7.670	7.458	7.165	6.989	7.096	7.104	7.071	7.329	7.274	7.388	8.005	8.504	8.441	8.087	7.800	7.611	7.399	7.202	7.041	6.916	6.811	6.743	7.493	8.163	8.897	9.051
18	6.758	6.656	7.253	7.893	7.933	7.661	7.447	7.149	6.995	7.101	7.108	7.071	7.332	7.270	7.368	8.049	8.524	8.419	8.060	7.796	7.603	7.397	7.203	7.044	6.922	6.815	6.751	7.534	8.190	9.502	9.029
19	6.763	6.725	7.255	7.924	7.918	7.647	7.438	7.148	7.001	7.106	7.110	7.083	7.337	7.262	7.415	8.091	8.541	8.406	8.050	7.785	7.593	7.387	7.198	7.044	6.922	6.816	6.766	7.582	8.218	8.989	9.012
20	6.761	6.714	7.260	7.941	7.908	7.626	7.424	7.140	7.014	7.109	7.120	7.091	7.345	7.265	7.480	8.133	8.548	8.395	8.029	7.779	7.584	7.378	7.193	7.037	6.920	6.812	6.776	7.620	8.241	8.997	8.992
21	6.760	6.726	7.264	7.960	7.891	7.608	7.405	7.132	7.026	7.119	7.128	7.104	7.357	7.258	7.556	8.179	8.561	8.374	8.015	7.770	7.572	7.371	7.183	7.029	6.926	6.816	6.782	7.659	8.274	9.183	8.976
22	6.754	6.770	7.260	7.976	7.880	7.595	7.389	7.109	7.037	7.119	7.131	7.112	7.357	7.256	7.623	8.212	8.566	8.361	8.000	7.757	7.567	7.360	7.175	7.026	6.921	6.814	6.801	7.695	8.301	9.130	8.957
23	6.757	6.831	7.267	7.992	7.860	7.576	7.369	7.098	7.043	7.114	7.132	7.121	7.360	7.250	7.678	8.239	8.575	8.349	7.988	7.749	7.558	7.347	7.160	7.018	6.918	6.802	6.815	7.721	8.321	9.160	8.948
最高(m)	6.827	6.831	7.267	7.992	8.028	7.852	7.561	7.359	7.087	7.119	7.132	7.121	7.360	7.356	7.678	8.239	8.575	8.583	8.334	7.974	7.738	7.540	7.335	7.153	7.006	6.907	6.815	7.721	8.321	9.549	9.232
最低(m)	6.754	6.651	6.881	7.264	7.860	7.576	7.369	7.098	6.978	7.046	7.091	7.067	7.139	7.250	7.130	7.728	8.266	8.349	7.988	7.749	7.558	7.347	7.160	7.018	6.916	6.802	6.734	6.827	7.748	8.337	8.948
平均(m)	6.794	6.709	7.172	7.582	7.972	7.724	7.478	7.228	7.026	7.090	7.108	7.094	7.286	7.308	7.291	7.962	8.414	8.490	8.160	7.848	7.648	7.445	7.246	7.080	6.952	6.848	6.763	7.249	8.015	8.894	9.126

平均水位值：　7.516　　月最高水位值：　9.549　　月最低水位值：　6.651

附錄 IV.6-59　101 年 5 月 P8-1'地下水位逐時記錄表

地面標高：—公尺　井頂標高：20.583公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	19.815	19.741	19.869	19.952	20.288	20.140	20.149	19.947	19.885	19.897	19.925	19.868	19.972	19.874	19.783	19.996	19.976	20.018	19.996	19.937	19.909	19.849	19.728	19.517	19.338	19.260	19.233	20.022	20.022	20.018	20.040
1	19.814	19.734	19.923	19.958	20.299	20.133	20.143	19.929	19.879	19.868	19.925	19.866	19.965	19.869	19.786	19.986	19.966	20.004	19.989	19.919	19.896	19.846	19.726	19.519	19.332	19.249	19.225	20.025	20.021	20.027	20.027
2	19.812	19.722	19.978	19.963	20.308	20.120	20.134	19.924	19.883	19.857	19.930	19.859	19.958	19.859	19.779	19.982	19.964	19.999	19.990	19.905	19.889	19.838	19.728	19.514	19.335	19.259	19.484	20.000	20.021	20.045	20.034
3	19.803	19.718	20.016	19.973	20.315	20.117	20.131	19.913	19.891	19.839	19.939	19.861	19.951	19.855	19.775	19.977	19.964	20.003	19.995	19.898	19.884	19.834	19.730	19.509	19.343	19.240	19.678	19.992	20.009	20.052	20.023
4	19.801	19.707	20.057	19.985	20.314	20.101	20.115	19.908	19.904	19.827	19.949	19.853	19.948	19.857	19.775	19.967	19.997	19.998	19.985	19.894	19.881	19.832	19.727	19.525	19.333	19.250	19.750	20.023	20.005	20.069	20.023
5	19.795	19.700	20.079	19.983	20.316	20.095	20.109	19.903	19.916	19.960	19.975	19.844	19.938	19.857	19.766	19.966	19.974	20.001	19.988	19.881	19.882	19.842	19.730	19.524	19.330	19.262	19.691	20.024	20.006	20.048	20.025
6	19.801	19.694	19.812	19.988	20.306	20.082	20.099	19.892	19.920	19.972	19.950	19.853	19.939	19.858	19.774	19.974	19.975	20.004	19.985	19.882	19.879	19.842	19.731	19.531	19.344	19.260	19.663	20.058	20.023	20.043	20.021
7	19.804	19.687	19.833	20.004	20.297	20.074	20.088	19.883	19.925	19.940	19.942	19.878	19.944	19.860	19.781	19.974	19.980	20.011	19.986	19.918	19.882	19.841	19.710	19.525	19.303	19.275	19.628	20.042	20.038	20.044	20.023
8	19.802	19.685	19.859	20.044	20.299	20.051	20.065	19.866	19.944	19.932	19.940	19.915	19.947	19.865	19.769	19.966	19.979	20.013	19.980	19.931	19.886	19.841	19.713	19.516	19.310	19.293	19.605	20.049	20.077	20.041	20.020
9	19.800	19.676	19.877	20.054	20.289	20.041	20.062	19.811	19.935	19.923	19.940	19.937	19.947	19.867	19.754	19.964	19.980	20.015	19.980	19.939	19.886	19.831	19.714	19.502	19.324	19.315	19.576	20.036	20.095	20.036	20.020
10	19.794	19.678	19.896	20.002	20.279	20.025	20.069	19.781	19.927	19.925	19.938	19.933	19.940	19.857	19.754	19.966	19.984	20.019	19.973	19.941	19.882	19.828	19.699	19.490	19.303	19.305	19.568	20.044	20.060	20.025	20.024
11	19.796	19.679	19.908	20.069	20.276	20.012	20.075	19.791	19.928	19.913	19.927	19.919	19.923	19.840	19.728	19.961	19.994	20.014	19.961	19.931	19.882	19.802	19.680	19.476	19.291	19.289	19.914	20.029	20.041	20.027	20.024
12	19.798	19.679	19.926	20.140	20.266	19.989	20.077	19.797	19.870	19.911	19.922	19.965	19.909	19.820	19.685	19.944	20.031	20.006	19.950	19.928	19.872	19.770	19.654	19.442	19.242	19.262	19.887	20.029	20.028	20.043	20.028
13	19.786	19.668	19.936	20.126	20.263	19.982	20.067	19.795	19.844	19.882	19.907	19.941	19.897	19.798	19.658	19.936	20.035	20.005	19.942	19.920	19.849	19.723	19.636	19.407	19.199	19.227	19.862	20.023	20.023	20.009	20.022
14	19.782	19.665	19.942	20.100	20.262	19.981	20.059	19.798	19.830	19.863	19.892	19.941	19.879	19.740	19.645	19.971	20.012	19.996	19.930	19.915	19.834	19.708	19.609	19.331	19.162	19.199	19.972	20.043	20.017	19.995	20.018
15	19.773	19.658	19.946	20.160	20.256	19.975	20.054	19.808	19.824	19.855	19.887	19.920	19.856	19.723	19.995	19.975	20.010	19.988	19.920	19.916	19.829	19.695	19.585	19.293	19.140	19.196	20.015	20.017	20.016	19.997	20.011
16	19.765	19.656	19.946	20.116	20.246	19.971	20.051	19.791	19.802	19.851	19.879	19.909	19.854	19.712	19.995	20.002	20.003	19.985	19.906	19.904	19.819	19.688	19.566	19.269	19.154	19.194	19.961	20.017	20.016	19.987	20.004
17	19.756	19.639	19.944	20.153	20.234	19.958	20.046	19.803	19.836	19.851	19.867	19.905	19.857	19.712	20.027	20.003	20.006	19.986	19.917	19.901	19.809	19.692	19.546	19.269	19.149	19.196	19.924	20.015	20.042	19.982	20.000
18	19.746	19.644	19.941	20.181	20.221	19.949	20.035	19.801	19.983	19.863	19.866	19.909	19.861	19.715	20.031	19.984	20.003	19.984	19.968	19.894	19.814	19.708	19.527	19.279	19.145	19.210	19.934	20.015	20.060	20.065	20.006
19	19.751	19.713	19.943	20.212	20.206	19.935	20.026	19.815	19.948	19.931	19.866	19.902	19.869	19.726	20.007	19.978	20.012	19.994	19.969	19.896	19.820	19.720	19.524	19.267	19.150	19.208	19.960	20.026	20.030	20.043	20.005
20	19.749	19.702	19.948	20.229	20.196	19.914	20.012	19.841	19.934	19.951	19.870	19.900	19.873	19.739	20.007	19.978	20.014	19.989	19.961	19.903	19.829	19.722	19.521	19.303	19.176	19.221	19.963	20.033	20.026	20.048	20.011
21	19.748	19.714	19.952	20.248	20.179	19.896	19.993	19.846	19.924	19.950	19.876	20.036	19.877	19.758	20.012	19.980	20.015	19.999	19.953	19.898	19.841	19.721	19.517	19.326	19.197	19.235	19.966	20.040	20.027	20.061	20.014
22	19.742	19.758	19.948	20.264	20.168	19.883	19.977	19.853	19.920	19.958	19.877	19.997	19.880	19.782	20.005	19.985	20.023	19.998	19.956	19.906	19.849	19.723	19.519	19.336	19.225	19.238	20.026	20.045	20.023	20.042	20.014
23	19.745	19.819	19.955	20.280	20.148	19.864	19.957	19.885	19.904	19.939	19.869	19.986	19.883	19.784	19.999	19.987	20.021	19.999	19.940	19.906	19.851	19.735	19.508	19.331	19.251	19.237	20.027	20.040	20.027	20.049	20.011
最高(m)	19.815	19.819	20.079	20.280	20.316	20.140	20.149	19.947	19.983	19.972	19.975	20.036	19.972	19.874	20.031	20.003	20.035	20.019	19.996	19.941	19.909	19.849	19.731	19.531	19.344	19.315	20.027	20.058	20.095	20.069	20.040
最低(m)	19.742	19.639	19.812	19.952	20.148	19.864	19.957	19.781	19.802	19.827	19.866	19.844	19.854	19.712	19.645	19.936	19.964	19.984	19.906	19.881	19.809	19.688	19.508	19.267	19.140	19.194	19.225	19.992	20.005	19.982	20.000
平均(m)	19.782	19.697	19.935	20.091	20.260	20.012	20.066	19.849	19.898	19.902	19.911	19.912	19.911	19.805	19.845	19.975	19.997	20.001	19.963	19.911	19.861	19.776	19.639	19.417	19.253	19.245	19.772	20.029	20.030	20.031	20.019

平均水位值：　19.864　　月最高水位值：　20.316　　月最低水位值：　19.140

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

017-11\reports\93-4期計錄及其他\app4-6(逐時水位)-10105101.05

附錄 IV.6-60　101 年 5 月 GM9 地下水位逐時記錄表

地面標高：16.71公尺　井頂標高：17.21公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	14.038	13.930	15.199	14.410	14.942	14.351	14.108	13.986	13.903	13.982	14.054	14.151	14.784	14.288	14.033	14.810	15.034	14.772	14.269	14.020	13.966	13.926	13.883	13.850	13.821	13.830	13.823	14.449	15.033	15.093	15.494
1	14.038	13.920	15.195	14.442	14.894	14.334	14.101	13.980	13.899	13.978	14.051	14.142	14.793	14.268	14.026	14.769	14.986	14.739	14.255	14.009	13.960	13.922	13.878	13.847	13.818	13.829	13.821	14.563	14.986	15.132	15.410
2	14.039	13.906	15.161	14.445	14.852	14.322	14.098	13.980	13.898	13.975	14.049	14.136	14.785	14.256	14.012	14.733	14.932	14.710	14.237	13.998	13.954	13.912	13.872	13.840	13.812	13.822	13.815	14.660	14.943	15.211	15.324
3	14.037	13.903	15.117	14.438	14.810	14.311	14.095	13.972	13.895	13.972	14.048	14.132	14.769	14.243	14.004	14.699	14.885	14.683	14.223	13.994	13.950	13.914	13.865	13.838	13.810	13.819	13.811	14.658	14.901	15.369	15.245
4	14.042	13.897	15.076	14.441	14.778	14.300	14.087	13.970	13.895	13.970	14.047	14.122	14.747	14.237	13.999	14.670	14.844	14.656	14.211	13.984	13.951	13.912	13.865	13.834	13.811	13.817	13.814	14.634	14.862	15.548	15.174
5	14.046	13.891	15.034	14.506	14.748	14.293	14.085	13.971	13.900	13.972	14.054	14.117	14.725	14.229	13.995	14.647	14.881	14.636	14.203	13.978	13.951	13.906	13.868	13.837	13.811	13.817	13.820	14.750	14.827	15.735	15.125
6	14.054	13.892	14.996	14.551	14.716	14.283	14.083	13.963	13.905	14.008	14.066	14.116	14.708	14.214	13.999	14.626	14.875	14.617	14.192	13.976	13.952	13.912	13.871	13.836	13.810	13.820	13.827	14.959	14.794	15.716	15.071
7	14.059	13.892	14.953	14.570	14.688	14.284	14.083	13.960	13.907	14.031	14.081	14.115	14.688	14.206	14.000	14.605	14.853	14.598	14.185	13.982	13.950	13.913	13.878	13.834	13.811	13.820	13.830	15.166	14.772	15.666	15.010
8	14.060	13.886	14.904	14.627	14.663	14.273	14.079	13.963	13.916	14.043	14.096	14.114	14.667	14.199	13.997	14.579	14.829	14.578	14.177	13.980	13.957	13.915	13.882	13.836	13.818	13.825	13.836	15.299	14.814	15.593	14.947
9	14.058	13.886	14.866	14.795	14.629	14.266	14.078	13.958	13.910	14.053	14.106	14.111	14.641	14.188	13.993	14.559	14.803	14.559	14.168	13.984	13.959	13.911	13.875	13.836	13.820	13.826	13.833	15.402	15.141	15.500	14.896
10	14.048	13.879	14.818	14.986	14.654	14.259	14.071	13.951	13.912	14.058	14.114	14.106	14.611	14.172	13.986	14.540	14.781	14.534	14.156	13.983	13.959	13.910	13.876	13.831	13.819	13.822	13.836	15.475	15.439	15.411	14.847
11	14.039	13.872	14.772	15.239	14.559	14.244	14.061	13.948	13.911	14.061	14.122	14.103	14.580	14.158	13.982	14.516	14.758	14.509	14.139	13.977	13.956	13.907	13.872	13.828	13.813	13.821	13.840	15.471	15.505	15.316	14.795
12	14.028	13.860	14.728	15.399	14.480	14.222	14.057	13.943	13.905	14.063	14.127	14.103	14.545	14.139	13.965	14.488	14.800	14.479	14.125	13.971	13.944	13.898	13.867	13.822	13.808	13.813	13.841	15.404	15.461	15.232	14.749
13	14.014	13.852	14.690	15.444	14.487	14.205	14.045	13.934	13.904	14.060	14.131	14.103	14.508	14.121	13.962	14.462	14.920	14.456	14.108	13.965	13.939	13.892	13.855	13.819	13.807	13.807	13.842	15.346	15.385	15.156	14.702
14	14.001	13.842	14.649	15.416	14.494	14.190	14.038	13.919	13.908	14.057	14.135	14.105	14.474	14.100	13.950	14.456	14.979	14.428	14.095	13.963	13.930	13.887	13.849	13.812	13.803	13.801	13.843	15.325	15.304	15.092	14.656
15	13.989	13.838	14.609	15.369	14.476	14.175	14.028	13.913	13.914	14.051	14.138	14.105	14.441	14.085	13.952	14.619	14.985	14.406	14.078	13.963	13.925	13.885	13.840	13.805	13.802	13.799	13.847	15.357	15.225	15.022	14.611
16	13.979	13.836	14.571	15.320	14.463	14.162	14.013	13.904	13.915	14.053	14.142	14.110	14.414	14.073	13.964	14.849	14.968	14.384	14.063	13.962	13.922	13.881	13.841	13.804	13.798	13.801	13.857	15.332	15.154	14.959	14.571
17	13.967	13.838	14.540	15.265	14.441	14.151	14.008	13.897	13.919	14.052	14.140	14.117	14.391	14.064	14.155	15.074	14.946	14.362	14.059	13.961	13.911	13.877	13.838	13.804	13.799	13.803	13.868	15.291	15.100	14.894	14.538
18	13.961	13.839	14.513	15.210	14.429	14.149	14.004	13.894	13.932	14.053	14.146	14.124	14.373	14.059	14.621	15.225	14.921	14.344	14.051	13.956	13.918	13.879	13.843	13.803	13.804	13.811	13.882	15.237	15.189	14.893	14.508
19	13.964	13.929	14.486	15.156	14.418	14.138	14.004	13.899	13.951	14.057	14.151	14.133	14.361	14.054	14.919	15.241	14.897	14.334	14.049	13.965	13.921	13.877	13.843	13.811	13.809	13.811	13.892	15.180	15.259	15.207	14.484
20	13.957	14.336	14.463	15.110	14.408	14.136	14.001	13.897	13.964	14.062	14.155	14.142	14.343	14.051	14.932	15.212	14.875	14.325	14.043	13.969	13.925	13.882	13.851	13.815	13.821	13.820	13.917	15.130	15.263	15.391	14.459
21	13.952	14.824	14.443	15.071	14.393	14.132	14.000	13.904	13.972	14.060	14.163	14.291	14.334	14.048	14.913	15.169	14.852	14.315	14.040	13.967	13.931	13.886	13.854	13.819	13.829	13.823	13.950	15.104	15.231	15.558	14.432
22	13.947	15.096	14.425	15.033	14.380	14.132	13.999	13.906	13.977	14.062	14.160	14.616	14.322	14.049	14.884	15.125	14.832	14.302	14.038	13.971	13.933	13.890	13.856	13.821	13.835	13.827	14.028	15.081	15.177	15.631	14.417
23	13.943	15.180	14.405	14.991	14.366	14.123	13.993	13.904	13.982	14.061	14.156	14.748	14.309	14.040	14.848	15.080	14.801	14.288	14.028	13.971	13.934	13.889	13.853	13.822	13.834	13.828	14.206	15.066	15.122	15.586	14.394
最高(m)	14.060	15.180	15.199	15.444	14.942	14.351	14.108	13.986	13.982	14.063	14.163	14.748	14.793	14.288	14.932	15.241	15.034	14.772	14.269	14.020	13.966	13.926	13.883	13.850	13.835	13.830	14.206	15.475	15.505	15.735	15.494
最低(m)	13.943	13.836	14.405	14.410	14.366	14.123	13.993	13.894	13.895	13.970	14.047	14.103	14.309	14.040	13.950	14.456	14.758	14.288	14.028	13.956	13.911	13.877	13.838	13.803	13.798	13.799	13.811	14.449	14.772	14.893	14.394
平均(m)	14.011	14.043	14.776	14.926	14.590	14.226	14.051	13.938	13.921	14.033	14.110	14.173	14.555	14.148	14.212	14.781	14.885	14.501	14.133	13.977	13.942	13.899	13.861	13.825	13.813	13.817	13.870	15.097	15.120	15.330	14.827

平均水位值：　14.303　　月最高水位值：　15.735　　月最低水位值：　13.798

附錄 IV.6-61　101 年 5 月 GM11 地下水位逐時記錄表

地面標高：42.30公尺　井頂標高：42.89公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	29.798	29.648	29.527	29.735	31.238	30.888	30.336	30.091	29.899	29.770	29.647	29.555	29.634	29.929	30.114	30.045	30.805	31.158	30.889	30.399	30.114	29.940	29.804	29.677	29.561	29.408	29.244	29.137	29.197	30.114	31.742
1	29.786	29.640	29.523	29.752	31.265	30.860	30.315	30.089	29.893	29.764	29.640	29.548	29.634	29.945	30.110	30.056	30.829	31.170	30.861	30.373	30.100	29.936	29.795	29.676	29.555	29.398	29.235	29.130	29.213	30.168	31.763
2	29.780	29.633	29.517	29.766	31.282	30.830	30.293	30.081	29.880	29.756	29.637	29.547	29.638	29.958	30.102	30.074	30.851	31.180	30.835	30.358	30.087	29.926	29.789	29.669	29.551	29.386	29.232	29.130	29.222	30.214	31.789
3	29.773	29.626	29.519	29.784	31.296	30.809	30.279	30.074	29.873	29.751	29.626	29.543	29.645	29.970	30.097	30.105	30.879	31.189	30.808	30.337	30.082	29.921	29.777	29.661	29.541	29.381	29.229	29.126	29.239	30.264	31.820
4	29.763	29.619	29.519	29.801	31.300	30.783	30.267	30.066	29.866	29.745	29.625	29.542	29.650	29.985	30.089	30.138	30.905	31.198	30.783	30.322	30.071	29.912	29.777	29.654	29.531	29.376	29.219	29.118	29.256	30.317	31.845
5	29.759	29.608	29.517	29.820	31.298	30.759	30.248	30.062	29.862	29.749	29.618	29.546	29.657	30.000	30.092	30.182	30.935	31.206	30.762	30.301	30.059	29.909	29.769	29.649	29.530	29.366	29.216	29.119	29.275	30.377	31.866
6	29.758	29.601	29.523	29.836	31.293	30.737	30.234	30.048	29.856	29.736	29.614	29.545	29.662	30.012	30.091	30.244	30.968	31.208	30.744	30.289	30.059	29.896	29.765	29.648	29.527	29.359	29.212	29.114	29.305	30.451	31.886
7	29.754	29.600	29.521	29.849	31.289	30.716	30.220	30.045	29.858	29.728	29.608	29.550	29.674	30.025	30.088	30.305	30.989	31.206	30.725	30.280	30.052	29.895	29.766	29.644	29.517	29.353	29.204	29.111	29.336	30.560	31.894
8	29.746	29.594	29.526	29.866	31.274	30.694	30.205	30.039	29.850	29.730	29.607	29.556	29.687	30.039	30.087	30.361	31.017	31.198	30.700	30.264	30.044	29.894	29.761	29.635	29.508	29.347	29.202	29.113	29.383	30.762	31.894
9	29.740	29.587	29.532	29.884	31.260	30.673	30.191	30.031	29.844	29.723	29.607	29.554	29.696	30.052	30.083	30.418	31.032	31.196	30.677	30.254	30.041	29.887	29.758	29.635	29.506	29.340	29.198	29.109	29.422	31.025	31.883
10	29.736	29.585	29.534	29.899	31.244	30.641	30.174	30.019	29.840	29.716	29.600	29.557	29.708	30.060	30.080	30.476	31.050	31.186	30.659	30.246	30.032	29.885	29.748	29.630	29.493	29.331	29.193	29.105	29.468	31.289	31.883
11	29.725	29.581	29.536	29.920	31.225	30.619	30.014	30.012	29.831	29.715	29.598	29.565	29.717	30.070	30.077	30.525	31.058	31.173	30.636	30.227	30.028	29.876	29.746	29.625	29.489	29.324	29.189	29.110	29.515	31.489	31.855
12	29.720	29.572	29.543	29.933	31.201	30.593	29.906	30.003	29.827	29.707	29.597	29.571	29.728	30.078	30.067	30.573	31.071	31.157	30.610	30.214	30.022	29.865	29.739	29.618	29.480	29.317	29.185	29.110	29.559	31.624	31.837
13	29.713	29.567	29.552	29.958	31.179	30.565	29.799	29.990	29.822	29.698	29.588	29.580	29.743	30.087	30.062	30.606	31.077	31.141	30.590	30.206	30.010	29.867	29.734	29.614	29.475	29.308	29.179	29.107	29.606	31.705	31.806
14	29.705	29.563	29.562	29.989	31.149	30.541	29.687	29.986	29.812	29.693	29.580	29.578	29.753	30.090	30.055	30.635	31.072	31.116	30.573	30.197	30.004	29.853	29.722	29.601	29.471	29.300	29.174	29.111	29.650	31.752	31.779
15	29.695	29.554	29.570	30.071	31.126	30.514	29.930	29.977	29.810	29.682	29.577	29.577	29.764	30.092	30.051	30.666	31.071	31.093	30.542	30.187	29.994	29.850	29.717	29.601	29.463	29.293	29.172	29.109	29.689	31.785	31.745
16	29.689	29.548	29.582	30.195	31.096	30.493	30.005	29.955	29.802	29.677	29.575	29.582	29.779	30.095	30.045	30.685	31.069	31.068	30.524	30.174	29.985	29.843	29.711	29.592	29.448	29.286	29.166	29.106	29.727	31.795	31.705
17	29.683	29.544	29.595	30.397	31.072	30.465	30.043	29.952	29.799	29.672	29.573	29.589	29.796	30.096	30.042	30.704	31.068	31.047	30.507	30.170	29.971	29.839	29.703	29.592	29.452	29.277	29.161	29.124	29.771	31.798	31.666
18	29.676	29.542	29.612	30.603	31.040	30.447	30.069	29.945	29.795	29.676	29.566	29.592	29.814	30.103	30.041	30.714	31.072	31.025	30.489	30.162	29.973	29.830	29.702	29.586	29.443	29.276	29.158	29.133	29.814	31.796	31.630
19	29.671	29.539	29.632	30.779	31.019	30.428	30.081	29.928	29.791	29.669	29.558	29.598	29.833	30.104	30.037	30.731	31.081	31.008	30.474	30.154	29.963	29.830	29.701	29.585	29.435	29.268	29.156	29.141	29.857	31.794	31.595
20	29.670	29.540	29.656	30.933	30.994	30.407	30.087	29.924	29.790	29.663	29.561	29.606	29.855	30.110	30.031	30.742	31.096	30.980	30.456	30.145	29.964	29.823	29.693	29.580	29.433	29.264	29.153	29.149	29.961	31.784	31.568
21	29.666	29.539	29.680	31.050	30.968	30.390	30.094	29.923	29.785	29.662	29.556	29.615	29.874	30.111	30.033	30.756	31.111	30.958	30.439	30.139	29.954	29.813	29.693	29.579	29.420	29.259	29.147	29.161	29.947	31.768	31.521
22	29.658	29.535	29.699	31.125	30.945	30.376	30.099	29.910	29.781	29.655	29.556	29.625	29.896	30.112	30.034	30.767	31.128	30.937	30.429	30.131	29.957	29.815	29.689	29.569	29.419	29.254	29.149	29.172	29.993	31.755	31.487
23	29.656	29.536	29.716	31.197	30.916	30.349	30.100	29.902	29.775	29.651	29.548	29.631	29.917	30.112	30.037	30.789	31.141	30.913	30.411	30.123	29.951	29.811	29.683	29.571	29.411	29.250	29.142	29.185	30.046	31.748	31.446
最高(m)	29.798	29.648	29.716	31.197	31.300	30.888	30.336	30.091	29.899	29.770	29.647	29.631	29.917	30.112	30.114	30.789	31.141	31.208	30.889	30.399	30.114	29.940	29.804	29.677	29.561	29.408	29.244	29.185	30.046	31.798	31.894
最低(m)	29.656	29.535	29.517	29.735	30.916	30.349	29.687	29.902	29.775	29.651	29.548	29.542	29.634	29.929	30.031	30.045	30.805	30.913	30.411	30.123	29.951	29.811	29.683	29.569	29.411	29.250	29.142	29.105	29.197	30.114	31.446
平均(m)	29.722	29.579	29.571	30.173	31.165	30.607	30.112	30.002	29.831	29.708	29.594	29.573	29.740	30.051	30.069	30.471	31.016	31.113	30.630	30.236	30.022	29.872	29.739	29.620	29.486	29.322	29.188	29.127	29.558	31.172	31.746

平均水位值：　30.058　　月最高水位值：　31.894　　月最低水位值：　29.105

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-62　101 年 5 月 GM12 地下水位逐時記錄表

地面標高：43.56公尺　井頂標高：44.00公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	34.157	33.855	33.736	36.029	37.840	36.638	35.499	34.688	34.442	34.188	34.014	34.062	34.248	35.658	35.192	35.353	37.445	37.602	36.687	35.706	34.988	34.568	34.171	33.852	33.662	33.542	33.437	33.357	34.626	37.095	38.830
1	34.135	33.841	33.867	35.997	37.806	36.584	35.455	34.665	34.434	34.175	34.006	34.068	34.264	35.668	35.157	35.563	37.509	37.605	36.647	35.672	34.967	34.550	34.157	33.843	33.656	33.533	33.437	33.361	34.724	37.127	38.957
2	34.113	33.824	34.054	35.964	37.767	36.515	35.414	34.642	34.432	34.166	33.996	34.074	34.284	35.666	35.125	35.758	37.546	37.601	36.597	35.624	34.952	34.530	34.136	33.834	33.651	33.529	33.429	33.357	34.816	37.158	38.985
3	34.100	33.812	34.256	35.935	37.723	36.461	35.373	34.622	34.422	34.149	33.999	34.079	34.309	35.669	35.098	35.945	37.572	37.584	36.545	35.580	34.928	34.512	34.118	33.828	33.645	33.522	33.415	33.357	34.921	37.199	38.968
4	34.082	33.799	34.430	35.900	37.685	36.398	35.333	34.591	34.410	34.135	33.993	34.092	34.337	35.662	35.061	36.144	37.582	37.574	36.494	35.529	34.907	34.502	34.103	33.818	33.642	33.514	33.412	33.358	35.034	37.250	38.940
5	34.070	33.790	34.595	35.878	37.644	36.340	35.298	34.579	34.402	34.131	33.988	34.095	34.379	35.651	35.033	36.345	37.579	37.557	36.448	35.496	34.883	34.484	34.084	33.813	33.637	33.508	33.409	33.366	35.142	37.343	38.897
6	34.052	33.781	34.769	35.841	37.606	36.294	35.256	34.554	34.394	34.116	33.994	34.105	34.450	35.647	35.000	36.505	37.580	37.536	36.416	35.454	34.866	34.463	34.072	33.800	33.629	33.504	33.409	33.375	35.242	37.722	38.853
7	34.045	33.771	34.960	35.825	37.559	36.251	35.219	34.533	34.377	34.110	33.987	34.119	34.520	35.635	34.973	36.634	37.569	37.520	36.371	35.424	34.843	34.454	34.060	33.793	33.622	33.501	33.396	33.386	35.348	38.416	38.790
8	34.033	33.761	35.135	35.804	37.521	36.198	35.186	34.507	34.376	34.099	33.994	34.129	34.605	35.620	34.945	36.741	37.563	37.490	36.333	35.393	34.823	34.438	34.052	33.784	33.616	33.500	33.393	33.403	35.456	38.761	38.730
9	34.018	33.751	35.283	35.797	37.487	36.147	35.143	34.485	34.358	34.097	33.997	34.141	34.709	35.604	34.914	36.799	37.552	37.454	36.287	35.359	34.805	34.423	34.038	33.773	33.615	33.495	33.395	33.431	35.544	38.894	38.671
10	34.006	33.745	35.439	35.802	37.444	36.099	35.112	34.466	34.351	34.094	33.993	34.151	34.801	35.582	34.886	36.837	37.529	37.429	36.254	35.330	34.787	34.410	34.021	33.770	33.605	33.498	33.391	33.464	35.633	38.928	38.602
11	33.994	33.739	35.575	35.847	37.420	36.065	35.077	34.441	34.341	34.087	33.999	34.161	34.895	35.561	34.870	36.861	37.525	37.400	36.219	35.300	34.773	34.385	34.002	33.762	33.601	33.488	33.386	33.501	35.731	38.916	38.542
12	33.980	33.730	35.699	36.063	37.382	36.020	35.041	34.388	34.330	34.079	34.003	34.166	34.985	35.542	34.840	36.863	37.510	37.346	36.190	35.268	34.758	34.366	33.980	33.744	33.594	33.488	33.388	33.545	35.825	38.896	38.472
13	33.973	33.723	35.809	36.717	37.339	35.969	35.007	34.283	34.317	34.076	34.000	34.166	35.076	35.517	34.820	36.866	37.490	37.304	36.148	35.241	34.737	34.354	33.973	33.741	33.583	33.481	33.379	33.597	35.919	38.855	38.397
14	33.953	33.706	35.893	37.281	37.300	35.932	34.976	34.212	34.307	34.066	34.003	34.174	35.169	35.487	34.783	36.857	37.461	37.243	36.107	35.222	34.718	34.341	33.960	33.733	33.585	33.470	33.377	33.657	36.041	38.807	38.333
15	33.940	33.696	35.952	37.606	37.245	35.883	34.942	34.237	34.293	34.052	34.007	34.177	35.252	35.466	34.764	36.837	37.449	37.184	36.069	35.185	34.695	34.324	33.944	33.715	33.570	33.466	33.369	33.731	36.171	38.758	38.271
16	33.922	33.697	35.996	37.782	37.192	35.848	34.913	34.276	34.284	34.047	34.005	34.180	35.320	35.430	34.737	36.815	37.443	37.118	36.033	35.167	34.683	34.308	33.929	33.707	33.561	33.458	33.368	33.811	36.307	38.703	38.202
17	33.909	33.681	36.031	37.867	37.136	35.805	34.884	34.285	34.275	34.038	34.016	34.187	35.400	35.399	34.713	36.801	37.444	37.062	35.994	35.140	34.668	34.290	33.918	33.699	33.554	33.448	33.367	33.899	36.445	38.639	38.138
18	33.898	33.671	36.052	37.917	37.079	35.754	34.856	34.346	34.263	34.038	34.016	34.191	35.464	35.373	34.698	36.808	37.465	36.997	35.944	35.118	34.647	34.271	33.906	33.694	33.559	33.442	33.365	33.993	36.605	38.575	38.076
19	33.894	33.670	36.064	37.936	37.019	35.710	34.823	34.392	34.250	34.024	34.020	34.198	35.510	35.342	34.683	36.845	37.484	36.934	35.909	35.093	34.636	34.251	33.899	33.688	33.554	33.449	33.365	34.093	36.735	38.514	38.018
20	33.887	33.666	36.069	37.935	36.940	35.673	34.799	34.415	34.241	34.025	34.027	34.211	35.556	35.311	34.704	36.937	37.514	36.889	35.868	35.074	34.620	34.234	33.891	33.682	33.552	33.443	33.361	34.192	36.849	38.478	37.952
21	33.877	33.672	36.069	37.925	36.873	35.627	34.772	34.432	34.231	34.030	34.044	34.219	35.587	35.279	34.776	37.078	37.546	36.830	35.832	35.047	34.609	34.217	33.882	33.673	33.551	33.450	33.361	34.303	36.934	38.479	37.901
22	33.867	33.674	36.067	37.897	36.789	35.590	34.745	34.440	34.220	34.024	34.050	34.234	35.625	35.249	34.911	37.242	37.567	36.782	35.789	35.029	34.599	34.204	33.875	33.674	33.552	33.446	33.353	34.402	37.002	38.519	37.853
23	33.864	33.684	36.050	37.877	36.710	35.545	34.715	34.443	34.200	34.021	34.057	34.237	35.651	35.221	35.123	37.354	37.594	36.732	35.749	35.013	34.580	34.191	33.867	33.668	33.546	33.443	33.364	34.521	37.041	38.646	37.805
最高(m)	34.157	33.855	36.069	37.936	37.840	36.638	35.499	34.688	34.442	34.188	34.057	34.237	35.651	35.669	35.192	37.354	37.594	37.605	36.687	35.706	34.988	34.568	34.171	33.852	33.662	33.542	33.437	34.521	37.041	38.928	38.985
最低(m)	33.864	33.666	33.736	35.797	36.710	35.545	34.715	34.212	34.200	34.021	33.987	34.062	34.248	35.221	34.683	35.353	37.443	36.732	35.749	35.013	34.580	34.191	33.867	33.668	33.546	33.442	33.353	33.357	34.626	37.095	37.805
平均(m)	33.990	33.739	35.927	36.726	37.354	36.056	35.077	34.455	34.331	34.086	34.009	34.151	34.933	35.510	34.909	36.616	37.522	37.282	36.205	35.311	34.770	34.378	34.002	33.754	33.598	33.484	33.389	33.686	35.837	38.278	38.466

平均水位值：　35.201　　月最高水位值：　38.985　　月最低水位值：　33.353

附錄 IV.6-63　101 年 5 月 GM13 地下水位逐時記錄表

地面標高：55.25公尺　井頂標高：55.77公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	42.823	42.163	41.894	45.394	48.239	45.757	44.358	43.657	42.738	42.010	41.630	41.877	42.467	44.798	44.560	46.059	48.646	47.802	46.160	44.881	44.286	43.461	42.796	42.358	42.003	41.730	41.495	41.295	44.793	48.400	50.883
1	42.783	42.129	42.351	45.334	48.056	45.672	44.310	43.628	42.700	41.985	41.670	41.878	42.508	44.813	44.533	46.641	48.755	47.802	46.080	44.833	44.257	43.421	42.770	42.338	41.988	41.719	41.483	41.285	45.001	48.393	51.144
2	42.752	42.103	43.243	45.273	47.891	45.597	44.266	43.595	42.649	41.958	41.691	41.882	42.559	44.822	44.504	47.042	48.765	47.791	46.001	44.812	44.230	43.379	42.746	42.314	41.975	41.708	41.472	41.275	45.151	48.394	51.085
3	42.710	42.089	44.003	45.218	47.735	45.527	44.230	43.565	42.599	41.936	41.718	41.890	42.621	44.837	44.477	47.281	48.691	47.752	45.928	44.798	44.209	43.342	42.720	42.297	41.957	41.694	41.461	41.267	45.246	48.394	50.908
4	42.678	42.067	44.582	45.174	47.604	45.448	44.206	43.533	42.561	41.916	41.741	41.897	42.692	44.838	44.453	47.396	48.585	47.717	45.860	44.775	44.194	43.303	42.701	42.283	41.947	41.677	41.447	41.264	45.388	48.381	50.681
5	42.650	42.045	45.113	45.113	47.473	45.373	44.182	43.505	42.528	41.897	41.761	41.903	42.768	44.838	44.429	47.486	48.456	47.661	45.795	44.746	44.174	43.265	42.686	42.265	41.932	41.666	41.441	41.261	45.493	48.399	50.450
6	42.632	42.025	45.459	45.071	47.356	45.303	44.176	43.476	42.490	41.882	41.776	41.908	42.871	44.835	44.408	47.513	48.320	47.600	45.733	44.719	44.149	43.237	42.665	42.252	41.925	41.660	41.437	41.254	45.579	48.937	50.203
7	42.594	42.009	45.674	45.018	47.243	45.235	44.155	43.449	42.456	41.887	41.789	41.922	43.003	44.830	44.388	47.530	48.183	47.529	45.670	44.692	44.119	43.207	42.655	42.238	41.913	41.653	41.431	41.260	45.646	50.404	49.971
8	42.567	41.988	45.810	44.977	47.145	45.170	44.129	43.415	42.431	41.888	41.805	41.941	43.146	44.823	44.366	47.515	48.051	47.455	45.605	44.675	44.087	43.180	42.642	42.224	41.909	41.646	41.422	41.261	45.691	51.221	49.670
9	42.539	41.967	45.887	44.924	47.037	45.108	44.091	43.381	42.394	41.878	41.813	41.952	43.326	44.812	44.342	47.480	47.937	47.402	45.554	44.653	44.059	43.157	42.624	42.212	41.898	41.639	41.418	41.260	45.720	51.362	49.374
10	42.518	41.949	45.924	44.885	46.946	45.042	44.059	43.342	42.362	41.797	41.819	41.968	43.527	44.797	44.318	47.435	47.817	47.343	45.499	44.631	44.029	43.130	42.604	42.196	41.888	41.630	41.405	41.271	45.746	51.268	49.128
11	42.481	41.926	45.929	44.865	46.865	44.977	44.033	43.311	42.325	41.679	41.824	41.984	43.753	44.781	44.297	47.384	47.720	47.276	45.443	44.598	44.004	43.103	42.582	42.184	41.876	41.620	41.398	41.295	45.797	51.083	48.932
12	42.454	41.906	45.921	45.235	46.785	44.913	44.001	43.282	42.293	41.598	41.828	42.004	43.984	44.766	44.271	47.326	47.630	47.201	45.394	44.563	43.973	43.072	42.565	42.168	41.858	41.608	41.389	41.339	46.089	50.870	48.755
13	42.429	41.888	45.923	46.725	46.713	44.859	43.975	43.253	42.262	41.516	41.829	42.029	44.170	44.745	44.240	47.263	47.542	47.119	45.338	44.538	43.928	43.045	42.559	42.156	41.845	41.596	41.376	41.407	46.919	50.640	48.616
14	42.403	41.863	45.905	48.131	46.643	44.806	43.941	43.197	42.229	41.831	41.830	42.053	44.282	44.730	44.214	47.198	47.466	47.030	45.292	44.510	43.872	43.017	42.545	42.136	41.832	41.577	41.364	41.509	47.018	46.891	48.472
15	42.374	41.849	45.870	48.985	46.570	44.761	43.910	43.154	42.204	41.943	41.831	42.077	44.395	44.712	44.185	47.122	47.381	46.948	45.238	44.497	43.820	42.987	42.540	42.122	41.822	41.559	41.357	41.666	48.386	50.148	48.365
16	42.352	41.835	45.829	49.350	46.495	44.710	43.882	43.108	42.175	41.707	41.835	42.111	44.507	44.698	44.161	47.049	47.340	46.842	45.193	44.474	43.786	42.963	42.514	42.105	41.810	41.549	41.348	41.936	48.730	49.910	48.258
17	42.325	41.829	45.788	49.439	46.409	44.660	43.850	43.052	42.151	41.318	41.838	42.148	44.558	44.682	44.133	46.965	47.311	46.758	45.161	44.453	43.742	42.937	42.484	42.091	41.799	41.542	41.329	42.318	48.913	49.624	48.154
18	42.303	41.833	45.740	49.386	46.324	44.617	43.826	43.002	42.135	41.269	41.844	42.186	44.597	44.670	44.104	46.897	47.322	46.668	45.132	44.430	43.694	42.911	42.468	42.078	41.788	41.535	41.328	42.642	48.995	49.322	48.065
19	42.279	41.838	45.686	49.256	46.234	44.569	43.798	42.957	42.120	41.071	41.851	42.233	44.636	44.653	44.082	46.837	47.370	46.580	45.089	44.405	43.651	42.895	42.446	42.071	41.782	41.529	41.327	46.195	48.901	49.076	47.982
20	42.261	41.823	45.632	49.076	46.134	44.532	43.775	42.907	42.097	41.285	41.857	42.276	44.679	44.636	44.094	46.953	47.484	46.487	45.047	44.378	43.616	42.877	42.429	42.058	41.771	41.524	41.320	43.670	48.786	48.870	47.904
21	42.236	41.797	45.572	48.871	46.029	44.497	43.748	42.870	42.074	41.426	41.867	42.322	44.718	44.622	44.192	47.478	47.594	46.406	45.001	44.356	43.577	42.854	42.415	42.048	41.769	41.522	41.317	44.146	48.647	48.745	47.824
22	42.208	41.774	45.521	48.665	45.941	44.451	43.717	42.826	42.057	41.514	41.873	42.375	44.756	44.605	44.624	48.012	47.700	46.328	44.956	44.335	43.541	42.832	42.399	42.038	41.757	41.514	41.309	44.402	48.526	48.888	47.768
23	42.189	41.794	45.454	48.443	45.848	44.407	43.683	42.784	42.034	41.588	41.876	42.424	44.785	44.584	45.277	48.403	47.767	46.252	44.917	44.319	43.496	42.821	42.376	42.023	41.748	41.507	41.303	44.645	48.440	49.960	47.706
最高(m)	42.823	42.163	45.929	49.439	48.239	45.757	44.358	43.657	42.738	42.010	41.876	42.424	44.785	44.838	45.277	48.403	48.765	47.802	46.160	44.881	44.286	43.461	42.796	42.358	42.003	41.730	41.495	44.645	48.957	51.362	51.144
最低(m)	42.189	41.774	41.894	44.865	45.848	44.407	43.683	42.784	42.034	41.071	41.630	41.877	42.467	44.584	44.082	46.059	47.311	46.252	44.917	44.319	43.496	42.821	42.376	42.023	41.748	41.507	41.303	41.254	44.793	48.381	47.706
平均(m)	42.481	41.937	45.196	46.784	46.905	45.000	44.013	43.260	42.336	41.699	41.800	42.052	43.721	44.747	44.361	47.261	47.910	47.156	45.462	44.586	43.937	43.100	42.560	42.177	41.866	41.609	41.391	42.008	46.848	49.628	49.179

平均水位值：　44.290　　月最高水位值：　51.362　　月最低水位值：　41.071

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-64　101 年 5 月 GM7 地下水位逐時記錄表

地面標高：19.49公尺　井頂標高：19.96公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	10.505	10.443	10.542	10.581	10.700	10.652	10.553	10.477	10.416	11.049	11.625	11.752	11.814	11.856	11.838	11.961	11.957	11.993	11.970	11.908	11.890	11.866	11.792	11.747	11.725	11.719	11.689	11.776	11.932	12.020	12.132
1	10.502	10.438	10.560	10.587	10.694	10.646	10.555	10.478	10.408	11.112	11.628	11.750	11.826	11.846	11.841	11.965	11.965	11.984	11.953	11.897	11.884	11.863	11.786	11.746	11.716	11.714	11.688	11.786	11.940	12.019	12.139
2	10.500	10.435	10.570	10.584	10.693	10.643	10.547	10.468	10.414	11.160	11.636	11.759	11.817	11.843	11.834	11.965	11.959	11.980	11.964	11.894	11.885	11.850	11.778	11.738	11.715	11.702	11.682	11.786	11.931	12.020	12.132
3	10.495	10.430	10.573	10.586	10.693	10.643	10.539	10.468	10.404	11.200	11.638	11.754	11.817	11.852	11.834	11.969	11.966	11.982	11.945	11.889	11.879	11.841	11.782	11.742	11.716	11.708	11.688	11.793	11.930	12.025	12.131
4	10.496	10.427	10.576	10.589	10.693	10.643	10.545	10.463	10.403	11.240	11.647	11.745	11.826	11.848	11.833	11.958	11.953	11.976	11.942	11.883	11.881	11.835	11.779	11.733	11.711	11.694	11.683	11.793	11.930	12.034	12.133
5	10.489	10.421	10.583	10.596	10.693	10.644	10.538	10.462	10.406	11.275	11.646	11.747	11.816	11.836	11.825	11.952	11.956	11.988	11.946	11.880	11.876	11.844	11.770	11.739	11.705	11.694	11.685	11.804	11.937	12.038	12.132
6	10.492	10.420	10.590	10.599	10.692	10.650	10.550	10.460	10.422	11.319	11.654	11.753	11.823	11.852	11.822	11.955	11.964	11.984	11.954	11.884	11.875	11.844	11.780	11.731	11.702	11.690	11.694	11.813	11.926	12.057	12.126
7	10.491	10.420	10.588	10.602	10.693	10.643	10.535	10.463	10.417	11.349	11.667	11.759	11.829	11.847	11.828	11.959	11.951	11.983	11.943	11.877	11.879	11.839	11.773	11.733	11.716	11.695	11.699	11.835	11.930	12.075	12.126
8	10.494	10.415	10.595	10.618	10.691	10.639	10.545	10.466	10.420	11.379	11.681	11.761	11.824	11.838	11.824	11.947	11.960	11.978	11.949	11.893	11.890	11.829	11.779	11.735	11.718	11.697	11.700	11.842	11.939	12.074	12.122
9	10.488	10.423	10.590	10.622	10.694	10.642	10.527	10.454	10.285	11.411	11.684	11.763	11.828	11.841	11.817	11.946	11.954	11.976	11.938	11.888	11.879	11.827	11.774	11.733	11.711	11.697	11.699	11.847	11.943	12.081	12.120
10	10.485	10.414	10.599	10.624	10.690	10.628	10.520	10.452	10.222	11.435	11.693	11.771	11.841	11.839	11.817	11.954	11.956	11.975	11.941	11.897	11.886	11.822	11.772	11.738	11.715	11.701	11.696	11.863	11.961	12.082	12.121
11	10.480	10.413	10.591	10.650	10.674	10.618	10.510	10.447	10.131	11.458	11.708	11.769	11.842	11.838	11.824	11.950	11.955	11.977	11.923	11.884	11.881	11.813	11.767	11.731	11.701	11.705	11.697	11.872	11.971	12.087	12.119
12	10.474	10.409	10.589	10.668	10.672	10.616	10.508	10.446	10.036	11.477	11.709	11.770	11.839	11.845	11.816	11.947	11.953	11.961	11.916	11.885	11.866	11.806	11.759	11.712	11.701	11.691	11.716	11.886	11.982	12.100	12.128
13	10.481	10.406	10.590	10.669	10.667	10.604	10.503	10.421	10.141	11.490	11.706	11.770	11.832	11.834	11.813	11.933	11.962	11.962	11.911	11.871	11.858	11.797	11.752	11.715	11.682	11.682	11.708	11.882	11.977	12.086	12.121
14	10.466	10.398	10.598	10.679	10.667	10.598	10.495	10.427	10.239	11.502	11.714	11.782	11.828	11.842	11.823	11.935	11.980	11.965	11.917	11.875	11.864	11.802	11.742	11.710	11.690	11.674	11.719	11.884	11.992	12.092	12.122
15	10.464	10.404	10.588	10.690	10.676	10.606	10.489	10.415	10.305	11.513	11.711	11.777	11.835	11.837	11.811	11.927	11.969	11.968	11.913	11.879	11.854	11.791	11.749	11.702	11.687	11.678	11.711	11.887	11.983	12.075	12.115
16	10.453	10.411	10.586	10.697	10.676	10.594	10.489	10.422	10.328	11.516	11.712	11.776	11.832	11.833	11.826	11.938	11.975	11.967	11.904	11.885	11.861	11.796	11.744	11.707	11.680	11.664	11.724	11.895	11.983	12.077	12.114
17	10.450	10.405	10.583	10.697	10.675	10.588	10.492	10.412	10.350	11.523	11.704	11.767	11.825	11.833	11.848	11.932	11.975	11.959	11.910	11.876	11.856	11.789	11.735	11.694	11.676	11.665	11.715	11.886	11.978	12.069	12.116
18	10.445	10.402	10.589	10.700	10.670	10.597	10.490	10.425	10.460	11.552	11.706	11.777	11.832	11.839	11.871	11.935	11.988	11.966	11.905	11.888	11.862	11.791	11.741	11.697	11.677	11.666	11.719	11.896	11.981	12.068	12.107
19	10.445	10.424	10.579	10.702	10.663	10.589	10.504	10.410	10.552	11.556	11.719	11.787	11.823	11.830	11.895	11.947	11.986	11.967	11.911	11.894	11.861	11.797	11.752	11.700	11.692	11.675	11.723	11.908	11.988	12.076	12.104
20	10.458	10.457	10.575	10.703	10.664	10.592	10.499	10.417	10.690	11.583	11.725	11.789	11.829	11.832	11.917	11.954	11.986	11.969	11.916	11.900	11.860	11.794	11.742	11.703	11.689	11.686	11.741	11.913	12.005	12.086	12.100
21	10.443	10.486	10.576	10.701	10.674	10.586	10.492	10.426	10.804	11.587	11.722	11.799	11.830	11.826	11.939	11.949	11.984	11.961	11.910	11.896	11.865	11.804	11.747	11.716	11.701	11.683	11.745	11.912	12.006	12.091	12.099
22	10.442	10.501	10.578	10.700	10.668	10.581	10.497	10.419	10.902	11.609	11.738	11.814	11.840	11.842	11.960	11.961	11.994	11.962	11.920	11.894	11.869	11.793	11.760	11.715	11.714	11.686	11.752	11.928	12.017	12.112	12.103
23	10.443	10.524	10.581	10.701	10.656	10.563	10.487	10.419	10.982	11.628	11.752	11.812	11.841	11.841	11.967	11.966	11.995	11.970	11.905	11.896	11.869	11.794	11.760	11.715	11.707	11.686	11.765	11.937	12.011	12.131	12.099
最高(m)	10.505	10.524	10.599	10.703	10.700	10.652	10.555	10.478	10.982	11.628	11.752	11.814	11.842	11.856	11.967	11.969	11.995	11.993	11.970	11.908	11.890	11.866	11.792	11.747	11.725	11.719	11.765	11.937	12.017	12.131	12.139
最低(m)	10.442	10.398	10.542	10.581	10.656	10.563	10.487	10.410	10.036	11.049	11.625	11.745	11.814	11.826	11.811	11.927	11.951	11.969	11.904	11.871	11.854	11.789	11.735	11.694	11.676	11.664	11.682	11.776	11.926	12.019	12.099
平均(m)	10.474	10.430	10.582	10.648	10.680	10.617	10.517	10.442	10.422	11.413	11.689	11.771	11.829	11.840	11.851	11.950	11.968	11.973	11.929	11.888	11.872	11.818	11.763	11.722	11.702	11.690	11.710	11.859	11.966	12.070	12.119

平均水位值：　11.458　　月最高水位值：　12.139　　月最低水位值：　10.036

附錄 IV.6-65　101 年 5 月 GM14-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：一公尺　井頂標高：12.69公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	7.665	7.607	7.800	7.855	8.120	7.973	7.846	7.714	7.606	7.855	7.882	7.907	7.927	7.933	7.864	8.099	8.233	8.298	8.157	7.976	7.928	7.880	7.804	7.738	7.679	7.659	7.624	7.676	8.088	8.293	8.640
1	7.662	7.591	7.823	7.847	8.108	7.967	7.836	7.709	7.593	7.860	7.869	7.896	7.931	7.926	7.868	8.102	8.229	8.294	8.145	7.977	7.922	7.872	7.799	7.726	7.666	7.656	7.616	7.707	8.086	8.284	8.647
2	7.662	7.590	7.841	7.851	8.102	7.960	7.829	7.702	7.597	7.864	7.875	7.892	7.942	7.917	7.853	8.107	8.226	8.282	8.139	7.958	7.916	7.870	7.794	7.723	7.667	7.644	7.614	7.730	8.084	8.284	8.647
3	7.647	7.579	7.849	7.852	8.097	7.952	7.821	7.701	7.585	7.861	7.866	7.876	7.942	7.910	7.846	8.104	8.220	8.271	8.122	7.947	7.910	7.855	7.782	7.713	7.658	7.634	7.608	7.748	8.083	8.289	8.640
4	7.644	7.574	7.859	7.870	8.089	7.957	7.822	7.689	7.589	7.864	7.864	7.876	7.947	7.909	7.845	8.104	8.213	8.263	8.117	7.947	7.907	7.856	7.776	7.714	7.654	7.639	7.603	7.768	8.082	8.301	8.630
5	7.641	7.567	7.867	7.873	8.087	7.946	7.815	7.687	7.586	7.854	7.864	7.869	7.950	7.902	7.837	8.101	8.206	8.260	8.103	7.933	7.902	7.847	7.780	7.712	7.652	7.633	7.595	7.784	8.085	8.334	8.624
6	7.644	7.574	7.878	7.879	8.088	7.952	7.814	7.688	7.592	7.877	7.868	7.871	7.942	7.910	7.836	8.103	8.212	8.257	8.097	7.931	7.907	7.845	7.774	7.712	7.659	7.633	7.594	7.801	8.089	8.392	8.618
7	7.655	7.569	7.881	7.888	8.082	7.946	7.808	7.684	7.590	7.866	7.874	7.860	7.955	7.901	7.835	8.107	8.216	8.253	8.089	7.920	7.906	7.847	7.775	7.704	7.651	7.627	7.598	7.822	8.092	8.451	8.600
8	7.652	7.573	7.886	7.901	8.081	7.943	7.808	7.675	7.598	7.868	7.883	7.867	7.958	7.903	7.844	8.110	8.221	8.253	8.089	7.928	7.905	7.843	7.780	7.709	7.655	7.634	7.600	7.856	8.103	8.489	8.596
9	7.657	7.567	7.896	7.921	8.078	7.939	7.799	7.673	7.589	7.867	7.892	7.864	7.961	7.903	7.845	8.109	8.226	8.252	8.081	7.928	7.903	7.851	7.774	7.706	7.652	7.638	7.605	7.879	8.110	8.513	8.584
10	7.658	7.578	7.896	7.948	8.076	7.943	7.799	7.667	7.590	7.875	7.905	7.862	7.969	7.904	7.841	8.112	8.228	8.251	8.080	7.933	7.908	7.842	7.773	7.705	7.656	7.636	7.605	7.904	8.131	8.527	8.585
11	7.648	7.569	7.890	7.989	8.067	7.930	7.787	7.656	7.614	7.881	7.906	7.857	7.967	7.903	7.837	8.108	8.230	8.247	8.067	7.930	7.905	7.838	7.770	7.696	7.653	7.630	7.601	7.927	8.162	8.532	8.572
12	7.644	7.567	7.894	8.031	8.064	7.923	7.781	7.656	7.764	7.880	7.906	7.864	7.961	7.896	7.845	8.108	8.231	8.239	8.058	7.924	7.912	7.839	7.770	7.700	7.656	7.632	7.610	7.953	8.193	8.540	8.559
13	7.633	7.561	7.891	8.067	8.052	7.910	7.773	7.646	7.750	7.885	7.910	7.854	7.956	7.890	7.837	8.097	8.239	8.232	8.051	7.921	7.901	7.829	7.762	7.689	7.641	7.619	7.608	7.965	8.209	8.522	8.550
14	7.632	7.553	7.886	8.091	8.049	7.902	7.770	7.644	7.606	7.880	7.925	7.851	7.948	7.889	7.830	8.087	8.261	8.222	8.041	7.915	7.891	7.827	7.753	7.683	7.637	7.619	7.608	7.980	8.222	8.514	8.538
15	7.619	7.551	7.869	8.107	8.033	7.893	7.761	7.635	7.475	7.873	7.916	7.853	7.938	7.876	7.822	8.083	8.270	8.213	8.030	7.915	7.889	7.816	7.741	7.678	7.636	7.608	7.597	7.985	8.225	8.497	8.525
16	7.612	7.555	7.865	8.116	8.027	7.888	7.761	7.625	7.374	7.869	7.914	7.848	7.924	7.869	7.823	8.085	8.278	8.200	8.026	7.912	7.888	7.824	7.742	7.675	7.636	7.604	7.597	7.995	8.232	8.494	8.508
17	7.602	7.544	7.857	8.115	8.013	7.880	7.745	7.618	7.273	7.870	7.910	7.846	7.921	7.861	7.829	8.102	8.280	8.191	8.007	7.913	7.880	7.810	7.736	7.665	7.629	7.600	7.598	8.007	8.239	8.472	8.493
18	7.605	7.553	7.853	8.120	8.012	7.871	7.745	7.612	7.368	7.873	7.904	7.859	7.918	7.863	7.856	8.132	8.282	8.178	8.002	7.919	7.871	7.810	7.736	7.663	7.634	7.601	7.598	8.020	8.236	8.471	8.480
19	7.604	7.557	7.850	8.124	8.003	7.872	7.742	7.597	7.577	7.872	7.901	7.859	7.920	7.864	7.917	8.158	8.283	8.183	7.993	7.915	7.872	7.809	7.737	7.671	7.636	7.606	7.613	8.040	8.237	8.468	8.469
20	7.611	7.588	7.849	8.124	7.998	7.870	7.738	7.604	7.708	7.868	7.900	7.868	7.920	7.861	7.976	8.180	8.288	8.178	8.000	7.918	7.878	7.804	7.736	7.674	7.639	7.617	7.619	8.044	8.254	8.469	8.461
21	7.606	7.662	7.851	8.121	7.992	7.861	7.732	7.608	7.823	7.879	7.902	7.872	7.926	7.873	8.026	8.204	8.294	8.166	7.989	7.921	7.879	7.808	7.732	7.678	7.644	7.612	7.635	8.055	8.272	8.532	8.454
22	7.606	7.721	7.852	8.124	7.999	7.864	7.732	7.611	7.836	7.883	7.904	7.881	7.929	7.868	8.058	8.210	8.299	8.166	7.985	7.927	7.875	7.808	7.743	7.681	7.656	7.619	7.654	8.068	8.283	8.570	8.448
23	7.605	7.769	7.853	8.126	7.985	7.860	7.718	7.604	7.843	7.874	7.905	7.902	7.936	7.876	8.083	8.228	8.293	8.163	7.985	7.929	7.876	7.805	7.744	7.668	7.660	7.620	7.655	8.078	8.290	8.608	8.439
最高(m)	7.665	7.769	7.896	8.126	8.120	7.973	7.846	7.714	7.843	7.885	7.925	7.907	7.969	7.933	8.083	8.228	8.299	8.298	8.157	7.977	7.928	7.880	7.804	7.738	7.679	7.659	7.655	8.078	8.290	8.608	8.647
最低(m)	7.602	7.544	7.800	7.847	7.985	7.860	7.718	7.597	7.273	7.854	7.864	7.846	7.918	7.861	7.822	8.083	8.206	8.166	7.985	7.912	7.871	7.804	7.732	7.663	7.629	7.600	7.594	7.676	8.082	8.284	8.439
平均(m)	7.634	7.588	7.864	7.998	8.054	7.917	7.783	7.654	7.605	7.871	7.894	7.869	7.941	7.892	7.877	8.123	8.248	8.230	8.061	7.931	7.897	7.835	7.763	7.695	7.650	7.626	7.610	7.908	8.170	8.453	8.554

平均水位值：　7.909　　月最高水位值：　8.647　　月最低水位值：　7.273

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

017-11\reports\93-4附錄及其他\app4-6(連續水位)-10105101.05

環境檢驗有限公司
TEL:2203335
FAX:2203335
新北市新北產業園區五工路100

附錄 IV.6-67　101 年 5 月 GM6-1 地下水位逐時記錄表

[測井編號:GM06]　[地面標高:5.95 公尺]　[管頂標高:6.484 公尺]　[井深:11.2 公尺]　[儀器安裝標高:0.58 公尺]　[單位:公尺]

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均	最高	時 間	最低	時 間
日期	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
01	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.21	2.22	2.23	2.23	2.23	2.22	2.25	17:19	2.20	02:09
	2.23	2.23	2.23	2.23	2.24	2.24	2.23	2.23	2.22	2.22	2.22	2.21					
02	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.22	2.22	2.23	2.24	2.21	2.25	12:08	2.16	23:08
	2.24	2.24	2.23	2.23	2.22	2.22	2.21	2.21	2.20	2.19	2.17	2.16					
03	2.15	2.14	2.12	2.11	2.11	2.10	2.10	2.09	2.07	2.07	2.08	2.09	2.09	2.65	11:22	2.06	23:03
	2.09	2.09	2.07	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.06	2.06	2.06	2.06					
04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.08	2.10	2.17	23:58	2.06	03:11
	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.13	2.14	2.15	2.15	2.16	2.17					
05	2.18	2.18	2.19	2.20	2.20	2.21	2.21	2.23	2.24	2.25	2.25	2.25	2.25	2.30	23:57	2.17	00:02
	2.25	2.26	2.28	2.29	2.30	2.30	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.30					
06	2.30	2.31	2.31	2.31	2.32	2.32	2.32	2.34	2.35	2.35	2.36	2.35	2.33	2.36	10:38	2.30	00:01
	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.34	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33					
07	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.34	2.35	2.36	2.35	2.35	2.34	2.33	2.36	08:44	2.31	20:49
	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.33	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32					
08	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.32	2.32	2.33	2.34	2.34	2.34	2.33	2.34	10:48	2.31	05:17
	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.33	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32					
09	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.32	2.32	2.32	2.33	2.32	2.33	12:44	2.30	18:50
	2.33	2.33	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.32	2.32	2.32					
10	2.32	2.32	2.32	2.33	2.33	2.33	2.33	2.34	2.34	2.34	2.35	2.35	2.34	2.36	13:09	2.32	00:01
	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34					
11	2.34	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.36	2.36	2.36	2.36	2.37	13:05	2.34	00:05
	2.36	2.37	2.37	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36					
12	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.37	14:16	2.36	17:58
	2.36	2.36	2.37	2.37	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36					
13	2.36	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.38	2.36	2.35	2.36	2.35	2.34	2.38	07:39	2.25	23:21
	2.35	2.33	2.33	2.32	2.31	2.31	2.32	2.31	2.30	2.29	2.27	2.25					
14	2.25	2.24	2.24	2.23	2.13	2.12	2.12	2.12	2.11	2.11	2.11	2.12	2.14	2.25	00:01	2.10	20:33
	2.12	2.13	2.12	2.13	2.12	2.12	2.11	2.10	2.10	2.11	2.11	2.11					
15	2.12	2.12	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.29	2.19	2.16	2.17	2.23	2.24	2.34	14:44	2.11	00:02
	2.33	2.34	2.32	2.30	2.27	2.29	2.30	2.32	2.33	2.34	2.30	2.32					
16	2.33	2.34	2.34	2.35	2.35	2.37	2.36	2.38	2.38	2.39	2.38	2.40	2.41	2.39	23:42	2.23	00:01
	2.40	2.40	2.42	2.42	2.44	2.46	2.47	2.49	2.49	2.50	2.52	2.53					
17	2.53	2.53	2.54	2.55	2.55	2.58	2.59	2.64	2.65	2.66	2.69	2.69	2.67	2.79	23:41	2.53	00:01
	2.71	2.73	2.73	2.73	2.72	2.74	2.75	2.76	2.77	2.77	2.78	2.79					
18	2.79	2.80	2.80	2.81	2.81	2.82	2.82	2.84	2.85	2.85	2.85	2.86	2.85	2.88	22:51	2.79	00:01
	2.86	2.86	2.87	2.87	2.87	2.87	2.86	2.86	2.87	2.87	2.87	2.88					
19	2.88	2.88	2.87	2.87	2.87	2.86	2.86	2.87	2.87	2.88	2.87	2.87	2.87	2.89	09:46	2.85	06:56
	2.87	2.87	2.88	2.88	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.88	2.88	2.88					
20	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.89	2.89	2.88	2.89	10:54	2.87	21:11
	2.89	2.89	2.88	2.89	2.89	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.87	2.88					
21	2.88	2.88	2.88	2.88	2.87	2.87	2.87	2.87	2.86	2.86	2.85	2.85	2.84	2.88	02:32	2.78	23:49
	2.85	2.84	2.84	2.83	2.83	2.83	2.82	2.81	2.80	2.79	2.79	2.78					
22	2.78	2.78	2.78	2.77	2.77	2.76	2.76	2.76	2.75	2.75	2.74	2.74	2.73	2.78	00:01	2.66	22:58
	2.72	2.72	2.71	2.70	2.69	2.69	2.68	2.68	2.67	2.67	2.67	2.67					
23	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.68	2.69	2.69	2.70	2.68	2.71	16:12	2.66	00:02
	2.70	2.70	2.70	2.70	2.71	2.70	2.69	2.69	2.68	2.68	2.68	2.68					
24	2.68	2.68	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.68	2.69	2.70	2.70	2.70	2.69	2.71	14:52	2.67	04:51
	2.70	2.70	2.71	2.71	2.71	2.70	2.70	2.69	2.69	2.68	2.68	2.68					
25	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.69	2.70	2.70	2.71	2.71	2.69	2.71	12:48	2.68	05:05
	2.71	2.71	2.71	2.70	2.70	2.70	2.69	2.69	2.69	2.68	2.68	2.68					
26	2.68	2.68	2.68	2.69	2.69	2.69	2.69	2.70	2.71	2.71	2.72	2.73	2.69	2.73	13:39	2.64	23:18
	2.73	2.73	2.72	2.71	2.70	2.69	2.68	2.67	2.66	2.66	2.65	2.64					
27	2.64	2.63	2.63	2.63	2.63	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.64	00:14	2.61	17:39
	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61					
28	2.61	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.66	2.66	2.70	23:21	2.61	00:03
	2.67	2.67	2.68	2.68	2.68	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.70	2.70					
29	2.70	2.70	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.72	2.72	2.73	2.73	2.74	2.73	2.77	23:34	2.70	00:01
	2.74	2.74	2.74	2.74	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.76	2.76	2.76					
30	2.77	2.77	2.78	2.79	2.81	2.83	2.85	2.88	2.91	2.94	2.96	2.98	2.97	3.16	23:59	2.76	00:03
	3.00	3.02	3.04	3.06	3.07	3.08	3.09	3.11	3.12	3.14	3.12	3.15					
31	3.18	3.21	3.23	3.25	3.27	3.28	3.29	3.29	3.29	3.30	3.31	3.30	3.30	3.34	23:45	3.16	00:01
	3.31	3.31	3.31	3.32	3.32	3.32	3.33	3.33	3.33	3.34	3.34	3.34					

月平均水位值	2.52				
月最高水位值	3.34	發生時間	05/31	日	23:45
月最低水位值	2.06	發生時間	05/03	日	23:03

附錄 IV.6-66　101 年 5 月 GM10 地下水位逐時記錄表

[測井編號:GM10]　[地面標高:18.09 公尺]　[管頂標高:18.58 公尺]　[井深:21.95 公尺]　[儀器安裝標高:-0.37 公尺]　[單位:公尺]

時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均	最高	時 間	最低	時 間
日期	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
01	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.07	07:03	1.04	22:33
	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04					
02	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.06	23:52	1.03	18:46
	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05					
03	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.08	10:00	1.05	00:03
	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07					
04	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.10	23:11	1.06	01:05
	1.07	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10					
05	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.12	15:35	1.09	03:22
	1.11	1.11	1.11	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10					
06	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.11	09:37	1.07	21:35
	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07					
07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.08	10:39	1.05	19:21
	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06					
08	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.06	1.07	12:18	1.04	20:49
	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05	1.05	1.05					
09	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06	11:17	1.04	17:41
	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04					
10	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.07	13:12	1.04	00:01
	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04					
11	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.05	1.07	14:18	1.04	22:30
	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04					
12	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	13:31	1.04	00:01
	1.05	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05					
13	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	15:37	1.05	00:03
	1.07	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06					
14	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	09:41	1.05	22:44
	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06					
15	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.08	22:41	1.05	14:29
	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.08					
16	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.11	21:48	1.08	00:01
	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11					
17	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	05:41	1.10	12:21
	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11					
18	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10	1.11	09:42	1.09	23:37
	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09					
19	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.10	08:01	1.08	18:22
	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08					
20	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.08	1.09	09:49	1.08	17:56
	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09					
21	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.10	1.11	10:14	1.09	17:40
	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09					
22	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.10	1.11	09:52	1.08	19:10
	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09					
23	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.11	11:44	1.09	19:42
	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09					
24	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.10	1.11	11:03	1.09	20:36
	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09					
25	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.10	1.11	10:51	1.08	21:34
	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09					
26	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.10	1.11	14:14	1.09	00:02
	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09					
27	1.09	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	11:49	1.09	00:02
	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10					
28	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.15	23:27	1.10	00:01
	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.15	1.15					
29	1.15	1.15	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.17	1.17	1.17	1.19	22:55	1.15	00:01
	1.17	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19					
30	1.20	1.20	1.20	1.20	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22	1.23	1.23	1.23	1.23	1.26	23:36	1.19	00:01
	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	1.26					
31	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.29	1.29	1.29	1.31	22:18	1.26	00:06
	1.29	1.29	1.29	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.31					

月平均水位值	1.09				
月最高水位值	1.31	發生時間	05/31	日	22:18
月最低水位值	1.03	發生時間	05/02	日	18:46

附錄 IV.6-68　101 年 6 月 GM2 地下水位逐時記錄表

地面標高：9.92公尺　井頂標高：10.42公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	10.047	10.019	10.000	10.094	10.088	10.022	10.019	10.021	10.001	9.968	9.988	9.995	10.101	10.061	10.022	9.998	9.968	9.916	9.889	9.855	9.854	9.810	9.762	9.699	10.033	10.072	10.094	10.121	10.148	10.138
1	10.047	10.019	9.997	10.096	10.079	10.021	10.014	10.013	9.992	9.963	9.990	9.996	10.101	10.065	10.016	9.991	9.961	9.914	9.876	9.855	9.847	9.800	9.748	9.708	10.027	10.076	10.086	10.117	10.133	10.133
2	10.039	10.012	9.993	10.098	10.079	10.020	10.017	10.016	9.992	9.959	9.994	9.999	10.100	10.062	10.014	9.994	9.962	9.910	9.876	9.851	9.838	9.797	9.741	9.739	10.036	10.073	10.090	10.114	10.143	10.130
3	10.038	10.005	9.988	10.095	10.078	10.029	10.013	10.017	9.992	9.962	9.999	10.002	10.090	10.067	10.012	9.993	9.955	9.908	9.882	9.856	9.834	9.796	9.741	9.780	10.037	10.076	10.088	10.115	10.134	10.128
4	10.036	10.004	9.986	10.092	10.076	10.017	10.017	10.019	9.992	9.971	9.999	10.003	10.095	10.068	10.011	9.997	9.963	9.910	9.881	9.856	9.833	9.788	9.743	9.826	10.033	10.077	10.095	10.118	10.138	10.123
5	10.038	9.997	9.985	10.097	10.080	10.023	10.020	10.027	9.989	9.976	10.002	10.005	10.096	10.068	10.017	10.002	9.959	9.913	9.885	9.851	9.838	9.794	9.742	9.921	10.042	10.081	10.091	10.124	10.140	10.130
6	10.043	10.000	9.989	10.104	10.086	10.025	10.028	10.035	9.995	9.974	10.007	9.996	10.094	10.060	10.021	9.999	9.959	9.914	9.891	9.860	9.833	9.790	9.737	9.938	10.056	10.087	10.094	10.124	10.146	10.132
7	10.044	10.007	9.996	10.106	10.081	10.028	10.026	10.059	9.994	9.973	10.011	9.999	10.099	10.058	10.024	9.997	9.956	9.918	9.889	9.862	9.843	9.795	9.740	9.959	10.057	10.091	10.101	10.129	10.146	10.132
8	10.045	10.015	9.995	10.111	10.080	10.047	10.029	10.078	9.994	9.982	10.003	10.000	10.096	10.054	10.016	10.001	9.954	9.912	9.884	9.859	9.839	9.798	9.742	9.962	10.068	10.094	10.102	10.131	10.146	10.131
9	10.051	10.011	9.997	10.104	10.073	10.048	10.029	10.077	9.986	9.978	10.008	10.001	10.103	10.047	10.022	9.998	9.949	9.904	9.885	9.862	9.842	9.796	9.731	9.974	10.064	10.090	10.098	10.137	10.150	10.126
10	10.045	10.012	9.879	10.107	10.068	10.053	10.034	10.072	9.992	9.982	10.007	9.996	10.106	10.049	10.018	9.996	9.944	9.902	9.883	9.860	9.832	9.798	9.721	9.979	10.066	10.090	10.097	10.130	10.150	10.123
11	10.049	10.014	9.752	10.107	10.070	10.045	10.034	10.063	9.989	9.975	10.003	9.994	10.103	10.044	10.016	9.991	9.942	9.897	9.877	9.857	9.836	9.791	9.721	9.981	10.059	10.083	10.099	10.134	10.142	10.142
12	10.037	10.007	9.618	10.101	10.059	10.033	10.019	10.057	9.977	9.978	9.998	9.994	10.099	10.036	10.010	9.992	9.933	9.899	9.874	9.848	9.826	9.784	9.717	9.984	10.062	10.087	10.084	10.132	10.140	10.140
13	10.034	10.004	9.701	10.100	10.056	10.028	10.019	10.040	9.975	9.969	9.993	9.987	10.093	10.039	10.003	9.977	9.930	9.890	9.864	9.849	9.822	9.781	9.710	9.981	10.058	10.081	10.090	10.126	10.143	10.143
14	10.025	9.997	9.769	10.094	10.042	10.025	10.018	10.030	9.970	9.965	9.986	9.988	10.095	10.036	10.004	9.977	9.928	9.891	9.858	9.855	9.813	9.773	9.694	9.987	10.049	10.082	10.086	10.124	10.131	10.131
15	10.019	9.991	9.850	10.096	10.038	10.017	10.014	10.015	9.971	9.955	9.986	9.983	10.088	10.029	9.998	9.972	9.924	9.893	9.859	9.846	9.821	9.764	9.688	9.990	10.057	10.078	10.098	10.125	10.139	10.139
16	10.016	9.990	9.887	10.095	10.036	10.014	10.011	10.013	9.964	9.961	9.986	9.982	10.085	10.031	9.993	9.968	9.922	9.904	9.859	9.848	9.815	9.768	9.679	9.988	10.061	10.076	10.100	10.127	10.136	10.136
17	10.011	9.986	9.974	10.099	10.034	10.011	10.016	10.010	9.971	9.960	9.984	9.994	10.083	10.022	9.992	9.969	9.927	9.901	9.856	9.848	9.818	9.767	9.692	9.990	10.056	10.081	10.098	10.128	10.142	10.142
18	10.013	9.998	10.023	10.102	10.039	10.017	10.013	10.012	9.975	9.966	9.988	10.029	10.089	10.015	9.991	9.980	9.930	9.903	9.859	9.860	9.815	9.774	9.707	9.997	10.068	10.084	10.102	10.128	10.143	10.143
19	10.014	9.996	10.061	10.101	10.042	10.021	10.022	10.015	9.984	9.965	9.996	10.063	10.092	10.020	9.994	9.987	9.937	9.901	9.864	9.859	9.824	9.773	9.710	10.008	10.078	10.091	10.107	10.136	10.148	10.148
20	10.024	10.004	10.081	10.103	10.038	10.020	10.019	10.019	9.985	9.975	10.002	10.086	10.087	10.022	9.995	9.987	9.932	9.900	9.866	9.864	9.827	9.774	9.707	10.013	10.085	10.098	10.116	10.142	10.154	10.154
21	10.022	10.004	10.095	10.100	10.037	10.027	10.028	10.020	9.983	9.975	10.002	10.093	10.086	10.021	10.002	9.986	9.930	9.891	9.867	9.863	9.825	9.772	9.710	10.030	10.087	10.100	10.122	10.142	10.158	10.158
22	10.027	10.010	10.099	10.098	10.030	10.028	10.024	10.018	9.984	9.983	9.998	10.106	10.077	10.019	10.005	9.990	9.927	9.888	9.862	9.866	9.820	9.772	9.703	10.030	10.086	10.099	10.122	10.148	10.157	10.157
23	10.033	10.004	10.100	10.092	10.029	10.020	10.023	10.010	9.978	9.982	10.002	10.102	10.069	10.021	9.999	9.976	9.920	9.886	9.859	9.855	9.817	9.769	9.703	10.023	10.089	10.097	10.120	10.146	10.144	10.157
最高(m)	*10.051*	*10.019*	*10.100*	*10.111*	*10.088*	*10.053*	*10.034*	*10.078*	*10.001*	*9.983*	*10.011*	*10.106*	*10.106*	*10.068*	*10.024*	*10.002*	*9.968*	*9.918*	*9.891*	*9.866*	*9.854*	*9.810*	*9.762*	*10.030*	*10.089*	*10.100*	*10.122*	*10.148*	*10.158*	*10.158*
最低(m)	*10.011*	*9.986*	*9.618*	*10.092*	*10.029*	*10.011*	*10.011*	*10.010*	*9.964*	*9.955*	*9.984*	*9.982*	*10.069*	*10.015*	*9.991*	*9.968*	*9.920*	*9.886*	*9.856*	*9.846*	*9.813*	*9.764*	*9.679*	*9.699*	*10.027*	*10.072*	*10.084*	*10.114*	*10.131*	*10.123*
平均(m)	*10.033*	*10.004*	*9.951*	*10.100*	*10.059*	*10.027*	*10.021*	*10.032*	*9.984*	*9.971*	*9.997*	*10.016*	*10.093*	*10.042*	*10.008*	*9.988*	*9.942*	*9.903*	*9.873*	*9.856*	*9.830*	*9.784*	*9.720*	*9.937*	*10.059*	*10.085*	*10.099*	*10.129*	*10.144*	*10.138*

平均水位值： **9.994**　　*月最高水位值：* **10.158**　　*月最低水位值：* **9.618**

附錄 IV.6-69　101 年 6 月 GM3-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：---公尺　井頂標高：9.530公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	7.655	7.487	7.376	7.021	7.179	7.244	7.216	7.168	7.143	7.109	7.063	7.050	7.064	7.213	7.114	7.030	7.009	6.975	6.918	6.886	6.861	6.861	6.824	6.789	6.767	7.329	7.249	7.173	7.152	7.146
1	7.648	7.484	7.370	7.013	7.189	7.234	7.213	7.168	7.135	7.095	7.058	7.057	7.065	7.212	7.106	7.031	7.000	6.972	6.916	6.879	6.856	6.857	6.812	6.786	6.765	7.313	7.235	7.172	7.148	7.136
2	7.636	7.474	7.370	7.006	7.195	7.226	7.205	7.168	7.136	7.091	7.049	7.064	7.063	7.217	7.093	7.036	6.999	6.965	6.906	6.875	6.857	6.852	6.813	6.775	6.756	7.308	7.225	7.163	7.148	7.141
3	7.624	7.462	7.367	7.005	7.209	7.226	7.202	7.158	7.133	7.082	7.048	7.070	7.067	7.214	7.093	7.033	6.993	6.962	6.900	6.866	6.850	6.840	6.804	6.769	6.769	7.304	7.225	7.158	7.149	7.130
4	7.620	7.462	7.355	7.004	7.214	7.222	7.200	7.150	7.133	7.074	7.043	7.073	7.073	7.210	7.103	7.031	6.993	6.949	6.900	6.873	6.851	6.838	6.805	6.765	6.865	7.299	7.218	7.149	7.145	7.137
5	7.612	7.452	7.353	7.009	7.222	7.220	7.200	7.151	7.129	7.083	7.048	7.072	7.069	7.199	7.097	7.024	7.000	6.954	6.909	6.877	6.853	6.836	6.795	6.754	6.922	7.291	7.221	7.151	7.144	7.129
6	7.607	7.450	7.351	7.003	7.222	7.227	7.199	7.149	7.135	7.081	7.048	7.075	7.069	7.188	7.098	7.029	7.000	6.954	6.906	6.886	6.856	6.839	6.800	6.761	6.988	7.287	7.210	7.153	7.141	7.131
7	7.602	7.442	7.352	7.001	7.233	7.221	7.195	7.157	7.135	7.081	7.043	7.074	7.068	7.184	7.101	7.033	7.009	6.954	6.911	6.889	6.854	6.842	6.800	6.756	7.088	7.290	7.215	7.153	7.143	7.122
8	7.601	7.444	7.348	7.010	7.247	7.232	7.201	7.162	7.137	7.076	7.044	7.072	7.064	7.176	7.097	7.031	7.006	6.955	6.911	6.886	6.862	6.836	6.803	6.757	7.138	7.288	7.208	7.156	7.147	7.121
9	7.591	7.439	7.348	7.006	7.250	7.234	7.192	7.166	7.135	7.075	7.044	7.079	7.065	7.177	7.086	7.024	7.002	6.952	6.908	6.887	6.864	6.841	6.810	6.767	7.224	7.291	7.207	7.156	7.144	7.117
10	7.589	7.438	7.340	6.999	7.247	7.222	7.196	7.163	7.142	7.071	7.049	7.075	7.066	7.168	7.078	7.024	6.993	6.949	6.907	6.881	6.865	6.845	6.811	6.762	7.299	7.280	7.208	7.161	7.143	7.120
11	7.576	7.432	7.338	6.987	7.246	7.231	7.196	7.163	7.135	7.071	7.040	7.080	7.062	7.165	7.074	7.027	6.995	6.938	6.901	6.878	6.866	6.843	6.806	6.749	7.365	7.276	7.202	7.156	7.144	7.122
12	7.572	7.429	7.337	7.045	7.250	7.224	7.191	7.155	7.131	7.071	7.042	7.076	7.055	7.161	7.072	7.018	6.995	6.922	6.897	6.874	6.858	6.840	6.805	6.744	7.400	7.271	7.199	7.154	7.142	7.121
13	7.559	7.421	7.201	7.045	7.243	7.221	7.175	7.158	7.130	7.063	7.045	7.069	7.058	7.158	7.063	7.023	6.987	6.928	6.891	6.873	6.854	6.828	6.796	6.746	7.410	7.260	7.191	7.150	7.126	7.119
14	7.546	7.411	7.090	7.036	7.237	7.213	7.170	7.146	7.119	7.065	7.046	7.072	7.053	7.146	7.063	7.014	6.982	6.921	6.887	6.861	6.853	6.825	6.803	6.741	7.399	7.257	7.188	7.153	7.138	7.117
15	7.542	7.406	6.988	7.041	7.244	7.212	7.166	7.136	7.115	7.058	7.043	7.068	7.053	7.131	7.062	7.010	6.977	6.920	6.886	6.858	6.853	6.825	6.797	6.735	7.384	7.246	7.182	7.151	7.141	7.114
16	7.536	7.402	7.017	6.649	7.235	7.197	7.152	7.132	7.104	7.057	7.032	7.066	7.054	7.137	7.061	7.015	6.976	6.913	6.896	6.847	6.851	6.817	6.791	6.719	7.376	7.239	7.176	7.140	7.135	7.110
17	7.521	7.390	7.032	6.885	7.239	7.199	7.152	7.131	7.094	7.045	7.032	7.060	7.050	7.136	7.048	7.004	6.972	6.911	6.888	6.854	6.845	6.817	6.780	6.720	7.364	7.229	7.167	7.144	7.140	7.108
18	7.515	7.390	7.024	6.969	7.236	7.199	7.153	7.126	7.086	7.048	7.026	7.055	7.043	7.131	7.052	7.003	6.970	6.919	6.894	6.846	6.846	6.818	6.788	6.701	7.357	7.232	7.172	7.146	7.137	7.105
19	7.513	7.394	7.033	7.038	7.239	7.208	7.158	7.129	7.094	7.055	7.028	7.055	7.056	7.124	7.042	7.004	6.970	6.920	6.894	6.853	6.851	6.820	6.790	6.717	7.350	7.232	7.166	7.140	7.134	7.104
20	7.503	7.387	7.032	7.080	7.244	7.207	7.164	7.135	7.102	7.054	7.034	7.063	7.102	7.123	7.035	7.006	6.978	6.922	6.895	6.856	6.857	6.822	6.792	6.740	7.344	7.238	7.167	7.142	7.141	7.107
21	7.503	7.390	7.034	7.120	7.250	7.214	7.171	7.139	7.104	7.060	7.034	7.063	7.145	7.120	7.041	7.003	6.980	6.929	6.898	6.863	6.865	6.831	6.793	6.760	7.347	7.241	7.170	7.141	7.140	7.106
22	7.504	7.389	7.025	7.148	7.245	7.219	7.173	7.137	7.105	7.064	7.035	7.063	7.193	7.119	7.035	7.007	6.981	6.928	6.899	6.866	6.866	6.829	6.793	6.762	7.336	7.247	7.176	7.146	7.140	7.108
23	7.497	7.379	7.028	7.166	7.255	7.217	7.165	7.146	7.114	7.063	7.042	7.072	7.210	7.119	7.035	7.012	6.978	6.926	6.894	6.868	6.869	6.834	6.793	6.765	7.336	7.249	7.177	7.147	7.149	7.110
最高(m)	*7.655*	*7.487*	*7.376*	*7.166*	*7.255*	*7.244*	*7.216*	*7.168*	*7.143*	*7.109*	*7.063*	*7.080*	*7.210*	*7.217*	*7.114*	*7.036*	*7.009*	*6.975*	*6.918*	*6.889*	*6.869*	*6.861*	*6.824*	*6.789*	*7.410*	*7.329*	*7.249*	*7.173*	*7.152*	*7.146*
最低(m)	*7.497*	*7.379*	*6.988*	*6.649*	*7.179*	*7.197*	*7.152*	*7.126*	*7.086*	*7.045*	*7.026*	*7.050*	*7.043*	*7.119*	*7.035*	*7.003*	*6.970*	*6.911*	*6.886*	*6.846*	*6.845*	*6.817*	*6.780*	*6.701*	*6.756*	*7.229*	*7.166*	*7.140*	*7.126*	*7.104*
平均(m)	*7.570*	*7.427*	*7.213*	*7.012*	*7.232*	*7.220*	*7.184*	*7.150*	*7.122*	*7.071*	*7.042*	*7.068*	*7.078*	*7.164*	*7.073*	*7.020*	*6.989*	*6.939*	*6.901*	*6.870*	*6.857*	*6.835*	*6.800*	*6.752*	*7.181*	*7.271*	*7.198*	*7.152*	*7.142*	*7.119*

平均水位值： **7.088**　　*月最高水位值：* **7.655**　　*月最低水位值：* **6.649**

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-70　101 年 6 月 P5-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：---公尺　井頂標高：12.139公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	8.871	8.471	8.164	7.928	7.776	7.680	7.548	7.047	6.972	6.892	6.806	6.735	6.695	6.681	6.729	6.689	6.654	6.614	6.527	6.464	6.410	6.378	6.325	6.256	6.143	7.567	7.798	7.667	7.525	7.409
1	8.856	8.459	8.150	7.919	7.768	7.675	7.537	7.034	6.971	6.884	6.798	6.733	6.695	6.684	6.724	6.682	6.651	6.609	6.525	6.459	6.406	6.374	6.309	6.246	6.142	7.604	7.798	7.657	7.522	7.401
2	8.830	8.440	8.143	7.903	7.760	7.668	7.530	7.034	6.960	6.872	6.793	6.732	6.692	6.697	6.725	6.690	6.645	6.602	6.514	6.457	6.405	6.365	6.310	6.247	6.138	7.633	7.787	7.656	7.518	7.393
3	8.817	8.427	8.134	7.904	7.764	7.665	7.524	7.023	6.953	6.858	6.783	6.722	6.689	6.705	6.724	6.689	6.649	6.591	6.516	6.448	6.394	6.360	6.299	6.229	6.131	7.658	7.776	7.645	7.507	7.393
4	8.789	8.406	8.124	7.901	7.768	7.669	7.523	7.020	6.949	6.855	6.772	6.725	6.689	6.704	6.733	6.691	6.649	6.591	6.510	6.449	6.397	6.350	6.293	6.228	6.138	7.675	7.773	7.636	7.506	7.388
5	8.772	8.390	8.114	7.892	7.764	7.660	7.518	7.017	6.945	6.849	6.771	6.714	6.688	6.712	6.724	6.681	6.654	6.595	6.510	6.446	6.392	6.351	6.291	6.221	6.134	7.694	7.765	7.625	7.498	7.379
6	8.759	8.375	8.092	7.882	7.758	7.662	7.519	7.016	6.944	6.847	6.770	6.711	6.679	6.712	6.731	6.683	6.648	6.595	6.511	6.451	6.395	6.346	6.287	6.214	6.145	7.705	7.758	7.620	7.496	7.372
7	8.730	8.357	8.076	7.873	7.749	7.660	7.514	7.017	6.943	6.844	6.764	6.707	6.675	6.711	6.718	6.682	6.648	6.590	6.509	6.452	6.397	6.355	6.286	6.215	6.170	7.724	7.748	7.607	7.481	7.364
8	8.713	8.343	8.063	7.857	7.747	7.648	7.511	7.017	6.947	6.842	6.760	6.710	6.668	6.707	6.720	6.681	6.645	6.582	6.513	6.454	6.395	6.352	6.285	6.214	6.207	7.746	7.743	7.604	7.474	7.353
9	8.701	8.332	8.046	7.841	7.732	7.631	7.496	7.022	6.940	6.837	6.761	6.703	6.669	6.717	6.707	6.680	6.637	6.579	6.502	6.457	6.396	6.353	6.287	6.217	6.263	7.758	7.744	7.592	7.468	7.348
10	8.682	8.322	8.041	7.839	7.724	7.618	7.478	7.019	6.941	6.839	6.761	6.708	6.666	6.716	6.697	6.667	6.631	6.576	6.501	6.446	6.397	6.354	6.287	6.210	6.332	7.759	7.735	7.586	7.463	7.336
11	8.671	8.310	8.039	7.834	7.715	7.609	7.447	7.016	6.941	6.834	6.759	6.711	6.668	6.717	6.698	6.670	6.631	6.560	6.492	6.442	6.400	6.352	6.287	6.205	6.431	7.776	7.734	7.582	7.459	7.332
12	8.655	8.299	8.032	7.826	7.713	7.607	7.423	7.015	6.938	6.838	6.761	6.709	6.668	6.725	6.695	6.668	6.621	6.551	6.480	6.431	6.396	6.341	6.281	6.201	6.543	7.784	7.732	7.572	7.456	7.328
13	8.642	8.288	8.018	7.822	7.714	7.599	7.405	7.003	6.934	6.832	6.763	6.707	6.669	6.726	6.688	6.661	6.619	6.541	6.475	6.426	6.387	6.335	6.280	6.200	6.668	7.791	7.729	7.572	7.457	7.321
14	8.625	8.281	8.021	7.818	7.709	7.588	7.327	6.998	6.924	6.820	6.760	6.710	6.670	6.732	6.699	6.666	6.616	6.539	6.475	6.421	6.380	6.325	6.270	6.198	6.806	7.794	7.723	7.566	7.452	7.319
15	8.609	8.270	8.017	7.819	7.715	7.594	7.174	6.987	6.913	6.815	6.748	6.707	6.673	6.740	6.699	6.662	6.620	6.541	6.470	6.416	6.373	6.321	6.263	6.192	6.917	7.794	7.713	7.567	7.451	7.310
16	8.584	8.259	8.008	7.822	7.718	7.587	7.081	6.983	6.905	6.806	6.746	6.702	6.673	6.736	6.706	6.669	6.620	6.544	6.475	6.412	6.377	6.319	6.258	6.176	7.023	7.793	7.712	7.563	7.447	7.317
17	8.567	8.242	7.996	7.821	7.717	7.595	6.966	6.978	6.896	6.801	6.738	6.700	6.670	6.742	6.707	6.670	6.619	6.547	6.480	6.416	6.376	6.318	6.255	6.165	7.116	7.794	7.699	7.556	7.443	7.310
18	8.550	8.227	7.989	7.813	7.717	7.600	7.027	6.975	6.883	6.803	6.739	6.693	6.663	6.747	6.707	6.669	6.621	6.543	6.486	6.417	6.374	6.318	6.257	6.162	7.196	7.792	7.693	7.551	7.440	7.307
19	8.533	8.211	7.976	7.808	7.712	7.595	7.031	6.972	6.888	6.802	6.733	6.686	6.671	6.738	6.703	6.664	6.626	6.547	6.482	6.414	6.380	6.316	6.257	6.164	7.275	7.794	7.682	7.540	7.430	7.304
20	8.516	8.202	7.966	7.805	7.708	7.593	7.044	6.972	6.892	6.796	6.731	6.693	6.660	6.738	6.703	6.660	6.621	6.542	6.484	6.417	6.381	6.326	6.257	6.160	7.350	7.794	7.677	7.539	7.424	7.296
21	8.506	8.191	7.955	7.796	7.703	7.580	7.047	6.981	6.894	6.803	6.735	6.685	6.660	6.735	6.695	6.654	6.626	6.544	6.489	6.419	6.387	6.320	6.252	6.156	7.416	7.797	7.676	7.538	7.416	7.288
22	8.498	8.187	7.949	7.788	7.699	7.571	7.042	6.978	6.895	6.806	6.733	6.690	6.664	6.731	6.690	6.653	6.624	6.542	6.486	6.419	6.388	6.328	6.260	6.155	7.470	7.798	7.672	7.530	7.417	7.283
23	8.488	8.170	7.936	7.786	7.687	7.559	7.047	6.978	6.897	6.805	6.734	6.693	6.673	6.737	6.685	6.656	6.618	6.537	6.471	6.419	6.387	6.319	6.256	6.146	7.529	7.794	7.671	7.530	7.413	7.284
最高(m)	*8.871*	*8.471*	*8.164*	*7.928*	*7.776*	*7.680*	*7.548*	*7.047*	*6.972*	*6.892*	*6.806*	*6.735*	*6.695*	*6.747*	*6.733*	*6.691*	*6.654*	*6.614*	*6.527*	*6.464*	*6.410*	*6.378*	*6.325*	*6.256*	*7.529*	*7.798*	*7.798*	*7.667*	*7.525*	*7.409*
最低(m)	*8.488*	*8.170*	*7.936*	*7.786*	*7.687*	*7.559*	*6.966*	*6.972*	*6.883*	*6.796*	*6.731*	*6.685*	*6.660*	*6.681*	*6.685*	*6.653*	*6.616*	*6.537*	*6.470*	*6.412*	*6.373*	*6.316*	*6.252*	*6.146*	*6.131*	*7.567*	*7.671*	*7.530*	*7.413*	*7.283*
平均(m)	*8.665*	*8.311*	*8.044*	*7.846*	*7.731*	*7.621*	*7.323*	*7.004*	*6.928*	*6.833*	*6.759*	*6.708*	*6.674*	*6.720*	*6.709*	*6.672*	*6.633*	*6.567*	*6.495*	*6.436*	*6.390*	*6.341*	*6.279*	*6.199*	*6.653*	*7.742*	*7.731*	*7.588*	*7.465*	*7.339*

平均水位值： *7.080*　　*月最高水位值：* *8.871*　　*月最低水位值：* *6.131*

附錄 IV.6-71　101 年 6 月 P8-1'地下水位逐時記錄表

地面標高：---公尺　井頂標高：20.583公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	19.982	19.947	19.911	19.883	19.871	19.834	20.023	20.007	20.022	20.021	19.999	19.940	19.855	19.887	19.920	19.856	19.723	19.995	19.975	20.010	19.988	19.920	19.916	19.850	19.833	19.919	19.923	19.840	19.728	19.961
1	19.982	19.938	19.906	19.880	19.860	19.828	20.017	19.995	19.976	20.018	19.996	19.937	19.851	19.879	19.909	19.854	19.712	19.995	20.002	20.003	19.985	19.906	19.904	19.844	19.922	19.965	19.909	19.820	19.685	19.944
2	19.978	19.924	19.903	19.872	19.851	19.822	20.016	19.987	19.966	20.004	19.989	19.919	19.851	19.867	19.905	19.857	19.712	20.027	20.003	20.006	19.986	19.917	19.901	19.838	19.907	19.941	19.897	19.798	19.658	19.936
3	19.971	19.919	19.903	19.897	19.848	19.816	20.016	19.987	19.964	19.999	19.990	19.905	19.863	19.866	19.909	19.861	19.715	20.031	19.984	20.003	19.984	19.968	19.894	19.834	19.892	19.941	19.879	19.740	19.645	19.971
4	19.973	19.922	19.899	19.911	19.852	19.812	20.042	19.982	19.964	20.003	19.995	19.948	19.931	19.866	19.902	19.869	19.726	20.007	19.978	20.012	19.994	19.969	19.870	19.834	19.887	19.920	19.856	19.723	19.995	19.975
5	19.973	19.919	19.894	19.903	19.848	19.812	20.030	20.065	19.997	19.998	19.985	19.934	19.951	19.870	19.900	19.873	19.739	20.007	19.978	20.014	19.989	19.961	19.872	19.838	19.879	19.909	19.854	19.712	19.995	20.002
6	19.972	19.915	19.902	19.900	19.850	19.816	20.030	20.043	19.974	20.001	19.988	19.924	19.950	19.876	20.036	19.877	19.758	20.012	19.980	20.015	19.999	19.953	19.870	19.840	19.867	19.905	19.857	19.712	20.027	20.003
7	19.966	19.927	19.902	19.900	19.848	19.818	20.026	20.048	19.975	20.004	19.985	19.920	19.958	19.877	19.997	19.880	19.782	20.005	19.985	20.023	19.998	19.956	19.873	19.850	19.866	19.909	19.861	19.715	20.031	19.984
8	19.974	19.930	19.902	19.910	19.851	19.828	20.027	20.061	19.980	20.011	19.986	19.904	19.939	19.869	19.986	19.883	19.784	19.999	19.987	20.021	19.999	19.940	19.871	19.843	19.866	19.902	19.869	19.726	20.007	19.978
9	19.967	19.927	19.906	19.902	19.849	19.821	20.023	20.042	19.979	20.013	19.980	19.897	19.925	19.868	19.972	19.874	19.783	19.996	19.976	20.018	19.996	19.937	19.872	19.835	19.870	19.900	19.873	19.739	20.007	19.978
10	19.966	19.925	19.907	19.900	19.850	19.786	20.027	20.049	19.980	20.015	19.980	19.868	19.925	19.866	19.965	19.869	19.786	19.986	19.966	20.004	19.989	19.919	19.868	19.829	19.876	20.036	19.877	19.758	20.012	19.980
11	19.962	19.926	19.916	19.894	19.846	19.824	20.018	20.040	19.984	20.019	19.973	19.857	19.930	19.859	19.958	19.859	19.779	19.982	19.964	19.999	19.990	19.905	19.860	19.833	19.877	19.997	19.880	19.838	20.005	19.985
12	19.957	19.921	19.921	19.884	19.838	19.859	20.027	20.027	19.994	20.014	19.961	19.839	19.939	19.861	19.951	19.855	19.775	19.977	19.964	20.003	19.995	19.898	19.849	19.829	19.869	19.989	19.838	19.764	19.990	19.987
13	19.947	19.915	19.915	19.878	19.827	19.899	20.045	20.034	20.031	20.006	19.950	19.827	19.949	19.853	19.948	19.857	19.775	19.967	19.997	19.998	19.985	19.894	19.839	19.833	19.868	19.972	19.874	19.783	19.996	19.976
14	19.940	19.910	19.906	19.869	19.817	19.918	20.052	20.023	20.035	20.005	19.942	19.960	19.975	19.844	19.938	19.857	19.766	19.966	19.974	20.001	19.988	19.881	19.829	19.845	19.866	19.965	19.862	19.786	19.998	19.966
15	19.940	19.897	19.901	19.865	19.807	19.930	20.069	20.023	20.012	19.996	19.930	19.972	19.950	19.853	19.939	19.858	19.774	19.974	19.975	20.004	19.985	19.882	19.833	19.852	19.859	19.958	19.859	19.779	19.982	19.964
16	19.937	19.898	19.890	19.860	19.811	20.006	20.048	20.025	20.010	19.988	19.920	19.940	19.942	19.878	19.944	19.860	19.781	19.974	19.980	20.011	19.986	19.918	19.829	19.850	19.861	19.951	19.865	19.775	19.977	19.964
17	19.932	19.899	19.882	19.856	19.807	20.023	20.043	20.021	20.003	19.985	19.906	19.932	19.940	19.915	19.947	19.865	19.769	19.966	19.979	20.013	19.980	19.931	19.833	19.860	19.853	19.948	19.857	19.765	19.975	19.957
18	19.939	19.906	19.877	19.852	19.811	20.038	20.044	20.023	20.006	19.986	19.917	19.923	19.940	19.937	19.947	19.867	19.754	19.964	19.980	20.015	19.980	19.939	19.845	19.857	19.844	19.938	19.857	19.768	19.969	19.974
19	19.942	19.907	19.883	19.858	19.823	20.077	20.041	20.020	20.003	19.984	19.968	19.925	19.938	19.933	19.940	19.857	19.754	19.966	19.984	20.019	19.973	19.941	19.852	19.856	19.853	19.939	19.854	19.772	19.978	19.990
20	19.941	19.915	19.889	19.863	19.830	20.095	20.036	20.020	20.012	19.994	19.969	19.913	19.927	19.919	19.923	19.840	19.728	19.961	19.994	20.014	19.961	19.931	19.850	19.850	19.878	19.944	19.860	19.781	19.974	19.980
21	19.954	19.920	19.895	19.860	19.828	20.060	20.025	20.024	20.014	19.989	19.961	19.911	19.922	19.965	19.909	19.820	19.685	19.944	20.031	20.006	19.950	19.928	19.860	19.844	19.915	19.947	19.865	19.769	19.966	19.974
22	19.957	19.919	19.897	19.862	19.838	20.041	20.027	20.024	20.015	19.999	19.953	19.882	19.907	19.941	19.897	19.798	19.658	19.936	20.035	20.005	19.942	19.920	19.857	19.838	19.937	19.947	19.864	19.764	19.964	19.960
23	19.950	19.913	19.893	19.867	19.835	20.028	20.011	20.028	20.023	19.998	19.956	19.863	19.892	19.941	19.879	19.740	19.645	19.971	20.012	19.996	19.930	19.915	19.856	19.829	19.933	19.940	19.857	19.754	19.966	19.984
最高(m)	*19.982*	*19.947*	*19.921*	*19.911*	*19.871*	*20.095*	*20.069*	*20.065*	*20.035*	*20.021*	*19.999*	*19.972*	*19.975*	*19.965*	*20.036*	*19.883*	*19.786*	*20.031*	*20.035*	*20.023*	*19.999*	*19.969*	*19.916*	*19.860*	*19.937*	*20.036*	*19.923*	*19.840*	*20.031*	*20.003*
最低(m)	*19.932*	*19.897*	*19.877*	*19.852*	*19.807*	*19.786*	*20.011*	*19.982*	*19.964*	*19.984*	*19.906*	*19.827*	*19.851*	*19.844*	*19.879*	*19.740*	*19.645*	*19.936*	*19.964*	*19.996*	*19.930*	*19.881*	*19.829*	*19.829*	*19.833*	*19.900*	*19.854*	*19.712*	*19.645*	*19.936*
平均(m)	*19.958*	*19.918*	*19.900*	*19.880*	*19.837*	*19.908*	*20.032*	*20.025*	*19.997*	*20.002*	*19.966*	*19.910*	*19.923*	*19.887*	*19.938*	*19.854*	*19.744*	*19.984*	*19.987*	*20.009*	*19.981*	*19.926*	*19.863*	*19.842*	*19.878*	*19.945*	*19.871*	*19.764*	*19.938*	*19.976*

平均水位值： *#DIV/0!*　　*月最高水位值：* *20.095*　　*月最低水位值：* *19.645*

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-72　101 年 6 月 GM9 地下水位逐時記錄表

地面標高：16.71公尺　井頂標高：17.21公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	14.429	14.121	14.041	14.015	13.862	13.874	13.791	13.776	13.758	13.711	13.697	13.714	13.711	13.740	13.674	13.691	13.692	13.656	13.637	13.629	13.632	13.614	13.591	13.537	15.467	14.050	13.814	13.772	13.774	13.747
1	14.409	14.110	14.040	14.006	14.020	13.866	13.784	13.770	13.749	13.700	13.694	13.708	13.707	13.730	13.667	13.686	13.690	13.650	13.630	13.630	13.625	13.615	13.585	13.530	15.528	14.020	13.808	13.762	13.765	13.741
2	14.386	14.097	14.037	13.998	13.669	13.855	13.779	13.766	13.743	13.698	13.688	13.700	13.700	13.721	13.672	13.680	13.680	13.652	13.630	13.620	13.627	13.609	13.579	13.523	15.508	13.990	13.796	13.762	13.760	13.737
3	14.369	14.086	14.032	13.996	13.867	13.848	13.779	13.764	13.737	13.696	13.683	13.702	13.703	13.710	13.671	13.685	13.678	13.650	13.631	13.617	13.632	13.606	13.575	13.514	15.427	13.965	13.790	13.762	13.758	13.736
4	14.351	14.080	14.032	13.996	13.906	13.834	13.773	13.762	13.727	13.692	13.683	13.701	13.702	13.706	13.665	13.673	13.674	13.649	13.635	13.617	13.621	13.607	13.572	13.511	15.313	13.944	13.786	13.769	13.761	13.733
5	14.335	14.074	14.030	13.996	13.926	13.831	13.772	13.766	13.727	13.698	13.686	13.705	13.701	13.703	13.671	13.672	13.669	13.648	13.639	13.618	13.626	13.607	13.576	13.506	15.192	13.933	13.791	13.767	13.760	13.733
6	14.321	14.068	14.034	13.997	13.936	13.833	13.775	13.763	13.732	13.707	13.694	13.713	13.708	13.706	13.667	13.673	13.676	13.657	13.640	13.614	13.631	13.611	13.575	13.510	15.102	13.920	13.786	13.767	13.760	13.733
7	14.310	14.068	14.037	14.003	13.941	13.836	13.781	13.764	13.739	13.712	13.697	13.722	13.719	13.705	13.672	13.671	13.687	13.655	13.644	13.617	13.640	13.616	13.584	13.516	15.033	13.913	13.789	13.770	13.763	13.739
8	14.298	14.063	14.037	14.005	13.943	13.841	13.786	13.773	13.739	13.719	13.705	13.724	13.730	13.706	13.677	13.671	13.695	13.662	13.649	13.626	13.643	13.619	13.587	13.515	14.971	13.909	13.794	13.775	13.767	13.743
9	14.285	14.060	14.039	14.006	13.944	13.836	13.788	13.772	13.744	13.722	13.712	13.729	13.735	13.707	13.677	13.683	13.699	13.664	13.646	13.631	13.649	13.624	13.586	13.514	14.882	13.902	13.796	13.779	13.773	13.746
10	14.270	13.996	14.042	14.003	13.942	13.838	13.795	13.776	13.747	13.721	13.710	13.732	13.745	13.706	13.683	13.691	13.701	13.661	13.639	13.633	13.648	13.623	13.590	13.512	14.800	13.898	13.798	13.785	13.776	13.752
11	14.255	13.894	14.042	14.003	13.939	13.829	13.796	13.774	13.745	13.719	13.709	13.732	13.747	13.699	13.682	13.694	13.699	13.660	13.637	13.632	13.651	13.614	13.589	13.506	14.727	13.889	13.796	13.785	13.775	13.749
12	14.238	13.922	14.037	13.999	13.926	13.824	13.790	13.768	13.736	13.708	13.712	13.731	13.747	13.683	13.683	13.687	13.694	13.659	13.634	13.624	13.643	13.613	13.583	13.500	14.647	13.877	13.793	13.779	13.770	13.730
13	14.220	13.997	14.025	13.996	13.918	13.822	13.789	13.767	13.728	13.697	13.707	13.722	13.750	13.683	13.682	13.690	13.687	13.653	13.632	13.625	13.638	13.608	13.579	13.493	14.576	13.863	13.789	13.777	13.763	13.735
14	14.201	14.046	14.022	13.995	13.916	13.820	13.782	13.764	13.723	13.695	13.715	13.725	13.746	13.683	13.678	13.686	13.682	13.649	13.628	13.620	13.635	13.606	13.571	13.493	14.505	13.854	13.786	13.773	13.760	13.740
15	14.186	14.044	14.023	13.993	13.906	13.818	13.779	13.764	13.727	13.694	13.713	13.731	13.747	13.686	13.674	13.687	13.673	13.645	13.628	13.623	13.628	13.604	13.566	13.497	14.447	13.853	13.784	13.769	13.759	13.743
16	14.171	14.043	14.021	13.993	13.905	13.817	13.778	13.768	13.724	13.698	13.715	13.732	13.747	13.690	13.674	13.688	13.672	13.646	13.634	13.624	13.622	13.601	13.561	13.514	14.389	13.844	13.782	13.769	13.756	13.743
17	14.159	14.045	14.024	13.990	13.904	13.813	13.780	13.772	13.729	13.706	13.717	13.731	13.753	13.691	13.680	13.691	13.675	13.646	13.635	13.628	13.628	13.597	13.565	13.532	14.334	13.841	13.782	13.771	13.755	13.741
18	14.153	14.048	14.023	13.997	13.902	13.812	13.786	13.772	13.725	13.707	13.725	13.731	13.755	13.693	13.685	13.696	13.678	13.649	13.641	13.620	13.626	13.598	13.563	13.632	14.289	13.838	13.783	13.771	13.756	13.736
19	14.152	14.054	14.027	14.005	13.908	13.817	13.790	13.776	13.730	13.709	13.729	13.732	13.755	13.694	13.691	13.696	13.677	13.651	13.645	13.630	13.626	13.596	13.559	13.779	14.250	13.838	13.786	13.775	13.761	13.730
20	14.146	14.053	14.025	14.005	13.900	13.816	13.788	13.773	13.725	13.709	13.734	13.734	13.757	13.689	13.691	13.694	13.675	13.648	13.642	13.631	13.630	13.596	13.566	14.086	14.206	13.838	13.782	13.776	13.761	13.725
21	14.144	14.052	14.029	14.002	13.893	13.811	13.791	13.774	13.722	13.704	13.730	13.733	13.756	13.686	13.692	13.693	13.668	13.644	13.633	13.633	13.626	13.599	13.556	14.480	14.162	13.833	13.781	13.780	13.759	13.720
22	14.140	14.049	14.027	14.003	13.888	13.802	13.787	13.768	13.720	13.703	13.728	13.726	13.750	13.684	13.696	13.693	13.661	13.641	13.636	13.636	13.624	13.595	13.546	14.928	14.122	13.833	13.781	13.778	13.757	13.714
23	14.132	14.048	14.022	14.001	13.882	13.797	13.782	13.764	13.716	13.697	13.721	13.719	13.747	13.681	13.694	13.695	13.662	13.639	13.634	13.638	13.621	13.596	13.532	15.249	14.086	13.823	13.778	13.778	13.754	13.710
最高(m)	14.429	14.121	14.042	14.015	14.020	13.874	13.796	13.776	13.758	13.722	13.734	13.734	13.757	13.740	13.696	13.696	13.701	13.664	13.649	13.638	13.651	13.624	13.591	15.249	15.528	14.050	13.814	13.785	13.776	13.752
最低(m)	14.132	13.894	14.021	13.990	13.669	13.797	13.772	13.762	13.716	13.692	13.683	13.700	13.700	13.681	13.665	13.671	13.661	13.639	13.628	13.614	13.621	13.595	13.532	13.493	14.086	13.823	13.778	13.762	13.754	13.710
平均(m)	14.253	14.047	14.031	14.000	13.906	13.829	13.784	13.769	13.733	13.705	13.709	13.722	13.734	13.699	13.679	13.686	13.681	13.651	13.637	13.626	13.632	13.607	13.572	13.724	14.748	13.895	13.790	13.773	13.763	13.736

平均水位值：　13.804　　月最高水位值：　15.528　　月最低水位值：　13.493

附錄 IV.6-73　101 年 6 月 GM11 地下水位逐時記錄表

地面標高：42.30公尺　井頂標高：42.89公尺　　單位：公尺

日期 / 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	31.322	30.606	30.185	29.930	29.746	29.630	29.512	29.043	29.008	28.964	28.921	28.883	28.851	28.810	28.779	28.747	28.699	28.647	28.595	28.570	28.568	28.552	28.526	28.503	28.480	28.460	28.443	28.417	28.385	28.350
1	31.286	30.582	30.174	29.915	29.741	29.629	29.508	29.042	29.006	28.963	28.921	28.886	28.849	28.812	28.778	28.749	28.696	28.646	28.594	28.565	28.564	28.552	28.530	28.504	28.483	28.462	28.439	28.410	28.378	28.349
2	31.249	30.547	30.154	29.905	29.727	29.622	29.502	29.038	29.003	28.957	28.916	28.880	28.851	28.811	28.778	28.746	28.694	28.643	28.592	28.564	28.563	28.547	28.525	28.502	28.477	28.455	28.439	28.409	28.382	28.344
3	31.213	30.529	30.140	29.896	29.724	29.612	29.492	29.039	29.002	28.957	28.918	28.882	28.846	28.808	28.777	28.744	28.691	28.638	28.588	28.566	28.563	28.548	28.522	28.502	28.473	28.457	28.436	28.407	28.377	28.346
4	31.176	30.506	30.120	29.889	29.719	29.611	29.490	29.038	29.005	28.953	28.911	28.878	28.841	28.809	28.772	28.745	28.689	28.638	28.593	28.563	28.561	28.546	28.524	28.498	28.474	28.452	28.435	28.403	28.375	28.341
5	31.145	30.478	30.110	29.883	29.717	29.603	29.489	29.036	28.996	28.956	28.913	28.875	28.841	28.807	28.773	28.738	28.683	28.636	28.587	28.565	28.561	28.543	28.523	28.499	28.470	28.453	28.433	28.400	28.373	28.336
6	31.111	30.466	30.101	29.871	29.715	29.604	29.480	29.037	28.991	28.948	28.910	28.879	28.840	28.802	28.771	28.736	28.684	28.632	28.583	28.560	28.560	28.543	28.520	28.501	28.471	28.451	28.438	28.397	28.365	28.335
7	31.079	30.448	30.097	29.868	29.708	29.591	29.474	29.034	28.994	28.947	28.909	28.879	28.836	28.804	28.770	28.737	28.681	28.633	28.582	28.563	28.560	28.543	28.523	28.493	28.472	28.455	28.437	28.399	28.370	28.334
8	31.051	30.434	30.085	29.859	29.706	29.592	29.475	29.031	28.995	28.948	28.910	28.877	28.837	28.799	28.766	28.732	28.681	28.630	28.582	28.567	28.561	28.544	28.523	28.496	28.475	28.454	28.430	28.401	28.367	28.336
9	31.020	30.416	30.070	29.850	29.697	29.582	29.465	29.033	28.995	28.944	28.907	28.871	28.835	28.800	28.769	28.734	28.678	28.632	28.583	28.567	28.561	28.543	28.522	28.496	28.473	28.454	28.431	28.397	28.365	28.333
10	30.985	30.402	30.061	29.845	29.697	29.579	29.327	29.032	28.992	28.945	28.907	28.869	28.837	28.802	28.767	28.723	28.676	28.628	28.579	28.572	28.560	28.543	28.520	28.498	28.475	28.458	28.436	28.398	28.362	28.331
11	30.961	30.383	30.051	29.835	29.696	29.576	29.226	29.030	28.992	28.941	28.906	28.872	28.833	28.798	28.761	28.727	28.674	28.626	28.579	28.567	28.561	28.544	28.520	28.494	28.470	28.459	28.436	28.400	28.364	28.332
12	30.933	30.362	30.039	29.826	29.689	29.568	29.109	29.028	28.986	28.940	28.904	28.868	28.832	28.796	28.764	28.724	28.671	28.620	28.577	28.569	28.559	28.537	28.514	28.491	28.473	28.454	28.434	28.395	28.362	28.326
13	30.894	30.346	30.030	29.822	29.681	29.558	29.023	29.025	28.987	28.937	28.904	28.868	28.832	28.792	28.763	28.721	28.670	28.617	28.577	28.565	28.556	28.541	28.515	28.491	28.471	28.457	28.426	28.396	28.361	28.326
14	30.862	30.331	30.016	29.812	29.675	29.555	29.039	29.020	28.982	28.938	28.902	28.866	28.826	28.790	28.758	28.721	28.667	28.617	28.571	28.565	28.562	28.538	28.516	28.490	28.466	28.454	28.423	28.389	28.356	28.322
15	30.838	30.312	30.003	29.800	29.673	29.552	29.039	29.018	28.976	28.933	28.899	28.866	28.823	28.791	28.760	28.719	28.663	28.613	28.568	28.565	28.551	28.536	28.514	28.488	28.463	28.453	28.421	28.389	28.352	28.319
16	30.810	30.297	29.994	29.785	29.665	29.549	29.044	29.019	28.979	28.932	28.896	28.864	28.826	28.789	28.758	28.716	28.662	28.615	28.570	28.566	28.557	28.536	28.510	28.483	28.465	28.446	28.414	28.388	28.355	28.317
17	30.775	30.284	29.985	29.785	29.657	29.538	29.041	29.015	28.971	28.926	28.894	28.861	28.821	28.787	28.755	28.712	28.659	28.611	28.569	28.563	28.557	28.531	28.509	28.481	28.461	28.447	28.417	28.385	28.349	28.315
18	30.751	30.272	29.974	29.777	29.658	29.539	29.041	29.013	28.971	28.928	28.893	28.857	28.819	28.784	28.752	28.709	28.656	28.606	28.566	28.567	28.555	28.531	28.508	28.481	28.461	28.446	28.413	28.384	28.346	28.312
19	30.731	30.259	29.969	29.772	29.654	29.531	29.039	29.014	28.971	28.928	28.895	28.856	28.821	28.784	28.751	28.710	28.649	28.600	28.566	28.566	28.556	28.533	28.507	28.481	28.457	28.446	28.413	28.381	28.345	28.313
20	30.701	30.249	29.959	29.772	29.648	29.535	29.040	29.015	28.969	28.924	28.889	28.856	28.819	28.783	28.752	28.706	28.652	28.604	28.565	28.564	28.556	28.528	28.508	28.478	28.464	28.445	28.412	28.388	28.348	28.314
21	30.683	30.232	29.953	29.768	29.646	29.525	29.041	29.013	28.968	28.923	28.890	28.857	28.817	28.783	28.752	28.704	28.652	28.604	28.568	28.561	28.556	28.529	28.507	28.481	28.460	28.446	28.414	28.386	28.350	28.316
22	30.657	30.222	29.943	29.756	29.644	29.530	29.041	29.008	28.966	28.922	28.890	28.853	28.820	28.780	28.755	28.703	28.651	28.601	28.568	28.562	28.552	28.533	28.506	28.483	28.464	28.442	28.414	28.384	28.350	28.308
23	30.632	30.207	29.938	29.750	29.636	29.517	29.040	29.007	28.966	28.923	28.889	28.854	28.815	28.777	28.751	28.703	28.648	28.598	28.569	28.570	28.552	28.529	28.506	28.480	28.463	28.442	28.414	28.381	28.350	28.316
最高(m)	31.322	30.606	30.185	29.930	29.746	29.630	29.512	29.043	29.008	28.964	28.921	28.886	28.851	28.812	28.779	28.749	28.699	28.647	28.595	28.572	28.568	28.552	28.530	28.504	28.483	28.462	28.443	28.417	28.385	28.350
最低(m)	30.632	30.207	29.938	29.750	29.636	29.517	29.023	29.007	28.966	28.922	28.889	28.853	28.815	28.777	28.751	28.703	28.648	28.598	28.565	28.560	28.551	28.528	28.506	28.478	28.457	28.442	28.412	28.381	28.348	28.308
平均(m)	30.953	30.382	30.048	29.832	29.688	29.572	29.249	29.026	28.986	28.941	28.904	28.869	28.832	28.796	28.764	28.725	28.672	28.622	28.578	28.566	28.559	28.540	28.517	28.491	28.469	28.452	28.427	28.395	28.362	28.328

平均水位值：　28.951　　月最高水位值：　31.322　　月最低水位值：　28.308

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-74　101 年 6 月 GM12 地下水位逐時記錄表

地面標高：43.56公尺　井頂標高：44.00公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	37.513	36.107	35.221	34.636	34.197	33.853	33.699	33.546	33.411	33.288	33.183	33.086	39.429	37.842	37.011	36.388	35.653	34.971	34.451	34.115	33.797	33.680	33.615	33.560	33.493	33.409	33.326	33.255	33.156	33.097
1	37.467	36.063	35.193	34.612	34.175	33.842	33.693	33.537	33.408	33.280	33.173	33.097	39.425	37.760	37.015	36.353	35.627	34.942	34.438	34.097	33.787	33.674	33.612	33.558	33.481	33.401	33.325	33.253	33.149	33.099
2	37.423	36.017	35.171	34.596	34.159	33.820	33.693	33.532	33.405	33.281	33.167	33.087	39.455	37.693	37.013	36.309	35.596	34.921	34.416	34.087	33.779	33.670	33.606	33.546	33.486	33.399	33.319	33.252	33.140	33.093
3	37.372	35.964	35.135	34.572	34.141	33.813	33.681	33.528	33.397	33.269	33.163	33.088	39.481	37.631	37.006	36.273	35.563	34.891	34.396	34.070	33.769	33.663	33.600	33.545	33.477	33.390	33.319	33.245	33.134	33.095
4	37.324	35.929	35.107	34.548	34.132	33.788	33.676	33.521	33.389	33.268	33.154	33.095	39.474	37.582	37.006	36.253	35.522	34.860	34.374	34.054	33.766	33.659	33.603	33.536	33.472	33.382	33.305	33.239	33.130	33.087
5	37.265	35.895	35.081	34.528	34.117	33.773	33.661	33.508	33.384	33.262	33.147	33.099	39.437	37.522	37.001	36.222	35.489	34.838	34.360	34.046	33.761	33.656	33.592	33.536	33.473	33.380	33.308	33.237	33.124	33.090
6	37.217	35.852	35.052	34.507	34.105	33.763	33.659	33.508	33.375	33.268	33.141	33.114	39.365	37.480	36.991	36.188	35.460	34.817	34.345	34.036	33.757	33.654	33.595	33.541	33.473	33.380	33.302	33.236	33.119	33.095
7	37.163	35.819	35.025	34.491	34.092	33.745	33.656	33.496	33.376	33.262	33.148	33.137	39.293	37.437	36.962	36.150	35.430	34.795	34.330	34.018	33.755	33.650	33.599	33.542	33.475	33.382	33.307	33.231	33.123	33.095
8	37.098	35.787	35.005	34.471	34.081	33.731	33.651	33.489	33.381	33.254	33.144	33.196	39.208	37.385	36.941	36.133	35.398	34.771	34.325	34.004	33.751	33.649	33.592	33.537	33.470	33.374	33.308	33.231	33.124	33.082
9	37.012	35.741	34.973	34.450	34.067	33.720	33.641	33.485	33.372	33.263	33.136	33.363	39.120	37.335	36.921	36.113	35.377	34.752	34.310	33.992	33.749	33.647	33.592	33.534	33.467	33.374	33.304	33.231	33.122	33.090
10	36.945	35.705	34.955	34.431	34.056	33.704	33.635	33.478	33.368	33.258	33.132	34.336	39.028	37.285	36.904	36.085	35.340	34.733	34.296	33.975	33.742	33.646	33.585	33.531	33.462	33.369	33.300	33.225	33.111	33.085
11	36.867	35.660	34.935	34.413	34.039	33.695	33.631	33.477	33.364	33.250	33.128	35.906	38.927	37.226	36.875	36.058	35.308	34.713	34.276	33.957	33.742	33.641	33.584	33.534	33.459	33.363	33.301	33.218	33.124	33.084
12	36.789	35.626	34.910	34.394	34.024	33.681	33.627	33.469	33.356	33.239	33.126	37.534	38.835	37.168	36.848	36.018	35.286	34.694	34.269	33.949	33.733	33.645	33.588	33.532	33.454	33.356	33.291	33.214	33.115	33.088
13	36.708	35.587	34.891	34.373	34.010	33.619	33.625	33.465	33.351	33.239	33.111	38.961	38.744	37.112	36.808	35.996	35.263	34.668	34.255	33.927	33.725	33.641	33.579	33.524	33.446	33.351	33.290	33.210	33.108	33.081
14	36.645	35.546	34.861	34.348	33.997	33.512	33.614	33.456	33.347	33.229	33.109	39.430	38.650	37.045	36.756	35.964	35.236	34.646	34.239	33.915	33.725	33.635	33.575	33.519	33.440	33.352	33.280	33.199	33.109	33.077
15	36.595	35.514	34.831	34.337	33.988	33.448	33.608	33.448	33.335	33.223	33.114	39.507	38.562	37.009	36.714	35.934	35.202	34.628	34.221	33.897	33.714	33.632	33.570	33.517	33.438	33.343	33.276	33.192	33.105	33.065
16	36.521	35.467	34.806	34.319	33.971	33.484	33.597	33.439	33.327	33.219	33.107	39.536	38.474	36.997	36.675	35.901	35.175	34.599	34.206	33.880	33.712	33.629	33.573	33.517	33.433	33.348	33.273	33.190	33.100	33.072
17	36.464	35.433	34.787	34.303	33.948	33.549	33.590	33.439	33.320	33.211	33.097	39.550	38.385	36.981	36.641	35.874	35.152	34.578	34.196	33.869	33.707	33.626	33.568	33.517	33.426	33.336	33.272	33.176	33.100	33.072
18	36.404	35.398	34.764	34.282	33.939	33.625	33.578	33.431	33.317	33.208	33.101	39.563	38.303	36.971	36.612	35.841	35.129	34.556	34.181	33.855	33.706	33.623	33.563	33.513	33.417	33.342	33.264	33.177	33.100	33.067
19	36.348	35.360	34.742	34.275	33.926	33.656	33.570	33.429	33.310	33.205	33.092	39.562	38.209	36.977	36.574	35.803	35.090	34.542	34.165	33.844	33.696	33.624	33.566	33.512	33.419	33.336	33.266	33.170	33.094	33.064
20	36.294	35.340	34.724	34.259	33.911	33.683	33.569	33.424	33.307	33.204	33.097	39.558	38.129	36.977	36.541	35.777	35.076	34.523	34.151	33.826	33.698	33.622	33.564	33.511	33.418	33.337	33.265	33.169	33.093	33.066
21	36.244	35.310	34.702	34.242	33.902	33.690	33.566	33.426	33.311	33.194	33.094	39.546	38.057	36.988	36.505	35.747	35.052	34.503	34.146	33.817	33.685	33.621	33.569	33.507	33.418	33.337	33.265	33.162	33.094	33.068
22	36.198	35.280	34.687	34.220	33.893	33.705	33.559	33.417	33.304	33.193	33.094	39.505	37.985	36.994	36.471	35.714	35.026	34.487	34.139	33.812	33.686	33.620	33.569	33.496	33.419	33.333	33.261	33.165	33.096	33.072
23	36.147	35.258	34.662	34.215	33.872	33.701	33.553	33.419	33.302	33.189	33.094	39.473	37.905	37.005	36.433	35.678	34.998	34.467	34.122	33.804	33.682	33.619	33.561	33.499	33.410	33.332	33.258	33.159	33.099	33.073
最高(m)	37.513	36.107	35.221	34.636	34.197	33.853	33.699	33.546	33.411	33.288	33.183	39.563	39.481	37.842	37.015	36.388	35.653	34.971	34.451	34.115	33.797	33.680	33.615	33.560	33.493	33.409	33.326	33.255	33.156	33.099
最低(m)	36.147	35.258	34.662	34.215	33.872	33.448	33.553	33.417	33.302	33.189	33.092	33.086	37.905	36.971	36.433	35.678	34.998	34.467	34.122	33.804	33.682	33.619	33.561	33.496	33.410	33.332	33.258	33.159	33.093	33.064
平均(m)	36.834	35.652	34.926	34.409	34.031	33.692	33.626	33.474	33.355	33.240	33.127	36.389	38.628	37.267	36.801	36.032	35.310	34.704	34.275	33.952	33.734	33.643	33.584	33.528	33.451	33.363	33.291	33.210	33.115	33.082

平均水位值：　34.464　　月最高水位值：　39.563　　月最低水位值：　33.064

附錄 IV.6-75　101 年 6 月 GM13 地下水位逐時記錄表

地面標高：55.25公尺　井頂標高：55.77公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	46.956	45.395	44.329	43.746	42.988	42.247	41.791	41.411	41.103	40.743	40.734	40.692	40.646	40.590	40.554	40.541	40.473	40.424	40.344	40.273	40.214	40.154	40.069	39.995	39.861	43.399	44.203	43.570	42.958	42.432
1	46.902	45.324	44.299	43.720	42.941	42.221	41.766	41.396	41.091	40.741	40.723	40.689	40.640	40.584	40.555	40.536	40.467	40.413	40.332	40.265	40.208	40.140	40.064	39.981	39.860	43.637	44.177	43.542	42.935	42.405
2	46.845	45.266	44.272	43.695	42.899	42.199	41.746	41.382	41.077	40.741	40.715	40.695	40.634	40.580	40.556	40.529	40.466	40.401	40.326	40.258	40.200	40.141	40.055	39.970	39.846	43.847	44.152	43.515	42.905	42.379
3	46.790	45.220	44.258	43.679	42.862	42.182	41.722	41.373	41.062	40.744	40.715	40.694	40.636	40.575	40.562	40.521	40.458	40.400	40.324	40.258	40.197	40.133	40.054	39.967	39.854	44.010	44.129	43.486	42.882	42.362
4	46.727	45.163	44.242	43.651	42.827	42.166	41.712	41.349	41.052	40.747	40.722	40.690	40.635	40.574	40.567	40.521	40.462	40.392	40.319	40.259	40.196	40.128	40.051	39.963	39.864	44.117	44.102	43.456	42.861	42.342
5	46.687	45.106	44.221	43.621	42.794	42.148	41.693	41.340	41.041	40.749	40.727	40.686	40.633	40.570	40.571	40.521	40.461	40.395	40.320	40.265	40.195	40.132	40.047	39.963	39.863	44.193	44.091	43.428	42.847	42.326
6	46.631	45.067	44.196	43.604	42.756	42.129	41.685	41.319	41.037	40.750	40.726	40.686	40.632	40.571	40.567	40.523	40.464	40.395	40.319	40.258	40.187	40.131	40.045	39.964	39.874	44.254	44.075	43.397	42.823	42.311
7	46.575	45.009	44.161	43.580	42.721	42.108	41.675	41.307	41.029	40.753	40.724	40.686	40.632	40.573	40.569	40.525	40.467	40.396	40.320	40.260	40.199	40.126	40.047	39.960	39.880	44.290	44.062	43.368	42.809	42.293
8	46.501	44.958	44.128	43.552	42.685	42.092	41.658	41.294	41.023	40.756	40.725	40.686	40.627	40.577	40.565	40.522	40.465	40.395	40.318	40.261	40.194	40.133	40.046	39.960	39.881	44.326	44.038	43.338	42.784	42.278
9	46.426	44.916	44.103	43.531	42.646	42.070	41.645	41.282	41.009	40.753	40.723	40.679	40.626	40.574	40.570	40.516	40.461	40.389	40.316	40.260	40.193	40.128	40.048	39.948	39.893	44.343	44.017	43.315	42.769	42.254
10	46.348	44.862	44.078	43.501	42.617	42.050	41.631	41.272	40.936	40.752	40.715	40.678	40.623	40.574	40.565	40.515	40.460	40.382	40.307	40.249	40.192	40.130	40.043	39.942	39.898	44.352	43.984	43.285	42.745	42.237
11	46.276	44.819	44.058	43.462	42.586	42.028	41.609	41.257	40.833	40.758	40.713	40.674	40.618	40.571	40.558	40.511	40.456	40.379	40.310	40.253	40.186	40.122	40.047	39.931	39.914	44.363	43.949	43.256	42.724	42.217
12	46.185	44.773	44.032	43.431	42.555	42.009	41.591	41.242	40.751	40.759	40.710	40.669	40.614	40.573	40.557	40.503	40.456	40.373	40.300	40.243	40.181	40.116	40.043	39.927	39.927	44.356	43.898	43.194	42.688	42.197
13	46.115	44.727	44.008	43.402	42.520	41.984	41.569	41.228	40.662	40.748	40.708	40.666	40.610	40.568	40.554	40.498	40.449	40.367	40.295	40.240	40.174	40.094	40.036	39.922	39.963	44.354	43.898	43.194	42.688	42.197
14	46.039	44.686	43.993	43.372	42.483	41.962	41.555	41.212	40.664	40.747	40.704	40.655	40.606	40.560	40.559	40.485	40.441	40.362	40.295	40.231	40.166	40.089	40.028	39.914	40.009	44.348	43.864	43.164	42.667	42.161
15	45.963	44.645	43.975	43.339	42.455	41.946	41.534	41.198	40.673	40.747	40.696	40.659	40.605	40.556	40.554	40.483	40.434	40.371	40.292	40.227	40.164	40.079	40.024	39.904	40.141	44.339	43.839	43.139	42.645	42.145
16	45.894	44.609	43.950	43.316	42.431	41.924	41.521	41.189	40.676	40.745	40.693	40.658	40.601	40.558	40.550	40.481	40.431	40.360	40.296	40.226	40.156	40.081	40.022	39.898	40.327	44.330	43.805	43.105	42.623	42.126
17	45.829	44.571	43.933	43.296	42.408	41.908	41.504	41.181	40.672	40.742	40.693	40.651	40.597	40.559	40.544	40.473	40.422	40.354	40.297	40.225	40.157	40.083	40.018	39.886	40.599	44.326	43.777	43.108	42.598	42.109
18	45.774	44.538	43.914	43.266	42.387	41.893	41.495	41.164	40.685	40.751	40.698	40.657	40.597	40.563	40.546	40.469	40.427	40.359	40.297	40.222	40.158	40.083	40.016	39.887	40.956	44.308	43.747	43.084	42.573	42.095
19	45.708	44.516	43.892	43.219	42.368	41.897	41.485	41.154	40.705	40.754	40.699	40.661	40.604	40.564	40.547	40.473	40.432	40.357	40.293	40.225	40.169	40.081	40.016	39.889	41.391	44.299	43.726	43.070	42.552	42.075
20	45.649	44.482	43.865	43.173	42.341	41.899	41.475	41.147	40.717	40.758	40.697	40.662	40.602	40.567	40.548	40.470	40.439	40.362	40.292	40.226	40.170	40.080	40.017	39.889	41.867	44.282	43.696	43.043	42.531	42.058
21	45.600	44.448	43.835	43.128	42.322	41.880	41.454	41.139	40.727	40.755	40.698	40.657	40.605	40.566	40.547	40.473	40.436	40.359	40.286	40.225	40.167	40.081	40.010	39.879	42.347	44.273	43.670	43.026	42.507	42.046
22	45.534	44.411	43.802	43.079	42.298	41.850	41.439	41.126	40.735	40.750	40.696	40.659	40.601	40.565	40.545	40.472	40.436	40.355	40.280	40.222	40.171	40.077	40.006	39.868	42.768	44.254	43.648	43.000	42.492	42.028
23	45.463	44.364	43.775	43.035	42.271	41.822	41.423	41.116	40.744	40.744	40.694	40.651	40.594	40.562	40.544	40.476	40.431	40.351	40.272	40.218	40.168	40.063	40.003	39.869	43.099	44.233	43.607	42.981	42.460	42.005
最高(m)	46.956	45.395	44.329	43.746	42.988	42.247	41.791	41.411	41.103	40.759	40.734	40.695	40.646	40.590	40.571	40.541	40.473	40.424	40.344	40.273	40.214	40.154	40.069	39.995	43.099	44.363	44.203	43.570	42.958	42.432
最低(m)	45.463	44.364	43.775	43.035	42.271	41.822	41.423	41.116	40.662	40.741	40.693	40.651	40.594	40.556	40.544	40.469	40.422	40.351	40.272	40.218	40.156	40.063	40.003	39.868	39.846	43.399	43.607	42.981	42.460	42.005
平均(m)	46.226	44.828	44.055	43.433	42.590	42.026	41.599	41.258	40.863	40.749	40.710	40.673	40.617	40.570	40.556	40.502	40.450	40.379	40.306	40.244	40.182	40.109	40.036	39.928	40.495	44.201	43.924	43.256	42.712	42.211

平均水位值：　41.656　　月最高水位值：　46.956　　月最低水位值：　39.846

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-76　101 年 6 月 GM7 地下水位逐時記錄表

地面標高：19.49公尺　井頂標高：19.96公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	12.019	11.816	11.589	11.459	11.393	11.331	10.645	10.401	10.317	10.372	10.480	10.535	10.507	10.400	10.402	10.491	10.400	10.327	10.257	10.209	10.183	10.199	10.303	10.203	10.181	10.210	10.301	10.456	10.552	10.564
1	12.013	11.818	11.591	11.439	11.381	11.273	10.643	10.396	10.314	10.369	10.483	10.538	10.504	10.390	10.408	10.491	10.397	10.323	10.252	10.202	10.178	10.200	10.295	10.194	10.175	10.205	10.311	10.461	10.553	10.561
2	12.002	11.815	11.575	11.438	11.382	10.248	10.642	10.386	10.306	10.373	10.484	10.535	10.498	10.379	10.410	10.485	10.393	10.319	10.245	10.200	10.177	10.205	10.290	10.189	10.173	10.199	10.306	10.461	10.553	10.561
3	12.003	11.813	11.577	11.443	11.383	11.226	10.642	10.347	10.300	10.374	10.487	10.530	10.495	10.369	10.412	10.486	10.396	10.321	10.240	10.198	10.173	10.210	10.289	10.188	10.173	10.197	10.314	10.473	10.549	10.555
4	11.995	11.806	11.573	11.434	11.388	11.129	10.637	10.344	10.296	10.379	10.493	10.532	10.490	10.359	10.411	10.479	10.391	10.313	10.244	10.205	10.178	10.215	10.284	10.189	10.168	10.196	10.319	10.476	10.548	10.554
5	11.984	11.801	11.574	11.433	11.397	11.025	10.635	10.336	10.299	10.383	10.500	10.533	10.486	10.350	10.412	10.479	10.388	10.309	10.241	10.203	10.178	10.222	10.294	10.188	10.173	10.197	10.324	10.486	10.553	10.552
6	11.977	11.797	11.558	11.433	11.396	10.958	10.636	10.334	10.300	10.390	10.513	10.537	10.490	10.348	10.418	10.479	10.389	10.307	10.243	10.205	10.188	10.233	10.297	10.192	10.179	10.205	10.331	10.496	10.553	10.556
7	11.972	11.794	11.549	11.429	11.400	10.852	10.633	10.333	10.304	10.394	10.524	10.540	10.492	10.345	10.423	10.482	10.388	10.303	10.245	10.208	10.190	10.244	10.300	10.190	10.181	10.209	10.345	10.502	10.559	10.554
8	11.966	11.791	11.546	11.440	11.392	10.836	10.631	10.330	10.303	10.400	10.536	10.546	10.491	10.340	10.428	10.480	10.387	10.304	10.240	10.210	10.187	10.250	10.301	10.194	10.188	10.213	10.355	10.513	10.565	10.558
9	11.958	11.785	11.544	11.431	11.390	10.831	16.626	10.219	10.302	10.414	10.547	10.548	10.489	10.340	10.429	10.453	10.388	10.299	10.236	10.206	10.190	10.252	10.299	10.189	10.189	10.214	10.370	10.518	10.567	10.560
10	11.941	11.776	11.540	11.431	11.388	10.826	10.623	10.112	10.304	10.418	10.553	10.549	10.488	10.331	10.439	10.452	10.381	10.289	10.237	10.199	10.187	10.254	10.290	10.190	10.189	10.218	10.380	10.520	10.572	10.554
11	11.936	11.771	11.537	11.431	11.383	10.824	10.621	10.010	10.299	10.421	10.553	10.543	10.483	10.327	10.438	10.449	10.384	10.293	10.232	10.190	10.181	10.253	10.277	10.190	10.186	10.217	10.390	10.523	10.566	10.551
12	12.021	11.766	11.533	11.431	11.381	10.823	10.621	9.889	10.288	10.416	10.558	10.537	10.469	10.327	10.440	10.442	10.376	10.281	10.225	10.188	10.168	10.253	10.262	10.182	10.187	10.223	10.394	10.526	10.566	10.550
13	11.936	11.767	11.525	11.423	11.383	10.820	10.613	10.029	10.288	10.411	10.557	10.528	10.466	10.312	10.448	10.436	10.373	10.283	10.221	10.179	10.163	10.253	10.251	10.173	10.184	10.224	10.395	10.525	10.565	10.545
14	11.929	11.748	11.514	11.411	11.371	10.816	10.607	10.217	10.280	10.410	10.550	10.518	10.452	10.317	10.449	10.428	10.368	10.282	10.222	10.174	10.158	10.250	10.241	10.164	10.180	10.226	10.399	10.521	10.563	10.542
15	11.915	11.719	11.511	11.415	11.375	10.802	10.598	10.296	10.278	10.405	10.524	10.513	10.441	10.317	10.458	10.423	10.364	10.279	10.218	10.171	10.157	10.254	10.231	10.157	10.176	10.229	10.391	10.522	10.565	10.540
16	11.909	11.684	11.509	11.412	11.385	10.797	10.578	10.313	10.282	10.410	10.515	10.507	10.433	10.330	10.462	10.422	10.361	10.282	10.216	10.176	10.161	10.260	10.227	10.155	10.179	10.238	10.396	10.527	10.574	10.537
17	11.901	11.674	11.506	11.399	11.375	10.794	10.564	10.309	10.292	10.417	10.510	10.507	10.426	10.334	10.468	10.416	10.362	10.286	10.219	10.182	10.165	10.268	10.221	10.156	10.180	10.244	10.401	10.527	10.564	10.531
18	11.894	11.666	11.510	11.404	11.377	10.796	10.549	10.310	10.304	10.427	10.515	10.511	10.422	10.342	10.474	10.414	10.356	10.287	10.219	10.184	10.170	10.278	10.222	10.159	10.186	10.259	10.411	10.529	10.566	10.540
19	11.877	11.645	11.500	11.414	11.375	10.785	10.537	10.314	10.322	10.430	10.520	10.509	10.412	10.352	10.480	10.410	10.352	10.283	10.223	10.191	10.177	10.285	10.217	10.164	10.194	10.263	10.412	10.531	10.565	10.543
20	11.882	11.636	11.493	11.406	11.371	10.779	10.475	10.316	10.340	10.446	10.528	10.510	10.411	10.365	10.481	10.412	10.348	10.282	10.223	10.194	10.184	10.298	10.219	10.172	10.197	10.276	10.427	10.535	10.565	10.554
21	11.866	11.591	11.481	11.410	11.366	10.770	10.423	10.318	10.355	10.453	10.534	10.510	10.411	10.377	10.488	10.406	10.346	10.280	10.219	10.193	10.190	10.306	10.217	10.177	10.205	10.285	10.432	10.539	10.568	10.561
22	11.832	11.589	11.483	11.399	11.357	10.768	10.418	10.318	10.361	10.468	10.537	10.512	10.407	10.386	10.491	10.399	10.340	10.272	10.219	10.188	10.198	10.305	10.217	10.177	10.210	10.293	10.443	10.549	10.564	10.568
23	11.825	11.588	11.475	11.398	11.354	10.752	10.405	10.316	10.373	10.474	10.542	10.510	10.404	10.392	10.492	10.402	10.333	10.265	10.213	10.186	10.198	10.305	10.206	10.177	10.210	10.298	10.446	10.552	10.564	10.573
最高(m)	12.021	11.818	11.591	11.459	11.400	11.331	16.626	10.401	10.373	10.474	10.558	10.549	10.507	10.400	10.492	10.491	10.400	10.327	10.257	10.210	10.198	10.306	10.303	10.203	10.210	10.298	10.446	10.552	10.574	10.573
最低(m)	11.825	11.588	11.475	11.398	11.354	10.248	10.405	9.889	10.278	10.369	10.480	10.507	10.404	10.312	10.402	10.399	10.333	10.265	10.213	10.171	10.157	10.199	10.206	10.155	10.168	10.196	10.307	10.456	10.548	10.531
平均(m)	11.940	11.786	11.533	11.423	11.381	10.869	10.833	10.271	10.309	10.411	10.523	10.527	10.461	10.351	10.444	10.447	10.373	10.295	10.231	10.193	10.178	10.252	10.260	10.180	10.185	10.231	10.375	10.511	10.562	10.553

平均水位值：10.595　　月最高水位值：16.626　　月最低水位值：9.889

附錄 IV.6-77　101 年 6 月 GM14-1 地下水位逐時記錄表

地面標高：—公尺　井頂標高：12.69公尺　　單位：公尺

日期 時間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	8.412	8.154	7.970	7.850	7.770	7.745	7.681	7.632	7.244	7.208	7.186	7.186	7.198	7.218	7.212	7.210	7.213	7.206	7.156	7.123	7.098	7.091	7.051	7.012	6.897	7.659	7.651	7.581	7.534	7.492
1	8.399	8.144	7.970	7.840	7.762	7.739	7.671	7.626	7.242	7.197	7.181	7.192	7.189	7.227	7.211	7.211	7.212	7.202	7.154	7.120	7.099	7.092	7.053	7.004	6.893	7.655	7.644	7.575	7.532	7.491
2	8.381	8.124	7.953	7.832	7.758	7.728	7.659	7.627	7.237	7.192	7.170	7.183	7.189	7.215	7.209	7.205	7.208	7.189	7.142	7.113	7.096	7.083	7.042	6.992	6.897	7.658	7.640	7.572	7.523	7.478
3	8.373	8.118	7.950	7.833	7.754	7.730	7.654	7.623	7.234	7.192	7.168	7.183	7.194	7.215	7.212	7.200	7.215	7.184	7.145	7.122	7.091	7.073	7.037	6.986	6.899	7.663	7.638	7.564	7.519	7.485
4	8.358	8.107	7.935	7.820	7.760	7.721	7.647	7.621	7.238	7.196	7.175	7.183	7.194	7.210	7.217	7.201	7.208	7.182	7.145	7.119	7.093	7.073	7.034	6.981	6.915	7.660	7.629	7.563	7.520	7.477
5	8.345	8.099	7.935	7.827	7.759	7.725	7.648	7.623	7.243	7.198	7.188	7.182	7.194	7.217	7.215	7.205	7.212	7.188	7.146	7.121	7.093	7.072	7.034	6.982	6.929	7.660	7.630	7.558	7.515	7.475
6	8.338	8.090	7.937	7.817	7.761	7.721	7.649	7.613	7.247	7.197	7.186	7.184	7.198	7.219	7.220	7.212	7.215	7.182	7.144	7.126	7.089	7.072	7.031	6.983	6.962	7.666	7.627	7.558	7.519	7.475
7	8.329	8.083	7.932	7.823	7.757	7.714	7.647	7.619	7.250	7.198	7.182	7.191	7.194	7.218	7.220	7.215	7.212	7.184	7.150	7.130	7.101	7.074	7.034	6.984	7.016	7.672	7.630	7.561	7.518	7.475
8	8.323	8.079	7.923	7.820	7.758	7.715	7.650	7.613	7.243	7.193	7.185	7.192	7.198	7.224	7.219	7.214	7.211	7.185	7.141	7.128	7.095	7.075	7.035	6.980	7.086	7.677	7.630	7.557	7.521	7.476
9	8.313	8.078	7.924	7.814	7.756	7.714	7.658	7.601	7.246	7.192	7.185	7.190	7.201	7.227	7.214	7.217	7.211	7.180	7.137	7.122	7.101	7.073	7.032	6.975	7.158	7.681	7.622	7.552	7.517	7.470
10	8.300	8.069	7.915	7.806	7.752	7.705	7.649	7.601	7.241	7.188	7.182	7.193	7.201	7.227	7.214	7.221	7.210	7.170	7.136	7.121	7.104	7.075	7.028	6.970	7.233	7.676	7.623	7.551	7.518	7.471
11	8.289	8.067	7.914	7.806	7.754	7.702	7.645	7.608	7.238	7.193	7.187	7.192	7.206	7.231	7.217	7.221	7.218	7.173	7.138	7.125	7.105	7.069	7.032	6.963	7.314	7.682	7.626	7.550	7.516	7.469
12	8.278	8.052	7.906	7.801	7.753	7.697	7.645	7.609	7.233	7.187	7.181	7.187	7.194	7.228	7.211	7.217	7.210	7.161	7.133	7.114	7.094	7.066	7.030	6.963	7.384	7.672	7.611	7.538	7.511	7.463
13	8.268	8.039	7.898	7.802	7.754	7.695	7.642	7.551	7.226	7.183	7.180	7.184	7.195	7.226	7.209	7.216	7.209	7.159	7.130	7.114	7.089	7.059	7.022	6.955	7.449	7.668	7.605	7.532	7.505	7.456
14	8.247	8.026	7.890	7.789	7.749	7.690	7.633	7.522	7.221	7.176	7.175	7.180	7.188	7.222	7.207	7.210	7.200	7.163	7.129	7.109	7.092	7.054	7.017	6.947	7.495	7.661	7.593	7.523	7.493	7.452
15	8.229	8.016	7.887	7.789	7.747	7.688	7.629	7.318	7.214	7.176	7.170	7.179	7.198	7.220	7.208	7.211	7.196	7.153	7.131	7.102	7.102	7.053	7.020	6.938	7.533	7.652	7.587	7.518	7.497	7.454
16	8.214	8.006	7.876	7.783	7.744	7.685	7.622	7.220	7.204	7.174	7.170	7.176	7.186	7.215	7.199	7.205	7.196	7.160	7.135	7.102	7.086	7.054	7.012	6.927	7.554	7.650	7.587	7.515	7.498	7.447
17	8.207	7.998	7.872	7.775	7.746	7.684	7.621	7.124	7.207	7.179	7.172	7.179	7.185	7.215	7.204	7.200	7.191	7.156	7.137	7.100	7.088	7.057	7.010	6.921	7.580	7.651	7.581	7.510	7.496	7.451
18	8.191	7.995	7.865	7.780	7.742	7.686	7.622	7.245	7.205	7.183	7.177	7.187	7.191	7.217	7.201	7.198	7.198	7.157	7.133	7.099	7.093	7.058	7.016	6.922	7.598	7.649	7.584	7.510	7.497	7.444
19	8.186	7.997	7.866	7.780	7.743	7.681	7.625	7.244	7.214	7.191	7.185	7.190	7.200	7.221	7.204	7.200	7.203	7.158	7.145	7.105	7.099	7.068	7.024	6.932	7.614	7.656	7.583	7.525	7.496	7.450
20	8.180	7.996	7.864	7.780	7.750	7.692	7.634	7.250	7.216	7.197	7.187	7.200	7.211	7.223	7.209	7.202	7.210	7.165	7.141	7.104	7.100	7.067	7.021	6.924	7.638	7.663	7.590	7.535	7.498	7.448
21	8.175	7.990	7.872	7.780	7.743	7.686	7.634	7.251	7.219	7.196	7.195	7.203	7.209	7.223	7.207	7.208	7.219	7.167	7.138	7.117	7.101	7.067	7.018	6.918	7.644	7.663	7.593	7.543	7.502	7.456
22	8.176	7.986	7.865	7.775	7.749	7.679	7.638	7.251	7.222	7.201	7.193	7.206	7.221	7.228	7.210	7.214	7.211	7.162	7.139	7.107	7.102	7.065	7.023	6.914	7.659	7.664	7.595	7.544	7.504	7.457
23	8.174	7.987	7.857	7.775	7.749	7.685	7.638	7.255	7.219	7.193	7.193	7.198	7.224	7.217	7.210	7.218	7.209	7.160	7.127	7.106	7.097	7.056	7.016	6.911	7.663	7.661	7.587	7.539	7.503	7.446
最高(m)	8.412	8.154	7.970	7.850	7.770	7.745	7.681	7.632	7.250	7.208	7.195	7.206	7.224	7.231	7.220	7.221	7.219	7.206	7.156	7.130	7.105	7.092	7.053	7.012	7.663	7.682	7.651	7.581	7.534	7.492
最低(m)	8.174	7.986	7.857	7.775	7.742	7.679	7.621	7.124	7.204	7.174	7.168	7.176	7.185	7.210	7.199	7.198	7.191	7.153	7.127	7.099	7.086	7.053	7.010	6.911	6.893	7.649	7.583	7.525	7.496	7.444
平均(m)	8.279	8.054	7.907	7.804	7.753	7.704	7.643	7.469	7.229	7.191	7.181	7.188	7.198	7.221	7.211	7.210	7.208	7.173	7.140	7.115	7.096	7.069	7.028	6.958	7.292	7.663	7.611	7.548	7.511	7.465

平均水位值：7.404　　月最高水位值：8.412　　月最低水位值：6.893

註：方框為採樣時段，水位計取出download資料

附錄 IV.6-79　101 年 6 月 GM6-1 地下水位逐時記錄表

[測井編號:GM06]　[地面標高:5.95 公尺]　[管頂標高:6.484 公尺]　[井深:11.2 公尺]　[儀器安裝標高:0.58 公尺]　[單位:公尺]

時間 / 日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均	最高	時間	最低	時間
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
01	3.34	3.34	3.33	3.33	3.33	3.34	3.34	3.35	3.34	3.35	3.36	3.36	3.35	3.36	11:27	3.33	20:33
	3.36	3.36	3.35	3.35	3.36	3.35	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34					
02	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.33	3.33	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.33	3.35	09:14	3.32	21:53
	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.33	3.33	3.33	3.32	3.32	3.32	3.32					
03	3.32	3.32	3.32	3.32	3.33	3.32	3.31	3.31	3.31	3.31	3.32	3.31	3.31	3.33	05:01	3.28	22:03
	3.31	3.31	3.31	3.31	3.30	3.30	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.28					
04	3.30	3.31	3.29	3.29	3.29	3.28	3.28	3.28	3.27	3.29	3.29	3.27	3.27	3.32	01:11	3.24	23:29
	3.27	3.28	3.28	3.27	3.27	3.26	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.24					
05	3.24	3.24	3.24	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23	3.24	3.24	3.25	3.25	3.23	3.26	11:26	3.19	23:21
	3.25	3.24	3.24	3.24	3.23	3.23	3.21	3.21	3.20	3.20	3.19	3.19					
06	3.19	3.19	3.18	3.18	3.18	3.17	3.17	3.17	3.17	3.18	3.18	3.18	3.15	3.19	01:04	3.09	23:56
	3.17	3.17	3.17	3.16	3.14	3.11	3.11	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10					
07	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.07	3.07	3.07	3.09	00:01	3.04	23:45
	3.07	3.07	3.07	3.06	3.06	3.06	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.04					
08	3.04	3.04	3.04	3.04	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.02	3.02	3.02	3.02	3.04	00:14	2.99	23:26
	3.02	3.02	3.01	3.01	3.01	3.01	3.00	3.00	3.00	3.00	2.99	2.99					
09	2.99	2.99	2.99	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.97	2.97	2.97	2.96	2.97	3.00	01:10	2.95	23:37
	2.96	2.97	2.96	2.96	2.96	2.96	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.96					
10	2.94	2.94	2.94	2.94	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.92	2.92	2.95	00:01	2.90	22:33
	2.92	2.92	2.92	2.92	2.91	2.91	2.91	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90					
11	2.90	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.90	00:14	2.85	23:54
	2.88	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.85					
12	2.85	2.86	2.87	2.88	2.90	2.92	2.93	2.95	2.97	2.99	3.01	3.05	3.15	3.60	23:59	2.85	00:37
	3.10	3.15	3.20	3.26	3.31	3.37	3.41	3.46	3.49	3.53	3.55	3.58					
13	3.61	3.63	3.66	3.68	3.70	3.72	3.73	3.75	3.76	3.77	3.78	3.79	3.76	3.81	17:48	3.59	00:01
	3.79	3.80	3.80	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.80					
14	3.80	3.80	3.80	3.80	3.79	3.79	3.79	3.78	3.78	3.78	3.79	3.80	3.81	3.85	23:58	3.78	09:21
	3.81	3.82	3.83	3.83	3.83	3.83	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84					
15	3.85	3.85	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.83	3.83	3.82	3.85	00:34	3.77	23:13
	3.83	3.83	3.82	3.82	3.81	3.80	3.80	3.79	3.79	3.78	3.78	3.77					
16	3.77	3.77	3.76	3.76	3.76	3.75	3.75	3.75	3.74	3.74	3.73	3.73	3.73	3.77	00:42	3.68	23:50
	3.73	3.72	3.72	3.72	3.71	3.71	3.70	3.70	3.70	3.69	3.69	3.69					
17	3.68	3.68	3.68	3.67	3.67	3.67	3.66	3.66	3.66	3.66	3.65	3.65	3.65	3.69	00:04	3.61	22:53
	3.65	3.65	3.64	3.64	3.63	3.63	3.62	3.62	3.62	3.62	3.61	3.61					
18	3.61	3.60	3.60	3.60	3.60	3.59	3.59	3.59	3.58	3.58	3.58	3.57	3.57	3.61	00:02	3.53	23:41
	3.57	3.57	3.57	3.56	3.56	3.56	3.55	3.55	3.54	3.54	3.54	3.53					
19	3.53	3.53	3.52	3.52	3.52	3.51	3.51	3.51	3.50	3.50	3.50	3.50	3.49	3.53	00:56	3.45	23:55
	3.49	3.49	3.49	3.49	3.48	3.48	3.47	3.47	3.47	3.46	3.46	3.46					
20	3.45	3.45	3.45	3.45	3.44	3.44	3.44	3.43	3.43	3.43	3.43	3.42	3.42	3.46	00:01	3.39	23:54
	3.42	3.42	3.42	3.42	3.41	3.41	3.40	3.40	3.40	3.39	3.39	3.39					
21	3.39	3.38	3.38	3.38	3.37	3.37	3.37	3.37	3.36	3.36	3.36	3.36	3.35	3.39	00:01	3.32	23:59
	3.35	3.35	3.35	3.34	3.34	3.34	3.33	3.33	3.33	3.33	3.32	3.32					
22	3.32	3.32	3.31	3.31	3.31	3.31	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.29	3.29	3.32	00:01	3.26	23:35
	3.29	3.29	3.29	3.28	3.28	3.28	3.27	3.27	3.27	3.27	3.26	3.26					
23	3.26	3.26	3.25	3.25	3.25	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.23	3.23	3.23	3.26	01:21	3.19	23:32
	3.23	3.23	3.22	3.22	3.22	3.22	3.21	3.21	3.20	3.20	3.20	3.20					
24	3.19	3.19	3.19	3.19	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.17	3.17	3.17	3.16	3.19	01:33	3.13	23:41
	3.16	3.16	3.16	3.16	3.15	3.15	3.15	3.14	3.14	3.14	3.14	3.13					
25	3.13	3.13	3.13	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.11	3.11	3.11	3.11	3.10	3.13	01:21	3.07	24:00
	3.10	3.10	3.10	3.10	3.09	3.09	3.09	3.08	3.08	3.08	3.08	3.07					
26	3.07	3.07	3.07	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.05	3.05	3.05	3.05	3.04	3.07	00:01	3.01	23:50
	3.04	3.04	3.04	3.04	3.03	3.03	3.03	3.02	3.02	3.02	3.02	3.01					
27	3.01	3.01	3.01	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.99	2.99	2.99	2.99	2.98	3.01	00:01	2.95	22:29
	2.98	2.98	2.98	2.98	2.97	2.97	2.97	2.96	2.96	2.96	2.96	2.95					
28	2.95	2.95	2.95	2.95	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.93	2.93	2.93	2.93	2.95	00:01	2.90	23:58
	2.93	2.93	2.92	2.92	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.90	2.90	2.90					
29	2.90	2.90	2.89	2.89	2.89	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.87	2.90	00:24	2.84	23:42
	2.87	2.87	2.87	2.87	2.86	2.86	2.86	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85					
30	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.82	2.82	2.82	2.84	00:01	2.79	23:56
	2.82	2.82	2.81	2.81	2.81	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.79	2.79					

月平均水位值　3.26
月最高水位值　3.85　發生時間　06/15　日　00:34
月最低水位值　2.79　發生時間　06/30　日　23:56

附錄 IV.6-78　101 年 6 月 GM10 地下水位逐時記錄表

[測井編號:GM10]　[地面標高:18.09 公尺]　[管頂標高:18.58 公尺]　[井深:21.95 公尺]　[儀器安裝標高:-0.37 公尺]　[單位:公尺]

時間 / 日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均	最高	時間	最低	時間
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
01	1.31	1.31	1.31	1.32	1.32	1.32	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.34	1.34	1.36	23:19	1.31	00:01
	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.36	1.36	1.36					
02	1.36	1.37	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.39	1.38	1.38	1.40	23:19	1.36	00:02
	1.38	1.38	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.40					
03	1.40	1.41	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.43	1.43	1.44	1.44	1.44	1.44	1.48	23:42	1.40	00:01
	1.44	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.46	1.46	1.46	1.47	1.47	1.47					
04	1.48	1.48	1.48	1.49	1.49	1.49	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.51	1.51	1.54	23:40	1.48	00:01
	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.53	1.53	1.53	1.54	1.54	1.54					
05	1.54	1.55	1.55	1.55	1.55	1.56	1.56	1.56	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.59	23:40	1.54	00:06
	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.59	1.59					
06	1.59	1.59	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.61	1.61	1.61	1.62	1.62	1.63	1.68	23:37	1.59	01:30
	1.62	1.62	1.62	1.62	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.68					
07	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.69	1.69	1.69	1.70	1.71	1.72	1.70	1.72	12:04	1.68	00:02
	1.72	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71					
08	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.71	1.73	12:14	1.71	20:19
	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71					
09	1.71	1.71	1.71	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.73	11:46	1.71	20:21
	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71					
10	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.72	1.72	1.71	1.73	13:24	1.70	21:55
	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70					
11	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.71	02:56	1.68	23:42
	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68					
12	1.68	1.69	1.69	1.69	1.70	1.70	1.71	1.71	1.71	1.72	1.73	1.73	1.73	1.77	23:46	1.68	00:17
	1.74	1.74	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	1.77					
13	1.77	1.77	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.79	1.79	1.79	1.78	1.79	16:48	1.77	00:01
	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.78					
14	1.78	1.78	1.79	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.79	1.80	15:26	1.78	06:47
	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79					
15	1.79	1.79	1.79	1.79	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.79	1.79	1.80	04:15	1.79	18:49
	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79					
16	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.79	1.79	1.80	04:26	1.78	17:33
	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79					
17	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.80	1.80	1.80	1.80	1.79	1.79	1.80	06:04	1.78	15:43
	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79					
18	1.79	1.79	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.81	1.80	1.80	1.81	11:02	1.79	00:01
	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80					
19	1.80	1.80	1.80	1.80	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.82	10:41	1.80	17:10
	1.81	1.81	1.81	1.81	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.81	1.81					
20	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.81	1.82	10:57	1.80	17:22
	1.82	1.82	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81					
21	1.81	1.81	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.81	1.82	12:09	1.80	20:59
	1.82	1.82	1.81	1.81	1.81	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80					
22	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.80	1.82	10:06	1.78	20:29
	1.81	1.81	1.80	1.80	1.80	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	1.79	1.79					
23	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.78	1.79	09:05	1.76	21:20
	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76					
24	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.77	1.77	1.76	1.76	1.77	02:36	1.74	20:27
	1.76	1.76	1.76	1.76	1.75	1.75	1.75	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74					
25	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.75	00:33	1.72	20:23
	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.73	1.73	1.73	1.72	1.72	1.72	1.72					
26	1.72	1.73	1.73	1.73	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.73	00:42	1.70	20:50
	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.70	1.71					
27	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.71	01:32	1.68	20:54
	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.69	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68					
28	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.69	00:13	1.67	20:59
	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67					
29	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.66	1.66	1.68	03:21	1.65	22:21
	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65					
30	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.64	1.64	1.65	00:22	1.63	23:10
	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63					

月平均水位值　1.69
月最高水位值　1.82　發生時間　06/20　日　10:57
月最低水位值　1.31　發生時間　06/01　日　00:01

附　錄　Ⅳ.7

海域水質監測成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-1　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120329AC4

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：海水
樣品編號：PW4004101~08、4201
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：沿岸海域

採樣時間：101年04月03日12時20分
至：101年04月03日14時10分
收樣時間：101年04月03日16時25分
報告日期：101年05月03日
報告編號：PW/2012/40041A
聯絡人：張菅芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示＂＊＂者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以＂ND＂表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以＂<檢測報告最低位數單位值＂表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
7.報告編號PW/2012/40041A取代原本PW/2012/40041。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚靚成
檢驗室主管：實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6956891

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-2　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW4004101~08、4201

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW4004101	PW4004102	PW4004103	PW4004104	PW4004105	PW4004106	PW4004107	PW4004108	PW4004201	-
						測點4(表層)(345412;2769643)	測點4(底層)(345412;2769643)	測點3(表層)(344724;2770308)	測點3(底層)(344724;2770308)	測點2(表層)(344369;2771328)	測點2(底層)(344369;2771328)	測點1(表層)(344703;2772270)	測點1(底層)(344703;2772270)	運送空白	-
*	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	20.1	20.2	19.8	19.8	19.9	20.0	20.2	20.2	-	-
*	2	pH(備註3.)	NIEA W424.52A	-	-	8.072	8.065	8.115	8.117	8.125	8.127	8.125	8.122	-	-
*	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	50100	50100	50200	50200	50300	50300	50200	50200	-	-
*	4	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	-	-
*	5	鹽氣	NIEA W408.51A	-	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	-	-
*	6	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	-
	7	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	1.1	1.2	0.65	1.1	1.0	1.3	1.1	0.80	-	-
*	8	懸浮固體(海水)(備註4.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	1.2	1.6	1.3	2.2	1.4	1.8	2.0	1.4	-	-
*	9	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	1.7	-	-
*	10	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.016	0.019	0.019	0.013	0.020	0.015	0.012	0.012	-	-
*	11	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-
*	12	海水中銅(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	13	海水中鉛(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	14	海水中鎘(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	15	海水中鋅(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0014	mg/L	<0.0050(0.0017)	<0.0050(0.0020)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	16	海水中鎳(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	17	海水中鉻(備註1.)	NIEA W309.22A	<0.0050[A]	mg/L	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	-	-
*	18	汞(備註1.)	NIEA W330.52A	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	19	鐵(備註1.)	NIEA W311.52C	0.313	mg/L	1320	1350	1360	1350	1350	1340	1370	1370	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	4月3日	
-	-	-	-		採樣時間：	12:20	12:30	12:50	13:00	13:20	13:30	13:50	14:00	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	
		以下空白													

備註
1.此項目是委託台灣檢驗科技股份有限公司-高雄環境實驗室分析。
2."A"表示為定量極限值。
3.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
4.PW4004101~08懸浮固體樣品以全量過濾分析。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 6956892

附4.7-1

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-3　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120427AI9

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：海水
樣品編號：PW5006501~08、6601
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：沿岸海域

採樣時間：101年05月03日12時10分
至：101年05月03日14時00分
收樣時間：101年05月03日16時40分
報告日期：101年05月16日
報告編號：PW/2012/50065
聯絡人：張箐芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚親成
檢驗室主管：柯雅齡　實驗室主任郭淑清

（第1頁，共3頁）

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6957986

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-4　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW5006501~08、6601

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW5006501 附點4(表層) (345412;2769643)	PW5006502 附點4(底層) (345412;2769643)	PW5006503 附點3(表層) (344724;2770308)	PW5006504 附點3(底層) (344724;2770308)	PW5006505 附點2(表層) (344369;2771328)	PW5006506 附點2(底層) (344369;2771328)	PW5006507 附點1(表層) (344703;2772270)	PW5006508 附點1(底層) (344703;2772270)	PW5006601 運送空白	-
*	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	24.8	24.7	25.2	25.2	25.5	25.5	25.7	25.6	-	-
*	2	pH(備註3.)	NIEA W424.52A	-	-	8.221	8.224	8.145	8.142	8.114	8.113	8.082	8.080	-	-
*	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	33700	33800	49400	49400	47500	47500	49900	49900	-	-
*	4	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	6.9	6.8	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3	6.4	-	-
*	5	鹽氯	NIEA W408.51A	-	mg/L	0.04	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	-	-
*	6	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	2.3×10^3	2.6×10^3	<10	30	45	50	<10	<10	<10	-
	7	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	11	11	0.65	0.65	1.0	1.4	0.70	0.50	-	-
*	8	懸浮固體(海水)(備註4.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	9.4	9.8	1.4	1.5	1.8	1.8	1.6	1.5	-	-
*	9	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.8	1.9	-	-
*	10	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.054	0.024	0.009	0.011	0.016	0.013	0.011	0.011	-	-
*	11	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-
*	12	海水中銅(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	<0.0010(0.0004)	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	13	海水中鋅(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	14	海水中鎘(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	15	海水中砷(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0014	mg/L	<0.0050(0.0029)	<0.0050(0.0043)	<0.0050(0.0030)	<0.0050(0.0047)	<0.0050(0.0037)	<0.0050(0.0029)	<0.0050(0.0040)	<0.0050(0.0037)	-	-
	16	海水中鎳(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	17	海水中鉻(備註1.)	NIEA W309.22A	<0.0050△	mg/L	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	-	-
*	18	汞(備註1.)	NIEA W330.52A	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	19	鉛(備註1.)	NIEA W311.52C	0.313	mg/L	861	840	1320	1320	1290	1290	1330	1330	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	5月3日	-
-	-	-	-		採樣時間：	12:10	12:20	12:40	12:50	13:10	13:20	13:40	13:50	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	-
		以下空白													

備註
1.此項目是委託台灣檢驗科技股份有限公司-高雄環境實驗室分析。
2."△"表示爲定量極限值。
3.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
4.PW5006503~08懸浮固體樣品以全量過濾分析。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6957987

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-5　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120528BH6

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：海水
樣品編號：PW6000601~08、00701
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：沿岸海域

採樣時間：101年06月04日09時20分
至：101年06月04日11時10分
收樣時間：101年06月04日17時23分
報告日期：101年06月21日
報告編號：PW/2012/60006
聯絡人：張簪芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚觀[illegible]
檢驗室主管：柯雅齡　實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 7882562

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-6　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW6000601~08、00701

認證	序號	樣品編號 / 檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW6000601 測站4(表層) (345412;2769643)	PW6000602 測站4(底層) (345412;2769643)	PW6000603 測站3(表層) (344724;2770308)	PW6000604 測站3(底層) (344724;2770308)	PW6000605 測站2(表層) (344369;2771328)	PW6000606 測站2(底層) (344369;2771328)	PW6000607 測站1(表層) (344703;2772270)	PW6000608 測站1(底層) (344703;2772270)	PW6000701 運送空白	-
*	1	水溫	NIEA W217.51A	-	℃	25.9	25.9	26.0	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	-	-
*	2	pH(備註3.)	NIEA W424.52A	-	-	8.097	8.087	8.062	8.095	8.083	8.086	8.089	8.092	-	-
*	3	導電度	NIEA W203.51B	-	μmho/cm	38800	36600	49100	47500	49300	49200	50300	50300	-	-
*	4	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	6.4	6.2	6.5	6.4	6.2	6.2	6.4	6.2	-	-
*	5	鹽度	NIEA W408.51A	-	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	-	-
*	6	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	2.7E+02	5.2E+02	85	1.4E+02	45	50	15	25	<10	-
	7	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	3.7	3.8	1.2	1.4	1.3	2.1	2.1	1.4	-	-
*	8	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	5.0	4.5	2.1	2.2	2.4	2.6	2.6	2.7	-	-
*	9	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.8	1.5	1.7	1.0	1.6	1.4	1.8	1.6	-	-
*	10	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.019	0.019	0.094	0.018	0.021	0.018	0.027	0.017	-	-
*	11	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	-	-
*	12	海水中銅(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	<0.0010(0.0004)	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	13	海水中鎘(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	14	海水中鉛(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
*	15	海水中鋅(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0014	mg/L	<0.0050(0.0016)	<0.0050(0.0031)	<0.0050(0.0032)	<0.0050(0.0037)	<0.0050(0.0035)	<0.0050(0.0036)	<0.0050(0.0033)	<0.0050(0.0025)	-	-
	16	海水中鎳(備註1.)	NIEA W308.22B/W311.52C	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	17	海水中鉻(備註1.)	NIEA W309.22A	<0.0050[Δ]	mg/L	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	-	-
*	18	汞(備註1.)	NIEA W330.52A	0.0004	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-
	19	鎳(備註1.)	NIEA W311.52C	0.313	mg/L	949	927	1260	1300	1290	1300	1330	1340	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	-
-	-	-	-		採樣時間：	09:20	09:30	09:50	10:00	10:20	10:30	10:50	11:00	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	-
		以下空白													

備註
1.此項目是委託台灣檢驗科技股份有限公司-高雄環境實驗室分析。
2."Δ"表示爲定量極限值。
3.此數據由儀器直接讀取，未依報告規定出具小數點下一位，是依客戶要求出具小數點下三位。
4.面落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即爲1.5×10^{2}。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 7882565

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-7　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120329AC5

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司

計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析

樣品基質：海水

樣品編號：PW4004301

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點：澳底漁港

採樣時間：101年04月03日14時20分

至：101年04月03日14時30分

收樣時間：101年04月03日16時25分

報告日期：101年05月03日

報告編號：PW/2012/40043A

聯絡人：張簪芸

電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/麥方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
7.報告編號PW2012/40043A取代原本PW/2012/40043。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀[illegible]

檢驗室主管：實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956902

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-8　行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW4004301

認證	序號	樣品編號		MDL	單位	PW4004301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		檢驗項目	檢驗方法			澳底漁港 (342666;2772616)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	鹽度	NIEA W447.20C	-	psu	32.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	2	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體(海水)(備註1.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	6	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	7	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣日期：		4月3日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣時間：		14:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	天氣：		陰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註：1.PW4004301懸浮固體樣品以全量過濾分析。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6956903

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-9 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120427AJ5

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：海水
樣品編號：PW5006701
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：澳底漁港

採樣時間：101年05月03日14時10分
至：101年05月03日14時20分
收樣時間：101年05月03日16時40分
報告日期：101年05月11日
報告編號：PW/2012/50067
聯絡人：張箐芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/麥方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示＂＊＂者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以＂ND＂表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以＂<檢測報告最低位數單位值＂表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願接受司法機關依法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚親成
檢驗室主管：實驗室主任郭淑清

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6957989

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄IV.7-10 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW5006701

認證	序號	樣品編號		MDL	單位	PW5006701	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		檢驗項目	檢驗方法			澳底漁港 (342666;2772616)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	鹽度	NIEA W447.20C	-	psu	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	2	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體(海水)(備註1.)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	6	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	7	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣日期：	5月3日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		採樣時間：	14:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		天氣：	陰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註：1.PW5006701懸浮固體樣品以全量過濾分析。

環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

TWA 6957990

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.7-11　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA120528BH7

委託單位：美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司
計畫名稱：核能四廠發電工程施工期間環境調查評析
樣品基質：海水
樣品編號：PW6000801
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣地點：澳底漁港

採樣時間：101年06月04日11時20分
至：101年06月04日11時30分
收樣時間：101年06月04日17時23分
報告日期：101年06月14日
報告編號：PW/2012/60008
聯絡人：張箐芸
電話/傳真：02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
2.本報告共3頁，分離使用無效。
3.檢測項目有標示〞＊〞者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4.低於方法偵測極限之測定值以〞ND〞表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以〞<檢測報告最低位數單位值〞表示，並括號註明其實測值。
5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作爲宣傳廣告之用。
6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所爲之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦爲刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：戚親成
檢驗室主管：　實驗室主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第1頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 7882566
SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.sgs.tw
Member of SGS Group
1002

台灣檢驗科技股份有限公司

附錄 IV.7-12　行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號

樣品檢驗報告

樣品編號：PW6000801

認證	序號	檢驗項目	檢驗方法	MDL	單位	PW6000801 滿底漁港 (342666;2772616)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	鹽度	NIEA W447.20C	-	psu	31.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	2	大腸桿菌群	NIEA E202.54B	<10	CFU/100mL	2.2E+02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	3	生化需氧量	NIEA W510.55B	<1.0	mg/L	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	4	懸浮固體(海水)	NIEA W210.57A	<1.0	mg/L	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	濁度	NIEA W219.52C	<0.05	NTU	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	6	溶氧量	NIEA W455.52C	-	mg/L	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	7	總磷	NIEA W427.53B	0.002	mg/L	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	8	油脂	NIEA W506.21B	<1.0	mg/L	<1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣日期：		6月4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	採樣時間：		11:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	天氣：		陰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		以下空白													

備註：1.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即爲1.5×10^2。

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室 實驗報告章 TEL:22993939 FAX:22993230 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

（第2頁，共3頁）

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.
除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
TWA 7882567
SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區五工路136-1號 t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3230 www.sgs.tw
Member of SGS Group
1002


附　錄　Ⅳ.8

海象調查成果


台灣電力公司


核能四廠發電工程施工期間環境監測


101年第2季監測報告

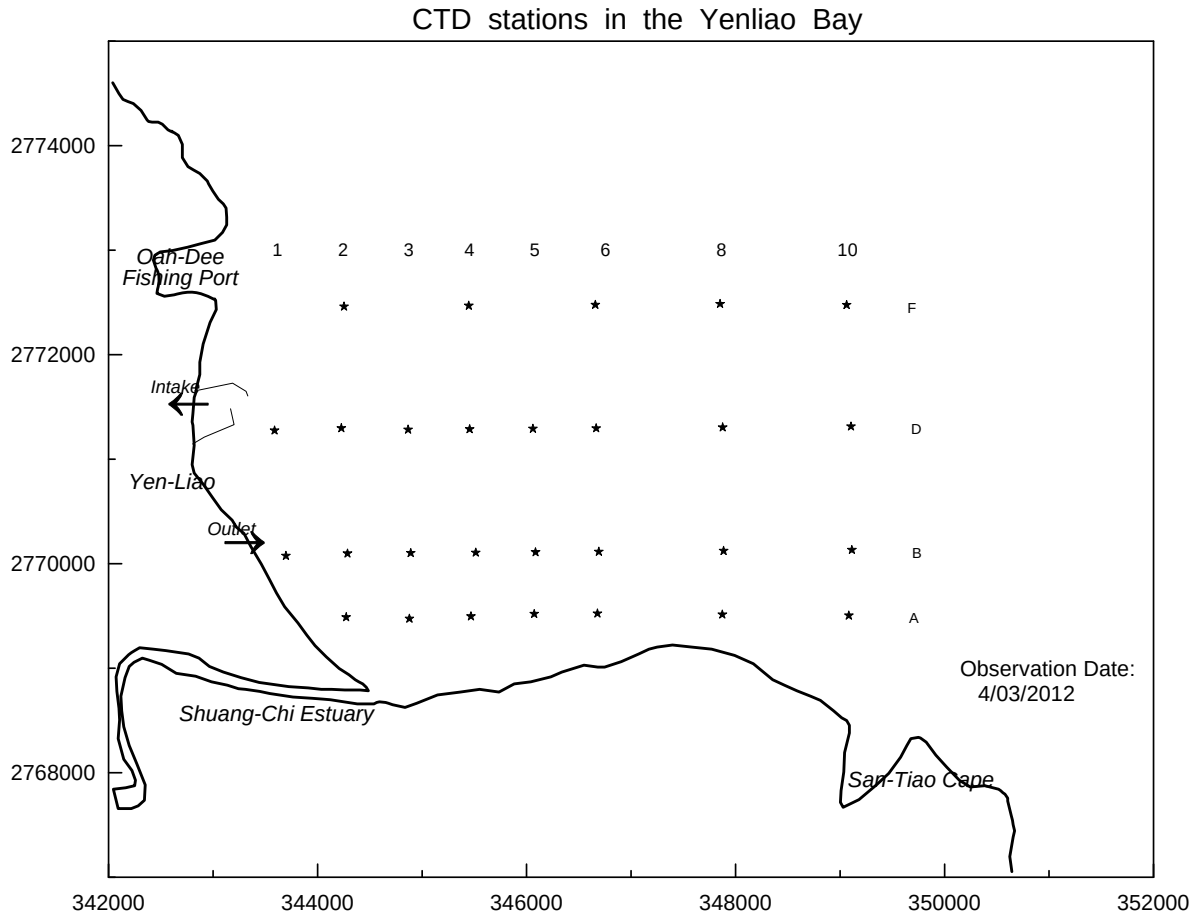



附錄Ⅳ.8-1 海象CTD調查101年4月3日縱深剖面溫鹽圖

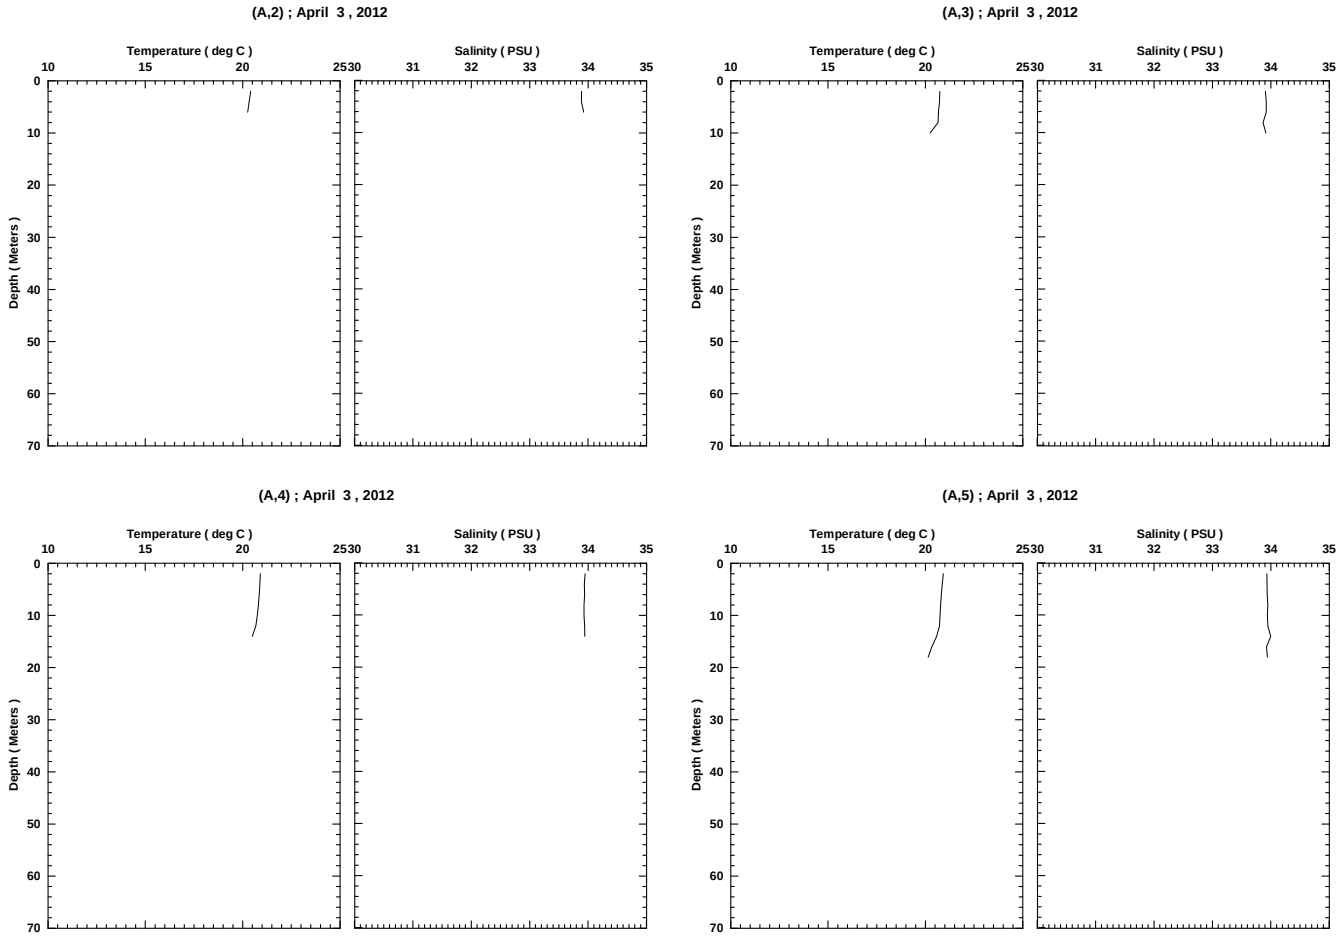


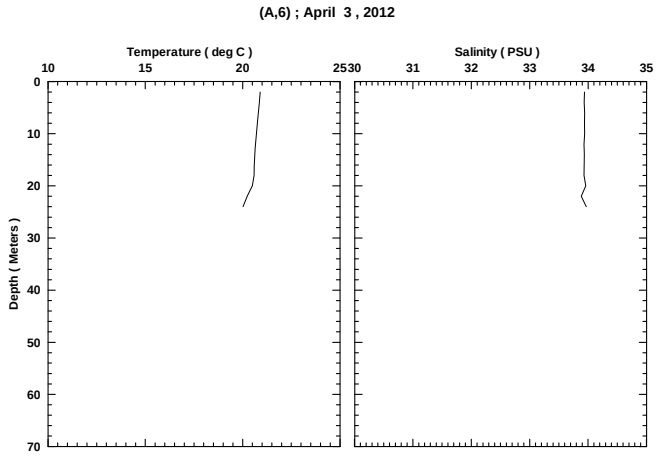

(A,6) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

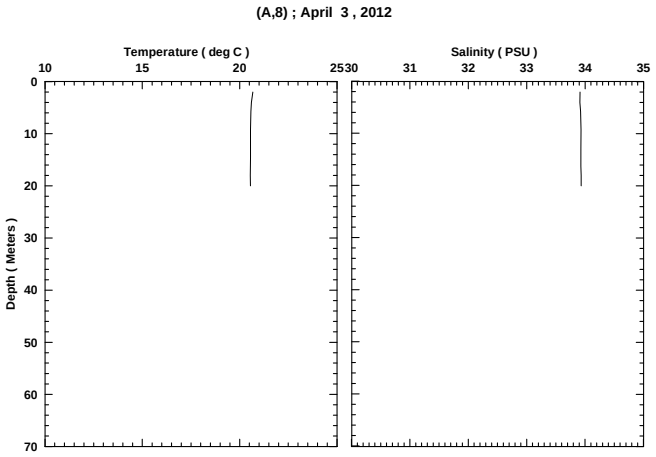

(A,8) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

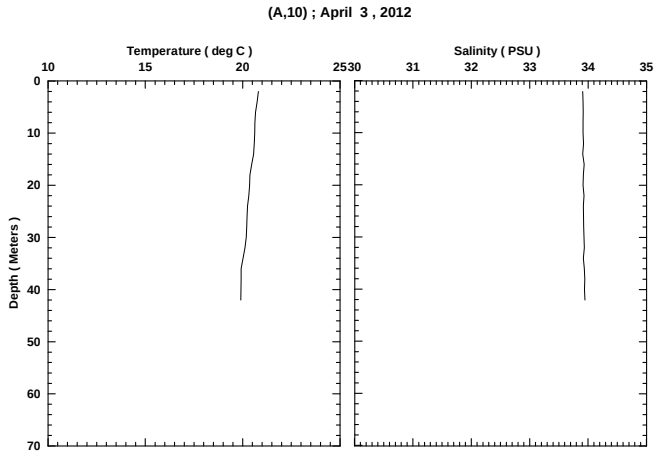

(A,10) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

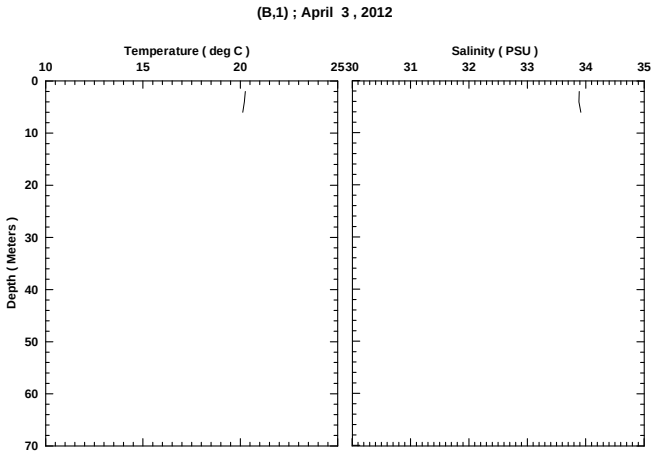

(B,1) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

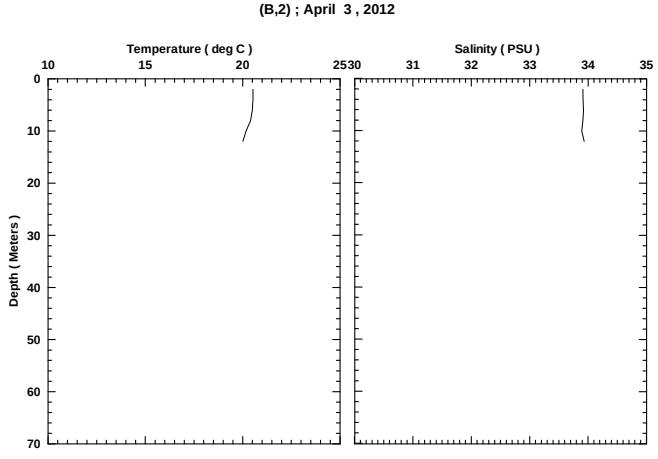

(B,2) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

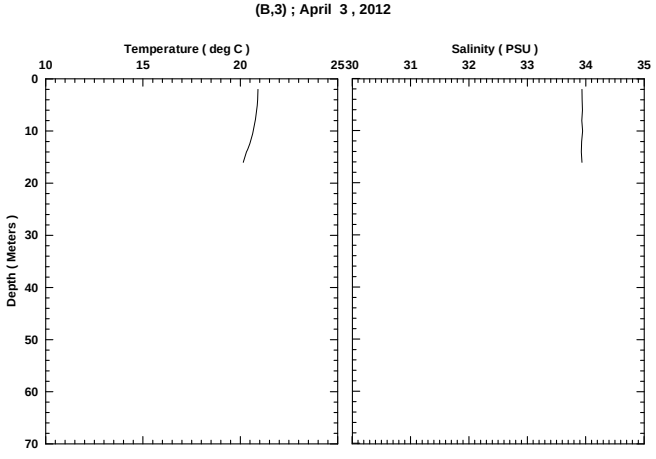

(B,3) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

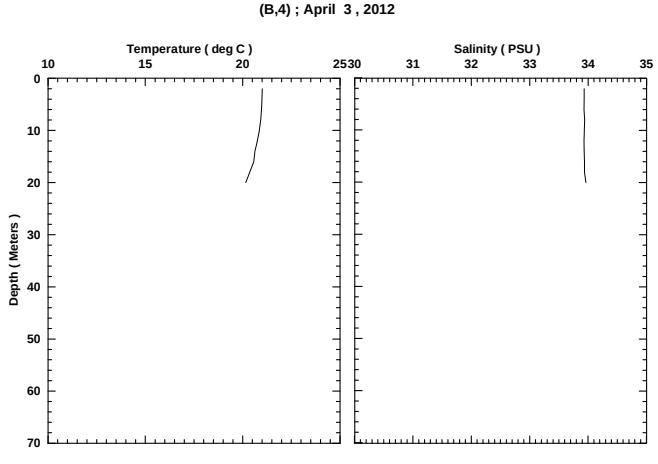

(B,4) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

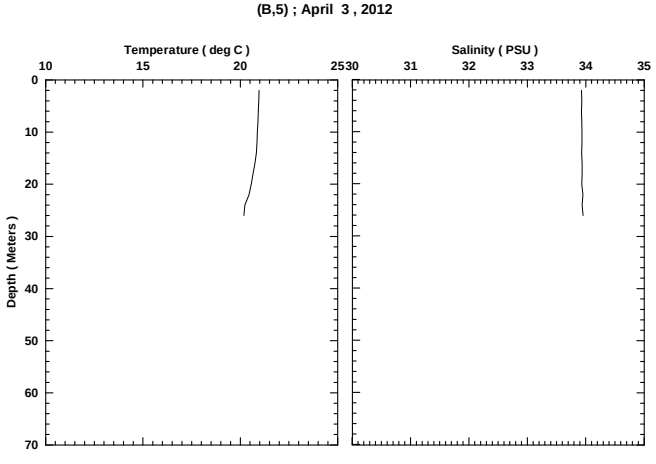

(B,5) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

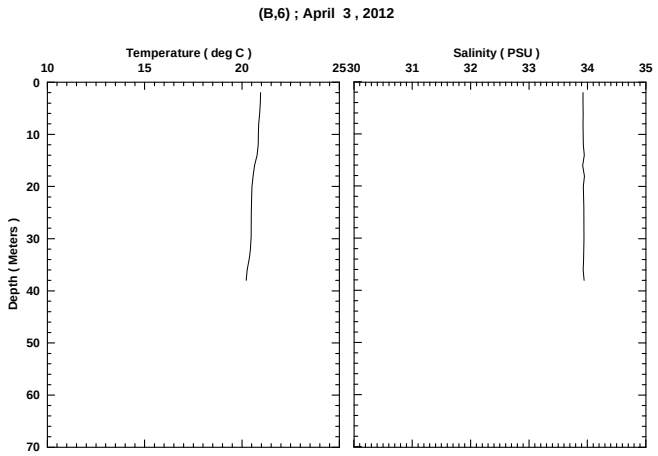

(B,6) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

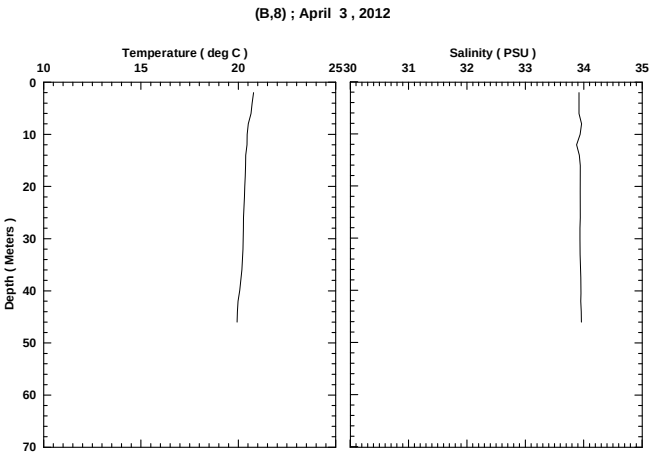

(B,8) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

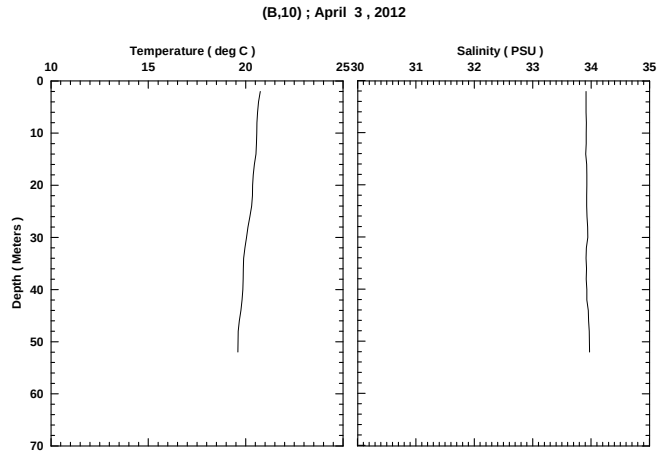

(B,10) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

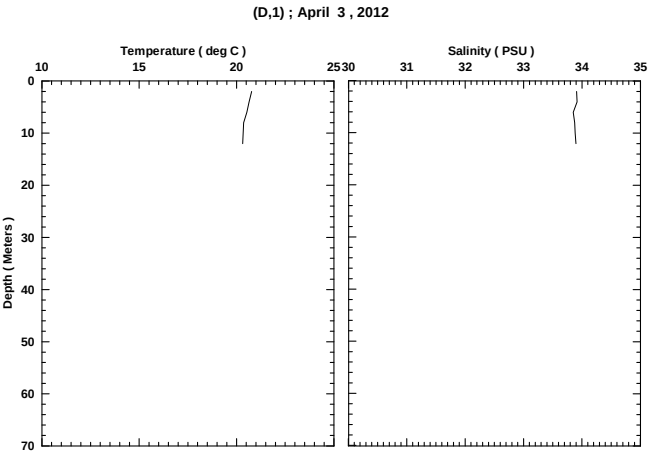

(D,1) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

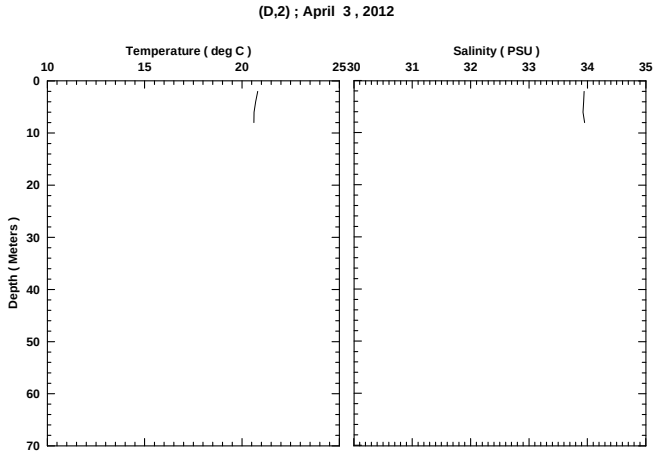

(D,2) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

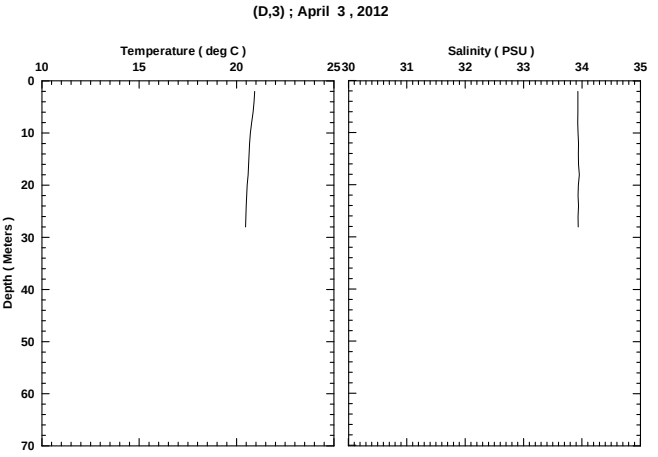

(D,3) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

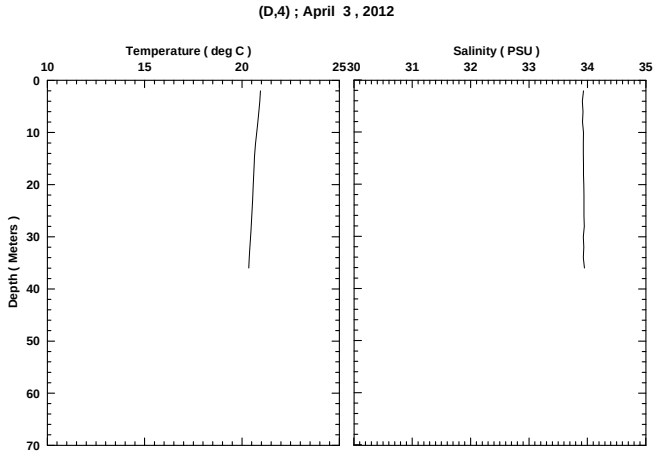

(D,4) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

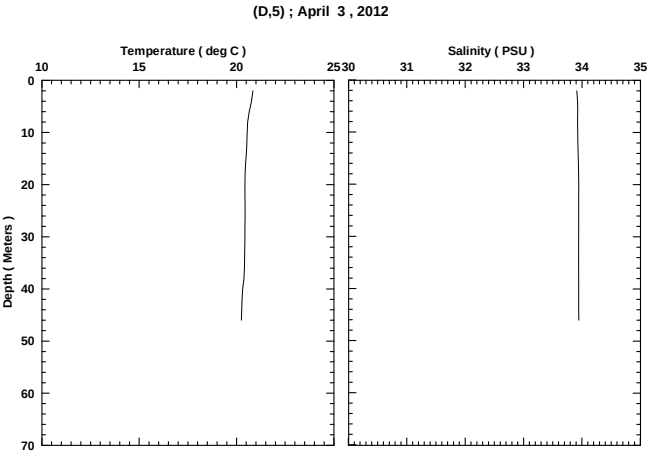

(D,5) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

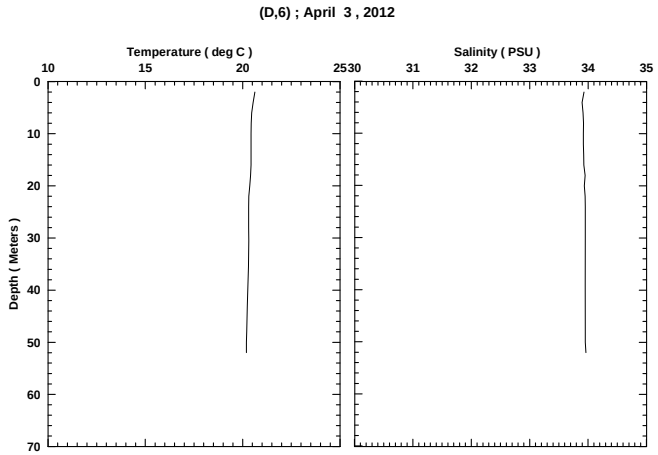

(D,6) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

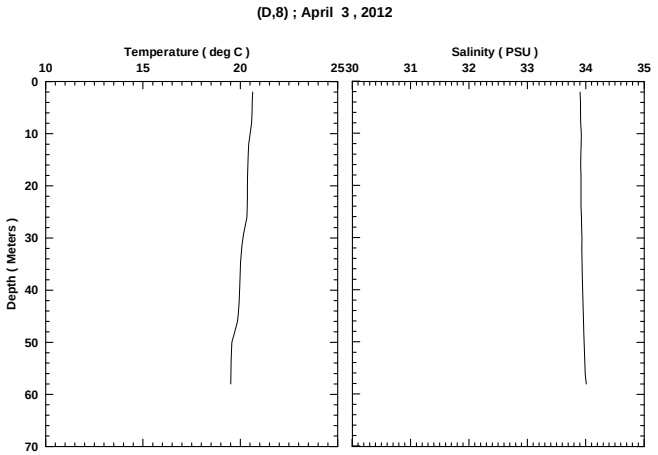

(D,8) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

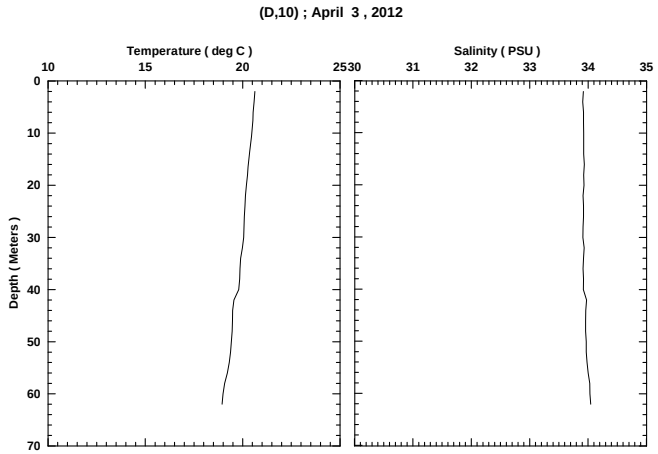

(D,10) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

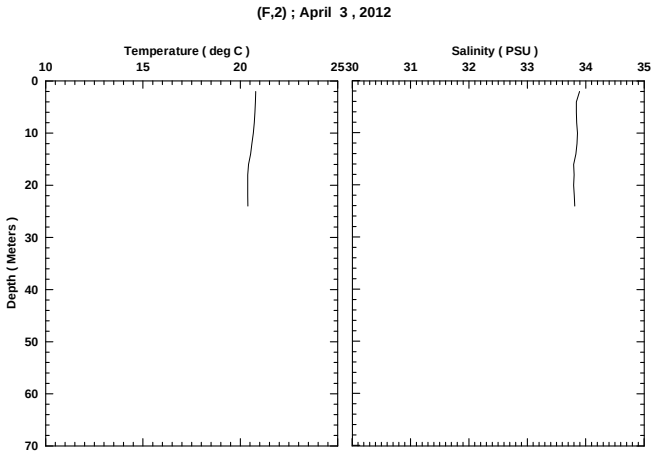

(F,2) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

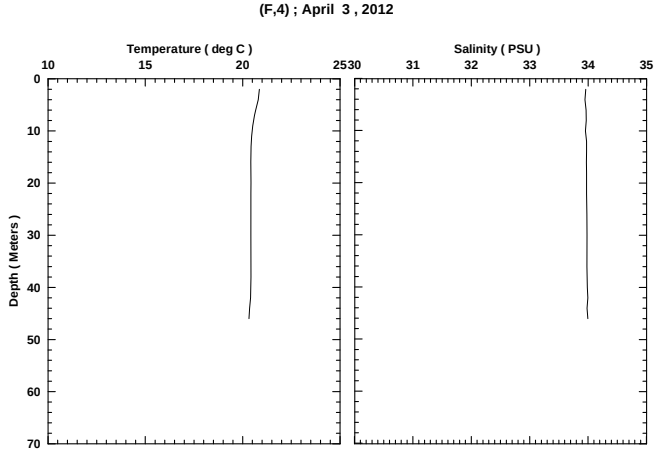
(F,4) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

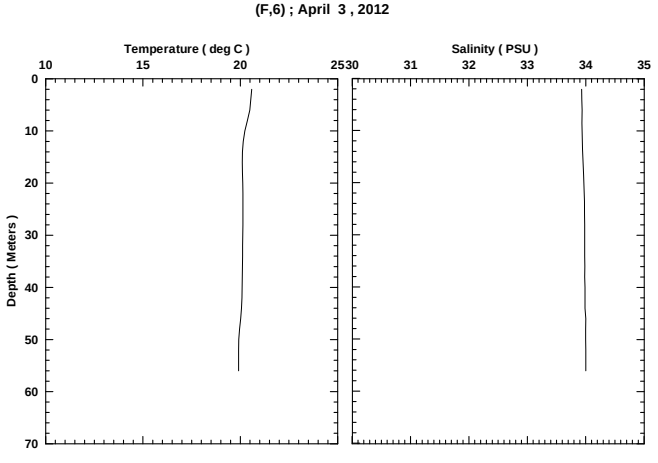

(F,6) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

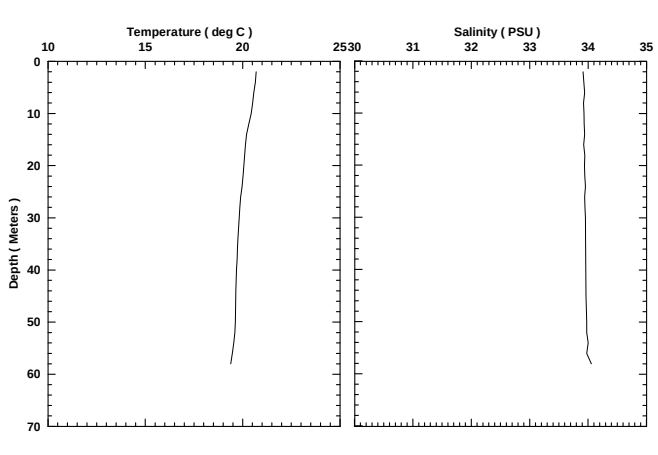

(F,8) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

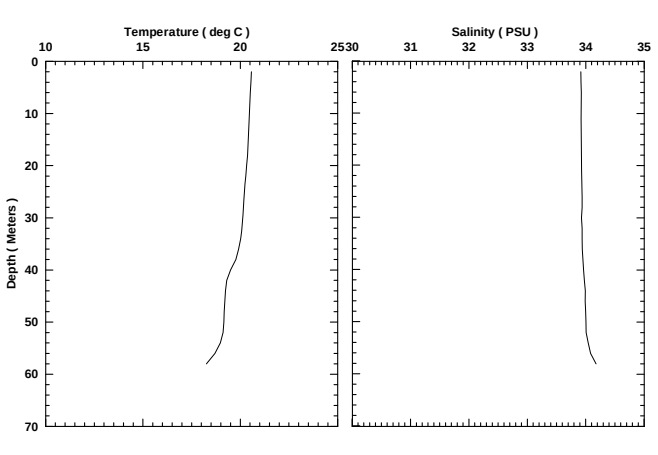
(F,10) ; April 3 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

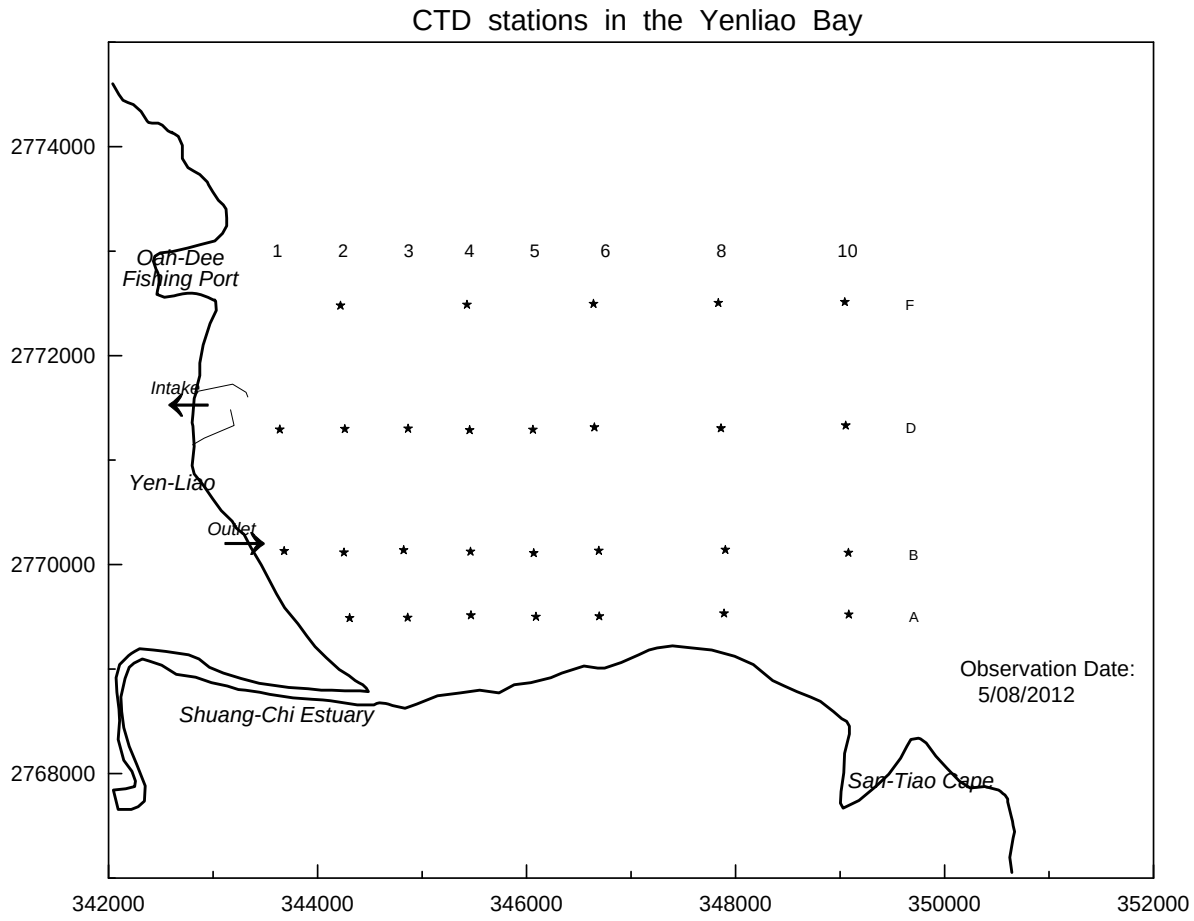


附錄Ⅳ.8-2 海象CTD調查101年5月8日縱深剖面溫鹽圖

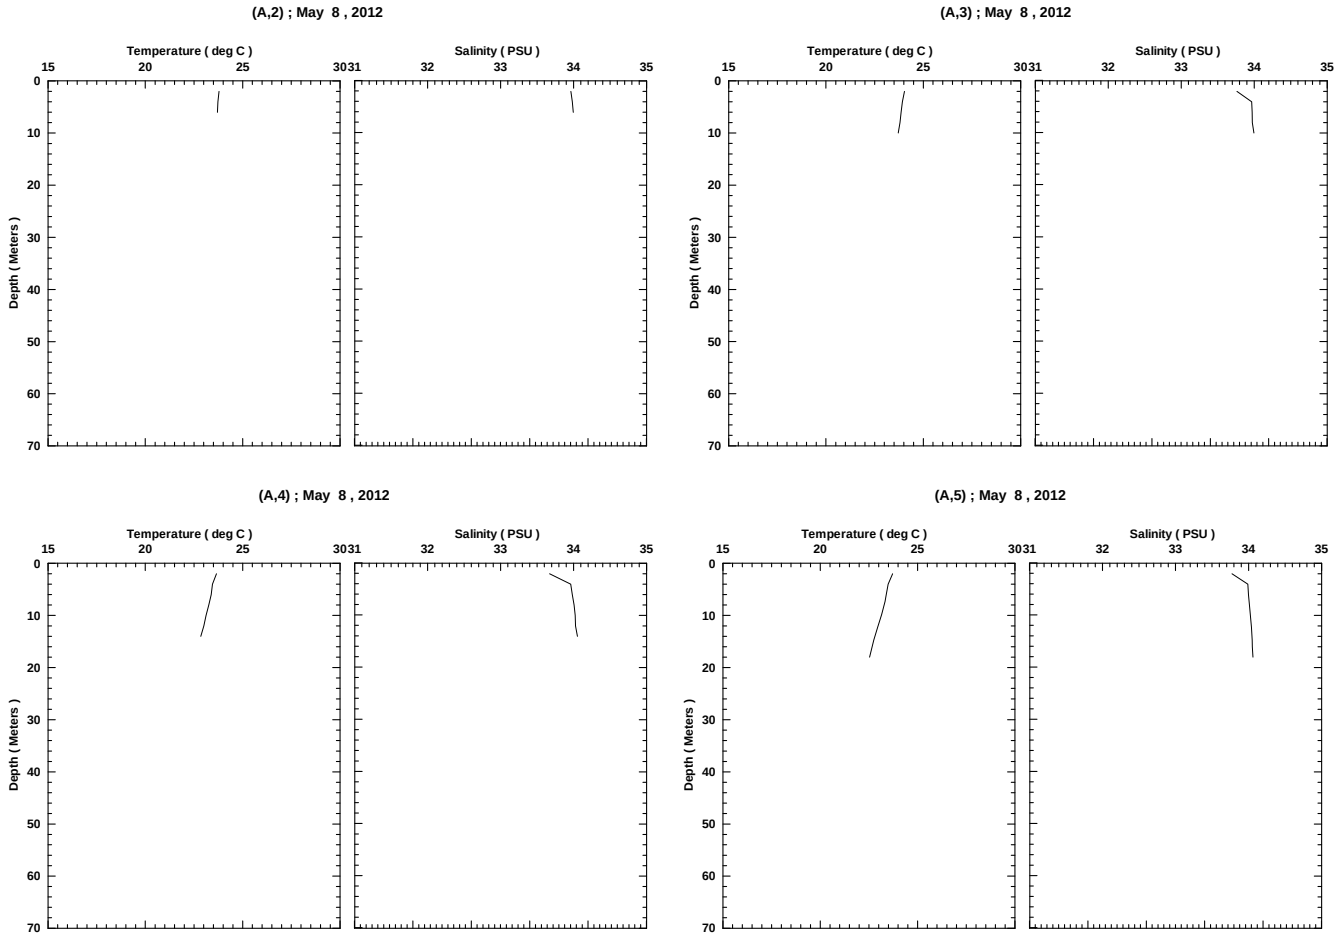

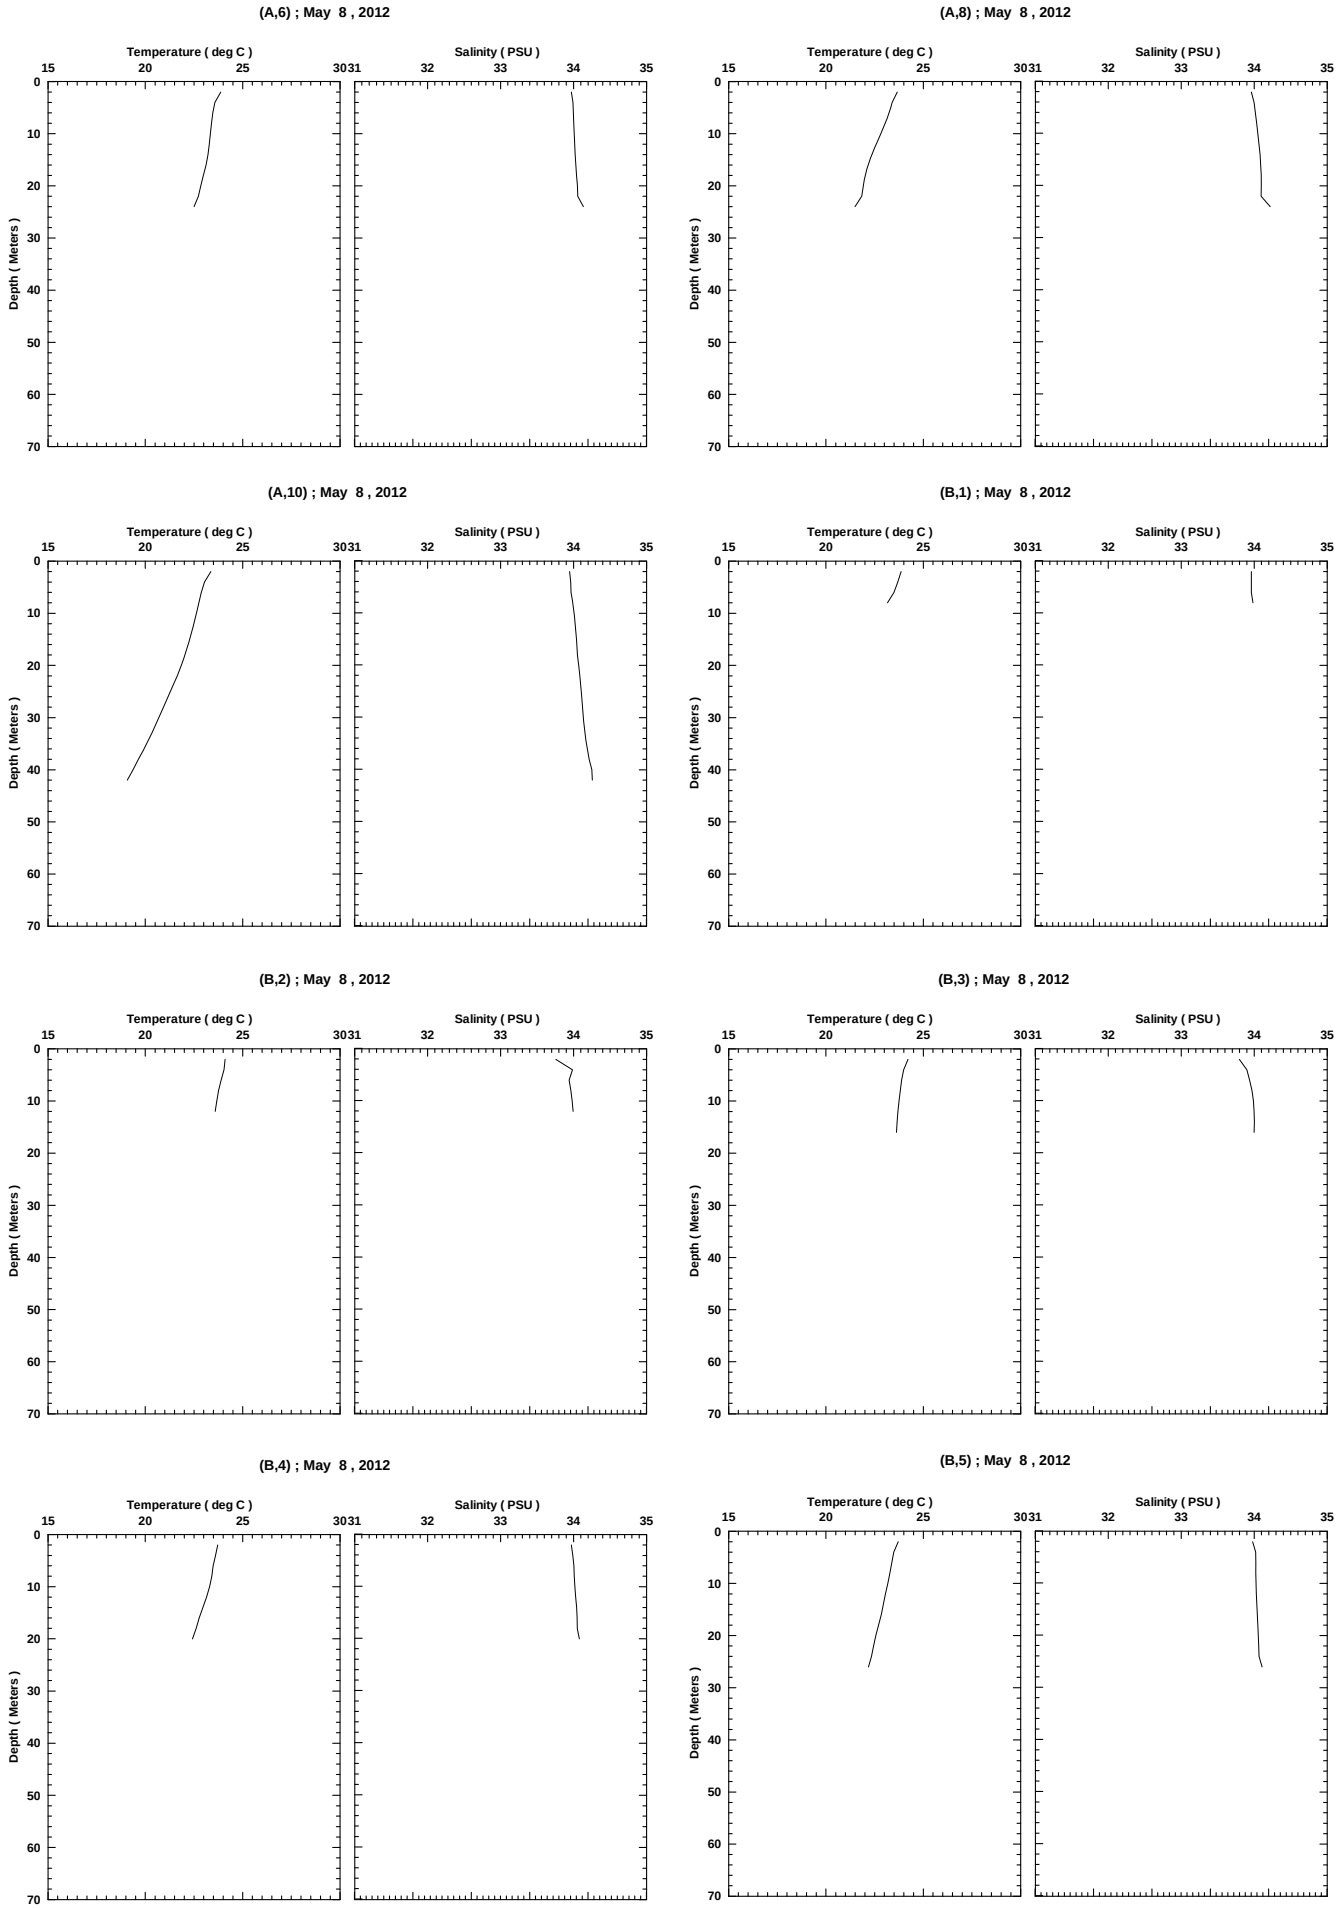

(A,6) ; May 8 , 2012
(A,8) ; May 8 , 2012
(A,10) ; May 8 , 2012
(B,1) ; May 8 , 2012
(B,2) ; May 8 , 2012
(B,3) ; May 8 , 2012
(B,4) ; May 8 , 2012
(B,5) ; May 8 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

附**4.8-6**


(B,6) ; May 8 , 2012

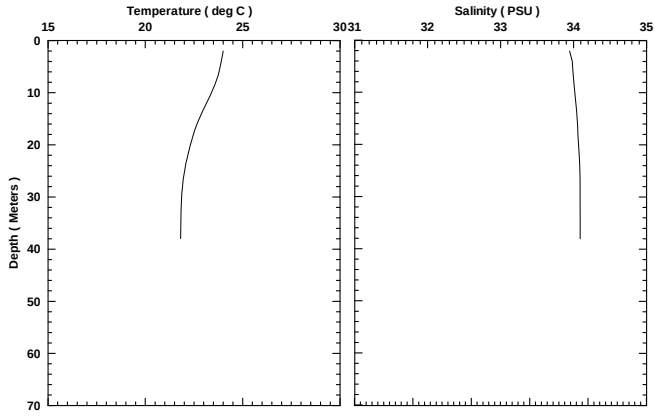


(B,8) ; May 8 , 2012

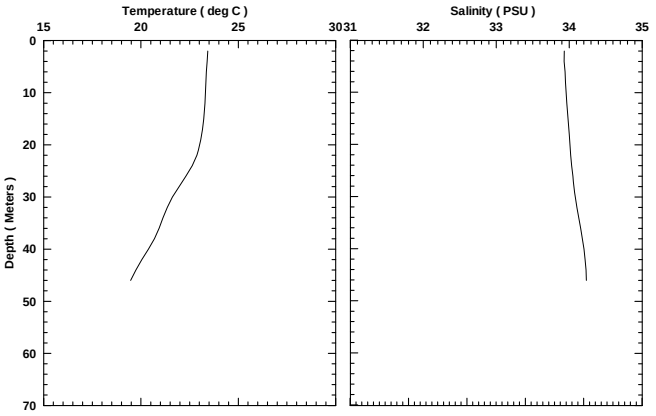


(B,10) ; May 8 , 2012

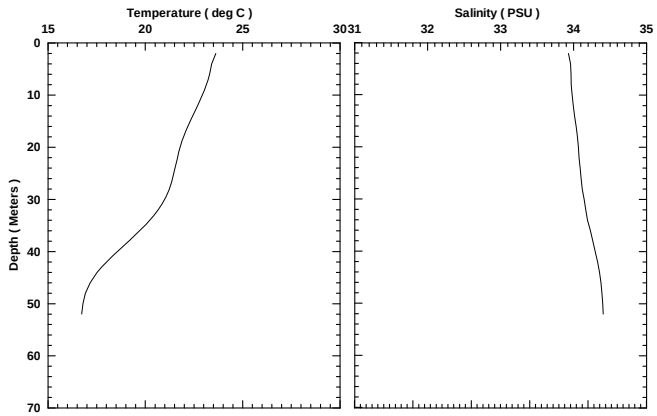


(D,1) ; May 8 , 2012

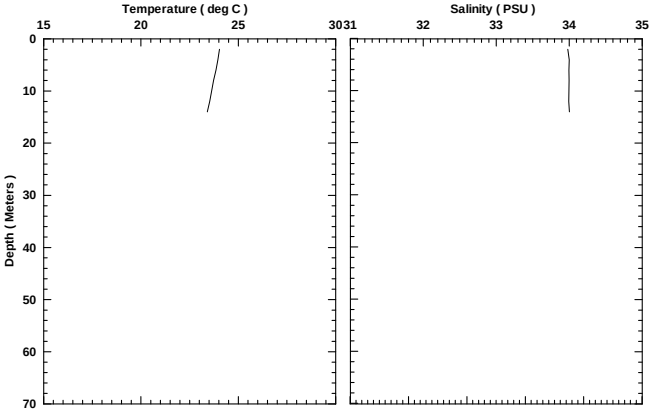


(D,2) ; May 8 , 2012

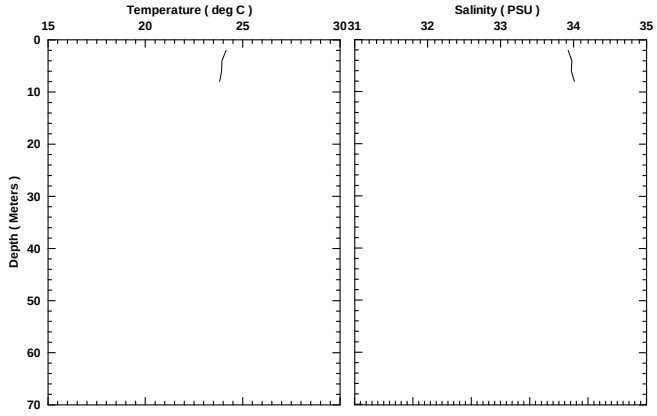


(D,3) ; May 8 , 2012

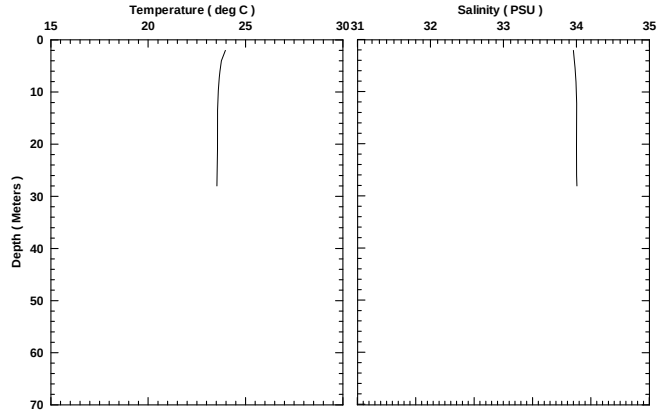


(D,4) ; May 8 , 2012

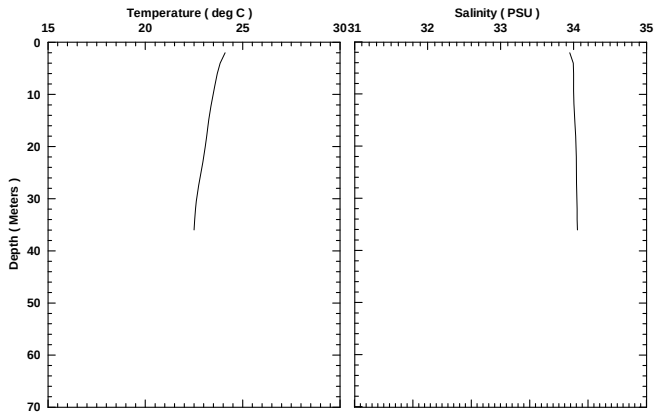


(D,5) ; May 8 , 2012

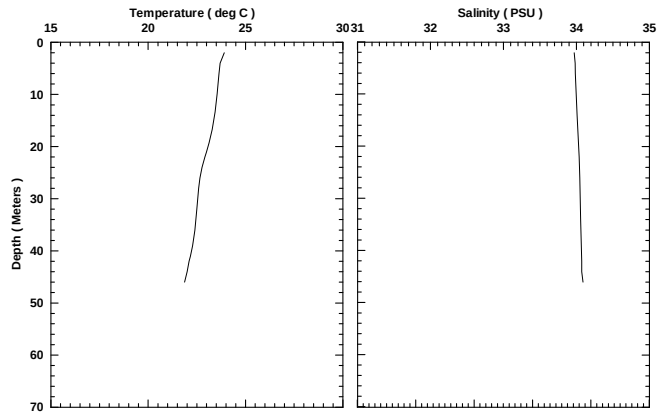


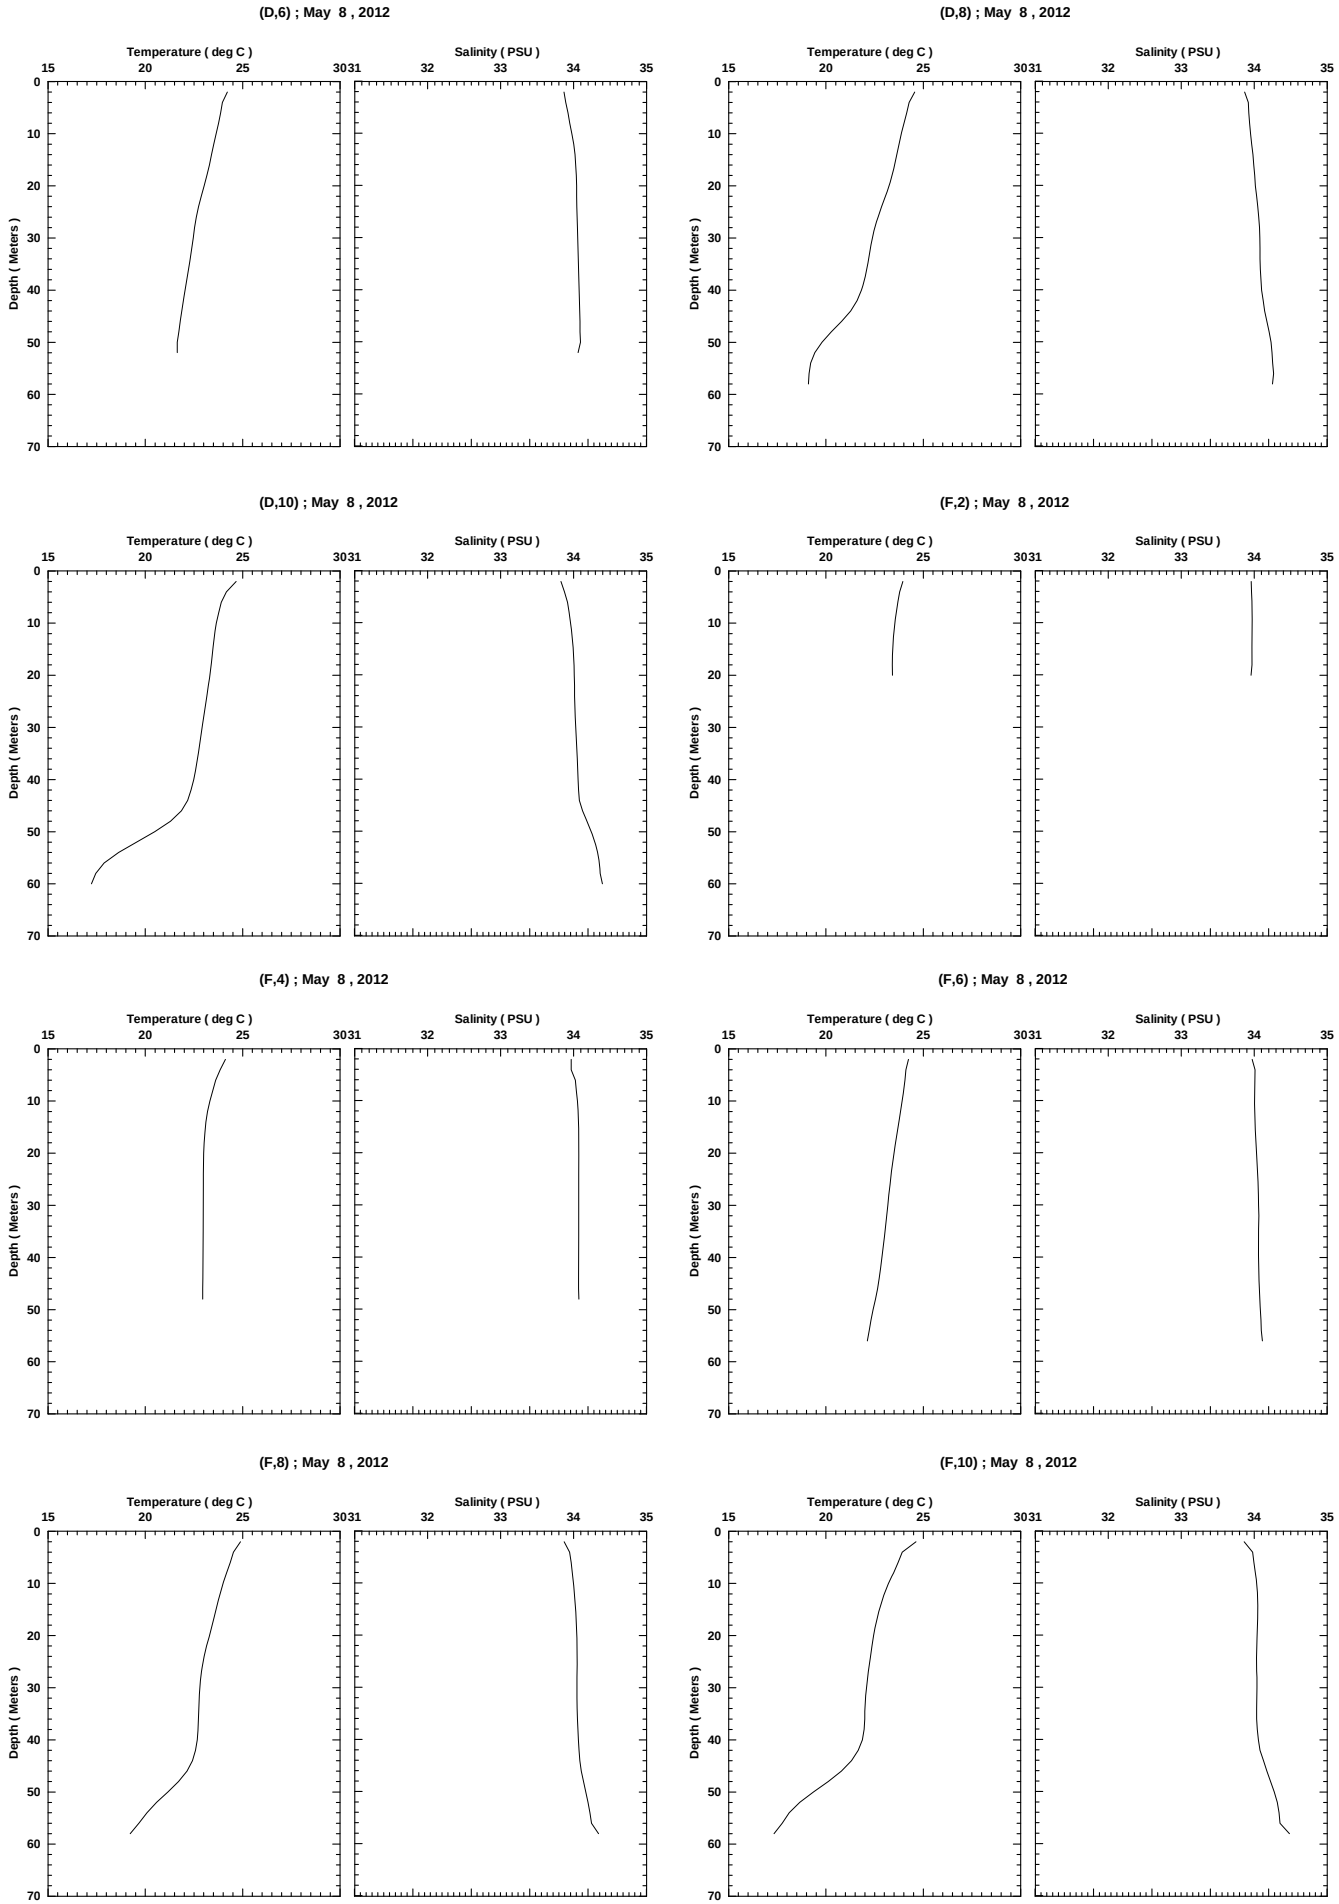

(D,6) ; May 8 , 2012
(D,8) ; May 8 , 2012
(D,10) ; May 8 , 2012
(F,2) ; May 8 , 2012
(F,4) ; May 8 , 2012
(F,6) ; May 8 , 2012
(F,8) ; May 8 , 2012
(F,10) ; May 8 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)


附**4.8-8**

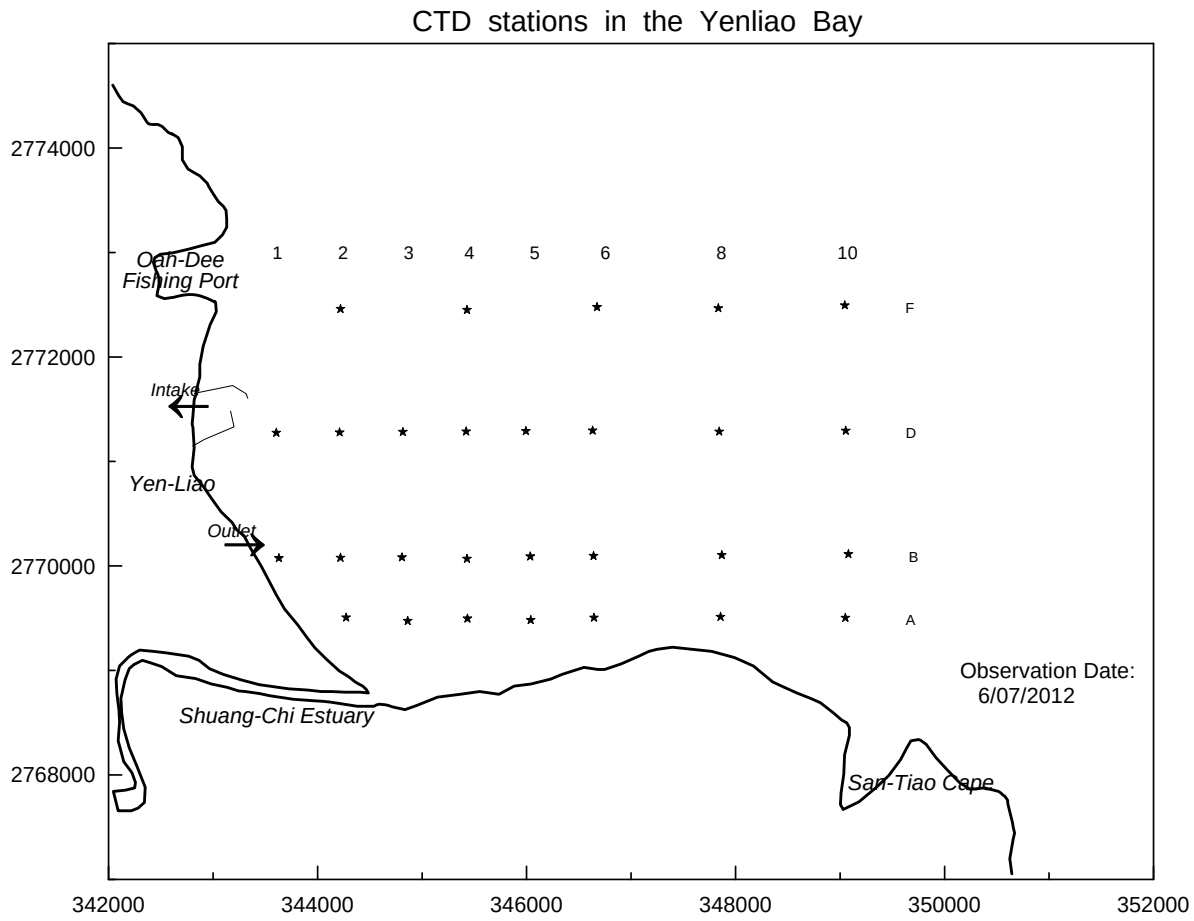



附錄Ⅳ.8-3 海象CTD調查101年6月7日縱深剖面溫鹽圖

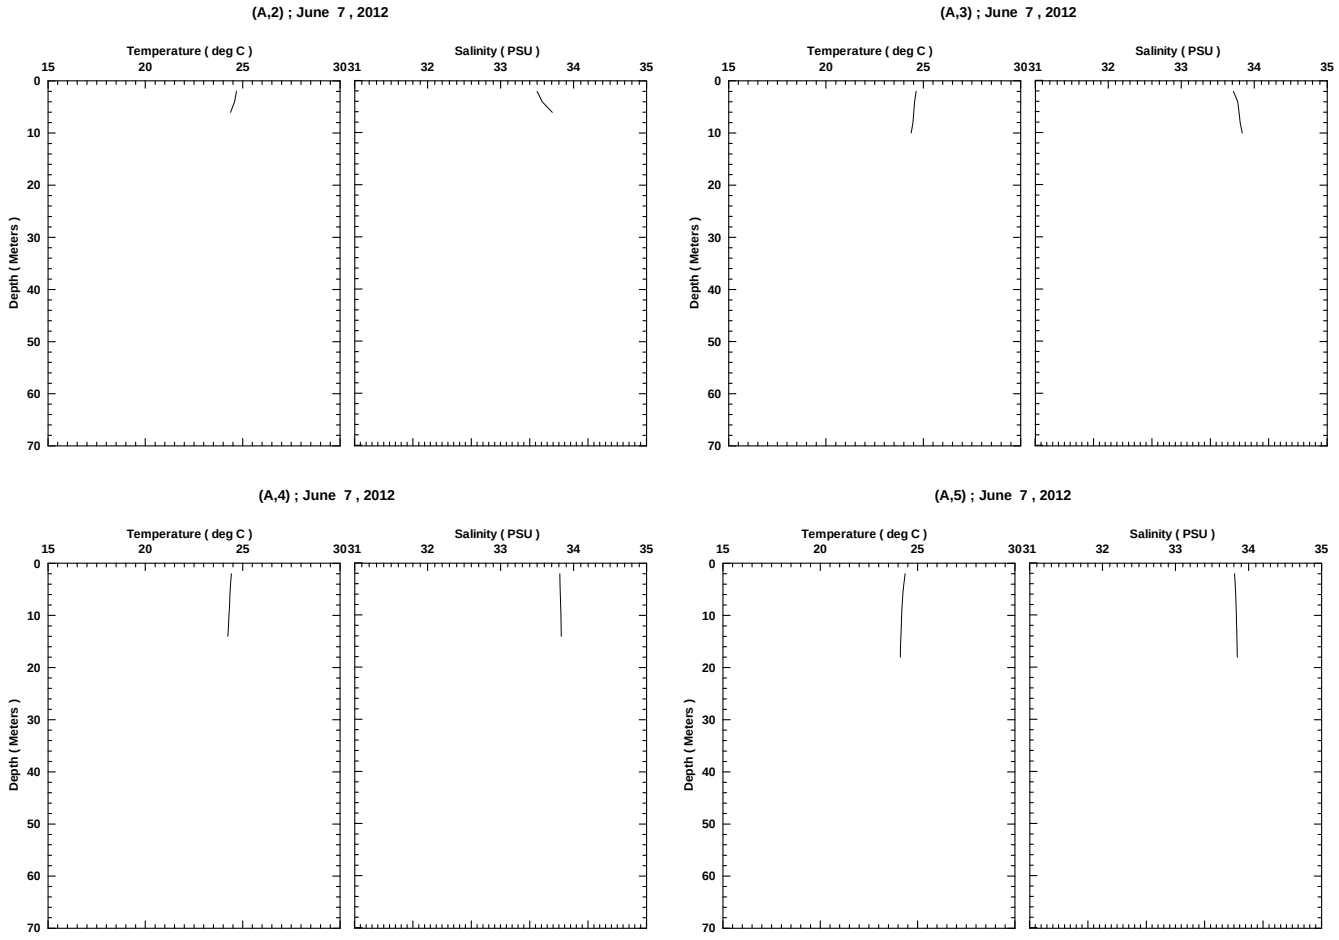


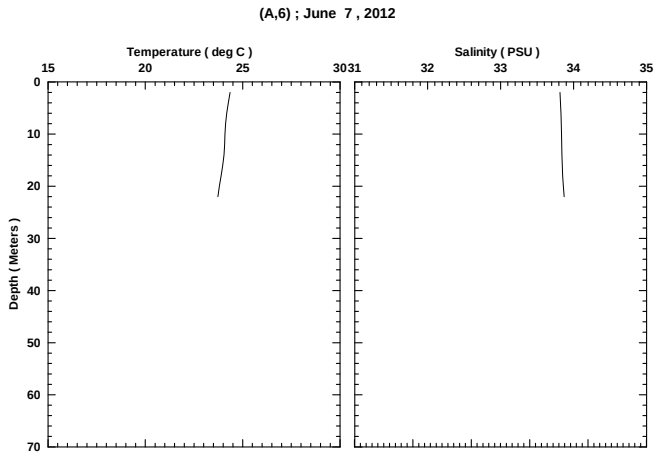

(A,6) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

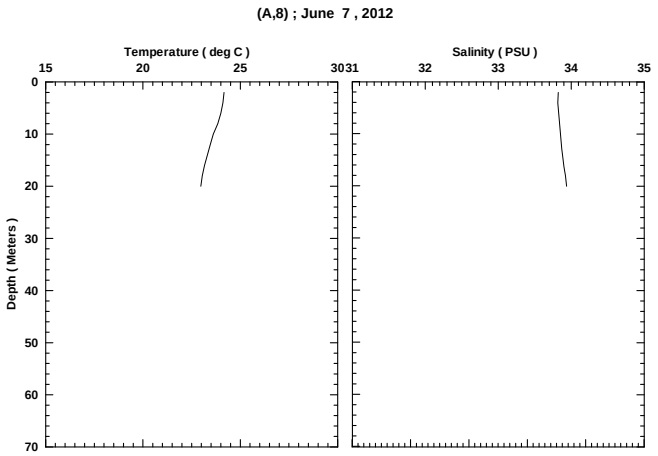

(A,8) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

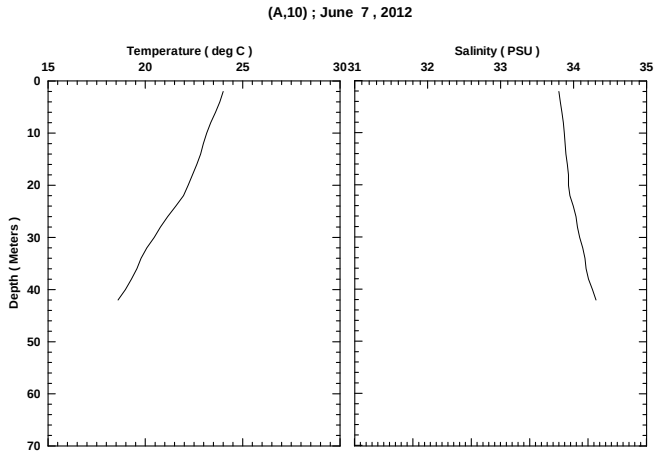

(A,10) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

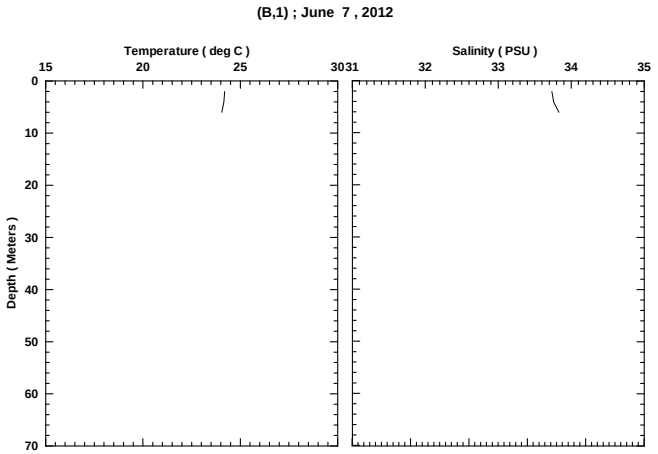

(B,1) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

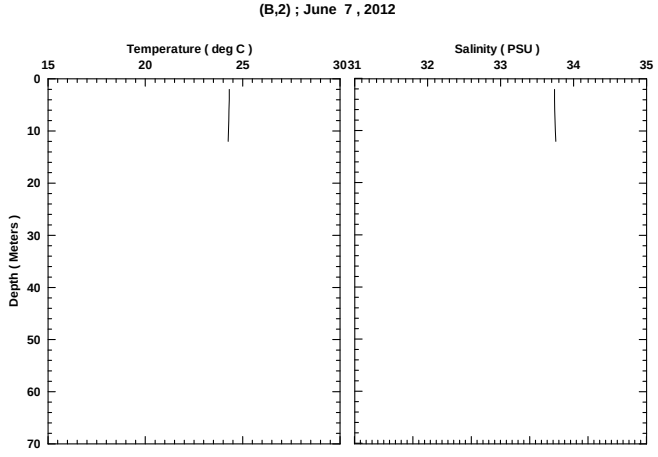

(B,2) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

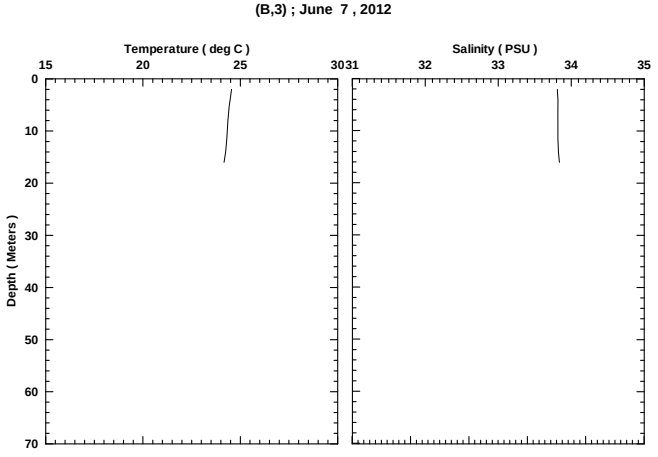

(B,3) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

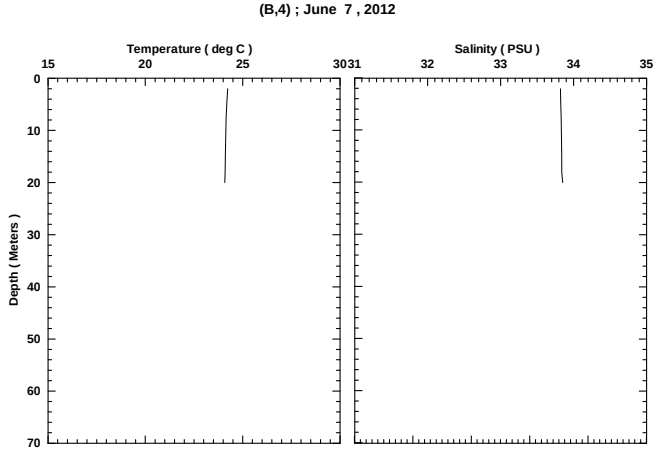

(B,4) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

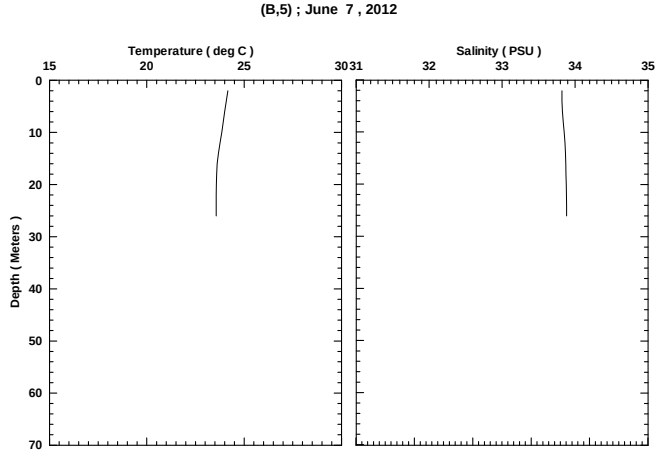

(B,5) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

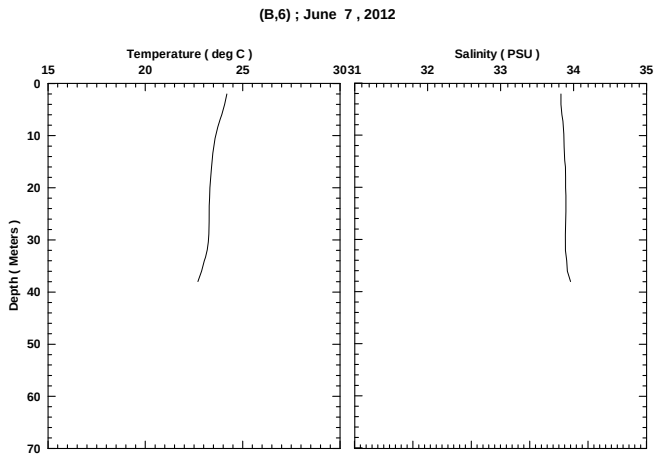

(B,6) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

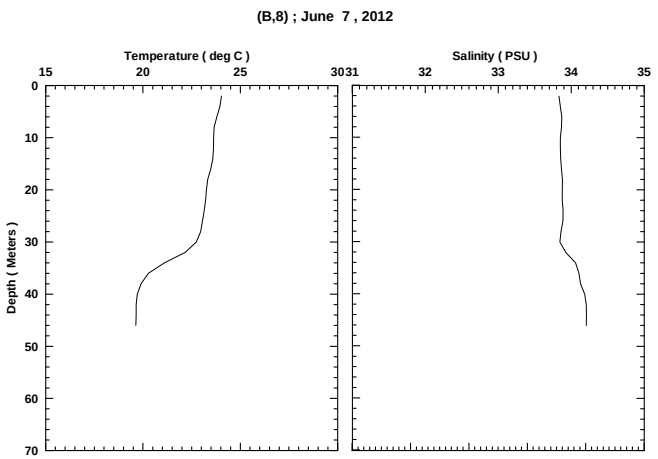

(B,8) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

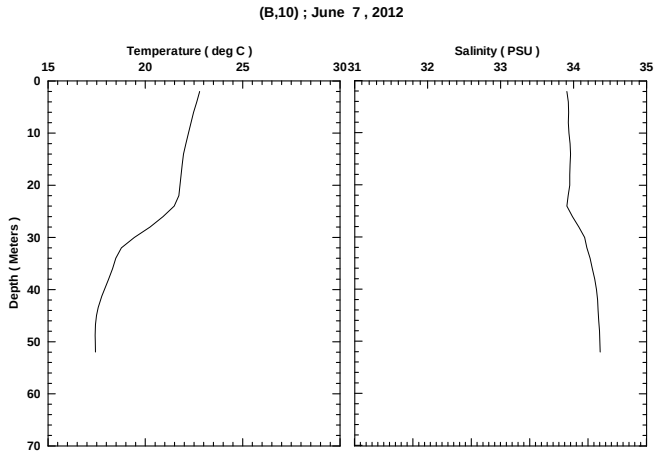

(B,10) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

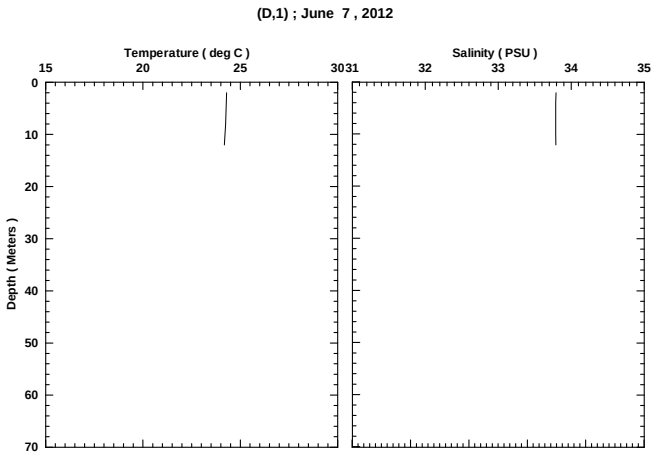

(D,1) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

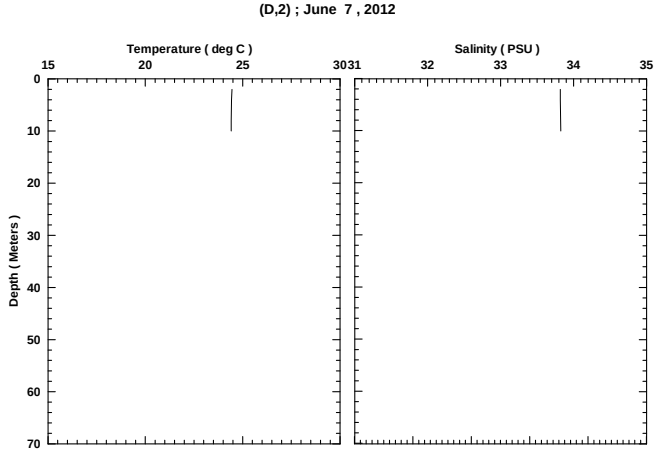

(D,2) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

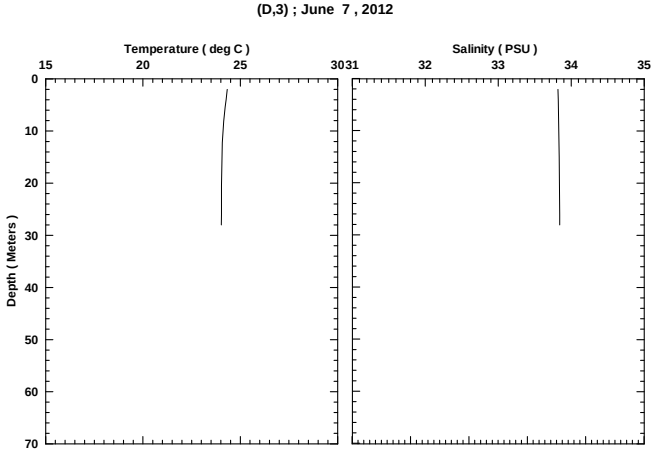

(D,3) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

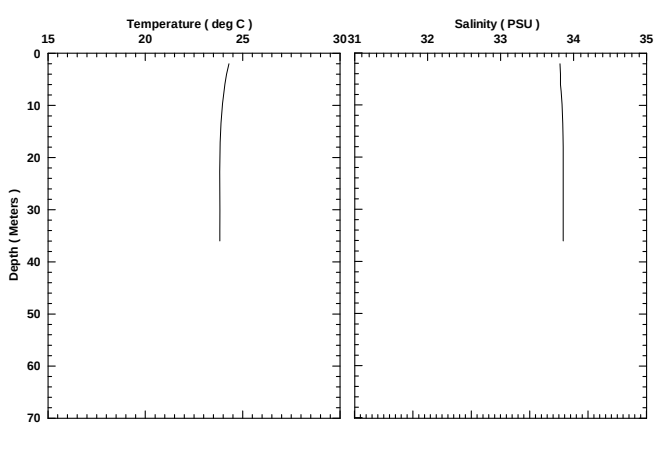

(D,4) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

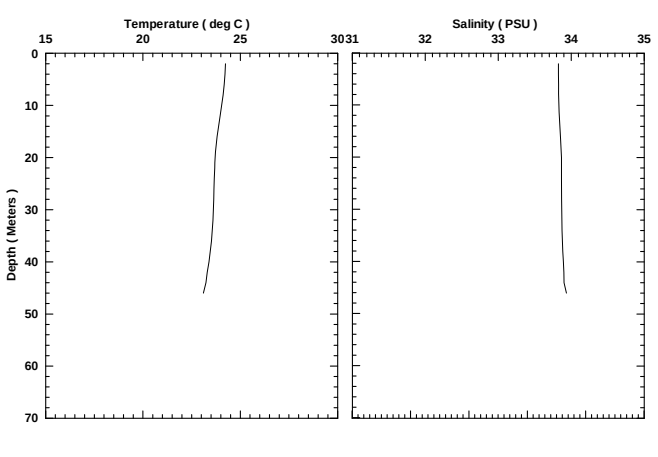

(D,5) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

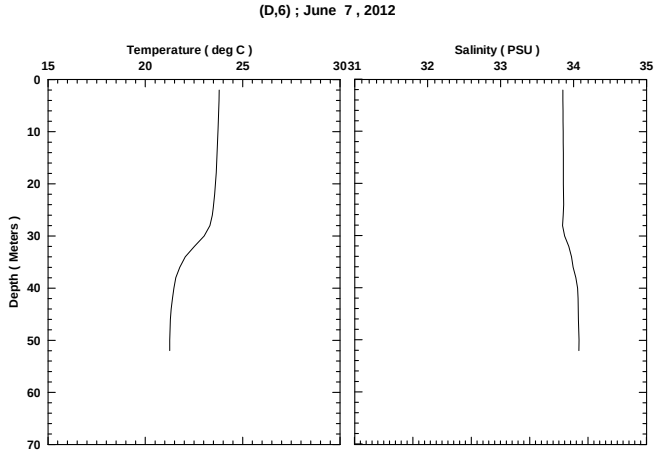

(D,6) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

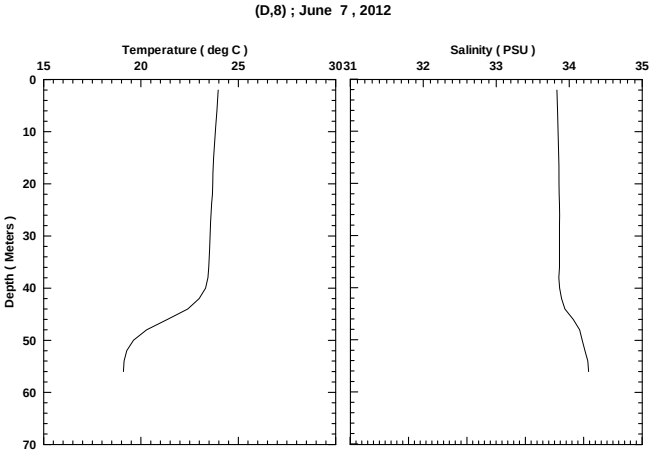

(D,8) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

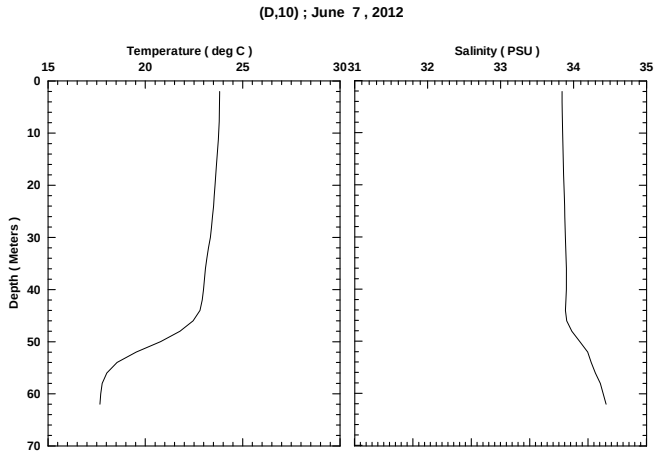

(D,10) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

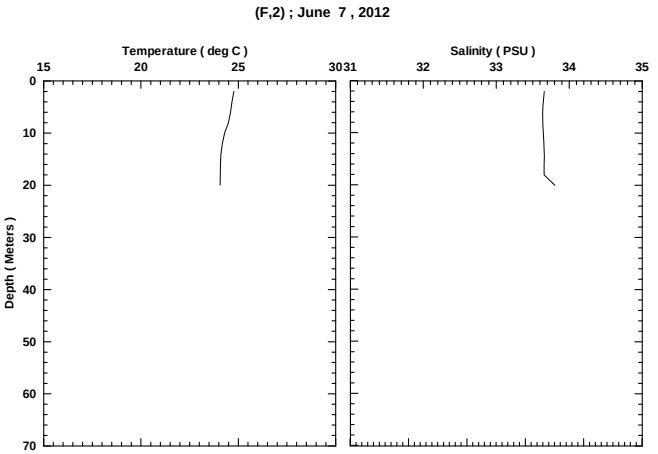
(F,2) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

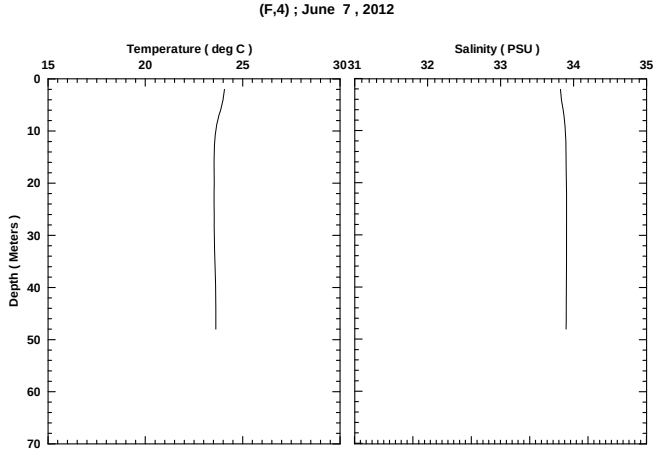
(F,4) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

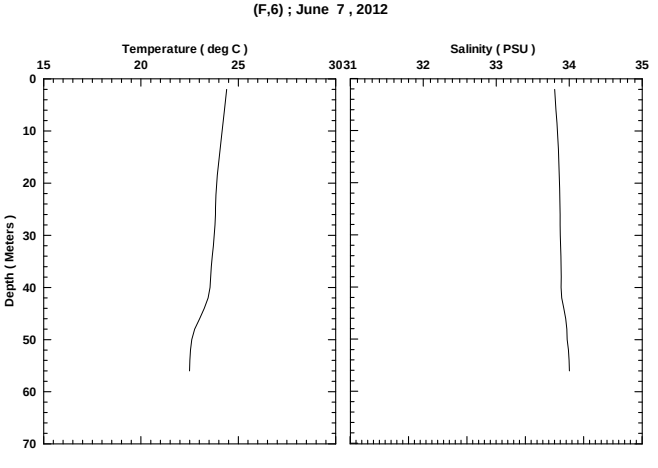
(F,6) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

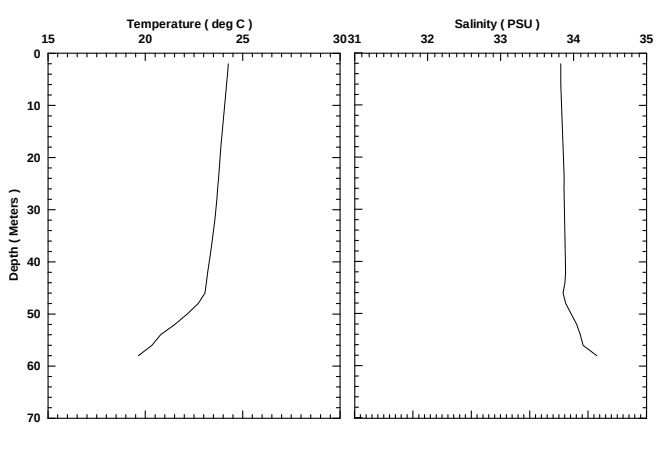
(F,8) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

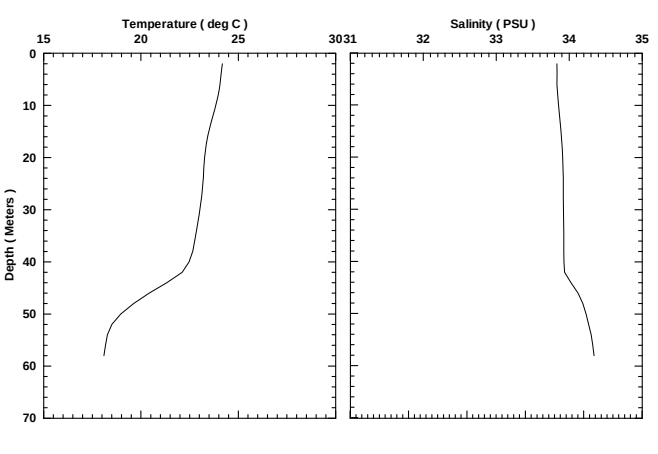
(F,10) ; June 7 , 2012
Temperature (deg C)
Salinity (PSU)
Depth (Meters)

附錄 IV.8-4 核四沿岸潮汐調查 101 年 4 月逐時記錄表

April ,2012

STATION: Yen-Liao
UNIT: M

LUNAR DATE:11/ 3 -- 10/ 4
ELEVATION OF GAGE ZERO: 0 M

HOUR / DATE SOL.	LUN.	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24	TOTAL AVER.	HIGH TIME H M	TIDE LEVEL	LOW TIME H M	TIDE LEVEL
1	11	.08	.10	.15	.17	.20	.22	.20	.20	.21	.17	.17	.17	1.29	540	.23	2040	-.26
		.17	.16	.13	.07	-.02	-.09	-.18	-.24	-.25	-.23	-.17	-.10	.05	**********		**********	
2	12	.00	.10	.18	.24	.26	.26	.25	.21	.18	.16	.14	.18	2.51	530	.28	1050	.13
		.22	.29	.30	.27	.18	.10	-.02	-.12	-.22	-.25	-.24	-.16	.10	1450	.31	2220	-.28
3	13	-.07	.08	.23	.31	.28	.32	.29	.21	.19	.13	.14	.12	3.98	610	.34	1130	.11
		.14	.26	.37	.44	.46	.33	.21	.09	-.05	-.14	-.18	-.18	.17	1620	.49	2320	-.20
4	14	-.05	.12	.28	.45	.52	.49	.39	.27	.15	.06	-.03	-.06	2.84	500	.52	1150	-.06
		.01	.14	.26	.32	.35	.24	.09	-.08	-.18	-.28	-.31	-.31	.12	1650	.36	2330	-.33
5	15	-.21	-.10	.05	.17	.22	.22	.09	.02	-.09	-.14	-.23	-.26	1.38	500	.22	1140	-.27
		-.23	-.08	.09	.31	.50	.57	.45	.30	.13	.00	-.16	-.24	.06	1800	.57	**********	
6	16	-.21	-.09	.10	.31	.51	.59	.57	.40	.18	-.01	-.18	-.36	3.26	620	.61	20	-.25
		-.37	-.29	-.11	.11	.35	.51	.58	.49	.30	.12	-.06	-.18	.14	1900	.58	1300	-.37
7	17	-.26	-.20	-.04	.18	.37	.54	.53	.38	.15	-.05	-.24	-.42	1.23	620	.56	100	-.26
		-.53	-.54	-.41	-.18	.08	.33	.50	.45	.34	.22	.07	-.04	.05	1910	.51	1330	-.55
8	18	-.13	-.13	-.02	.15	.34	.50	.58	.48	.31	.09	-.14	-.34	1.09	700	.58	130	-.16
		-.51	-.61	-.56	-.40	-.19	.07	.31	.41	.36	.28	.18	.06	.05	2000	.41	1400	-.61
9	19	-.04	-.08	-.03	.11	.27	.42	.58	.58	.44	.23	.03	-.17	1.31	730	.60	210	-.08
		-.38	-.54	-.62	-.56	-.40	-.18	.07	.26	.38	.37	.32	.25	.05	2120	.38	1500	-.62
10	20	.18	.11	.08	.14	.27	.40	.51	.59	.58	.42	.22	-.01	2.17	820	.59	240	.06
		-.21	-.37	-.51	-.54	-.48	-.34	-.14	.06	.24	.35	.32	.30	.09	2220	.36	1550	-.54
11	21	.26	.22	.17	.17	.23	.31	.43	.53	.54	.49	.35	.17	2.71	830	.56	320	.16
		-.02	-.18	-.32	-.43	-.45	-.40	-.28	-.11	.05	.24	.38	.36	.11	2300	.38	1710	-.45
12	22	.37	.33	.34	.31	.31	.34	.39	.46	.53	.54	.49	.38	3.95	940	.55	430	.31
		.20	.08	-.06	-.18	-.26	-.31	-.29	-.25	-.13	.00	.13	.23	.16	**********		1810	-.32
13	23	.30	.34	.32	.32	.33	.28	.31	.32	.37	.39	.40	.37	3.88	440	.35	610	.28
		.27	.21	.11	.00	-.07	-.17	-.20	-.23	-.19	-.11	.03	.18	.16	1140	.42	1940	-.24
14	24	.30	.39	.43	.45	.44	.40	.35	.35	.32	.33	.37	.39	5.06	400	.45	900	.32
		.37	.32	.26	.19	.10	-.02	-.12	-.15	-.18	-.16	-.08	.01	.21	1200	.39	2050	-.19
15	25	.17	.30	.40	.43	.43	.40	.37	.32	.27	.24	.25	.27	5.39	430	.43	1020	.22
		.30	.35	.34	.28	.24	.17	.11	.03	-.08	-.12	-.07	-.01	.22	1400	.35	2200	-.12
16	26	.11	.24	.39	.43	.44	.43	.41	.31	.25	.15	.14	.16	5.11	510	.44	1050	.13
		.23	.28	.34	.35	.29	.24	.15	.08	-.04	-.10	-.11	-.06	.21	1530	.36	2300	-.11
17	27	.03	.17	.31	.41	.43	.40	.33	.28	.20	.12	.05	.08	5.12	430	.45	1110	.05
		.13	.21	.31	.40	.40	.36	.26	.18	.11	.01	-.04	-.02	.21	1620	.41	2310	-.04
18	28	.05	.15	.29	.40	.45	.42	.34	.25	.17	.06	-.03	-.03	4.98	510	.45	1120	-.04
		.02	.12	.22	.35	.39	.40	.34	.25	.19	.13	.03	.02	.21	1800	.40	**********	
19	29	.07	.16	.31	.43	.50	.49	.44	.33	.20	.10	-.04	-.11	5.85	520	.51	20	.01
		-.08	.02	.15	.31	.43	.49	.46	.41	.33	.23	.14	.08	.24	1800	.49	1210	-.11
20	30	.07	.18	.31	.45	.54	.56	.52	.40	.26	.11	-.03	-.13	6.20	600	.56	20	.06
		-.17	-.10	.05	.23	.39	.48	.51	.45	.38	.32	.25	.17	.26	1850	.51	1250	-.17
21	1	.13	.20	.32	.45	.58	.64	.59	.49	.33	.18	.04	-.12	6.88	600	.64	40	.12
		-.20	-.17	-.05	.13	.31	.47	.55	.53	.47	.42	.34	.25	.29	1910	.56	1320	-.20
22	2	.18	.20	.27	.38	.53	.65	.64	.55	.38	.20	.03	-.14	5.44	620	.67	100	.18
		-.27	-.31	-.24	-.09	.09	.27	.40	.45	.40	.35	.28	.24	.23	1950	.46	1350	-.31
23	3	.21	.19	.23	.34	.45	.53	.56	.52	.37	.19	.00	-.16	4.39	640	.57	200	.19
		-.26	-.32	-.30	-.20	-.03	.16	.29	.38	.41	.33	.26	.24	.18	2100	.41	1420	-.34
24	4	.20	.20	.25	.35	.46	.54	.60	.55	.45	.28	.08	-.06	4.98	700	.60	130	.18
		-.20	-.28	-.29	-.23	-.08	.10	.30	.38	.38	.37	.33	.30	.21	2010	.39	1440	-.30
25	5	.30	.28	.30	.36	.46	.55	.61	.62	.55	.43	.26	.09	6.14	740	.63	220	.27
		-.06	-.18	-.26	-.24	-.16	.03	.19	.33	.40	.44	.43	.41	.26	2150	.45	1520	-.26
26	6	.42	.42	.44	.41	.46	.53	.59	.63	.60	.53	.40	.26	5.66	730	.65	330	.39
		.07	-.11	-.20	-.27	-.28	-.17	-.05	.09	.20	.21	.24	.24	.24	2320	.24	1640	-.28
27	7	.23	.21	.25	.30	.33	.36	.38	.41	.37	.29	.22	.05	2.41	800	.41	200	.21
		-.03	-.16	-.23	-.28	-.29	-.24	-.19	-.08	.02	.12	.17	.20	.10	**********		1630	-.31
28	8	.20	.21	.22	.25	.29	.32	.40	.43	.43	.41	.37	.27	3.88	820	.45	1750	-.20
		.17	.06	-.05	-.14	-.18	-.20	-.15	-.10	-.01	.13	.24	.31	.16	**********		**********	
29	9	.36	.38	.37	.37	.38	.38	.41	.42	.42	.46	.48	.45	6.01	1050	.48	1910	-.12
		.38	.28	.19	.09	-.02	-.07	-.12	-.08	-.06	.05	.19	.30	.25	**********		**********	
30	10	.39	.42	.44	.46	.42	.39	.37	.34	.33	.36	.40	.43	7.22	410	.47	830	.32
		.43	.40	.38	.30	.21	.16	.05	.00	.00	.06	.18	.30	.30	1230	.44	2030	-.02

Statistics	Elevation	Time (Date)
Monthly Highest High Water Level:	.67 M	620H (22D)
Monthly Mean High Water Level of Spring Tide:	.50 M	
Monthly Mean High Water Level:	.46 M	
Monthly Mean High Water Level of Neap Tide:	.38 M	
Monthly Mean Tidal Level:	.18 M	
Monthly Mean Low Water Level of Neap Tide:	.00 M	
Monthly Mean Low Water Level:	-.10 M	
Monthly Mean Low Water Level of Spring Tide:	-.20 M	
Monthly Lowest Low Water Level:	-.62 M	1500H (9D)
Monthly Maximum Tidal Range:	1.22 M	730H (9D) To 1500H (9D)
Monthly Mean Tidal Range:	.56 M	
Monthly Minimum Tidal Range:	.03 M	2320H (26D) To 200H (27D)

附錄 IV.8-5 核四沿岸潮汐調查 101 年 5 月逐時記錄表

May ,2012

STATION: Yen-Liao
UNIT: M

LUNAR DATE:11/ 4 -- 11/ 4
ELEVATION OF GAGE ZERO: 0 M

HOUR DATE SOL.	LUN.	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24	TOTAL AVER.	HIGH TIME H M	TIDE LEVEL	LOW TIME H M	TIDE LEVEL
1	11	.42	.51	.56	.56	.56	.49	.44	.36	.32	.29	.28	.34	8.51	430	.57	1050	.28
		.44	.46	.48	.43	.38	.31	.22	.13	.05	.07	.15	.26	.35	1450	.48	2110	.05
2	12	.37	.50	.57	.59	.58	.53	.45	.34	.26	.19	.17	.24	9.00	400	.59	1050	.17
		.36	.46	.56	.58	.54	.48	.38	.29	.16	.10	.10	.20	.38	1550	.59	2220	.09
3	13	.32	.47	.58	.62	.56	.50	.41	.30	.15	.03	-.02	.02	7.38	350	.62	1050	-.03
		.11	.25	.41	.49	.52	.47	.41	.27	.20	.14	.07	.10	.31	1650	.53	2320	.07
4	14	.22	.38	.50	.59	.61	.51	.38	.20	.09	-.05	-.17	-.22	6.07	450	.61	1150	-.23
		-.16	.00	.21	.42	.54	.56	.49	.36	.24	.15	.13	.09	.25	1720	.57	**********	
5	15	.14	.30	.49	.62	.68	.62	.48	.27	.09	-.11	-.27	-.37	5.55	500	.68	10	.09
		-.35	-.21	.03	.26	.45	.55	.56	.47	.38	.24	.15	.08	.23	1830	.58	1230	-.39
6	16	.11	.24	.39	.57	.69	.69	.62	.42	.18	-.06	-.28	-.48	4.82	530	.70	10	.08
		-.53	-.47	-.27	-.02	.25	.45	.54	.54	.45	.37	.26	.16	.20	1930	.56	1300	-.53
7	17	.14	.16	.30	.49	.64	.72	.72	.57	.34	.10	-.15	-.39	4.39	630	.74	120	.13
		-.56	-.62	-.51	-.32	-.05	.24	.46	.54	.50	.42	.37	.28	.18	2010	.55	1340	-.64
8	18	.20	.17	.25	.41	.57	.71	.76	.70	.55	.32	.05	-.17	5.13	700	.76	200	.17
		-.40	-.57	-.58	-.46	-.24	.01	.31	.51	.56	.55	.48	.44	.21	2120	.57	1430	-.59
9	19	.36	.32	.32	.39	.51	.67	.79	.82	.73	.59	.34	.12	6.69	740	.84	220	.31
		-.10	-.31	-.42	-.47	-.40	-.21	.03	.29	.52	.65	.61	.54	.28	2210	.65	1600	-.47
10	20	.50	.45	.41	.36	.41	.55	.66	.74	.72	.66	.48	.28	6.44	820	.76	410	.36
		.10	-.06	-.23	-.35	-.38	-.32	-.17	.01	.24	.40	.50	.48	.27	2320	.51	1710	-.39
11	21	.47	.44	.40	.37	.37	.41	.47	.55	.60	.57	.53	.36	5.88	920	.61	430	.35
		.20	.07	-.03	-.15	-.22	-.24	-.19	-.09	.08	.20	.32	.39	.25	**********		1750	-.24
12	22	.42	.43	.41	.38	.37	.37	.37	.42	.45	.49	.50	.43	6.20	200	.43	620	.36
		.34	.22	.11	.01	-.05	-.08	-.09	-.08	.01	.12	.26	.39	.26	1030	.50	1850	-.09
13	23	.44	.45	.46	.43	.41	.36	.36	.36	.39	.41	.44	.45	7.32	250	.46	720	.35
		.42	.34	.27	.22	.14	.09	.04	.05	.07	.13	.24	.35	.31	1150	.46	1920	.03
14	24	.45	.49	.51	.48	.46	.41	.36	.31	.29	.28	.30	.34	7.42	240	.51	1000	.28
		.38	.37	.33	.29	.24	.20	.16	.11	.11	.12	.17	.26	.31	1330	.39	2130	.09
15	25	.39	.45	.52	.52	.48	.43	.36	.27	.22	.19	.20	.27	7.89	330	.52	1040	.18
		.32	.36	.39	.39	.36	.33	.32	.25	.21	.17	.22	.27	.33	1440	.40	2200	.17
16	26	.35	.46	.54	.55	.50	.44	.36	.28	.16	.09	.09	.15	7.61	340	.55	1020	.08
		.19	.27	.34	.40	.39	.37	.33	.30	.27	.25	.24	.29	.32	1610	.40	2240	.23
17	27	.36	.45	.52	.57	.56	.49	.33	.27	.17	.06	-.02	-.02	7.28	430	.58	1140	-.03
		.06	.18	.29	.38	.43	.43	.38	.33	.28	.26	.24	.28	.30	1730	.44	2300	.24
18	28	.32	.42	.50	.58	.58	.50	.37	.25	.13	.02	-.08	-.09	7.02	430	.59	1140	-.09
		-.03	.07	.22	.34	.44	.48	.43	.38	.34	.31	.27	.27	.29	1750	.48	2330	.26
19	29	.32	.41	.50	.56	.59	.55	.43	.28	.12	.01	-.09	-.15	7.10	450	.59	1220	-.16
		-.13	-.02	.12	.27	.40	.48	.49	.47	.42	.39	.34	.34	.30	1900	.49	2320	.33
20	30	.36	.43	.56	.66	.74	.73	.67	.50	.32	.17	.03	-.08	9.20	530	.75	1300	-.13
		-.13	-.08	.04	.19	.37	.54	.63	.63	.58	.50	.44	.40	.38	1930	.64	**********	
21	1	.37	.41	.51	.60	.66	.72	.66	.53	.38	.19	.03	-.13	7.26	610	.72	50	.37
		-.25	-.26	-.17	-.03	.15	.35	.48	.51	.47	.40	.35	.33	.30	1940	.51	1330	-.28
22	2	.31	.32	.40	.49	.58	.65	.67	.57	.39	.18	.00	-.14	6.17	640	.68	120	.30
		-.27	-.32	-.27	-.15	.04	.27	.45	.48	.46	.39	.34	.33	.26	2010	.48	1400	-.32
23	3	.31	.34	.37	.47	.57	.66	.72	.68	.51	.31	.12	-.05	6.78	710	.72	100	.31
		-.19	-.28	-.29	-.19	-.01	.19	.37	.46	.50	.44	.40	.37	.28	2100	.50	1430	-.29
24	4	.33	.34	.35	.42	.52	.60	.67	.66	.58	.41	.22	.04	6.63	720	.68	100	.33
		-.12	-.24	-.28	-.27	-.15	.06	.26	.40	.49	.50	.43	.41	.28	2120	.51	1440	-.29
25	5	.37	.35	.34	.37	.44	.53	.61	.65	.64	.54	.38	.19	6.78	830	.68	300	.34
		.04	-.10	-.20	-.26	-.21	-.07	.09	.26	.41	.49	.48	.44	.28	2230	.51	1600	-.26
26	6	.40	.38	.36	.34	.38	.44	.52	.58	.59	.55	.41	.29	6.51	840	.59	400	.34
		.16	.03	-.09	-.15	-.17	-.13	-.01	.12	.26	.38	.44	.43	.27	2310	.45	1640	-.18
27	7	.43	.42	.38	.38	.34	.38	.43	.49	.54	.54	.48	.39	6.98	930	.56	450	.34
		.27	.17	.08	-.05	-.11	-.10	-.04	.08	.20	.34	.46	.48	.29	**********		1720	-.11
28	8	.48	.47	.45	.43	.37	.32	.35	.37	.43	.44	.48	.44	7.28	30	.48	600	.32
		.37	.30	.18	.11	.02	-.02	-.01	.05	.14	.27	.38	.46	.30	1040	.50	1830	-.03
29	9	.47	.48	.46	.46	.40	.33	.27	.25	.26	.29	.34	.37	6.85	220	.50	820	.24
		.36	.31	.25	.18	.13	.09	.05	.07	.10	.20	.31	.42	.29	1230	.38	1920	.04
30	10	.50	.52	.50	.46	.41	.35	.27	.18	.16	.16	.21	.29	7.53	140	.52	930	.15
		.37	.41	.40	.36	.29	.24	.18	.16	.16	.23	.30	.42	.31	1420	.42	2030	.14
31	11	.55	.63	.63	.58	.49	.40	.29	.17	.07	.00	.04	.13	8.29	230	.64	1010	-.01
		.28	.41	.52	.56	.51	.44	.34	.27	.20	.19	.26	.33	.35	1550	.57	2150	.18

Statistics	Elevation	Time (Date)
Monthly Highest High Water Level:	.84 M	740H (9D)
Monthly Mean High Water Level of Spring Tide:	.64 M	
Monthly Mean High Water Level:	.56 M	
Monthly Mean High Water Level of Neap Tide:	.51 M	
Monthly Mean Tidal Level:	.30 M	
Monthly Mean Low Water Level of Neap Tide:	.15 M	
Monthly Mean Low Water Level:	.04 M	
Monthly Mean Low Water Level of Spring Tide:	-.09 M	
Monthly Lowest Low Water Level:	-.64 M	1340H (7D)
Monthly Maximum Tidal Range:	1.38 M	630H (7D) To 1340H (7D)
Monthly Mean Tidal Range:	.52 M	
Monthly Minimum Tidal Range:	.07 M	200H (12D) To 620H (12D)

附錄 IV.8-6 核四沿岸潮汐調查 101 年 6 月逐時記錄表

June ,2012

STATION: Yen-Liao
UNIT: M

LUNAR DATE:12/ 4 -- 12/ 5
ELEVATION OF GAGE ZERO: 0 M

HOUR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	HIGH	TIDE	LOW	TIDE
DATE		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	AVER.	TIME	LEVEL	TIME	LEVEL
SOL.	LUN.														H M		H M	
1	12	.47	.57	.62	.61	.54	.43	.30	.14	-.02	-.16	-.19	-.13	7.08	330	.64	1110	-.19
		-.02	.17	.37	.50	.53	.49	.43	.39	.31	.23	.21	.29	.29	1700	.53	2250	.20
2	13	.42	.53	.64	.70	.64	.49	.33	.18	.00	-.18	-.30	-.30	7.54	410	.71	1130	-.30
		-.22	.00	.26	.46	.62	.64	.60	.55	.47	.37	.30	.34	.31	1750	.64	2310	.30
3	14	.42	.53	.67	.79	.79	.67	.53	.32	.15	-.07	-.28	-.40	7.63	430	.81	1230	-.42
		-.37	-.25	-.02	.24	.47	.60	.61	.55	.51	.46	.37	.34	.32	1830	.64	2400	.34
4	15	.36	.47	.60	.74	.81	.78	.67	.45	.22	-.02	-.19	-.37	7.50	510	.81	1310	-.48
		-.47	-.41	-.24	-.01	.28	.52	.63	.62	.59	.52	.50	.45	.31	1930	.64	**********	
5	16	.37	.41	.53	.68	.80	.87	.85	.67	.45	.18	-.05	-.27	7.76	620	.87	110	.36
		-.45	-.48	-.41	-.24	.02	.29	.53	.68	.66	.60	.57	.50	.32	2030	.69	1340	-.49
6	17	.39	.36	.42	.56	.69	.82	.85	.80	.60	.35	.09	-.10	6.94	700	.85	140	.35
		-.29	-.45	-.48	-.39	-.20	.07	.29	.47	.54	.56	.52	.47	.29	2130	.57	1500	-.48
7	18	.43	.38	.34	.40	.54	.66	.76	.79	.69	.50	.26	.05	6.77	740	.80	300	.34
		-.15	-.30	-.41	-.37	-.26	-.07	.14	.33	.49	.55	.53	.49	.28	2220	.56	1500	-.41
8	19	.46	.42	.35	.34	.40	.51	.64	.70	.73	.62	.43	.24	7.18	840	.74	340	.32
		.04	-.09	-.22	-.30	-.27	-.16	.03	.23	.41	.55	.56	.56	.30	2230	.58	1550	-.31
9	20	.53	.47	.40	.35	.35	.42	.50	.58	.65	.64	.55	.39	8.14	930	.66	430	.34
		.26	.12	.00	-.08	-.13	-.10	-.01	.15	.32	.50	.63	.65	.34	2350	.65	1650	-.13
10	21	.61	.55	.50	.43	.37	.36	.40	.47	.55	.59	.56	.47	8.85	1000	.59	550	.36
		.37	.28	.21	.14	.04	.03	.05	.12	.25	.39	.53	.58	.37	**********		1810	.03
11	22	.58	.58	.54	.49	.42	.36	.36	.35	.41	.45	.51	.52	9.92	50	.59	730	.34
		.48	.40	.34	.29	.27	.24	.23	.26	.30	.42	.52	.60	.41	1200	.52	1840	.22
12	23	.66	.67	.65	.61	.54	.44	.38	.33	.33	.36	.41	.45	10.45	220	.68	830	.32
		.47	.45	.41	.37	.38	.34	.32	.31	.31	.34	.43	.49	.44	1250	.47	2040	.30
13	24	.58	.60	.59	.56	.49	.42	.34	.24	.21	.20	.22	.26	9.26	150	.60	950	.20
		.33	.35	.38	.39	.39	.39	.39	.37	.35	.36	.40	.45	.39	1710	.40	2120	.33
14	25	.51	.56	.58	.56	.49	.44	.35	.24	.14	.11	.11	.14	8.79	310	.58	1020	.09
		.20	.29	.36	.40	.41	.41	.44	.44	.38	.37	.41	.45	.37	1920	.44	2140	.37
15	26	.50	.56	.60	.60	.55	.47	.37	.25	.15	.05	.01	.02	8.66	330	.62	1100	.01
		.10	.20	.32	.42	.45	.47	.46	.46	.44	.40	.39	.42	.36	1810	.47	2250	.38
16	27	.47	.53	.60	.63	.60	.53	.44	.30	.13	.00	-.10	-.12	8.25	350	.63	1150	-.12
		-.07	.05	.20	.36	.48	.53	.52	.50	.47	.43	.39	.38	.34	1800	.53	2330	.37
17	28	.43	.50	.57	.62	.61	.54	.42	.31	.17	.02	-.11	-.17	7.79	420	.63	1230	-.19
		-.16	-.05	.10	.26	.42	.51	.51	.49	.47	.47	.44	.42	.32	1850	.52	2400	.42
18	29	.45	.53	.62	.67	.70	.65	.57	.42	.27	.13	.00	-.09	9.26	450	.70	1240	-.15
		-.14	-.10	.06	.22	.42	.52	.59	.58	.58	.57	.53	.51	.39	1920	.60	**********	
19	1	.48	.54	.63	.71	.76	.76	.69	.56	.40	.25	.11	-.04	10.32	530	.78	100	.48
		-.16	-.15	-.04	.13	.34	.54	.66	.68	.65	.64	.61	.57	.43	1950	.68	1320	-.17
20	2	.54	.54	.62	.70	.76	.81	.79	.70	.56	.40	.23	.02	10.56	610	.81	130	.52
		-.13	-.19	-.13	.04	.22	.43	.63	.69	.65	.60	.58	.50	.44	1950	.69	1400	-.19
21	3	.45	.45	.48	.58	.65	.71	.70	.63	.52	.34	.16	-.04	7.66	550	.71	220	.44
		-.22	-.31	-.32	-.21	-.04	.17	.39	.53	.55	.52	.50	.47	.32	2040	.57	1450	-.32
22	4	.44	.39	.39	.47	.55	.64	.68	.68	.59	.41	.23	.05	7.34	730	.69	220	.38
		-.09	-.20	-.28	-.26	-.14	.04	.24	.44	.56	.55	.50	.46	.31	2120	.56	1510	-.28
23	5	.41	.37	.34	.38	.45	.53	.63	.70	.68	.54	.36	.19	7.31	820	.71	300	.34
		.04	-.12	-.22	-.24	-.18	-.04	.14	.31	.49	.55	.51	.49	.30	2150	.56	1550	-.24
24	6	.43	.39	.33	.33	.37	.43	.53	.60	.63	.57	.44	.29	7.43	850	.63	340	.32
		.14	.00	-.13	-.19	-.17	-.08	.08	.26	.41	.58	.62	.57	.31	2300	.62	1600	-.19
25	7	.50	.45	.38	.32	.31	.34	.42	.49	.54	.57	.52	.41	7.95	1000	.57	500	.31
		.30	.20	.08	-.03	-.07	-.01	.10	.22	.36	.47	.55	.53	.33	2320	.55	1700	-.07
26	8	.52	.47	.43	.36	.28	.27	.30	.36	.41	.47	.49	.44	7.91	1100	.49	550	.27
		.35	.28	.21	.13	.05	.04	.09	.17	.31	.41	.50	.57	.33	**********		1740	.04
27	9	.56	.49	.43	.35	.27	.20	.18	.18	.23	.28	.37	.40	7.47	10	.57	710	.18
		.42	.37	.31	.24	.17	.13	.12	.18	.23	.35	.46	.55	.31	1250	.42	1830	.11
28	10	.56	.53	.49	.41	.30	.19	.09	.04	.05	.09	.17	.27	7.54	40	.57	800	.04
		.37	.42	.40	.39	.35	.30	.27	.25	.27	.34	.45	.54	.31	1400	.42	2000	.25
29	11	.59	.59	.52	.43	.32	.21	.13	.01	-.05	-.07	-.03	.03	6.56	130	.60	1010	-.07
		.16	.27	.33	.35	.35	.34	.33	.30	.29	.31	.39	.46	.27	1540	.36	2050	.28
30	12	.56	.62	.62	.53	.41	.30	.15	.01	-.12	-.21	-.23	-.17	6.77	230	.63	1040	-.24
		-.01	.18	.31	.42	.45	.47	.48	.45	.38	.35	.38	.44	.28	1900	.48	2150	.34

Statistics	Elevation	Time (Date)
Monthly Highest High Water Level:	.87 M	620H (5D)
Monthly Mean High Water Level of Spring Tide:	.70 M	
Monthly Mean High Water Level:	.61 M	
Monthly Mean High Water Level of Neap Tide:	.53 M	
Monthly Mean Tidal Level:	.35 M	
Monthly Mean Low Water Level of Neap Tide:	.16 M	
Monthly Mean Low Water Level:	.09 M	
Monthly Mean Low Water Level of Spring Tide:	.02 M	
Monthly Lowest Low Water Level:	-.49 M	1340H (5D)
Monthly Maximum Tidal Range:	1.36 M	620H (5D) To 1340H (5D)
Monthly Mean Tidal Range:	.53 M	
Monthly Minimum Tidal Range:	.07 M	1710H (13D) To 2120H (13D)

附錄 IV.8-7 核四施工環境監測沿岸水溫調查 101 年 4 月逐時記錄表

April ,2012

Station:Yen-Liao　　Water Depth: 6 M

Unit: deg C　　Sensor Depth: 4 M

Hr Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Avg.	Max.	Min.
1	13.8	13.8	14.0	14.0	13.9	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.1	14.1	14.0	14.1	14.1	14.3	14.0	14.7	13.8
2	14.6	14.7	14.7	14.7	14.8	14.7	14.7	14.8	14.9	15.2	15.3	15.5	15.6	16.0	16.5	16.8	16.7	16.3	15.7	15.5	15.2	15.1	15.1	15.1	15.3	16.8	14.7
3	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	15.0	15.2	15.2	15.4	15.6	15.8	15.8	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	14.8	14.6	14.6	14.4	14.4	14.4	15.0	16.0	14.3
4	14.3	14.4	14.3	14.5	14.7	14.7	14.8	15.0	15.5	15.9	16.3	16.5	16.7	16.8	16.9	16.9	16.8	16.8	16.8	16.7	16.6	16.6	16.6	16.7	15.9	17.0	14.3
5	16.6	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.6	16.6	16.7	16.5	16.5	16.4	16.4	16.3	16.3	16.2	16.1	16.4	16.3	16.5	16.7	15.8
6	15.9	15.7	15.6	15.7	15.6	15.9	16.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.6	15.5	15.5	15.5	15.4	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.6	16.1	15.3
7	15.3	15.4	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.7	15.7	15.8	16.1	16.4	16.6	16.5	16.4	16.4	16.3	16.2	16.4	16.5	16.3	16.1	16.1	16.1	16.0	16.9	15.3
8	15.9	16.0	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	16.1	16.3	16.4	16.3	16.2	16.1	16.1	16.0	16.0	15.9	16.1	15.9	15.8	15.8	15.9	16.0	16.4	15.7
9	15.9	15.7	15.5	15.5	15.5	15.2	15.3	15.4	15.4	15.4	15.6	15.9	16.0	15.9	15.7	15.7	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.5	16.0	15.1
10	15.2	15.2	15.4	15.4	15.4	15.5	15.7	16.0	16.5	16.8	17.8	18.6	19.1	18.2	17.4	18.4	18.9	17.4	16.5	16.3	16.0	16.0	16.1	16.0	16.7	19.2	15.2
11	15.9	15.9	16.0	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4	17.0	17.7	19.1	20.2	20.3	20.5	20.7	20.4	20.7	20.8	20.8	20.9	20.8	20.9	20.8	20.7	18.8	21.2	15.8
12	20.8	20.7	20.6	20.6	20.7	20.9	21.1	21.1	21.1	21.3	21.2	21.3	21.5	21.6	21.6	21.7	21.6	21.5	21.5	21.5	21.6	21.7	21.6	21.6	21.3	21.8	20.6
13	21.7	21.7	21.7	21.7	21.8	21.8	22.1	22.6	22.8	23.0	22.8	23.0	23.0	23.1	23.3	23.5	23.5	23.5	23.4	23.4	23.3	23.2	23.2	23.3	22.8	23.6	21.7
14	23.2	23.2	23.1	23.1	23.1	23.1	23.0	23.0	22.9	22.8	22.8	22.7	22.8	22.8	22.8	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.6	22.6	22.9	23.2	22.6
15	22.6	22.6	22.5	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.6	22.6	22.8	22.8	23.0	23.1	23.0	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	22.8	23.1	22.5
16	23.1	23.1	23.1	23.1	23.0	23.0	23.0	23.0	22.9	22.9	22.9	22.9	23.0	23.0	22.9	22.9	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8	22.8	22.7	22.7	22.9	23.1	22.6
17	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.5	22.6	22.6	22.6	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.6	22.6	22.7	22.6	22.6	22.6	22.6	22.8	22.5
18	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.7	22.7	22.6	22.7	22.7	22.6	22.7	22.9	23.0	22.9	23.0	22.9	23.0	22.9	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8	22.8	23.0	22.1
19	22.8	22.8	22.8	22.7	22.6	22.6	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.6	22.6	22.6	22.8	22.7	21.7	21.2	20.8	20.6	20.4	20.2	20.1	20.1	22.0	22.9	20.0
20	20.0	19.8	19.9	19.9	20.0	20.2	20.5	20.6	20.7	20.8	21.0	21.1	21.1	21.3	21.3	21.4	21.7	21.5	21.3	21.1	21.0	21.0	20.9	21.0	20.8	21.8	19.7
21	21.2	21.1	21.0	20.9	20.9	20.9	21.3	21.6	22.5	23.1	24.0	24.4	24.6	24.5	24.2	23.3	23.3	23.1	23.1	23.4	23.4	23.4	23.3	23.3	22.7	24.6	20.8
22	23.2	23.2	23.2	23.1	23.1	23.1	23.0	22.9	22.9	22.8	22.8	22.9	22.9	23.0	23.0	23.1	23.1	23.0	23.1	23.0	23.0	23.0	23.0	22.9	23.0	23.2	22.8
23	23.1	23.0	23.0	22.9	22.9	22.9	22.8	22.8	22.9	23.0	23.2	23.3	23.4	23.5	23.7	23.6	23.6	23.8	23.7	23.5	23.5	23.5	23.3	23.3	23.3	23.9	22.8
24	23.2	23.2	21.1	20.1	19.9	19.7	19.5	19.6	19.9	20.2	20.8	22.9	22.9	23.0	23.1	23.4	23.4	23.1	23.2	23.2	23.0	22.6	22.9	22.9	22.0	23.6	19.4
25	22.8	22.8	22.8	22.8	22.6	22.5	22.6	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.6	22.7	22.6	22.7	22.6	22.6	22.6	22.7	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.8	22.5
26	22.6	22.6	22.3	22.6	22.5	22.5	22.5	22.4	22.4	22.4	22.3	22.3	22.3	22.3	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.0	22.0	22.1	22.0	22.0	22.3	22.6	21.9
27	22.1	22.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.0	21.9	21.9	22.0	22.0	22.0	22.1	21.6	19.8	19.8	19.7	19.4	19.3	19.2	19.3	19.3	19.4	21.1	22.3	19.1
28	19.6	19.6	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	19.2	19.6	20.3	21.3	22.1	22.7	22.5	22.0	21.0	20.3	19.8	19.7	19.2	18.9	18.8	18.7	18.6	20.0	22.9	18.5
29	18.5	18.4	18.4	18.5	18.5	18.6	18.6	19.0	19.9	21.4	22.4	22.9	21.8	21.3	21.9	22.3	22.3	21.7	20.1	19.7	19.6	19.5	19.7	19.7	20.2	23.1	18.4
30	19.6	19.5	19.4	19.5	19.5	19.7	19.8	20.0	20.5	21.2	22.7	23.6	24.3	24.4	24.4	23.5	21.8	21.1	20.8	20.0	19.7	19.5	19.4	19.6	21.0	24.7	19.3

---- 1. Monthly average: 19.8 2. Monthly maximum: 24.7 3. Monthly minimum: 13.8 ----

附錄 IV.8-8 核四施工環境監測沿岸水溫調查 101 年 5 月逐時記錄表

May ,2012

Station:Yen-Liao　　Water Depth: 6 M

Unit: deg C　　Sensor Depth: 4 M

Hr / Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Avg.	Max.	Min.
1	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.6	19.9	20.5	21.2	22.3	23.3	23.5	23.8	23.5	22.9	22.9	22.4	21.6	20.6	20.2	20.1	20.0	19.8	21.0	23.9	19.4
2	19.8	19.9	19.9	20.0	20.1	20.2	20.2	20.3	20.3	20.4	21.0	21.9	22.5	22.2	21.7	21.3	21.0	20.6	20.3	20.1	20.0	19.7	19.8	19.9	20.5	22.9	19.6
3	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.3	20.5	20.8	20.6	20.3	20.3	20.1	20.1	20.0	19.9	19.9	19.8	19.7	19.7	20.1	20.8	19.6
4	19.6	19.6	19.6	19.8	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.8	19.8	19.8	19.6	19.2	19.2	19.5	19.5	19.6	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.9	19.7	20.0	18.8
5	19.8	19.8	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	20.2	20.8	21.6	22.5	23.0	23.0	22.9	22.9	22.8	22.2	21.4	20.6	19.8	19.4	19.3	19.2	19.1	20.8	23.1	19.0
6	19.1	18.9	19.0	18.9	18.7	18.6	18.6	18.8	19.0	19.4	20.1	20.6	20.7	20.7	20.8	20.9	20.8	20.9	20.0	19.4	19.1	18.8	18.7	18.8	19.6	21.1	18.5
7	18.8	18.4	18.0	17.9	17.9	17.8	17.8	18.0	18.4	18.9	19.4	19.7	20.1	20.3	20.3	20.6	20.4	20.1	19.7	19.1	18.8	18.7	18.5	17.9	19.0	20.7	17.4
8	17.3	17.0	16.8	16.8	16.9	16.9	16.9	17.0	17.2	17.8	18.6	18.8	19.3	19.6	19.6	19.5	19.6	19.5	19.1	18.9	18.6	18.4	18.3	18.2	18.2	19.7	16.7
9	18.0	18.0	17.8	17.7	17.6	17.5	17.6	17.7	17.9	18.1	18.2	18.5	19.0	19.0	18.7	18.2	18.1	18.0	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	18.1	19.1	17.5
10	18.1	18.2	18.3	18.3	18.3	18.3	18.5	18.6	18.7	18.9	19.0	19.1	19.2	19.2	19.2	19.2	19.1	19.0	18.9	18.8	18.8	18.8	18.9	19.0	18.8	19.3	18.1
11	19.0	19.0	19.1	19.3	19.2	19.3	19.4	19.5	19.7	19.8	20.4	20.5	20.7	21.2	20.8	20.7	20.2	20.3	20.1	20.0	20.1	20.1	20.1	20.2	19.9	21.5	19.0
12	20.2	20.1	20.1	20.2	20.1	20.1	20.4	20.4	20.6	20.5	20.8	20.8	21.1	21.1	21.1	21.5	21.4	21.1	21.1	20.9	20.8	20.8	20.8	21.0	20.7	21.6	20.0
13	21.2	21.3	21.5	21.5	21.6	21.8	21.9	22.1	22.1	22.6	23.5	24.1	24.4	24.4	24.3	24.4	24.0	23.5	22.6	21.2	20.1	19.7	19.6	19.5	22.2	24.7	19.4
14	19.4	19.3	19.3	19.3	19.2	19.2	19.3	19.6	20.5	21.5	22.5	23.0	23.3	23.2	22.9	22.6	22.2	21.7	20.7	20.0	19.5	19.2	19.1	19.2	20.7	23.6	19.1
15	19.3	19.3	19.3	19.2	19.1	19.1	19.2	19.4	20.0	20.8	21.1	21.6	22.5	22.0	20.7	20.2	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.4	19.5	19.5	20.0	23.0	19.1
16	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.1	20.3	20.4	20.8	21.2	21.5	21.7	22.4	22.5	21.7	21.5	21.4	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.0	22.8	19.5
17	21.4	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.7	21.9	22.0	22.2	22.2	22.1	21.9	21.5	21.5	21.8	21.9	21.7	21.6	21.4	21.3	21.1	21.2	21.2	21.6	22.3	21.1
18	21.1	21.1	21.0	20.9	20.8	20.8	20.8	21.1	22.0	23.6	24.8	24.8	25.0	24.9	24.2	23.7	23.2	22.3	21.7	21.2	21.0	20.8	20.7	20.6	22.2	25.2	20.5
19	20.5	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5	20.7	21.1	22.2	24.0	23.9	23.4	23.3	22.7	22.2	21.0	20.4	20.2	20.1	20.0	20.0	19.9	21.2	24.2	19.9
20	19.9	19.9	19.8	19.9	19.9	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2	20.4	20.6	20.6	20.5	20.5	20.6	20.8	20.6	20.4	20.2	20.2	20.1	20.2	20.2	20.2	20.9	19.8
21	20.2	20.2	20.2	20.2	20.1	20.3	20.3	20.4	20.7	20.9	21.1	21.4	22.4	22.8	22.8	22.5	22.0	21.2	20.7	20.3	20.2	20.1	20.0	20.0	20.9	22.9	20.0
22	20.0	20.0	20.0	20.0	19.9	19.8	19.8	20.0	20.4	20.8	20.6	20.8	21.2	21.2	21.1	21.2	21.2	21.1	20.6	20.1	19.9	19.7	19.6	19.5	20.4	21.4	19.5
23	19.5	19.4	19.4	19.3	19.3	19.3	19.3	19.4	19.6	20.0	20.6	20.6	20.4	20.5	20.5	20.4	20.6	20.7	20.4	19.9	19.7	19.6	19.5	19.3	19.9	20.8	19.1
24	19.1	19.1	19.1	19.2	19.2	19.3	19.3	19.5	19.7	20.1	20.4	20.6	20.7	20.9	20.9	21.0	20.7	20.6	20.3	19.9	19.4	19.2	19.0	18.7	19.8	21.1	18.6
25	18.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5	18.5	18.8	19.1	19.3	19.7	19.9	20.3	20.5	20.2	19.9	19.6	19.5	19.4	19.2	19.1	19.2	19.1	19.1	19.2	20.5	18.5
26	19.0	19.0	18.9	18.9	18.8	18.8	18.9	19.0	19.2	19.5	20.0	20.5	20.4	20.1	19.8	19.6	19.3	19.2	19.1	19.1	19.0	19.0	19.1	19.1	19.3	20.6	18.8
27	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.6	19.7	19.7	19.8	19.9	20.1	20.1	20.2	19.5	20.2	19.0
28	20.1	20.2	20.3	20.5	20.7	20.8	21.2	21.5	21.6	21.8	21.8	22.1	22.1	22.3	22.5	22.2	22.1	22.0	22.0	22.0	22.1	22.1	22.1	22.3	21.6	22.8	20.1
29	22.4	22.3	22.4	22.7	23.1	23.3	23.6	23.9	23.9	24.1	24.5	24.6	24.8	24.7	24.6	24.3	24.0	23.7	23.6	23.5	23.3	23.1	23.3	23.2	23.6	24.8	22.2
30	23.1	23.1	23.0	23.1	23.0	22.9	23.0	23.1	23.4	24.2	24.4	24.4	24.4	24.2	24.6	24.4	24.1	23.5	22.5	21.9	21.6	21.5	21.5	21.5	23.2	24.7	21.3
31	21.4	21.5	21.5	21.3	21.2	21.1	21.4	21.4	21.7	21.8	22.1	22.1	22.0	21.8	22.3	22.4	21.7	21.3	20.9	20.7	20.6	20.6	20.7	20.6	21.4	22.5	20.5

---- 1. Monthly average: 20.5 2. Monthly maximum: 25.2 3. Monthly minimum: 16.7 ----

附錄 IV.8-9 核四施工環境監測沿岸水溫調查 101 年 6 月逐時記錄表

June ,2012

Station:Yen-Liao　　Water Depth: 6 M

Unit: deg C　　Sensor Depth: 4 M

Hr Day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Avg.	Max.	Min.
1	22.9	22.9	22.8	22.8	22.8	23.0	23.1	23.1	23.4	23.5	23.8	24.4	24.4	24.3	24.2	24.5	25.0	24.7	23.9	23.4	23.1	23.1	23.2	23.1	23.6	25.1	22.8
2	23.1	23.1	23.1	23.0	23.0	23.1	23.3	23.5	23.7	23.8	23.8	23.7	23.8	23.9	24.2	24.4	24.5	24.3	24.1	23.9	23.6	23.6	23.7	23.7	23.7	24.6	22.9
3	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7	23.8	24.1	24.3	24.3	24.4	24.3	24.3	24.4	24.7	24.8	24.7	24.6	24.6	24.6	24.3	24.2	24.3	24.3	24.4	24.2	25.0	23.6
4	24.4	24.6	24.3	24.3	24.3	24.5	25.4	25.7	26.0	26.3	26.4	26.5	26.6	26.9	27.1	27.0	26.9	26.6	26.4	26.1	25.9	25.9	26.1	26.1	25.8	27.2	24.2
5	26.0	25.9	25.8	25.9	26.0	26.1	26.4	26.4	26.4	26.6	27.0	27.2	27.1	27.0	27.0	26.8	26.4	26.2	25.6	24.7	24.2	23.9	23.7	23.7	25.9	27.2	23.6
6	23.7	23.7	23.5	23.3	23.3	23.4	23.9	24.0	24.1	25.2	26.3	26.9	26.8	26.5	26.1	26.2	26.1	25.4	24.4	23.7	23.3	23.1	22.9	22.9	24.5	26.9	22.8
7	22.8	22.8	22.9	22.8	22.5	22.4	22.4	22.6	23.4	24.8	26.1	26.5	26.5	26.4	26.7	26.4	25.9	26.4	26.4	26.1	26.0	25.8	25.5	25.2	24.8	27.1	22.4
8	24.7	24.7	24.6	24.6	24.5	24.7	24.7	24.7	24.7	24.8	25.0	25.2	25.2	25.2	25.5	25.4	25.4	25.4	25.5	25.6	25.6	25.6	25.5	25.4	25.1	25.7	24.5
9	25.0	24.7	24.7	24.8	24.8	24.8	24.5	24.5	24.7	24.9	25.1	25.2	25.3	25.5	24.9	25.3	25.3	25.4	25.4	25.4	25.5	25.5	25.6	25.5	25.1	25.6	23.8
10	25.5	25.5	25.4	25.3	25.3	25.4	25.4	25.6	26.3	26.6	26.8	26.9	26.9	27.0	26.9	26.8	26.8	26.8	26.8	26.9	26.9	26.9	26.7	26.6	26.3	27.0	25.3
11	26.6	26.5	26.3	26.2	26.3	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	26.3	26.5	26.6	26.7	26.8	26.7	26.5	26.5	26.5	26.5	26.4	26.5	26.5	26.4	26.4	26.8	26.1
12	26.4	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4	26.5	26.6	26.6	26.6	26.7	26.8	26.8	26.9	27.0	27.0	27.0	27.0	27.1	27.0	26.8	26.9	27.0	27.0	26.7	27.1	26.3
13	27.0	27.1	27.1	27.1	27.0	27.0	27.1	27.1	27.0	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.1	27.1	26.9
14	27.0	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	26.9	26.9	26.9	26.9	27.0	27.1	26.9
15	26.9	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.7	26.8	26.8	26.8	26.8	26.7	26.6	26.3	25.7	25.1	24.6	24.3	24.1	23.8	23.6	23.5	23.4	25.8	27.2	23.4
16	23.4	23.7	23.6	23.6	23.5	23.6	23.7	24.0	24.7	25.6	26.5	27.4	27.7	27.6	27.7	26.6	25.4	24.8	24.4	24.2	24.1	24.1	24.1	24.1	24.9	27.9	23.4
17	24.1	24.1	24.0	24.0	23.9	24.0	24.1	24.2	24.6	24.4	24.7	25.3	25.4	25.4	25.5	24.9	24.8	24.6	24.5	24.6	24.7	24.6	24.6	24.5	24.6	25.7	23.9
18	24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.0	24.1	24.5	25.4	26.2	26.7	27.0	27.1	26.5	26.2	26.0	26.2	25.6	25.3	24.9	24.6	24.3	24.3	24.2	25.2	27.3	23.9
19	24.1	24.1	24.1	24.1	24.2	24.2	24.2	24.1	24.2	24.4	24.6	25.0	25.1	25.4	25.9	26.2	25.5	25.1	24.9	24.7	24.6	24.5	24.4	24.5	24.7	26.3	24.1
20	24.5	24.5	24.5	24.6	24.5	24.5	24.6	24.6	24.8	25.1	25.2	25.2	25.0	25.0	25.1	25.3	25.5	25.3	25.3	25.2	25.1	25.0	25.0	25.0	24.9	25.5	24.5
21	24.8	24.8	24.8	24.7	24.8	24.9	25.0	24.9	25.1	25.3	25.4	25.4	25.8	25.6	25.4	25.5	25.2	24.8	24.6	24.5	24.4	24.5	24.4	24.3	25.0	25.9	24.3
22	24.3	24.4	24.2	24.2	24.4	24.4	24.6	24.7	25.3	26.0	26.8	27.9	28.3	28.3	28.3	28.3	27.9	26.3	25.6	24.9	24.6	24.4	24.3	24.1	25.7	28.5	24.0
23	24.1	24.2	23.8	23.4	23.0	23.0	23.3	23.7	24.5	25.2	26.4	27.0	27.8	28.4	28.8	28.7	27.7	27.1	26.9	25.4	24.5	24.2	24.0	23.8	25.4	28.8	22.7
24	23.7	23.6	23.6	23.5	23.3	23.3	23.9	24.4	24.9	25.4	25.8	25.7	25.8	26.3	26.4	26.0	25.6	25.0	25.0	25.2	24.8	24.6	24.5	24.3	24.8	26.5	23.1
25	24.2	24.1	24.1	24.1	24.1	23.9	23.8	24.0	24.4	25.1	25.5	25.8	26.5	26.2	25.8	26.1	25.6	25.1	24.9	24.7	24.5	24.4	24.3	24.3	24.8	26.7	23.8
26	24.2	24.1	24.1	24.0	24.0	24.1	24.1	24.0	24.4	25.0	25.6	25.9	26.0	25.9	25.7	25.4	25.1	24.8	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.4	24.7	26.0	23.7
27	24.4	24.4	24.3	24.2	24.3	24.2	23.9	23.8	23.9	24.4	25.0	25.6	26.3	26.4	26.2	25.9	25.6	25.1	24.8	24.6	24.4	24.4	24.4	24.3	24.8	26.9	23.7
28	24.3	24.4	24.3	24.3	24.2	24.2	24.0	24.2	24.6	24.7	25.0	25.0	24.9	24.8	24.8	24.8	25.0	24.9	24.6	24.7	24.6	24.6	24.5	24.6	24.6	25.1	23.9
29	24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.3	24.3	24.3	24.5	24.7	24.8	24.9	24.9	25.0	25.0	25.0	24.8	24.7	24.6	24.5	24.3	24.1	23.7	23.6	24.5	25.1	23.5
30	23.6	23.5	23.4	23.3	23.2	23.4	23.1	23.2	23.4	23.7	23.7	23.5	23.8	23.8	23.9	24.1	23.8	23.5	23.4	23.2	23.1	23.1	23.1	23.5	23.5	24.1	23.0

---- 1. Monthly average: 25.1 2. Monthly maximum: 28.8 3. Monthly minimum: 22.4 ----

附　錄　Ⅳ.9

海域漂砂調查成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:04 21 Jun 2012

15e.$01, 15en.$01, 15es.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 15en.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	205.8 um	95% Conf. Limits:	42.1-370 um
Median:	198.7 um	S.D.:	83.5 um
Mean/Median Ratio:	1.036	Variance:	6980 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	40.6%
		Skewness:	0.76 Right skewed
		Kurtosis:	2.71 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	126.9	168.7	198.7	214.9	299.1

Volume Statistics (Arithmetic) 15es.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	208.6 um	95% Conf. Limits:	38.1-379 um
Median:	201.8 um	S.D.:	87 um
Mean/Median Ratio:	1.034	Variance:	7570 um^2
Mode:	211.7 um	C.V.:	41.7%
		Skewness:	0.633 Right skewed
		Kurtosis:	2.2 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	125.9	170.9	201.8	218.3	306.0

Particle Diameter um	15e.$01 Diff. Volume %	15e.$01 Cum. < Volume %	15en.$01 Diff. Volume %	15en.$01 Cum. < Volume %	15es.$01 Diff. Volume %	15es.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.050	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
1.168	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
1.301	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01	0.02
1.448	0.03	0.06	0.01	0.03	0.01	0.03
1.612	0.03	0.09	0.02	0.04	0.02	0.05
1.794	0.03	0.12	0.02	0.06	0.02	0.06
1.997	0.03	0.15	0.02	0.08	0.02	0.08
2.223	0.04	0.19	0.02	0.10	0.02	0.11


註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-2 S01(15 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析

附件 4.9-1

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:04 21 Jun 2012

15e.$01, 15en.$01, 15es.$01

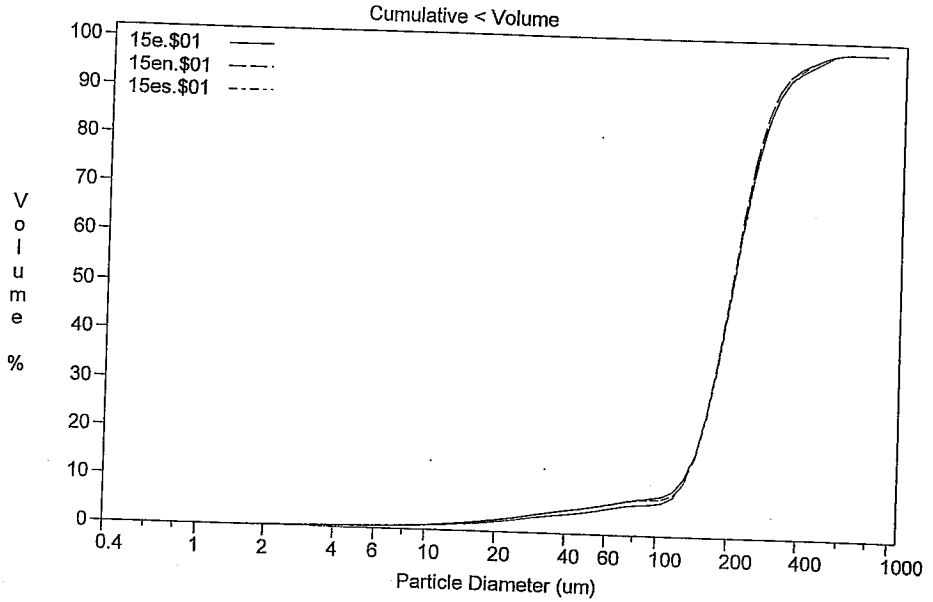

Volume Statistics (Arithmetic) 15e.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	208.2 um	95% Conf. Limits:	31.9-384 um
Median:	200.7 um	S.D.:	89.9 um
Mean/Median Ratio:	1.037	Variance:	8090 um^2
Mode:	211.7 um	C.V.:	43.2%
		Skewness:	0.782 Right skewed
		Kurtosis:	2.48 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	122.1	169.7	200.7	217.4	305.4

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-1 S01(15 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:04 21 Jun 2012

15e.$01, 15en.$01, 15es.$01

Particle Diameter um	15e.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	15en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	15es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	1.23	98.05	0.90	98.63	0.96	98.57
526.6	0.65	99.28	0.43	99.53	0.43	99.53
586.2	0.06	99.94	0.04	99.96	0.04	99.96
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

附4.9-2

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-3 (續一) S01(15 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:04 21 Jun 2012

15e.$01, 15en.$01, 15es.$01

Particle Diameter um	15e.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	15en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	15es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
2.475	0.04	0.22	0.03	0.13	0.03	0.13
2.755	0.04	0.26	0.03	0.15	0.03	0.16
3.067	0.04	0.29	0.03	0.18	0.03	0.19
3.414	0.04	0.33	0.03	0.21	0.04	0.22
3.800	0.04	0.37	0.04	0.25	0.04	0.26
4.230	0.04	0.41	0.04	0.29	0.04	0.30
4.709	0.04	0.45	0.04	0.33	0.05	0.34
5.241	0.05	0.49	0.05	0.37	0.05	0.39
5.835	0.06	0.54	0.05	0.42	0.06	0.44
6.495	0.07	0.60	0.06	0.47	0.07	0.50
7.230	0.08	0.67	0.07	0.53	0.08	0.57
8.048	0.10	0.75	0.08	0.60	0.10	0.66
8.959	0.12	0.85	0.10	0.69	0.12	0.76
9.972	0.15	0.97	0.12	0.79	0.14	0.88
11.10	0.18	1.12	0.14	0.91	0.17	1.02
12.36	0.20	1.29	0.16	1.04	0.19	1.19
13.76	0.22	1.49	0.18	1.20	0.22	1.38
15.31	0.24	1.72	0.21	1.39	0.25	1.60
17.05	0.26	1.96	0.24	1.60	0.28	1.84
18.97	0.29	2.22	0.27	1.83	0.31	2.12
21.12	0.34	2.52	0.31	2.11	0.36	2.43
23.51	0.38	2.85	0.33	2.42	0.39	2.79
26.17	0.40	3.23	0.33	2.75	0.41	3.18
29.13	0.39	3.63	0.30	3.08	0.40	3.59
32.43	0.36	4.02	0.26	3.38	0.36	3.99
36.10	0.33	4.38	0.24	3.64	0.32	4.35
40.18	0.32	4.71	0.25	3.87	0.31	4.67
44.73	0.34	5.04	0.31	4.13	0.33	4.99
49.79	0.38	5.38	0.39	4.44	0.37	5.31
55.43	0.44	5.77	0.45	4.83	0.42	5.68
61.70	0.47	6.20	0.44	5.27	0.45	6.10
68.68	0.44	6.67	0.34	5.71	0.41	6.55
76.46	0.33	7.11	0.20	6.05	0.27	6.96
85.11	0.25	7.45	0.15	6.25	0.14	7.23
94.74	0.37	7.70	0.34	6.40	0.21	7.37
105.5	1.02	8.07	1.15	6.73	0.83	7.58
117.4	2.59	9.09	2.95	7.88	2.47	8.42
130.7	5.15	11.68	5.72	10.83	5.11	10.88
145.5	8.34	16.83	9.00	16.55	8.38	15.99
161.9	11.40	25.17	12.00	25.56	11.48	24.37
180.3	13.39	36.57	13.78	37.55	13.47	35.85
200.6	13.62	49.96	13.76	51.33	13.70	49.32
223.4	11.99	63.58	11.92	65.09	12.09	63.02
248.6	9.07	75.58	8.91	77.01	9.23	75.11
276.8	5.85	84.65	5.70	85.93	6.07	84.33
308.1	3.27	90.50	3.17	91.63	3.56	90.41
342.9	1.83	93.77	1.73	94.80	2.07	93.97
381.8	1.26	95.60	1.13	96.53	1.39	96.04
425.0	1.19	96.87	0.97	97.66	1.14	97.43

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-3 S01(15 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:05 21 Jun 2012

15n.$01, 15s.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 15s.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	216.7 um	95% Conf. Limits:	32.5-401 um
Median:	206.0 um	S.D.:	94 um
Mean/Median Ratio:	1.052	Variance:	8840 um^2
Mode:	211.7 um	C.V.:	43.4%
		Skewness:	0.817 Right skewed
		Kurtosis:	2.04 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	128.2	173.4	206.0	223.2	327.7

Particle Diameter um	15n.$01 Diff. Volume %	15n.$01 Cum. < Volume %	15s.$01 Diff. Volume %	15s.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.00	0.00	0.00	0.00
1.050	0.01	0.00	0.00	0.00
1.168	0.01	0.01	0.00	0.00
1.301	0.01	0.02	0.00	0.01
1.448	0.02	0.03	0.01	0.01
1.612	0.02	0.05	0.01	0.02
1.794	0.02	0.07	0.01	0.03
1.997	0.02	0.09	0.01	0.04
2.223	0.03	0.11	0.02	0.05
2.475	0.03	0.14	0.02	0.07
2.755	0.03	0.17	0.02	0.09
3.067	0.03	0.20	0.03	0.11
3.414	0.04	0.23	0.03	0.14
3.800	0.04	0.26	0.04	0.17
4.230	0.04	0.30	0.04	0.21
4.709	0.05	0.34	0.05	0.25
5.241	0.05	0.39	0.05	0.30
5.835	0.06	0.44	0.06	0.35
6.495	0.06	0.50	0.07	0.41
7.230	0.08	0.56	0.08	0.48
8.048	0.09	0.64	0.09	0.56
8.959	0.11	0.73	0.11	0.65
9.972	0.13	0.84	0.13	0.76
11.10	0.15	0.96	0.14	0.89
12.36	0.17	1.11	0.17	1.03

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」


附錄 IV.9-5 S01(15 號捕砂器)砂樣 N、S 粒徑分析

附4.9-3

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:05 21 Jun 2012

15n.$01, 15s.$01

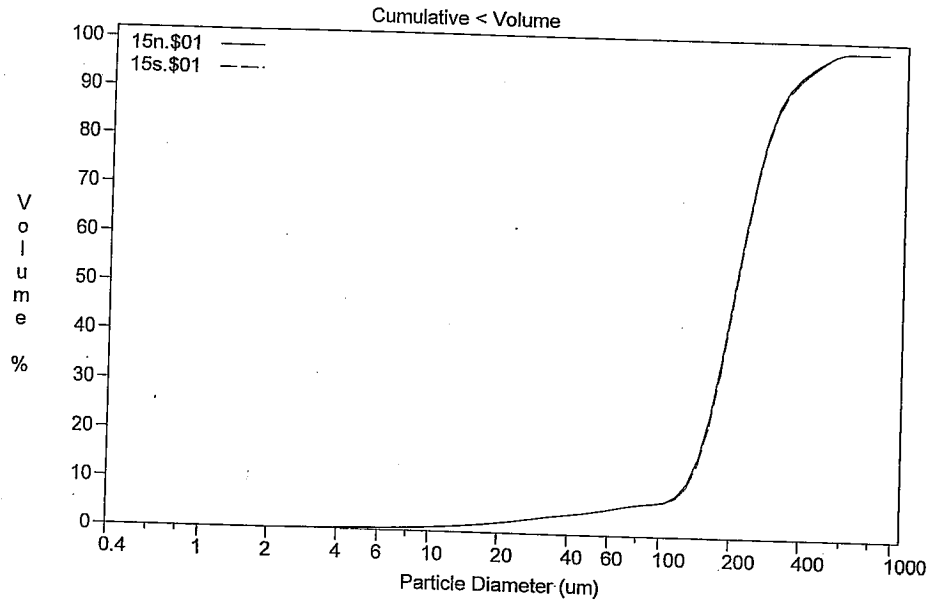

Volume Statistics (Arithmetic) 15n.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	213.7 um	95% Conf. Limits:	32.8-395 um
Median:	203.6 um	S.D.:	92.3 um
Mean/Median Ratio:	1.050	Variance:	8520 um^2
Mode:	211.7 um	C.V.:	43.2%
		Skewness:	0.797 Right skewed
		Kurtosis:	2.06 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	125.4	171.3	203.6	220.9	322.5


註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-4 S01(15 號捕砂器)砂樣 N、S 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:05 21 Jun 2012

15w.$01, 15wn.$01, 15ws.$01

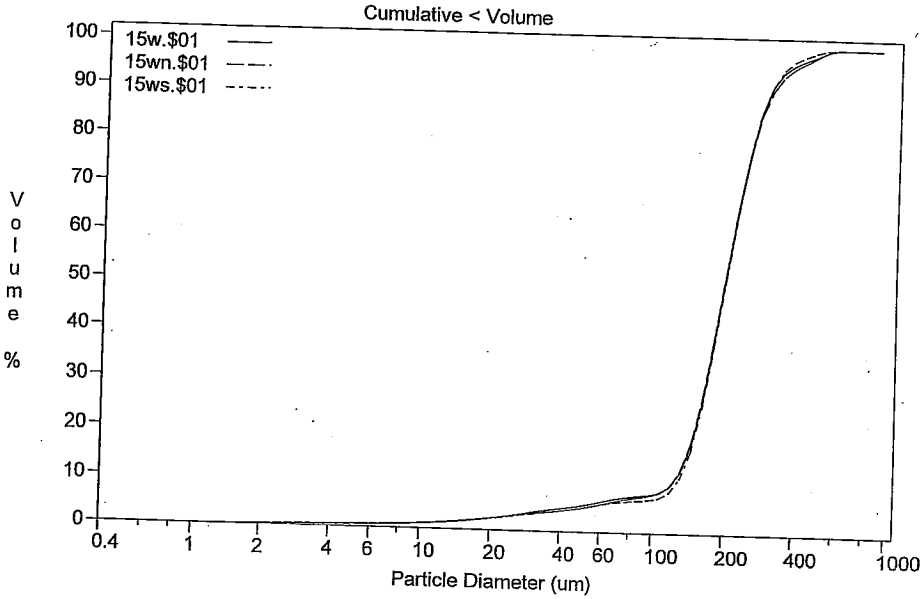

Volume Statistics (Arithmetic) 15w.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	202.5 um	95% Conf. Limits:	34.8-370 um
Median:	196.8 um	S.D.:	85.6 um
Mean/Median Ratio:	1.029	Variance:	7320 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	42.3%
		Skewness:	0.736 Right skewed
		Kurtosis:	2.72 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	119.9	166.6	196.8	213.0	295.8

附4.9-4

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-7 S01(15 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:05 21 Jun 2012

15n.$01, 15s.$01

Particle Diameter um	15n.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	15s.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
13.76	0.19	1.28	0.19	1.20
15.31	0.21	1.46	0.21	1.38
17.05	0.23	1.67	0.25	1.60
18.97	0.26	1.90	0.28	1.85
21.12	0.30	2.17	0.32	2.13
23.51	0.33	2.47	0.35	2.45
26.17	0.35	2.80	0.36	2.80
29.13	0.33	3.15	0.34	3.15
32.43	0.30	3.48	0.30	3.49
36.10	0.28	3.78	0.27	3.79
40.18	0.28	4.06	0.27	4.06
44.73	0.31	4.33	0.30	4.33
49.79	0.37	4.65	0.36	4.63
55.43	0.42	5.01	0.42	4.99
61.70	0.45	5.44	0.45	5.41
68.68	0.40	5.89	0.41	5.86
76.46	0.30	6.29	0.29	6.27
85.11	0.26	6.59	0.21	6.56
94.74	0.43	6.84	0.32	6.77
105.5	1.12	7.27	0.94	7.09
117.4	2.67	8.39	2.43	8.02
130.7	5.14	11.06	4.86	10.45
145.5	8.18	16.20	7.89	15.31
161.9	11.04	24.38	10.84	23.21
180.3	12.88	35.42	12.82	34.04
200.6	13.10	48.30	13.22	46.86
223.4	11.67	61.40	11.90	60.08
248.6	9.09	73.07	9.35	71.98
276.8	6.23	82.16	6.43	81.33
308.1	3.87	88.39	3.98	87.76
342.9	2.43	92.27	2.49	91.74
381.8	1.73	94.70	1.79	94.23
425.0	1.47	96.43	1.57	96.01
473.0	1.36	97.90	1.54	97.59
526.6	0.68	99.26	0.80	99.12
586.2	0.07	99.93	0.08	99.92
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-6 S01(15 號捕砂器)砂樣 N、S 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:05 21 Jun 2012

15w.$01, 15wn.$01, 15ws.$01

Particle Diameter um	15w.$01 Diff. Volume %	15w.$01 Cum. < Volume %	15wn.$01 Diff. Volume %	15wn.$01 Cum. < Volume %	15ws.$01 Diff. Volume %	15ws.$01 Cum. < Volume %
2.475	0.04	0.21	0.05	0.29	0.04	0.23
2.755	0.04	0.24	0.04	0.34	0.04	0.27
3.067	0.04	0.28	0.04	0.38	0.04	0.30
3.414	0.04	0.32	0.04	0.43	0.04	0.34
3.800	0.04	0.35	0.04	0.47	0.04	0.38
4.230	0.04	0.39	0.04	0.52	0.04	0.42
4.709	0.05	0.44	0.05	0.56	0.04	0.46
5.241	0.05	0.48	0.05	0.60	0.05	0.51
5.835	0.06	0.53	0.06	0.65	0.05	0.56
6.495	0.07	0.59	0.07	0.71	0.06	0.61
7.230	0.08	0.66	0.08	0.78	0.07	0.67
8.048	0.10	0.74	0.10	0.85	0.09	0.74
8.959	0.12	0.84	0.12	0.95	0.11	0.83
9.972	0.15	0.96	0.15	1.07	0.13	0.93
11.10	0.17	1.11	0.17	1.22	0.16	1.06
12.36	0.20	1.28	0.20	1.40	0.18	1.22
13.76	0.23	1.48	0.22	1.60	0.21	1.40
15.31	0.25	1.71	0.23	1.81	0.23	1.61
17.05	0.28	1.96	0.25	2.05	0.25	1.83
18.97	0.31	2.24	0.27	2.30	0.27	2.08
21.12	0.35	2.55	0.29	2.56	0.30	2.36
23.51	0.39	2.90	0.31	2.86	0.32	2.66
26.17	0.39	3.29	0.31	3.17	0.32	2.98
29.13	0.37	3.68	0.28	3.47	0.31	3.30
32.43	0.33	4.04	0.25	3.75	0.30	3.61
36.10	0.31	4.37	0.25	4.00	0.30	3.91
40.18	0.33	4.68	0.29	4.25	0.32	4.21
44.73	0.39	5.01	0.35	4.54	0.36	4.53
49.79	0.45	5.39	0.43	4.89	0.40	4.89
55.43	0.49	5.84	0.50	5.32	0.42	5.29
61.70	0.49	6.33	0.53	5.81	0.39	5.71
68.68	0.43	6.82	0.50	6.34	0.31	6.11
76.46	0.32	7.25	0.40	6.84	0.19	6.42
85.11	0.26	7.57	0.34	7.24	0.15	6.61
94.74	0.43	7.83	0.55	7.59	0.36	6.76
105.5	1.19	8.26	1.36	8.13	1.18	7.11
117.4	2.92	9.45	3.14	9.49	2.97	8.29
130.7	5.65	12.38	5.85	12.63	5.74	11.26
145.5	8.93	18.02	9.03	18.48	9.01	17.00
161.9	11.93	26.95	11.85	27.50	11.98	26.01
180.3	13.71	38.88	13.46	39.36	13.73	37.99
200.6	13.66	52.59	13.29	52.82	13.68	51.72
223.4	11.76	66.25	11.39	66.10	11.89	65.41
248.6	8.69	78.01	8.41	77.49	8.98	77.30
276.8	5.43	86.70	5.31	85.90	5.87	86.28
308.1	2.91	92.13	2.95	91.21	3.38	92.15
342.9	1.54	95.04	1.69	94.17	1.86	95.53
381.8	1.01	96.57	1.21	95.85	1.11	97.39
425.0	0.92	97.59	1.14	97.06	0.78	98.50

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-9 S01(15 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:05 21 Jun 2012

15w.$01, 15wn.$01, 15ws.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 15wn.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	204.2 um	95% Conf. Limits:	31-377 um
Median:	196.4 um	S.D.:	88.4 um
Mean/Median Ratio:	1.040	Variance:	7810 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	43.3%
		Skewness:	0.854 Right skewed
		Kurtosis:	2.65 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	119.5	165.8	196.4	212.9	300.9

Volume Statistics (Arithmetic) 15ws.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	203.1 um	95% Conf. Limits:	46.3-360 um
Median:	198.1 um	S.D.:	80 um
Mean/Median Ratio:	1.025	Variance:	6400 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	39.4%
		Skewness:	0.451 Right skewed
		Kurtosis:	2.06 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	125.0	168.0	198.1	214.4	296.6

Particle Diameter um	15w.$01 Diff. Volume %	15w.$01 Cum. < Volume %	15wn.$01 Diff. Volume %	15wn.$01 Cum. < Volume %	15ws.$01 Diff. Volume %	15ws.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.050	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
1.168	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
1.301	0.02	0.04	0.03	0.05	0.02	0.04
1.448	0.02	0.06	0.04	0.09	0.03	0.06
1.612	0.03	0.08	0.04	0.12	0.03	0.09
1.794	0.03	0.11	0.04	0.16	0.03	0.12
1.997	0.03	0.14	0.04	0.20	0.04	0.15
2.223	0.03	0.17	0.05	0.25	0.04	0.19


註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-8 S01(15 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:59 21 Jun 2012

13e.$01, 13en.$01, 13es.$01

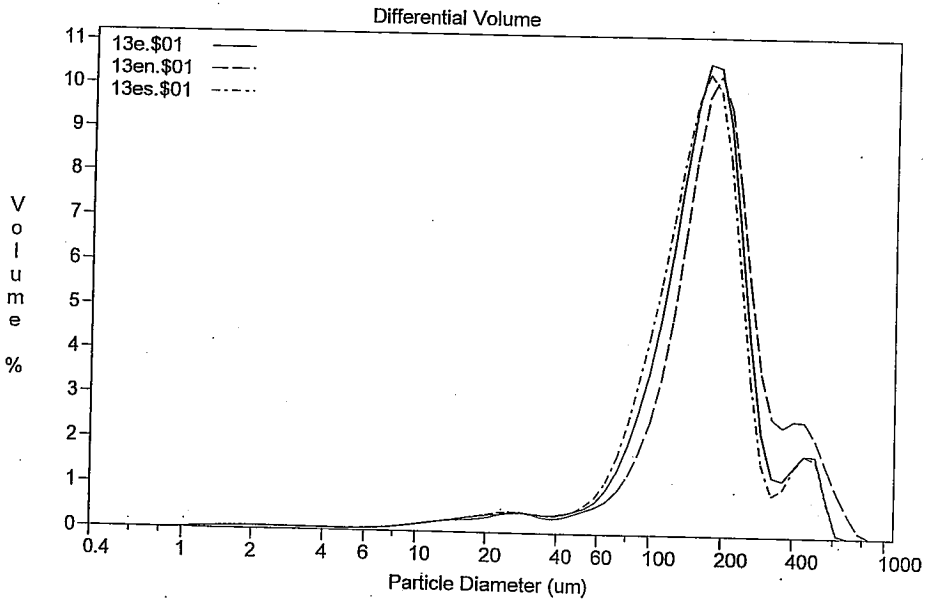

Volume Statistics (Arithmetic) 13e.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	179.9 um	95% Conf. Limits:	0-379 um
Median:	166.2 um	S.D.:	102 um
Mean/Median Ratio:	1.082	Variance:	1.03e+004 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	56.5%
		Skewness:	1.34 Right skewed
		Kurtosis:	2.66 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	74.52	130.9	166.2	183.9	290.1

附4.9-6

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-10 S02(13 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:05 21 Jun 2012

15w.$01, 15wn.$01, 15ws.$01

Particle Diameter um	15w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	15wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	15ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	0.94	98.51	1.15	98.20	0.52	99.28
526.6	0.50	99.45	0.59	99.35	0.19	99.80
586.2	0.05	99.95	0.06	99.94	0.01	99.99
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-9 (續一) S01(15 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:59 21 Jun 2012

13e.$01, 13en.$01, 13es.$01

Particle Diameter um	13e.$01 Diff. Volume %	13e.$01 Cum. < Volume %	13en.$01 Diff. Volume %	13en.$01 Cum. < Volume %	13es.$01 Diff. Volume %	13es.$01 Cum. < Volume %
2.475	0.07	0.43	0.05	0.43	0.07	0.45
2.755	0.06	0.50	0.05	0.48	0.06	0.52
3.067	0.06	0.56	0.05	0.53	0.06	0.58
3.414	0.06	0.62	0.04	0.58	0.06	0.64
3.800	0.06	0.68	0.04	0.62	0.06	0.70
4.230	0.05	0.74	0.04	0.66	0.05	0.76
4.709	0.05	0.79	0.04	0.70	0.05	0.81
5.241	0.06	0.85	0.04	0.74	0.06	0.86
5.835	0.06	0.90	0.05	0.78	0.06	0.92
6.495	0.07	0.96	0.07	0.84	0.07	0.98
7.230	0.08	1.03	0.09	0.90	0.09	1.05
8.048	0.10	1.11	0.12	0.99	0.11	1.14
8.959	0.13	1.21	0.15	1.11	0.14	1.25
9.972	0.16	1.34	0.18	1.26	0.17	1.39
11.10	0.20	1.50	0.22	1.44	0.21	1.56
12.36	0.24	1.70	0.24	1.66	0.25	1.77
13.76	0.28	1.94	0.26	1.90	0.29	2.02
15.31	0.32	2.22	0.27	2.17	0.32	2.30
17.05	0.35	2.54	0.29	2.44	0.36	2.63
18.97	0.38	2.89	0.33	2.73	0.40	2.99
21.12	0.41	3.27	0.39	3.07	0.44	3.39
23.51	0.43	3.68	0.44	3.45	0.47	3.84
26.17	0.44	4.12	0.45	3.89	0.47	4.31
29.13	0.43	4.56	0.42	4.34	0.44	4.78
32.43	0.41	4.98	0.36	4.76	0.40	5.22
36.10	0.41	5.39	0.33	5.11	0.38	5.61
40.18	0.43	5.80	0.36	5.44	0.41	5.99
44.73	0.49	6.24	0.43	5.79	0.49	6.40
49.79	0.56	6.72	0.51	6.23	0.62	6.89
55.43	0.70	7.28	0.59	6.74	0.81	7.51
61.70	0.97	7.99	0.72	7.33	1.16	8.32
68.68	1.39	8.95	0.95	8.04	1.70	9.48
76.46	1.97	10.35	1.31	8.99	2.45	11.18
85.11	2.72	12.32	1.81	10.30	3.38	13.63
94.74	3.65	15.04	2.49	12.10	4.44	17.01
105.5	4.85	18.69	3.45	14.60	5.64	21.45
117.4	6.33	23.54	4.80	18.05	7.01	27.09
130.7	8.02	29.87	6.54	22.85	8.46	34.09
145.5	9.62	37.90	8.41	29.39	9.74	42.56
161.9	10.62	47.51	9.85	37.80	10.39	52.30
180.3	10.53	58.13	10.34	47.65	10.00	62.69
200.6	9.19	68.66	9.58	57.99	8.42	72.68
223.4	6.87	77.85	7.76	67.58	5.99	81.11
248.6	4.31	84.72	5.51	75.34	3.45	87.10
276.8	2.29	89.02	3.63	80.85	1.62	90.54
308.1	1.32	91.32	2.62	84.49	0.92	92.16
342.9	1.25	92.64	2.42	87.11	1.06	93.08
381.8	1.55	93.89	2.58	89.53	1.51	94.14
425.0	1.82	95.45	2.56	92.12	1.81	95.65

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-12 S02(13 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:59 21 Jun 2012

13e.$01, 13en.$01, 13es.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 13en.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	209.3 um	95% Conf. Limits:	0-455 um
Median:	184.9 um	S.D.:	125 um
Mean/Median Ratio:	1.132	Variance:	1.57e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	59.9%
		Skewness:	1.34 Right skewed
		Kurtosis:	2.29 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	83.14	146.6	184.9	205.4	389.5

Volume Statistics (Arithmetic) 13es.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	172.0 um	95% Conf. Limits:	0-368 um
Median:	158.0 um	S.D.:	100 um
Mean/Median Ratio:	1.089	Variance:	1e+004 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	58.2%
		Skewness:	1.47 Right skewed
		Kurtosis:	3.09 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	71.07	122.9	158.0	175.5	272.3

Particle Diameter um	13e.$01 Diff. Volume %	13e.$01 Cum. < Volume %	13en.$01 Diff. Volume %	13en.$01 Cum. < Volume %	13es.$01 Diff. Volume %	13es.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1.050	0.03	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02
1.168	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
1.301	0.05	0.08	0.05	0.08	0.05	0.08
1.448	0.05	0.13	0.05	0.13	0.06	0.13
1.612	0.06	0.18	0.06	0.19	0.06	0.19
1.794	0.06	0.24	0.06	0.25	0.07	0.25
1.997	0.07	0.30	0.06	0.31	0.07	0.32
2.223	0.07	0.37	0.06	0.37	0.07	0.38


註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-11 S02(13 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:03 21 Jun 2012

13n.$01, 13s.$02

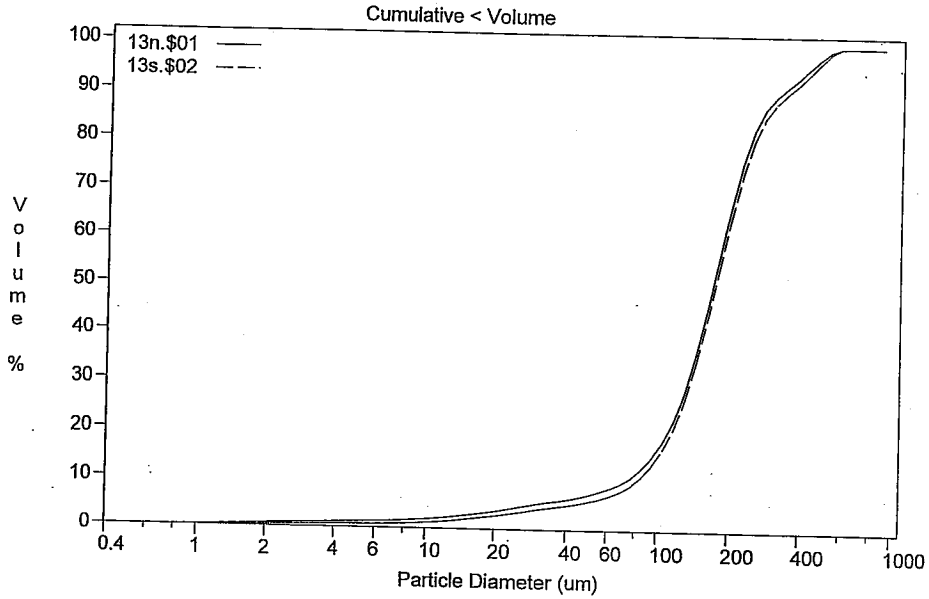

Volume Statistics (Arithmetic) 13n.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	183.3 um	95% Conf. Limits:	0-386 um
Median:	169.7 um	S.D.:	104 um
Mean/Median Ratio:	1.080	Variance:	1.07e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	56.5%
		Skewness:	1.15 Right skewed
		Kurtosis:	1.95 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	71.06	133.4	169.7	187.9	309.8

附件9.4-8

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-13 S02(13 號捕砂器)砂樣 N、S 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:59 21 Jun 2012

13e.$01, 13en.$01, 13es.$01

Particle Diameter um	13e.$01 Diff. Volume %	13e.$01 Cum. < Volume %	13en.$01 Diff. Volume %	13en.$01 Cum. < Volume %	13es.$01 Diff. Volume %	13es.$01 Cum. < Volume %
473.0	1.79	97.27	2.15	94.67	1.70	97.46
526.6	0.86	99.06	1.55	96.82	0.77	99.16
586.2	0.08	99.92	0.99	98.37	0.07	99.93
652.5	0.00	100.00	0.50	99.36	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.13	99.86	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.01	99.99	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-12 (續一) S02(13 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積百分比

13n.$01, 13s.$02

Volume Statistics (Arithmetic) 13s.$02

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	191.1 um	95% Conf. Limits:	0-402 um
Median:	173.3 um	S.D.:	108 um
Mean/Median Ratio:	1.102	Variance:	1.16e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	56.4%
		Skewness:	1.22 Right skewed
		Kurtosis:	1.86 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	80.15	136.4	173:3	192.4	334.4

Particle Diameter um	13n.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	13s.$02 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.01	0.00	0.00	0.00
0.684	0.02	0.01	0.00	0.00
0.761	0.03	0.03	0.00	0.00
0.847	0.04	0.07	0.00	0.00
0.943	0.05	0.11	0.01	0.00
1.050	0.06	0.16	0.03	0.01
1.168	0.06	0.22	0.03	0.04
1.301	0.07	0.28	0.04	0.07
1.448	0.07	0.35	0.05	0.12
1.612	0.07	0.42	0.05	0.17
1.794	0.07	0.49	0.05	0.22
1.997	0.07	0.57	0.06	0.27
2.223	0.07	0.64	0.05	0.33
2.475	0.07	0.72	0.05	0.38
2.755	0.07	0.79	0.05	0.43
3.067	0.07	0.86	0.04	0.48
3.414	0.07	0.93	0.04	0.53
3.800	0.07	1.00	0.04	0.57
4.230	0.07	1.07	0.04	0.60
4.709	0.07	1.13	0.04	0.64
5.241	0.08	1.21	0.04	0.68
5.835	0.08	1.28	0.05	0.72
6.495	0.09	1.37	0.06	0.77
7.230	0.11	1.46	0.08	0.83
8.048	0.13	1.57	0.10	0.91
8.959	0.16	1.70	0.13	1.01
9.972	0.19	1.86	0.17	1.14
11.10	0.22	2.05	0.20	1.31
12.36	0.25	2.27	0.23	1.51

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

13n.$01, 13s.$02


Particle Diameter um	13n.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	13s.$02 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
13.76	0.28	2.52	0.25	1.74
15.31	0.32	2.80	0.27	1.98
17.05	0.36	3.12	0.28	2.25
18.97	0.40	3.47	0.32	2.53
21.12	0.44	3.87	0.36	2.85
23.51	0.46	4.31	0.40	3.21
26.17	0.44	4.77	0.41	3.61
29.13	0.38	5.21	0.38	4.03
32.43	0.33	5.59	0.34	4.41
36.10	0.34	5.92	0.32	4.75
40.18	0.43	6.26	0.35	5.07
44.73	0.56	6.69	0.43	5.43
49.79	0.67	7.26	0.54	5.86
55.43	0.76	7.93	0.68	6.40
61.70	0.93	8.68	0.90	7.07
68.68	1.28	9.61	1.26	7.97
76.46	1.81	10.89	1.79	9.24
85.11	2.48	12.70	2.48	11.02
94.74	3.29	15.17	3.34	13.50
105.5	4.36	18.46	4.43	16.84
117.4	5.81	22.82	5.82	21.27
130.7	7.58	28.62	7.46	27.09
145.5	9.34	36.20	9.09	34.55
161.9	10.50	45.54	10.21	43.64
180.3	10.54	56.04	10.33	53.86
200.6	9.24	66.58	9.25	64.19
223.4	6.97	75.82	7.20	73.44
248.6	4.49	82.79	4.87	80.64
276.8	2.63	87.28	2.98	85.51
308.1	1.80	89.91	2.00	88.49
342.9	1.78	91.71	1.85	90.49
381.8	2.01	93.49	2.05	92.34
425.0	2.05	95.50	2.24	94.39
473.0	1.69	97.56	2.20	96.63
526.6	0.69	99.25	1.07	98.83
586.2	0.06	99.94	0.10	99.90
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:04 21 Jun 2012

13w.$01, 13wn.$01, 13ws.$01

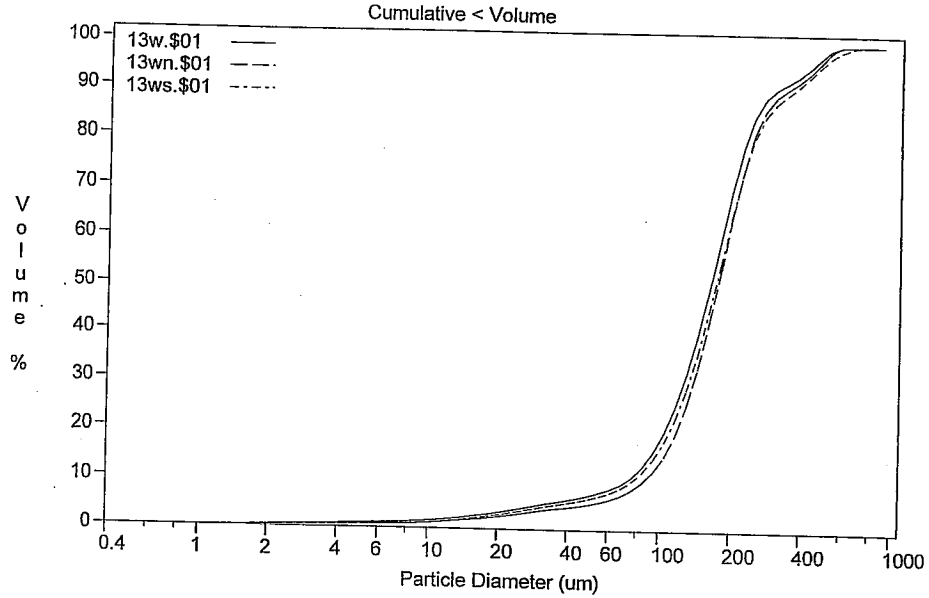

Volume Statistics (Arithmetic) 13w.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	178.1 um	95% Conf. Limits:	0-382 um
Median:	162.5 um	S.D.:	104 um
Mean/Median Ratio:	1.096	Variance:	1.09e+004 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	58.5%
		Skewness:	1.37 Right skewed
		Kurtosis:	2.54 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	72.11	127.0	162.5	180.1	295.8

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-16 S02(13 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:04 21 Jun 2012

13w.$01, 13wn.$01, 13ws.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 13wn.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	192.3 um	95% Conf. Limits:	0-402 um
Median:	174.2 um	S.D.:	107 um
Mean/Median Ratio:	1.104	Variance:	1.15e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	55.8%
		Skewness:	1.33 Right skewed
		Kurtosis:	2.25 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	85.81	139.5	174.2	192.2	326.6

Volume Statistics (Arithmetic) 13ws.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	192.7 um	95% Conf. Limits:	0-426 um
Median:	170.7 um	S.D.:	119 um
Mean/Median Ratio:	1.129	Variance:	1.41e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	61.7%
		Skewness:	1.51 Right skewed
		Kurtosis:	2.87 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	76.54	133.3	170.7	190.0	351.5

Particle Diameter um	13w.$01 Diff. Volume %	13w.$01 Cum. < Volume %	13wn.$01 Diff. Volume %	13wn.$01 Cum. < Volume %	13ws.$01 Diff. Volume %	13ws.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1.050	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
1.168	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04
1.301	0.05	0.09	0.04	0.07	0.05	0.08
1.448	0.06	0.15	0.04	0.11	0.05	0.13
1.612	0.07	0.21	0.05	0.15	0.06	0.18
1.794	0.07	0.28	0.05	0.20	0.06	0.24
1.997	0.07	0.35	0.05	0.25	0.06	0.30
2.223	0.07	0.42	0.05	0.30	0.06	0.36

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-17 S02(13 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:04 21 Jun 2012

13w.$01, 13wn.$01, 13ws.$01

Particle Diameter um	13w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	13wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	13ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	1.93	97.10	2.43	96.17	1.87	95.46
526.6	0.89	99.03	1.27	98.60	1.39	97.33
586.2	0.08	99.92	0.12	99.88	0.90	98.73
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.34	99.63
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00	0.03	99.97
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-18 (續一) S02(13 號捕砂器)砂樣 WN、WS 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:04 21 Jun 2012

13w.$01, 13wn.$01, 13ws.$01

Particle Diameter um	13w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	13wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	13ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
2.475	0.07	0.49	0.05	0.35	0.05	0.41
2.755	0.07	0.57	0.05	0.40	0.05	0.46
3.067	0.07	0.64	0.04	0.45	0.04	0.51
3.414	0.06	0.71	0.04	0.49	0.04	0.56
3.800	0.06	0.77	0.04	0.53	0.04	0.60
4.230	0.06	0.83	0.04	0.57	0.03	0.63
4.709	0.06	0.89	0.04	0.61	0.04	0.67
5.241	0.06	0.95	0.04	0.65	0.04	0.70
5.835	0.07	1.01	0.05	0.69	0.05	0.74
6.495	0.08	1.08	0.06	0.74	0.06	0.79
7.230	0.10	1.16	0.07	0.79	0.08	0.85
8.048	0.12	1.26	0.10	0.87	0.11	0.93
8.959	0.15	1.38	0.12	0.97	0.14	1.04
9.972	0.18	1.53	0.15	1.09	0.18	1.18
11.10	0.22	1.71	0.18	1.24	0.22	1.36
12.36	0.26	1.93	0.20	1.42	0.25	1.58
13.76	0.29	2.19	0.22	1.62	0.27	1.82
15.31	0.32	2.48	0.24	1.85	0.29	2.10
17.05	0.36	2.80	0.26	2.09	0.32	2.39
18.97	0.39	3.16	0.29	2.35	0.35	2.70
21.12	0.43	3.55	0.33	2.64	0.40	3.05
23.51	0.46	3.97	0.37	2.97	0.44	3.45
26.17	0.46	4.43	0.37	3.34	0.45	3.89
29.13	0.43	4.89	0.33	3.70	0.43	4.34
32.43	0.40	5.32	0.28	4.03	0.38	4.77
36.10	0.39	5.72	0.26	4.31	0.37	5.15
40.18	0.44	6.11	0.29	4.57	0.40	5.52
44.73	0.53	6.55	0.37	4.86	0.47	5.92
49.79	0.61	7.08	0.47	5.23	0.57	6.39
55.43	0.72	7.69	0.60	5.69	0.71	6.96
61.70	0.96	8.41	0.82	6.29	0.96	7.67
68.68	1.44	9.37	1.14	7.11	1.35	8.63
76.46	2.16	10.80	1.59	8.25	1.93	9.98
85.11	3.03	12.96	2.21	9.84	2.65	11.91
94.74	4.02	15.99	3.07	12.05	3.53	14.56
105.5	5.20	20.01	4.30	15.12	4.61	18.08
117.4	6.62	25.21	5.91	19.42	5.96	22.70
130.7	8.20	31.82	7.80	25.33	7.52	28.66
145.5	9.63	40.02	9.62	33.13	9.02	36.18
161.9	10.42	49.65	10.84	42.75	10.00	45.20
180.3	10.12	60.08	10.93	53.59	10.02	55.20
200.6	8.62	70.20	9.70	64.53	8.86	65.22
223.4	6.24	78.82	7.41	74.23	6.78	74.07
248.6	3.76	85.06	4.81	81.64	4.43	80.85
276.8	1.95	88.81	2.70	86.45	2.61	85.28
308.1	1.22	90.76	1.60	89.15	1.74	87.89
342.9	1.33	91.98	1.45	90.75	1.69	89.63
381.8	1.75	93.31	1.78	92.19	2.00	91.32
425.0	2.04	95.07	2.20	93.97	2.13	93.32

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-18 S02(13 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:07 21 Jun 2012

8e.$01, 8en.$01, 8es.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 8en.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	224.8 um	95% Conf. Limits:	0-475 um
Median:	196.3 um	S.D.:	128 um
Mean/Median Ratio:	1.145	Variance:	1.63e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	56.8%
		Skewness:	0.906 Right skewed
		Kurtosis:	0.694 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	94.18	150.9	196.3	224.3	414.0

Volume Statistics (Arithmetic) 8es.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	249.9 um	95% Conf. Limits:	0-564 um
Median:	204.4 um	S.D.:	160 um
Mean/Median Ratio:	1.223	Variance:	2.57e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	64.2%
		Skewness:	1.3 Right skewed
		Kurtosis:	1.8 Leptokurtic


% <	10	30	50	60	90
Size um	98.11	153.4	204.4	239.9	470.5

Particle Diameter um	8e.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.050	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
1.168	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01
1.301	0.02	0.03	0.04	0.06	0.01	0.02
1.448	0.02	0.05	0.04	0.10	0.02	0.04
1.612	0.02	0.07	0.05	0.15	0.02	0.06
1.794	0.03	0.09	0.05	0.19	0.02	0.08
1.997	0.03	0.12	0.05	0.24	0.02	0.10
2.223	0.03	0.14	0.05	0.29	0.03	0.12

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:07 21 Jun 2012

8e.$01, 8en.$01, 8es.$01

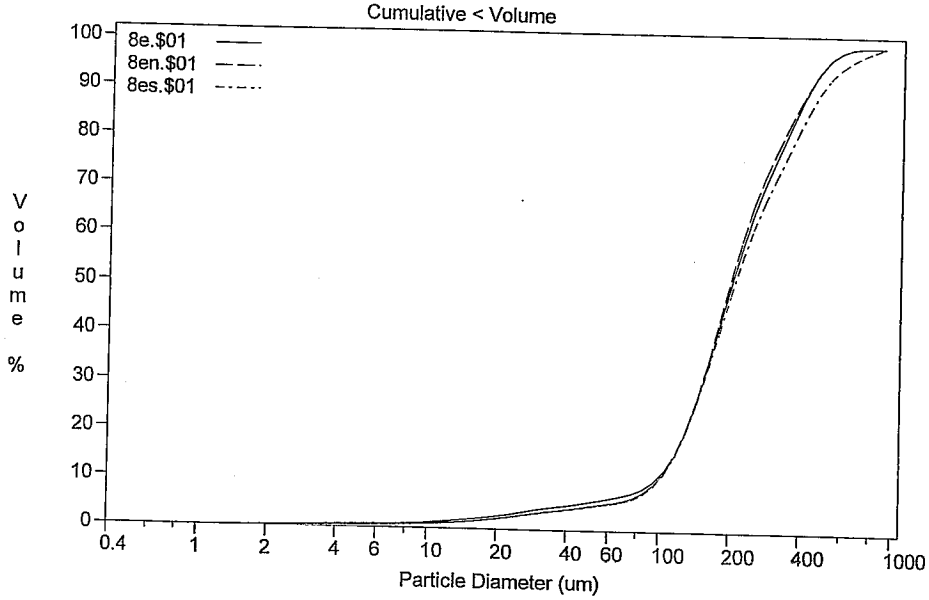

Volume Statistics (Arithmetic) 8e.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	229.5 um	95% Conf. Limits:	0-482 um
Median:	199.5 um	S.D.:	129 um
Mean/Median Ratio:	1.150	Variance:	1.66e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	56.2%
		Skewness:	0.897 Right skewed
		Kurtosis:	0.65 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	96.85	152.3	199.5	230.0	418.2

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:07 21 Jun 2012

8e.$01, 8en.$01, 8es.$01

Particle Diameter um	8e.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	2.66	94.48	2.63	94.57	3.03	90.20
526.6	1.61	97.14	1.67	97.20	2.19	93.23
586.2	0.86	98.75	0.86	98.87	1.58	95.42
652.5	0.33	99.61	0.26	99.73	1.19	96.99
726.3	0.05	99.95	0.02	99.98	0.97	98.18
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.85	99.15
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-21 (續一) S03(8 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積百分比

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:07 21 Jun 2012

8e.$01, 8en.$01, 8es.$01

Particle Diameter um	8e.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
2.475	0.03	0.17	0.05	0.34	0.03	0.15
2.755	0.03	0.21	0.05	0.39	0.03	0.18
3.067	0.04	0.24	0.04	0.43	0.03	0.21
3.414	0.04	0.27	0.04	0.48	0.04	0.25
3.800	0.04	0.31	0.04	0.52	0.04	0.28
4.230	0.04	0.35	0.04	0.56	0.04	0.32
4.709	0.04	0.39	0.04	0.60	0.05	0.36
5.241	0.05	0.44	0.05	0.64	0.05	0.41
5.835	0.05	0.49	0.05	0.69	0.06	0.46
6.495	0.06	0.54	0.07	0.75	0.06	0.52
7.230	0.07	0.60	0.08	0.81	0.08	0.58
8.048	0.09	0.67	0.11	0.90	0.09	0.66
8.959	0.11	0.76	0.14	1.01	0.11	0.75
9.972	0.13	0.87	0.17	1.14	0.13	0.86
11.10	0.15	1.00	0.20	1.31	0.15	0.99
12.36	0.18	1.15	0.22	1.51	0.17	1.14
13.76	0.20	1.33	0.24	1.73	0.19	1.31
15.31	0.23	1.53	0.25	1.97	0.22	1.51
17.05	0.25	1.76	0.28	2.22	0.24	1.72
18.97	0.29	2.02	0.32	2.50	0.28	1.96
21.12	0.32	2.30	0.37	2.81	0.31	2.24
23.51	0.35	2.63	0.43	3.19	0.34	2.55
26.17	0.36	2.98	0.43	3.61	0.35	2.90
29.13	0.33	3.33	0.38	4.05	0.32	3.24
32.43	0.31	3.67	0.31	4.43	0.28	3.56
36.10	0.31	3.98	0.28	4.74	0.27	3.84
40.18	0.33	4.28	0.33	5.03	0.29	4.11
44.73	0.35	4.61	0.41	5.36	0.33	4.41
49.79	0.35	4.96	0.45	5.77	0.34	4.74
55.43	0.35	5.31	0.44	6.22	0.34	5.08
61.70	0.42	5.66	0.45	6.66	0.39	5.42
68.68	0.63	6.08	0.58	7.11	0.59	5.82
76.46	1.05	6.70	0.90	7.69	1.03	6.41
85.11	1.73	7.76	1.49	8.59	1.73	7.44
94.74	2.63	9.48	2.41	10.09	2.66	9.16
105.5	3.72	12.11	3.62	12.49	3.75	11.82
117.4	4.95	15.83	5.01	16.11	4.93	15.57
130.7	6.20	20.78	6.39	21.12	6.09	20.50
145.5	7.31	26.99	7.55	27.51	7.05	26.59
161.9	8.02	34.29	8.29	35.07	7.60	33.63
180.3	8.17	42.31	8.43	43.35	7.61	41.23
200.6	7.72	50.48	7.96	51.78	7.08	48.84
223.4	6.86	58.19	7.07	59.74	6.24	55.92
248.6	5.95	65.06	6.02	66.82	5.41	62.17
276.8	5.29	71.01	5.13	72.84	4.86	67.57
308.1	4.99	76.30	4.59	77.97	4.67	72.43
342.9	4.87	81.29	4.37	82.56	4.68	77.10
381.8	4.54	86.17	4.11	86.93	4.50	81.78
425.0	3.77	90.71	3.53	91.04	3.92	86.29

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-21 S03(8 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積百分比

8n.$01, 8s.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 8s.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um


Volume	100.0%		
Mean:	198.3 um	95% Conf. Limits:	0-423 um
Median:	174.1 um	S.D.:	114 um
Mean/Median Ratio:	1.139	Variance:	1.31e+004 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	57.7%
		Skewness:	1.12 Right skewed
		Kurtosis:	1.44 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	85.61	136.7	174.1	195.6	368.9

Particle Diameter um	8n.$01 Diff. Volume %	8n.$01 Cum. < Volume %	8s.$01 Diff. Volume %	8s.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.01	0.00	0.01	0.00
1.050	0.03	0.02	0.03	0.02
1.168	0.04	0.05	0.04	0.05
1.301	0.05	0.09	0.05	0.09
1.448	0.06	0.14	0.06	0.14
1.612	0.07	0.20	0.06	0.19
1.794	0.07	0.27	0.07	0.26
1.997	0.07	0.34	0.07	0.33
2.223	0.07	0.41	0.07	0.40
2.475	0.07	0.48	0.07	0.47
2.755	0.06	0.55	0.07	0.54
3.067	0.06	0.61	0.06	0.60
3.414	0.06	0.67	0.06	0.67
3.800	0.05	0.72	0.06	0.73
4.230	0.05	0.78	0.06	0.78
4.709	0.05	0.83	0.05	0.84
5.241	0.05	0.88	0.06	0.89
5.835	0.06	0.93	0.06	0.95
6.495	0.07	0.98	0.07	1.01
7.230	0.08	1.05	0.08	1.08
8.048	0.10	1.13	0.10	1.16
8.959	0.13	1.24	0.13	1.26
9.972	0.16	1.37	0.16	1.39
11.10	0.20	1.54	0.19	1.55
12.36	0.23	1.73	0.23	1.74

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

8n.$01, 8s.$01

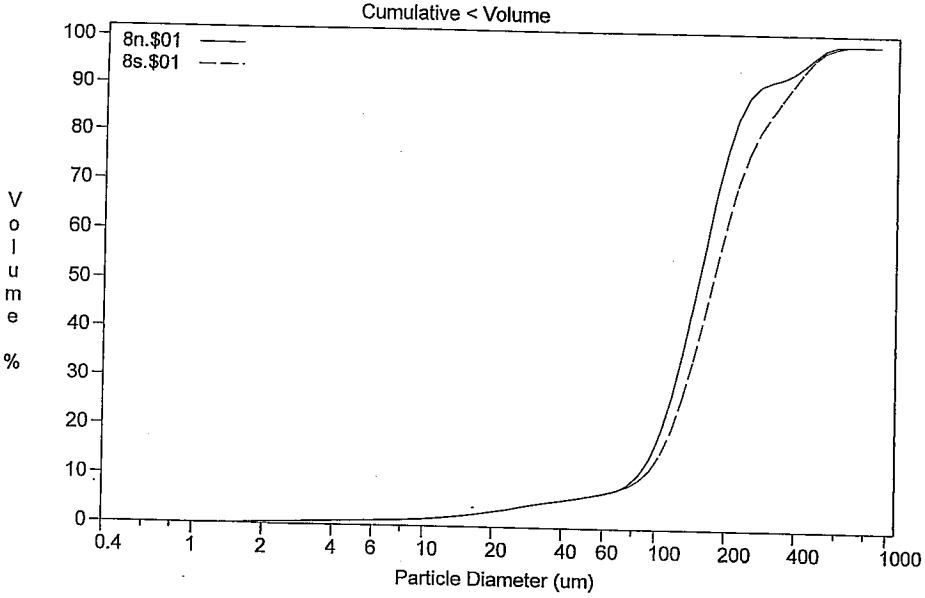

Volume Statistics (Arithmetic) 8n.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	169.4 um	95% Conf. Limits:	0-365 um
Median:	151.5 um	S.D.:	99.8 um
Mean/Median Ratio:	1.118	Variance:	9950 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	58.9%
		Skewness:	1.71 Right skewed
		Kurtosis:	3.77 Leptokurtic


% <	10	30	50	60	90
Size um	80.83	122.1	151.5	167.2	264.3

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:07 21 Jun 2012

8w.$01, 8wn.$01, 8ws.$01

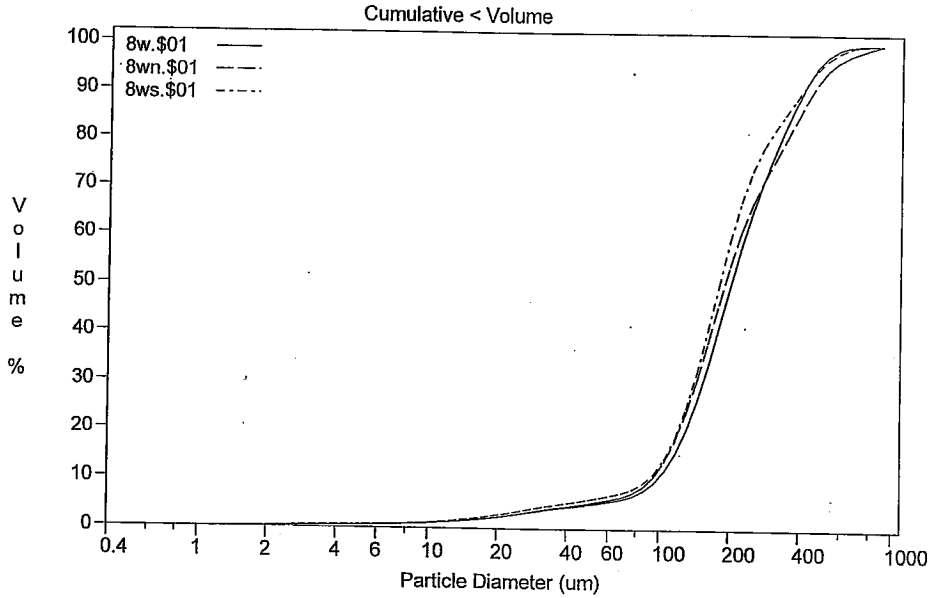

Volume Statistics (Arithmetic) 8w.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	227.8 um	95% Conf. Limits:	0-471 um
Median:	201.6 um	S.D.:	124 um
Mean/Median Ratio:	1.130	Variance:	1.54e+004 um^2
Mode:	190.2 um	C.V.:	54.5%
		Skewness:	0.841 Right skewed
		Kurtosis:	0.617 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	97.77	154.1	201.6	231.5	408.1

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-25 S03(8 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:07 21 Jun 2012

8n.$01, 8s.$01

Particle Diameter um	8n.$01 Diff. Volume %	8n.$01 Cum. < Volume %	8s.$01 Diff. Volume %	8s.$01 Cum. < Volume %
13.76	0.27	1.97	0.26	1.97
15.31	0.30	2.23	0.29	2.23
17.05	0.33	2.53	0.33	2.52
18.97	0.36	2.86	0.36	2.85
21.12	0.39	3.22	0.40	3.21
23.51	0.42	3.61	0.44	3.61
26.17	0.41	4.03	0.44	4.05
29.13	0.39	4.44	0.42	4.50
32.43	0.36	4.83	0.37	4.91
36.10	0.34	5.19	0.34	5.28
40.18	0.36	5.53	0.36	5.62
44.73	0.38	5.89	0.42	5.98
49.79	0.40	6.27	0.45	6.39
55.43	0.45	6.67	0.46	6.85
61.70	0.65	7.12	0.52	7.31
68.68	1.16	7.77	0.76	7.83
76.46	2.11	8.93	1.30	8.59
85.11	3.49	11.04	2.19	9.89
94.74	5.22	14.54	3.41	12.08
105.5	7.10	19.76	4.88	15.49
117.4	8.88	26.86	6.44	20.36
130.7	10.26	35.74	7.89	26.80
145.5	10.92	45.99	9.00	34.69
161.9	10.65	56.92	9.47	43.69
180.3	9.35	67.57	9.12	53.16
200.6	7.18	76.92	7.97	62.28
223.4	4.60	84.10	6.33	70.24
248.6	2.33	88.70	4.71	76.57
276.8	0.98	91.03	3.56	81.28
308.1	0.65	92.01	3.09	84.84
342.9	1.01	92.66	3.09	87.93
381.8	1.60	93.67	3.08	91.02
425.0	1.93	95.27	2.64	94.10
473.0	1.86	97.20	1.80	96.74
526.6	0.86	99.06	0.98	98.54
586.2	0.08	99.92	0.40	99.51
652.5	0.00	100.00	0.09	99.91
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-24 S03(8 號捕砂器)砂樣 N、S 粒徑分析累積百分比

Particle Diameter um	8w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
2.475	0.04	0.26	0.04	0.22	0.05	0.38
2.755	0.04	0.30	0.04	0.26	0.05	0.43
3.067	0.04	0.35	0.04	0.30	0.04	0.47
3.414	0.04	0.39	0.04	0.33	0.04	0.52
3.800	0.04	0.43	0.04	0.37	0.04	0.55
4.230	0.04	0.47	0.04	0.41	0.03	0.59
4.709	0.04	0.51	0.04	0.45	0.04	0.62
5.241	0.05	0.55	0.05	0.50	0.04	0.66
5.835	0.05	0.60	0.05	0.55	0.05	0.70
6.495	0.06	0.65	0.06	0.60	0.06	0.75
7.230	0.07	0.71	0.08	0.67	0.08	0.81
8.048	0.09	0.78	0.10	0.74	0.10	0.88
8.959	0.11	0.87	0.12	0.84	0.13	0.99
9.972	0.13	0.98	0.14	0.96	0.17	1.12
11.10	0.16	1.11	0.17	1.10	0.20	1.28
12.36	0.18	1.27	0.19	1.27	0.23	1.48
13.76	0.20	1.45	0.21	1.46	0.25	1.71
15.31	0.22	1.65	0.24	1.67	0.27	1.96
17.05	0.24	1.87	0.26	1.91	0.29	2.23
18.97	0.27	2.10	0.30	2.17	0.33	2.52
21.12	0.31	2.37	0.34	2.46	0.38	2.85
23.51	0.35	2.68	0.37	2.80	0.43	3.24
26.17	0.36	3.02	0.38	3.18	0.44	3.66
29.13	0.33	3.38	0.35	3.56	0.40	4.10
32.43	0.30	3.72	0.31	3.91	0.35	4.50
36.10	0.27	4.01	0.29	4.21	0.33	4.85
40.18	0.29	4.28	0.31	4.50	0.35	5.18
44.73	0.32	4.57	0.35	4.81	0.40	5.53
49.79	0.34	4.89	0.38	5.17	0.42	5.93
55.43	0.35	5.23	0.41	5.55	0.43	6.35
61.70	0.42	5.59	0.49	5.96	0.50	6.78
68.68	0.61	6.01	0.75	6.45	0.72	7.28
76.46	1.01	6.62	1.26	7.20	1.19	7.99
85.11	1.65	7.63	2.08	8.46	1.98	9.19
94.74	2.52	9.29	3.15	10.53	3.07	11.16
105.5	3.58	11.81	4.39	13.69	4.44	14.24
117.4	4.78	15.38	5.67	18.08	5.98	18.68
130.7	6.04	20.17	6.83	23.74	7.49	24.66
145.5	7.18	26.21	7.69	30.57	8.71	32.16
161.9	7.99	33.39	8.04	38.27	9.30	40.87
180.3	8.28	41.39	7.75	46.31	9.06	50.17
200.6	7.98	49.66	6.89	54.05	7.98	59.22
223.4	7.28	57.65	5.75	60.94	6.41	67.21
248.6	6.43	64.92	4.73	66.69	4.83	73.61
276.8	5.73	71.35	4.16	71.43	3.71	78.44
308.1	5.28	77.08	4.09	75.58	3.22	82.15
342.9	4.95	82.36	4.27	79.67	3.21	85.37
381.8	4.42	87.31	4.23	83.94	3.23	88.59
425.0	3.52	91.72	3.68	88.18	2.90	91.82

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

Volume Statistics (Arithmetic) 8wn.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	234.2 um	95% Conf. Limits:	0-534 um
Median:	190.0 um	S.D.:	153 um
Mean/Median Ratio:	1.233	Variance:	2.34e+004 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	65.3%
		Skewness:	1.38 Right skewed
		Kurtosis:	2.15 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	92.26	144.2	190.0	220.2	448.8

Volume Statistics (Arithmetic) 8ws.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	210.8 um	95% Conf. Limits:	0-461 um
Median:	179.9 um	S.D.:	128 um
Mean/Median Ratio:	1.172	Variance:	1.63e+004 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	60.5%
		Skewness:	1.27 Right skewed
		Kurtosis:	1.8 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	89.07	141.2	179.9	202.9	400.7


Particle Diameter um	8w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1.050	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01
1.168	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04
1.301	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.07
1.448	0.03	0.08	0.03	0.06	0.05	0.12
1.612	0.04	0.11	0.03	0.09	0.05	0.16
1.794	0.04	0.14	0.03	0.12	0.05	0.22
1.997	0.04	0.18	0.03	0.15	0.05	0.27
2.223	0.04	0.22	0.04	0.19	0.05	0.32

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:56 21 Jun 2012

10e.$01, 10en.$01, 10es.$01

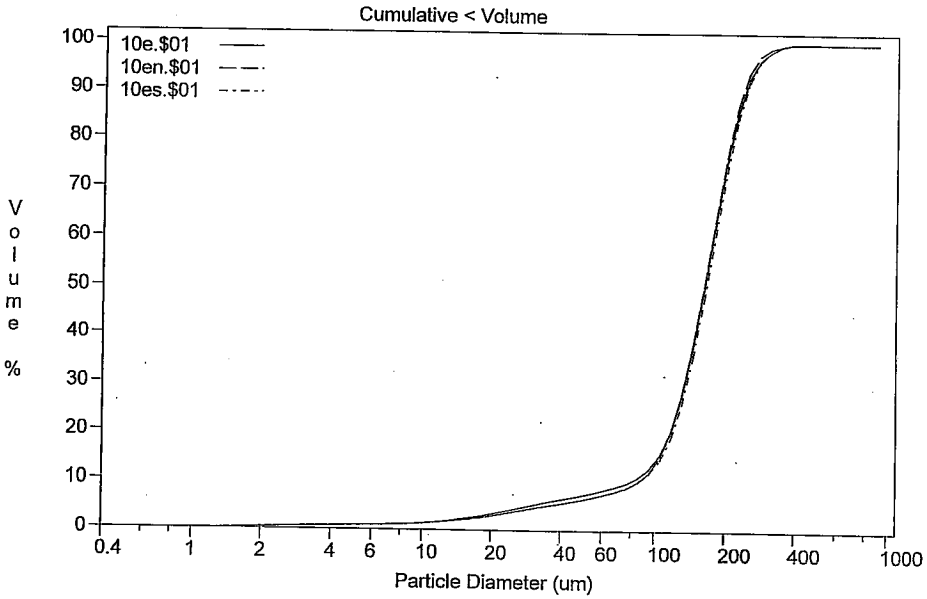

Volume Statistics (Arithmetic) 10e.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	160.9 um	95% Conf. Limits:	33.6-288 um
Median:	162.4 um	S.D.:	65 um
Mean/Median Ratio:	0.991	Variance:	4220 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	40.4%
		Skewness:	-0.0971 Left skewed
		Kurtosis:	0.543 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	78.52	134.1	162.4	176.4	239.2

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-28 S04(10 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:07 21 Jun 2012

8w.$01, 8wn.$01, 8ws.$01

Particle Diameter um	8w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	8ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	2.40	95.24	2.75	91.86	2.24	94.72
526.6	1.40	97.64	1.87	94.61	1.51	96.96
586.2	0.71	99.04	1.26	96.48	0.93	98.47
652.5	0.23	99.75	0.90	97.74	0.47	99.40
726.3	0.02	99.98	0.72	98.64	0.12	99.87
808.5	0.00	100.00	0.64	99.36	0.01	99.99
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-27 (續一) S03(8 號捕砂器)砂樣 WN、WS 粒徑分析累積百分比

附4.9-17

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:56 21 Jun 2012

10e.$01, 10en.$01, 10es.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 10en.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	159.8 um	95% Conf. Limits:	38.9-281 um
Median:	161.3 um	S.D.:	61.7 um
Mean/Median Ratio:	0.991	Variance:	3800 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	38.6%
		Skewness:	-0.152 Left skewed
		Kurtosis:	0.587 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	85.35	133.8	161.3	175.0	235.0

Volume Statistics (Arithmetic) 10es.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	164.1 um	95% Conf. Limits:	37.9-290 um
Median:	165.1 um	S.D.:	64.4 um
Mean/Median Ratio:	0.994	Variance:	4150 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	39.2%
		Skewness:	-0.102 Left skewed
		Kurtosis:	0.517 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	85.59	136.6	165.1	179.1	242.5

Particle Diameter um	10e.$01 Diff. Volume %	10e.$01 Cum. < Volume %	10en.$01 Diff. Volume %	10en.$01 Cum. < Volume %	10es.$01 Diff. Volume %	10es.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
1.050	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00
1.168	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.01
1.301	0.05	0.09	0.05	0.08	0.04	0.04
1.448	0.06	0.14	0.05	0.13	0.05	0.08
1.612	0.06	0.20	0.06	0.18	0.06	0.13
1.794	0.07	0.26	0.06	0.24	0.06	0.18
1.997	0.07	0.33	0.06	0.30	0.06	0.24
2.223	0.07	0.40	0.06	0.37	0.06	0.31
2.475	0.07	0.47	0.06	0.43	0.06	0.37
2.755	0.06	0.54	0.06	0.49	0.06	0.43
3.067	0.06	0.60	0.06	0.55	0.06	0.50
3.414	0.06	0.66	0.05	0.61	0.06	0.56
3.800	0.05	0.72	0.05	0.66	0.05	0.61
4.230	0.05	0.77	0.05	0.71	0.05	0.66
4.709	0.05	0.82	0.05	0.76	0.05	0.71
5.241	0.05	0.88	0.05	0.81	0.05	0.76
5.835	0.06	0.93	0.05	0.86	0.05	0.80
6.495	0.07	0.99	0.06	0.91	0.05	0.85
7.230	0.09	1.06	0.06	0.97	0.06	0.90
8.048	0.11	1.15	0.08	1.05	0.07	0.96
8.959	0.14	1.26	0.10	1.15	0.09	1.03
9.972	0.18	1.41	0.12	1.27	0.12	1.12
11.10	0.22	1.59	0.16	1.43	0.15	1.24
12.36	0.26	1.81	0.19	1.62	0.19	1.39
13.76	0.31	2.08	0.23	1.86	0.22	1.58
15.31	0.35	2.38	0.27	2.13	0.26	1.80
17.05	0.38	2.73	0.31	2.44	0.30	2.06
18.97	0.42	3.11	0.34	2.79	0.34	2.36
21.12	0.47	3.53	0.38	3.16	0.38	2.70
23.51	0.50	4.00	0.41	3.57	0.41	3.08
26.17	0.52	4.50	0.43	4.00	0.44	3.49
29.13	0.51	5.03	0.42	4.42	0.44	3.93
32.43	0.46	5.53	0.40	4.82	0.41	4.37
36.10	0.42	6.00	0.37	5.19	0.38	4.78
40.18	0.42	6.42	0.36	5.56	0.37	5.15
44.73	0.46	6.84	0.39	5.95	0.40	5.52
49.79	0.52	7.30	0.45	6.40	0.46	5.92
55.43	0.55	7.82	0.49	6.90	0.52	6.38
61.70	0.61	8.37	0.53	7.42	0.56	6.90
68.68	0.75	8.98	0.59	8.01	0.62	7.46
76.46	1.10	9.74	0.77	8.78	0.76	8.08
85.11	1.79	10.84	1.17	9.95	1.07	8.84
94.74	2.99	12.63	1.94	11.89	1.71	9.91
105.5	4.84	15.61	3.23	15.13	2.85	11.63
117.4	7.24	20.45	5.15	20.27	4.64	14.48
130.7	9.87	27.70	7.59	27.86	7.00	19.12
145.5	12.06	37.57	10.22	38.08	9.64	26.12
161.9	13.09	49.63	12.39	50.47	11.93	35.76
180.3	12.51	62.73	13.36	63.83	13.13	47.69
200.6	10.27	75.24	12.67	76.49	12.74	60.83
223.4	7.13	85.52	10.29	86.78	10.67	73.57
248.6	3.95	92.65	6.99	93.78	7.59	84.24
276.8	1.78	96.60	3.72	97.50	4.42	91.83
308.1	1.02	98.38	1.45	98.95	2.11	96.25
342.9	0.54	99.40	0.66	99.61	1.10	98.36
381.8	0.06	99.94	0.34	99.96	0.49	99.46
425.0	0.00	100.00	0.04	100.00	0.05	99.95
			0.00		0.00	100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:56 21 Jun 2012

10e.$01, 10en.$01, 10es.$01


Particle Diameter um	10e.$01 Diff. Volume %	10e.$01 Cum. < Volume %	10en.$01 Diff. Volume %	10en.$01 Cum. < Volume %	10es.$01 Diff. Volume %	10es.$01 Cum. < Volume %
2.475	0.07	0.47	0.06	0.43	0.06	0.43
2.755	0.06	0.54	0.06	0.49	0.06	0.50
3.067	0.06	0.60	0.06	0.55	0.06	0.56
3.414	0.06	0.66	0.05	0.61	0.05	0.61
3.800	0.05	0.72	0.05	0.66	0.05	0.66
4.230	0.05	0.77	0.05	0.71	0.05	0.71
4.709	0.05	0.82	0.05	0.76	0.05	0.76
5.241	0.05	0.88	0.05	0.81	0.05	0.80
5.835	0.06	0.93	0.05	0.86	0.05	0.85
6.495	0.07	0.99	0.06	0.91	0.06	0.90
7.230	0.09	1.06	0.08	0.97	0.07	0.96
8.048	0.11	1.15	0.10	1.05	0.09	1.03
8.959	0.14	1.26	0.12	1.15	0.12	1.12
9.972	0.18	1.41	0.16	1.27	0.15	1.24
11.10	0.22	1.59	0.19	1.43	0.19	1.39
12.36	0.26	1.81	0.23	1.62	0.22	1.58
13.76	0.31	2.08	0.27	1.86	0.26	1.80
15.31	0.35	2.38	0.31	2.13	0.30	2.06
17.05	0.38	2.73	0.34	2.44	0.34	2.36
18.97	0.42	3.11	0.38	2.79	0.38	2.70
21.12	0.47	3.53	0.41	3.16	0.41	3.08
23.51	0.50	4.00	0.43	3.57	0.44	3.49
26.17	0.52	4.50	0.42	4.00	0.44	3.93
29.13	0.51	5.03	0.40	4.42	0.41	4.37
32.43	0.46	5.53	0.37	4.82	0.38	4.78
36.10	0.42	6.00	0.36	5.19	0.37	5.15
40.18	0.42	6.42	0.39	5.56	0.40	5.52
44.73	0.46	6.84	0.45	5.95	0.46	5.92
49.79	0.52	7.30	0.49	6.40	0.52	6.38
55.43	0.55	7.82	0.53	6.90	0.56	6.90
61.70	0.61	8.37	0.59	7.42	0.62	7.46
68.68	0.75	8.98	0.77	8.01	0.76	8.08
76.46	1.10	9.74	1.17	8.78	1.07	8.84
85.11	1.79	10.84	1.94	9.95	1.71	9.91
94.74	2.99	12.63	3.23	11.89	2.85	11.63
105.5	4.84	15.61	5.15	15.13	4.64	14.48
117.4	7.24	20.45	7.59	20.27	7.00	19.12
130.7	9.87	27.70	10.22	27.86	9.64	26.12
145.5	12.06	37.57	12.39	38.08	11.93	35.76
161.9	13.09	49.63	13.36	50.47	13.13	47.69
180.3	12.51	62.73	12.67	63.83	12.74	60.83
200.6	10.27	75.24	10.29	76.49	10.67	73.57
223.4	7.13	85.52	6.99	86.78	7.59	84.24
248.6	3.95	92.65	3.72	93.78	4.42	91.83
276.8	1.78	96.60	1.45	97.50	2.11	96.25
308.1	1.02	98.38	0.66	98.95	1.10	98.36
342.9	0.54	99.40	0.34	99.61	0.49	99.46
381.8	0.06	99.94	0.04	99.96	0.05	99.95
425.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:00 21 Jun 2012

10n.$01, 10s.$01

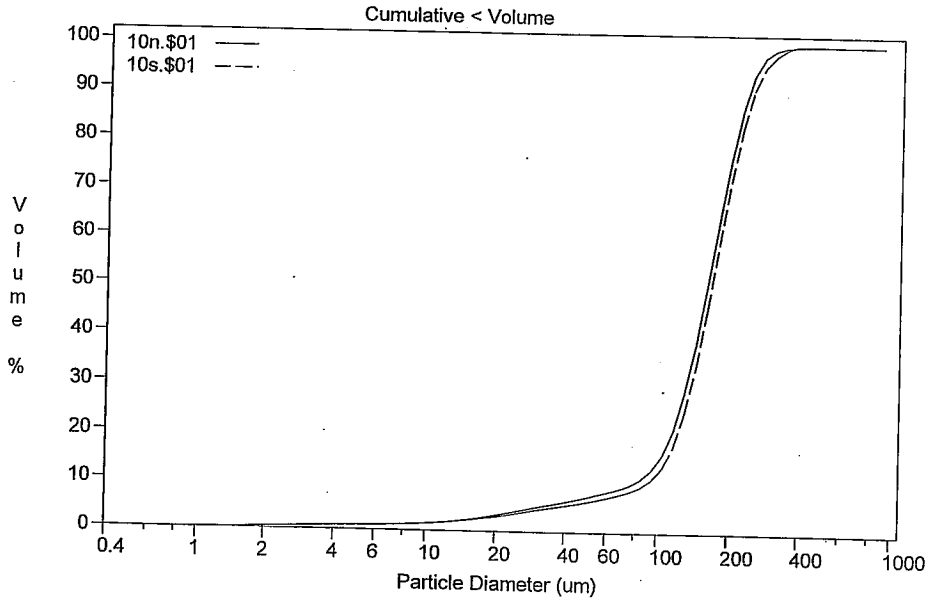

Volume Statistics (Arithmetic) 10n.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	158.3 um	95% Conf. Limits:	35.7-281 um
Median:	160.5 um	S.D.:	62.6 um
Mean/Median Ratio:	0.986	Variance:	3920 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	39.5%
		Skewness:	-0.2 Left skewed
		Kurtosis:	0.424 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	78.41	132.4	160.5	174.4	234.8

附4.9-19

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-31 S04(10 號捕砂器)砂樣 N、S 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

15:56 21 Jun 2012

10e.$01, 10en.$01, 10es.$01

Particle Diameter um	10e.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
526.6	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
586.2	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-30 (續一) S04(10 號捕砂器)砂樣 E、EN、ES 粒徑分析累積百分比

10n.$01, 10s.$01

Particle Diameter um	10n.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10s.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
13.76	0.29	2.06	0.26	1.89
15.31	0.33	2.35	0.29	2.14
17.05	0.37	2.67	0.32	2.43
18.97	0.41	3.04	0.35	2.75
21.12	0.45	3.45	0.39	3.11
23.51	0.47	3.90	0.41	3.49
26.17	0.48	4.37	0.41	3.90
29.13	0.46	4.85	0.39	4.31
32.43	0.43	5.32	0.36	4.70
36.10	0.43	5.75	0.34	5.06
40.18	0.47	6.18	0.37	5.40
44.73	0.53	6.65	0.42	5.77
49.79	0.57	7.18	0.48	6.19
55.43	0.58	7.75	0.51	6.67
61.70	0.62	8.33	0.55	7.18
68.68	0.78	8.95	0.65	7.74
76.46	1.19	9.73	0.93	8.39
85.11	1.97	10.92	1.53	9.32
94.74	3.26	12.89	2.65	10.85
105.5	5.14	16.15	4.42	13.50
117.4	7.53	21.29	6.80	17.92
130.7	10.07	28.82	9.48	24.72
145.5	12.17	38.89	11.86	34.20
161.9	13.11	51.05	13.17	46.06
180.3	12.46	64.17	12.89	59.23
200.6	10.20	76.63	10.90	72.12
223.4	7.01	86.83	7.87	83.02
248.6	3.79	93.83	4.69	90.89
276.8	1.48	97.63	2.37	95.58
308.1	0.59	99.10	1.36	97.95
342.9	0.27	99.70	0.63	99.31
381.8	0.03	99.97	0.07	99.93
425.0	0.00	100.00	0.00	100.00
473.0	0.00	100.00	0.00	100.00
526.6	0.00	100.00	0.00	100.00
586.2	0.00	100.00	0.00	100.00
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

10n.$01, 10s.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 10s.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	166.9 um	95% Conf. Limits:	38.9-295 um
Median:	167.4 um	S.D.:	65.3 um
Mean/Median Ratio:	0.997	Variance:	4270 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	39.1%
		Skewness:	-0.0795 Left skewed
		Kurtosis:	0.577 Leptokurtic


% <	10	30	50	60	90
Size um	89.40	138.9	167.4	181.5	245.8

Particle Diameter um	10n.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10s.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.02	0.00	0.01	0.00
1.050	0.03	0.02	0.03	0.01
1.168	0.04	0.05	0.04	0.04
1.301	0.06	0.09	0.05	0.08
1.448	0.06	0.15	0.06	0.13
1.612	0.07	0.21	0.06	0.19
1.794	0.07	0.28	0.07	0.25
1.997	0.07	0.36	0.07	0.31
2.223	0.07	0.43	0.07	0.38
2.475	0.07	0.50	0.07	0.45
2.755	0.07	0.58	0.06	0.51
3.067	0.06	0.64	0.06	0.58
3.414	0.06	0.71	0.06	0.64
3.800	0.06	0.77	0.06	0.70
4.230	0.05	0.82	0.05	0.75
4.709	0.05	0.88	0.05	0.81
5.241	0.05	0.93	0.05	0.86
5.835	0.06	0.98	0.06	0.91
6.495	0.07	1.04	0.06	0.97
7.230	0.08	1.11	0.08	1.03
8.048	0.11	1.19	0.10	1.11
8.959	0.13	1.30	0.12	1.21
9.972	0.17	1.43	0.15	1.33
11.10	0.21	1.60	0.19	1.48
12.36	0.25	1.81	0.22	1.67

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:01 21 Jun 2012

10w.$01, 10wn.$01, 10ws.$01

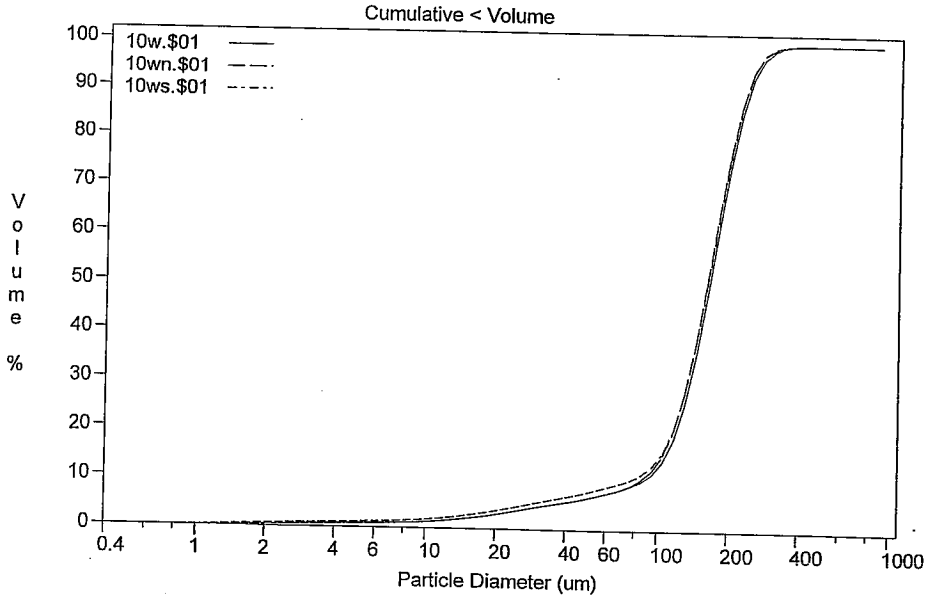

Volume Statistics (Arithmetic) 10w.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	163.1 um	95% Conf. Limits:	40.5-286 um
Median:	164.9 um	S.D.:	62.5 um
Mean/Median Ratio:	0.989	Variance:	3910 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	38.3%
		Skewness:	-0.203 Left skewed
		Kurtosis:	0.527 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	86.41	137.0	164.9	178.5	239.3

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

10w.$01, 10wn.$01, 10ws.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 10wn.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	159.1 um	95% Conf. Limits:	39.3-279 um
Median:	160.9 um	S.D.:	61.1 um
Mean/Median Ratio:	0.989	Variance:	3740 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	38.4%
		Skewness:	-0.199 Left skewed
		Kurtosis:	0.501 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	83.78	133.3	160.9	174.7	234.0

Volume Statistics (Arithmetic) 10ws.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	158.6 um	95% Conf. Limits:	36-281 um
Median:	162.0 um	S.D.:	62.6 um
Mean/Median Ratio:	0.979	Variance:	3910 um^2
Mode:	170.8 um	C.V.:	39.5%
		Skewness:	-0.33 Left skewed
		Kurtosis:	0.348 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	74.94	133.8	162.0	175.7	234.7

Particle Diameter um	10w.$01 Diff. Volume %	10w.$01 Cum. < Volume %	10wn.$01 Diff. Volume %	10wn.$01 Cum. < Volume %	10ws.$01 Diff. Volume %	10ws.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
0.943	0.01	0.00	0.01	0.00	0.05	0.11
1.050	0.03	0.01	0.03	0.02	0.06	0.17
1.168	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.23
1.301	0.05	0.08	0.05	0.09	0.07	0.29
1.448	0.05	0.13	0.06	0.14	0.07	0.36
1.612	0.06	0.18	0.06	0.19	0.07	0.43
1.794	0.06	0.24	0.07	0.25	0.07	0.51
1.997	0.06	0.31	0.07	0.32	0.07	0.58
2.223	0.06	0.37	0.07	0.39	0.07	0.65

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^{R} LS Particle Size Analysis

16:01 21 Jun 2012

10w.$01, 10wn.$01, 10ws.$01

Particle Diameter um	10w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
526.6	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
586.2	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^{R} LS Particle Size Analysis

16:01 21 Jun 2012

10w.$01, 10wn.$01, 10ws.$01

Particle Diameter um	10w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	10ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
2.475	0.06	0.44	0.06	0.45	0.07	0.72
2.755	0.06	0.50	0.06	0.52	0.06	0.79
3.067	0.06	0.56	0.06	0.58	0.06	0.85
3.414	0.05	0.61	0.05	0.63	0.06	0.91
3.800	0.05	0.67	0.05	0.69	0.06	0.97
4.230	0.05	0.72	0.05	0.74	0.06	1.03
4.709	0.05	0.76	0.05	0.78	0.06	1.08
5.241	0.05	0.81	0.05	0.83	0.06	1.14
5.835	0.05	0.86	0.05	0.88	0.07	1.21
6.495	0.06	0.91	0.06	0.93	0.08	1.28
7.230	0.07	0.97	0.08	0.99	0.10	1.36
8.048	0.09	1.04	0.10	1.06	0.12	1.46
8.959	0.12	1.13	0.12	1.16	0.15	1.59
9.972	0.15	1.25	0.15	1.28	0.19	1.74
11.10	0.19	1.40	0.19	1.44	0.22	1.92
12.36	0.22	1.59	0.23	1.63	0.26	2.15
13.76	0.26	1.81	0.26	1.85	0.30	2.41
15.31	0.29	2.07	0.30	2.11	0.34	2.71
17.05	0.33	2.37	0.33	2.41	0.38	3.05
18.97	0.37	2.69	0.37	2.74	0.42	3.43
21.12	0.40	3.06	0.41	3.11	0.46	3.85
23.51	0.43	3.46	0.44	3.51	0.49	4.30
26.17	0.44	3.89	0.45	3.95	0.50	4.79
29.13	0.43	4.34	0.43	4.40	0.47	5.29
32.43	0.39	4.76	0.39	4.83	0.44	5.76
36.10	0.37	5.16	0.37	5.22	0.42	6.20
40.18	0.39	5.53	0.39	5.58	0.45	6.62
44.73	0.45	5.92	0.44	5.97	0.52	7.07
49.79	0.52	6.38	0.51	6.41	0.58	7.59
55.43	0.57	6.90	0.57	6.92	0.60	8.17
61.70	0.61	7.47	0.65	7.49	0.63	8.77
68.68	0.71	8.08	0.83	8.14	0.75	9.40
76.46	0.99	8.79	1.22	8.97	1.07	10.15
85.11	1.60	9.78	1.97	10.19	1.74	11.21
94.74	2.75	11.39	3.25	12.16	2.94	12.96
105.5	4.59	14.14	5.16	15.41	4.79	15.90
117.4	7.06	18.73	7.60	20.58	7.21	20.69
130.7	9.82	25.78	10.20	28.18	9.88	27.90
145.5	12.21	35.60	12.36	38.38	12.17	37.78
161.9	13.46	47.81	13.33	50.74	13.32	49.95
180.3	13.04	61.27	12.67	64.07	12.82	63.28
200.6	10.87	74.31	10.32	76.74	10.60	76.10
223.4	7.63	85.18	7.02	87.05	7.33	86.70
248.6	4.27	92.81	3.72	94.07	3.95	94.03
276.8	1.79	97.08	1.38	97.80	1.41	97.98
308.1	0.76	98.87	0.53	99.18	0.42	99.39
342.9	0.33	99.64	0.26	99.71	0.16	99.81
381.8	0.04	99.96	0.03	99.97	0.02	99.98
425.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:05 21 Jun 2012

7e.$02, 7en.$01, 7es.$01

Volume Statistics (Arithmetic) 7en.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	132.1 um	95% Conf. Limits:	35.1-229 um
Median:	136.0 um	S.D.:	49.5 um
Mean/Median Ratio:	0.971	Variance:	2450 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	37.5%
		Skewness:	-0.564 Left skewed
		Kurtosis:	0.279 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	65.69	113.1	136.0	147.1	192.4

Volume Statistics (Arithmetic) 7es.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	137.4 um	95% Conf. Limits:	37.1-238 um
Median:	140.7 um	S.D.:	51.2 um
Mean/Median Ratio:	0.976	Variance:	2620 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	37.2%
		Skewness:	-0.512 Left skewed
		Kurtosis:	0.274 Leptokurtic


% <	10	30	50	60	90
Size um	72.05	117.1	140.7	152.5	199.4

Particle Diameter um	7e.$02 Diff. Volume %	7e.$02 Cum. < Volume %	7en.$01 Diff. Volume %	7en.$01 Cum. < Volume %	7es.$01 Diff. Volume %	7es.$01 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
0.684	0.03	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01
0.761	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04
0.847	0.05	0.08	0.06	0.10	0.05	0.08
0.943	0.06	0.14	0.07	0.16	0.06	0.13
1.050	0.07	0.20	0.08	0.24	0.07	0.19
1.168	0.08	0.27	0.09	0.32	0.07	0.26
1.301	0.08	0.35	0.09	0.41	0.08	0.33
1.448	0.08	0.43	0.09	0.50	0.08	0.41
1.612	0.08	0.51	0.09	0.59	0.08	0.48
1.794	0.08	0.59	0.08	0.67	0.07	0.56
1.997	0.07	0.67	0.08	0.76	0.07	0.63
2.223	0.07	0.74	0.07	0.83	0.06	0.70

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis 16:05 21 Jun 2012

7e.$02, 7en.$01, 7es.$01

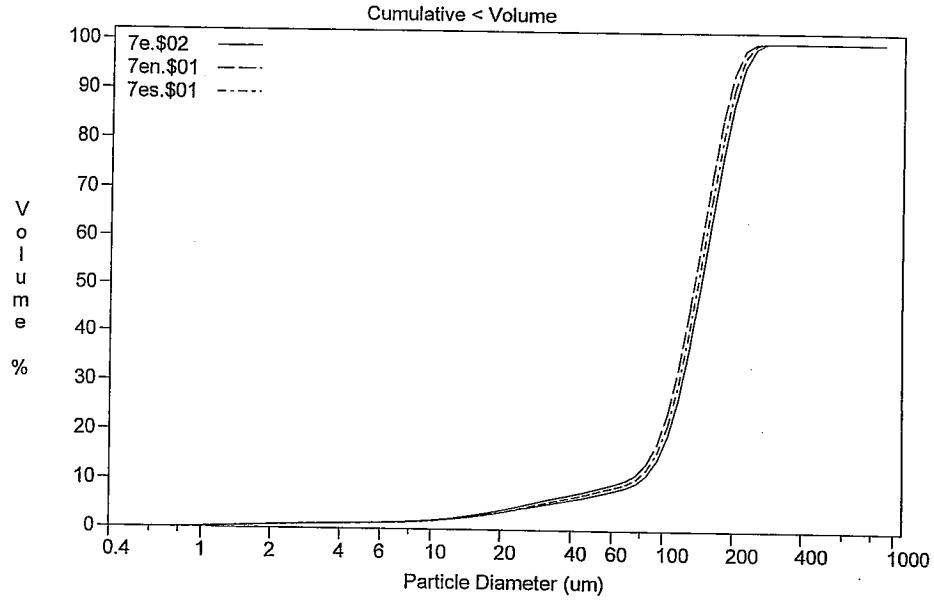

Volume Statistics (Arithmetic) 7e.$02

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	142.6 um	95% Conf. Limits:	38.9-246 um
Median:	145.5 um	S.D.:	52.9 um
Mean/Median Ratio:	0.980	Variance:	2790 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	37.1%
		Skewness:	-0.478 Left skewed
		Kurtosis:	0.319 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	77.87	121.0	145.5	157.6	207.9

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^{R} LS Particle Size Analysis 16:05 21 Jun 2012

7e.$02, 7en.$01, 7es.$01

Particle Diameter um	7e.$02 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
526.6	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
586.2	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-39 (續一) S05(7 號捕砂器)砂樣 E、ES、EN 粒徑分析累積百分比

COULTER^{R} LS Particle Size Analysis 16:05 21 Jun 2012

7e.$02, 7en.$01, 7es.$01

Particle Diameter um	7e.$02 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7en.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7es.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
2.475	0.06	0.81	0.06	0.90	0.06	0.76
2.755	0.06	0.87	0.06	0.97	0.05	0.82
3.067	0.05	0.93	0.05	1.02	0.05	0.88
3.414	0.05	0.98	0.05	1.07	0.05	0.93
3.800	0.05	1.03	0.04	1.12	0.04	0.97
4.230	0.05	1.07	0.05	1.16	0.04	1.02
4.709	0.05	1.12	0.05	1.21	0.05	1.06
5.241	0.05	1.17	0.06	1.26	0.05	1.10
5.835	0.06	1.22	0.07	1.32	0.06	1.16
6.495	0.07	1.28	0.08	1.39	0.07	1.21
7.230	0.09	1.35	0.11	1.47	0.09	1.29
8.048	0.12	1.45	0.14	1.58	0.12	1.38
8.959	0.15	1.56	0.17	1.71	0.15	1.50
9.972	0.18	1.71	0.21	1.88	0.19	1.65
11.10	0.21	1.89	0.25	2.09	0.23	1.84
12.36	0.25	2.10	0.29	2.33	0.27	2.06
13.76	0.28	2.35	0.33	2.62	0.31	2.33
15.31	0.32	2.64	0.37	2.95	0.36	2.65
17.05	0.36	2.96	0.42	3.32	0.40	3.00
18.97	0.39	3.31	0.46	3.73	0.44	3.40
21.12	0.42	3.70	0.51	4.20	0.47	3.84
23.51	0.45	4.13	0.55	4.71	0.50	4.31
26.17	0.44	4.57	0.55	5.26	0.50	4.81
29.13	0.42	5.02	0.53	5.81	0.48	5.31
32.43	0.39	5.44	0.49	6.33	0.45	5.79
36.10	0.40	5.83	0.47	6.82	0.46	6.24
40.18	0.44	6.22	0.51	7.29	0.51	6.70
44.73	0.50	6.66	0.57	7.80	0.56	7.21
49.79	0.52	7.16	0.60	8.37	0.56	7.77
55.43	0.52	7.68	0.61	8.96	0.56	8.34
61.70	0.60	8.20	0.74	9.58	0.66	8.89
68.68	0.92	8.81	1.19	10.32	1.04	9.55
76.46	1.68	9.73	2.22	11.51	1.93	10.59
85.11	3.07	11.41	3.99	13.73	3.51	12.53
94.74	5.11	14.47	6.42	17.72	5.74	16.03
105.5	7.65	19.59	9.20	24.14	8.40	21.78
117.4	10.30	27.24	11.78	33.34	11.01	30.17
130.7	12.47	37.53	13.52	45.12	12.96	41.18
145.5	13.57	50.01	13.78	58.64	13.68	54.14
161.9	13.10	63.58	12.20	72.42	12.71	67.82
180.3	10.92	76.68	9.02	84.62	10.10	80.52
200.6	7.54	87.60	4.91	93.64	6.45	90.62
223.4	3.81	95.14	1.36	98.55	2.54	97.07
248.6	0.99	98.95	0.09	99.91	0.38	99.61
276.8	0.06	99.94	0.00	100.00	0.01	99.99
308.1	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
342.9	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
381.8	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
425.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-39 S05(7 號捕砂器)砂樣 E、ES、EN 粒徑分析累積百分比

7n.$01, 7s.$02

Volume Statistics (Arithmetic) 7s.$02

Calculations from 0.400 um to 900.0 um


Volume	100.0%		
Mean:	140.6 um	95% Conf. Limits:	38.8-242 um
Median:	143.4 um	S.D.:	52 um
Mean/Median Ratio:	0.981	Variance:	2700 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	36.9%
		Skewness:	-0.468 Left skewed
		Kurtosis:	0.303 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	77.18	119.4	143.4	155.4	204.4

Particle Diameter um	7n.$01 Diff. Volume %	7n.$01 Cum. < Volume %	7s.$02 Diff. Volume %	7s.$02 Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.00	0.00	0.00	0.00
0.684	0.00	0.00	0.00	0.00
0.761	0.00	0.00	0.00	0.00
0.847	0.00	0.00	0.00	0.00
0.943	0.02	0.00	0.02	0.00
1.050	0.04	0.02	0.04	0.02
1.168	0.05	0.06	0.05	0.06
1.301	0.06	0.11	0.06	0.11
1.448	0.07	0.18	0.07	0.18
1.612	0.08	0.25	0.08	0.25
1.794	0.08	0.33	0.08	0.33
1.997	0.08	0.41	0.08	0.41
2.223	0.08	0.49	0.08	0.49
2.475	0.07	0.57	0.07	0.57
2.755	0.07	0.64	0.07	0.65
3.067	0.06	0.71	0.06	0.72
3.414	0.06	0.77	0.06	0.78
3.800	0.05	0.83	0.05	0.83
4.230	0.05	0.88	0.05	0.89
4.709	0.05	0.93	0.05	0.93
5.241	0.05	0.98	0.05	0.98
5.835	0.06	1.03	0.05	1.03
6.495	0.07	1.08	0.07	1.08
7.230	0.09	1.15	0.08	1.15
8.048	0.11	1.24	0.11	1.23
8.959	0.15	1.35	0.14	1.34
9.972	0.18	1.50	0.18	1.48
11.10	0.23	1.68	0.22	1.65
12.36	0.27	1.91	0.26	1.87

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

7n.$01, 7s.$02

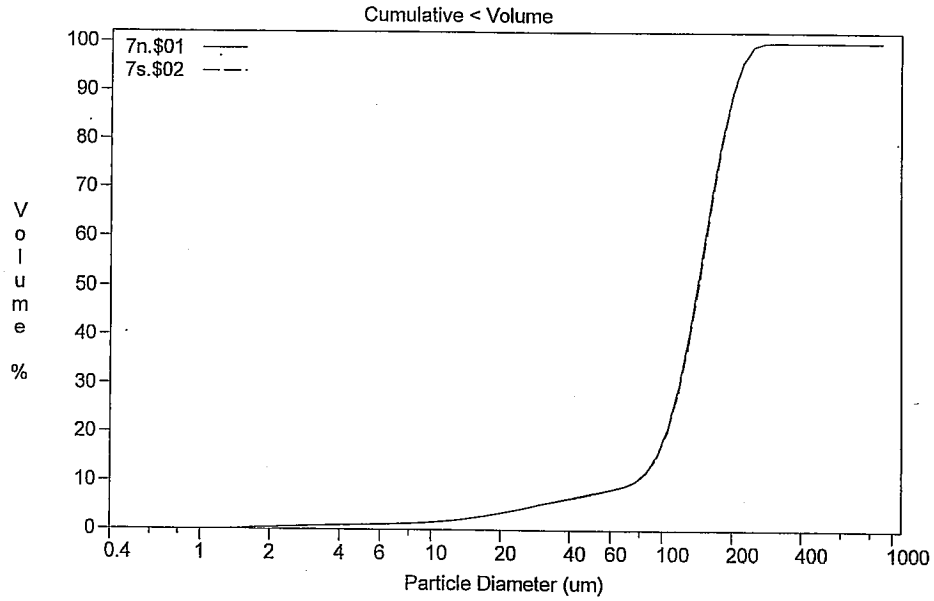

Volume Statistics (Arithmetic) 7n.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	139.0 um	95% Conf. Limits:	37.5-241 um
Median:	141.6 um	S.D.:	51.8 um
Mean/Median Ratio:	0.982	Variance:	2680 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	37.2%
		Skewness:	-0.449 Left skewed
		Kurtosis:	0.298 Leptokurtic


% <	10	30	50	60	90
Size um	75.58	118.1	141.6	153.5	202.2

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:06 21 Jun 2012

7w.$01, 7wn.$01, 7ws.$01

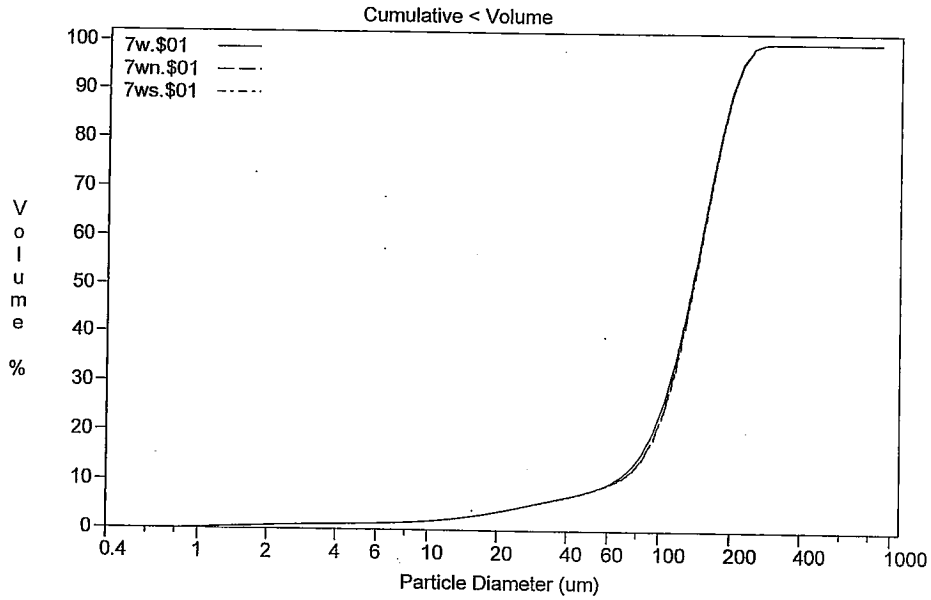

Volume Statistics (Arithmetic) 7w.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	134.7 um	95% Conf. Limits:	29-240 um
Median:	137.5 um	S.D.:	53.9 um
Mean/Median Ratio:	0.979	Variance:	2910 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	40%
		Skewness:	-0.313 Left skewed
		Kurtosis:	-0.0592 Platykurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	62.33	110.8	137.5	150.4	201.5

附4.9-26

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-43 S05(7 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積曲線圖

COULTER^R LS Particle Size Analysis

16:06 21 Jun 2012

7n.$01, 7s.$02

Particle Diameter um	7n.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7s.$02 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
13.76	0.31	2.18	0.30	2.13
15.31	0.36	2.49	0.34	2.43
17.05	0.40	2.85	0.39	2.77
18.97	0.44	3.25	0.43	3.16
21.12	0.47	3.69	0.46	3.58
23.51	0.49	4.16	0.48	4.04
26.17	0.50	4.65	0.48	4.52
29.13	0.49	5.15	0.45	5.00
32.43	0.47	5.64	0.43	5.46
36.10	0.47	6.11	0.43	5.89
40.18	0.48	6.58	0.47	6.32
44.73	0.50	7.06	0.51	6.78
49.79	0.48	7.56	0.52	7.29
55.43	0.48	8.04	0.51	7.81
61.70	0.60	8.52	0.59	8.32
68.68	1.00	9.12	0.94	8.91
76.46	1.88	10.11	1.78	9.85
85.11	3.43	11.99	3.27	11.63
94.74	5.67	15.41	5.42	14.90
105.5	8.36	21.08	8.03	20.33
117.4	10.99	29.44	10.67	28.35
130.7	12.91	40.43	12.73	39.02
145.5	13.57	53.34	13.63	51.75
161.9	12.58	66.92	12.91	65.39
180.3	10.07	79.49	10.53	78.29
200.6	6.60	89.56	7.05	88.82
223.4	3.07	96.16	3.32	95.87
248.6	0.73	99.23	0.77	99.19
276.8	0.04	99.96	0.04	99.96
308.1	0.00	100.00	0.00	100.00
342.9	0.00	100.00	0.00	100.00
381.8	0.00	100.00	0.00	100.00
425.0	0.00	100.00	0.00	100.00
473.0	0.00	100.00	0.00	100.00
526.6	0.00	100.00	0.00	100.00
586.2	0.00	100.00	0.00	100.00
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-42 S05(7 號捕砂器)砂樣 N、S 粒徑分析累積百分比

Particle Diameter um	7w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
2.475	0.06	0.86	0.06	0.83	0.06	0.81
2.755	0.06	0.92	0.06	0.89	0.06	0.87
3.067	0.05	0.98	0.05	0.94	0.05	0.93
3.414	0.05	1.04	0.05	0.99	0.05	0.98
3.800	0.05	1.09	0.04	1.04	0.04	1.02
4.230	0.05	1.13	0.04	1.08	0.04	1.07
4.709	0.05	1.18	0.05	1.13	0.05	1.11
5.241	0.06	1.23	0.05	1.17	0.05	1.16
5.835	0.07	1.29	0.06	1.23	0.06	1.21
6.495	0.08	1.36	0.07	1.29	0.07	1.27
7.230	0.10	1.44	0.10	1.36	0.09	1.34
8.048	0.13	1.54	0.12	1.46	0.12	1.44
8.959	0.16	1.67	0.15	1.58	0.15	1.56
9.972	0.19	1.83	0.19	1.73	0.19	1.71
11.10	0.23	2.02	0.23	1.92	0.23	1.90
12.36	0.27	2.26	0.27	2.15	0.27	2.13
13.76	0.31	2.53	0.32	2.43	0.31	2.39
15.31	0.35	2.84	0.36	2.74	0.35	2.70
17.05	0.39	3.20	0.40	3.10	0.39	3.05
18.97	0.44	3.59	0.44	3.50	0.44	3.45
21.12	0.48	4.03	0.48	3.94	0.48	3.89
23.51	0.50	4.50	0.52	4.42	0.50	4.36
26.17	0.51	5.01	0.53	4.94	0.50	4.86
29.13	0.48	5.51	0.51	5.47	0.48	5.37
32.43	0.45	5.99	0.49	5.98	0.45	5.84
36.10	0.45	6.44	0.49	6.47	0.46	6.29
40.18	0.52	6.89	0.54	6.96	0.53	6.75
44.73	0.65	7.41	0.62	7.49	0.63	7.28
49.79	0.81	8.05	0.72	8.11	0.74	7.91
55.43	1.02	8.86	0.85	8.84	0.86	8.65
61.70	1.36	9.88	1.11	9.68	1.11	9.51
68.68	1.96	11.24	1.64	10.79	1.61	10.62
76.46	2.90	13.20	2.60	12.44	2.52	12.22
85.11	4.27	16.10	4.07	15.04	3.94	14.74
94.74	6.04	20.38	6.01	19.11	5.84	18.68
105.5	8.07	26.41	8.24	25.12	8.05	24.52
117.4	10.10	34.48	10.37	33.35	10.23	32.56
130.7	11.69	44.58	11.97	43.73	11.93	42.79
145.5	12.36	56.27	12.54	55.70	12.65	54.73
161.9	11.63	68.63	11.69	68.24	11.93	67.37
180.3	9.50	80.26	9.51	79.93	9.80	79.31
200.6	6.34	89.76	6.35	89.45	6.57	89.10
223.4	3.06	96.10	3.21	95.79	3.30	95.68
248.6	0.79	99.16	0.93	99.00	0.95	98.98
276.8	0.05	99.95	0.07	99.93	0.07	99.93
308.1	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
342.9	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
381.8	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
425.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

Volume Statistics (Arithmetic) 7wn.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	135.8 um	95% Conf. Limits:	30.3-241 um
Median:	138.4 um	S.D.:	53.9 um
Mean/Median Ratio:	0.981	Variance:	2900 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	39.7%
		Skewness:	-0.321 Left skewed
		Kurtosis:	0.0192 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	63.68	112.5	138.4	151.1	202.6

Volume Statistics (Arithmetic) 7ws.$01

Calculations from 0.400 um to 900.0 um

Volume	100.0%		
Mean:	136.9 um	95% Conf. Limits:	31.2-242 um
Median:	139.6 um	S.D.:	53.9 um
Mean/Median Ratio:	0.980	Variance:	2900 um^2
Mode:	153.5 um	C.V.:	39.4%
		Skewness:	-0.338 Left skewed
		Kurtosis:	0.0274 Leptokurtic

% <	10	30	50	60	90
Size um	64.80	113.6	139.6	152.3	203.7

Particle Diameter um	7w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
0.400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.614	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
0.684	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01
0.761	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
0.847	0.06	0.09	0.06	0.09	0.05	0.09
0.943	0.07	0.15	0.07	0.14	0.06	0.14
1.050	0.08	0.22	0.07	0.21	0.07	0.20
1.168	0.08	0.29	0.08	0.28	0.08	0.28
1.301	0.08	0.38	0.08	0.36	0.08	0.35
1.448	0.09	0.46	0.08	0.44	0.08	0.43
1.612	0.08	0.55	0.08	0.53	0.08	0.52
1.794	0.08	0.63	0.08	0.61	0.08	0.60
1.997	0.08	0.71	0.07	0.69	0.07	0.67
2.223	0.07	0.79	0.07	0.76	0.07	0.74

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

COULTER^{R} LS Particle Size Analysis

16:06 21 Jun 2012

7w.$01, 7wn.$01, 7ws.$01

Particle Diameter um	7w.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7wn.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %	7ws.$01 Diff. Volume %	Cum. < Volume %
473.0	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
526.6	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
586.2	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
652.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
726.3	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
808.5	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900.0		100.00		100.00		100.00

註：附錄 IV.9 各表中之單位「um」係指「μm」

附錄 IV.9-45 (續一) S05(7 號捕砂器)砂樣 W、WN、WS 粒徑分析累積百分比


附　錄　Ⅳ.10

海岸地形調查成果

台灣電力公司


核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

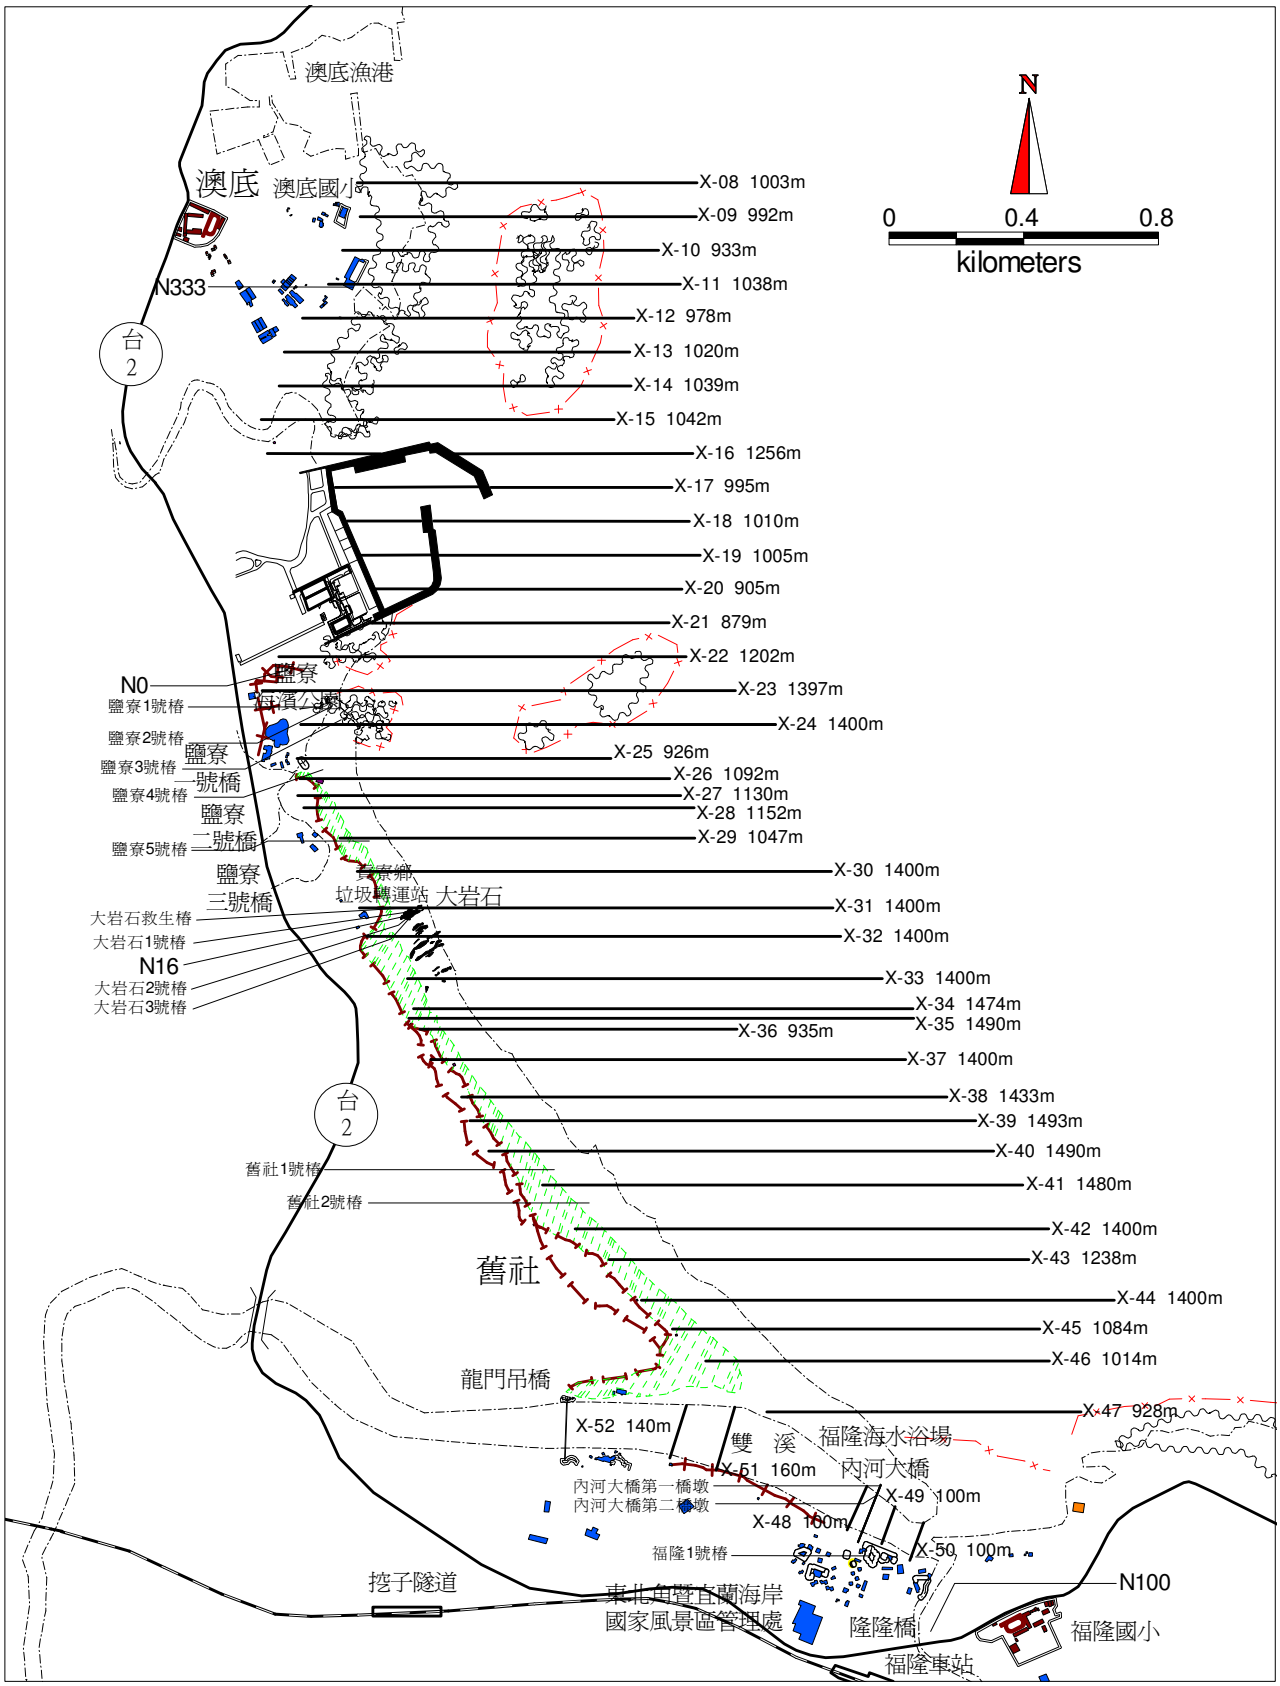


附錄IV.10-1 核四附近海岸地形陸上控制點及剖面相對位置示意圖


附4.10-1

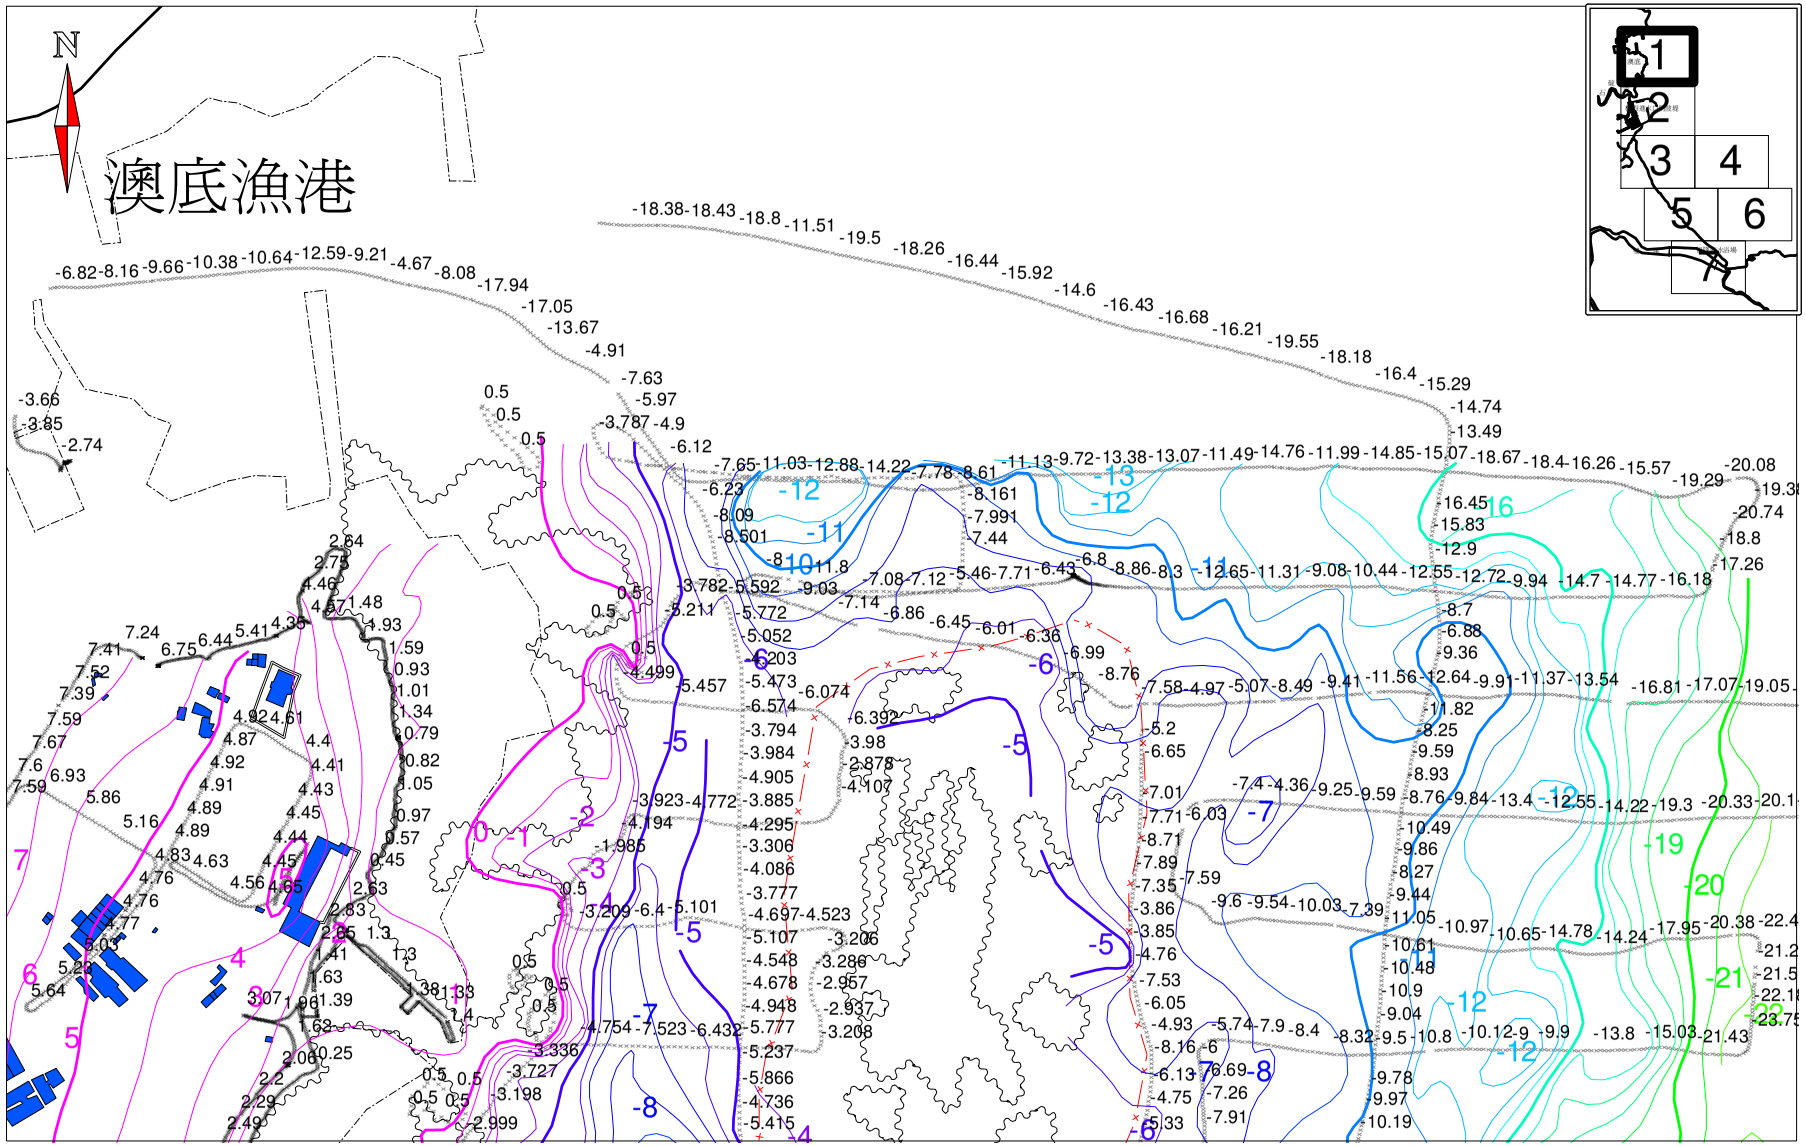

附錄IV.10-2 海岸地形101年6月（第二季）陸域地形、海域地形及水深測量

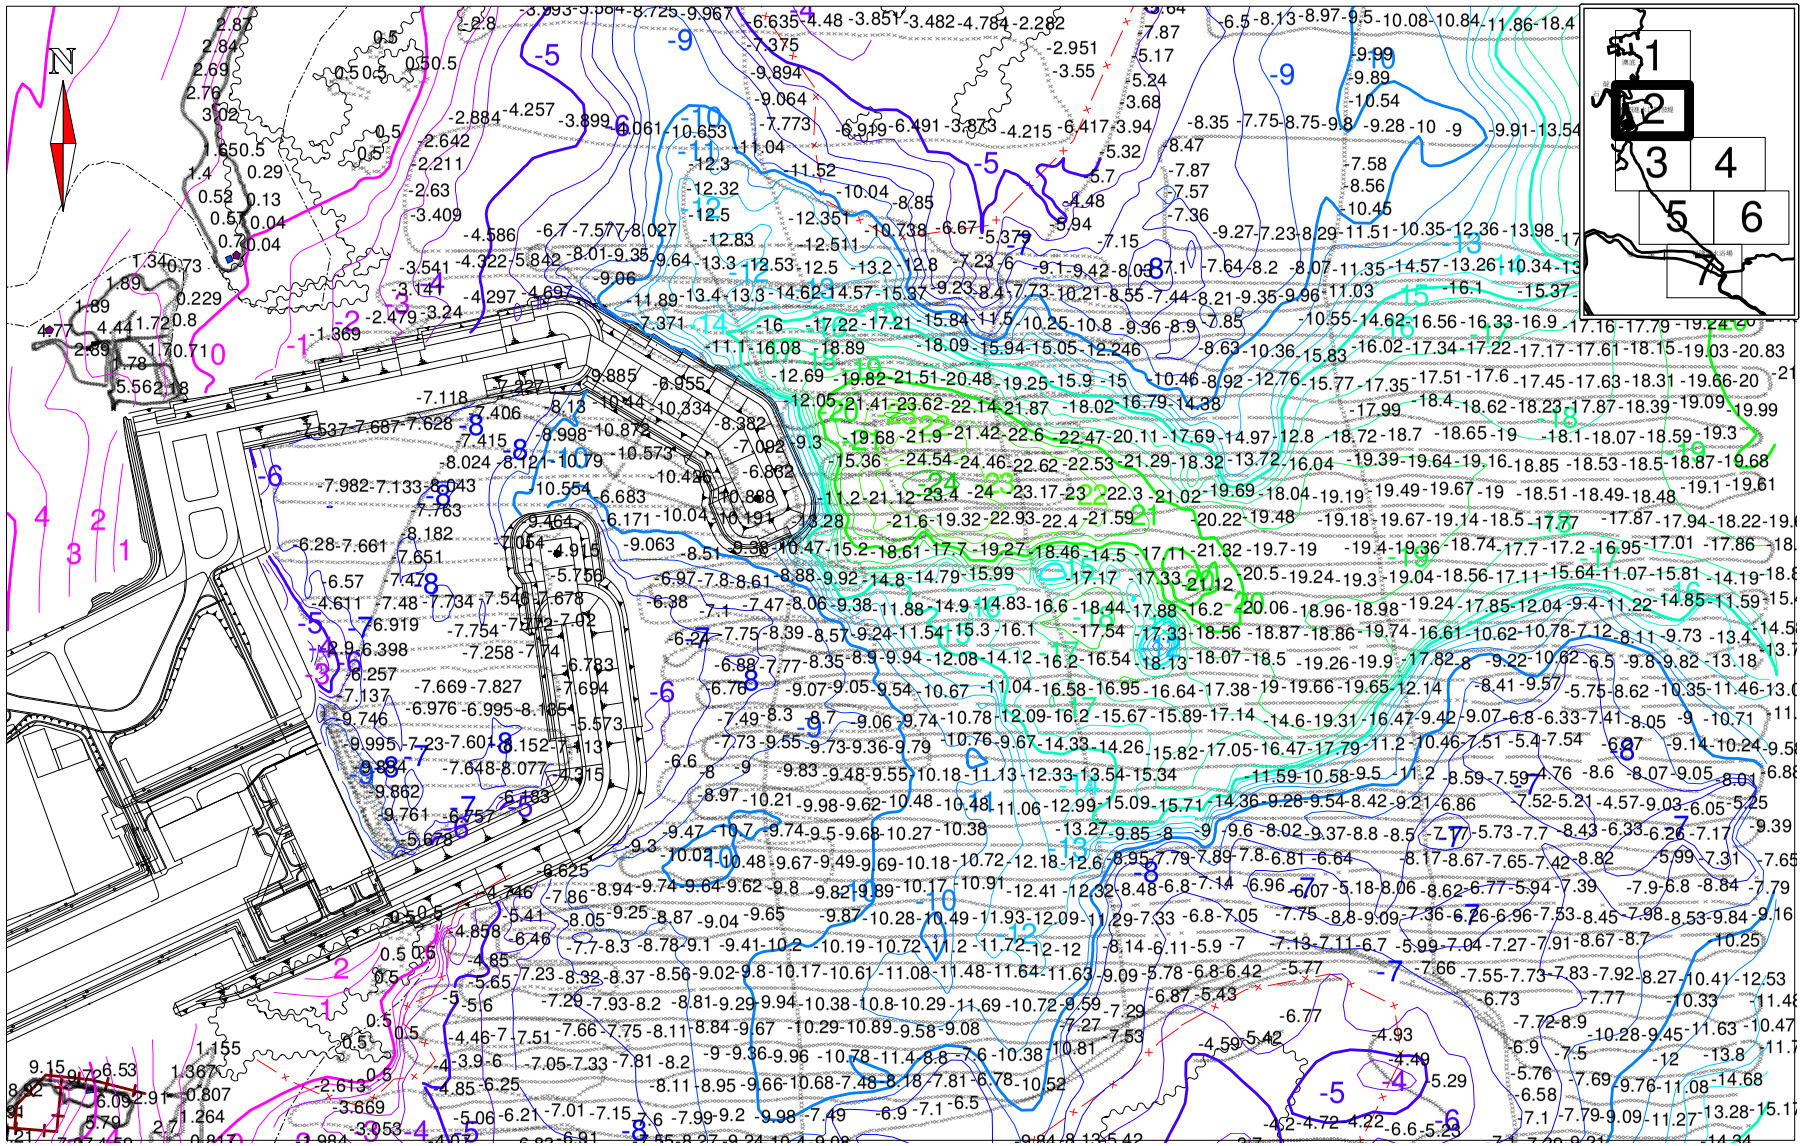


附錄IV.10-2 海岸地形101年6月（第二季）陸域地形、海域地形及水深測量（續1）

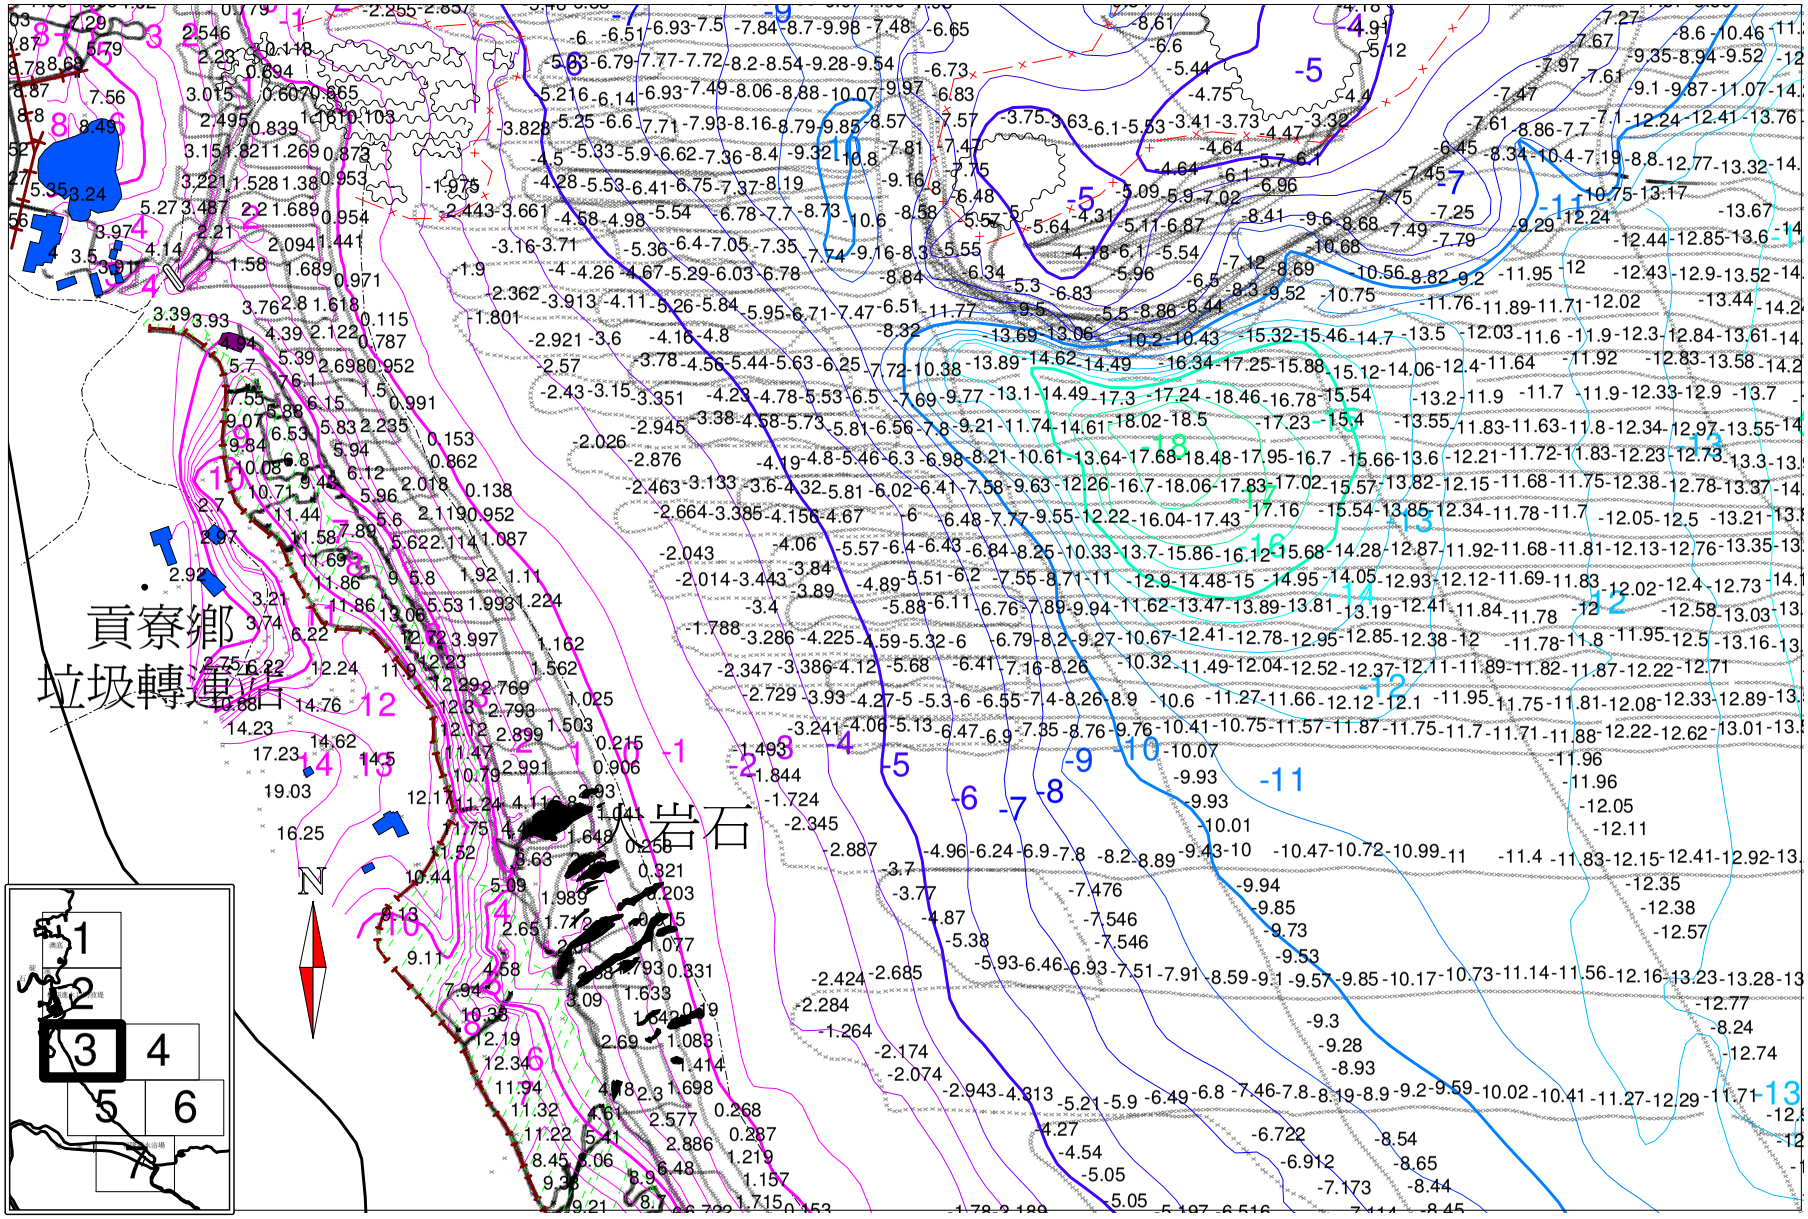


附4.10-4


附錄IV.10-2 海岸地形101年6月（第二季）陸域地形、海域地形及水深測量（續2）

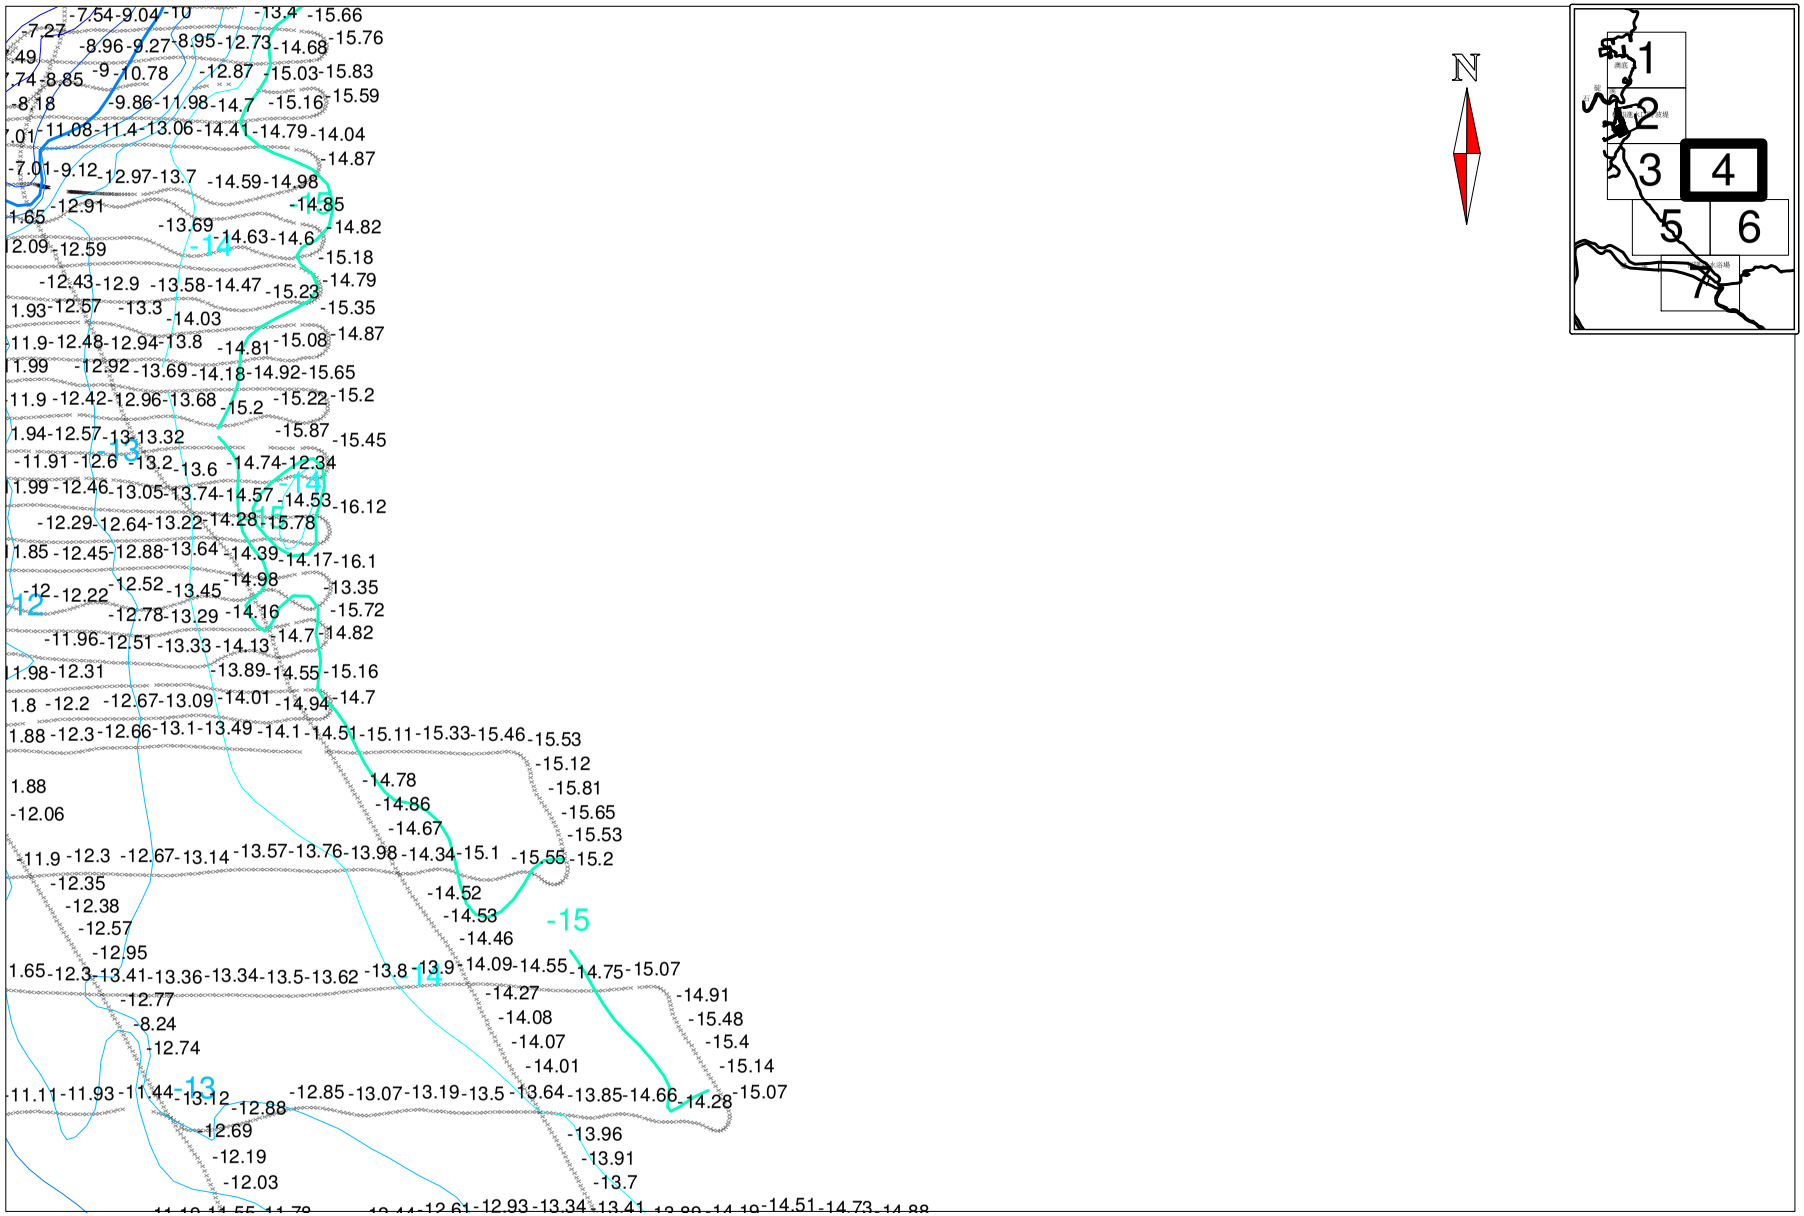


附錄IV.10-2 海岸地形101年6月（第二季）陸域地形、海域地形及水深測量（續3）

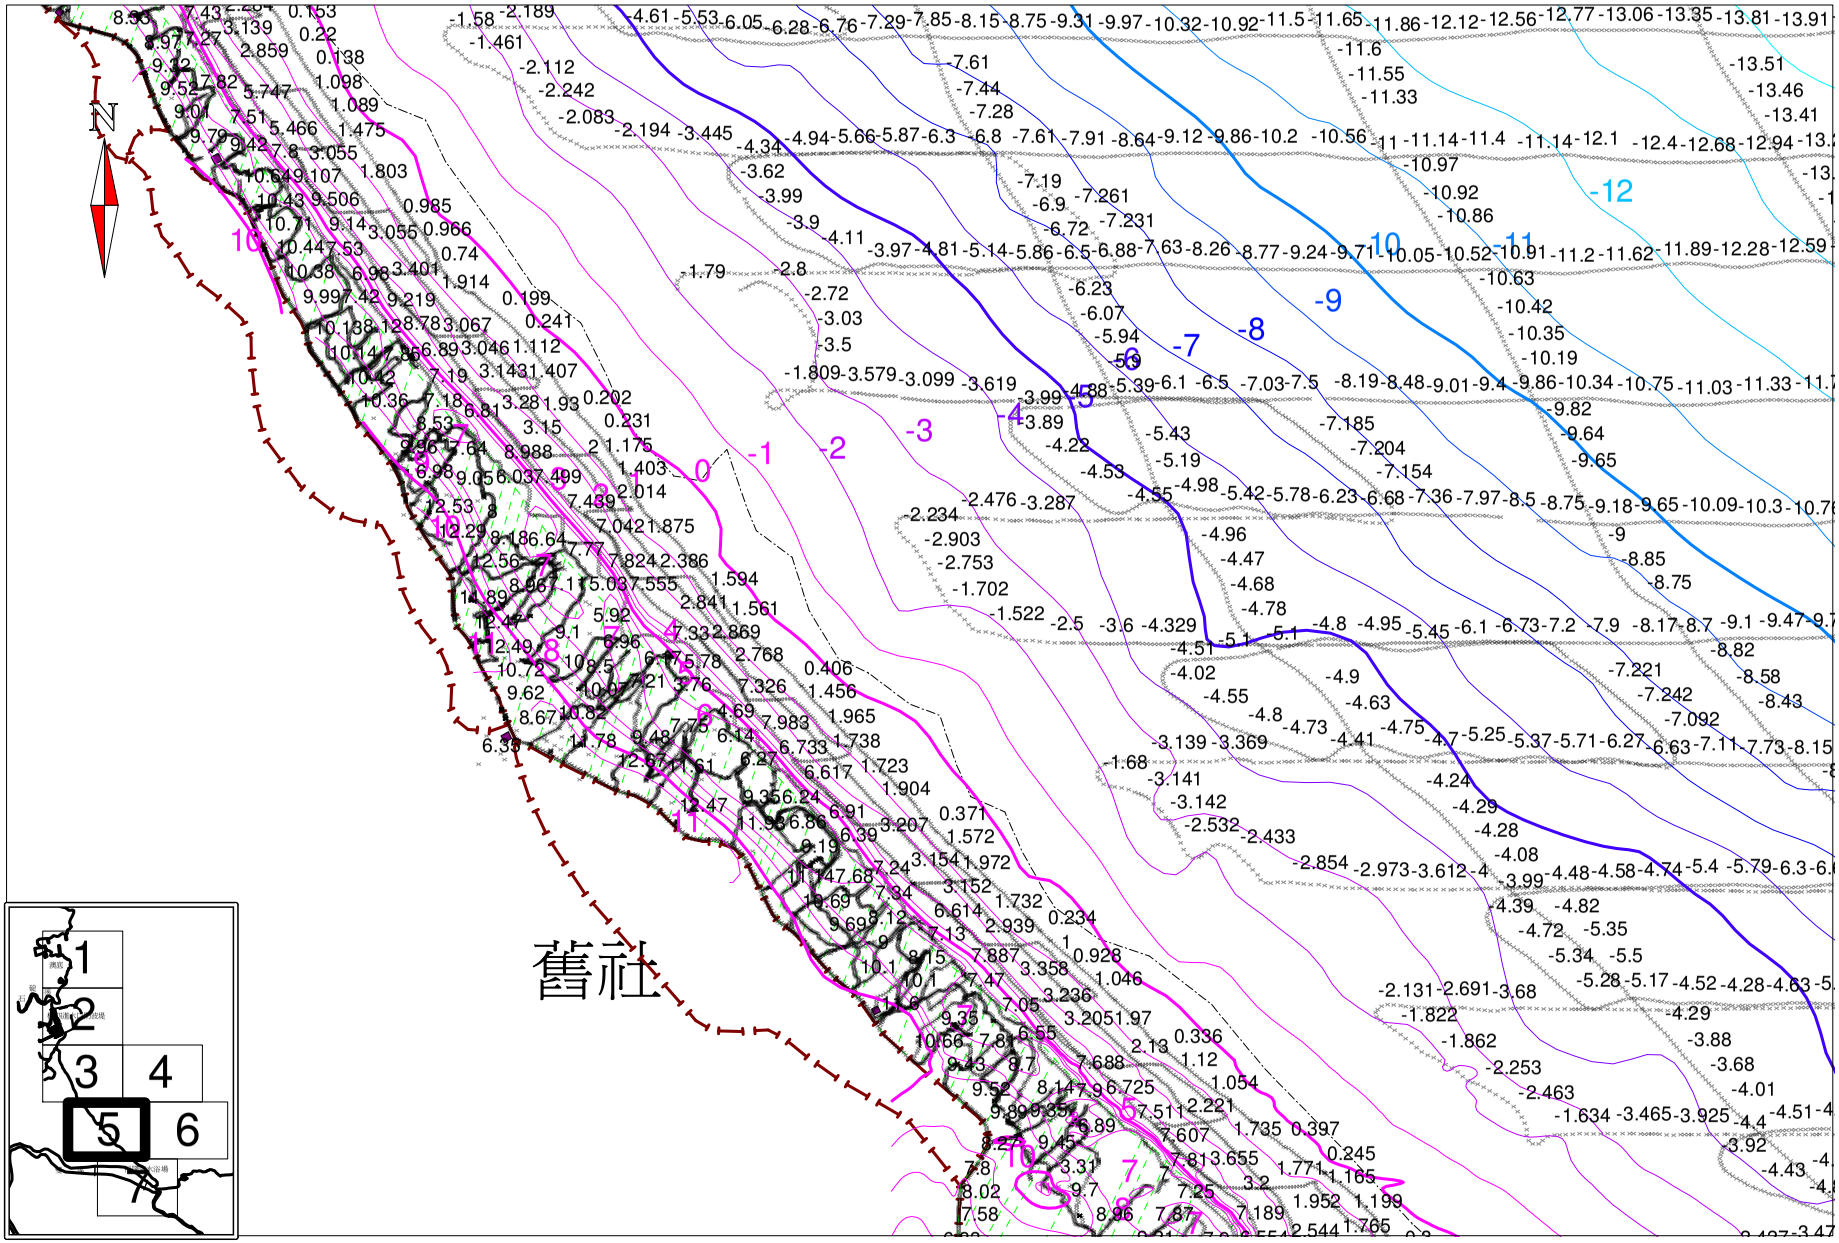


附錄IV.10-2 海岸地形101年6月（第二季）陸域地形、海域地形及水深測量（續4）

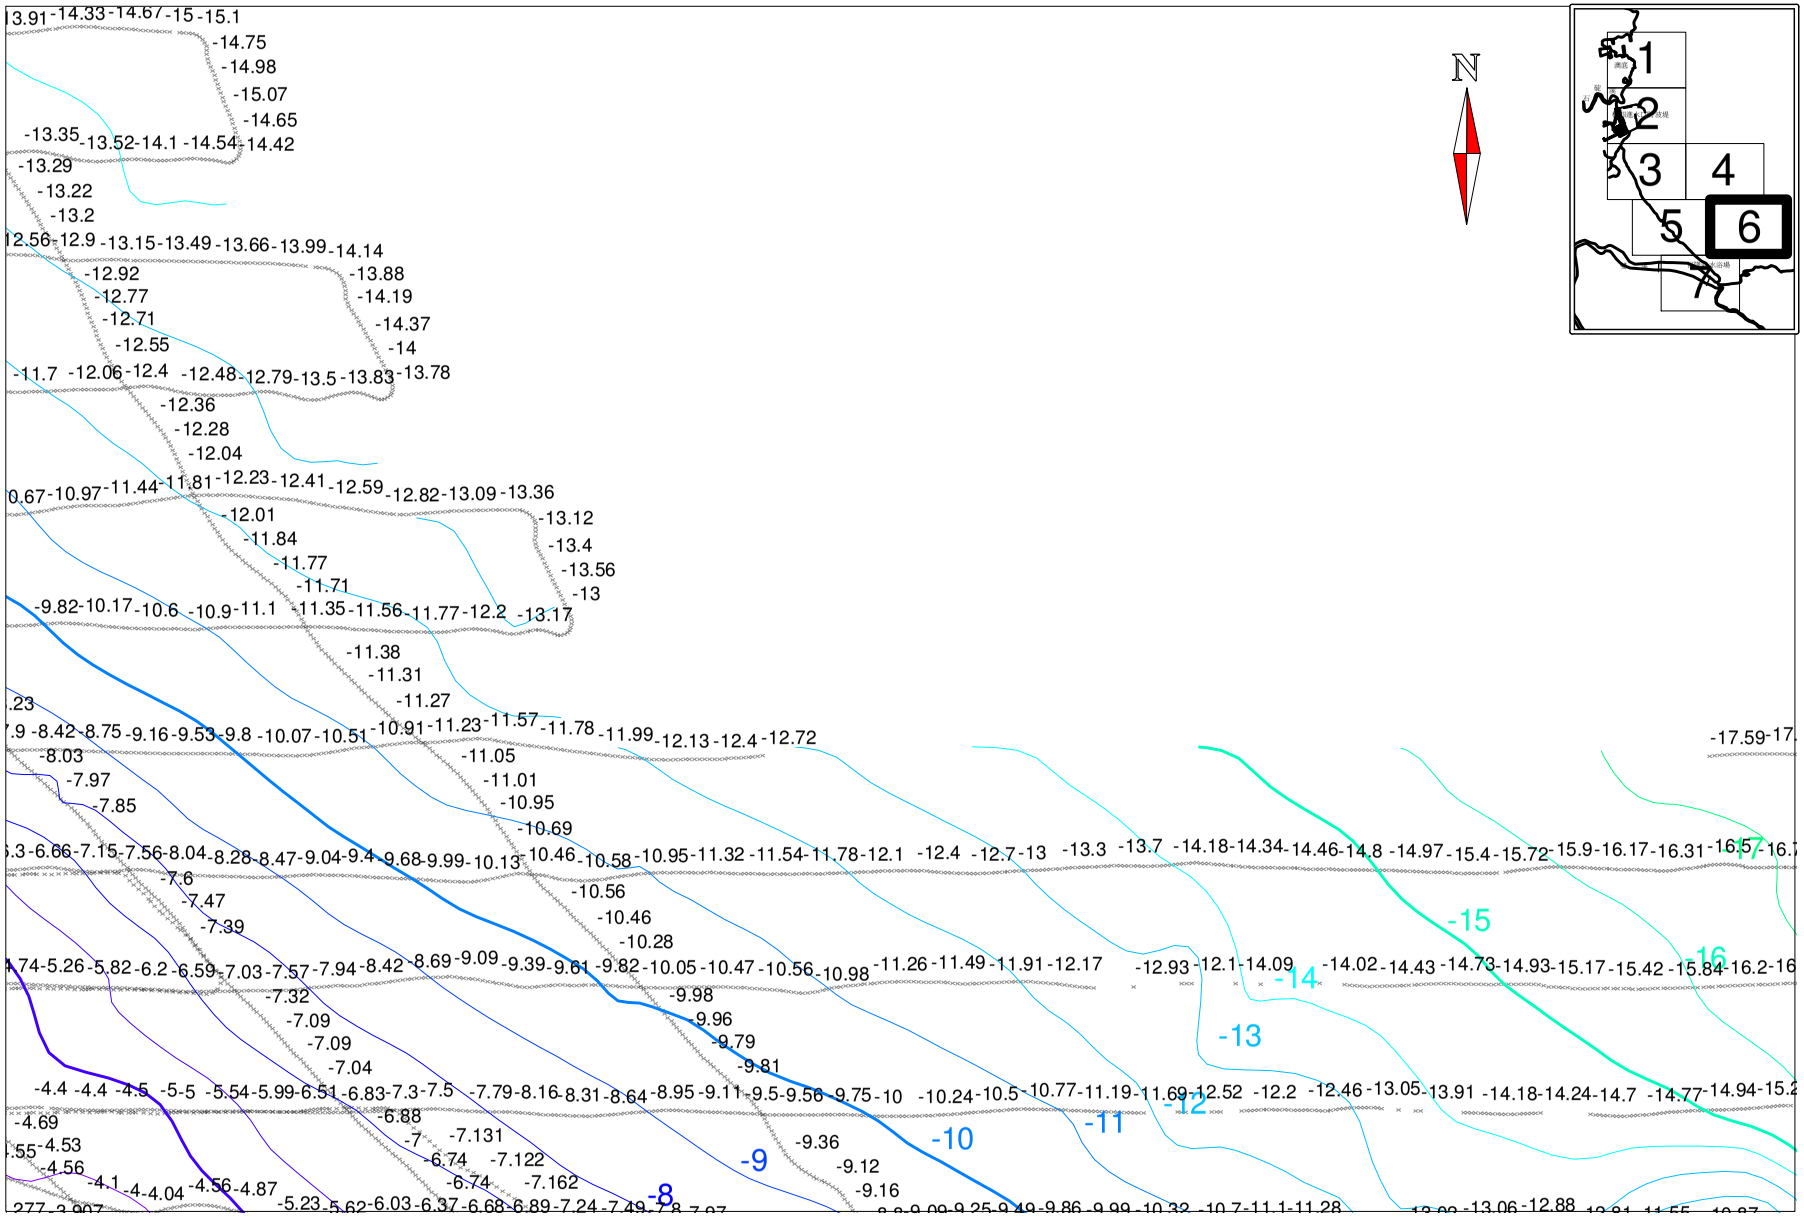



附錄IV.10-2 海岸地形101年6月（第二季）陸域地形、海域地形及水深測量（續5）

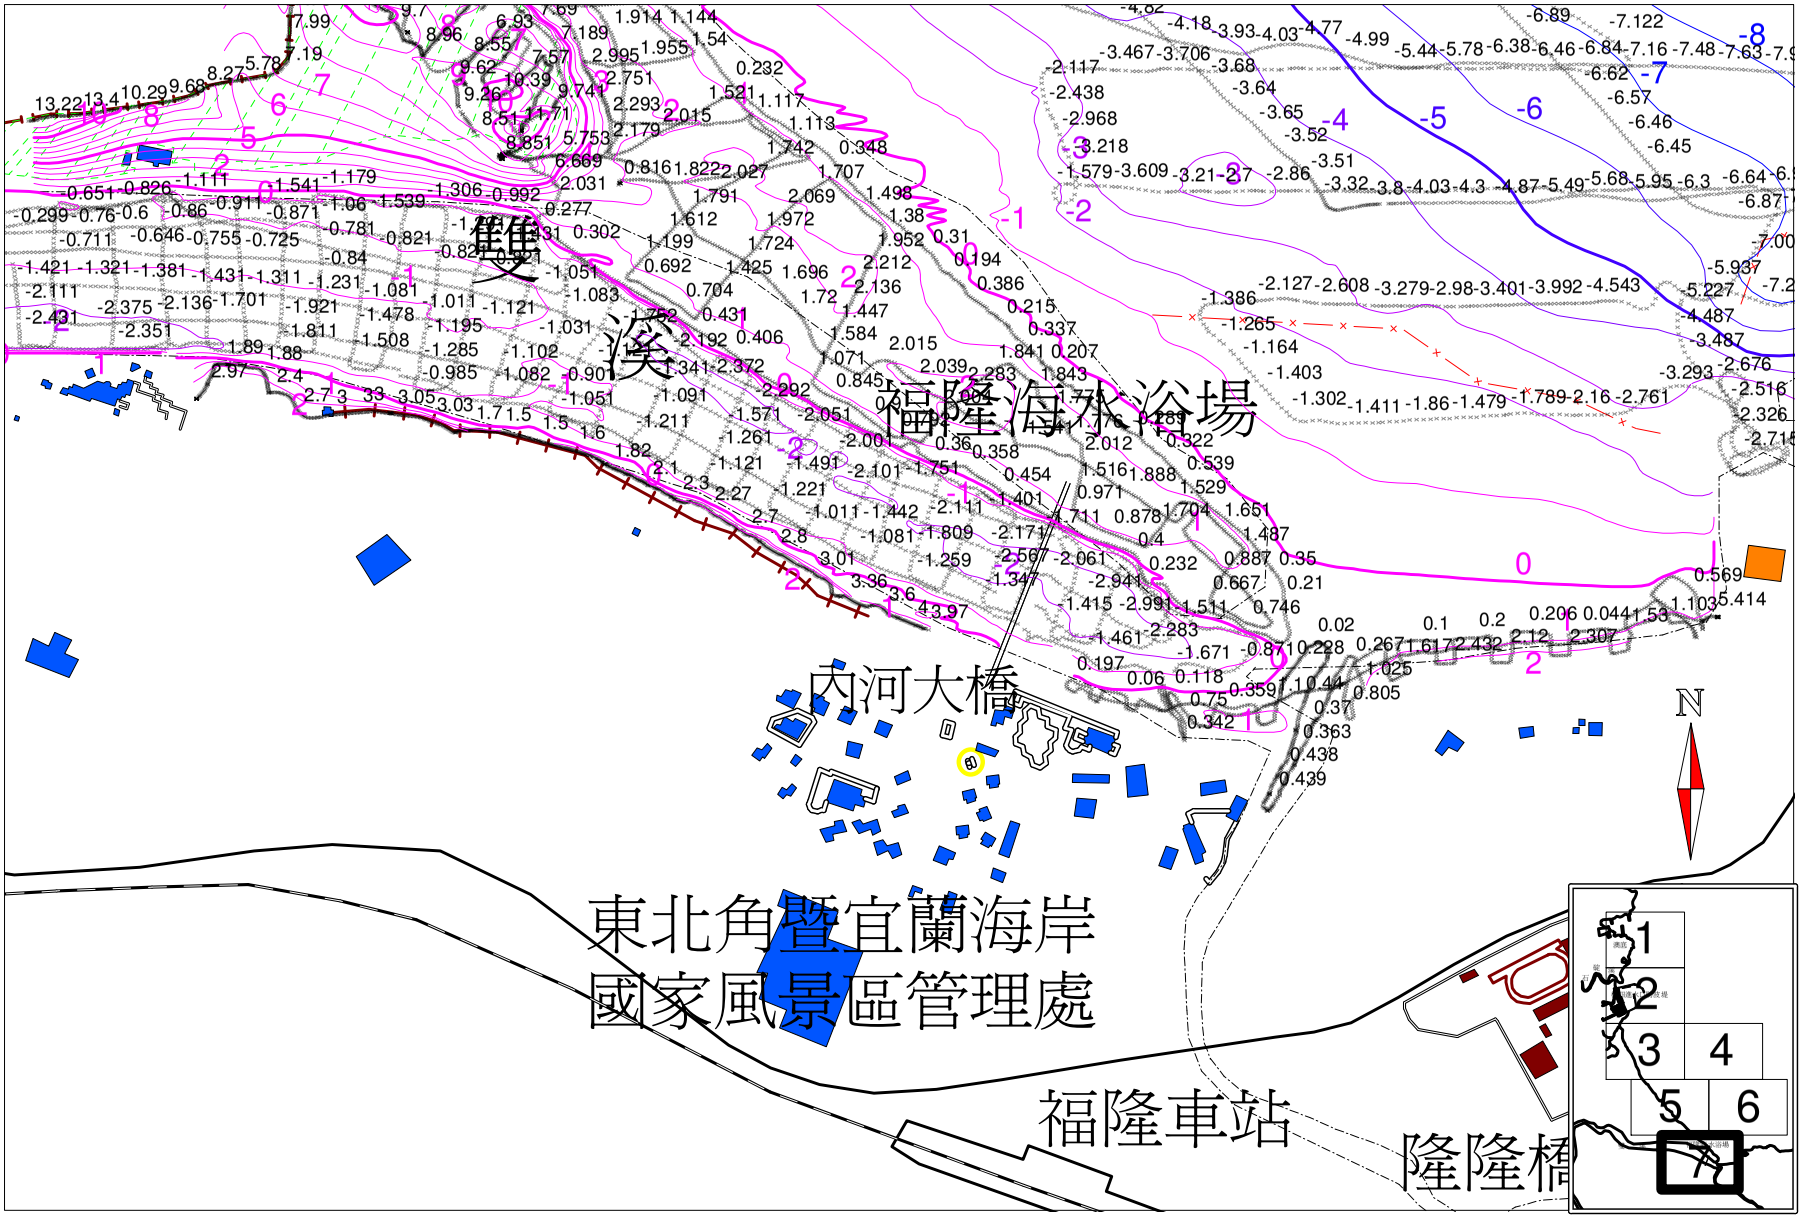


附錄IV.10-2 海岸地形101年6月（第二季）陸域地形、海域地形及水深測量（續6）

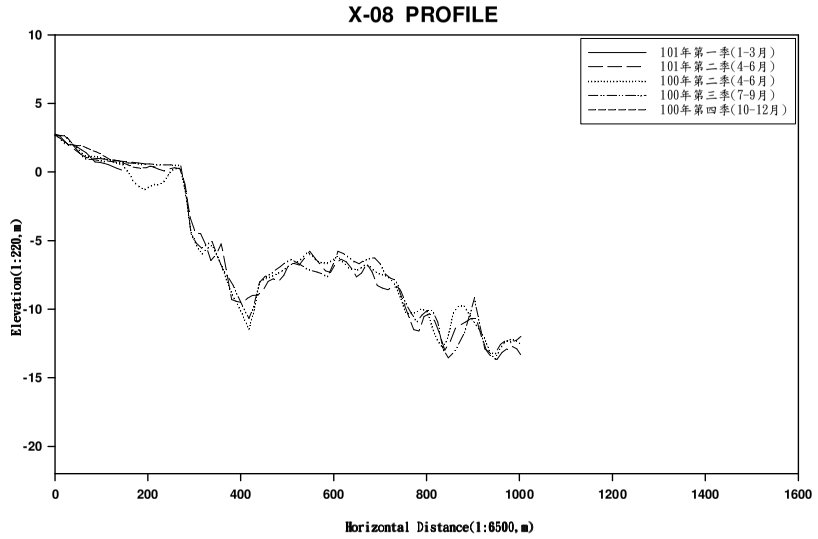

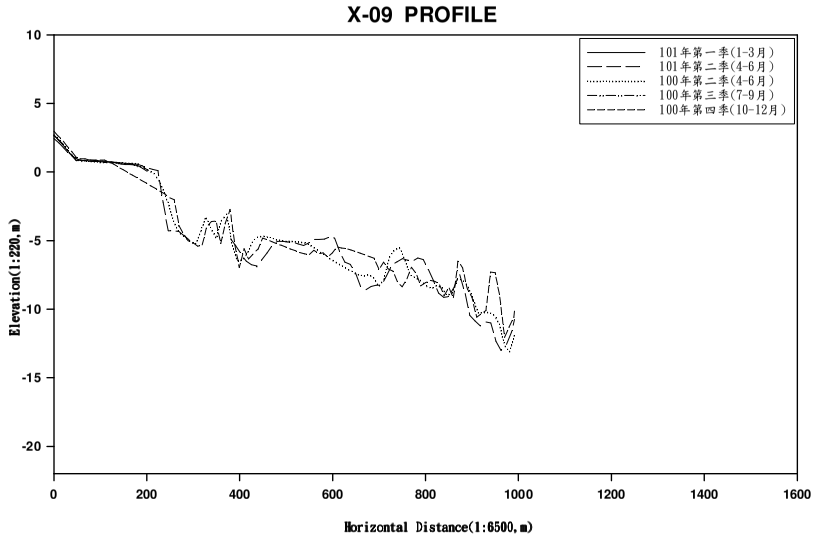


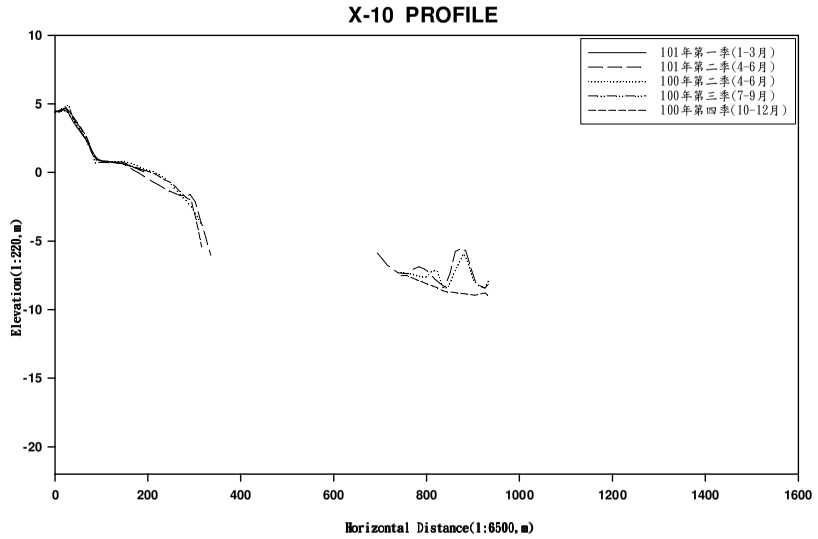


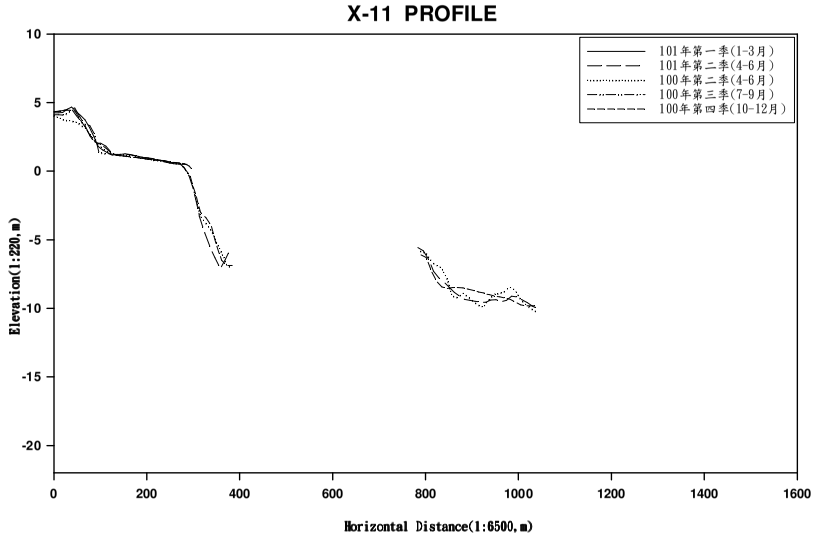



附4.10-9

附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖

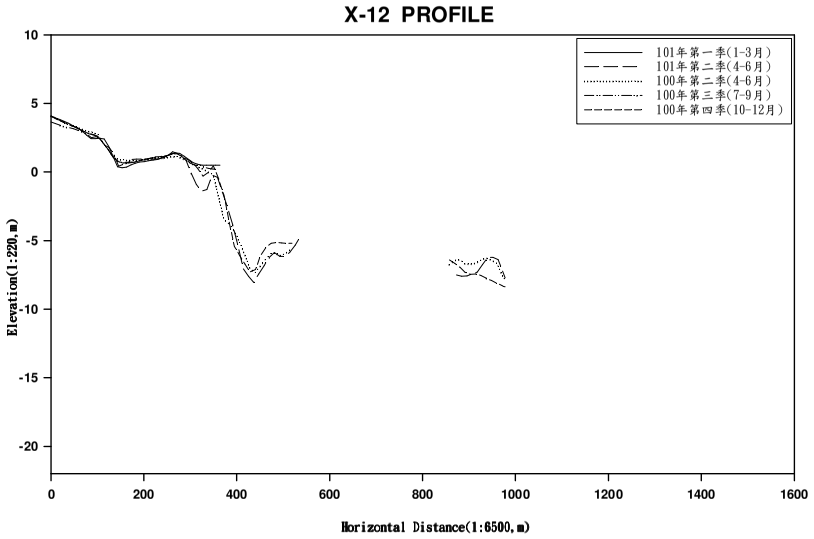


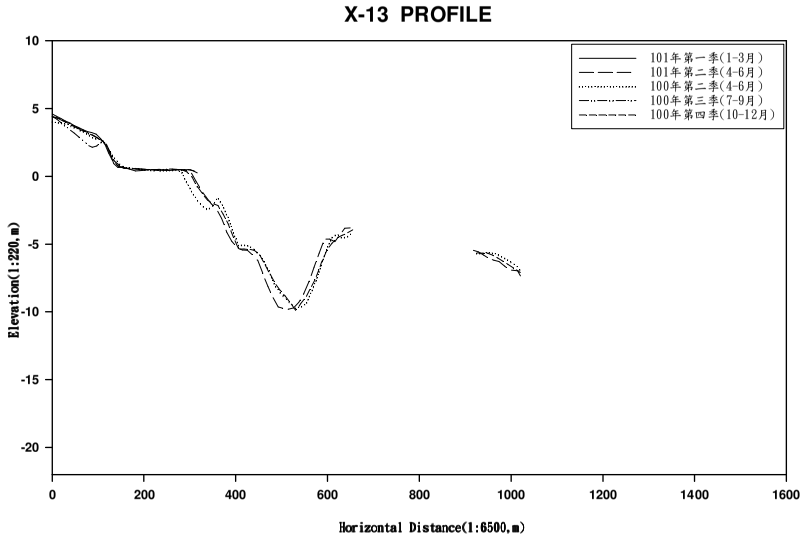


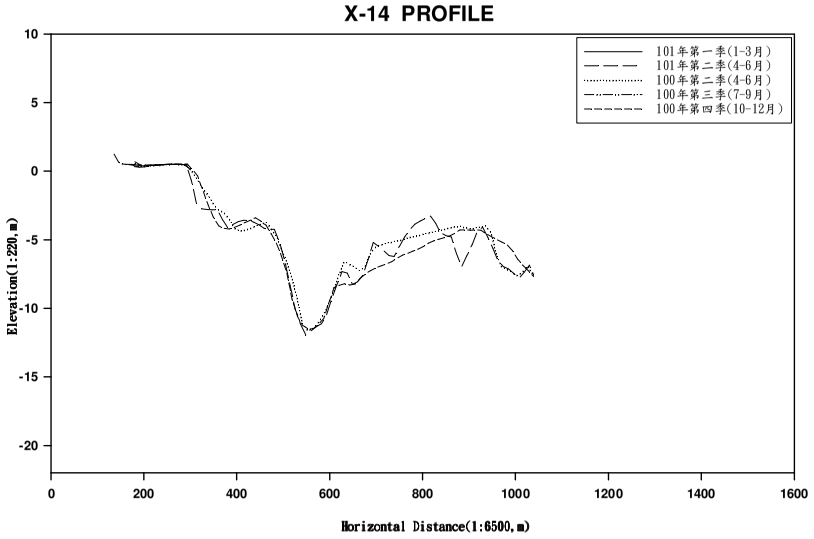


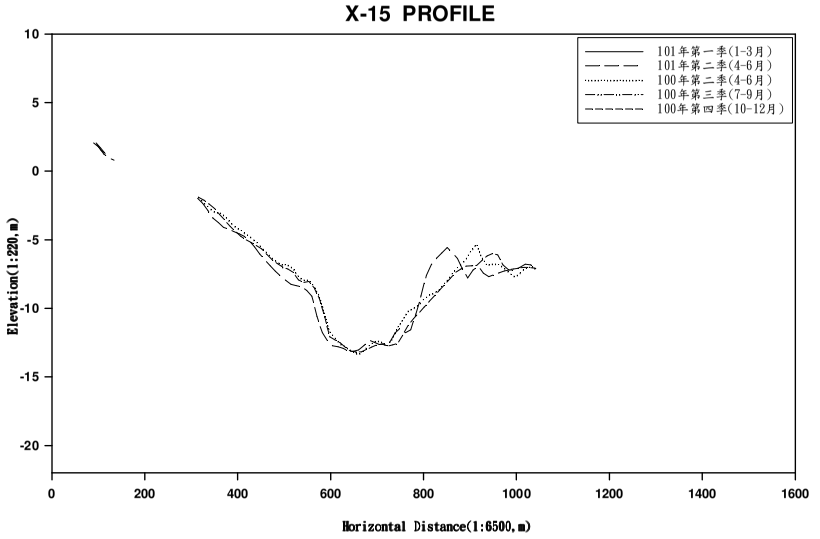


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續1)

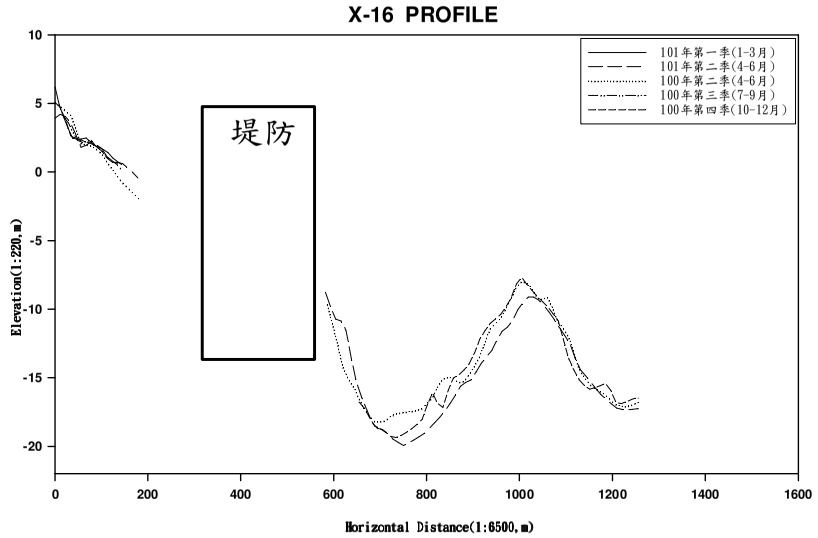


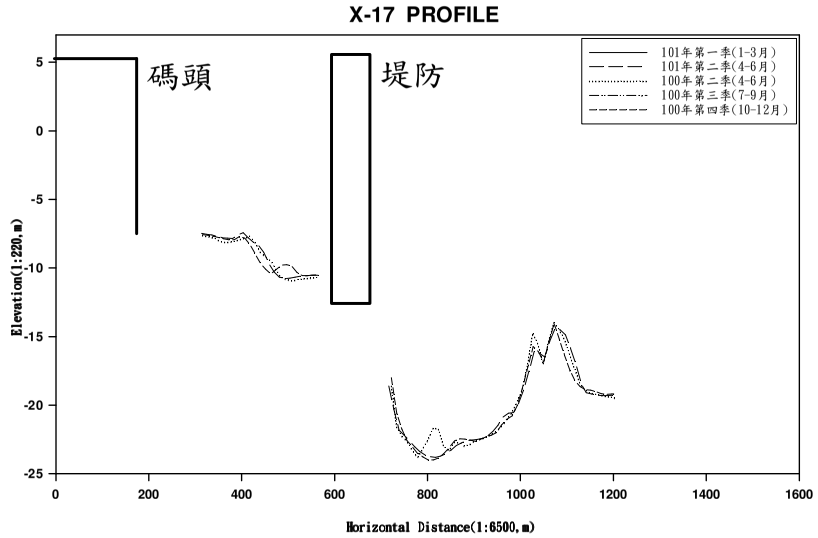


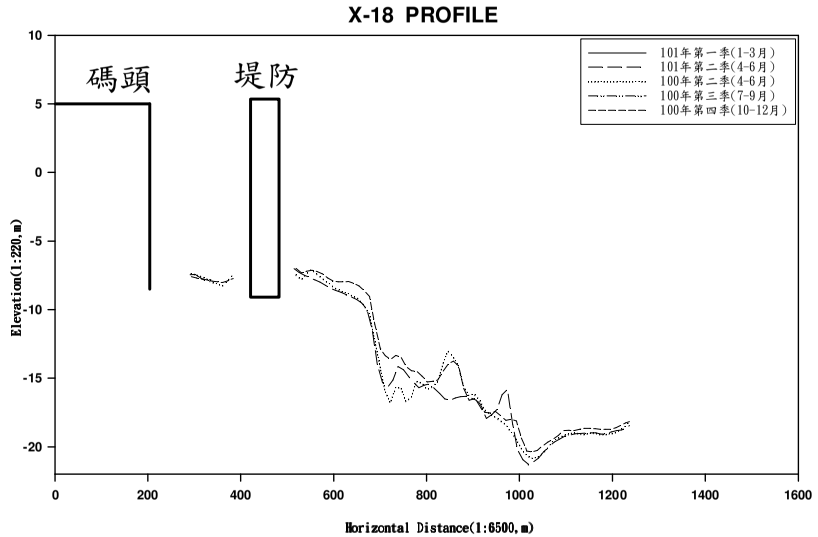


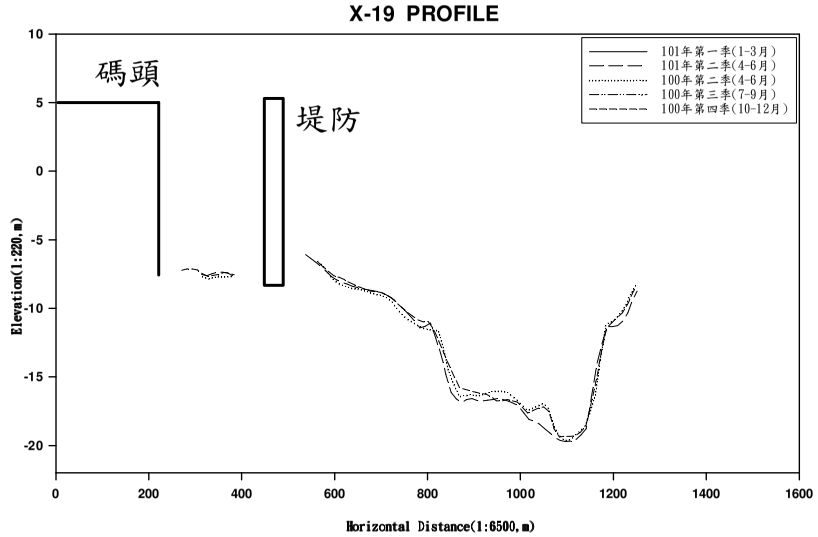


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續2)

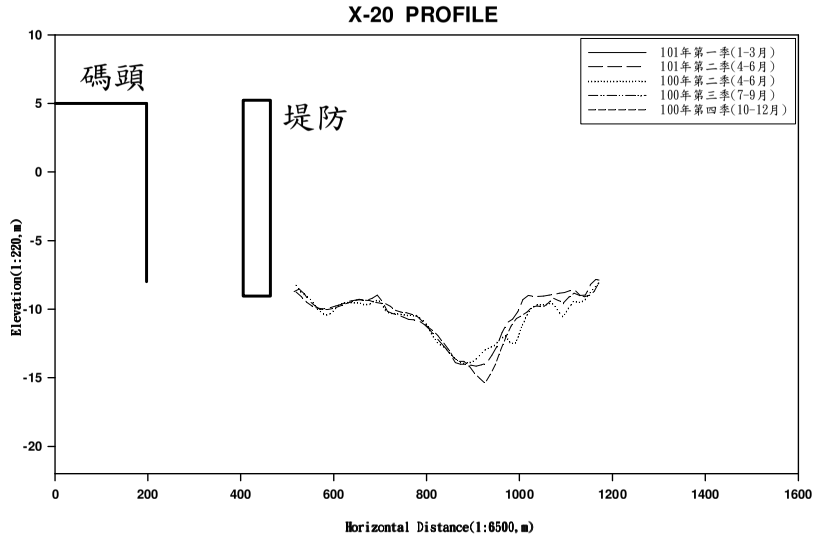


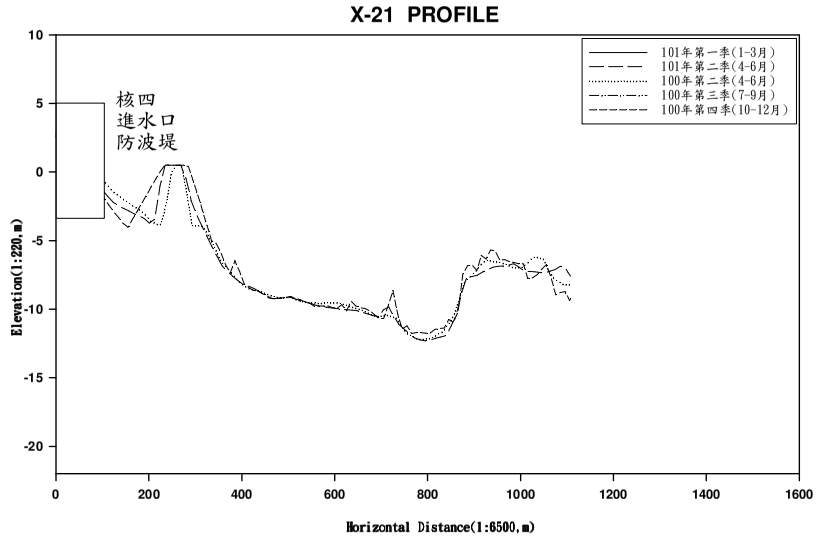


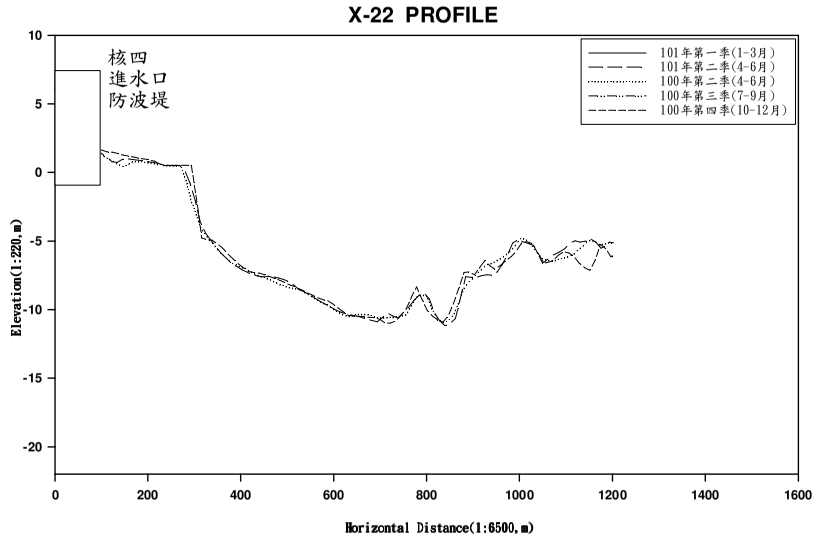


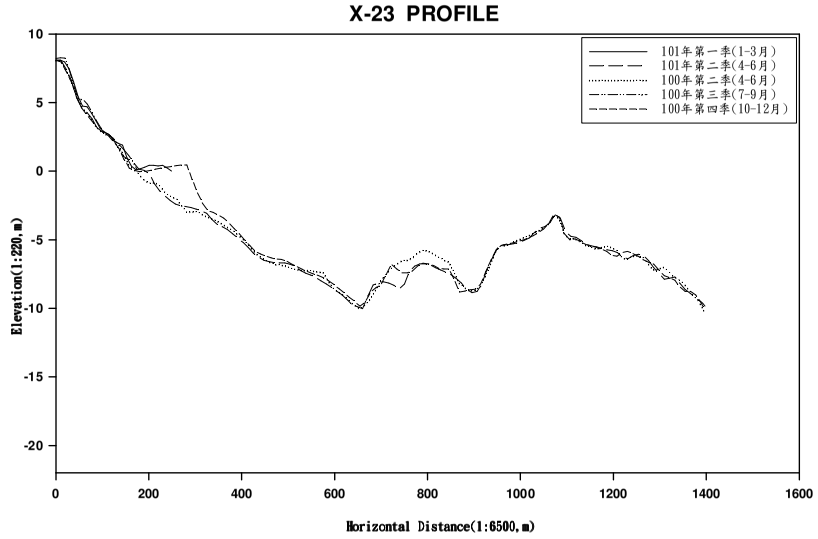


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續3)

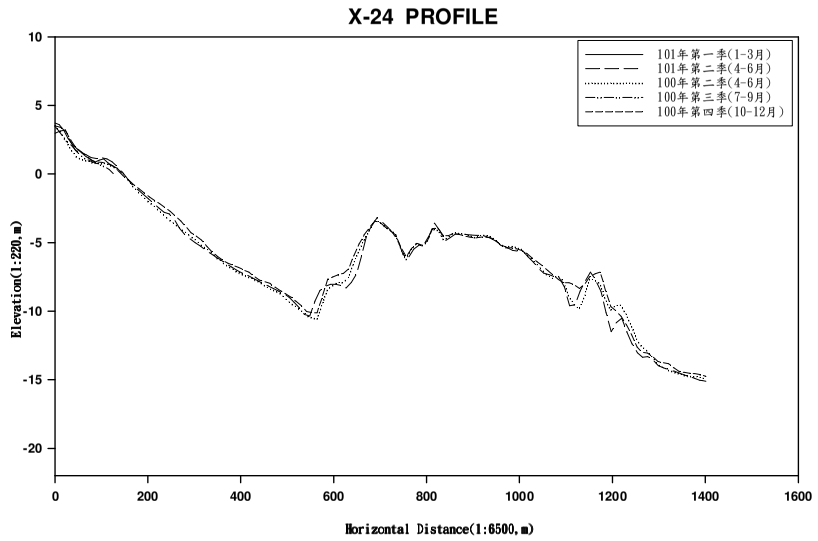


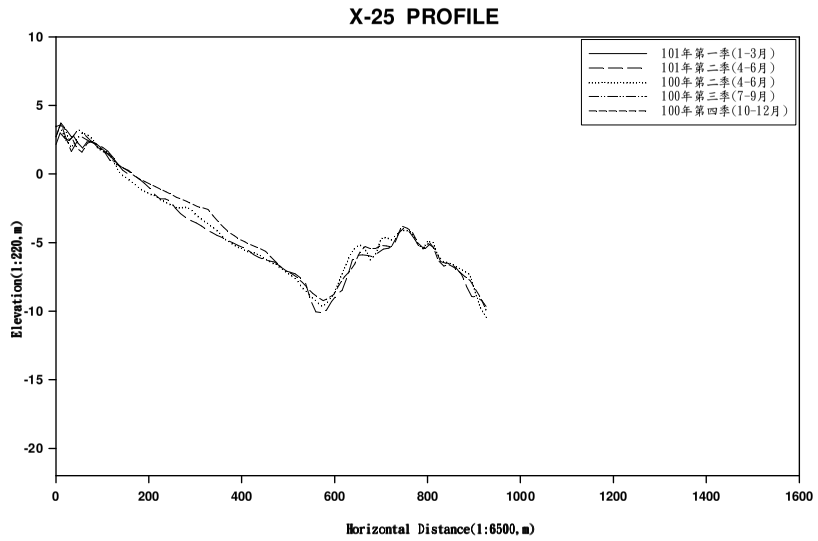


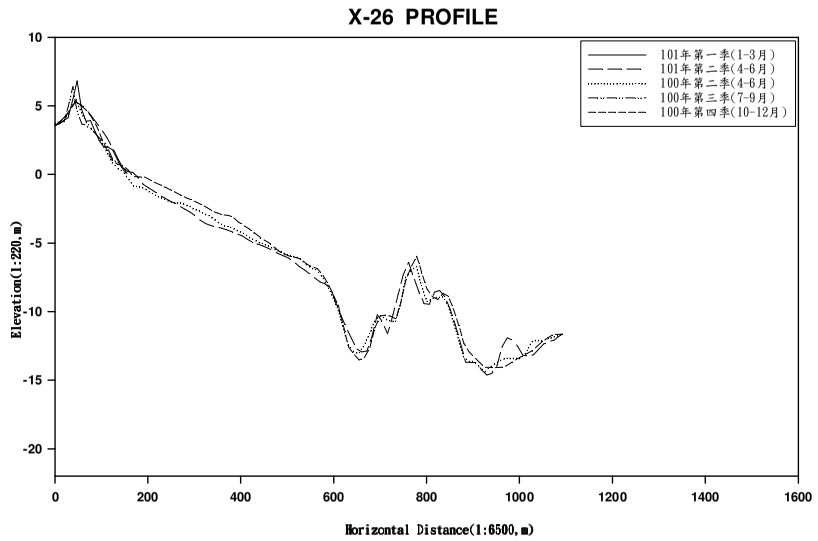


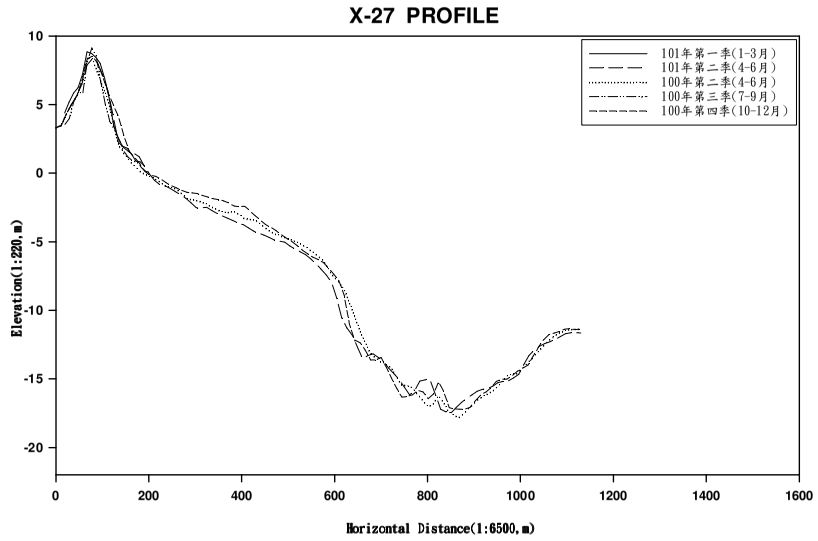


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續4)

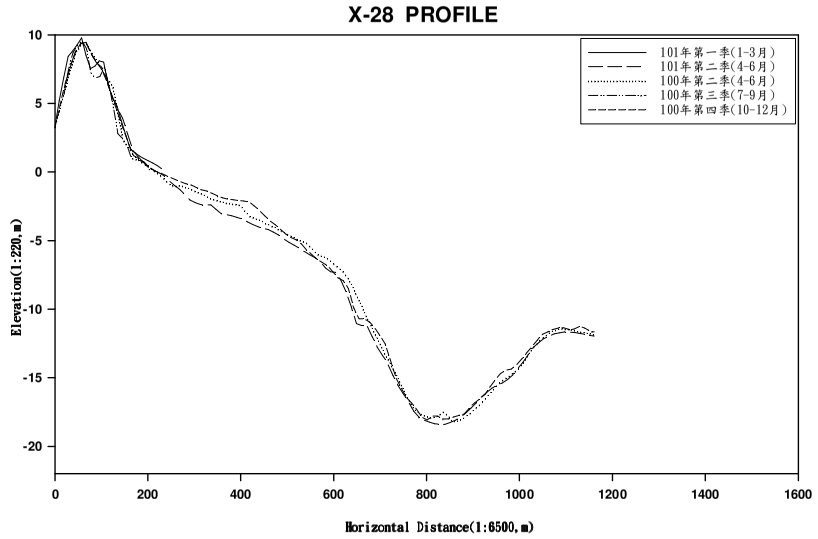

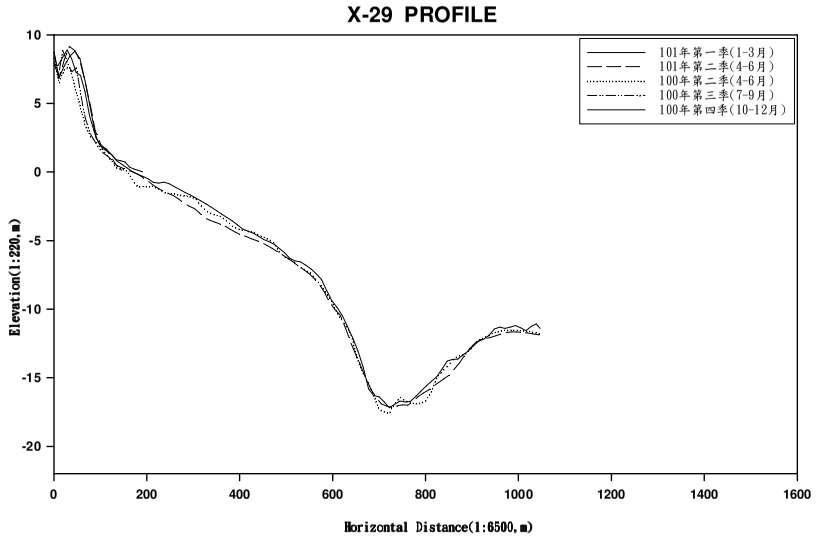


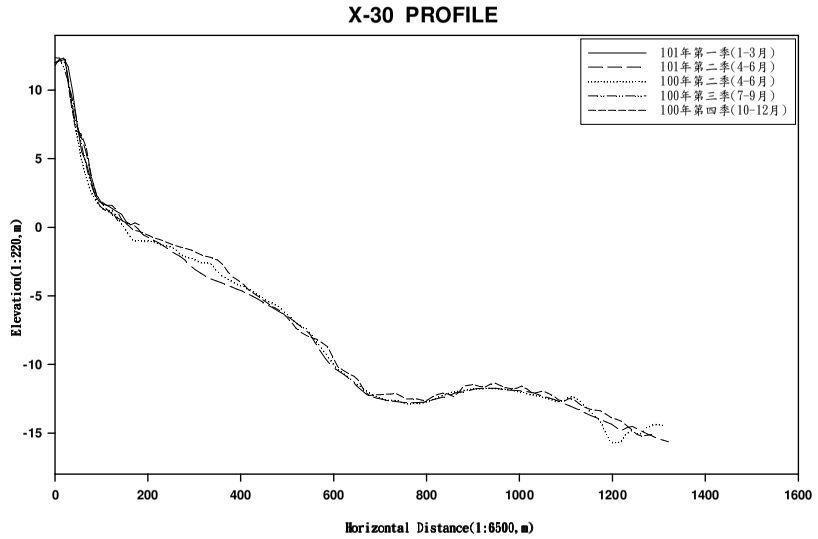


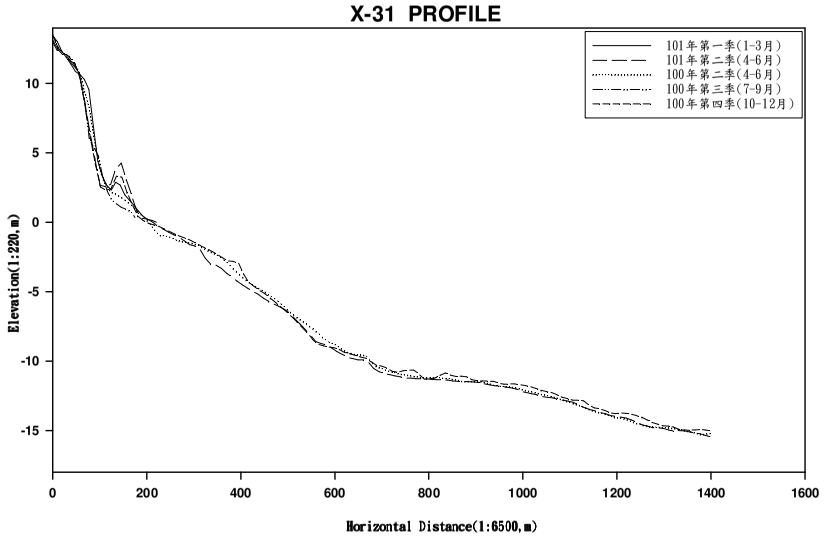



附4.10-14

附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續5)

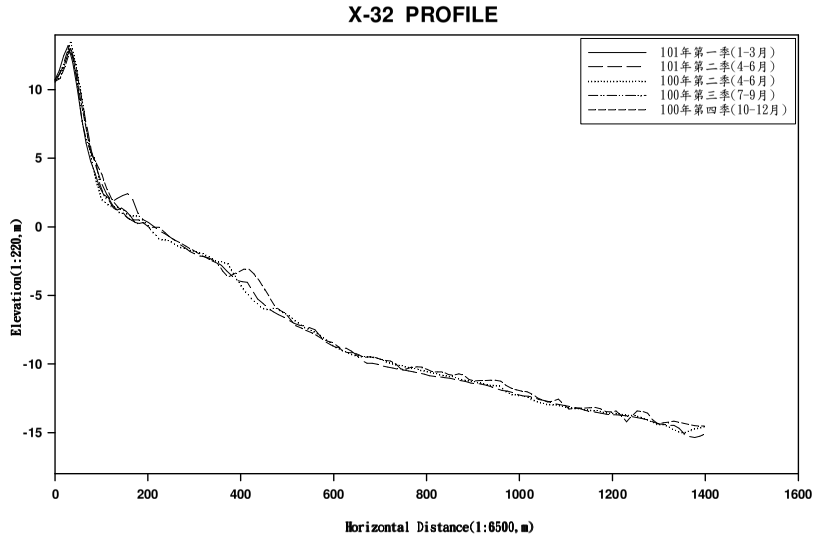


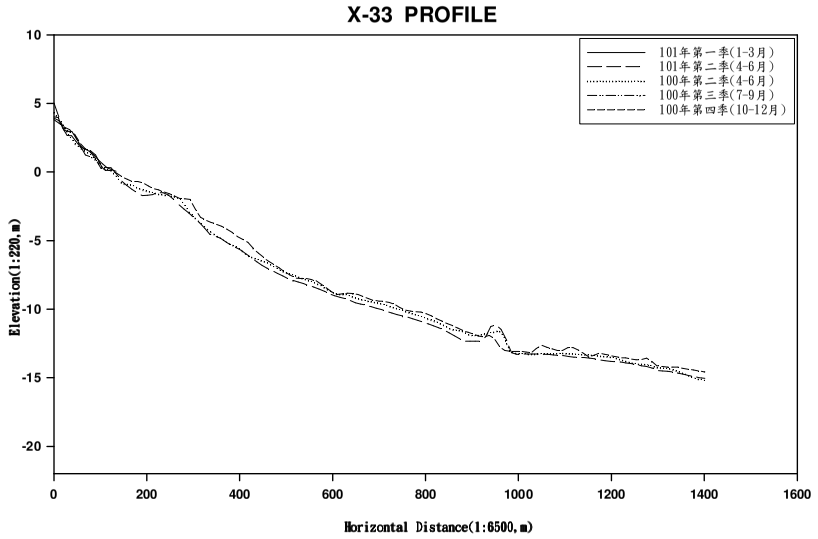


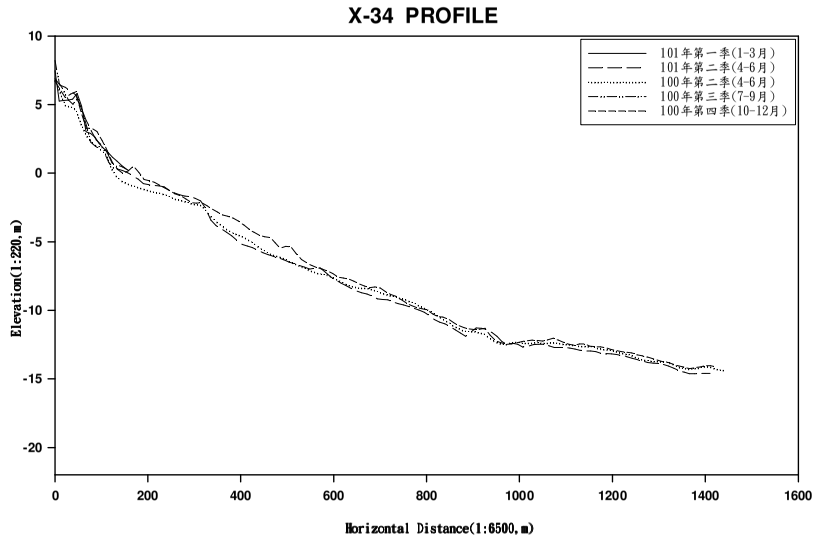


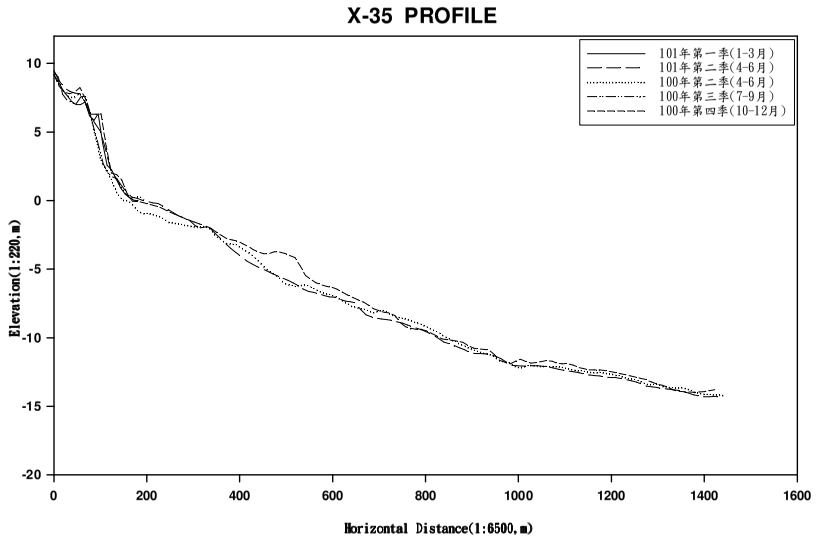


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續6)

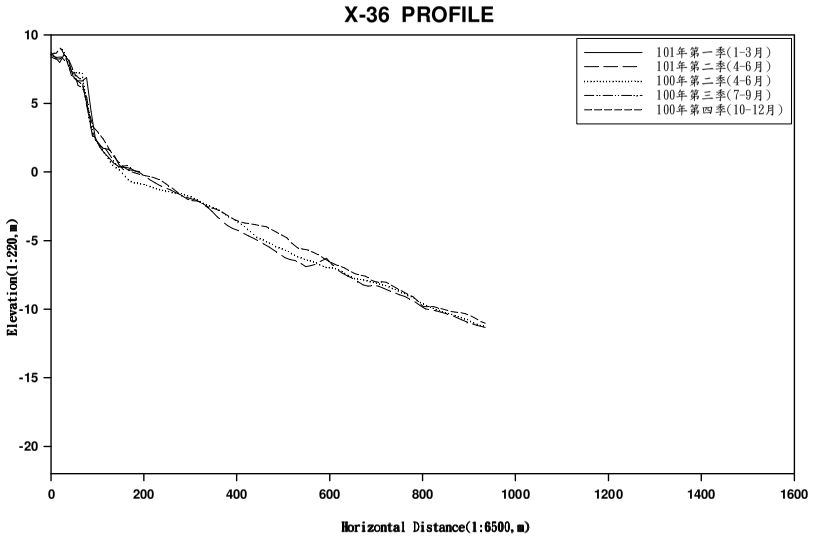


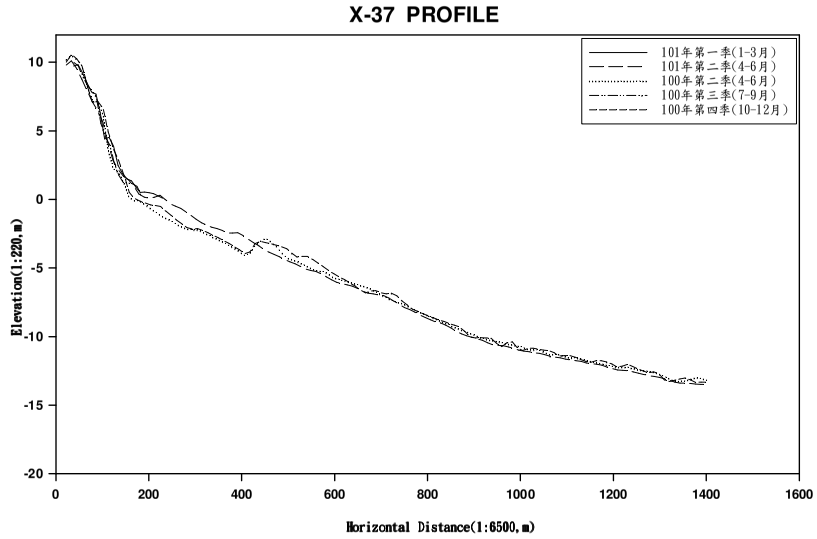


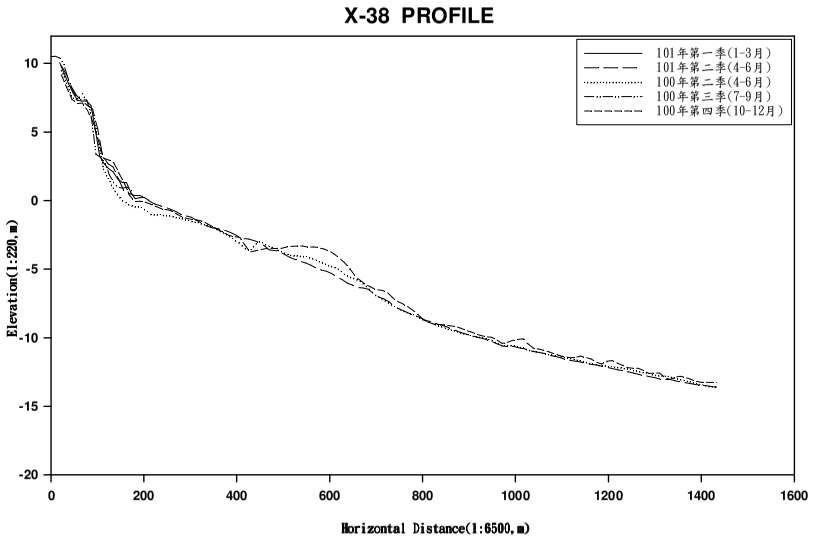


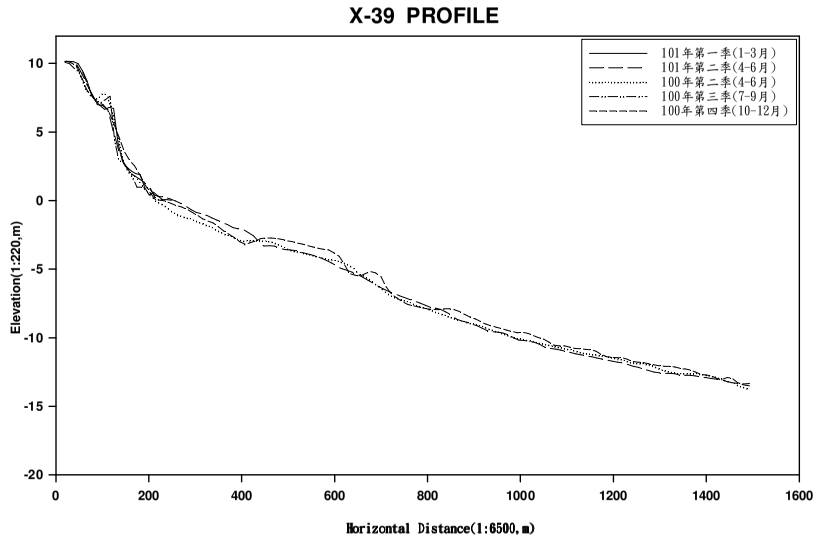


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續7)

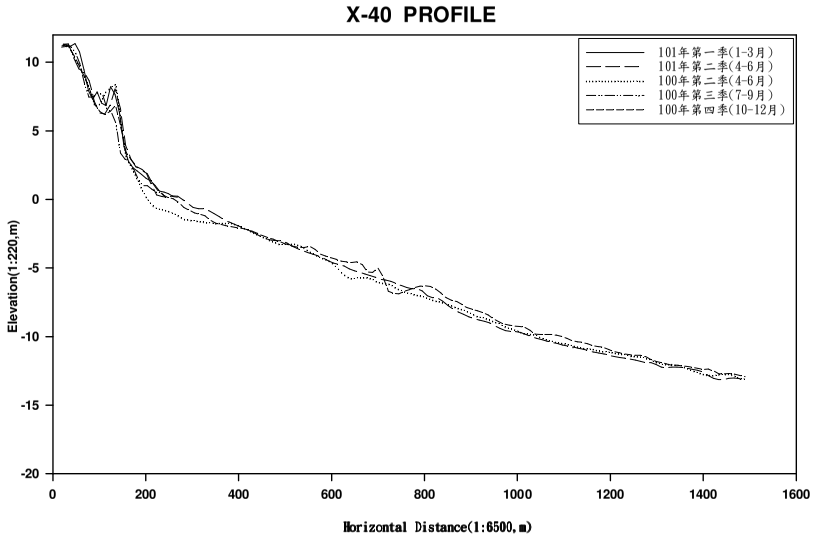


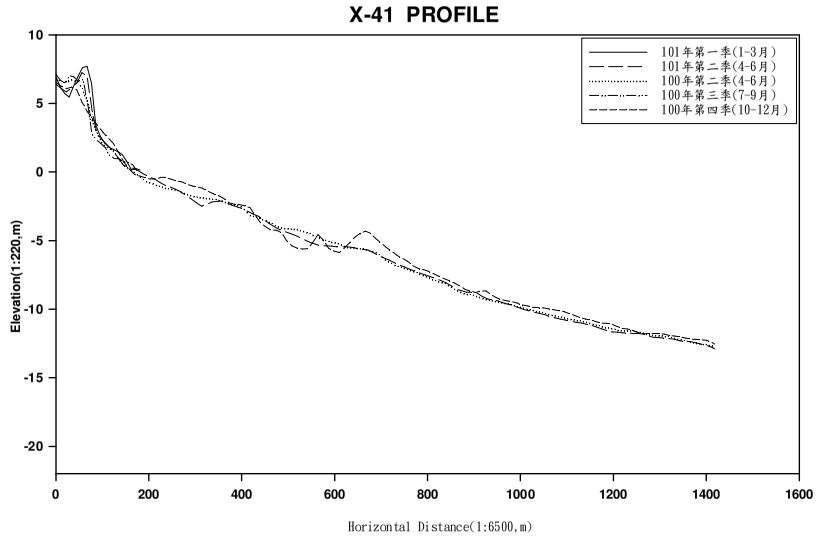


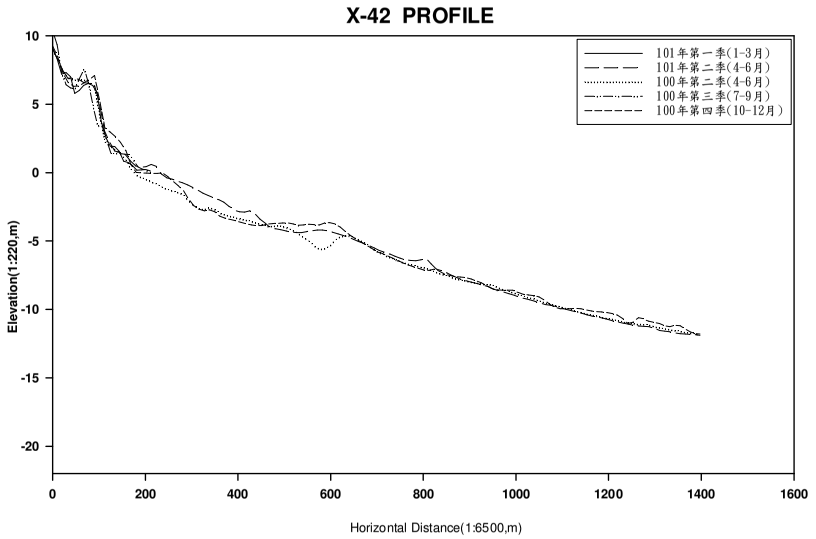


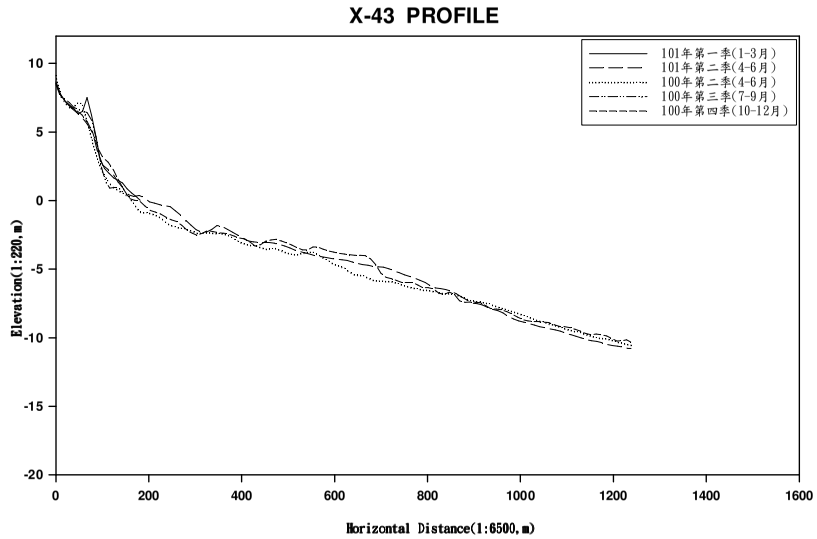


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續8)

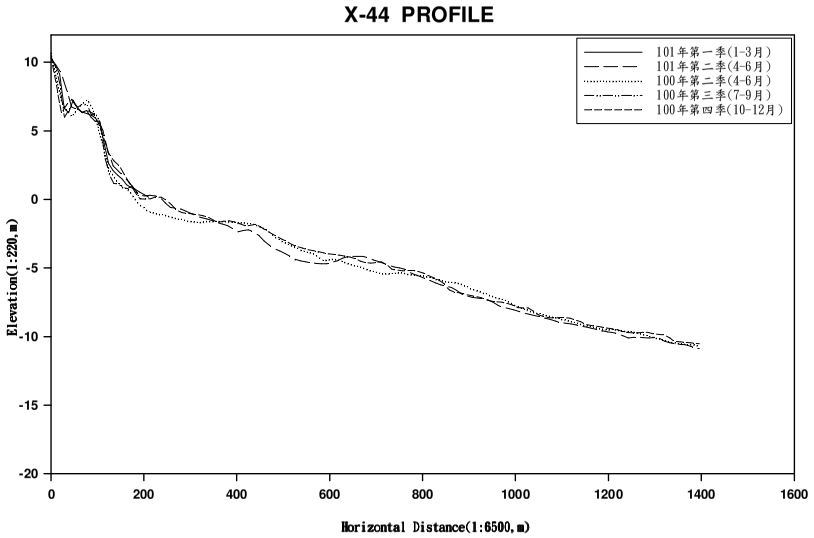


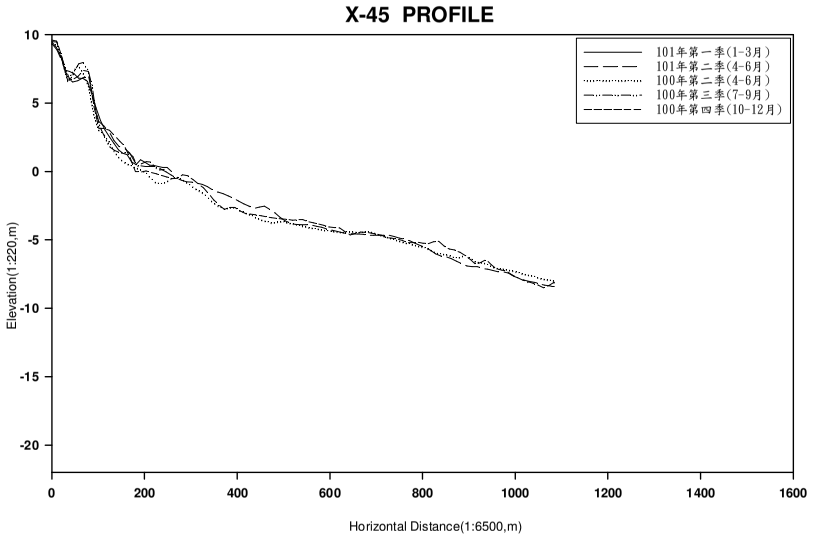


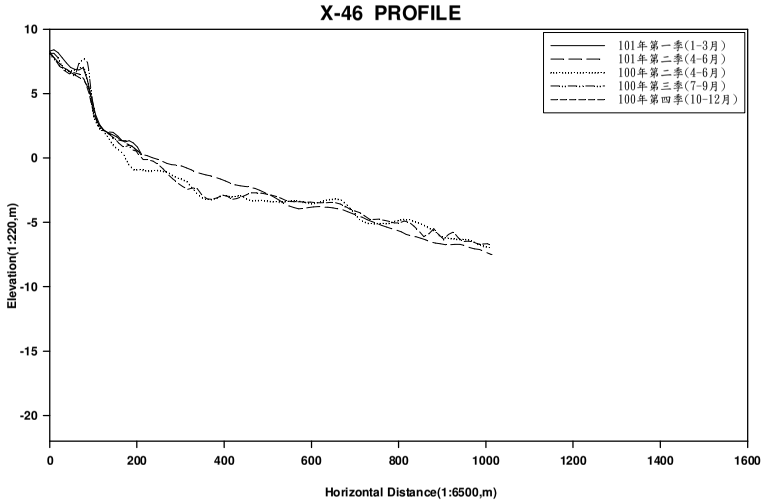


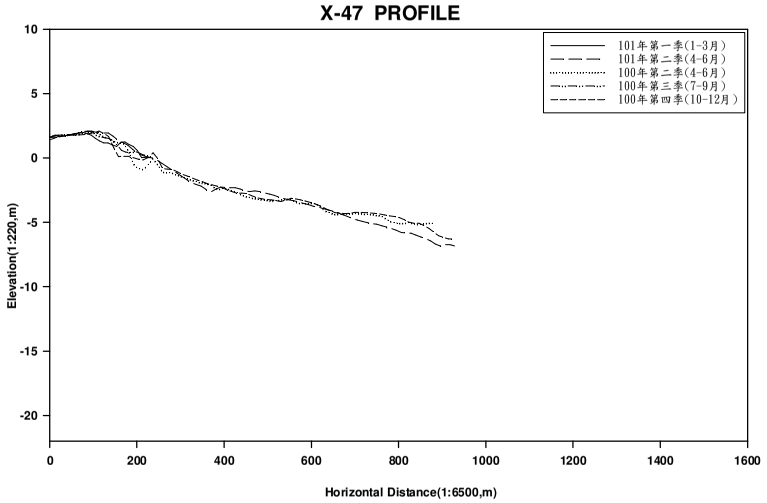


附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續9)

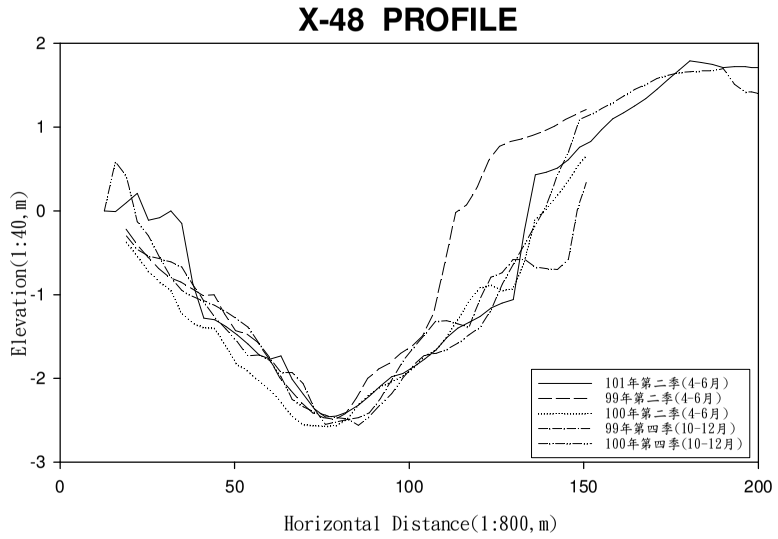


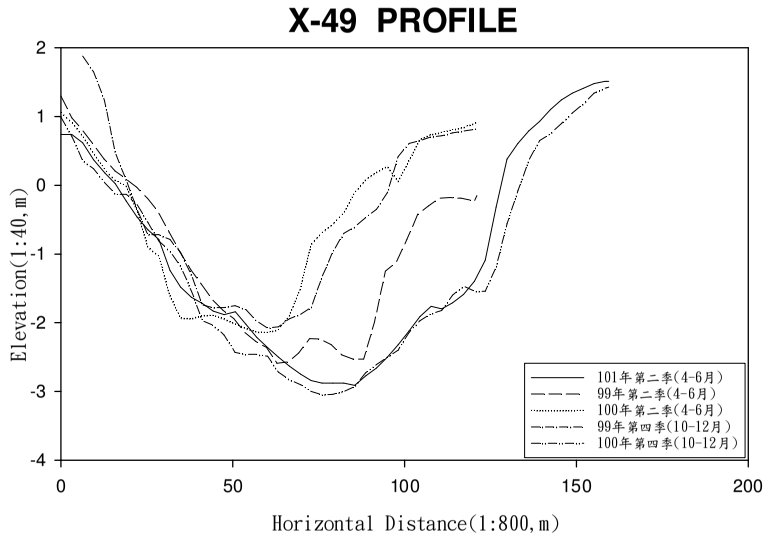

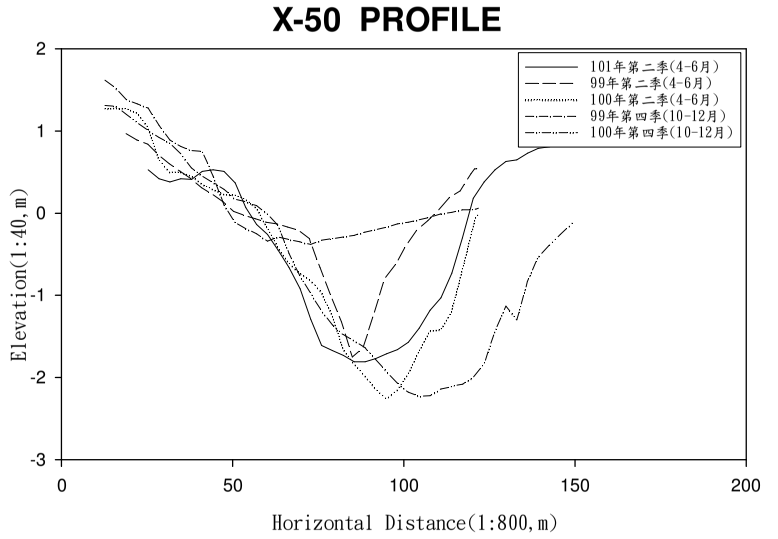

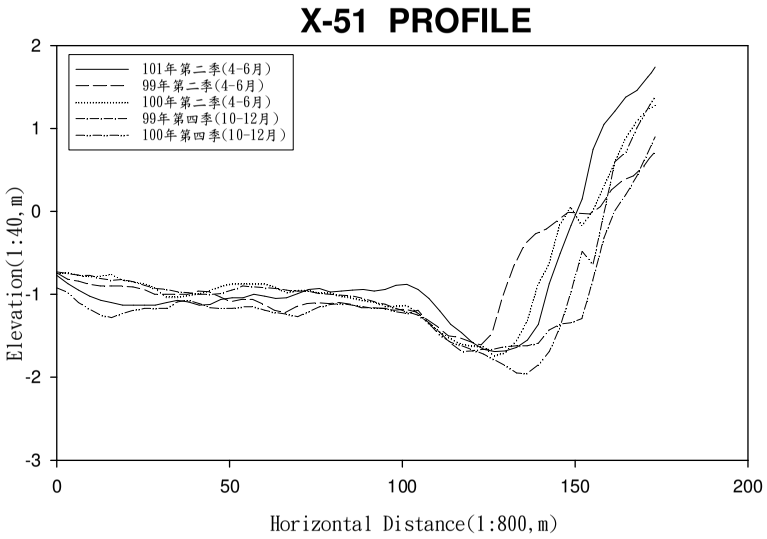

附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續10)

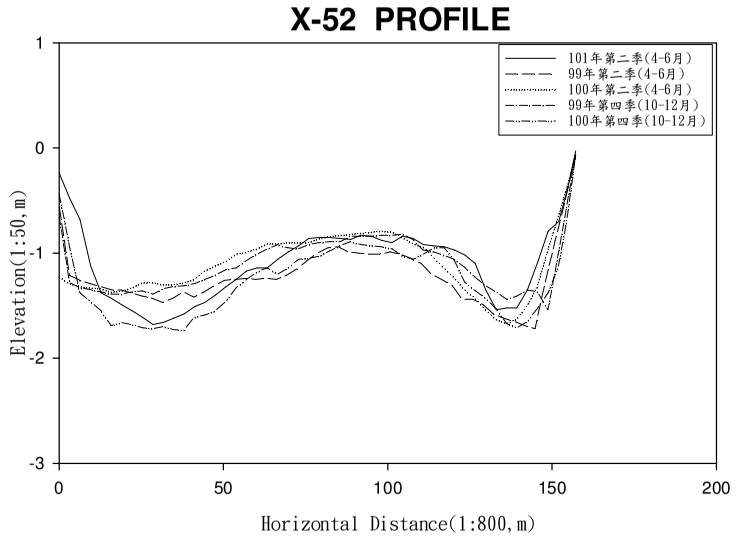

附4.10-20

附錄Ⅳ.10-3 100年第二季、100年第三季、100年第四季、101年第一季、101年第二季海域監測剖面比較圖(續11)

附　錄　Ⅳ.11

漁業調查成果

台灣電力公司

核能四廠發電工程施工期間環境監測

101年第2季監測報告

附錄 IV.11-1 漁撈戶重要經濟魚種之平均漁獲產量、漁獲產值

單位：公斤/戶、元/戶

項目 / 年	月	軟絲 (*Sepioteuthis lessoniana*)		黑毛 (*Sepia esculenta*)		白毛 (*Kyphosus lembus*)		紅甘 (*Seriola dumerili*)		花枝 (*Sepia esculenta*)		赤宗(赤鯨) (*Dentex tumifrons*)		小卷 (*Neritic Squid*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
84	4	35.1	18,975	56.0	7,633	26.4	11,000	-	-	120.0	20,000	-	-	-	-
	5	27.6	14,750	12.0	5,467	30.0	10,000	11.4	21,600	-	-	-	-	-	-
	6	57.0	32,983	13.0	5,930	26.0	10,640	21.0	21,550	-	-	-	-	-	-
85	4	35.1	18,975	182.0	26,725	26.7	11,333	-	-	120.0	22,000	-	-	-	-
	5	47.5	16,438	172.5	26,150	50.0	10,000	18.0	16,200	-	-	-	-	-	-
	6	57.0	32,983	13.0	5,930	26.0	10,640	29.0	31,650	-	-	-	-	-	-
86	4	3.6	1,380	2	1,018	40.8	18,360	6.3	2,279	22.1	4,761	68.3	23,324	-	-
	5	2.2	860	-	-	7.5	2,500	6.7	819	9.6	2,083	33.0	8,283	-	-
	6	-	-	1.0	120	6.0	1,852	-	-	-	-	176.0	89,090	63.0	11,346
87	4	10.7	4,838	-	-	36.0	15,000	-	-	32.0	7,032	330.0	132,150	-	-
	5	3.0	1,220	1.8	900	3.9	1,420	-	-	9.3	2,010	152.0	47,950	-	-
	6	6.0	3,000	-	-	1.0	300	-	-	-	-	155.0	86,467	272.0	64,690
88	4	5.1	1,500	-	-	-	-	11.7	2,955	19.2	4,075	296.8	74,200	-	-
	5	4.8	1,308	2.9	1,121	4.0	1,363	2.7	900	29.6	5,493	477.0	119,250	-	-
	6	2.0	768	-	-	11.0	3,850	-	-	-	-	35.0	15,339	21.0	4,273
89	4	9.6	4,519	1.4	786	5.8	2,101	10.6	3,307	11.1	2,127	59.9	20,200	-	-
	5	4.6	2,233	1.6	842	6.3	2,290	1.2	323	1.7	392	67.4	23,240	-	-
	6	1.0	673	-	-	6.0	1,879	-	-	-	-	30.0	15,214	70.0	12,197
90	4	10.1	4,809	0.7	316	4.3	1,532	16.2	4,299	4.3	787	96.5	32,627	-	-
	5	6.1	2,430	9.9	5,124	6.3	2,509	1.6	447	4.7	931	42.0	14,879	-	-
	6	4.9	2,174	7.3	1,328	53.1	19,465	10.2	3,400	-	-	60.6	28,978	78.89	13,058
91	4	22.50	6,300	21.44	6,003	3.32	664	7.32	1,098	22.47	6,292	132.51	13,251	-	-
	5	17.13	4,796	13.15	3,682	4.21	842	4.21	632	47.35	13,258	147.58	14,758	-	-
	6	3.0	1,269	1.0	182	3.0	1,095	-	-	-	-	81.0	38,779	9.0	1,520
92	4	4	2.5	1,122	5.9	2,547.9	0.9	340	2.3	501.2	5.0	9.4	5,363	5,363	-
	5	5	5.2	1,700	0.4	212.9	1.3	471	0.7	138.5	2.0	17.8	8,784	8,784	-
	6	6	3.0	1,244	1.0	444	1.0	406	2.0	420	-	14.0	7,846	7,846	9.0
93	4	4.8	2,278	0.5	259	1.4	524	3.9	928	4.0	664	44.1	23,824	-	-
	5	3.0	1,326	0.6	388	1.8	686	1.2	235	2.6	496	67.8	26,551	-	-
	6	0.8	443	0.2	85	1.6	598	17.0	3,198	-	-	9.0	4,563	1.7	298

附錄 IV.11-1 漁撈戶重要經濟魚種之平均漁獲產量、漁獲產值（續 1）

單位：公斤/戶、元/戶

項目 / 年	月	軟絲 (*Sepioteuthis lessoniana*)		黑毛 (*Sepia esculenta*)		白毛 (*Kyphosus lembus*)		紅甘 (*Seriola dumerili*)		花枝 (*Sepia esculenta*)		赤宗(赤鯨) (*Dentex tumifrons*)		小卷 (*Neritic Squid*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
94	4	4.0	2,316	0.6	285	1.5	507	2.7	555	1.4	259	80.5	17,463	-	-
	5	0.3	140	0.3	166	1.1	350	1.2	238	2.5	419	62.6	16,535	-	-
	6	1.9	459	2.0	652	3.3	637	4.1	718	-	-	194.7	58,353	7.0	1,667
95	4	4.9	2,195	0.3	125	0.3	107	10.1	2,330	1.8	320	102.0	31,514	41.3	6,264
	5	3.6	1,614	0.1	57	0.7	244	2.5	655	1.5	254	38.5	10,835	52.5	6,682
	6	2.3	1,117	0.3	67	1.5	563	1.8	432	0.4	85	17.1	6,023	6.0	1,531
96	4	4.0	1,802	0.4	217	0.7	248	1.5	324	2.7	435	30.6	9,290	60.9	8,095
	5	1.7	779	0.8	487	0.7	289	1.5	359	1.7	297	19.1	6,483	3.7	613
	6	0.5	206	0.6	355	1.1	457	0.7	132	0.6	119	8.6	3,426	5.2	1,116
97	4	3.3	1,499	0.5	254	4.4	1,355	3.3	554	12.7	2,102	34.4	11,897	53.4	9309
	5	2.4	1,126	0.2	93	2.8	1,110	0.7	148	5.4	1,025	11.6	3,448	20.1	3,249
	6	0.9	404	0.7	297	0.3	123	2.4	429	2.0	419	7.7	3,586	11.4	538
98	4	4.3	1,994	0.9	522	1.2	462	3.4	910	4.2	811	4.9	2,703	18.2	3,525
	5	1.3	577	0.1	49	0.3	137	1.7	508	1.4	203	8.2	4,228	14.7	3,428
	6	0.7	332	-	13	0.5	208	11.3	1,527	2.2	449	8.1	4,219	-	-
99	4	4.5	2,032	0.9	423	1.8	737	2.5	630	2.0	419	6.3	3,160	12.8	101
	5	1.3	584	0.4	219	2.8	1,036	3.4	876	0.8	172	7.9	4,140	10.8	2,523
	6	0.2	80	0.4	158	1.1	396	1.2	350	0.5	108	3.8	2,355	0.9	156
100	4	4.6	2,096	0.3	131	0.7	271	12.9	3,776	5.0	1,043	11.2	5,199	0.9	489
	5	1.6	747	0.1	45	1.0	363	1.5	349	2.4	472	6.9	3,358	-	-
	6	0.3	143	0.1	26	4.6	1,548	0.5	169	0.9	181	4.1	2,017	-	13
101	4	8.2	3,967.2	0.5	258.2	3.8	1,533.0	0.4	94.8	11.9	2,497.1	20.7	12,346.	291.0	40,533.
	5	2.6	1,192	0.5	320	1.0	379	1.4	341	0.8	162	11.2	5800	-	-
	6	1.2	561	0.2	129	1.4	570	4.7	989	0.8	177	13.7	6,365	0.0	0.0
101 年 4~6 月總和		12.0	5,720	1.2	707	6.2	2,482	6.5	1,425	13.5	2,836	45.6	24,511	291.0	40,533
101 年 4~6 月平均		4.0	1,907	0.4	236	2.1	827	2.2	475	4.5	945	15.2	8,170	145.5	20,267

附錄 IV.11-1 漁撈戶重要經濟魚種之平均漁獲產量、漁獲產值（續 2）

單位：公斤/戶、元//戶

項目 / 年	月	魩仔魚		紅目鰱(紅目大眼鯛) (*Cookeolus boops*)		龍蝦(龍蝦) (Penulirus Japanicus)		石狗公(石狗公) (*Sebastiscus albofasciatus*)		煙仔虎(齒鰆) (*Sarda orientalis*)		煙管仔(圓花鰹) (*Auxis rochei*)		其他 (*Others*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
84	4	480.0	160,000	-	-	48.0	48,875	6.0	2,500	-	-	-	-	140.0	34,656
	5	368.0	106,007	-	-	66.8	67,375	-	-	-	-	-	-	137.0	14,923
	6	-	-	-	-			-	-			-	-	185.0	46,352
85	4	-	-	-	-	48.0	48,875	193.0	29,333	-	-	-	-	155.7	34,262
	5	170.0	250,000	-	-	82.5	55,820	98.5	23,825	-	-	-	-	220.9	30,413
	6	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	185.0	46,352
86	4	67.8	28,330	120.0	67,800	9.1	9,926	23.1	12,875	724.0	57,600	-	-	63.78	10,984
	5	80.4	21,870	60.0	33,900	-	-	9.6	2400	963.6	35,126	-	-	704.4	45,869
	6	-	-	-	-			-	-	-	-	5,845	66,235	59.0	11,150
87	4	-	-	122.0	17,800	54.4	61,689	53.0	10,600	2,242.2	114,180	-	-	256.6	34,793
	5	-	-	2.4	120	22.8	26,600	19.0	4,000	246.0	13,120	-	-	149.5	20,675
	6	-	-	-	-			-	-	316.0	17,955	-	-	1,976.0	183,700
88	4	-	-	161.0	80,500	23.4	21,510	39.8	14,614	1,378.7	46,313	-	-	110.5	14,962
	5	2566.0	641,500	311.0	103,667	24.5	21,421	76.0	37,633	434.0	16,260	-	-	42.0	16,600
	6	-	-	-	-			-	-	-	-	4,634	64,364	32.0	15,693
89	4	213.9	21,392	68.0	13,600	7.3	7,432	23.9	5,088	529.6	25,989	-	-	5.99	621
	5	423.8	43,201	1.9	200	5.3	5,184	30.7	8,171	56.2	1,629	-	-	7.86	728
	6	-	-	-	-			-	-	5.0	278	2,995	48,651	6.0	1,509
90	4	-	-	1.1	109	7.8	7,452	17.0	3,661	503.7	17,039	-	-	2.8	491
	5	-	-	0.6	165	4.7	4,084	17.0	4,614	147.5	4,893	-	-	0.4	106
	6	-	-	-	-			-	-	130.2	6,422	4,085	50,657	26.8	5,039
91	4	-	-	0.7	245	15.1	9,072	22.8	13,680	566.1	11,323	-	-	97.8	8,316
	5	-	-	2.5	875	6.4	3,882	78.1	46,890	678.56	13,571	-	-	131.5	11,178
	6	-	-	-	-			-	-	8.0	418	4,061	50,355	841.0	158,092

附錄 IV.11-1 漁撈戶重要經濟魚種之平均漁獲產量、漁獲產值（續 3）

單位：公斤/戶、元//戶

項目 / 年	月	魩仔魚		紅目鰱(紅目大眼鯛) (*Cookeolus boops*)		龍蝦(龍蝦) (Penulirus Japanicus)		石狗公(石狗公) (*Sebastiscus albofasciatus*)		煙仔虎(齒鰆) (*Sarda orientalis*)		煙管仔(圓花鰹) (*Auxis rochei*)		其他 (*Others*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
92	4	13.7	2,080.0	0.2	43.1	1.2	1,206.2	1.9	697.2	598.1	25,701	-	-	342.8	26,015
	5	5.7	842.1	-	-	2.6	2,468.7	2.4	886.8	185.7	8,741	-	-	1,592.3	51,912
	6	14.0	724	-	-			-	-	-	-	5,634	32,253	1,921.0	24,798
93	4	182.4	182	-	-	6.8	6,804	8.1	2,267	150.0	8,563	-	-	452.8	37,596
	5	22.7	23	0.2	74	3.2	3,212	20.5	5,446	0.4	35	-	-	4,256.2	64,856
	6	-	-	-	-			-	-	24	269	12,367	163,692	2,544.1	27,882
94	4	165.0	16,500	-	-	7.3	6,887	6.7	983	279.0	10,636	-	-	105.4	20,601
	5	1,864.0	186,400	-	-	9.2	8,702	5.3	1,000	1.1	55	-	-	2,714.3	45,069
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	240	8,705	99,577	392.9	51,597
95	4	236.5	39,735	0.5	82	21.1	16,988	20.4	1,611	82.5	5,980	5.2	89	174.2	39,056
	5	781.5	93,787	0.2	79	4.6	4,282	37.2	7,197	3.2	214	8,435.3	116,218	223.6	21,003
	6	2.0	-	0.5	234	5.7	5,203	18.7	3,929	-	-	13,385.6	179,909	171.9	17,670
96	4	6.0	688	-	14	12.5	13,439	19.0	4,409	188.9	11,486	18.8	676	155.2	29,062
	5	29.4	2,438	0.1	34	6.1	5,749	22.3	5,056	204.4	13,356	2,221.5	26,543	148.6	19,582
	6	-	-	0.2	80	10.0	9,205	11.2	2,999	-	-	2,959.2	32,991	136.1	13,726
97	4	5.3	1,067	2.4	442	7.0	6,017	9.7	2,828	226.5	19,115	132.9	2,254	3,002.8	111,981
	5	-	-	-	-	5.1	4,602	7.9	1,467	4.5	413	4,136.3	77,347	2,682.7	79,954
	6	-	-	-	10	5.4	4,569	4.7	1,644	-	-	8,511.5	164,578	9,071.7	159,684
98	4	14.0	1,914	2.6	888	0.1	101	2.5	952	109.7	9,070	-	-	3,960.3	98,197
	5	1.0	172	0.5	178	1.1	1,181	4.1	1,503	55.0	4,728	3,893.3	78,201	112.8	12,578
	6	-	-	-	-	2.2	2,469	5.2	1,957	-	-	13,718.0	282,359	695.8	18,560

附錄 IV.11-1 漁撈戶重要經濟魚種之平均漁獲產量、漁獲產值（續 4）

單位：公斤/戶、元//戶

項目 / 年	月	魩仔魚		紅目鰱(紅目大眼鯛) (*Cookeolus boops*)		龍蝦(龍蝦) (Penulirus Japanicus)		石狗公(石狗公) (*Sebastiscus albofasciatus*)		煙仔虎(齒鰆) (*Sarda orientalis*)		煙管仔(圓花鰹) (*Auxis rochei*)		其他 (*Others*)	
		產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值	產量	價值
99	4	3.0	150	0.1	38	3.1	3,688	3.0	1,134	2.2	400	4.3	86	2,189.2	70,390
	5	2.2	555	-	12	3.6	4,276	3.6	1,269	2.0	325	2,682.8	43,032	2,752.7	69,597
	6	-	-	-	13	3.6	4,319	4.2	1,433	-	-	11,689.1	187,026	3,101.0	80,499
100	4	16.7	5,136	0.1	22	8.4	11,278	3.6	1,233	-	-	-	-	2,248.4	2,248
	5	16.6	3,300	0.1	35	6.7	8,674	4.5	1,580	-	-	4,107.5	92,858	7,463.4	215,372
	6	0.0	0	0.7	326	5.4	7,044	4.5	1,557	17.2	1,841	8,906.2	155,213	25,604.8	729,853
101	4	38.8	8,506.5	-	-	6.4	8,394.6	4.1	1,362.0	38.8	3,390.4	0.0	0.0	15,552	491,299
	5	7.8	548	-	-	7.9	10696	1.5	473	68.8	3961	1,441.3	28607	11,382.1	399968
	6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	4,656	2.7	934	229.7	7,527	2,087.1	38,961	11,456.7	416,019
101 年 4~6 月總和		46.6	9,055	0	0	17.4	23,747	8.3	2,769	337.3	14,878	3528.4	67,568	38390.8	1,307,286
101 年 4~6 月平均		15.5	3,018	0	0	5.8	7,916	2.8	923	112.4	4,959	1176.1	22,523	12796.9	435,762

註：“-”表示該月無該魚種的產量或產值

附錄Ⅳ.11-2　101 年 4~6 月貢寮地區火誘網漁業標本戶月平均漁獲產量之變化

單位：公斤/戶

魚種 \ 年月別 / 產量		4 月	5 月	6 月
頭足類	小卷(*Loligo edulis*,劍尖槍鎖管)	846		
	軟絲(*Sepioteuthis lessoniana*,白烏賊)			1
	花枝(*Sepia esculenta*,金烏賊)			
	透抽(*Lologo edulis*,真鎖管)	4		2
	小計	850		3
鯵科	四破(*Decapterus macrosoma*,拉疆鯵)		6	20
	目孔(*Selar crumenophthalmus*,脂眼凹肩			
	赤尾仔(*Decapterus russelli*,紅瓜鯵)	3		
	紅鮸(*Seriola dumerili*,紅甘鯵)			
	黑尾、巴郎(*Trachurus japonicus*,真鯵)			
	硬尾、巴郎(*Decapterus maruadsi*,藍圓			
	白赤尾(*Decapterus kurroides*,紅尾圓鯵)	4		
	小計	7	6	20
鯖科	煙管仔(*Auxis rochei rochei*,圓花鰹)		4,899	7,366
	煙仔魚(*Euthynnus affinis*,巴鰹)			88
	煙仔虎(*Sarda orientalis*,齒鰆)	65	24	472
	花輝(*Scomber australusis*,花腹鯖)		8	89
	馬加(*Scomberomorus niphonius*,日本馬加鰆)			
	卓鯃(*Katsuwonus pelamis*,正鰹)			
	白北(*Scomberomorus guttata*,台灣馬加鰆)			
	小計	65	4,931	8,015
正旗魚科	旗魚(*Istiophorus platypterus*,雨傘旗魚)			
海鱷科	海鱷仔(*Rachycentron canadum*,海鱷)			
舵魚科	白毛(*Kyphosus cinerascens*,低鰭舵魚)			
	黑毛(*Girella punctata*,黑瓜仔鱲)			
	小計			
鯛科	加鱲(*Pagrus major*,嘉鱲)			
	黑豬哥(*Prionurus scalprus*,鋸尾鯛)			
	倒吊(*Acanthurus bleekeri*,布氏刺尾鯛)			
	赤鯊(*Dentex tumifrons*,赤鯊)			
	小計			
大眼鯛科	紅目鰱(*Priacanthus macracanthus*,大眼			
單棘魨科	白達(*Aluterus monoceros*,單角革單棘魨)			
	黑達(*Thamnaconus modestus*,短角單棘魨)			
	小計			
逌科	石狗公(*Sebastiscus albofasciatus*,石狗公)			

附錄Ⅳ.11-2　101 年 4~6 月貢寮地區火誘網漁業標本戶月平均漁獲產量之變化（續）

單位：公斤/戶

魚種 \ 產量 \ 年月別		2012		
		4 月	5 月	6 月
鮨科	石斑(*Epinephelus sp.*,石斑)			
	過魚(*Cephalopholis boenak*,橫紋九刺鮨)			
	小計			
石鱸科	黃雞魚(*Parapristipoma trilneatum*,三線雞魚)			
鯡科	青鱗仔(*sardinella melanure*,黑尾砂魚丁)		92	654
	臭肉鱎(*Etrumeus teres*,脂眼鯡)			
	小計		92	654
鯷科	苦蚵仔			
	丁香			
	鱙仔	235		
	魩仔魚	134		
	小計	369		
弱棘魚科	馬頭(*Branchiostegus japonicus*,日本馬頭魚)			
飛魚科	飛魚(*Cypselurus unicolor*,白鰭飛魚)			
	飛魚卵		25	
	小計		25	
帶魚科	白帶(*Trichiurus lepturus*,白帶魚)	4		
金梭魚科	尖梭(*Sphyraena japonica*,日本金梭)			
鯊鮫科	鯊魚(*Sphyrna zygaena*,丫髻鮫)			
	豆腐沙(*Rhincodon typus*,鯨鮫)			
	沙條(*Mustelus manazo*,星貂鮫)			
	小計			
海鰻科	海鰻(*Muraenesox cinereus*,灰海鰻)			
鰻鱺科	花鰻(*Anguilla marmorata*,鱸鰻)			
鯙科	錢鰻(*Gymnothorax favagineus*,黑斑裸胸鯙)			
	薯鰻(*Gymnothorax* sp.,裸胸鯙)			
	小計			
鬼頭刀科	飛烏虎(*coryphaena hippurus*,鬼頭刀)		6	7
隆頭魚科	石老(*Choerodon azurio*,寒雕)			
臭肚魚科	臭肚魚(*Siganus fuscescens*,褐籃子魚)			
小計	其他			
合計		1,295	5,060	8,699

附錄 IV.11-3　101 年 4~6 月貢寮地區扒網漁業標本戶月平均漁獲產量變化

單位：公斤/戶

年月別 / 產量 / 魚種	2012年		
	4 月	5 月	6 月
花腹鯖	6,460	32,725	14,478
白腹鯖	3,040	26,775	19,192
黑尾	118,274	24,333	
紅尾			
硬尾	1,333	833	
四破			
鰹魚			
紅四破			
煙管仔			
小計	129,107	84,666	33,670

附錄 IV.11-4　101 年 4~6 月貢寮地區扒網漁業標本戶月平均漁獲產值變化

單位：元/戶

年月別 / 產值 / 魚種	2012年		
	4 月	5 月	6 月
花腹鯖	203,093	1,195,608	389,331
白腹鯖	95,573	978,225	516,089
黑尾	3,269,907	681,553	
紅尾			
硬尾	53,333	32,500	
四破			
鰹魚			
紅四破			
煙管仔			
小計	3,621,906	2,887,886	905,420

附錄 IV.11-5 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產量變化

單位：公斤/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Mustelus manazo					
星貂鮫	沙條仔		0.2		0.2
Dasyatis akajei					
赤土魟	魟仔		1.0	0.3	1.3
Elops machnata					
海鰱	爛槽			1.5	1.5
Gymnothorax sp.					
裸胸鯙	薯鰻、錢鰻		1.2	0.7	1.9
Chanos chanos					
虱目魚	虱目魚	0.1	3.6	17.5	21.2
Saurida elongata					
長體蛇鯡	狗母		0.2		0.2
Pterois volitans					
魔鬼簑鮋	獅子魚	0.1			0.1
Sebastiscus albofasciatus					
白條紋石狗公	石狗公	0.6	0.8	0.7	2.1
Synanceia verrucosa					
腫瘤毒鮋	石頭魚			0.3	0.3
Platycephalus indicus					
印度牛尾魚	牛尾			0.6	0.6
Epinephelus sp.					
石斑	石斑	0.3	1.4	0.8	2.5
Terapon jarbua					
花身鯛	花身仔	1.2	2.0	2.9	6.1
Rachycentron canadum					
海鱺	海力	0.1	0.4	2.5	3.0
Alectis indicus					
印度絲鯵	秋甘	1.4			1.4
Carangoides ferdau					
平線若鯵	白甘	0.8			0.8
Carangoides malabaricus					
馬拉巴若鯵	甘仔	1.8	0.5	11.5	13.8
Decapterus maruadsi					
藍圓鯵	硬尾		0.3	0.5	0.8

附錄 IV.11-5 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產量變化(續 1)

單位：公斤/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Parastromateus niger					
烏鯧	烏鯧	0.3	0.2	1.9	2.4
Scomberoides tol					
托爾逆鉤鯵	七星		1.2	1.5	2.7
Seriola dumerili					
杜氏鰤	紅甘	1.4	5.0	17.8	24.2
Seriolina nigrofasciata					
小甘鯵	軟甘、石甘	0.1	0.4	0.4	0.9
Trachinotus blochii					
布氏鯧鯵	紅沙	0.4	0.3		0.7
Lutjanus argentimaculatus					
銀紋笛鯛	紅槽	1.3	0.3		1.6
Lutjanus fulviflamma					
火斑笛鯛	黑點		0.2	0.3	0.5
Lutjanus stellatus					
白星笛鯛	紅魚		0.2		0.2
Pterocaesio digramma					
雙帶烏尾冬	紅尾冬		0.5		0.5
Parapristipoma trilineatum					
三線雞魚	黃雞魚	1.2	1.0	0.7	2.9
Plectorhinchus cinctus					
花軟唇	加志	1.7	1.2	0.7	3.6
Plectorhinchus gibbosus					
駝背石鱸	包公	0.1			0.1
Acanthopagrus latus					
黃鰭鯛	赤翅			0.1	0.1
Acanthopagrus schlegelii					
黑鯛	黑格	0.5			0.5
Pagrus major					
嘉鱲魚	加臘	0.6	0.2		0.8
Rhabdosargus sarba					
黃錫鯛	枋頭		0.1		0.1
Lethrinus nebulosus					
青嘴龍占	青嘴、龍占	1.9	1.0	1.1	4.0

附錄 IV.11-5 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產量變化(續 2)

單位：公斤/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Miichthys miiuy					
鮸魚	鮸魚			0.1	0.1
Parupeneus barberinus					
單帶海緋鯉	秋姑、秋哥	0.4	1.1	0.5	2.0
Girella punctata					
瓜子鱲	黑毛	1.9	1.9	0.8	4.6
Kyphosus cinerascens					
天竺舵魚	開旗、開支		0.2	0.2	0.4
Kyphosus vaigiensis					
低鰭舵魚	白毛	14.5	3.7	5.5	23.7
Drepane punctata					
斑點簾鯛	銀鯧	0.4			0.4
Platax orbicularis					
圓眼燕魚	包鯧	0.8	3.8	2.0	6.6
Platax teira					
尖翅燕魚	竹葉甘		0.3		0.3
Oplegnathus punctatus					
斑石鯛	海膽	0.6	0.7	0.5	1.8
Goniistius zonatus					
花尾鷹(魚翁)	金花	0.1			0.1
Liza macrolepis					
大鱗鯔	豆仔、烏仔			0.1	0.1
Mugil cephalus					
鯔魚	烏魚	0.5	0.5	0.2	1.2
Sphyraena barracuda					
巴拉金梭魚	金梭			0.3	0.3
Polydactylus plebeius					
五絲馬鮫	午仔		0.3	0.7	1.0
Anampses caeruleopunctatus					
青斑阿南魚	青衣	0.4	0.4	1.3	2.1
Choerodon azurio					
藍豬齒魚	石老	0.8	5.4	0.3	6.5
Pseudolabrus eoethinus					
紅頸擬隆頭魚	倒立	1.0	0.1	0.1	1.2

附錄 IV.11-5 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產量變化(續 3)

單位：公斤/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Scarus sp.					
鸚哥魚	鸚哥	2.6	1.1	0.5	4.2
Acanthurus dussumieri					
杜氏刺尾鯛	正吊	12.1	7.6	12.8	32.5
Prionurus scalprum					
鋸尾鯛	黑豬哥、琵琶	28.6	22.5	9.6	60.7
Siganus fuscescens					
褐籃子魚	象魚	20.9	6.5	5.5	32.9
Acanthocybium solandri					
棘鰆	土托		0.2		0.2
Euthynnus affinis					
巴鰹	煙仔魚		10.9		10.9
Sarda orientalis					
齒鰆	煙仔虎	1.2	0.9	2.7	4.8
Scomber australasicus					
花腹鯖	花飛		4.4	1.0	5.4
Scomberomorus niphonius					
日本馬加鰆	馬加	1.3	0.3	1.0	2.6
Paralichthys sp.					
扁魚	皇帝魚、扁魚	0.5	0.1	0.5	1.1
Aluterus monoceros					
單角革單棘魨	白達仔、剝皮魚	2.9	5.8	7.1	15.8
Monacanthus chinensis					
單棘魨	黑達仔	1.3	1.3	1.0	3.6
Sepia esculenta					
真烏賊	花枝	41.4	2.0	3.2	46.6
Sepioteuthis lessoniana					
萊氏擬烏賊	軟絲	3.0	0.7	1.0	4.7
Octopus vulgaris					
真蛸	章魚、石居	5.2		3.7	8.9
Panulirus sp.					
龍蝦	龍蝦	20.4	29.4	24.5	74.3
Scyllarides squammosus					
鱗突擬蟬蝦	戰車、蝦姑頭	1.8	5.6	0.9	8.3

附錄 IV.11-5 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產量變化(續 4)

單位：公斤/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Ibacus cilliatus					
毛緣扇蝦	蝦姑、蝦姑撇啦	4.8	4.0	1.5	10.3
Ranina ranina					
蛙形蟹	旭蟹、獅姑麻	0.2	0.6	1.2	2.0
Charybdis feriatus					
鑷斑蟳	花市		0.2	0.1	0.3
Portunus sanguinolentus					
紅星梭子蟹	三點市	0.2	0.8		1.0
	螺	0.3	4.2		4.5
	力魚			0.3	0.3
	青腳	0.2	0.1		0.3
Other	雜魚	0.2	0.5	0.9	1.6
合　計		186.4	151.5	155.9	493.8

附錄 IV.11-6 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產值變化

單位：元/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Mustelus manazo					
星貂鮫	沙條仔		27		27
Dasyatis akajei					
赤土魟	魟仔		51	20	71
Elops machnata					
海鰱	爛槽			49	49
Gymnothorax sp.					
裸胸鯙	薯鰻、錢鰻		300	167	467
Chanos chanos					
虱目魚	虱目魚	13	520	1,719	2,252
Saurida elongata					
長體蛇鯡	狗母		25		25
Pterois volitans					
魔鬼簑鮋	獅子魚	40			40
Sebastiscus albofasciatus					
白條紋石狗公	石狗公	196	317	233	746
Synanceia verrucosa					
腫瘤毒鮋	石頭魚			75	75
Platycephalus indicus					
印度牛尾魚	牛尾			134	134
Epinephelus sp.					
石斑	石斑	123	688	327	1,138
Terapon jarbua					
花身鯛	花身仔	480	854	1,251	2,585
Rachycentron canadum					
海鱺	海力	13	57	567	637
Alectis indicus					
印度絲鯵	秋甘	378			378
Carangoides ferdau					
平線若鯵	白甘	203			203
Carangoides malabaricus					
馬拉巴若鯵	甘仔	440	97	2529	3,066
Decapterus maruadsi					
藍圓鯵	硬尾		21	67	88

附錄 IV.11-6 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產值變化(續 1)

單位：元/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Parastromateus niger 烏鯧	烏鯧	50	40	440	530
Scomberoides tol 托爾逆鉤鯵	七星		53	98	151
Seriola dumerili 杜氏鰤	紅甘	363	1,173	3,791	5,327
Seriolina nigrofasciata 小甘鯵	軟甘、石甘	17	106	80	203
Trachinotus blochii 布氏鯧鯵	紅沙	67	110		177
Lutjanus argentimaculatus 銀紋笛鯛	紅槽	340	130		470
Lutjanus fulviflamma 火斑笛鯛	黑點		71	103	174
Lutjanus stellatus 白星笛鯛	紅魚		167		167
Pterocaesio digramma 雙帶烏尾冬	紅尾冬		100		100
Parapristipoma trilineatum 三線雞魚	黃雞魚	419	250	175	844
Plectorhinchus cinctus 花軟唇	加志	441	298	198	937
Plectorhinchus gibbosus 駝背石鱸	包公	17			17
Acanthopagrus latus 黃鰭鯛	赤翅			27	27
Acanthopagrus schlegelii 黑鯛	黑格	176			176
Pagrus major 嘉鱲魚	加臘	183	67		250
Rhabdosargus sarba 黃錫鯛	枋頭		64		64
Lethrinus nebulosus 青嘴龍占	青嘴、龍占	423	231	333	987

附錄 IV.11-6 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產值變化(續 2)

單位：元/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Miichthys miiuy 鮸魚	鮸魚			41	41
Parupeneus barberinus 單帶海緋鯉	秋姑、秋哥	111	273	105	489
Girella punctata 瓜子鱲	黑毛	990	1,225	496	2,711
Kyphosus cinerascens 天竺舵魚	開旗、開支		83	88	171
Kyphosus vaigiensis 低鰭舵魚	白毛	5,876	1,454	2,187	9,517
Drepane punctata 斑點簾鯛	銀鯧	31			31
Platax orbicularis 圓眼燕魚	包鯧	175	914	474	1563
Platax teira 尖翅燕魚	竹葉甘		75		75
Goniistius zonatus 花尾鷹(魚翁)	金花	21			21
Liza macrolepis 大鱗鯔	豆仔、烏仔			9	9
Mugil cephalus 鯔	烏魚	30	42	32	104
Sphyraena barracuda 巴拉金梭魚	金梭			86	86
Polydactylus plebeius 五絲馬鮫	午仔		60	210	270
Anampses caeruleopunctatus 青斑阿南魚	青衣	93	131	347	571
Choerodon azurio 藍豬齒魚	石老	230	736	88	1054
Pseudolabrus eoethinus 紅頸擬隆頭魚	倒立	100	20	42	162
Scarus sp. 鸚哥魚	鸚哥	565	284	143	992

附錄 IV.11-6 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產值變化(續 3)

單位：元/月/戶

種　　類	俗　　名	四月	五月	六月	合計
Acanthurus dussumieri 杜氏刺尾鯛	正吊	1,438	868	1,492	3,798
Prionurus scalprum 鋸尾鯛	黑豬哥、琵琶	2,400	1,985	892	5,277
Siganus fuscescens 褐籃子魚	象魚	4,972	1,530	1,243	7,745
Acanthocybium solandri 棘鰆	土托		82		82
Euthynnus affinis 巴鰹	煙仔魚		1,453		1,453
Sarda orientalis 齒鰆	煙仔虎	120	105	185	410
Scomber australasicus 花腹鯖	花飛		215	82	297
Scomberomorus niphonius 日本馬加鰆	馬加	245	63	266	574
Paralichthys sp. 扁魚	皇帝魚、扁魚	198	30	214	442
Aluterus monoceros 單角革單棘魨	白達仔、剝皮魚	563	1,190	1,647	3,400
Monacanthus chinensis 單棘魨	黑達仔	157	203	118	478
Sepia esculenta 真烏賊	花枝	8,756	440	680	9,876
Octopus vulgaris 真蛸	章魚、石居	669		413	1,082
Panulirus sp. 龍蝦	龍蝦	26,846	39726	34,766	101,338
Scyllarides squammosus 鱗突擬蟬蝦	戰車、蝦姑頭	2,580	8,755	1,308	12,643
Ibacus cilliatus 毛緣扇蝦	蝦姑撇啦	5,067	2,480	986	8,533
Ranina ranina 蛙形蟹	旭蟹、獅姑麻	67	222	675	964

附錄 IV.11-6 貢寮地區刺網漁業 101 年 4~6 月漁獲產值變化(續 4)

單位：元/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Charybdis feriatus 鏽斑蟳	花市		67	67	134
Portunus sanguinolentus 紅星梭子蟹	三點市	58	207		265
Opleganthus punctatus 斑石鯛	海膽	700	760	486	1,946
Sepioteuthis lessoniana 萊氏擬烏賊	軟絲	1,606	331	490	2,427
	螺	75	805		880
	力魚			116	116
	青腳	146	63		209
Other	雜魚	22	92	233	347
合　計		69,289	72,786	63,090	205,165

附錄 IV.11-7 貢寮地區釣具漁業 101 年 4~6 月漁獲重量變化

單位：公斤/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Mustelus manazo 星貂鮫	沙條	2.3	2.2	0.8	5.3
Sebastiscus albofasciatus 白條紋石狗公	石狗公	7.1	2.5	5.3	14.9
Epinephelus sp. 石斑	石斑	1.2	0.3	0.4	1.9
Branchiostegus albus 白馬頭魚	白馬頭	0.1	0.1	0.2	0.4
Branchiostegus japonicus 日本馬頭魚	馬頭	9.3	5.5	8.6	23.4
Carangoides malabaricus 馬拉巴若鰺	甘仔	1.3	1.0	0.8	3.1
Decapterus maruadsi 藍圓鰺	硬尾	3.0	5.6		8.6
Seriola dumerili 紅甘鰺	紅甘		0.2		0.2
Seriola quinqueradiata 五條鰤	青甘	0.5			0.5
Coryphaena hippurus 鬼頭刀	鬼頭刀		6.3	6.1	12.4
Lutjanus argentimaculatus 銀紋笛鯛	紅槽	0.2			0.2
Dentex tumifrons 赤鯨	赤宗	37.9	21.5	28.6	88.0
Evynnis cardinalis 鮸鯛	盤仔	1.0	1.4	1.0	3.4
Pagrus major 嘉鱲魚	加臘	0.5			0.5
Nemipterus japonicus 日本金線魚	金線鱲		0.3		0.3
Pseudolabrus eoethinus 紅頸擬隆頭魚	倒立	2.6			2.6
Acanthocybium solandri 棘鰆	土托		0.5		0.5

附錄 IV.11-7 貢寮地區釣具漁業 101 年 4~6 月漁獲重量變化（續）

單位：公斤/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Euthynnus affinis					
巴鰹	煙仔	1.8			1.8
Gymnosarda unicolor					
裸鰆	疏齒	0.1			0.1
Sarda orientalis					
齒鰆	煙仔虎	30.1	117.4	153.6	301.1
Scomber australasicus					
花腹鯖	花飛	7.2	4.3		11.5
Scomberomorus niphonius					
日本馬加鰆	馬加	0.9	0.3		1.2
Paralichthys sp.					
扁魚	皇帝魚、扁魚		0.1		0.1
Loligo edulis					
劍尖槍烏賊	透抽			0.6	0.6
Sepia esculenta					
真烏賊	花枝	1.8	0.5		2.3
Sepioteuthis lessoniana					
萊氏擬烏賊	軟絲	13.0	4.7	1.9	19.6
合　計		121.9	174.7	207.9	504.5

附錄 IV.11-8 貢寮地區釣具漁業 101 年 4~6 月漁獲產值變化

單位：元/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Mustelus manazo 星貂鮫	沙條	226	147	55	428
Sebastiscus albofasciatus 白條紋石狗公	石狗公	2,319	748	1,826	4,893
Epinephelus sp. 石斑	石斑	597	180	229	1,006
Branchiostegus albus 白馬頭魚	白馬頭	43	47	82	172
Branchiostegus japonicus 日本馬頭魚	馬頭	4,947	2,909	4,697	12,553
Carangoides malabaricus 馬拉巴若鰺	甘仔	269	158	180	607
Decapterus maruadsi 藍圓鰺	硬尾	185	323		508
Seriola dumerili 杜氏鰤	紅甘		67		67
Seriola quinqueradiata 五條鰤	青甘	135			135
Coryphaena hippurus 鬼頭刀	鬼頭刀		523	557	1,080
Lutjanus argentimaculatus 銀紋笛鯛	紅槽	81			81
Dentex tumifrons 赤鯨	赤宗	21,843	11,117	14,266	47,226
Evynnis cardinalis 鯇鯛	盤仔	269	526	298	1,093
Pagrus major 嘉鱲魚	加臘	254			254
Nemipterus japonicus 日本金線魚	金線鱲		140		140
Pseudolabrus eoethinus 紅頸擬隆頭魚	倒立	869			869
Acanthocybium solandri 棘鰆	土托		159		159

附錄 IV.11-8 貢寮地區釣具漁業 101 年 4~6 月漁獲產值變化（續）

單位：元/月/戶

種　類	俗　名	四月	五月	六月	合計
Euthynnus affinis					
巴鰹	煙仔	154			154
Gymnosarda unicolor					
裸鰆	疏齒	26			26
Sarda orientalis					
齒鰆	煙仔虎	2,541	14,460	13,353	30,354
Scomber australasicus					
花腹鯖	花飛	458	258		716
Scomberomorus niphonius					
日本馬加鰆	馬加	254	64		318
Paralichthys sp.					
扁魚	皇帝魚、扁魚		40		40
Loligo edulis					
劍尖槍烏賊	透抽			268	268
Sepia esculenta					
真烏賊	花枝	363	90		453
Sepioteuthis lessoniana					
萊氏擬烏賊	軟絲	6,138	2,118	907	9,163
合　計		41,971	34,074	36,718	112,763

附錄 IV.11-9 貢寮地區 101 年 4 月沿岸採捕業標本戶漁獲統計

單位：採捕量（公斤）、單價（元/公斤）、產值（元/戶/月）

標本戶	1	2	3	4	總計	平均產量	單價	平均產值	CPUE	IPUE
作業天數	5	12	14	15	46					
作業地點	美濫山至澳底	龍洞至澳底	龍洞至澳底	龍洞至美濫山		(公斤/月/戶)		(元/月/戶)	(公斤/日/戶)	(元/日/戶)
青苔菜(*Monostroma nitidum*)	10.80				10.80	2.70	100	270.00	0.23	23.48
茶米菜(*Chondracanthus acicularis*)	3.00		53.40		56.40	14.10	150	2115.00	1.23	183.91
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工前)	69.00	116.10	106.20	15.00	306.30	76.58	80	6126.00	6.66	532.70
海膽(*Anthocidaris crassispina*)	3.00				3.00	0.75	700	525.00	0.07	45.65
九孔(*Haliotis diversicolor supertexta*)	3.00				3.00	0.75	500	375.00	0.07	32.61
龍蝦(*Penulirus japanicus*)	9.00				9.00	2.25	500	1125.00	0.20	97.83
石菊(*collisella benoldi*)		0.60			0.60	0.15	450	67.50	0.01	5.87
貝菊(*liolophura japonica*)		0.60			0.60	0.15	450	67.50	0.01	5.87
總計	97.80	117.30	159.60	15.00	389.70	97.43		10671.00	8.47	927.91

附錄 IV.11-10 貢寮地區 101 年 5 月沿岸採捕業標本戶漁獲統計

單位：採捕量（公斤）、單價（元/公斤）、產值（元/戶/月）

標本戶	1	2	3	4	總計	平均產量	單價	平均產值	CPUE	IPUE
作業天數	5	7	7	16	35					
作業地點	美濫山至澳底	龍洞至澳底	龍洞至澳底	龍洞至美濫山		(公斤/月/戶)		(元/月/戶)	(公斤/日/戶)	(元/日/戶)
青苔菜(*Monostroma nitidum*)	6.00				6.00	1.50	100	150.00	0.17	17.14
茶米菜(*Chondracanthus acicularis*)			15.00		15.00	3.75	150	562.50	0.43	64.29
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工前)	78.00	90.60	57.60	17.40	243.60	60.90	80	4872.00	6.96	556.80
海膽(*Anthocidaris crassispina*)	6.00				6.00	1.50	700	1050.00	0.17	120.00
九孔(*Haliotis diversicolor supertexta*)	1.80				1.80	0.45	500	225.00	0.05	25.71
龍蝦(*Penulirus japanicus*)	10.20				10.20	2.55	500	1275.00	0.29	145.71
貝菊(*liolophura japonica*)			0.60		0.60	0.15	450	67.50	0.02	7.71
總計	102.00	90.60	73.20	17.40	283.20	70.80		8202.00	8.09	937.37

附錄 IV.11-11 貢寮地區 101 年 6 月沿岸採捕業標本戶漁獲統計

單位：採捕量（公斤）、單價（元/公斤）、產值（元/戶/月）

標本戶	1	2	3	4	總計	平均產量	單價	平均產值	CPUE	IPUE
作業天數	5	4	4	14	27					
作業地點	美濫山至澳底	龍洞至澳底	龍洞至澳底	龍洞至美濫山		(公斤/月/戶)		(元/月/戶)	(公斤/日/戶)	(元/日/戶)
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工前)	60.00	53.40	9.00	16.80	139.20	34.80	80	2784.00	5.16	412.44
海膽(*Anthocidaris crassispina*)	10.80				10.80	2.70	700	1890.00	0.40	280.00
龍蝦(*Penulirus japanicus*)	13.20				13.20	3.30	500	1650.00	0.49	244.44
貝菊(*liolophura japonica*)			2.48		2.48	0.62	450	278.44	0.09	41.25
總計	84.00	53.40	11.48	16.80	165.68	41.42		6602.44	6.14	978.14

附錄 IV.11-12 貢寮地區 101 年 4 月沿岸採捕業（潛水）標本戶漁獲統計

單位：採捕量（公斤）、單價（元/公斤）、產值（元/戶/月）

標本戶	1	2	3	4	總計	平均產量	單價	平均產值	CPUE	IPUE
作業天數	6	12	11	12	41					
作業地點	和美至福隆	和美至福隆	和美至福隆	和美至福隆		(公斤/月/戶)		(元/月/戶)	(公斤/日/戶)	(元/日/戶)
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工前)	120.60			353.40	474.00	118.50	90	10665.00	11.56	1040.49
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工後)		30.00	35.00		65.00	16.25	450	7312.50	1.59	713.41
海膽(*Anthocidaris crassispina*)		12.00	7.00	5.10	24.10	6.03	750	4518.75	0.59	440.85
九孔(*Haliotis diversicolor supertexta*)			2.00		2.00	0.50	800	400.00	0.05	39.02
龍蝦(*Penulirus japanicus*)	29.40	13.50	7.00	22.20	72.10	18.03	800	14420.00	1.76	1406.83
蝦蛄(*Oratosquilla oratoria*)	44.40				44.40	11.10	1050	11655.00	1.08	1137.07
貝菊(*liolophura japonica*)		3.00			3.00	0.75	750	562.50	0.07	54.88
黑碟貝(*Pinctade margaritifera*)			3.00	159.60	162.60	40.65	60	2439.00	3.97	237.95
文蛤(*Meretrix lusoria*)			3.00	66.00	69.00	17.25	400	6900.00	1.68	673.17
總計	194.40	58.50	57.00	606.30	916.20	229.05		58872.75	22.35	5743.68

附錄 IV.11-13 貢寮地區 101 年 5 月沿岸採捕業（潛水）標本戶漁獲統計

單位：採捕量（公斤）、單價（元/公斤）、產值（元/戶/月）

標本戶	1	2	3	4	總計	平均產量	單價	平均產值	CPUE	IPUE
作業天數	8	14	11	7	40					
作業地點	和美至福隆	和美至福隆	和美至福隆	和美至福隆		(公斤/月/戶)		(元/月/戶)	(公斤/日/戶)	(元/日/戶)
茶米菜(*Chondracanthus acicularis*)		8.00	8.00		16.00	4.00	200	800.00	0.40	80.00
鹿角菜(*Dermonema virens*)			2.00		2.00	0.50	200	100.00	0.05	10.00
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工前)	138.00			151.80	289.80	72.45	90	6520.50	7.25	652.05
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工後)		23.00	17.00		40.00	10.00	450	4500.00	1.00	450.00
海膽(*Anthocidaris crassispina*)	12.60	14.50	10.50	18.00	55.60	13.90	750	10425.00	1.39	1042.50
九孔(*Haliotis diversicolor supertexta*)				3.60	3.60	0.90	500	450.00	0.09	45.00
龍蝦(*Penulirus japanicus*)	43.80	15.00	8.00	9.00	75.80	18.95	800	15160.00	1.90	1516.00
蝦蛄(*Oratosquilla oratoria*)	45.00				45.00	11.25	1050	11812.50	1.13	1181.25
石菊(*collisella benoldi*)		4.00	2.00		6.00	1.50	750	1125.00	0.15	112.50
貝菊(*liolophura japonica*)		2.00	2.00		4.00	1.00	750	750.00	0.10	75.00
黑碟貝(*Pinctade margaritifera*)	48.00			51.60	99.60	24.90	55	1369.50	2.49	136.95
文蛤(*Meretrix lusoria*)				21.60	21.60	5.40	380	2052.00	0.54	205.20
總計	287.40	66.50	49.50	255.60	659.00	164.75		55064.50	16.48	5506.45

附錄 IV.11-14 貢寮地區 101 年 6 月沿岸採捕業（潛水）標本戶漁獲統計

單位：採捕量（公斤）、單價（元/公斤）、產值（元/戶/月）

標本戶	1	2	3	4	總計	平均產量	單價	平均產值	CPUE	IPUE
作業天數	7	16	12	10	45					
作業地點	和美至福隆	和美至福隆	和美至福隆	和美至福隆		(公斤/月/戶)		(元/月/戶)	(公斤/日/戶)	(元/日/戶)
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工前)				61.80	61.80	15.45	90	1390.50	1.37	123.60
石花菜(*Pterocladia capillacea*)(加工後)		23.00	9.00		32.00	8.00	450	3600.00	0.71	320.00
海膽(*Anthocidaris crassispina*)		8.00	10.50	9.00	27.50	6.88	800	5500.00	0.61	488.89
九孔(*Haliotis diversicolor supertexta*)		3.00			3.00	0.75	800	600.00	0.07	53.33
龍蝦(*Penulirus japanicus*)	33.60	20.50	10.00	60.90	125.00	31.25	800	25000.00	2.78	2222.22
蝦蛄(*Oratosquilla oratoria*)	70.20				70.20	17.55	1050	18427.50	1.56	1638.00
石菊(*collisella benoldi*)		2.00	3.50		5.50	1.38	750	1031.25	0.12	91.67
貝菊(*liolophura japonica*)		5.00	7.00		12.00	3.00	750	2250.00	0.27	200.00
黑碟貝(*Pinctade margaritifera*)			18.00	279.00	297.00	74.25	60	4455.00	6.60	396.00
文蛤(*Meretrix lusoria*)		18.00		96.60	114.60	28.65	380	10887.00	2.55	967.73
總計	103.80	79.50	58.00	507.30	748.60	187.15		73141.25	16.64	6501.44

附錄 IV.11-15 貢寮地區 101 年 4 月娛樂（海釣）漁業標本戶漁獲統計

標本戶	1	2	總計	平均漁獲量(公斤/月/戶)	CPUE(公斤/日/戶)
作業日數	13	6	19		
漁獲努力量（支）	129	35	164		
赤鯨(*Dentex tumifrons*)	157.8	126.0	283.8	141.9	14.9
石狗公(*Sebastiscus albofasciatus*)		14.5	14.5	7.3	0.8
大目鰱(*Cookeolus japonicus*)	1873.8		1873.8	936.9	98.6
馬頭(*Branchiostegus japonicus*)	19.2	173.0	192.2	96.1	10.1
黃雞母(*Parapristipoma trilneatus*)		200.0	200.0	100.0	10.5
總計	2050.8	513.5	2564.3	1282.2	135.0

附錄 IV.11-16 貢寮地區 101 年 5 月娛樂（海釣）漁業標本戶漁獲統計

標本戶	1	2	總計	平均漁獲量(公斤/月/戶)	CPUE(公斤/日/戶)
作業日數	17	3	20		
漁獲努力量（支）	170	21	191		
赤鯨(*Dentex tumifrons*)	37.8	115.0	152.8	76.4	7.6
石狗公(*Sebastiscus albofasciatus*)		14.0	14.0	7.0	0.7
大目鰱(*Cookeolus japonicus*)	1716.6		1,716.6	858.3	85.8
土目(*Psenopsis anomala*)	58.8		58.8	29.4	2.9
馬頭(*Branchiostegus japonicus*)	26.4	20.0	46.4	23.2	2.3
紅甘(*Seriola dumerili*)	15.0		15.0	7.5	0.8
煙仔虎 *(Sarda orientalis)*	22.8		22.8	11.4	1.1
大石斑(Epinephelus sp.)	16.2		16.2	8.1	0.8
紅黑喉*(Helicolenus hilgendorfii)*	10.8		10.8	5.4	0.5
總計	1904.4	149.0	2053.4	1026.7	102.7

附錄 IV.11-17 貢寮地區 101 年 6 月娛樂（海釣）漁業標本戶漁獲統計

標本戶	1	2	總計	平均漁獲量(公斤/月/戶)	CPUE(公斤/日/戶)
作業日數	11	5	16		
漁獲努力量 （支）	110	32	142		
赤鯨(*Dentex tumifrons*)		250.0	250.0	125.0	15.6
石狗公(*Sebastiscus albofasciatus*)		49.0	49.0	24.5	3.1
大目鰱(*Cookeolus japonicus*)	1752.0	3.0	1,755.0	877.5	109.7
馬頭(*Branchiostegus japonicus*)		48.0	48.0	24.0	3.0
黃雞母(*Parapristipoma trilneatus*)		500.0	500.0	250.0	31.3
總計	1752.0	850.0	2602.0	1301.0	162.6

附錄 IV.11-18 貢寮地區 101 年 4~5 月魩仔魚漁獲統計一覽表

單位：漁獲量（公斤）

日期	標本戶1	總計	CPUE（公斤/日/戶）	日期	標本戶1	總計	CPUE（公斤/日/戶）
101/04/02	80	80	80	101/04/10	40	40	40
101/04/03	40	40	40	101/04/11	30	30	30
101/04/05	60	60	60	101/05/01	50	50	50
101/04/06	200	200	200	101/05/05	40	40	40
101/04/07	160	160	160	合　　計	790	790	790
101/04/08	60	60	60	平　　均	71.82	71.82	71.82
101/04/09	30	30	30				
